

Id	Modo de tarea	item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
1			**CONTRATO DE OBRA SCJ-1805-2023 FRENTE FONTIBON CELDAS**	**58 días**	**mar 7/11/23**	**vie 5/01/24**			**$ 36,567,327.99**
2			INICIO	0 días	mar 7/11/23	mar 7/11/23			$ 0.00
3		**1**	**PRELIMINARES**	**13 días**	**mar 7/11/23**	**lun 20/11/23**			**$ 1,637,443.15**
4		3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	3 días	mar 7/11/23	jue 9/11/23		5;6;7;8;9;1	$ 301,264.00
5		10	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	10 días	jue 9/11/23	lun 20/11/23	4	45	$ 453,740.60
6		16	demolicion de muros (e=0,15) en altura de 17m, incluye cargue y transporte	10 días	jue 9/11/23	lun 20/11/23	4	45	$ 525,600.00
7		27	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	10 días	jue 9/11/23	lun 20/11/23	4	45	$ 205,284.80
8		31	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES MODULARES	10 días	jue 9/11/23	lun 20/11/23	4	45	$ 22,352.00
9		33	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SÓLO P´ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN DEL MISMO APARATO SANITARIO)	10 días	jue 9/11/23	lun 20/11/23	4	45	$ 43,439.00
10		52	Desmonte de push sanitarios	10 días	jue 9/11/23	lun 20/11/23	4	45	$ 38,338.00
11		73	Corte de placa con pulidora. Incluye aseo	10 días	jue 9/11/23	lun 20/11/23	4	45	$ 47,424.75
12		**4**	**MAMPOSTERIA**	**35 días**	**jue 30/11/23**	**vie 5/01/24**			**$ 354,398.50**
13		111	ALFAJIAS LADRILLO TOLETE COMUN	10 días	jue 30/11/23	lun 11/12/23	45FF		$ 294,202.50
14		116	CHAZOS PARA CARPINTERIA	10 días	mar 26/12/23	vie 5/01/24	46FF		$ 42,492.00
15		118	INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES	10 días	mar 26/12/23	vie 5/01/24	46FF		$ 17,704.00
16		**6**	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**	**30 días**	**mar 5/12/23**	**vie 5/01/24**			**$ 13,694,211.38**
17		432	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	10 días	mar 5/12/23	vie 15/12/23	45FC-5 días	25;26;27;2	$ 123,057.28
18		435	RESANES GENERALES	10 días	mar 26/12/23	vie 5/01/24	46FF		$ 82,200.40
19		457	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE PISOS ANCHO 5 CMS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OAABRA	10 días	mar 26/12/23	vie 5/01/24	46FF		$ 542,872.80
20		574	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE CERRAMIENTO DE CELDAS (REJAS) ELABORADOS EN VARILLA METÁLICA LISA Ø7/8" PUESTA VERTICALMENTE CADA 0.10 Y PLATINAS 38X4MM (1½"X3/16"). CON MARCOS PERIMETRALES Y DIVISIONES VERTICALES MODULARES EN ÁNGULO METÁLICO 50 X 4MM (2"X3/16	10 días	mar 26/12/23	vie 5/01/24	46FF		$ 7,696,752.75
21		578	Suministro e instalaciòn de lámina alfajor Cal.14 para protecciòn de ventanas. Incluye marco en angulo de 1*1*1/8", anticorriso alquidico y pintura de acabados alquidica. (Incluye elementos para trabajos en alturas)	10 días	mar 26/12/23	vie 5/01/24	46FF		$ 1,802,391.40
22		579	Suministro e instalaciòn de malla expandida IMT-20 Cal. 14 instalada a modo de cielo razo soldada sobre reja de segurida. Incluye platina pisamalla de 1 1/2x3/16" anticorrosivo y esmalte.	10 días	mar 26/12/23	vie 5/01/24	46FF		$ 2,299,306.75
23		680	Suministro e instalación de Refelctor de 100W	10 días	mar 26/12/23	vie 5/01/24	46FF		$ 1,147,630.00
24		**14**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**10 días**	**vie 15/12/23**	**mar 26/12/23**			**$ 3,497,830.00**
25		688	INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAMANOS	10 días	vie 15/12/23	mar 26/12/23	17	37;38;39;4	$ 26,518.00
26		690	INSTALACIÓN DE GRIFERIA ORINAL	10 días	vie 15/12/23	mar 26/12/23	17	37;38;39;4	$ 26,518.00

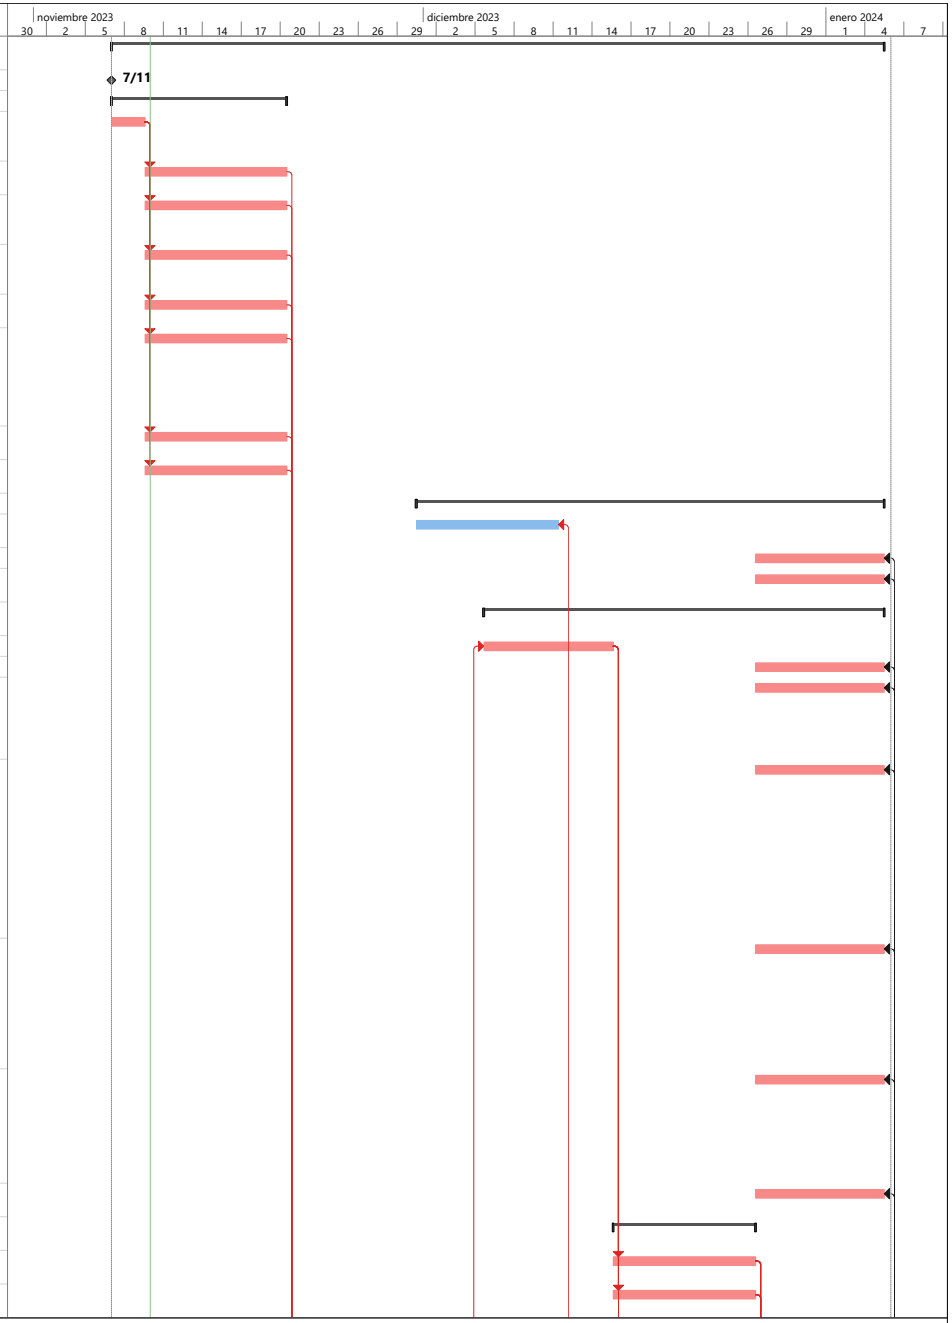

Proyecto:
1.porgramacion celdas epol fontibonV
Fecha: vie 10/11/23

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Progreso manual
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Tareas críticas
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | División crítica
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Progreso

Id	Modo de tarea	ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
27		691	INSTALACIÓN DE GRIFERIA SANITARIOS	10 días	vie 15/12/23	mar 26/12/23	17	37;38;39;4(	$ 26,518.00
28		693	INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS (SÓLO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON DESMONTE DEL MISMO APARATO SANITARIO)	10 días	vie 15/12/23	mar 26/12/23	17	37;38;39;4(	$ 86,878.00
29		720	Suministro e instalación de lavamanos antivandalico en acero inoxidable.	10 días	vie 15/12/23	mar 26/12/23	17	37;38;39;4(	$ 1,600,770.00
30		729	REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACIÓN)	10 días	vie 15/12/23	mar 26/12/23	17	37;38;39;4(	$ 24,513.00
31		738	Suministro e instalación de desagüe con rejilla para lavamanos, sencillo, con rebose, metálico, cromado, Marca A&A o similar.	10 días	vie 15/12/23	mar 26/12/23	17	37;38;39;4(	$ 38,975.00
32		756	GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR	10 días	vie 15/12/23	mar 26/12/23	17	37;38;39;4(	$ 318,930.00
33		757	DUCHA ANTIVANDÁLICA DE ACCIÓN HIDROMECÁNICA, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-17125106 DOCOL Ó SIMILAR	10 días	vie 15/12/23	mar 26/12/23	17	37;38;39;4(	$ 328,431.00
34		759	KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL Ó SIMILAR.	10 días	vie 15/12/23	mar 26/12/23	17	37;38;39;4(	$ 585,172.00
35		763	Suministro e instalación de push antivandalico para sanitario.	10 días	vie 15/12/23	mar 26/12/23	17	37;38;39;4(	$ 434,607.00
36		**16**	**PINTURA**	**10 días**	**mar 26/12/23**	**vie 5/01/24**			**$ 10,409,394.21**
37		800	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	10 días	mar 26/12/23	vie 5/01/24	35;34;33;32;31;3	46	$ 2,594,941.00
38		804	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	10 días	mar 26/12/23	vie 5/01/24	35;34;33;32;31;3	46	$ 518,089.60
39		806	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	10 días	mar 26/12/23	vie 5/01/24	35;34;33;32;31;3	46	$ 1,189,740.00
40		807	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	10 días	mar 26/12/23	vie 5/01/24	35;34;33;32;31;3	46	$ 1,248,516.00
41		818	Suministro e instalación de pintura poliuretano 2 manos	10 días	mar 26/12/23	vie 5/01/24	35;34;33;32;31;3	46	$ 2,563,704.11
42		827	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	10 días	mar 26/12/23	vie 5/01/24	35;34;33;32;31;3	46	$ 1,251,000.00
43		831	Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. Producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. Incluye transporte de insumos a obra.	10 días	mar 26/12/23	vie 5/01/24	35;34;33;32;31;3	46	$ 1,043,403.50
44			**ITEMS NO PREVISTOS**	**20 días**	**lun 20/11/23**	**lun 11/12/23**			**$ 6,974,050.75**
45		NP 1	CONSTRUCCION DE MURO EN MAMPOSTERIA CONFINADA,INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	20 días	lun 20/11/23	lun 11/12/23	11;10;9;8;7;6;5	17FC-5 días;13FF	$ 6,974,050.75
46			FIN	0 días	vie 5/01/24	vie 5/01/24	43;42;41;40;39;3	14FF;15FF;	$ 0.00

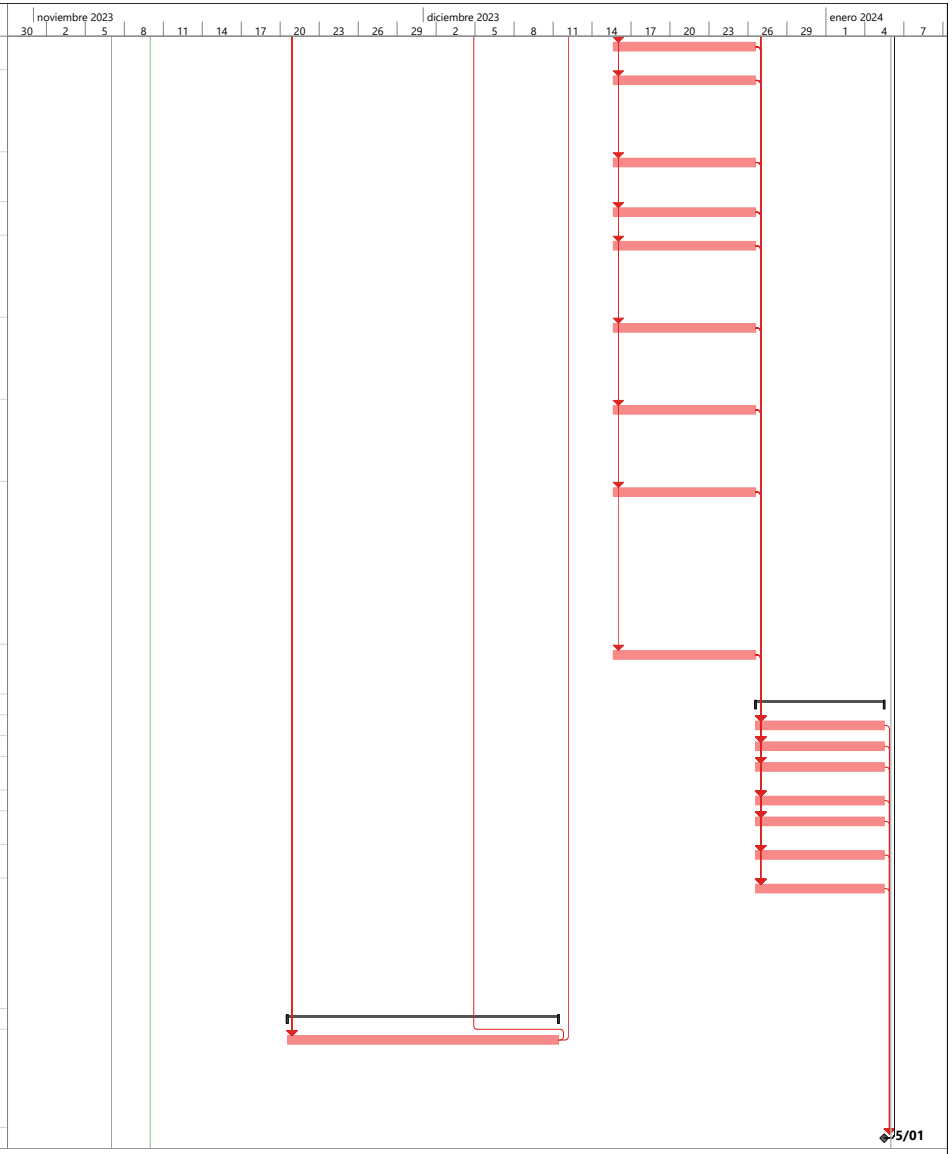

Proyecto:
1.porgramacion celdas epol fontibonV
Fecha: vie 10/11/23

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual				
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas					
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica					
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso					
