NUMERO DEL INFORME: 6

CORRESPONDIENTE A LAS OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PERÍODO DEL (01/12/23) AL (31/12/23).

TABLA DE CONTENIDO:

1. Información General de la Obra Pública
- **1.1.** Descripción general de la Obra Pública
- **1.2.** Localización de la Obra Pública
- **1.3.** Información básica de los contratos
  - **1.3.1.** Contrato de Obra
  - **1.3.2.** Contrato de Interventoría
- **1.4.** Personal administrativo de la interventoría y de la supervisión

2. Informe Técnico del Seguimiento al Contrato de Interventoría
- **2.1.** Control de ejecución
  - **2.1.1.** Relación de las obligaciones de la interventoría
  - **2.1.2.** Relación de las obligaciones de la supervisión frente al contrato de interventoría

3. Informe social, ambiental y de salud y seguridad en el trabajo, del contrato de interventoría
- **3.1.** Informe Social
  - **3.1.1.** Descripción de las actividades realizadas por la interventoría en ejecución del componente social.
  - **3.1.2.** Observaciones, recomendaciones y conclusiones de la supervisión con relación a las labores realizadas por la interventoría en el desarrollo del componente social de su contrato y en la verificación de este componente en el contrato de ejecución de la obra pública.
- **3.2.** Informe Ambiental
  - **3.2.1.** Descripción de las actividades realizadas por la interventoría en ejecución del componente ambiental.
  - **3.2.2.** Observaciones, recomendaciones y conclusiones de la supervisión con relación a las labores realizadas por la interventoría en el desarrollo del componente ambiental de su contrato y en la verificación de este componente en el contrato de ejecución de la obra pública.
- **3.3.** Informe de Salud y Seguridad en el Trabajo
  - **3.3.1.** Descripción de las actividades realizadas por la interventoría en ejecución del componente de salud y seguridad en el trabajo.
  - **3.3.2.** Observaciones, recomendaciones y conclusiones de la supervisión con relación a las labores realizadas por la interventoría en el desarrollo del componente de salud y seguridad en el trabajo de su contrato y en la verificación de este componente en el contrato de ejecución de la obra pública.

4. Informe Administrativo de seguimiento al contrato de interventoría

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4.1. Control del personal del contratista de interventoría asociado al proyecto (administrativo y técnico) y su pago de seguridad social integral.
4.2. Informe de la materialización de riesgos previsibles del contrato de interventoría y su mitigación.
4.3. Correspondencia enviada y recibida**.**
4.4. Evaluación en SAP de los contratistas (interventoría y obra)

5. Informe Financiero y Contable

5.1. Descripción de datos generales registrados en SAP
5.2. Relación de pagos y amortización del anticipo (si aplica) del contrato de interventoría
5.3. Control de inversión del anticipo y de los rendimientos financieros generados en el contrato de interventoría (si aplica)
5.4. Relación de las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones del contrato de interventoría.
5.5. Descripción de la realización de las funciones del apoyo administrativo, financiero y contable de la supervisión.

6. Informe Jurídico

6.1. Relación de reclamaciones.
6.2. Relación de sanciones.
6.3. Relación hallazgos de auditorías realizadas a los contratos (interventoría y obra) y seguimiento de acciones de mejoramiento definidas para su corrección.
6.4. Control al estado de las garantías del contrato de interventoría.
6.5. Descripción de la realización de las funciones del supervisor o apoyo jurídico de la supervisión.

7. Recomendaciones y conclusiones generales de la supervisión sobre el desarrollo del contrato de interventoría.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia


1. INFORMACION GENERAL DE LA OBRA PÚBLICA:

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA PÚBLICA:

Dentro de los programas de mantenimiento de la malla vial como proyecto estratégico por parte de la Secretaría de Infraestructura Física, que busca la recuperación de los corredores viales que sirven de eje para la movilidad de la ciudad, se cuenta con el programa de MANTENIMIENTO MASIVO soportado en el Sistema de Administración Vial (SGVial o SAV), el cual define la metodología de intervención de acuerdo con los criterios técnicos, sociales y económicos. Estas intervenciones van desde la simple corrección de defectos superficiales en la capa de rodadura, hasta la colocación de nuevas carpetas o el reemplazo de las existentes con mezclas de alto modulo en el caso de pavimentos flexibles o de un nuevo pavimento rígido en el caso de las vías en concreto que permitan recuperar su capacidad estructural mediante labores de DEMOLICIÓN Y/O FRESADO Y REPAVIMENTACIÓN.

La aparición de BACHES (conocidos como huecos) en la malla vial de la ciudad, es frecuente, periódico y cada vez más recurrente; ya que la malla vial en un gran porcentaje ya cumplió su vida útil y capacidad de servicio en forma eficiente; además su deterioro es constante debido a múltiples factores externos como son: el aumento del volumen vehicular, perdida de la capacidad estructural, construcción de brechas de servicios públicos, construcción de domiciliares y obras de entidades externas, empozamientos de agua, entre otras; que conllevan a la malla vial a un deterioro progresivo que se ve reflejado en la aparición de baches (huecos), razón por la cual la Secretaría de Infraestructura Física, debe velar por la atención de manera diligente en la reparación de los mismos, mitigando el riesgo en la movilidad vehicular y el daño antijurídico.

1.2. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA:

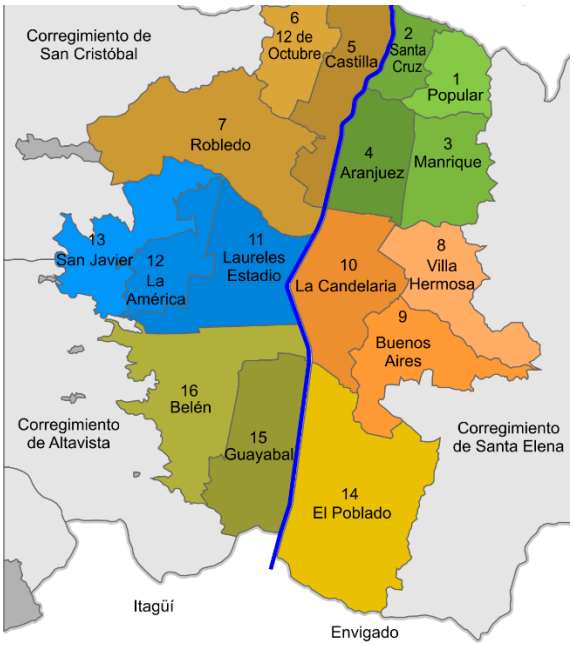

1.3. INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS CONTRATOS:

1.3.1. CONTRATO DE OBRA:

NÚMERO DEL CONTRATO:	4600098664 de 2023.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO MECAMED 2023 CONFORMADO POR MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI S.A.S IDENTIFICADO CON NIT: 811.038.634-6 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 70% Y CASTELLÓN INGENIERIA S.A.S CON NIT 900.944.024-2 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 30%, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR SEBASTIAN HINESTROZA ARANGO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA Nro. 1.017.127.069.
CÉDULA O NIT:	901.735.873-6
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	SEBASTIAN HINESTROZA ARANGO
DIRECCIÓN CONTRACTUAL:	Carrera 35ª 15B – 35 Edificio Prisma of 817
TELÉFONOS DE CONTACTO:	3116628
EMAIL:	licitaciones.megaproyectovial@gmail.com
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO:	10/7/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES SIN SUPERAR LA VIGENCIA
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023
AMPLIACIONES A LA FECHA:	Ampliación 1: Por el término de VEINTICINCO (25) DÍAS, contados a partir del primero (01) de enero de 2024, hasta el veinticinco (25) de enero de 2024, ambas fechas inclusive
SUSPENSIONES A LA FECHA	N.A
PLAZO ACTUAL:	6,5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	25/01/2024
VALOR INICIAL:	SESENTA Y CINCO MIL VENTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M.L ($65.026.971.827), INCLUIDO AIU, EQUIVALENTES A 56.057 SMLMV PARA EL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 2023
ADICIONES A LA FECHA:	N.A

VALOR ACTUAL:	SESENTA Y CINCO MIL VENTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M.L ($65.026.971.827), INCLUIDO AIU, EQUIVALENTES A 56.057 SMLMV PARA EL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 2023
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	CERO PESOS ML ($ 0)

1.3.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

NÚMERO DEL CONTRATO:	4600098732 DE 2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DE COLOMBIA NIT: 901-728-399-7 conformado por: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. NIT. 800.173.768-1 PORCENTAJE DE PARTICIPACION: 50% GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S. NIT. 830.010.109-8 PORCENTAJE DE PARTICIPACION: 50%
CÉDULA O NIT:	37.084.026
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	SARAH DEL MAR SANSON TORRES
DIRECCIÓN CONTRACTUAL:	AV. CRA. 28 Nº 37-38
TELÉFONOS DE CONTACTO:	(1) 2442900
EMAIL:	kevin.gomez@grupoarca.com.co
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO:	08/07/2023
PLAZO INICIAL:	195 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2023
AMPLIACIONES A LA FECHA:	Ampliación 1: Por el término de VEINTICINCO (25) DÍAS, contados a partir del primero (01) de enero de 2024, hasta el veinticinco (25) de enero de 2024, ambas fechas inclusive
SUSPENSIONES A LA FECHA	N.A
PLAZO ACTUAL:	202 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	25/01/2024
VALOR INICIAL:	DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS

	OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ML ($2.964.988.326) IVA INCLUIDO.
ADICIONES A LA FECHA:	ADICIÓN 1: POR VALOR DE CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($150.000.000) IVA INCLUIDO, CORRESPONDIENTE AL 5,06% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO
VALOR ACTUAL:	TRES MIL CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ML ($3.114.988.326) IVA INCLUIDO.
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	CERO PESOS ML ($ 0)

1.4. PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA Y DE LA SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR TÉCNICO PRINCIPAL	Gustavo Alonso Arenas Zapata
SUPERVISOR TÉCNICO SUPLENTE	Cesar Augusto Laverde Santana
APOYO JURIDICO SUPERVISION	Gloria Cristina Tabares Lopez
APOYO FINANCIERO SUPERVISION	José Julián Yepes Piedrahita
OTROS APOYOS A LA SUPERVISION	James Estiven Echeverri Gaviria
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Marcy Alejandra Correa Castaño
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Juan Camilo Diaz Villareal (reemplazo Juan José Bermúdez Ramírez en periodo de incapacidad)
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	José Luis Guzmán Arteaga
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Cristian David Correa Alvarado
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Cristóbal Segundo Correa Llorente
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Jairo Geovenni Ortiz
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Carlos Andrés Forero Anaya
RESIDENTE DE ADMINISTRATIVO	Lilia Margarita Bermúdez Ramírez
RESIDENTE DE ADMINISTRATIVO	Laura Marcela Muñoz Marín
PROFESIONAL AMBIENTAL	María Dianni Rentería Lozano
PROFESIONAL AMBIENTAL	Alexandra Bejarano Benavides
PROFESIONAL SOCIAL	Luisa Fernanda Ceballos González
PROFESIONAL SOCIAL	Tatiana Arias Parra
PROFESIONAL SOCIAL	Paula Andrea Ospina Uribe
PROFESIONAL SOCIAL	María del Carmen Carvajal Pedroza
PROFESIONAL SST	Julián Arango Salas
PROFESIONAL SST	Yira Lemus Gómez
TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO	Diana Paola Páez Velásquez

TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO	Blanca Patricia Gómez Gómez (Reemplazo a Angela María Aristizábal Giraldo desde el 25 de octubre)
TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO	Sebastián Solano Ledesma
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	Oscar Hernando Coutin Lema
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	Luis Andrés Vargas Jaramillo
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	Martha Gladis López Varela
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	Catalina María Castillo Montoya
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	Adriana Marcela Henao Villaneda
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	Alejandra Janeth Arango Betancur
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	Henry León Lopera Gallego
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	James Sneider Taborda Henao
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	Paulo Andrés Montoya Vélez
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	David Esteban Álvarez Avendaño
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	German David Toro Mesa
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	Carolina Hoyos Arbeláez
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	Mateo Palacio Villa
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	Diego Ignacio Corral Gonzales
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	Jonny Alexander Angulo Gómez
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	Manuela Guerra Sánchez
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	Juan David Castañeda Mena
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	David Santiago Gálvez Correa
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	Alexis Yamid Marín López
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	Oscar Luis Moreno
TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	Yamileth Patricia Herrera Campuzano

2. INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

2.1. CONTROL DE EJECUCIÓN:

2.1.1. RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN
Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el contrato, incluyendo sus anexos.	Cumple	La interventoría ha velado por el cumplimiento de las obligaciones del contratista de la obra, disponiendo de un equipo de profesionales que supervisan la ejecución del contrato de obra desde el componente técnico, financiero y jurídico. .

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN
Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad vigente para la realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de construcción definan y aprobar las debidas certificaciones a que haya lugar.	Cumple	La interventoría ha verificado y avalado el cumplimiento de las normas y especificaciones del Instituto Nacional de Vías, INVIAS; en los certificados de calidad de la emulsión asfáltica, en las densidades y porcentajes de compactación de núcleos extraídos en campo, en las fórmulas de trabajo de las diferentes plantas que suministran la mezcla asfáltica, PAVIMENTOS ABURRÁ, PAVIMENTAR S.A, PROCOPAL S.A y en la calidad de las mezclas asfálticas suministradas a través de los ensayos diarios realizados por el laboratorio externo INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S. Además, se ha realizado control en campo de las temperaturas de las mezclas.
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los estudios previos, pliego de condiciones, anexo técnico y la oferta presentada a la Entidad contratante.	Cumple	Para garantizar que la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada se realice de acuerdo a lo estipulado en los estudios previos, pliego de condiciones, anexo técnico y la oferta presentada, la interventoría ha dispuesto de 21 tecnólogos en obras civiles, uno por cada frente de trabajo, 3 tecnólogos administrativos, además cuenta con 6 residentes de interventoría, 4 profesionales sociales, 2 profesionales ambientales, 1 profesional especialista en tránsito y transporte, 2 profesionales SST, 2 residentes administrativos y un director encargado de coordinar la supervisión del contrato de obra por parte de la interventoría desde el componente técnico, financiero y jurídico.
Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, y dar la	Cumple	El inicio en la ejecución del contrato fue el 08 de julio de 2023, y a partir de ese momento la interventoría viene realizando la vigilancia a la ejecución del contrato

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN
orden de inicio al contratista de obra.		disponiendo de 21 tecnólogos en obras civiles, uno por cada frente de trabajo, 3 tecnólogos administrativos, además cuenta con 6 residentes de interventoría, 4 profesionales sociales, 2 profesionales ambientales, 1 profesional especialista en tránsito y transporte, 2 profesionales SST, 2 residentes administrativos y un director encargado de coordinar la supervisión del contrato de obra por parte de la interventoría desde el componente técnico, financiero y jurídico.
Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los estudios previos, pliego de condiciones, en el contrato celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles seguimiento durante la ejecución del contrato y verificar su cumplimiento.	Cumple	La interventoría ha velado por el cumplimiento de las condiciones técnicas en los diferentes frentes de obra, disponiendo de 21 tecnólogos en obras civiles, uno por cada frente de trabajo, 3 tecnólogos administrativos, además cuenta con 6 residentes de interventoría, 4 profesionales sociales, 2 profesionales ambientales, 1 profesional especialista en tránsito y transporte, 2 profesionales SST, 2 residentes administrativos y un director encargado de coordinar la supervisión del contrato de obra por parte de la interventoría desde el componente técnico, financiero y jurídico.
Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la ejecución del contrato, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente.	Cumple	La interventoría ha velado por el cumplimiento de las normas y especificaciones del Instituto Nacional de Vías, INVIAS; en los certificados de calidad de la emulsión asfáltica CRL 01, en las densidades y porcentajes de compactación de núcleos extraídos en campo, en las fórmulas de trabajo de las diferentes plantas que suministran la mezcla asfáltica, PAVIMENTOS ABURRÁ, PAVIMENTAR S.A, PROCOPAL S.A y en la calidad de las mezclas asfálticas suministradas a través de los ensayos diarios realizados por el laboratorio externo INTEINSA

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN
		PAVIMENTOS S.A.S. Además, se ha realizado control en campo de las temperaturas de las mezclas. Además, la interventoría a revisado y avalado las licencias ambientales de las plantas que suministran la mezcla asfáltica y los diseños presentados para las rehabilitaciones de las vías.
Informar a la Entidad contratante sobre cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o sobre sus obligaciones.	Cumple	Hasta el momento la interventoría no ha manifestado a la Entidad contratante de reclamaciones que puedan tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente contrato.	Cumple	La interventoría mediante radicado No CONSVICO-INT/ALCMED297-GER-017-23 dio viabilidad de la cesión del contrato Nro. 4600098664 de 2023 siendo el CONSORCIO CONSTRUCCIONES C-2023, con NIT No. 901.725.373-2, cedente y el Consorcio MECAMED 2023 el cesionario, mediante modificación Nro. 1 del contrato aprobada el 25 de julio de 2023; el contrato inicial fue cedido a CONSORCIO MECAMED 2023.
Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.	Cumple	Hasta el momento la Entidad no ha recibido ningún comunicado por parte de la interventoría donde manifieste que existen circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución del contrato.
Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del Contrato.	Cumple	Hasta el momento no se ha presentado ningún incumplimiento e inconveniente en el desarrollo de los contratos de obra e interventoría.

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN
No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento.	Cumple	Hasta el momento no se ha detenido la ejecución del contrato.
Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando cumplan con lo requerido	Cumple	Hasta el momento no se ha rechazado por parte de la interventoría, la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando cumplan con lo requerido.
Evaluar previamente a la finalización del contrato de obra, los trabajos, bienes y/o servicios contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas, con el fin de que sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual.	Cumple	La interventoría realiza la evaluación en tiempo real de las obras contratadas por la entidad, y hasta el momento no ha requerido al contratista para subsanar deficiencias que se hayan identificado en los frentes de obra que cuentan con presencia constante de un tecnólogo en construcción de la interventoría.
Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo a especificaciones técnicas y cantidades definidas contractualmente	Cumple	La ejecución de la obra se verifica en cada uno de los frentes con los tecnólogos dispuestos por la interventoría y el contratista, realizando recibos de cantidades de obra ejecutada con cortes mensuales, haciendo un control de las cantidades contractual por medio de balances de avance semanal del contrato que son entregados por la interventoría en los comités de obra.
Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de pago, las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato	Cumple	La interventoría elaboró, suscribió y presentó ante la entidad, el acta de pago del mes de noviembre, la cual fue aprobada para pago por parte de la supervisión.

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN
Proyectar y validar el acta de liquidación del contrato de obra y revisar la información necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o el que defina la ley, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, dejando trazabilidad de la misma en el expediente contractual.	N/A	El contrato se encuentra en ejecución.
Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o jurídicas que se presenten durante la ejecución de los contratos o convenios, asumiendo una posición imparcial en la interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación pueda modificar el contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión.	Cumple	Se ha recibido por parte de la interventoría un acompañamiento técnico permanente en los diferentes frentes del contrato, financiero en la revisión de las actas de obra del contratista y jurídico en la revisión de las pólizas presentadas por el contratista, y paz y salvo del contratista en salarios y prestaciones sociales. Además de acompañamiento para responder al contratista sus requerimientos técnicos, financieros y jurídicos.
Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista, en lo que al área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, presupuestal o jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes correspondientes sobre los incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además sustentar si deben o no iniciarse trámites	Cumple	La interventoría realiza una vigilancia técnica, financiera y jurídica al contrato de obra, garantizando el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Hasta la fecha de elaboración de este informe no se han presentado incumplimientos contractuales por parte de la interventoría del contrato que requieran iniciar un proceso sancionatorio o la imposición de multas.

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN
sancionatorios o el ejercicio de cláusulas excepcionales.		
Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione.	Cumple	La interventoría ha realizado el seguimiento en la atención oportuna por parte del contratista de las PQRS que se derivan de presuntos daños ocasionados sobre la ejecución de los diferentes mantenimientos que son objeto del contrato.
Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las solicitudes de modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a ello haya lugar. En ambos casos, las solicitudes deberán estar justificada, para ser aprobadas por la Secretaría de Infraestructura Física y la Secretaría de Suministros y Servicios.	Cumple	La interventoría mediante radicado Nro. CONSVICO-INT/ALCMED297-GER-017-23 dio viabilidad de la cesión del contrato Nro. 4600098664 de 2023 siendo el CONSORCIO CONSTRUCCIONES C-2023, con NIT No. 901.725.373-2, cedente y el Consorcio MECAMED 2023 el cesionario, mediante modificación Nro. 1 del contrato aprobada el 25 de julio de 2023; el contrato inicial fue cedido a CONSORCIO MECAMED 2023. El 26 de septiembre de 2023 se aprobó el OTROSÍ NRO. 1 del contrato de interventoría, disminución del plazo (meses) de los profesionales en el presupuesto del contrato y redistribución de recursos por valor de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L ($153.787.385), distribuidos así: CIENTO VEINTISEIS MILLONES DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L ($126.012.785) INCLUIDO IVA para pago de costos directos de personal. VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/L

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN
		($27.774.600) IVA INCLUIDO para pago de otros costos directos.
Verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito de Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio de la obra.	Cumple	La interventoría ha realizado la verificación del uso adecuado del uniforme por parte del personal del contratista de obra; que los identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito de Medellín.
Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el avance de los contratos de obra e interventoría.	Cumple	La interventoría presentó el informe del mes de noviembre con los respectivos anexos que dan cuenta del avance del contrato de obra.
Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde conste el cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena	Cumple	La interventoría realizó la verificación mensual de la certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal, donde conste el cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar y parafiscales.

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN
cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003.		
Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal del contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso	Cumple	La interventoría verificó el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal del contratista de obra.
Revisar mensualmente la afiliación y pago por parte del contratista de todo el personal a nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de incumplimiento exigir los correctivos.	Cumple	La interventoría realizó durante el período del presente informe, la revisión de la afiliación y pago por parte del contratista de todo el personal a nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta
Cumplir con el pago oportuno de salarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. Bajo ninguna circunstancia el personal tendrá vinculación alguna con el Distrito de Medellín o con cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el contratista, será exclusivamente contra éste; en consecuencia, el Distrito no será llamado a responder por ninguna de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA.	Cumple	La interventoría presentó las planillas de pago de seguridad social, nomina, y auxilios a los profesionales que la conforman.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN
Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga.	Cumple	Para el período de elaboración de este informe, la interventoría ha cumplido con los requerimientos realizados por la Entidad contratante.
Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las de sus subcontratistas o dependientes.	NA	No se han presentado reclamaciones de terceros derivadas de las actuaciones del contratista, sobre las cuales se hayan requerido recomendaciones por parte de la interventoría.
Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de obra al Distrito de Medellín y recomendar, motivadamente, la solución que corresponda.	Cumple	Hasta el momento de elaboración de este informe no se han presentado reclamaciones contractuales por parte del contratista de obra.
Mantener indemne al Distrito de Medellín frente a cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato.	Cumple	Para el período de elaboración de este informe, no se han presentado reclamaciones derivadas del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato.
Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.	Cumple	Para el período de elaboración del presente informe, la interventoría ha dado respuesta oportuna a las observaciones y requerimientos realizados por la supervisión.
Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los costos de éstas.	Cumple	La interventoría realizó la gestión de ajuste de las pólizas a la fecha de inicio del contrato y presentó para aprobación de la supervisión, las hojas de vida de los profesionales que van a apoyar la supervisión del contrato de obra.

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN
Mediar, conceptuar o discernir e informar al Distrito de Medellín, a través de la supervisión, sobre cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del Distrito de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes.	Cumple	Para el período de elaboración de este informe no se presentó ningún conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y/o cualquier otro hecho que pueda afectar la seguridad de las obras o del Distrito de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes.
Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.	Cumple	La Entidad no ha sido informada hasta el momento de la existencia de una inhabilidad e incompatibilidad de acuerdo con lo previsto en la constitución y la ley.
Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que cumpla las normas nacionales y municipales en materia de archivo.	Cumple	La interventoría presentó los informes de avance del contrato de obra con los respectivos anexos que pasan hacer parte del expediente del contrato.
Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información confidencial del Distrito de Medellín, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de	Cumple	Para el período de elaboración de este informe no se ha presentado la divulgación por parte de la interventoría o del contratista de información que haya sido como clasificada como confidencial del contrato.

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN
lo señalado en los artículos 196 y 200 del Código de Comercio Colombiano.		
Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar.	Cumple	Tanto el contratista de obra como de interventoría ajustaron las pólizas contractuales a la fecha de inicio de vigencia de los contratos.
Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista de obra, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para los riesgos de Anticipo (cuando aplique) y Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007.	-	Debido a que el contrato se encuentra en ejecución, aún no aplica el cumplimiento de esta obligación por parte de la interventoría.
El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Cumple	La interventoría cuenta con 2 profesionales SST, encargados de velar por el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El contratista deberá presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.	Cumple	La interventoría cuenta con 2 profesionales SST, encargados de verificar el certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por la ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y el respectivo plan de mejoramiento.

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN
Cumplir con los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo para empresas según la resolución 0312 de 2019, de acuerdo con el riesgo máximo definido en el presupuesto para los profesionales. Y verificar que el contratista de obra de cumplimiento a los mismos.	Cumple	La interventoría cuenta con 2 profesionales SST, encargados de verificar el Cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo para empresas según la resolución 0312 de 2019, de acuerdo con el riesgo máximo definido en el presupuesto para los profesionales. Y verificar que el contratista de obra de cumplimiento a los mismos.
Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de auditorías internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los aspectos técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de auditoría interna serán de uso reservado de la Secretaria de Evaluación y Control, el ordenador del gasto y señor Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoría interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de la información.	-	Para el período de elaboración de este informe, el contrato no ha sido objeto de auditoría.
Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al contratista en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato de obra: Análisis de precios	Cumple	La interventoría realizó la revisión de los APU, ajuste de las pólizas al contrato e inició de vigencia, RUT, cronograma de inversión y hojas de vida de los profesionales del contratista con la respectiva afiliación y del PASAO, PMT y compromiso anticorrupción del contratista.

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN
unitarios en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de factor prestacional, garantías exigidas en el contrato, certificación del contador público o revisor donde se especifique la característica tributaria, programa de trabajo de inversión, listado del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema integral de seguridad social, plan de acción socio ambiental en obra PASAO, compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando aplique.		
Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya lugar de acuerdo a lo pactado contractualmente con el contratista de obra.	Cumple	La fórmula de reajustes del contrato de obra fue definida contractualmente, y se ha aplicado a las actas de obra teniendo en cuenta los índices de Camacol del periodo del acta que se está reajustando.
Verificar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de contratista de obra, los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica necesaria para aprobar las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que periódicamente prepara el contratista de obra.	Cumple	La interventoría concilió con el contratista, las cantidades de obra y demás documentación técnica necesaria para aprobar las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro para el período de noviembre de 2023.
Verificar que el contratista de obra presente el formato debidamente diligenciado de actualización del Sistema de Gestión del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema	N/A	Debido a que el formato de actualización del Sistema de administración vial (SAV) se presenta cuando finalizan las obras, aún no ha sido presentado este formato por parte de la interventoría porque el contrato está en ejecución.

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN
de administración vial (SAV) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos establecidos en los documentos del proceso.		
Recibir, revisar y aprobar los planos record del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura Física como prerrequisito para liquidar el contrato de obra.	N/A	Esta obligación está orientada a la liquidación del contrato, pero el contrato actualmente se encuentra en ejecución por lo cual no aplica para este período el cumplimiento de la misma por parte de la interventoría.
Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra (cronograma) y aprobar las modificaciones necesarias, incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales.	Cumple	La interventoría realiza un seguimiento semanal al avance del contrato el cual presenta en los comités de obra.
Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor. Si el contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito durante los primeros cinco días calendario después de dada la orden.	Cumple	Para el período de elaboración de este informe, la interventoría ha cumplido con las solicitudes realizadas por la supervisión.
Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez suscrita el acta de inicio y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo	Cumple	Para el período de elaboración de este informe la interventoría presenta a la supervisión un seguimiento semanal al cumplimiento del cronograma de obra.

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN
con las órdenes y recomendaciones de la Supervisión.		
Verificar en el contrato de obra las actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a las contenidas en el presupuesto inicial y los análisis de precios unitarios y cantidades a ejecutar relacionadas con ellas y aprobar su alcance y contenido.	-	Para el período de elaboración de este informe no se han identificado por parte de la interventoría la necesidad de incluir obras adicionales o extras, diferentes a las contenidas en el presupuesto inicial y los análisis de precios unitarios.
Validar las propuestas de variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, o a las especificaciones técnicas del contrato de obra.	-	Para la fecha de elaboración de este informe no se han presentado propuestas de variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, o a las especificaciones técnicas del contrato de obra.
Revisar en el contrato de obra la aprobación del permiso de instalación de las vallas y verificar su instalación y condiciones de uso en el sitio indicado y aprobado por el Distrito de Medellín	Cumple	La interventoría realiza la verificación del cumplimiento de las disposiciones contempladas para la implementación de la guía socio-ambiental.
Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio de Inversión Ambiental del Proyecto.	Cumple	La interventoría realiza la verificación del cumplimiento de las disposiciones contempladas para la implementación de la guía socio-ambiental.
Comprobar el suministro de los servicios públicos y el sistema de comunicaciones para los campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la construcción de la obra.	Cumple	La interventoría verificó la entrega por parte de contratistas de una llave autorizada por EPM para el uso del agua de los hidrantes, las paletas de pare y siga, además del control de los equipos y herramientas usadas en la obra, la señalización y vallas con la información contractual.
Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones técnicas y	Cumple	La interventoría cuenta con un profesional especialista en tránsito y transporte encargado de verificar la presentación e

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN
normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito de Medellín.		implementación del Plan de Manejo de Tránsito PMT.
Aprobar y realizar seguimiento en el contrato de obra a la implementación del PASAO (plan de acción socio ambiental de obra)	Cumple	La interventoría cuenta con un profesional ambiental encargado de la aprobación y seguimiento del PASAO presentado por el contratista de obra.
Validar las actas de vecindad que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras.	Cumple	La interventoría acompaña con personal técnico la suscripción y cierre de las actas de vecindad por parte del contratista.
Validar las actas de entorno que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras.	Cumple	La interventoría acompaña con personal técnico la suscripción y cierre de las actas de entorno por parte del contratista.
Aprobar la utilización de maquinaria e insumos no previstos y que se requieran y verificar que el contratista de obra mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para la ejecución del contrato.	Cumple	Para el período de elaboración de este informe no se ha requerido la utilización de maquinaria e insumos no previstos. Sin embargo, se ha verificado por parte de la interventoría, que el contratista de obra mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para la ejecución del contrato.
Verificar que el contratista de obra mantenga en condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo y las instalaciones y que realice las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren sido afectados con la construcción de las obras.	Cumple	La interventoría del contrato verificó que el contratista de obra usara lonas para evitar afectar el espacio público y sumideros durante la aplicación de emulsión y mezcla asfáltica, además de la recolección de los escombros y cierres de las actas de entorno en las que se garantiza que el espacio público aferente a las intervenciones realizadas quedó en iguales o mejores condiciones a las encontradas en el momento del inicio de las obras,

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN
Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones de atenuación correspondientes.	N/A	Para el período de elaboración del presente informe, no se ha materializado ninguno de los riesgos contemplados en los documentos contractuales.
Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, del personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida deberá revisar previo a someterse a la aprobación.	Cumple	La interventoría verificó que, durante el presente período, el contratista dispusiera del personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida fueron revisadas por la misma. Mientras que la Entidad contratante verificó que los profesionales de la interventoría cumplen con lo establecido en los pliegos de condiciones, revisando las hojas de vida de los mismos.
Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento.	Cumple	La interventoría cuenta con personal calificado que cumple con los requisitos académicos y de experiencia solicitados por la Entidad.
Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los	Cumple	La interventoría ha dispuesto de personal en todos los frentes de obra que garantizan la calidad de las obras de

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN
cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos con miras a la seguridad y al avance del contrato.		mantenimiento que son objeto del contrato.
Tener o instalar previo al inicio del contrato, una Sede en la ciudad de Medellín o en cualquiera de los Distritos del Área Metropolitana, con capacidad administrativa y financiera suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión.	Cumple	La interventoría cuenta con una oficina en la ciudad ubicada en la carrera 55 No 40ª 20 oficina 1112 desde la cual se manejan los componentes, administrativo y financiero derivados de la ejecución del contrato, y con capacidad de decisión.
Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Supervisión.	Cumple	La interventoría ha realizado la entrega diaria, semanal y mensual de los informes solicitados por la supervisión, en los formatos requeridos por la Entidad.
Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen durante la ejecución del contrato.	Cumple	La interventoría presentó la información durante el período de elaboración de este informe en los formatos de calidad dispuestos por la Entidad.
Conceptuar sobre la solicitud de autorización de los subcontratos que pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de la misma.	Cumple	La interventoría mediante radicado Nro. CONSVICO-INT/ALCMED297-GER-010-23 avalo los subcontratos con CONCRETOS Y ASFALTOS S. A con NIT 890.929.951-7 y CONSTRUCCIONES RJ JHOA S.A.S con NIT 900.615.830-1, y posterior aprobación de la subcontratación

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN
		por parte del ordenador del gasto mediante radicado Nro. 202330287267 del 14 de julio de 2023. La interventoría mediante radicado Nro. CONSVICO INT/ALCMED297- GER-022-23 del 1 de agosto de 2023 avalo los subcontratos con CONCRETOS Y ASFALTOS (CONASFALTOS) S.A con NIT 890.929.951-7, CONSTRUCCIONES R.J. JHOA S.A.S con NIT 900.615.830-1 y MINCIVIL S.A con NIT 890.930.545-1, y posterior aprobación de la subcontratación por parte del ordenador del gasto mediante radicado Nro. 202330319631 del 8 de agosto de 2023.
Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del contrato.	Cumple	La interventoría ha programado reuniones semanales en las cuales se realiza un seguimiento al avance del contrato de obra desde el componente técnico, ambiental, social, SST y comunicacional.
Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente convocada.	Cumple	La interventoría ha participado de las reuniones en las que ha sido requerida por parte de la Entidad.
Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.	Cumple	La interventoría durante el periodo del presente informe cumple con el número de trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje.
Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra cumpla con todos los criterios	Cumple	La interventoría durante el periodo de elaboración de este informe cumplió con los criterios que le otorgaron puntaje.

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN
por los cuales se le otorgó puntaje en la calificación de la oferta.		
Velar por la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), cuando de ellas se recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan dichos residuos de las obras civiles o de otras actividades conexas.	Cumple	La interventoría cuenta con un profesional ambiental encargado de velar por el cumplimiento de la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD).
Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género y para ello el contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal vinculado a la interventoría sea femenino y el diez por ciento (10%) sean jóvenes entre 18 y 28.	Cumple	El contratista cumple con los porcentajes de contratación de personal femenino y jóvenes entre 18 y 28 vinculados a la interventoría.
Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a tres	CUMPLE	El personal clave fue aprobado por la supervisión del contrato teniendo en cuenta los requisitos descriptos en la matriz 4- información del personal clave evaluable, además de los requisitos adicionales por los cuales se haya asignado puntaje. Para el mes de noviembre, se presenta variación en el personal clave, debido a que el residente, Juan José Bermúdez fue incapacitado y debió ser reemplazado,

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN
(3) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la "Matriz 4-Información del personal clave evaluable" y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.		además se presentó el cambio de un tecnólogo en construcción que renunció, el detalle se puede observar en el numeral 1.4.
Incorporar como mínimo el porcentaje definido por la entidad de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.	CUMPLE	La interventoría cuenta con un 100% de personal colombiano.

2.1.2. RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN FRENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Debe elaborar un cuadro, en donde se especifique para cada una de las obligaciones del supervisor, las actividades a través de las cuales le da cumplimiento, complementadas con sus análisis, observaciones y/o conclusiones.

OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES
Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.	Cumple	Durante el período del presente informe, la supervisión desarrolló las actividades y funciones acorde a lo establecido en los documentos del proceso de contratación.
Asignar la supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato.	Cumple	Se designó la supervisión técnica del contrato a través de oficio del 6 de julio de 2023, acompañada de un apoyo jurídico, apoyo financiero, ambiental y social. El

OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES
		03 de agosto se modificó la designación con relación al supervisor suplente del contrato.
Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las especificaciones técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto.	Cumple	La supervisión realiza un seguimiento a través de los informes diarios, semanales y mensuales presentados por la interventoría del cumplimiento del objeto del contrato y de la disposición de profesionales de la interventoría en los diferentes frentes de trabajo para que realicen la vigilancia del cumplimiento de las especificaciones técnicas, además de visitas conjuntas con la interventoría de los frentes de trabajo.
Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de Supervisión e interventoría del Distrito de Medellín y la normatividad contractual vigente.	Cumple	La supervisión del contrato se está realizando acorde con lo dispuesto en la guía de Supervisión e interventoría del Distrito de Medellín y la normatividad contractual vigente.
Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.	Cumple	La supervisión verificó los aportes al Sistema de Seguridad Social por cada uno de los profesionales que hacen parte de la interventoría.
Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el desarrollo del contrato.	Cumple	La supervisión compartió con el contratista la información disponible del alcance del contrato, de los reportes de huecos que ingresan a la Entidad a través de la aplicación ReportesMed aceptados después de una visita al lugar por parte de

OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES
		los inspectores de pavimentos con los que cuenta la Secretaría de Infraestructura Física, además de los formatos de calidad y disposiciones del manual de identidad de la Entidad.
Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la cláusula 8 del contrato.	Cumple	La supervisión verificó las planillas de pago de nómina, seguridad social, y demás costos del contrato asociados a gastos demostrables y comprobables.
Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado.	Cumple	La supervisión asistió a los comités de obra semanales programados por la interventoría para el seguimiento del contrato.
Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.	Cumple	La supervisión dio una respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por la interventoría.
Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato.	N/A	Para el período de elaboración de este informe no fue necesario llamar en Garantía al contratista, ni a las compañías aseguradoras.
Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación.	Cumple	La interventoría mediante radicado Nro. CONSVICO-INT/ALCMED297-GER-017-23 dio viabilidad de la solicitud de modificación del contrato de obra, cesión del contrato Nro. 4600098664 de 2023 siendo el CONSORCIO CONSTRUCCIONES C-2023, con NIT Nro. 901.725.373-2, cedente y el Consorcio MECAMED 2023 el cesionario. Mediante modificación Nro. 1 del contrato aprobada el 25 de julio de 2023; el contrato inicial fue

OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES
		cedido a CONSORCIO MECAMED 2023.
Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato.	Cumple	La supervisión ha realizado las gestiones requeridas para dar respuesta a las solicitudes realizadas por la interventoría por medio de oficios dirigidos a la Entidad, además de compartir a la interventoría los formatos de calidad requeridos para la presentación de la información del contrato.
El Distrito de Medellín, podrá en cualquier momento, ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a ampliaciones de plazo.	N/A	Para el período de elaboración del presente informe no se presentó ninguna situación que requiriera ordenar por parte de la supervisión, una suspensión del contrato.
Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del Distrito.	Cumple	La supervisión apoyó los trámites que requerían concepto por parte de otras Secretarías.
Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago.	Cumple	La supervisión revisó los documentos presentados por la interventoría para aprobación del pago del mes de noviembre de 2023
Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización por la Supervisión.	Cumple	La interventoría acordó con el contratista las cantidades de obra ejecutadas en el mes de noviembre de 2023, al igual que los reajustes del acta de acuerdo con los índices de Camacol.
Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de interventoría mantenga en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que	Cumple	La interventoría durante el periodo del presente informe cumple con el número de trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES
dio lugar a la obtención del puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicho concepto.		
Liquidar el Contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato que vigila; por vencimiento de plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma.	N/A	Esta obligación aún no se puede realizar porque el contrato está en ejecución.
Brindar acompañamiento en la implementación de los protocolos de Bioseguridad al comienzo del contrato y durante el desarrollo de las actividades contractuales.	N/A	
Verificar al contratista el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015.	Cumple	La interventoría cuenta con una profesional SST, encargada de verificar el cumplimiento de los lineamientos definidos en la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015.

3. INFORME SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

La interventoría realizó seguimiento y acompañamiento a las actividades ambientales, sociales y de SST inherentes al contrato de construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada, expuestas en los siguientes numerales

3.1. INFORME SOCIAL:

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL.

ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS

- Seguimiento al cierre de los derechos de petición generados por daño o perjuicio a terceros relacionados con las actuaciones del contratista y/o de las de sus

subcontratistas o dependientes, de los cuales se recibieron 3 en el periodo de diciembre, para un total de 23 a lo largo de la ejecución contractual. De las cuales se han atendido 15.

- Socialización puerta a puerta y entrega de circulares a la comunidad donde se les informa los detalles del contrato, ubicación y fecha de las intervenciones a realizar en la malla vial.
- Diligenciamiento de las actas de entorno en los diferentes frentes de obra para un total de 119 actas de entorno generadas en lo que va de ejecución contractual, de las cuales 1 fue generada durante el periodo de diciembre.
- Seguimiento a los programas de la gestión social en obra contemplados en el PASAO.
- Verificación de la disposición e instalación de las vallas tijeras en cada uno de los frentes e instalación de imantados con la información del contrato en la maquinaria.
- Revisión de presentaciones a realizar en las reuniones y e-card de convocatoria, y acompañamiento de la socialización y entrega de circulares en las siguientes direcciones durante el periodo de diciembre:

SOCIALIZACIONES Y CIRCULARES DICIEMBRE 2023					
Nro.	FECHA	DIRECCIÓN	FRENTE DE OBRA	CONSECUTIVO CIRCULAR	CIRCULARES IMPRESAS
1	5/12/2023	Calle 112 con carrera 63, Toscana.	12	Genérica	25
2	12/12/2023	Calle 104 Nro. 45 - 55, Villa del Socorro.	22	Genérica	20
3	14/12/2023	PMT La Iguana, entre carreras 77D y 80A calzada descendente del túnel de occidente.	21	PMT	25
4	14/12/2023	PMT Autopista sur, carrera 50 entre calle 14 y puente de la 4 sur.	15	PMT	25
5	15/12/2023	PMT La Mañonga, calzada descendente. Carrera 80 con carrera 65B, Facultad de Minas.	7	PMT	20
6	20/12/2023	Calle 118 entre carreras 92 y 100, Altavista.	1	134	30
7	21/12/2023	Carrera 67 entre calles 92 y 93, Castilla.	13	Genérica	20
TOTAL DE CIRCULARES ENTREGADAS					165

3.1.2. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN CON RELACIÓN A LAS LABORES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE SOCIAL DE SU CONTRATO Y EN LA VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

- Al identificar alguna situación relevante por parte del equipo social en los predios aledaños al desarrollo de las obras, se solicita informar de manera inmediata al personal técnico del proyecto, con el fin de que tomen acciones preventivas ante estas situaciones.
- Las actas de vecindad se realizan antes de iniciar los tramos de obra de alcance masivo y se hace el cierre al finalizar las intervenciones, por parte de la supervisión técnica del contrato se solicita que las actas de entorno sean cerradas por lo menos dos días después de finalizadas las intervenciones y con pares y resaltos señalizado, así sea en pintura acrílica.
- Las estrategias comunicativas utilizadas para este proyecto han sido muy asertivas en las relaciones con la comunidad, ya que permite recibir información de primera mano, en un momento oportuno que les permite prepararse según sus necesidades.
- Las jornadas de socialización se realizan 1 o 2 días antes del inicio de las obras, permitiendo a los ciudadanos coordinar actividades del día siguiente, referente al ruido que se puede generar por el desarrollo de las obras, el retiro de los vehículos estacionados sobre la vía pública, igualmente se aprovecha esta actividad para identificar aspectos importantes del sector o de la comunidad que se deban tener presentes para el desarrollo.
- En los comités de obra semanales se realiza seguimiento a la gestión y novedades en el componente social.



3.2. INFORME AMBIENTAL:

3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL.

- Aprobación y seguimiento en el contrato de obra a la implementación del componente ambiental del PASAO (plan de acción socio ambiental de obra).
- Control al cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio de Inversión Ambiental del Proyecto.
- Validación de las actas de vecindad que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras.
- Validación de las actas de entorno que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras.
- Verificación de las condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo y las instalaciones.
- Velación de la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), cuando de ellas se recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan dichos residuos de las obras civiles o de otras actividades conexas.
- Para este periodo se reporta por parte de la interventoría un total dispuesto de residuos sólidos de 154,7 Kg para disposición final, discriminados así:

CONSOLIDADO RESIDUOS SOLIDOS (Kg)					
PERIODO	PELIGROSOS	NO APROVECHABLES	APROVECHABLES	ORGANICOS	TOTAL (Kg)
Diciembre	68,7	42	44	0	154,7

- La interventoría también ha realizado seguimiento a los residuos aprovechables, como el material demolido con fresadora de las vías, el cual se usa para la producción de mezcla con RAP (Reclaimed Asphalt Pavement).

RELACIÓN DEPÓSITO DE MATERIAL FRESADO		
PERIODO	DEPÓSITO	VOLUMEN
Noviembre	Acopio la 30	2072
	La Iguaná	84
	Mincivil	14
	Conasfaltos	969,5
	Pavimentar	268,19
Diciembre	Acopio la 30	686
	Conasfaltos	112
Total (m3)		4205,69

- La interventoría verificó la vigencia y cumplimiento de normatividad referente a análisis de gases, revisión técnico-mecánica, pólizas y hoja de vida de los mantenimientos de la maquinaria y vehículos usados por el contratista.
- La interventoría vigiló el manejo que el contratista le está dando al material particulado, ruido, olores, aguas residuales de los baños portátiles y sustancias químicas en los frentes de obra.
- La interventoría hizo seguimiento a las capacitaciones e inducciones realizadas por el contratista a los trabajadores de los diferentes frentes de obra.
- La interventoría realizó seguimiento a los incidentes de la obra.
- La interventoría vigiló la protección de los sumideros.
- Revisión de la documentación de automotores y maquinaria de los frentes de obra activos.
- Verificación de la vigencia del permiso otorgado por EPM para la conexión a hidrantes.
- Socialización del PASAO en los diferentes frentes de obra.
- Verificación de entrega de tapa oídos a la comunidad, como medida de mitigación al ruido generado por los frentes de trabajo.
- Las profesionales Ambientales de la interventoría ejercieron un rol veedor, en el acompañamiento en los diferentes frentes de obra, en los horarios diurnos y nocturnos, para realizar la supervisión y control de todas las actividades ejecutadas por el contratista, para mitigar los impactos ambientales generados en las actividades de los frentes de obra del proyecto.
- Se realizó seguimiento a la implementación de la señalización establecida en el PMT general y PMTs específicos del contrato.
- La interventoría realizó seguimiento y control al proceso de la inversión socioambiental al contrato, con la revisión de memorias, verificación de ítems e inspección en campo.
- Realizó actividades de capacitación a nivel interno, con los colaboradores de la interventoría con la finalidad de afianzar las competencias del personal en temáticas ambientales, se hizo énfasis en el manejo de los residuos sólidos, ahorro de agua y energía.

3.2.2. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN CON RELACIÓN A LAS LABORES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE SU CONTRATO Y EN LA VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

- Durante los recorridos y/o visitas conjuntas entre contratista e interventoría, se recomienda que la interventoría realice al contratista, todas las recomendaciones que considere necesarias para garantizar un óptimo cumplimiento de la gestión ambiental del proyecto; y que realicen un seguimiento al cumplimiento de las mismas.

- Para este periodo se reporta, el desarrollo de un comité ambiental, el 15 de diciembre de 2023, con participación de los profesionales ambientales del Contratista y de las de interventoría.

- Se presenta tabla con seguimiento y monitoreo realizado por parte de la interventoría a los indicadores ambientales:

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES	EVALUACIÓN
Gestión ambiental contractual	100
Manejo de residuos sólidos	94
Manejo de residuos especiales de construcción	94
Control de emisiones atmosféricas	88
Uso y almacenamiento de materiales de construcción	100
Protección del suelo	89
Manejo de las sustancias peligrosas	75
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	83
Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes	95
Gestión de la fauna y flora	100
Ahorro y uso eficiente de agua y energía	100
Manejo de campamentos e instalaciones temporales	76
CALIFICACIÓN OBTENIDA	***89%***

3.3. INFORME DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

La interventoría deberá verificar y garantizar que el contratista cumpla con la normatividad y requisitos legales vigentes asociados a la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de las obras.

3.3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

- Verificación de la entrega y uso del uniforme del Distrito y elementos de protección personal por parte de los trabajadores.
- Verificación del cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal del contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso.
- Revisión de la afiliación y pago por parte del contratista de todo el personal a nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de incumplimiento exigir los correctivos.
- Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluación que aporte el contratista.
- Planeación de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso.

- Verificación de las inducciones realizadas por el contratista al personal que ingresa a los diferentes frentes de trabajo.
- Verificación de la señalización, demarcación y cerramiento del área de trabajo.
- Seguimiento de asistencia y ausentismo.
- Verificó el cumplimiento del contratista en la divulgación y capacitación de todo el personal que ingresa en el reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Verificó el cumplimiento en la realización de los exámenes de ingreso para el personal nuevo y periódicos para el personal que lleva más de un año de contrato con los subcontratistas.
- Verificó que todo el personal SST realizara el diligenciamiento de los formatos de inspección y preoperacionales establecidos para verificar el estado de los equipos, maquinas, herramientas y recursos de emergencia.
- Realizó seguimiento a los incidentes y accidentes de trabajo en los diferentes frentes de obra.
- Verificó el cumplimiento de las condiciones mínimas de bioseguridad y dotar los frentes de trabajo con unidades sanitarias.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

La supervisión para hacerle seguimiento al programa de salud y seguridad en el trabajo – SST de la interventoría, debe diligenciar el siguiente formato:

	VERIFICACIÓN MENSUAL DE REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA INTERVENTORÍA DE OBRA		
Nombre del contrato o convenio con la SIF:	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4600098732 DE 2023, INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA.**	**Nombre del Contratista**	**CONSORCIO VIAS DE COLOMBIA**
Objeto de contrato:	EL OBJETO DEL CONTRATO ES CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA.		

Verificación previa ingreso del trabajador	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**	**PLAN DE ACCION (Cuando no cumple o cumple parcialmente)**
	SI	**NO**	**NA**		**DESCRIPCION**
Todos los trabajadores del contratista se encuentran afilados al Sistema de Seguridad Social, en la clase de riesgo que corresponda.	5				
En caso de ejecutar tareas de alto riesgo (Alturas, Soldadura, espacios confinados) se cuenta con la certificación de competencias del personal para ejecutar dicha actividad Nota: En el caso de alturas, la entidad/persona natural que expide el certificado debe contar con resolución aprobada y expedidas por el ministerio.			5	NO SE REALIZAN TRABAJOS DE ALTO RIESGO	
Se evidencia entrega y Uso de elementos de protección personal en las tareas a ejecutar, solicitar registro de entrega.	5				

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Verificación de ejecución del contrato					
Se realiza oportunamente el reporte, la investigación de los accidentes y casi accidentes de trabajo conforme a la Resolución 1401 de 2007, define y monitorea los planes de acción	5				
Cuenta con personal formado en SST según las especificaciones del contrato y la resolución 0312 de 2019.	5				
Se consolidan indicadores de ausentismo, accidentalidad y mortales durante la ejecución de la obra y se evidencia en los informes mensuales.	5				
En la oficina de la interventoría se cuenta con señalización, rutas de evacuación, botiquín de primeros auxilios y extintor.	5				
Tareas de Alto Riesgo - Tareas criticas					
Se tienen los procedimientos y los permisos para tareas de alto riesgo y/o criticas identificadas visibles y diligenciados acorde con las tareas rutinarias y no rutinarias			5	NO SE REALIZAN TRABAJOS DE ALTO RIESGO, POR LO TANTO, NO SE TIENE PROCEDIMIENTOS	
Actividades post retiro de personal					
Se presentan paz y salvo de salarios, liquidaciones y prestaciones sociales del personal	5				
Fecha de creación 31/12/2023					

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

3.3.2. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN CON RELACIÓN A LAS LABORES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE SU CONTRATO Y EN LA VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

En las visitas de campo y seguimiento que realiza la supervisión a la interventoría se observa un buen manejo del componente de salud y seguridad en el trabajo, en el cual se destacan, la realización de inspecciones periódicas de los elementos de emergencias y equipos, orden en los frentes de trabajo durante y después de terminadas las labores, revisión de la seguridad social de los trabajadores del contratista, vigilancia en el uso de los elementos de protección personal, capacitación del personal, y cumplimiento del protocolo de bioseguridad.

4. INFORME ADMINISTRATIVO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

4.1. CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA ASOCIADO AL PROYECTO (ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO) Y DE SU PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Durante el mes de **diciembre de 2023**, el contratista de interventoría ha empleado el siguiente personal:

Nombre	Periodo de Cotización	N° Planilla	Salario	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
HENAO VILLANEDA ADRIANA MARCELA	DICIEMBRE	73578922	$ 3.430.831	$ 137.300	$ 549.000	$ 238.800	$ 925.100
ARANGO BETANCUR ALEJANDRA JANETH	DICIEMBRE	73578922	$ 3.312.526	$ 132.600	$ 530.100	$ 230.600	$ 893.300
BEJARANO BENAVIDES ALEXANDRA	DICIEMBRE	73578922	$ 5.189.600	$ 207.600	$ 830.400	$ 361.200	$ 1.399.200
MARIN LOPEZ ALEXIS YAMID	DICIEMBRE	73578922	$ 3.541.249	$ 141.700	$ 566.600	$ 246.500	$ 954.800
GOMEZ GOMEZ BLANCA PATRICIA	DICIEMBRE	73578922	$ 2.965.500	$ 118.700	$ 474.500	$ 72.200	$ 665.400
HOYOS ARBELAEZ CAROLINA	DICIEMBRE	73578922	$ 3.604.976	$ 144.200	$ 576.800	$ 251.000	$ 972.000
CASTILLO MONTOYA CATALINA MARIA	DICIEMBRE	73578922	$ 4.594.632	$ 183.800	$ 735.200	$ 319.800	$ 1.238.800
CORREA ALVARADO CRISTIAN DAVID	DICIEMBRE	73578922	$ 6.171.900	$ 246.900	$ 987.600	$ 429.600	$ 1.664.100
CORREA LLORENTE CRISTOBAL SEGUNDO	DICIEMBRE	73578922	$ 6.171.900	$ 246.900	$ 987.600	$ 429.600	$ 1.664.100
ALVAREZ AVENDAÑO DAVID ESTEBAN	DICIEMBRE	73578922	$ 3.044.370	$ 121.800	$ 487.100	$ 211.900	$ 820.800
GALVEZ CORREA DAVID SANTIAGO	DICIEMBRE	73578922	$ 4.284.202	$ 171.400	$ 685.500	$ 298.200	$ 1.155.100
CORRAL GONZALEZ DIEGO IGNACIO	DICIEMBRE	73578922	$ 3.478.153	$ 139.200	$ 556.600	$ 242.100	$ 937.900
TORO MESA GERMAN DAVID	DICIEMBRE	73578922	$ 4.674.764	$ 187.000	$ 748.000	$ 325.400	$ 1.260.400
LOPERA GALLEGO HENRY LEON	DICIEMBRE	73578922	$ 4.142.867	$ 165.800	$ 662.900	$ 288.400	$ 1.117.100
TABORDA HENAO JAMES SNEIDER	DICIEMBRE	73578922	$ 3.762.084	$ 150.500	$ 602.000	$ 261.900	$ 1.014.400

Nombre	Periodo de Cotización	N° Planilla	Salario	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
ANGULO GOMEZ JONNY ALEXANDER	DICIEMBRE	73578922	$ 3.427.361	$ 137.100	$ 548.500	$ 238.600	$ 924.200
GUZMAN ARTEAGA JOSE LUIS	DICIEMBRE	73578922	$ 6.171.900	$ 246.900	$ 987.600	$ 429.600	$ 1.664.100
CASTAÑEDA MENA JUAN DAVID	DICIEMBRE	73578922	$ 3.233.657	$ 129.400	$ 517.400	$ 225.100	$ 871.900
BERMUDEZ RAMIREZ JUAN JOSE	DICIEMBRE	73578922	$ 4.114.806	$ 164.700	$ 658.500	$ -	$ 823.200
ARANGO SALAS JULIAN	DICIEMBRE	73578922	$ 5.189.600	$ 207.600	$ 830.400	$ 361.200	$ 1.399.200
BERMUDEZ RAMIREZ LILIA MARGARITA	DICIEMBRE	73578922	$ 6.171.900	$ 246.900	$ 987.600	$ 150.400	$ 1.384.900
VARGAS JARAMILLO LUIS ANDRES	DICIEMBRE	73578922	$ 4.129.618	$ 165.200	$ 660.800	$ 287.500	$ 1.113.500
CEBALLOS GONZALEZ LUISA FERNANDA	DICIEMBRE	73578922	$ 5.189.600	$ 207.600	$ 830.400	$ 361.200	$ 1.399.200
GUERRA SANCHEZ MANUELA	DICIEMBRE	73578922	$ 3.443.450	$ 137.800	$ 551.000	$ 239.700	$ 928.500
RENTERIA LOZANO MARIA DIANNI	DICIEMBRE	73578922	$ 5.189.600	$ 207.600	$ 830.400	$ 361.200	$ 1.399.200
CARVAJAL PEDROZA MARIANA DEL CARMEN	DICIEMBRE	73578922	$ 5.189.600	$ 207.600	$ 830.400	$ 361.200	$ 1.399.200
LOPEZ VARELA MARTHA GLADIS	DICIEMBRE	73578922	$ 3.683.214	$ 147.400	$ 589.400	$ 256.400	$ 993.200
PALACIO VILLA MATEO	DICIEMBRE	73578922	$ 4.110.057	$ 164.500	$ 657.700	$ 286.100	$ 1.108.300
COUTIN LEMA OSCAR HERNANDO	DICIEMBRE	73578922	$ 3.280.979	$ 131.300	$ 525.000	$ 228.400	$ 884.700
MORENO ARENAS OSCAR LUIS	DICIEMBRE	73578922	$ 3.513.802	$ 140.600		$ 244.600	$ 385.200
OSPINA URIBE PAULA ANDREA	DICIEMBRE	73578922	$ 5.189.600	$ 207.600	$ 830.400	$ 361.200	$ 1.399.200
MONTOYA VELEZ PAULO ANDRES	DICIEMBRE	73578922	$ 3.691.101	$ 147.700	$ 590.600	$ 257.000	$ 995.300
SOLANO LEDESMA SEBASTIAN	DICIEMBRE	73578922	$ 2.965.500	$ 118.700	$ 474.500	$ 72.300	$ 665.500
ARIAS PARRA TATIANA	DICIEMBRE	73578922	$ 5.189.600	$ 207.600	$ 830.400	$ 361.200	$ 1.399.200
HERRERA CAMPUZANO YAMILETH PATRICIA	DICIEMBRE	73578922	$ 3.301.485	$ 132.100	$ 528.300	$ 229.800	$ 890.200
ORTIZ JAIRO GEOVENNI	DICIEMBRE	73346823	$ 7.918.400	$ 316.800	$ 1.267.000	$ 551.200	$ 2.135.000
DIAZ VILLARREAL JUAN CAMILO	DICIEMBRE	73347052	$ 6.500.000	$ 260.000	$ 1.040.000	$ 452.400	$ 1.752.400
CORREA CASTAÑO MARCY ALEJANDRA	DICIEMBRE	7906310214	$ 7.413.700	$ 296.600	$ 1.260.400	$ 516.000	$ 2.073.000
FORERO ANAYA CARLOS ANDRES	DICIEMBRE	7906308460	$ 6.171.900	$ 246.900	$ 1.049.400	$ 429.600	$ 1.725.900
MUÑOZ MARIN LAURA MARCELA	DICIEMBRE	7906312111	$ 6.171.900	$ 246.600	$ 1.049.400	$ 429.600	$ 1.725.600
PAEZ VELASQUEZ DIANA PAOLA	DICIEMBRE	7906308406	$ 2.965.500	$ 118.700	$ 474.500	$ 206.400	$ 799.600
LEMUS GOMEZ YIRA	DICIEMBRE	7906308406	$ 5.189.600	$ 207.600	$ 882.400	$ 361.200	$ 1.451.200

Certificado del revisor fiscal o representante legal:

Certificación de que el contratista se encuentra al día en el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) del personal vinculado al contrato

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
28/12/2023	Desde 01/12/2023 Hasta 28/12/2023	Diego Orlando Santiago Ruiz T.P 277364-T Revisor Fiscal
28/12/2023	Desde 01/12/2023 Hasta 28/12/2023	David Perdomo Bonilla T.P 91814-T Revisor Fiscal
26/12/2023	Desde 01/12/2023 Hasta 26/12/2023	Carlos Alberto Mayorca Almeida T.P 74455-T Revisor Fiscal

4.2. INFORME DE LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y SU MITIGACIÓN:

A la fecha no se ha materializado ningún riesgo.


4.3. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA:

4.4. La correspondencia cruzada entre la entidad, la interventoría y otras entidades se anexa al presente informe.


4.5. EVALUACIÓN EN SAP DE LOS CONTRATISTAS (INTERVENTORÍA Y OBRA):

Contrato interventoría

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

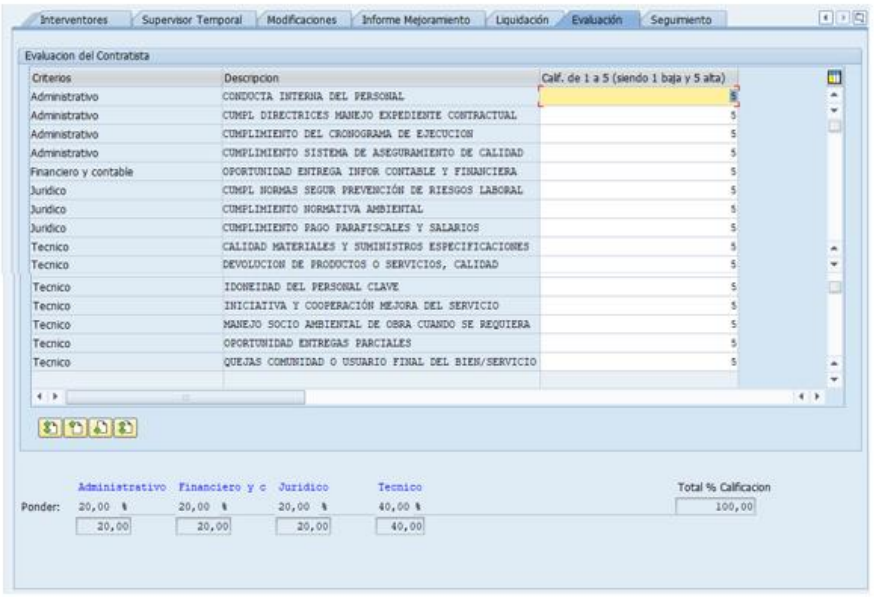

Contrato de obra

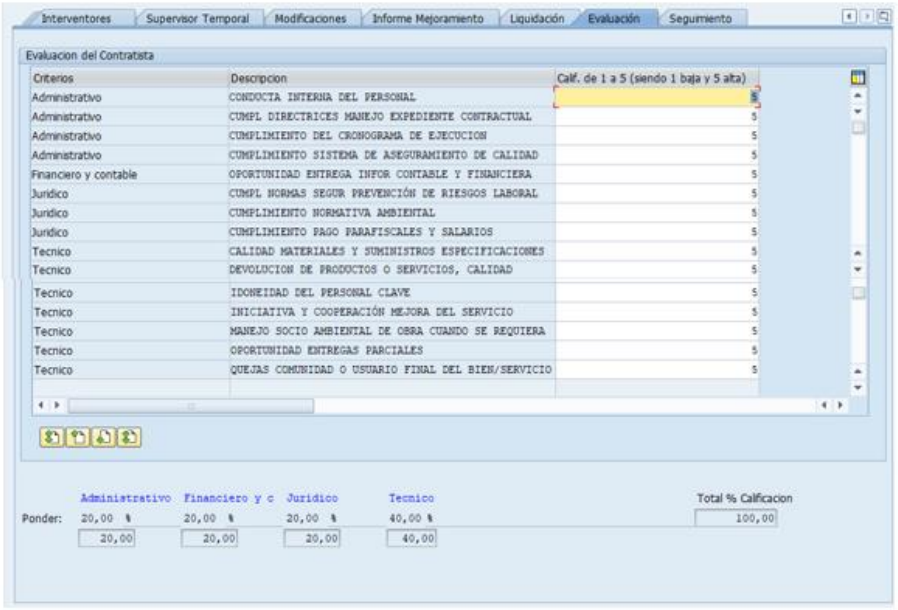

5. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

5.1. DESCRIPCIÓN DE DATOS GENERALES REGISTRADOS EN SAP:

En SAP se encuentra publicado el contrato, las pólizas y la relación de imputación del gasto del contrato de interventoría.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- **Relación de la Imputación del gasto**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	74100000	2320202008	200027	4000113890	20005172	5200005181
110000223	74100000	2320202008	200027	4000115692	20005190	5200005216

- **Relación de los pagos realizados**

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
5200005181	FCVC-1	22/08/2023	5000711271	$ 281.910.097
5200005181	FCVC-1	22/08/2023	5000711271	$ 4.984.543
5200005181	FCVC-2	18/09/2023	5000713968	$ 498.145.663
5200005181	FCVC-3	17/10/2023	5000716237	$ 500.616.442
5200005181	FCVC-4	14/11/2023	5000718737	$ 495.900.657
5200005181	FCVC-5	20/12/2023	5000724900	$ 483.983.689
5200005181	FCVC-6	20/12/2023	5000724901	$ 240.502.733
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA				**$ 2.506.043.824**

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600098732	5200005181	204	Infraestruc.Fisica	200027	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MEDELLIN	$ 2.964.988.326	$ 2.506.043.824	$ 458.944.502
4600098732	5200005216	204	Infraestruc.Fisica	200027	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MEDELLIN	$ 150.000.000	$ 0	$ 150.000.000

5.2. RELACIÓN DE PAGOS Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (SI APLICA) DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

No aplica, el contrato no contó con anticipo.

5.3. CONTROL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO Y DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (SI APLICA):

En este contrato no se pactó anticipo.

5.4. RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	$ 42.134.302,00
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	$ 10.533.575,00
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 21.067.150,00
Ret.impto.renta Contr Consultoría FM 2%	$ 37.296.626,00
Ret.renta construcción 2.0%	$ 4.837.676,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$ 4.212.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 59.899.317,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 27.387.295,00
Total	$ 207.367.941,00

5.5. DESCRIPCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN:

El apoyo financiero y contable de la supervisión revisa todas las actas de obra derivadas del contrato de interventoría, modificaciones (ampliación adición, redistribución, APU´s), informes parciales y actas de cambio.

6. INFORME JURÍDICO:

6.1. RELACIÓN DE RECLAMACIONES:

Relatar en forma clara y completa las reclamaciones, controversias y acuerdos entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y la interventoría, teniendo presente el concepto de la reclamación, trámite adelantado, cuantía. Cada uno de ellos, con los análisis, observaciones y conclusiones de la supervisión.

No se ha presentado ninguna reclamación, controversia o acuerdos entre las partes a la fecha del presente informe.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

6.2. RELACIÓN DE SANCIONES:

Relatar en forma clara y completa las multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, a la fecha impuestas a la interventoría, con la verificación del pago o descuento cuando sean de índole pecuniaria y con la identificación de los actos administrativos mediante los cuales se impuso tal sanción; cada uno de ellos, con los análisis, observaciones y conclusiones de la supervisión

A la fecha del presente informe no se ha impuesto ninguna multa, sanción, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento al contratista y no se ha adelantado proceso administrativo sancionatorio.

6.3. RELACIÓN HALLAZGOS DE AUDITORÍAS REALIZADAS A LOS CONTRATOS (INTERVENTORÍA Y OBRA) Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEFINIDAS PARA SU CORRECCIÓN.

Para el período que comprende el presente informe, el contrato no ha sido auditado.

6.4. CONTROL AL ESTADO DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Cuadros que dan cuenta de las condiciones iniciales y el estado de todas y cada una de las coberturas que amparan a la entidad, relacionadas con la ejecución del contrato de interventoría.

LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO						
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
SEGUROS DEL ESTADO	15-44-101282129 Anexo 0	Calidad	16/01/2024	16/01/2029	06/07/2023	$ 296.498.832.60
		Cumplimiento	04/07/2023	16/07/2024		$ 296.498.832.60
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	04/07/2023	16/01/2027		$ 148.249.416.30
ACTUALIZADA AL INICIO DE EJECUCIÓN						
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
SEGUROS DEL ESTADO	15-44-101282129	Calidad	20/01/2024	20/01/2029	08/09/2023	$ 296.498.832.60

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	Anexo 2	Cumplimiento	08/07/2023	20/07/2024		$ 296.498.832.60
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	08/07/2023	20/01/2027		$ 148.249.416.30

6.5. DESCRIPCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL SUPERVISOR O APOYO JURÍDICO:

Las actividades realizadas por el apoyo jurídico a la supervisión del contrato de interventoría consisten en la revisión desde el componente jurídico de las modificaciones del contrato, redistribuciones, pólizas e informes realizados por la supervisión al contrato de interventoría.

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

La interventoría ha cumplido con las obligaciones contenidas en los documentos contractuales.

Atentamente,

GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA
Supervisor
Fecha de elaboración: 19 de abril de 2024
