SGC-CP-16326-24
Neiva, abril 30 de 2024

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM
Ciudad

Ref.: Contrato de interventoría No.437 de 2023
Asunto: Informe de interventoría No.5

Cordial saludo.

En cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de la referencia, se hace entrega de los documentos correspondientes al periodo del 01 al 31 de marzo de 2024, los cuales contiene lo siguiente:

1. Informe interventoría No.5
2. Informes semanales del periodo
3. Acta de comité técnico
4. Correspondencia
5. Seguridad social

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

5

Ingenieria & Construcción

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	5	Periodo comprendido entre el :	1 de marzo de 2024	y el:	31 de marzo de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**Objeto:**	"ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
Contrato Nº:	437 DE 2023	**Contrato Nº:**	423 DE 2023
Contratista:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**Contratista:**	SOFOR INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES	**Plazo Inicial:**	DIEZ (10) MESES
Fecha de Inicio:	NOVIEMBRE 8 DE 2023	**Fecha de Inicio:**	NOVIEMBRE 8 DE 2023
Fecha de Terminación:	SEPTIEMBRE 7 DE 2024	**Fecha de Terminación:**	SEPTIEMBRE 7 DE 2024
Valor Inicial:	$ 152.573.345,00	**Valor Inicial:**	$ 1.505.964.466,00
Valor adicional:	$ -	**Valor adicional:**	
Valor total:	$ 152.573.345,00	**Valor total:**	$ 1.505.964.466,00
Valor pagado:	$ 19.229.353,00	**Valor pagado:**	$ 206.778.825,00
Valor por pagar:	$ 133.343.992,00	**Valor por pagar:**	$ 1.299.185.641,00
Nombre Supervisor:	ING. JAVIER CARDOZO GUTIERREZ	**Nombre interventor:**	ING. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	30/10/2023	22/03/2025	$ 45.772.020,00
Prestaciones sociales	30/10/2023	9/09/2027	$ 15.257.340,00
Calidad del servicio	30/10/2023	12/03/2025	$ 15.257.340,00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	8/11/2023	11/03/2025	$ 301.192.893,20
Pago salarios, prestaciones sociales e ind.	8/11/2023	8/09/2027	$ 150.596.446,60
Calidad y correcto func. bienes y equipos	8/11/2023	11/03/2025	$ 301.192.893,20
Estabilidad y calidad de la obra	8/11/2023	8/09/2029	$ 301.192.893,20
Responsabilidad civil extracontractual	8/11/2023	8/09/2024	$ 348.000.000,00

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial 1	29/12/2023	$ 19.229.353,00
TOTAL		**$ 19.229.353,00**

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial 1		$ 206.778.825,00
TOTAL		**$ 206.778.825,00**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

5

CQ Ingeniería & Construcción

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FÍSICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	25,90%	9,32%	35,22%
% Ejecutado	29,26%	4,33%	33,58%
Diferencia	3,36%	-4,99%	-1,64%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	$ 390.047,48	$ 140.353,00	$ 530.400,49	35,22%
% Ejecutado	$ 440.591,32	$ 65.179,32	$ 505.770,64	33,58%
Diferencia	$ -	$ (75.173,68)	$ (75.173,68)	-1,64%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

En este periodo se ejecutaron actividades de obra en los predios de los siguientes municipios:

Pitalito: Vereda Charguayaco 800m en RNSC El Recreo y vereda El Cedro predio El Cedro se completaron los 2000m de aislamiento; **Paicol:** vereda El Carmen en el predio RNSC Pedregal 1000m; **Aipe** vereda San Isidro predio Guamitos 213m, predio Guacharacas 200m de aislamientoy predio Hospital 200m de aislamiento y en el municipio de **Neiva** se han ejecutado 1.848m de aislamiento en el predio Buenavista de la vereda San Miguel .

2. PERSONAL


CONTRATO DE CONSULTORÍA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL	4		80,00%	0,00%	4
TÉCNICO	1		20,00%	0,00%	1
M.O.N.C			0,00%	0,00%	0
TOTAL	5	0	100,00%	0,00%	5
TOTALES	5		100,00%		


CONTRATO DE OBRA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL		4	0,00%	44,44%	4
TÉCNICO	1	1	11,11%	11,11%	2
M.O.N.C.	3		33,33%	0,00%	3
TOTAL	4	5	44,44%	55,56%	9
TOTALES	9		100,00%		


TIPO DE EMPLEO




GENERACIÓN DE EMPLEO



TIPO DE EMPLEO




GENERACIÓN DE EMPLEO



CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	**5**	CQ Ingenieria & Construcción

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"

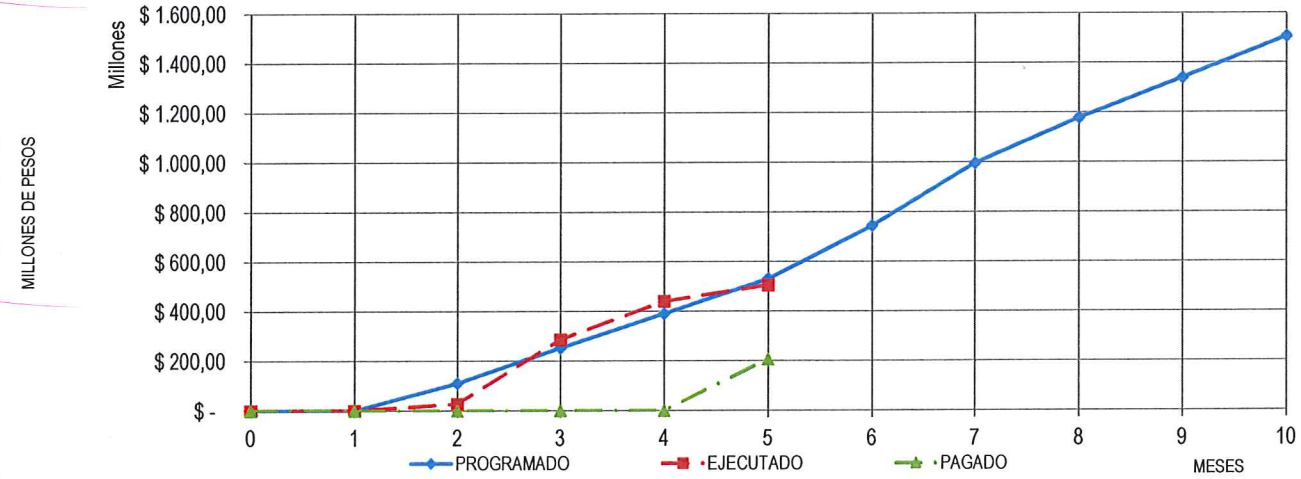

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

El contratista de obra en este periodo entregó la documentacion requerida para el acta parcial 2, la cual se encuentra en revisión para su aprobación e iniciar trámite para pago.
Se continúa en proceso de verificación de los aislamientos terminados y parciales en los diferentes predios. Se realizó reunión con la autoridad del cabildo de Río Negro en el municipio de Iquira, para determinar las áreas para restauración activa faltante ya que a la fecha el contratista ha realizado 3 hectáreas de las 6 contractuales.

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: Federico Pérez Charry **Cargo:** Inspector de Interventoría	**Nombre:** Hermencia Zambrano Serrato **Cargo:** Coordinador de Interventoría	**Nombre:** Carlos Arturo Quiza Camacho **Cargo:** Contratista de Interventoría

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 1

5

Ingenieria & Construcción

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	423 DE 2023	**Contratista:**	SOFOR INGENIERIA SAS
Periodo:	1 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024	**Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Coordinador contratista de obra	ANDRES FELIPE SAAVEDRA	**Coordinador de Interventoria:**	HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
	ITEMS				**$ 1.197.967.119,00**				**$ 350.482.317,00**	**$ 51.848.955,00**	**$ 402.331.273,00**		**$ 795.635.846,00**
1	Aislamiento en zonas de proteccion de la cuenca hidrigrafica del rio Las Ceibas	ML	35.467,00	$ 23.408	$ 830.215.310,00	13.739,00	2.215,00	15.954,00	$ 321.603.974,00	$ 51.848.955,00	$ 373.452.930,00	19.513,00	$ 456.762.380,00
2	Procesos de restauracion activa en areas de conservacion de la zona de reserva forestal (predioos adquiridos y otros) en la cuenca hodrografica del rio Las Ceibas	HA	10,00	$ 7.896.838	$ 78.968.375,00	0,00		0,00				10,00	$ 78.968.375,00
3	Implementar procesos de restauracion activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)	HA	30,00	$ 9.626.114	$ 288.783.434,00	3,00	0,00	3,00	$ 28.878.343,00		$ 28.878.343,00	27,00	$ 259.905.091,00
	TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA				**$ 1.197.967.119,00**				**$ 350.482.317,00**	**$ 51.848.955,00**	**$ 402.331.273,00**		**$ 795.635.846**
	ADMINISTRACION		**10,00%**		$ 119.796.712,00				$ 35.048.232,00	$ 5.184.896,00	$ 40.233.127,00		$ 79.563.585,00
	IMPREVISTOS		**5,00%**		$ 59.898.356,00				$ 17.524.116,00	$ 2.592.448,00	$ 20.116.564,00		$ 39.781.792,00
	UTILIDAD		**9,00%**		$ 107.817.041,00				$ 31.543.409,00	$ 4.666.406,00	$ 36.209.815,00		$ 71.607.226,00
	IVA		**19,00%**		$ 20.485.238,00				$ 5.993.248,00	$ 886.617,00	$ 6.879.865,00		$ 13.605.373,00
	COSTO AIU (24.00%)				**$ 307.997.347,00**				**$ 90.109.005,00**	**$ 13.330.367,00**	**$ 103.439.371,00**		**$ 204.557.976,00**
COSTO TOTAL DE OBRA					**$ 1.505.964.466,00**				**$ 440.591.322,00**	**$ 65.179.322,00**	**$ 505.770.644,00**		**$ 1.000.193.822,00**

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

V/R INICIAL CONTRATO: $ 1.505.964.466,00
V/R ADICIONES: $ 0,00
V/R ACTUAL CONTRATO: **$ 1.505.964.466,00**

V/R ANTICIPO: N/A
% ANTICIPO: 0,00%
% RETEGARANTIA: 0,00%

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta parcial No. 1	FE-96	En proceso	$ 206.778.825,00	$ 0,00	N/A	N/A	$ 206.778.825,00	$ 1.299.185.641,00	13,73%
					$ 0,00	N/A	N/A	$ 0,00	$ 1.299.185.641,00	13,73%
	TOTAL			**$ 206.778.825,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 206.778.825,00**	**$ 1.299.185.641,00**	

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA

V/R INICIAL CONTRATO: $ 152.573.345,00
V/R ADICIONES: $ 0,00
V/R ACTUAL CONTRATO: **$ 152.573.345,00**

V/R ANTICIPO: NA
% ANTICIPO: NA
% RETEGARANTIA: 10,00%

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta parcial No.1	FVE 59	29/12/2023	$ 19.229.353,00	$ 0,00	N/A	N/A	$ 19.229.353,00	$ 133.343.992,00	12,60%
					$ 0,00	N/A	N/A	$ 0,00	$ 133.343.992,00	12,60%
	TOTAL			**$ 19.229.353,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 133.343.992,00**	

cam	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** **ANEXO 2**	5	Ingenieria & Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	SOFOR INGENIERIA SAS	Coordinador de obra:	ANDRES FELIPE SAAVEDRA
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Coordinador Interventoria:	HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO
Fecha del registro fotográfico:	1 de marzo de 2024	al	31 de marzo de 2024

FOTOGRAFÍA No.1	FOTOGRAFÍA No.2	FOTOGRAFÍA No.3
		N.A
REUNION RESGUARDO INDIGENA - RIO NEGRO - IQUIRA	REUNION RESGUARDO INDIGENA - RIO NEGRO - IQUIRA	
FOTOGRAFÍA No.4	**FOTOGRAFÍA No.5**	**FOTOGRAFÍA No.6**
N.A	N.A	N.A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	11-mar-24	PERIODO No.	17	DEL	4/03/2024	AL	10/03/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	437 DE 2023			CONTRATO No.:	423 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (5 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	181			DÍAS POR EJECUTAR	181		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	123	EQUIVALE AL	40,5%	PLAZO TRANSCURRIDO:	123	EQUIVALE AL	40,5%
VALOR INICIAL :	$		152.573.345,00	VALOR INICIAL :	$		1.505.964.466,00
VALOR ADICION(ES):	$		-	VALOR ADICION(ES):	$		-
VALOR ACTUALIZADO:	$		152.573.345,00	VALOR ACTUALIZADO:	$		1.505.964.466,00
VALOR PAGADO:	$		-	VALOR PAGADO:	$		-
VALOR POR PAGAR:	$		152.573.345,00	VALOR POR PAGAR:	$		1.505.964.466,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2023	19/09/2023	0
1	**Aislamiento en zonas de protección de la protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	7/04/2024		no iniciado
2	**Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	14/07/2024		no iniciado
3	**Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)**	7/07/2024		no iniciado

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 451.282.203,49	29,97%	2,35%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 486.643.527,88	32,31%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
ANDRES FELIPE SAAVEDRA	2.236.682	Coordinador
RAMIRO DEVIA GALINDO	93.359.578	Técnico de campo
NICOLAS STEVEN CARDOZO BARRETO	1.110.582.681	Técnico de campo
FERNEY DANILO CASTRO GALINDEZ	1.083.917.582	Técnico de campo
ARIEL ALBEIRO ARIAS SALAS	93.982.899	Técnico de campo
ISABEL TERESA CHAVEZ SAAVEDRA	1.032.363.465	Ingeniera de apoyo
OSCAR HERVEY ARIAS	5.996.146	Ayudante
JHON URIEL MURILLO	93.393.748	Ayudante
JACID CARDOZO	93.371.376	Ayudante

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	4	0,0%	44,4%	4
	TECNICO	1	1	11,1%	11,1%	2
	M.O/N.C	3	0	33,3%	0,0%	3
	TOTALES	**4**	**5**	**44,4%**	**55,6%**	**9**
	TOTAL	**9**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo el contratista continuó avance de aislamiento en los municipios de: **Paicol** predio RNSC Pedregal se ejecutaron 850m de 1000m; **Pitalito** predio RNSC El Recreo se ejecutaron 600m de 800m; **Aipe** predio Guamitos se terminaron 213m de 378m teniendo en cuenta que en dicho predio los metrajes para proteger el nacimiento de agua realmente son los 213m y en el predio Guacharacas se ejecutaron 100m de 200m de aislamiento y **Neiva** vereda San Miguel, predio Buenavista se terminaron 2.009 m de 2.124m, debido a que por las condiciones del terreno no se permite la instalación de postes, evidenciando que se logra aislar totalmente la reserva con dicho metraje.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Los aislamientos terminados están en proceso de verificación por parte de la Interventoría. En la ejecución de los aislamientos para los predios del municipio de Neiva, no se ha logrado mayor avance, debido a que la comunidad no ha querido definir el tema de contratación de mano de obra con el contratista.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



PREDIO EL PEDREGAL - VDA EL CARMEN - PAICOL



EL RECREO - VDA CHARGUAYACO - PITALITO



PREDO BUENAVISTA - SAN MIGUEL - NEIVA



PREDIO GUACHARACAS - VDA SAN ISIDRO - AIPE

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: FEDERICO PÉREZ CHARRY

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	18-mar-24	PERIODO No.	18	DEL	11/03/2024	AL	17/03/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	437 DE 2023			CONTRATO No.:	423 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (5 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	174			DÍAS POR EJECUTAR	174		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	130	EQUIVALE AL	42,8%	PLAZO TRANSCURRIDO:	130	EQUIVALE AL	42,8%
VALOR INICIAL :	$ 152.573.345,00			VALOR INICIAL :	$ 1.505.964.466,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 152.573.345,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.505.964.466,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 152.573.345,00			VALOR POR PAGAR:	$ 1.505.964.466,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2023	19/09/2023	0
1	**Aislamiento en zonas de protección de la protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	7/04/2024		no iniciado
2	**Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	14/07/2024		no iniciado
3	**Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)**	7/07/2024		no iniciado


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 478.462.422,14	31,77%	1,52%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 501.356.693,08	33,29%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
ANDRES FELIPE SAAVEDRA	2.236.682	Coordinador
RAMIRO DEVIA GALINDO	93.359.578	Técnico de campo
NICOLAS STEVEN CARDOZO BARRETO	1.110.582.681	Técnico de campo
FERNEY DANILO CASTRO GALINDEZ	1.083.917.582	Técnico de campo
ARIEL ALBEIRO ARIAS SALAS	93.982.899	Técnico de campo
ISABEL TERESA CHAVEZ SAAVEDRA	1.032.363.465	Ingeniera de apoyo
OSCAR HERVEY ARIAS	5.996.146	Ayudante
JHON URIEL MURILLO	93.393.748	Ayudante
JACID CARDOZO	93.371.376	Ayudante

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	4	0,0%	44,4%	4
	TECNICO	1	1	11,1%	11,1%	2
	M.O/N.C	3	0	33,3%	0,0%	3
	TOTALES	**4**	**5**	**44,4%**	**55,6%**	**9**
	TOTAL	**9**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo el contratista continuó avance de aislamiento en los municipios de: **Paicol** se ejecutaron 1000m de aislamiento predio RNSC Pedregal vereda El Carmen, **Pitalito** se ejecutaron 800m de aislamiento en el predio RNSC El Recreo, **Aipe** predio Hospital se ejecutaron 100m de 200m y en el predio Guacharacas se ejecutaron 150m de 200m de aislamiento.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Los aislamientos terminados están en proceso de verificación por parte de la Interventoría.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



PREDIO EL PEDREGAL - VDA EL CARMEN - PAICOL



EL RECREO - VDA CHARGUAYACO - PITALITO



PREDIO HOSPITAL - VDA SAN ISIDRO - AIPE



PREDIO GUACHARACAS - VDA SAN ISIDRO - AIPE

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: FEDERICO PÉREZ CHARRY

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	25-mar-24	PERIODO No.	19	DEL	18/03/2024	AL	24/03/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	437 DE 2023			CONTRATO No.:	423 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (5 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	167			DÍAS POR EJECUTAR	167		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	137	EQUIVALE AL	45,1%	PLAZO TRANSCURRIDO:	137	EQUIVALE AL	45,1%
VALOR INICIAL :	$		152.573.345,00	VALOR INICIAL :	$		1.505.964.466,00
VALOR ADICION(ES):	$		-	VALOR ADICION(ES):	$		-
VALOR ACTUALIZADO:	$		152.573.345,00	VALOR ACTUALIZADO:	$		1.505.964.466,00
VALOR PAGADO:	$		-	VALOR PAGADO:	$		-
VALOR POR PAGAR:	$		152.573.345,00	VALOR POR PAGAR:	$		1.505.964.466,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2023	19/09/2023	0
1	**Aislamiento en zonas de protección de la protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	7/04/2024		no iniciado
2	**Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	14/07/2024		no iniciado
3	**Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)**	7/07/2024		no iniciado


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 530.400.485,11	35,22%	-1,64%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 505.770.643,05	33,58%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
ANDRES FELIPE SAAVEDRA	2.236.682	Coordinador
RAMIRO DEVIA GALINDO	93.359.578	Técnico de campo
NICOLAS STEVEN CARDOZO BARRETO	1.110.582.681	Técnico de campo
FERNEY DANILO CASTRO GALINDEZ	1.083.917.582	Técnico de campo
ARIEL ALBEIRO ARIAS SALAS	93.982.899	Técnico de campo
ISABEL TERESA CHAVEZ SAAVEDRA	1.032.363.465	Ingeniera de apoyo
OSCAR HERVEY ARIAS	5.996.146	Ayudante
JHON URIEL MURILLO	93.393.748	Ayudante
JACID CARDOZO	93.371.376	Ayudante

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	4	0,0%	44,4%	4
	TECNICO	1	1	11,1%	11,1%	2
	M.O/N.C	3	0	33,3%	0,0%	3
	TOTALES	**4**	**5**	**44,4%**	**55,6%**	**9**
	TOTAL	**9**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo el contratista continuó avance de aislamiento en el municipio de: **Aipe** predio Hospital se tienen 200m terminados y en el predio Guacharacas se tienen 200m de aislamiento terminados.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Los aislamientos terminados están en proceso de verificación por parte de la Interventoría.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



PREDIO HOSPITAL - VDA SAN ISIDRO - AIPE



PREDIO HOSPITAL - VDA SAN ISIDRO - AIPE



PREDIO GUACHARACAS - VDA SAN ISIDRO - AIPE



PREDIO GUACHARACAS - VDA SAN ISIDRO - AIPE

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: FEDERICO PÉREZ CHARRY

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	1-abr-24	PERIODO No.	20	DEL	25/03/2024	AL	31/03/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	437 DE 2023			CONTRATO No.:	423 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (5 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	160			DÍAS POR EJECUTAR	160		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	144	EQUIVALE AL	47,4%	PLAZO TRANSCURRIDO:	144	EQUIVALE AL	47,4%
VALOR INICIAL :	$ 152.573.345,00			VALOR INICIAL :	$ 1.505.964.466,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 152.573.345,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.505.964.466,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 152.573.345,00			VALOR POR PAGAR:	$ 1.505.964.466,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2023	19/09/2023	0
1	**Aislamiento en zonas de protección de la protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	7/04/2024		no iniciado
2	**Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	14/07/2024		no iniciado
3	**Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)**	7/07/2024		no iniciado


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 530.400.485,11	35,22%	-1,64%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 505.770.643,05	33,58%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
ANDRES FELIPE SAAVEDRA	2.236.682	Coordinador
RAMIRO DEVIA GALINDO	93.359.578	Técnico de campo
NICOLAS STEVEN CARDOZO BARRETO	1.110.582.681	Técnico de campo
FERNEY DANILO CASTRO GALINDEZ	1.083.917.582	Técnico de campo
ARIEL ALBEIRO ARIAS SALAS	93.982.899	Técnico de campo
ISABEL TERESA CHAVEZ SAAVEDRA	1.032.363.465	Ingeniera de apoyo
OSCAR HERVEY ARIAS	5.996.146	Ayudante
JHON URIEL MURILLO	93.393.748	Ayudante
JACID CARDOZO	93.371.376	Ayudante

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	4	0,0%	44,4%	4
	TECNICO	1	1	11,1%	11,1%	2
	M.O/N.C	3	0	33,3%	0,0%	3
	TOTALES	**4**	**5**	**44,4%**	**55,6%**	**9**
	TOTAL	**9**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo no se pudieron realizar actividades de obra, por temas religiosos (Semana Santa) la comunidad no realizó actividades en los aislamientos.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Los aislamientos terminados continúan en proceso de verificación por parte de la Interventoría. Se realizó reunión con la autoridad del cabildo de Río Negro en el municipio de Iquira, para determinar las áreas para restauración activa faltante ya que a la fecha se han realizado 3 hectáreas de las 6 contractuales.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



REUNION RESGUARDO INDIGENA - RIO NEGRO - IQUIRA



REUNION RESGUARDO INDIGENA - RIO NEGRO - IQUIRA

N.A

N.A

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: FEDERICO PÉREZ CHARRY


FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

* VoBo SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

ACTA No.9	CONTRATO DE OBRA No.423 DE 2023

PROYECTO: ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM	
CARLOS A. QUIZA CAMACHO (CQ) - Contratista de Interventoría	
LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional apoyo Interventoría	
ISABEL CHAVES (IC) - Profesional apoyo Contratista de Obra	
NICOLÁS CARDOZO BARRETO (NC) - Ingeniero campo Contratista de Obra	



II. OBJETO

Aspectos administrativos, técnicos y recomendaciones generales.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No habían compromisos pendientes.

V. TEMAS TRATADOS

JC informa que el otrosí modificatorio No.1 al contrato de obra por el cambio de predios, se encuentra en proceso de revisión por parte de la oficina jurídica de la Entidad, por lo cual se podría estar definiendo para las próximas semanas.

CQ informa que el contratista de obra continúa con la ejecución de los aislamientos en los siguientes municipios: Paicol predio RNSC Pedregal; Pitalito predio RNSC El Recreo; Aipe predio Guamitos y predio Guacharacas; y Neiva vereda San Miguel, predio Buenavista se ejecutaron 2.009 ml de 2.124 ml, debido a que por las condiciones del terreno no se permite la instalación de postes, evidenciando que se logra aislar totalmente la reserva con dicho metraje. Los aislamientos parciales y terminados se encuentran en proceso de verificación por parte del personal técnico de Interventoría.

NC manifiesta que en la ejecución de los aislamientos para los predios del municipio de Neiva, no se ha logrado mayor avance, solo se ha ejecutado el aislamiento en el predio Buenavista en la vereda San Miguel, debido a que la comunidad no se ha logrado definir el tema de contratación de mano de obra con la comunidad de la zona, por que que el costo solicitado por estos supera el establecido en el contrato y económicamente no sería viable para la empresa.

JC informa que el municipio expidió un comunicado donde consta que los predios son de su propiedad y para garantizar la continuidad del proyecto, autoriza dar la oportunidad a otros grupos asociativos y/o juntas de acción comunal para la realización de las actividades, teniendo en cuenta que con los de la zona no han logrado concretar dicha ejecución. Además, se está gestionando una vez más convocar una reunión con la comunidad para lograr la aceptación de la ejecución conforme a las condiciones que favorezca tanto a la comunidad como al contratista de obra.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DIA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los quince (15) días del mes de marzo de 2024.

¡Cuida tu naturaleza!	ACTA DE REUNIÓN	Código: F-CAM-125 Versión: 2 Fecha: 09 Abr 14

Fecha: 20 / Marzo / 2024 Hora:	
Lugar:. Alcaldía Municipal Santa María - Huila	
Participantes:- Ariel Albeiro Arias - contratista Sofor Ingenieros S.AS. - María Fernanda Alvarez Rodriguez- Interventoría - Johan Sebastián Gonzales - Alcaldía Municipal Santa María. - Yuli Alejandra Hoyos Valencia- Profesional de apoyo- CAM. - Luis Alveiro Suarez - Alcaldía Municipal Santa María	
Elaboró: Yuli Alejandra Hoyos Valencia	Acta N°:

Actividades Desarrolladas y Compromisos

TEMAS	RESPONSABLE
- Se realizó la visita técnica por parte de Interventoría, contratista Sofor y profesional CAM a tres predios identificados como potencial para la implementación de restauración activa, los predios de acuerdo a socialización y visita en campo, los predios si cumplen los criterios para la implementación pero no hay claridad frente a la formalidad de los predios adquiridos por la gobernación.	- Interventoría - Sofor Ingenieros - Alcaldía - CAM.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	PLAZO
- Acercamiento con la gobernación del Huila, para socialización de los predios. (formalización) - Realizar los procesos Jurídicos y administrativos para entrega de los predios adquiridos - Acompañamiento y visitas técnicas que se requieran a los predios involucrados	- Alcaldía - CAM. - Sofor Ingenieros - Interventoría	Mes. Marzo - Abril. 2024

Próxima reunión: Fecha: Hora: : Lugar:

Tema(s) a tratar:

Revisión y avances de la implementación procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo Colombiano.

A las se dio por terminada la reunión, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos.

Johan Sebastián G
1074607628
Alcaldía Municipal.

Secretario de la Reunión
Profesional Apoyo
RNSC - Norte - Centro
CAM

Coordinador S.A.C.

Ariel Albeiro Arias
Tec Sofor Ingenieros
contratista

Insp. Interventoría
Carlos Quiroz

LISTADO DE ASISTENTES	Código:	T-CAM-097
	Versión:	4
	Fecha:	23 Abril de 2019

TEMA: Socialización y visita técnica a predios con potencial para la implementación de procesos de restauración activa

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Equipo Biodiversidad CAM, interventoría, sotor Ingenieros, Alcaldía Municipal Santa María

SITIO DEL EVENTO: Zona urbana y rural

MUNICIPIO: Santa María

FECHA: 20 - 03 - 2024

HORA:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
1	Raúl Albeiro Rojas			93382899	sofor	Tecnico Ibagué		3158359721	soforing e.gmail.com		
2	Maria Fernanda Alvarez		X	1075263752	carlosaura	inge. interv	Neiva	3143479981	mafe.rodri.2392@gmail.com		
3	LUIS ALBEIRO SUAREZ N	X		7704956	Alcaldía	Coordinador JAC.	SANTA MARIA	3125805570	albarro suarez.creac@gmil.com		
4	Gonzalez Melo Sebastian	X		1079607628	Alcaldía	Coordinador Ambiental	Santa Maria	3107583208	gonzalcamelosebastian@gm		
5	Yuli Alejandra Hoyos V.		X	1004266032	CAM	Profesional RNSC	Neiva	3214649302	ingyahoyos7@gmail.com	Si	
6	Dilmer Arias Hermida	X		7733334	CAM	Profesional Biodiversidad	Sta María	3112219360	bradilmer@gmail.com.	Si	

TOTAL ASISTENTES: HOMBRES: _____ MUJERES: _____

SGC-CP-16322-24
Neiva, marzo 09 de 2024

Señores
SOFOR INGENIERÍA S.A.S
R.L GEMBER CARDOZO CRUZ
Contratista de Obra

Ref.: Contrato de obra No.423 de 2023
Asunto: Requerimiento ejecución obra

Cordial saludo.

En el desarrollo de las labores de supervisión y verificación de las actividades de obra ejecutadas a la fecha, se informa lo siguiente:

1. Cualquier cambio en metros lineales en predios de la misma vereda, sean cual sean las condiciones encontradas en cuanto a terreno y/o con los propietarios, antes de proceder a ejecutarlos se debe consultar con la interventoría, que es la que decidirá sobre la aceptación.

2. Es responsabilidad del contratista de obra la validación de los metros lineales de aislamiento antes de ejecutar la actividad, con el propósito de conocer longitudes reales y respetar las condiciones del contrato.

Por lo anterior, se solicita la programación con validación de longitudes de aislamientos a cambiar por predio/municipio; mayores cantidades de obra o de ejecución no serán reconocidas.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

SGC-CP-16324-24
Neiva, marzo 22 de 2024

Señores
SOFOR INGENIERÍA S.A.S
R.L GEMBER CARDOZO CRUZ
Contratista de Obra

Ref.: Contrato de obra No.423 de 2023
Asunto: Citación comité técnico

Cordial saludo.

Se convoca a comité técnico para el día miércoles 03 de abril de 2024 a las 8:00 am, en las instalaciones de la CAM de la ciudad de Neiva, con el fin de tratar aspectos técnicos y avance del contrato de la referencia, fundamental la asistencia del representante legal.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-03	29372779	I	2024-04-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.800	7.400	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	29372779	2024-04-23	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 79142300	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	1.400.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	175.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	406.400	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-03	29372779	I	2024-04-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.800	7.400	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	29372779	2024-04-23	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	224.000	0	4.000	0	228.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	224.000	0	4.000	0	228.000
EPS(Administradoras: 1)				1	175.000	0	3.200	0	178.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	175.000	0	3.200	0	178.200
ARP(Administradoras: 1)				1	7.400	0	200	0	7.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.400	0	200	0	7.600
Gran Total					406.400	0	7.400	0	413.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-04	29513458	E	2024-04-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.333.600	93.900	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
11	29513458	2024-04-23	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7704482	MANCHOLA PERDOMO JORGE HUMBERTO	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
2	CC 36152865	ZAMBRANO SERRATO HERMENCIA	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	1	194.500	S	5711001
3	CC 49609707	DAZA SALGADO LINDSAY VIBED	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.000	280.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5711001
4	CC 1075263752	ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	1.500.000	F																0			27	27	27	27	PROTECCION-230201	1.350.000	216.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.350.000	54.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.350.000	54.000	1.350.000	94.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	418.000	S	5711001
5	CC 1075263752	ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	1.500.000	F																3			3	3	3	3	PROTECCION-230201	150.000	24.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	150.000	6.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	150.000	0	150.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	30.000	S	5711001
6	CC 1075279737	VARGAS OSORIO JUAN FELIPE	1.800.000	F	X	X														0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	1.080.000	172.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.080.000	43.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.125.000	45.000	1.080.000	75.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	336.200	S	5711001
7	CC 1077865950	BARRERA PALENCIA FABIAN LEONARDO	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
8	CC 1077873357	PAREJO PEREZ VICTOR ALFONSO	2.500.000	F		X														0			13	13	13	13	COLPENSION ES-25-14	1.083.334	173.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.083.334	43.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.333.334	53.400	1.083.334	75.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	345.700	S	5711001
9	CC 1077873867	NARVAEZ RAMIREZ LAURA DANIELA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
10	CC 1080291745	SUAREZ MINU ANDERSON	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.000	280.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5711001
11	CC 1081516568	SUAREZ ORTIZ LIDA VANESSA	2.000.000	F		X														0			2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	133.334	21.400	0	0	SANITAS-EPS005	133.334	5.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	227.778	9.200	133.334	9.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	45.300	S	5711001
12	CC 1121917315	LUNA PINZON JULIAN RICARDO	4.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.000.000	640.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	4.000.000	160.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.000.000	160.000	4.000.000	278.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.238.400	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-04	29513458	E	2024-04-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.333.600	93.900	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	29513458	2024-04-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
16.296.668	17.596.668	17.596.668	17.986.112	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				10	2.607.600	0	46.700	0	2.654.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	194.800	0	3.500	0	198.300
PROTECCION	230201	800229739	0	4	932.800	0	16.700	0	949.500
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.480.000	0	26.500	0	1.506.500
EPS(Administradoras: 3)				11	704.000	0	12.700	0	716.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	373.400	0	6.700	0	380.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	160.000	0	2.900	0	162.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	170.600	0	3.100	0	173.700
ARP(Administradoras: 1)				11	1.214.500	0	21.700	0	1.236.200
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	11	1.214.500	0	21.700	0	1.236.200
CCF(Administradoras: 1)				11	713.600	0	12.800	0	726.400
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	11	713.600	0	12.800	0	726.400
Gran Total					5.239.700	0	93.900	0	5.333.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000		CQUIZA@SINCOLTDA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-04	29665390	E	2024-04-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.607.600	28.600	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	29665390	2024-04-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 7729413	GUTIERREZ QUIROGA DIEGO FERNEY	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
2	CC 12118071	PEREZ CHARRY FEDERICO	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5711001
3	CC 12124063	TRIVIÑO PEREZ JOSE LIZARDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000		CQUIZA@SINCOLTDA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-04	29665390	E	2024-04-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.607.600	28.600	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	29665390	2024-04-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	816.000	0	14.700	0	830.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	608.000	0	10.900	0	618.900
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	3.800	0	211.800
EPS(Administradoras: 2)				3	204.000	0	3.800	0	207.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	152.000	0	2.800	0	154.800

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	52.000	0	1.000	0	53.000
ARP(Administradoras: 1)				3	355.000	0	6.400	0	361.400
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	3	355.000	0	6.400	0	361.400
CCF(Administradoras: 1)				3	204.000	0	3.700	0	207.700
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	3	204.000	0	3.700	0	207.700
Gran Total					1.579.000	0	28.600	0	1.607.600

ASOPAGOS s.a.
PAGADO
