CONTRATO DE OBRA No. 0423 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA "CAM" Y SOFOR INGENIEROS SAS

INFORME NO.5 CONTRATO 0423 DE 2023

ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LAS SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORESTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

SOFOR INGENIEROS SAS

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA

ABRIL 2024

Sector C Casa 49 Vereda Santa Teresa – Ibagué (Tolima) Correo electrónico: soforing@gmail.com
Celular: 3162669405 Web: www.soforingenieros.com

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3

2.1 Localización geográfica. 3

2.2 Información General del Contrato 3

3. OBJETIVO DEL INFORME 4

4. ALCANCE DEL INFORME 4

6. RELACIÓN DE OTROSÍ MODIFICATORIO 4

6.1 Relación y estado de pólizas de garantías 5

7. RELACIÓN DE PERSONAL, VEHÍCULOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 5

7.1 Vehículos. 5

7.2 Equipo y herramientas 6

7.3 Personal del contrato 6

8. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 5 DE OBRA DEL PROYECTO 7

8.1 INSTALACIÓN DE AISLAMIENTOS EN PREDIOS EN LA ZONA FORESTAL PROTECTORA DE LA CUENCA, EN EL MACIZO COLOMBIANO, EN RNSC, EN HUMEDALES Y EN BOSQUE SECO TROPICAL (ML) 7

8.2 IMPLEMENTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA PARA CONSERVAR ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 8

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 9

9.1 ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE AISLAMIENTOS EN PREDIOS EN LA ZONA FORESTAL PROTECTORA DE LA CUENCA, EN EL MACIZO COLOMBIANO, EN RNSC, EN HUMEDALES Y EN BOSQUE SECO TROPICAL (ML) 9

10. CONCLUSIONES 16

1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar cumplimiento, al contrato 0423 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena "CAM" y SOFOR INGENIEROS SAS. el cual tiene como objeto ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LAS SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORESTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA", la empresa SOFOR INGENIEROS SAS, se permite presentar el Informe No. 5 en el cual se describen las actividades realizadas bajo el periodo de tiempo del 01 de marzo hasta el 31 de marzo de 2024.

Es importante resaltar la disponibilidad de las personas de la comunidad (propietarios) para la verificación de los tramos a aislar durante el proceso constructivo del aislamiento, además de visitas diagnósticas correspondiente a los nuevos predios ubicados en el Municipio de Santa María bajo el marco del otro sí modificatorio número 01 al contrato de obra pública 0423 de 2023.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización geográfica.

El proyecto se llevará a cabo en el Departamento del Huila abarcando los Municipios de Neiva, La Plata, Paicol, Isnos, Pital, Elías, Aipe Baraya, Rivera, Iquira, Santa María, Acevedo, Palestina y Pitalito.

2.2 Información General del Contrato

GENERALIDADES	
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN

	EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
NÚMERO DEL CONTRATO	0423 DEL 2023
VALOR TOTAL	MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.505.964.466 MCTE)
CONTRATISTA	SOFOR INGENIEROS SAS
PLAZO	EL CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	8 DE NOVIEMBRE DE 2023

3. OBJETIVO DEL INFORME

Informar a la CAM sobre las actividades desarrolladas bajo el marco del contrato 0423 de 2023 por parte del contratista SOFOR INGENIEROS SAS, para el periodo comprendido entre el 01 de marzo al 31 de marzo de 2024 correspondiente al mes 5 de obra.

4. ALCANCE DEL INFORME

Este informe tiene como alcance presentar a la CAM las actividades de instalación de aislamientos tales como ahoyado, hincado, templado y grapado de alambre además de terminación de aislamientos; además de visitas por parte del contratista SOFOR INGENIEROS SAS bajo el marco del contrato 0423 de 2023 ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo al 31 de marzo 2024.

5. RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES

Las actas elaboradas en la ejecución del contrato con corte a 31 de marzo del año 2024 se relacionan en la siguiente tabla:

NOMBRE	FECHA
Acta de comité No. 9	15/03/2024

6. RELACIÓN DE OTROSÍ MODIFICATORIO

Se adelanto la legalización del otro sí modificatorio número 01 al contrato de obra pública número 0423 de 2023 el cual se encuentra debidamente cargado y firmado electrónicamente en la plataforma transaccional SECOP II

6.1 Relación y estado de pólizas de garantías

De acuerdo al contrato de obra pública 0423 de 2023 en su clausula décima, el contratista SOFOR INGENIEROS SAS presentó y cargo al SECOP II las Pólizas de seguro de cumplimiento No. I-100027135 y de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. I-100006239 expedidas por la compañía Seguros Mundial, las cuales fueron cargadas en la plataforma del SECOP II y posteriormente aprobadas y se relacionan en la siguiente imagen:

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	301.192.893,20 COP	11/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	150.596.446,60 COP	8/09/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	301.192.893,20 COP	8/09/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	301.192.893,20 COP	11/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	348.000.000,00 COP	8/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Imagen 1. Pólizas contractuales

7. RELACIÓN DE PERSONAL, VEHÍCULOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

A continuación, se relaciona la maquinaria, vehículos y equipos utilizados en el desarrollo de las actividades y de la visita diagnosticas adelantada en el contrato el cual tiene como objeto ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo al 31 de marzo de 2024

7.1 Vehículos.

El contratista SOFOR INGENIEROS SAS durante el cuarto mes de ejecución en el desarrollo de las actividades, utilizó los vehículos relacionados a continuación para adelantar el proyecto en mención:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	PLACA
1	CAMIONETA	Chevrolet vitara	2004	VDC 466

7.2 Equipo y herramientas

El contratista SOFOR INGENIEROS SAS durante el periodo del presente informe, utilizó las siguientes herramientas, con el fin de realizar adelantar las actividades

ITEM	DESCRIPCIÓN EQUIPO
1	Gafas de seguridad
2	Guantes
3	Palines
4	Martillo
5.	Pinzas para templado

7.3 Personal del contrato

Para el desarrollo de las actividades en el cuarto mes de ejecución y según el objeto contractual SOFOR INGENIEROS SAS, contó con el personal idóneo por su experiencia, compromiso y cumplimiento. A continuación, se relaciona el personal administrativo y operativo participe en la ejecución de este tercer mes de actividades referente al contrato 0423 de 2023, además se envían todos los soportes de seguridad social.

No.	Nombre y Apellidos	C.C.	CARGO
1	ANDRÉS FELIPE SAAVEDRA	2236682	Coordinador del proyecto
2	RAMIRO DEVIA GALINDO	93359578	Ingeniero de Campo
3	NICOLÁS STEVEN CARDOZO BARRETO	1110582681	Ingeniero de campo
4	FERNEY DANILO CASTRO GALINDO	1083817582	Técnico de campo
5	ARIEL ALBEIRO ARIAS SANCHEZ	93382899	Ayudante de campo
6	ISABEL TERESA CHAVEZ SAAVEDRA	1032363465	Ingeniera del proyecto
7	OSCAR HERVEY ARIAS	5996146	Trabajador de campo
8	JHON URIEL MURILLO	93393748	Trabajador de campo
9	JACID CARDOZO	93371376	Trabajador de campo
10	ISRAEL MARTINEZ MONROY	93128802	Trabajador de campo

Se anexan los documentos de todo el personal mencionado

8. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 5 DE OBRA DEL PROYECTO

8.1 INSTALACIÓN DE AISLAMIENTOS EN PREDIOS EN LA ZONA FORESTAL PROTECTORA DE LA CUENCA, EN EL MACIZO COLOMBIANO, EN RNSC, EN HUMEDALES Y EN BOSQUE SECO TROPICAL (ML)

Con el fin de eliminar o evitar tensionantes ambientales los cuales afecten el entorno para la protección de cuencas hidrográficas u otros ecosistemas presentes en el proyecto se viene realizando la construcción de aislamiento o cercos protectores. Las características técnicas del aislamiento son las siguientes:

- Estantillos: De madera plástica, con un diámetro de 9 cm x 9 cm y una longitud mínima de 2,20 metros además de postes de madera de las mismas dimensiones como madrina y pie de amigo (cada 30 metros), esto con el fin de tener un mejor templado y grapado del aislamiento protector.
- Hincado: Los estantillos deben ser enterrados en un hueco de 40 cm x 40 cm x 40 cm y está depositando en cada hueco algún tipo de agregado o material encontrado en la zona del hueco con el fin de tener una buena fijación, a una distancia de 3.0 m cada poste y cada 30 metros se está ubicando un pie de amigo o cuando las condiciones topográficas o de dirección lo exijan, cada estantillo se está hincando a una profundidad de 50 cm completamente firme.
- Alambre: Se está utilizando calibre 14 nacional facturado legalmente, se están instalando 4 hilos de alambre a una distancia de 40 cm medidos a partir de la superficie del suelo.
- Grapado y templado: Cada hilo de alambre está siendo templado y grapado a los respectivos estantillos.

A continuación, se presenta el consolidado de las actividades realizadas en el periodo de tiempo correspondiente al mes de febrero, además de las justificaciones del traslado de metros de aislamiento en algunos predios.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTALACIÓN DE AISLAMIENTOS				
MUNICIPIO	**VEREDA**	**NOMBRE DEL PREDIO**	**CANTIDAD DE ML A EJECUTAR EN CADA PREDIO**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
NEIVA	BUENAVISTA	SAN MIGUEL	2124	**Se ejecuto la totalidad del aislamiento (2009 ml) debido a que no se presentaba el espacio para la ejecución de todo el metraje.**

AIPE	SAN ISIDRO	GRANIZO	200	**Se ejecutaron actividades ahoyado e hincado de postes**
		INDIAL	200	**Se ejecutaron actividades ahoyado e hincado de postes**
		GUACHARACAS	200	**Se ejecuto la totalidad del aislamiento**
		HOSPITAL	200	**Se ejecuto la totalidad del aislamiento**
		GUAMITOS	378	**Se ejecuto la totalidad del aislamiento (213 ml) debido a que no se presentaba el espacio para la ejecución de todo el metraje.**
PAICOL	EL CARMEN	RNSC EL PEDREGAL	1000	**Se ejecuto la totalidad del aislamiento**
PITALITO	CHARGUAYACO	RNSC EL RECREO	800	**Se ejecuto la totalidad del aislamiento**

8.2 IMPLEMENTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA PARA CONSERVAR ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Se realizaron actividades de visita técnica con el fin de llevar a cabo la revisión y avances de la implementación de procesos de restauración activa para la conectividad del Macizo Colombiano en el Municipio de Santa María levantando acta de reunión la cual se anexa al presente informe.

También se levanto acta de reunión en el Municipio de Iquira con el fin de definir el área de 3 has con el fin de completar las 6 has para la implementación de la restauración activa, se anexa acta de reunión.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

9.1 ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE AISLAMIENTOS EN PREDIOS EN LA ZONA FORESTAL PROTECTORA DE LA CUENCA, EN EL MACIZO COLOMBIANO, EN RNSC, EN HUMEDALES Y EN BOSQUE SECO TROPICAL (ML)

MUNICIPIO DE NEIVA

- **VEREDA BUENAVISTA PREDIO SAN MIGUEL (2.124 ML)**



Foto 1. Aislamiento de tramo faltante



Foto 2. Templado y grapado de alambre



Foto 3. Aislamiento finalizado



Foto 4. Aislamiento del tramo faltante

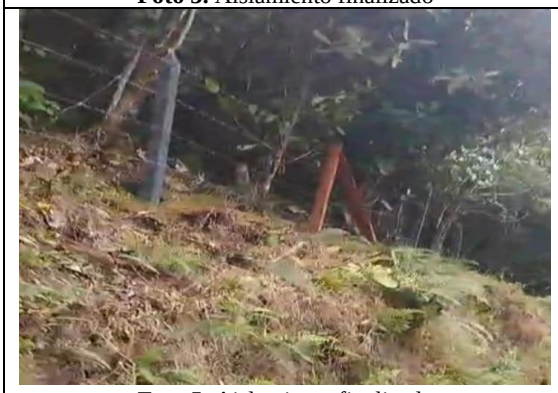


Foto 5. Aislamiento finalizado



Foto 6. Aislamiento finalizado

MUNICIPIO DE AIPE

VEREDA SAN ISIDRO PREDIO EL GRANIZO (200 ML)



Foto 7. Labores de transporte menor de insumos



Foto 8. Transporte menor de insumos al predio



Foto 9. Transporte postería



Foto 10. Ahoyado e hincado



Foto 11. Línea de postes hincados



Foto 12. Hincado de postes

VEREDA SAN ISIDRIO PREDIO EL INDIAL (200 ML)



Foto 13. Labores de ahoyado e hincado



Foto 14. Línea de posteria hincada

VEREDA SAN ISIDRO PREDIO GUACHARACAS (200 ML)



Foto 15. Labores de ahoyado



Foto 16. Labores de hincado



Foto 17. Labores de hincado de postes



Foto 18. Labores de templado y grapado aislamiento ejecutado

VEREDA SAN ISIDRO PREDIO HOSPITAL (200 ML)



Foto 19. Labores de ahoyado e hincado



Foto 20. Labores de hincado



Foto 21. Hincado de postes



Foto 22. Labores de templado y grapado



Foto 23. Aislamiento ejecutado

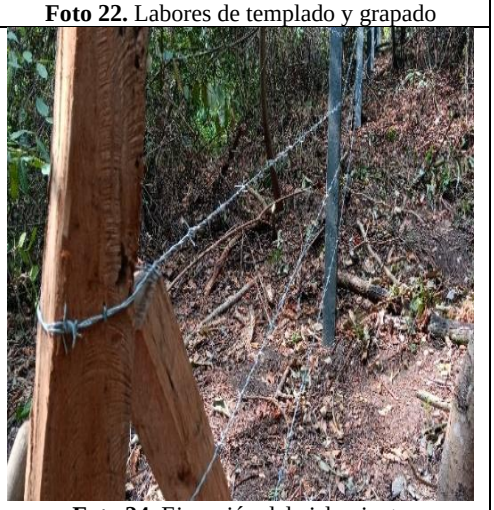


Foto 24. Ejecución del aislamiento

VEREDA SAN ISIDRO PREDIO GUAMITOS (378 ML)



Foto 25. Labores de hincado



Foto 26. Labores de ahoyado e hincado



Foto 27. Labores de templado y grapado



Foto 28. Aislamiento finalizado

MUNICIPIO DE PAICOL

VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC PEDREGAL (1000 ML)



Foto 29. Labores de templado y grapado



Foto 30. Tramo faltante finalizado



Foto 31. Aislamiento de coberturas vegetales



Foto 32. Aislamiento finalizado



Foto 33. Labores de templado y grapado



Foto 34. Aislamiento finalizado

MUNICIPIO DE PITALITO

- **VEREDA CHARGUAYACO PREDIO RNSC EL RECREO (800 ML)**



Foto 35. Labores de ahoyado e hincado



Foto 36. Labores de ahoyado e hincado



Foto 37. Labores templado y grapado



Foto 38. Labores de grapado



Foto 39. Aislamiento finalizado



Foto 118. Línea de aislamiento ejecutado



Foto 39. Aislamiento finalizado



Foto 39. Aislamiento finalizado


10. CONCLUSIONES

- Se han adelantado actividades satisfactoriamente y se realizó la ejecución total de algunos aislamientos levantando actas de entrega a satisfacción por parte de los propietarios.
- La concertación previa con la comunidad y el acercamiento efectivo permitieron adaptar las actividades de aislamiento para abordarlas de manera integral, con el fin de generar un impacto positivo de los recursos ambientales
- Las actividades ejecutadas no solo contribuyen a la mitigación de la degradación ambiental, sino que también buscan promover la conciencia ambiental y la responsabilidad compartida sobre la protección del entorno natural para las generaciones futuras.
- Se espera pronta solución a los predios del Municipio de Santa María con el fin de ejecutar satisfactoriamente las actividades de restauración activa para el Macizo Colombiano.

ACTA No.9	CONTRATO DE OBRA No.423 DE 2023

PROYECTO: ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM	
CARLOS A. QUIZA CAMACHO (CQ) - Contratista de Interventoría	
LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional apoyo Interventoría	
ISABEL CHAVES (IC) - Profesional apoyo Contratista de Obra	
NICOLÁS CARDOZO BARRETO (NC) - Ingeniero campo Contratista de Obra	



II. OBJETO

Aspectos administrativos, técnicos y recomendaciones generales.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No habían compromisos pendientes.

V. TEMAS TRATADOS

JC informa que el otrosí modificatorio No.1 al contrato de obra por el cambio de predios, se encuentra en proceso de revisión por parte de la oficina jurídica de la Entidad, por lo cual se podría estar definiendo para las próximas semanas.

CQ informa que el contratista de obra continúa con la ejecución de los aislamientos en los siguientes municipios: Paicol predio RNSC Pedregal; Pitalito predio RNSC El Recreo; Aipe predio Guamitos y predio Guacharacas; y Neiva vereda San Miguel, predio Buenavista se ejecutaron 2.009 ml de 2.124 ml, debido a que por las condiciones del terreno no se permite la instalación de postes, evidenciando que se logra aislar totalmente la reserva con dicho metraje. Los aislamientos parciales y terminados se encuentran en proceso de verificación por parte del personal técnico de Interventoría.

NC manifiesta que en la ejecución de los aislamientos para los predios del municipio de Neiva, no se ha logrado mayor avance, solo se ha ejecutado el aislamiento en el predio Buenavista en la vereda San Miguel, debido a que la comunidad no se ha logrado definir el tema de contratación de mano de obra con la comunidad de la zona, por que que el costo solicitado por estos supera el establecido en el contrato y económicamente no sería viable para la empresa.

JC informa que el municipio expidió un comunicado donde consta que los predios son de su propiedad y para garantizar la continuidad del proyecto, autoriza dar la oportunidad a otros grupos asociativos y/o juntas de acción comunal para la realización de las actividades, teniendo en cuenta que con los de la zona no han logrado concretar dicha ejecución. Además, se está gestionando una vez más convocar una reunión con la comunidad para lograr la aceptación de la ejecución conforme a las condiciones que favorezca tanto a la comunidad como al contratista de obra.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DIA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los quince (15) días del mes de marzo de 2024.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800082101	9	SOFOR INGENIEROS LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7 9-43 OF 501	IBAGUE-TOLIMA	2731110	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	492334511	9463863473	E	2024/03/04	2024/03/04	BANCO POPULAR	0	$4,042,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (10 Afiliados)						$15,286,000	$2,445,900			$15,286,000	$612,000			$15,286,000	$612,000			$15,286,000	$372,500		$0	$0
Centro de Trabajo: NIVEL 3 (10 Afiliados)						$15,286,000	$2,445,900			$15,286,000	$612,000			$15,286,000	$612,000			$15,286,000	$372,500		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (10 Afiliados)						$15,286,000	$2,445,900			$15,286,000	$612,000			$15,286,000	$612,000			$15,286,000	$372,500		$0	$0
1	CC	93382899	ARIAS ARIEL	231001	30	$1,498,000	$239,700	EPS037	30	$1,498,000	$60,000	CCF50	30	$1,498,000	$60,000	14-23	30	$1,498,000	$36,500	30	$0	$0
2	CC	5996146	ARIAS OSCAR	230301	30	$1,498,000	$239,700	EPS005	30	$1,498,000	$60,000	CCF50	30	$1,498,000	$60,000	14-23	30	$1,498,000	$36,500	30	$0	$0
3	CC	93374732	CARDOZO GEMBER	25-14	30	$1,498,000	$239,700	EPS005	30	$1,498,000	$60,000	CCF50	30	$1,498,000	$60,000	14-23	30	$1,498,000	$36,500	30	$0	$0
4	CC	93371376	CARDOZO JACID	230301	30	$1,498,000	$239,700	EPS037	30	$1,498,000	$60,000	CCF50	30	$1,498,000	$60,000	14-23	30	$1,498,000	$36,500	30	$0	$0
5	CC	1110582681	CARDOZO NICOLAS	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF50	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
6	CC	1083917582	CASTRO FERNEY	230301	30	$1,498,000	$239,700	EPS041	30	$1,498,000	$60,000	CCF50	30	$1,498,000	$60,000	14-23	30	$1,498,000	$36,500	30	$0	$0
7	CC	93359578	DEVIA RAMIRO	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF50	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
8	CC	93393748	MURILLO JOHN	25-14	30	$1,498,000	$239,700	EPS005	30	$1,498,000	$60,000	CCF50	30	$1,498,000	$60,000	14-23	30	$1,498,000	$36,500	30	$0	$0
9	CC	28555791	ROJAS ISABEL	230201	30	$1,498,000	$239,700	EPS037	30	$1,498,000	$60,000	CCF50	30	$1,498,000	$60,000	14-23	30	$1,498,000	$36,500	30	$0	$0
10	CC	2236682	SAAVEDRA ANDRES	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF50	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$15,286,000	$2,445,900			$15,286,000	$612,000			$15,286,000	$612,000			$15,286,000	$372,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800082101	9	SOFOR INGENIEROS LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7 9-43 OF 501	IBAGUE-TOLIMA	2731110	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	492334511	9463863473	E	2024/03/04	2024/03/04	BANCO POPULAR	0	$4,042,400

RESUMEN DE PAGO


RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$2,445,900	$0	$0	$2,445,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$239,700	$0	$0	$239,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$735,400	$0	$0	$735,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,231,100	$0	$0	$1,231,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$239,700	$0	$0	$239,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$372,500	$0	$0	$372,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$372,500	$0	$0	$372,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$612,000	$0	$0	$612,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	10	$612,000	$0	$0	$612,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$612,000	$0	$0	$612,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$372,000	$0	$0	$372,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$180,000	$0	$0	$180,000
TOTAL				**10**	**$4,042,400**	**$0**	**$0**	**$4,042,400**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE TRABAJO TÉRMINO FIJO

GEMBER CARDOZO CRUZ, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su respectiva firma, actuando en calidad de representante legal de SOFOR INGENIEROS SAS, con NIT: 800082101-9, quien en adelante se denominara El CONTRATANTE, e ISRAEL MARTINEZ MONROY, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía N° 93128802, domiciliada en el municipio de Ibagué quien para efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, el cual se regirá por las siguientes clausulas: **PRIMERA.-OBJETO:** EL CONTRATISTA en su calidad de trabajador de campo, se obliga para EL CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en: lasactividades de trabajador de campo bajo el marco del proyecto 0423 de 2023 el cual tienecomo objeto: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA" **SEGUNDA. - DURACION O PLAZO**: el presente contrato tendrá una duración de 6 meses, contados a partir del 7 de marzo de2024, y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración**TERCERA. -PRECIO:** el valor acordado para el presente contrato tiene una asignación mensualde un millón trescientos mil $(1.300.000) incluido el subsidio de transporte. **CUARTA. - FORMA DE PAGO:** El valor contratado será cancelado así: el pago del presente contrato será efectuado mensualmente. **QUINTA. - OBLIGACIONES**: EL CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio. **SEXTA. - SUPERVICION:** EL CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamentecon EL CONTRATISTA. **SEPTIMA. -TERMINACION.** El presente contrato terminara por acuerdoentre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. **OCTAVA-DOMICILIO.** Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractuala la ciudad de Ibagué Departamento del Tolima.

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a los 7 días del mes de marzo del 2024.





GEMBER CARDOZO CRUZ.
C.C 93.374.732
Representante Legal De: SOFOR INGENIEROS LTDA.
NIT: 800082101-9
CONTRATANTE

ISRAEL MARTINEZ MONROY.
C.C 93128802
CONTRATISTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93128802		MARTINEZ MONROY ISRAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 45CS 7 BARRIO EL TOPACIO	IBAGUE-TOLIMA	2681285	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	564638664	9464119157	I	2024/04/02	2024/04/09	BANCO POPULAR	7	$389,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	93128802	MARTINEZ ISRAEL	230201	30	$1,358,000	$217,300	EPS005	30	$1,358,000	$169,800		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,358,000	$217,300			$1,358,000	$169,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$217,300	$1,300	$0	$218,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$217,300	$1,300	$0	$218,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$169,800	$1,100	$0	$170,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$169,800	$1,100	$0	$170,900
TOTAL				1	$387,100	$2,400	$0	$389,500

2024/04/15 10:03 AM

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 30/03/2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney danilo castro	Nombre:	Alejandro perez R.
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	1003800841
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	Buena Vista Vda San Migel
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio : Neiva

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

- En esta acta se reciben 1009 metros lineales Para un total de aislamiento instalado en cerco protector de 2009 metros lineales.

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 30 de 03 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C.	Firma:	
Nombre:	Ferney danilo castro	Nombre:	Didier Alejandro perez

Vobo: Inspect. Interventoria

SIG / CAM — CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA — ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** DD/MM/YYYY 30/03/2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferneydarilo Castro G.	Nombre:	Miller Pobre Vargaz
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	4919605
Contratista:	SoFor Ingenieros S.A.S.	Correo electrónico:	
Cargo:	técnico de Campo	Predio donde se realiza la entrega:	Predio: El Pedregal. Vda: El Carmen
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio: Paicol

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

En la presente acta se recibe 250ml. para una instalación total de 1.000ml. de cerco de alambre de púas.

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 30 de 03 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Miller Pabon V

VoBo: Maria Fda Alvarez
Insp. Interventoria

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 30/03/2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Deva G.	Nombre:	Ramon Ruiz
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	4884542
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Tecnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	Guacharacas
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vereda San isidro Municipio de Aipe

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Instalación de 200 metros lineales de aislamiento con cerco protector

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 30 de 03 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Romiro Deva	Nombre:	Ramón Ruiz

Vo.Bo.

Insp. Intervventoria

SIG · CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 30/03/2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Devia G.	Nombre:	ARMIN GARZON
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	83168761
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Tecnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	Guamitos
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vereda San Isidro Municipio de Aipe.

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Instalacion de 213 metros lineales de aislamiento con cerco protector

SIG / cam CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:



A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 30 de 03 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ramiro Devia G.	Nombre:	Armin Garzon

VoBo.



SIG / CAM — CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA — ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** DD/MM/AA
   30/03/2024
2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Devia Galindo	Nombre:	Justo Olaya
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	4884624
Contratista:	Solor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Tecnico de Campo	Predio donde se realiza la entrega:	Hospital
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vereda San Isidro Municipio de Aipe

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Instalación de 200 metros lineales de aislamiento con cerco protector

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 30 de 03 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ramiro Devia G.	Nombre:	Justo Araya

VoBo

Ingr. Interventoría

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** DD/MM/YYYY 28/12/2023

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney danilo Castro	Nombre:	Griselda Gafindez
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	40600737
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	Robira
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio Acevedo Vereda la tocora

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Aislamiento de 200 metros lineales.

Scanned with ACE Scanner

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 28 de 12 de 2023

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C.	Firma:	Griselda Galindez
Nombre:	Ferney danilo Castro	Nombre:	Griselda Galindez

Scanned with ACE Scanner

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 14/03/2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Dora Lucia Ruiz Castro
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	36279824.
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	doralu7@gmail.com
Cargo:	técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	R.N.S.C. Ecofinca El Recreo.
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Cto Chonguayaco. Municipio - Pitalito

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

- Aislamiento de 800 metros lineales

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 14 de 03 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C.	Firma:	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Dora Lucia Perez Castro

VoBo: Inspector interventoria

SIG / cam — CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA — ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 30/01/2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

☐ Entrega Parcial ☒ Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	RAMIRO DEVIA	Nombre:	BONIFACIO ROJAS
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	12188146
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	TECNICO DE CAMPO	Predio donde se realiza la entrega:	LA FRONTERA
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vda ALTO LIBANO El PITAL - Huila

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe: Instalacion de cerco protector de 400 metros lineales, Cerco en alambre de puas y Postes plasticos. Cerco protector

SIG · CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 30 de 01 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ramiro Devia G.	Nombre:	Bonifacio Rojas

VoBo

Inspectora Interventoría

cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE REUNIÓN**	**Versión:** 2
		Fecha: 09 Abr 14

Fecha: 20 / Marzo / 2024 **Hora:**

Lugar:. Alcaldía Municipal Santa María - Huila

Participantes:
- Ariel Albeiro Arias - contratista Sofor Ingenieros S.AS.
- María Fernanda Alvarez Rodriguez - Interventoría
- Johan Sebastián Gonzales - Alcaldía Municipal Santa María.
- Yuli Alejandra Hoyos Valencia - Profesional de apoyo - CAM.
- Luis Alveiro Suarez - Alcaldía Municipal Santa María

Elaboró: Yuli Alejandra Hoyos Valencia. **Acta Nº:**

Actividades Desarrolladas y Compromisos

TEMAS	RESPONSABLE
-Se realizó la visita técnica por parte de Interventoría, contratista Sofor y profesional CAM a tres predios identificados como potencial para la implementación de restauración activa, los predios de acuerdo a socialización y visita en campo, los predios si cumplen los criterios para la implementación pero no hay claridad frente a la formalidad de los predios adquiridos por la gobernación.	- Interventoría - Sofor Ingenieros - Alcaldía - CAM.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	PLAZO
- Acercamiento con la gobernación del Huila, para socialización de los predios. (Formalización) - Realizar los procesos Jurídicos y administrativos para entrega de los predios adquiridos - Acompañamiento y visitas técnicas que se requieran a los predios involucrados	- Alcaldía - CAM. - Sofor Ingenieros - Interventoría	Mes. Marzo - Abril. 2024

Próxima reunión: Fecha: **Hora:** : **Lugar:**

Tema(s) a tratar:

Revisión y avances de la implementación procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo Colombiano.

A las se dio por terminada la reunión, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos.

Johan Sebastián G.
1074607628
Alcaldía Municipal.

Secretario de la Reunión
Profesional Apoyo
RNSC - Norte - Centro
CAM

Coordinador S.D.A.C.

Ariel Albeiro Arias
Tec. Sofor Ingenieros
contratista.

Insp. Interventoría
Carlos Quiza

Powered by CamScanner

cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** F-CAM-125 **Versión:** 2 **Fecha:** 09 Abr 14

Fecha: 27/03/2024 **Hora:** 9:00am.

Lugar:. Resguardo Rio Negro - Iguira

Participantes: Luis Alberto Mallama - fiscal Mayor Resguardo - Autoridad Indígena
- Anderson Suarez - Interventoría Carlos Quiza
- Albeiro Arias. - Contratista Sofor Ingenieros
- Yuli Alejandra Hoyos Valencia - Profesional CAM. - Neiva

Elaboró: Yuli Alejandra Hoyos Valencia **Acta Nº:**

Actividades Desarrolladas y Compromisos

TEMAS	RESPONSABLE
Se visitó el resguardo con el fin de establecer el área faltante (3) has, para la implementación de la restauración activa, De acuerdo a la intervención de los participantes, interventoría, cam, contratistas, y autoridad indígena se estable que el área a completar para la siembra de los 1875 árboles faltantes, se tendrán en cuenta. que las áreas sean de mínimo 0.5ha hasta completar las 3has. La autoridad ancentral se reunirá y definen los sitios que cumplan los criterios para la siembra. - Claridad sobre la NO posibilidad de que el Proyecto Salga de la Jurisdicción municipio de Iguira	Autoridad Indígena Interventoría CAM. Contratistas SOFOR.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	PLAZO
- Definición de las áreas para la implementación de restauración activa, para completar las 6ha. que están dentro del convenio (Resguardo indígena), Rio Negro - Iguira - Implementación - Siembra de 1875 árboles, contratista sofor - Visita técnica y seguimiento como parte de los compromisos dentro del Convenio.	Autoridad, Resguardo Indígena Rio Negro - Iguira Interventoría Resguardo Contratistas SOFOR CAM	15 dias.

Próxima reunión: **Fecha:** 20/Abril **Hora:** : 9:00am **Lugar:** Por definir

Tema(s) a tratar:
Avances y seguimiento al desarrollo de la implementación procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo Colombiano.

A las se dio por terminada la reunión, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos.

Luis Alberto Mallama C
Autoridad Ancestral

Contratista Sofor Ing.

Secretario de la Reunión
Prof Apoyo RNSC.
Norte y Centro Huila
CAM

Anderson Suarez M
Inspector interventoria

Powered by CamScanner

Corazón	LISTADO DE ASISTENTES	Código:	T-CAM-097
		Versión:	4
		Fecha:	23 Abril de 2019

TEMA: Reunión definición del arra para la implementación de Procesos restauración activa

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Autoridad ancestral, Interventoría, Sofor. CAM.

SITIO DEL EVENTO: Oficina de la autoridad ancestral. MUNICIPIO: Iguira FECHA: 27/03/2024. HORA: 9:00am

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
1	Andrea Etcheverry Baile		V	1004491134	Resguardo Huila	Secretaria Suplente	Iguira	3155220682	andrea123baile@gmail.com	✓	Andrea Etcheverry
2	Eduardo Teres	V		76341079	Resguardo Huila	fiscal suplente	Iguira	3172946695	eduarter7@yahoo.es	✓	
3	Luis Alberto Mullens	V		76324713	Resguardo Huila	fiscal Mayor	Iguira	3175125462	—	✓	Luis Alberto Mullens
4	Rosa blanca Cayu		X	1007209017	Resguardo Huila	Secretaria suplente	Iguira	3136903099	—	✓	
5	Ferney Danilo Castro	6 X		1083917587	SOFor Ingeniería	técnico de campo	Iguira	3214814560	Ferney[illegible]@gmail.com.	✓	Ferney danilo C.
6	Daniel Alberto Mesa	9		93382894	Sofor ingeniero	Tecnico contratista	Iguira	315 837 9741	Sofor.ing@gmail.com	✓	
7	Yuli Alejandra Hoyos V		X	1004266031	CAM	Contratista	Iguira	3214649302	ingyuhoyos@gmail.com	Si	Yuli Hoyos V

Powered by CamScanner
