Alcaldía Municipal de Floridablanca	INFORME DE VISITA TECNICA DE CAMPO
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORME DE VISITA TECNICA INSTITUTO RAFAEL POMBO


1. Participantes.

	AREA
ING YEIMY LIZETH ORTIZ BELTRAN	Contratista secretaria de Educación

2. Localización.

La visita se desarrolló en el instituto Rafael Pombo, ubicado en carrera 6 No 46 - 18 Lagos II en la figura 1, se señala el lugar en el cual se realizó la vista desde una vista en planta en un medio digital.

Figura 1. *Ubicación geográfica del Instituto Rafael Pombo.*

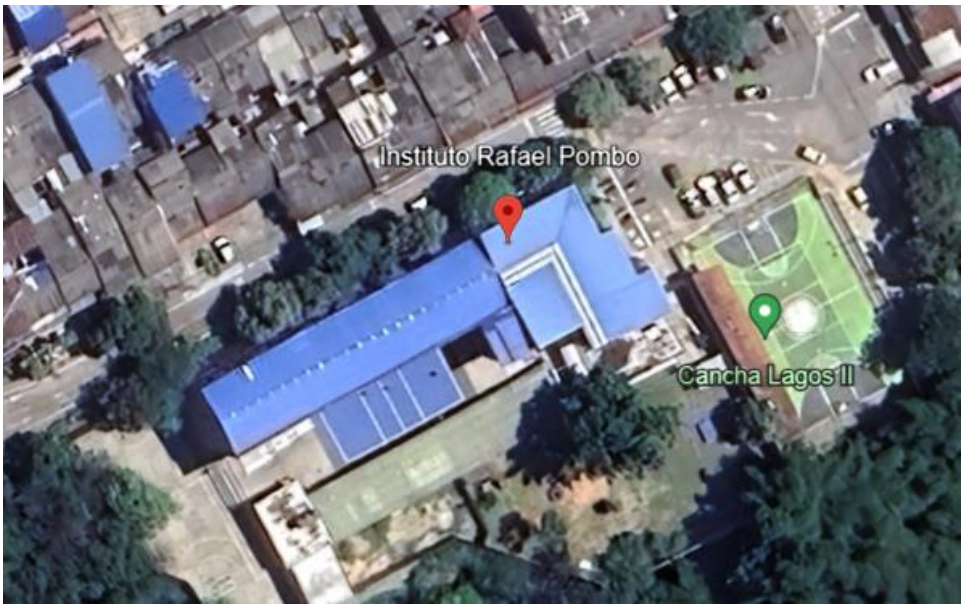

Fuente: Tomado de Google earth.

3. Desarrollo de la visita técnica de campo.

Se realizo el desplazamiento al sitio para atender la solicitud y revisión de infraestructura, bienes y servicios, calidad educativa, conectividad, para atender las afectaciones que se presentan en el instituto Rafael Pombo, En donde se realizaron las siguientes actividades:

Figura 2. Reconocimiento de la zona



3.1. Cubierta Cancha Deportiva: Se observa la necesidad de instalar una cubierta en la cancha deportiva, ya que los estudiantes no cuentas con cubierta y ven las actividades Físicas a la intemperie al sol y lluvia, no pueden llevar a cabo actividades como izadas de bandera, reuniones de padres de familia, y demás que hace la institución, la cubierta tiene un área total 640 m2 con una longitud de 40m de largo por 17m de ancho, como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Cubierta en la cancha Deportiva



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.2. Desagüe de aguas lluvias en la cancha: Se observa la necesidad de hacer un hueco para el canal para el desagüe de aguas lluvias ya que se empoza cuando llueve el agua en la cancha, como se observa en la figura 4.

Figura 4. Imbornal agujero de drenaje



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.3. Grietas en el muro: se observa que hay grietas en los muros del 3 piso, se observa la necesidad de intervenir esas grietas ya que se van ampliando cada vez más, como se observa en la figura 5.

Figura 5. Grietas en los muros



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.4. Rejas para la ventana: Se evidencia la necesidad de poner rejas en las ventanas ya que están expuestas en la parte externa de la calle, por seguridad en la institución se deben poner las rejas en 12 ventanas que están en la parte externa que dirige a la calle del 3 piso y segundo piso, con una longitud de 4 m de largo y 1,6m de ancho, como se observa en la figura 6.

Figura 5. Rejas para las ventanas



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.5. Construcción del segundo bloque de prescolar. Se observa la necesidad de la construcción del segundo bloque de prescolar ya que cuenta con espacio suficiente y tiene las bases para hacer la continuidad del segundo bloque, con un área de 77 m2 11m de largo y 7m de ancho, como se muestra en la figura 7.


Figura 7. Construcción del segundo Bloque



Fuente: Registro fotografico tomado en campo..

3.6. Cubierta en el área de prescolar: Se observa la necesidad de la instalación de una cubierta metálica para el patio de los niños de prescolar, ya que los niños no tienen cubierta y están a la intemperie el patio cuenta con un área total de 66 m2 con 11m de largo y 6m de ancho, como se muestra en la figura 8.

Figura 8. Cubierta área de prescolar**:**

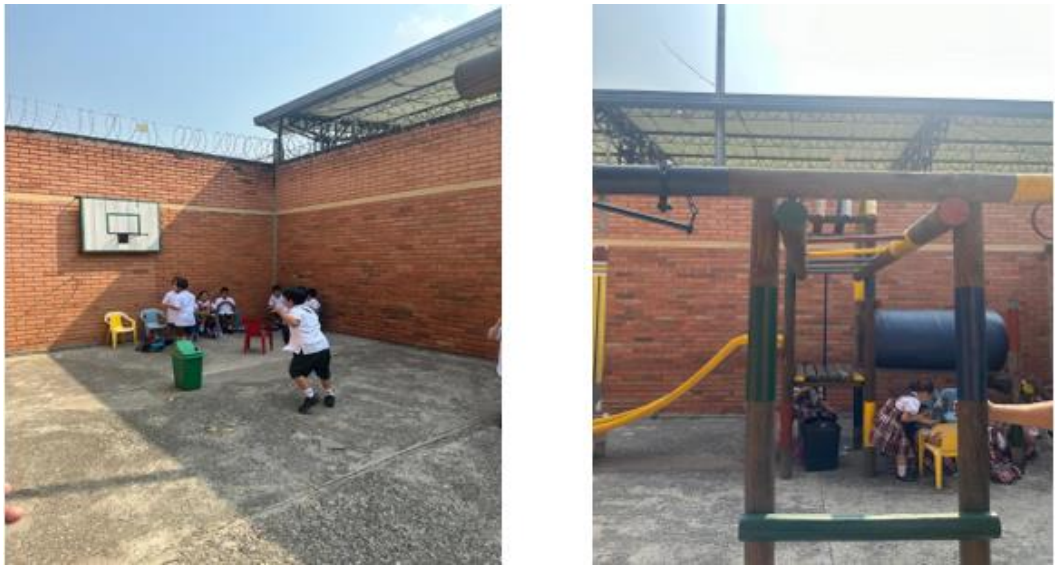

Fuente: Registro fotografico tomado en campo

3.7. Instalación de Puerta para el depósito y habitación de basura. Se observa la necesidad de hacer la instalación de dos puertas, una para la puerta de depósito y la otra para la habitación de residuos, con una longitud de 2 m de largo y 1m de ancho, como se muestra en la figura 9.

Figura 9. Instalación de dos puertas



Fuente: Registro fotografico tomado en campo

3.8. Mantenimiento de cubierta Bloque A. Se observa la necesidad de hacer el mantenimiento de la cubierta ya que tiene hojas de arboles y mugre que pueden llegar a tapar las canaletas, como se muestra en la figura 10.

Figura 10. Limpieza de cubierta



Fuente: Registro fotografico tomado en campo
