Alcaldía Municipal de Floridablanca	INFORME DE VISITA TECNICA DE CAMPO
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORME DE VISITA TECNICA INSTITUTO COMUNITARIO MINCA SEDE A


1. Participantes.

	AREA
ING YEIMY LIZETH ORTIZ BELTRAN	Contratista secretaria de Educación

2. Localización.

La visita se desarrolló en el instituto minca sede A, ubicado en la calle 107 No 39 - 12 Zapa manga I Etapa. En la figura 1, se señala el lugar en el cual se realizo la vista desde una vista en planta en un medio digital.

Figura 1. *Ubicación geográfica del Instituto Minca sede A.*

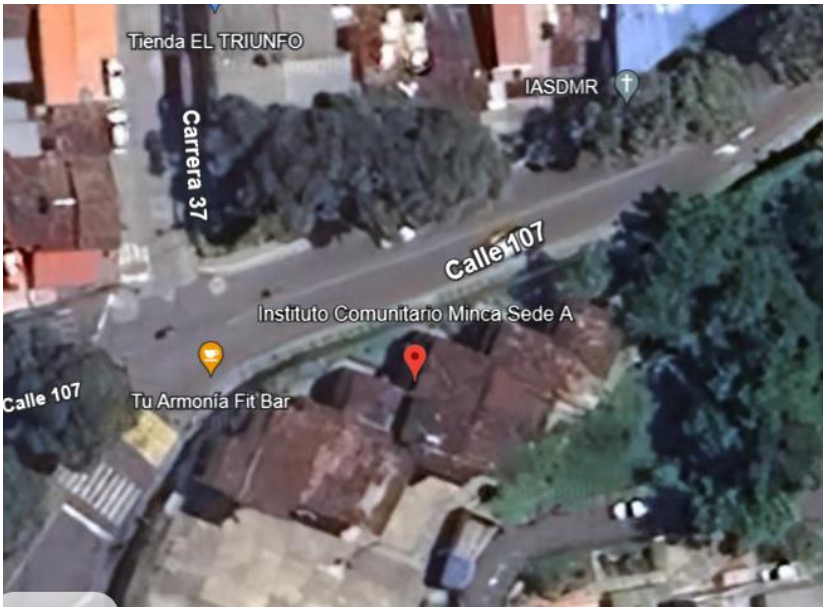

Fuente: Tomado de Google earth.

3. Desarrollo de la visita técnica de campo.

Se realizo el desplazamiento al sitio para atender la solicitud y revisión de infraestructura, bienes y servicios, calidad educativa, conectividad, para atender las afectaciones que se presentan en el instituto Comunitario Minca sede A, En donde se realizaron las siguientes actividades:

3.1. Desagüe en los muros de cerramiento: Se observa los muros del cerramiento y se observa el muro no tiene salida de desagüe de aguas lluvias, el cual esta afectando el muro de cerramiento, como se observa en la figura 1.

Figura 1. Insertar desagüe de aguas lluvias



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.2. Solicitar permiso para talar el árbol en la institución educativa: Se observa que el árbol es un riesgo para la institución educativa, ya que está en mal estado y se pueda caer afectando el muro de cerramiento y la vecindad, como se observa en la figura 2.

Figura 2. Talar Árbol de la institución educativa



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.3. Concertina de cerramiento: Toma de medidas en campo para la instalación de concertina en toda el área de cerramiento de la institución educativa con un área de 1500 m2, como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Concertina de cerramiento:



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.4. Hundimiento de baldosa por humedad: Se evidencia que las baldosas del pasillo están hundidas ya que se genera humedad en el relleno, como se muestra en la figura 4.

Figura 4 Hundimiento de baldosa



Fuente: Registro fotografico tomado en campo

3.5. Continuidad al canal del segundo piso: Se evidencia que el canal del segundo piso no tiene continuidad, y esta dañando la estructura del piso ya que todas las aguas lluvias caen al pasillo, como se muestra en la figura 5.


Figura 5. darle continuidad al canal



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.6. Cancha no tiene desnivel: Se observa que la cancha no tiene desnivel y por eso se hacen charcos de agua, de las aguas lluvias, como se observa en la figura 6.


Figura 6. Cancha con desnivel

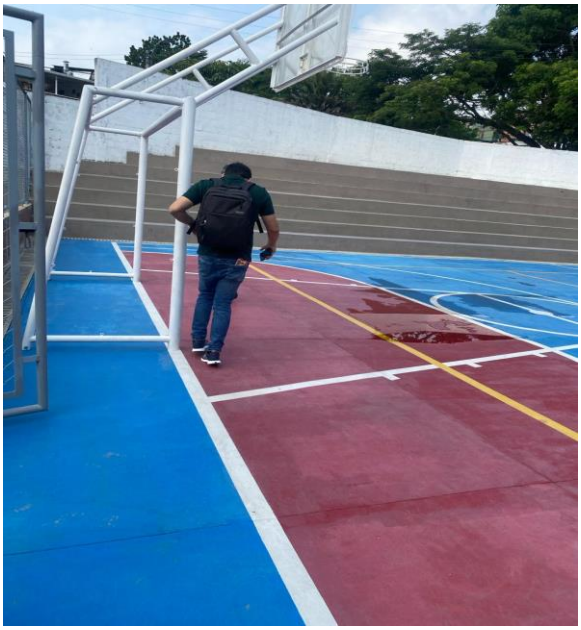

Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.7. Cubierta para la cancha deportiva: se toman medidas en campo de la cancha, para realización de una cubierta ya que la institución no cuenta con cubierta en la cancha deportiva, con un área total de 300 m2, como se muestra en la figura 7.

Figura 7. Cubierta para la cancha deportiva

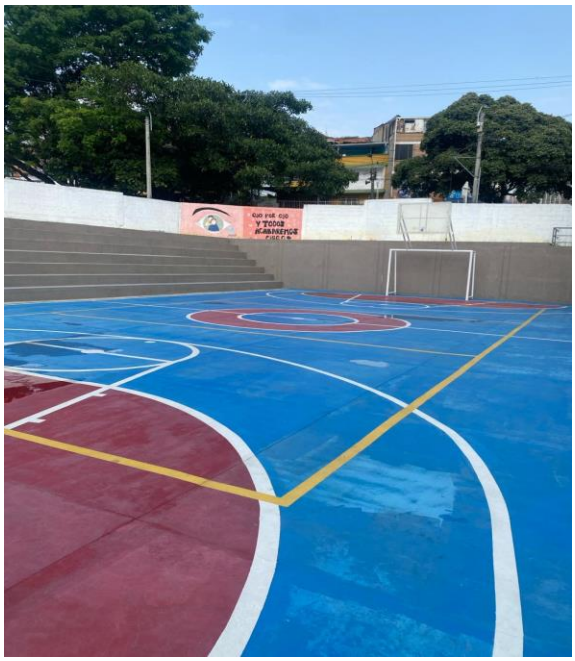

Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.8. Demoler caja de contadores del colegio: Se observa la necesidad de demoler la caja de contadores de la institución

Figura 7. Caja de contadores en la institución



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.
