	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No. CLP-202105002-2021 **Contratista:** CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021

Contrato de Interventoría No. 1981-2023 **Interventoría:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

Objeto Contrato de Obra:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".

INFORME MENSUAL No. 1 **MES O PERIODO:** JULIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		8
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		9
2.1	Localización		11
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		12
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		12
2.4	Características técnicas del proyecto		13
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		13
3.1	Información general del contrato		13
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		15
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		15
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		15
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		16
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	16
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	23
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	25
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	27
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	29
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	32
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	34
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	39
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		42
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	42
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	42
	• Seguimiento Programa de Obra		47
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	47
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	47
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	49
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	53
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		56
5.1	Información general del contrato		56
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		57
5.3	Informes especialistas y profesionales		57
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		57
5.5	Informe matriz de riesgos.		57
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		57
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		NA
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		58
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	58
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	60
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	65
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	67
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	71
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		71
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	71
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	71
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	71
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	71
7	**Conclusiones y recomendaciones**		74
8	**Anexos**		75
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		76
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		75
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		75
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		75

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 033 de fecha 29-06-2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **PERIODO MES:** JULIO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No.: CLP-202105002-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 NIT. 901.543.259-9

PLAZO INICIAL: CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO: 30/12/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN: 13/04/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: NO ASIGNADA A LA FECHA
FECHA DE VENCIMIENTO:
PLAZO ACUMULADO: QUINCE PUNTO CINCUENTA Y SIETE (15.57) MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 2.767.505.806,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 0,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 2.767.505.806,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 807.700.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 0,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: IP-DT-BOY-009-2023 **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimento con Placa Huella no Incluye Cunetas (1.0 km)	Subbase granular clase C	m3	1108,15
	Sello de juntas	ml	6785,80
	Excavaciones varias sin clasificar	m3	969,40
	Concreto resistencia 21MPa (D)	m3	636,40
	Concreto Resistencia 21 MPa (G) (Ciclopeo)	m3	466,20
	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	42453,80
Construcción de Cuneta en Concreto Reforzado (ml)	Subbase granular clase C	m3	296,00
	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	370,00
	Concreto resistencia 21MPa (D)	m3	555,00
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	48100,04
Actividades de Mantenimiento Periódico	Conformación de la calzada existente	m2	99000,00
	Afirmado	m3	402,36

TRAMO	METROS LINEALES
CHICHIPI 1	64,48
CHICHIPI 2	68,83
CHICHIPI 3	65,09
CHICHIPI 4	24,01
CHICHIPI 5	100,35
CHICHIPI 6	61,62
BATEA EL TORO	67,55
TRAPICHE QUEMADO	87,04
SANTA ROSA DANILO MATALLANA	135,29
HOMERO 2	66,5
HOMERO 1	90
SAN PEDRO LA ESCUELA	270,08
CURVA MARCELINO	80
JUAN DURAN	126,59
MORATO	74,34
SANTA ROSA LA ESCUELA	55,22
LA HERRADURA	195,68
SABANETA EL ROBLE 3	114,7
SABANETA EL ROBLE 1	43,67
SABANETA EL ROBLE 2	58,93

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimento con Placa Huella no Incluye Cunetas (1.0 km)	Subbase granular clase C	m3	823,19	823,19
	Sello de juntas	ml	0,00	0,00
	Excavaciones varias sin clasificar	m3	149,72	149,72
	Concreto resistencia 21MPa (D)	m3	254,93	254,93
	Concreto Resistencia 21 MPa (G) (Ciclopeo)	m3	166,92	166,92
	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	11769,16	11769,16
Construcción de Cuneta en Concreto Reforzado (ml)	Subbase granular clase C	m3	200,07	200,07
	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	0,00	0,00
	Concreto resistencia 21MPa (D)	m3	185,64	185,64
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	8605,37	8605,37
Actividades de Mantenimiento Periódico	Conformación de la calzada existente	m2	0,00	0,00
	Afirmado	m3	0,00	0,00

TRAMO	METROS LINEALES	METROS EJECUTADOS
CHICHIPI 1	64,48	
CHICHIPI 2	68,83	
CHICHIPI 3	65,09	
CHICHIPI 4	24,01	
CHICHIPI 5	100,35	
CHICHIPI 6	61,62	
BATEA EL TORO	67,55	
TRAPICHE QUEMADO	87,04	
SANTA ROSA DANILO MATALLANA	135,29	
HOMERO 2	66,5	66,91
HOMERO 1	90	91
SAN PEDRO LA ESCUELA	270,08	270,1
CURVA MARCELINO	80	79,88
JUAN DURAN	126,59	127,95
MORATO	74,34	91,5
SANTA ROSA LA ESCUELA	55,22	
LA HERRADURA	195,68	
SABANETA EL ROBLE 3	114,7	
SABANETA EL ROBLE 1	43,67	
SABANETA EL ROBLE 2	58,93	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 2.660.288.167,00	N/A	$ 2.660.288.167,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 65.447.454,00	$ 12.435.016,00	$ 77.882.470,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 29.335.004,00	N/A	$ 29.335.004,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 2.767.505.641,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 830.210.183,00	$ 0,00	$ 830.210.183,00	$ 830.210.183,00
AJUSTES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 55.000.000,00	$ 10.450.000,00	$ 65.450.000,00	$ 65.450.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR EJECUTADO				$ 895.660.183,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/07/2023 (Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 2.660.288.167,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 830.210.183,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	31,21%


EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**3**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRABAJO DE OFICINA REVISIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS



TRABAJO DE OFICINA REVISIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma ALVARO LARA.

Nombre ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.52202-82168

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1981 DE 2023.

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".


INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°01

PERIODO DEL 18 AL 31 DE JULIO DE 2023

VOLUMEN 01

VERSIÓN 00

RESPONSABLE

ELABORACIÓN	Residente de Interventoría Ing. Nelson Bravo Portilla Mat. 52202-185014 NRÑ	
VALIDACIÓN	Director de Interventoría Ing. Álvaro F. Lara Zambrano Mat. 52202 – 82168 NRÑ	

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	CAPÍTULO	VERSIÓN	CAMBIOS
Julio de 2023.		00	N/A

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 5

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6

2.1 Localización del Proyecto 8

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 9

2.3 Inventario y estado inicial de la vía 9

2.4 Características técnicas del proyecto. 10

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 10

3.1 Información general del contrato 10

3.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato 11

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 12

3.3 Seguimiento de ítems no previstos 12

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 12

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 13

4.1 Informe Semanal 13

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 14

4.3 Personal y Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 15

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 16

4.5 Estado General del Tiempo 17

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 18

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 19

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 20

4.9 Otros documentos seguimiento mensual 21

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 21

4.9.2 Seguimiento Programa de Obra 22

4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones 22

4.9.4 Actas de comité de obra 23

4.9.5 Acta de reunión 23

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 24

5.1 Información general del contrato 24
5.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato 25
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 25
5.3 Informes especialistas y profesionales 25
5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC 25
5.5 Informe Matriz de Riesgos 25
5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría 25
6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 26
6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 26
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 27
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 28
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 29
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 30
6.6 Otros documentos seguimiento mensual 30
6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 30
6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado 30
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 31
8 ANEXOS 32
8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor 32
8.2 Registro fotográfico del avance de las obras 32
8.3 Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas 32
8.4 Bitácora del mes 32

1 INTRODUCCIÓN

Mediante convenio N 1206 de 2021 entre INVIAS y el Municipio de Buenavista acuerdan iniciar el proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIATE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL.

La alcaldía municipal de Buenavista – Boyacá mediante la licitación pública CLP-202105002-2021, suscribió el Contrato de Obra No. CLP-202105002 DE 2021 con el CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIATE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL" por un valor de $2.767.505.806.

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS - ordenó el inicio del contrato No. 1981 de 2023 que tiene por OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL", por un valor de $82.176.975.


El acta de inicio del contrato de interventoría se firmó el 18 de julio de 2023.

El presente documento tiene como fin presentar el desarrollo y seguimiento de las actividades que se llevarán a cabo para el cumplimiento del objeto del contrato.


2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en la zona rural de municipio, el cual presenta una topografía principalmente montañosa y la composición de sus vías están conformadas principalmente por material pétreo en deficientes condiciones, carente de sistemas de drenajes que garanticen la correcta escorrentía de las aguas lluvias.


Como tal el proyecto contempla la construcción de diferentes tramos con una estructura de pavimento compuesta por placa huella, a través de las diferentes veredas mencionadas en la localización del proyecto. Adicional a lo anterior se tiene proyectado actividades de mantenimiento periódico a lo largo de las vías a intervenir. Todos los requisitos y demás especificaciones de los elementos a construir se rigen por los parámetros del Instituto Nacional de Vías INVIAS y específicamente en la Cartilla del Programa de Colombia Rural. A continuación, se presenta las diferentes secciones y/o esquemas generales que hacen parte del proyecto:

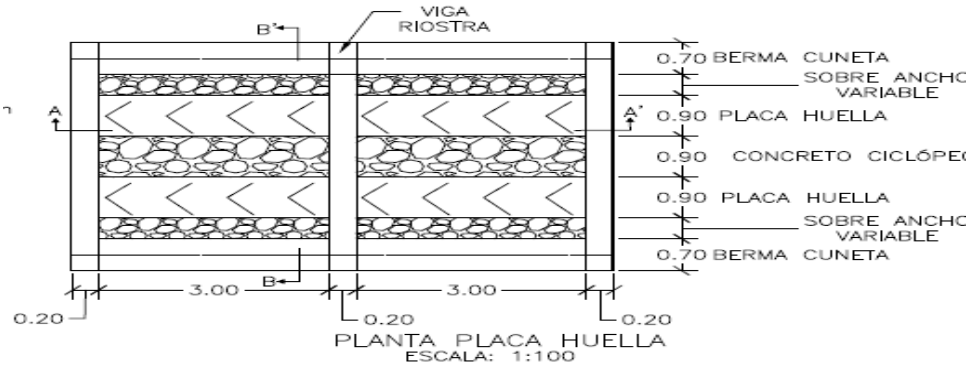


Vista en planta y sección en un tramo recto
Fuente: Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural INVIAS 2022




Sección longitudinal de Placa huella
Fuente: Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural INVIAS 2022



Corte Transversal Placa Huella
Fuente: Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural INVIAS 2020



Corte Longitudinal y transversal Riostra
Fuente: Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural INVIAS 2020

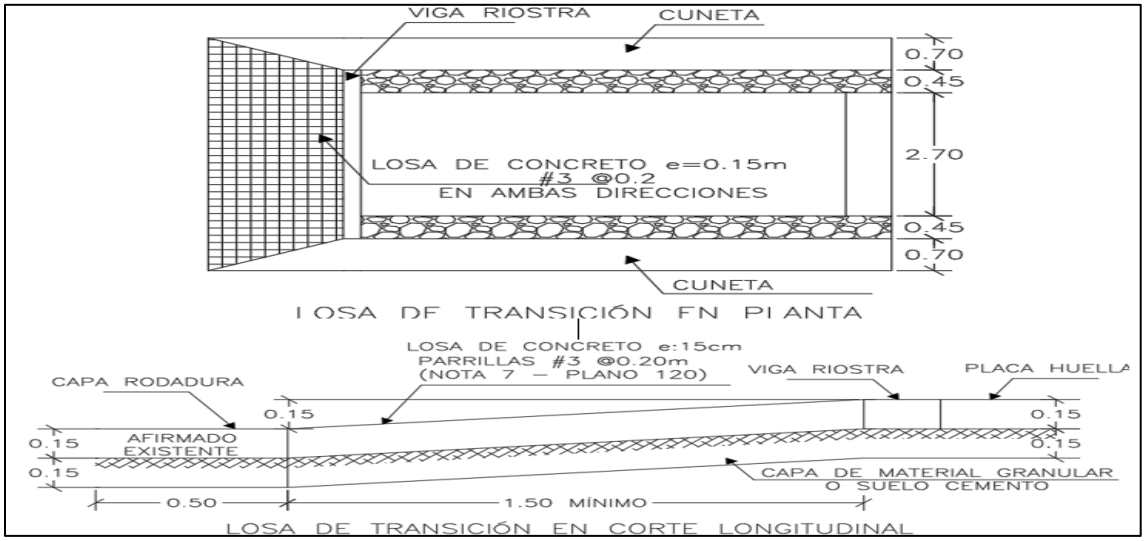

Losa de transición
Fuente: Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural INVIAS 2022

Con el mantenimiento vial realizado se aumentan las condiciones de seguridad para los usuarios de la vía propiciando mejores condiciones de movilidad y conectividad para los habitantes de las zonas.

2.1 Localización del Proyecto

Buenavista es un Municipio Colombiano, ubicado en el departamento de Boyacá, en la provincia de Occidente, está situado a 115 Km de la ciudad de Tunja, capital de departamento y a 30 Km de la ciudad de Chiquinquirá cabecera de la provincia. Es conocido principalmente por sus extensos cultivos frutales, base de la economía del Municipio.

El proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIATE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL", está conformado por diferentes tramos vial del Municipio de Bellavista, del departamento de Boyacá. Éstos se encuentran ubicados en las veredas SARVITH - SAN PEDRO – IMPARAL – HERRADURA – SABANETA - SANTA ROSA-CONCEPCIÓN, en la siguiente figura se presenta la localización, coordenadas y una longitud aproximada de los tramos de estudio descrito.

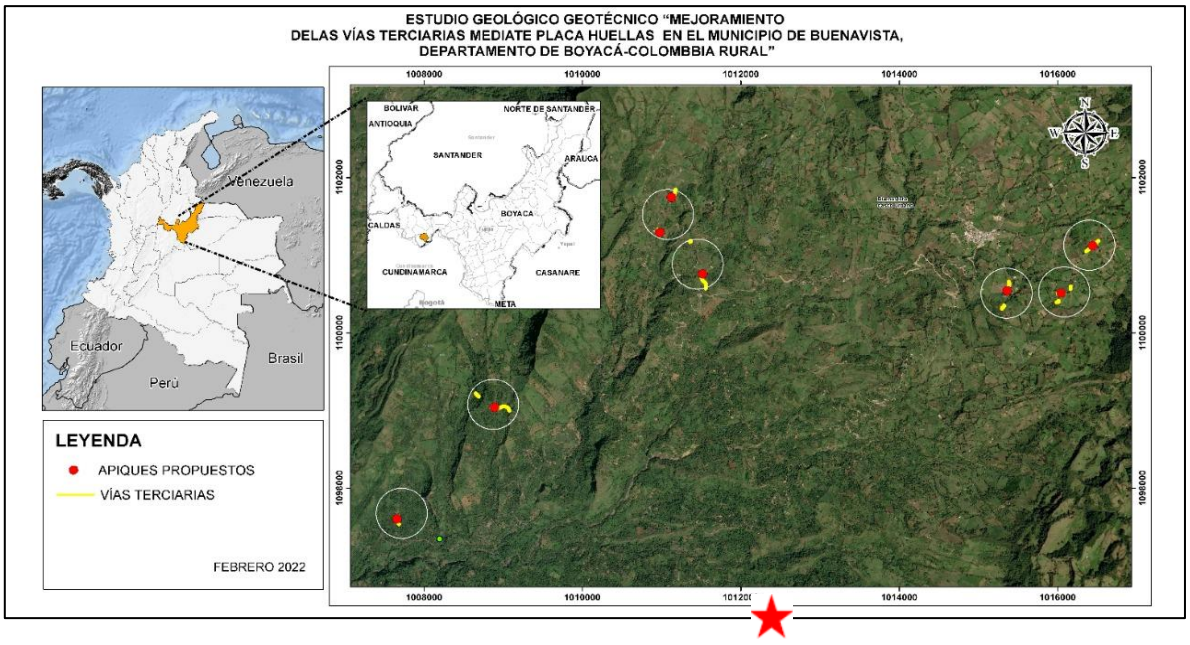


Figura 1. Localización de las vías a realizar intervención

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

El proyecto se encuentra localizado en el Municipio de Buenavista Boyacá, los Municipios cercanos son Otanche y Yacopí; la población de estos Municipios se beneficiará con los mejoramientos viales y conexión entre ellos.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía

Los sectores a intervenir son vías terciarias que se encuentran en material recebo, en su mayoría en mal estado, se tiene las longitudes a intervenir conforme al proyecto y las ya intervenidas por el contratista.

CONSOLIDADO TRAMOS A MEJORAR	LONGITUD TRAMO (M)	EJECUTADO (M)
CHICHIPI 1	64.48	
CHICHIPI 2	68,83	
CHICHIPI 3	65,09	
CHICHIPI 4	24,01	
CHICHIPI 5	100,35	
CHICHIPI 6	61,62	
BATEA EL TORO	67.55	
TRAPICHE QUEMADO	87,04	
SANTA ROSA DANILO MATALLANA	135,29	
HOMERO 2	66,5	66.91
HOMERO 1	90	91
SANPEDRO LA ESCUELA	270,08	270.1
CURVA MARCELINO	80	79.88
JUAN DURAN	126.59	127.95
MORATO	74,34	91.5
SANTA ROSA LA ESCUELA	55,22	
LA HERRADURA	195.68	
SABANETA EL ROBLE 3	114,7	
SABANETA EL ROBLE 1	43,67	
SABANETA EL ROBLE 2	58,96	
	1850,00	727.34

2.4 Características técnicas del proyecto.

El proyecto cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - COLOMBIA RURAL, contempla la intervención de puntos críticos identificados y ubicados en:

CURVA MARCELINO, HOMERO 1, HOMERO 2, SAN PEDRO LA ESCUELA, JUAN DURAN, MORATO, CHICHIPI 1, CHICHIPI 2, CHICHIPI 3, CHICHIPI 4, CHICHIPI 5 Y CHICHIPI 6, SABANETA EL ROBLE 1, SABANETA EL ROBLE 2 Y SABANETA EL ROBLE 3, SANTA ROSA LA ESCUELA, SANTA ROSA DANILO MATALLANA, TRAPICHE QUEMADO, BATEA EL TORO, LA HERRADURA

EL proyecto contempla la construcción de diferentes tramos con una estructura de pavimento compuesta por placa huella. Con la construcción de estas obras se aumenta las condiciones de seguridad para los usuarios de la vía y propiciando mejores condiciones de movilidad y conectividad para los habitantes de la zona.

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

A continuación, se relacionan los datos generales del contrato de obra N° CLP-202105002-2021.

Tabla 1. Información General del Contrato

TIPO DE PROCESO:	LICITACIÓN PUBLICA
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
NUMERO DE CONTRATO:	CLP-202105002 DE 2021
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUENAVISTA - BOYACÁ
NIT DEL CONTRATANTE:	891.808.260-0
NOMBRE CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021
NIT DEL CONTRATISTA:	901.543.259-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON RONAL VELANDIA ROMERO
OBJETO DEL CONTRATO:	“MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA,

	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL”
VALOR INICIAL:	$ 2.767.505.806 M/CTE
VALOR ADICIÓN:	$ -
VALOR TOTAL:	$ 2.767.505.806 M/CTE
PLAZO EJECUCIÓN:	5 MESES (SIN EXCEDER 31 JULIO 2022)
ANTICIPO:	$ 807.700.000,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/05/2022
PRORROGA No. 1:	SESENTA Y DOS (62) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31/JUL/2022
PRORROGA No. 2:	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	31/AGO/2022
PRORROGA No. 3:	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	31/OCT/2022
PRORROGA No. 4:	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	31/DIC/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	31/DIC/2022
FECHA DE REINICIO No. 1:	10/ENE/2023
PRORROGA No. 5	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	28/FEB/2023
PRORROGA No. 6:	UNO PUNTO CINCO (1,5) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 6:	15/ABR/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2:	13/ABR/2023

Fuente: Elaboración Propia

3.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato

A la fecha de elaboración del presente informe, se han presentado 6 prórrogas al contrato de Obra, conforme a la cual quedan 2 días de ejecución; el contrato se encuentra en la suspensión N 2 de fecha 13 de abril de 2023, la cual no tiene fecha prevista de reinicio.

TIPO DE ACTA Y/O MODIFICATORIO	FECHA	PLAZO
PRORROGA 1	27/05/2022	62 DÍAS CALENDARIO
PRORROGA 2	29/07/2022	1 MES
PRORROGA 3	31/08/2022	2 MESES
PRORROGA 4	28/10/2022	2 MESES
PRORROGA 5	10/01/2023	2 MESES
PRORROGA 6	28/02/2023	1,5 MESES

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Para el periodo comprendido entre el 18 al 31 de julio, se realizaron las siguientes actividades:

Semana N° 01: del 18 al 24 de julio

- Reunión inicial del proyecto.
- Firma del acta de inicio.

Semana N° 02: del 25 al 31 de julio

- Entrega de información por parte del contratista para la revisión de estudios y diseños.
- Inicio de la revisión de documentación entregada por el contratista.

3.3 Seguimiento de ítems no previstos

No se ha realizado inclusión de ítems no previstos a la fecha.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

A la fecha el contrato de obra se encuentra en suspensión con un avance del 23.80% del total de ejecución de obra.

Se realiza la revisión a los ajustes a diseños realizados por el contratista.

Se continuará con el acompañamiento a la ejecución de las actividades por parte de la interventoría.

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informe Semanal

Para ver los informes semanales del proyecto se utiliza el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 del Manual de Interventoría del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 24/07/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ — SEMANA No.: 68 del 18/07/2023 al 24/07/2023 — Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTA — **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** CAMILO ALFONSO ESPINOSA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES EL MEJORAMIENTO DE 1.85 KM DE VÍA TERCIARIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS, JUNTO CON SUS OBRAS DE DRENAJES (CUNETAS) Y EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE 16.5 KM MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

PAVIMENTACIÓN MEDIANTE PLACA HUELLAS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE (CUNETAS) Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 NIT. 901.543.259-9			**INTERVENTOR:**	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3		
INTEGRANTES:	60% CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JYM S.A.S. / 40% SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EMCONSUT S.A.S.			**INTEGRANTES:**	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO		
CONTRATO No.	CLP-202105002-2021	**VALOR INICIAL:**	$ 2.767.505.806,00	**CONTRATO No.**	IP-DT-BOY-009-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 82.176.975,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2021	**VALOR ADICIONES:**		**FECHA DE INICIO:**	18/07/2023	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/05/2022	**VALOR ACUMULADO:**	$ 2.767.505.806,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	17/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 82.176.975,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/12/2023	**VALOR ANTICIPO:**	$ 807.700.000,00	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	17/12/2023	**VALOR ANTICIPO:**	
		VALOR AMORTIZADO:				**VALOR AMORTIZADO:**	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 807.700.000,00			**SALDO POR AMORTIZAR:**	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 82.176.975,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 82.176.975,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.660.288.332,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.510.317.301,10	94,36%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 633.278.481,00	23,80%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-$ 1.877.038.820,10	-70,56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 27.500.000,00	50,00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.510.317.301,10	94,36%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 633.278.481,00	23,80%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	-$ 1.877.038.820,10	-70,56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 525.149.013,27	19,740%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: NO SE HA FACTURADO NADA

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.176.975,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.108.848,75	5,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.108.848,75	5,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.108.848,75	5,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	807.700.000,00
Amortizado $		
Saldo $	$	807.700.000,00

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 94,36%

Meta Física Ejecutada % 23,80%

Avance o Atraso Físico % -70,56%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada											
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**CURVA MARCELINO**	**HOMERO 1**	**HOMERO 2**	**SAN PEDRO LA ESCUELA**	**MORATO**	**JUAN DURAN**	**TOTAL**	**%**	**Descripción**	**Equipo Mínimo**	**Total Disponible**
PAVIMENTO CON PLACA HUELLA NO INCLUYE CUNETAS	KM	1,85	2023		Prog	79,88	91,00	66,91	270,10	91,50	127,95	727,34	39,32%	MOTONIVELADORA	1	
					Ejec	79,88	91,00	66,91	270,10	91,50	127,95	727,34	39,32%	VIBRO COMPACTADOR	1	
CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO REFORZADO	ML	3700	2023		Prog	159,76	182,00	133,82	540,20	183,00	255,90	1454,68	39,32%	RETRO EXCAVADORA	1	
					Ejec	159,76	182,00	133,82	540,20	183,00	255,90	1454,68	39,32%	VOLQUETA SENCILLA	2	
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	99000	2023		Prog									MEZCLADORA DE CONCRETO	4	
					Ejec											
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO	M3	402,36	2023		Prog											
					Ejec											
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	GL	1	2023		Prog											
					Ejec											
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA	GL	1	2023		Prog							1,00	50,00%			
					Ejec							1,00	50,00%			
														Total		
														Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: "CURVA MARCELINO"

TRAMO Y/O SECTOR 2: "HOMERO 1"

TRAMO Y/O SECTOR 3: "HOMERO 2"

TRAMO Y/O SECTOR 4: "SAN PEDRO LA ESCUELA"

TRAMO Y/O SECTOR 5: "MORATO"

TRAMO Y/O SECTOR 6: "JUAN DURAN"

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA EL TRIANGULO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	PAUNA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO X	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	

OBSERVACIONES: EN ESTUDIO POR PARTE DEL CONTRATISTA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: EL CONSORCIO AIRCPT 2021 SOLICITÓ EL CIERRE DEL PAGA A CORTE 17/04/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, POR LO CUAL SE REVISÓ EL PAGA POR ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO Y SE ENVIÓ NUEVAMENTE A LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL LA APROBACIÓN DEL MISMO.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A

AVALÚOS APROBADOS: N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATO DE OBRA No. CLP-202105002-2021, AL CUAL SE LE EJERCE LA INTERVENTORÍA EXTERNA, SE ENCUENTRA SUSPENDIDO ENTRE EL CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DESDE EL PASADO 13 DE ABRIL DE 2023, SIN HASTA LA FECHA TENER ACTA DE REINICIO; PARA EL PRESENTE INFORME SEMANAL NO SE DETALLA NINGÚN PORCENTAJE DE AVANCE NI REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA ALGUNA, SITUACIÓN QUE SE TOMA COMO REFERENCIA LOS PORCENTAJES DE AVANCES Y RENDIMIENTOS ESTABLECIDOS HASTA EL 12 DE ABRIL DE 2023.
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA LA SEMANA DEL PRESENTE INFORME CONSISTIÓ EN ASISTIR A COMITÉS TÉCNICO EN LAS OFICINAS DEL CONSOCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021, PARA DETERMINAR LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE CON RESPECTO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*SE PROGRAMARON ACTIVIDADES EN CONJUNTO CON LOS PROFESIONALES QUE HACEN PARTE DEL CONSOCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021, PARA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CON RESPECTO A LA TOPOGRAFIA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

A la fecha se tiene un avance programado en obra del 94,36 % teniendo en cuenta la reprogramación por prorroga 6 y presenta un avance ejecutado del 23,80 %, con un atraso del 70,56 %.
Ejecución en Agosto un solo tramo "Curva Marcelino" Tramo 1
Ejecución en Septiembre un solo tramo "Homero 1" Tramo 2
Ejecución en Octubre desde el 24 de Octubre un solo tramo " Homero 2" Tramo 3
Ejecución en Diciembre desde el 04 de Noviembre un solo tramo " San Pedro la Escuela" Tramo 4
Ejecución en Enero se encuentra suspendida, mediante acta de suspensión 1 desde el 31 de Diciembre de 2022, hasta el 09 de Enero de 2023.
Ejecución de actividades de Febrero se da terminación a la construcción de placa huella Tramo 5, "Morato".
Ejecucion de actividades mes de Marzo, se da terminación a la construcción de la placa huella tramo Juan Duran
Se suspenden actividades de obra mediante acta de Suspensión No.2 del 13 de abril de 2023

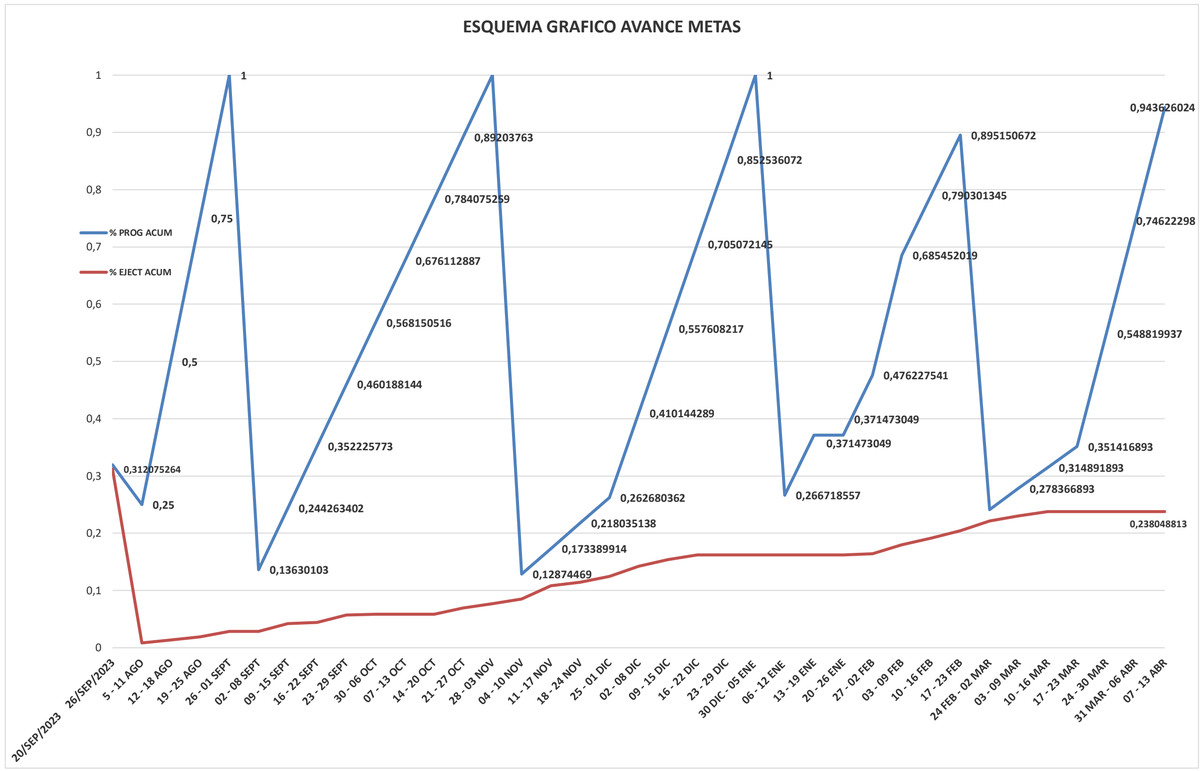

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Dar seguimiento y control con la ejecución de obras, verificando los trabajos realizados y la calidad de los mismos.		FIRMA ALVARO LARA NOMBRE: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO Matrícula Profesional No.: 52202-82168

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 31/07/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ — SEMANA No.: 69 del 25/07/2023 al 31/07/2023 — Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTA — **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** CAMILO ALFONSO ESPINOSA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES EL MEJORAMIENTO DE 1.85 KM DE VÍA TERCIARIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS, JUNTO CON SUS OBRAS DE DRENAJES (CUNETAS) Y EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE 16.5 KM MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

PAVIMENTACIÓN MEDIANTE PLACA HUELLAS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE (CUNETAS) Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 NIT. 901.543.259-9			**INTERVENTOR:**	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3		
INTEGRANTES:	60% CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JYM S.A.S. / 40% SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EMCONSUT S.A.S.			**INTEGRANTES:**	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO		
CONTRATO No.	CLP-202105002-2021	**VALOR INICIAL:**	$ 2.767.505.806,00	**CONTRATO No.**	IP-DT-BOY-009-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 82.176.975,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2021	**VALOR ADICIONES:**		**FECHA DE INICIO:**	18/07/2023	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/05/2022	**VALOR ACUMULADO:**	$ 2.767.505.806,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	17/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 82.176.975,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/12/2023	**VALOR ANTICIPO:**	$ 807.700.000,00	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	17/12/2023	**VALOR ANTICIPO:**	
		VALOR AMORTIZADO:				**VALOR AMORTIZADO:**	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 807.700.000,00			**SALDO POR AMORTIZAR:**	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 82.176.975,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 82.176.975,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.660.288.332,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.510.317.301,10	94,36%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 633.278.481,00	23,80%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-$ 1.877.038.820,10	-70,56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 27.500.000,00	50,00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.510.317.301,10	94,36%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 633.278.481,00	23,80%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	-$ 1.877.038.820,10	-70,56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 525.149.013,27	19,740%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: NO SE HA FACTURADO NADA

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.176.975,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.217.697,50	10,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.108.848,75	5,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.108.848,75	5,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	807.700.000,00
Amortizado $		
Saldo $	$	807.700.000,00

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 94,36%
Meta Física Ejecutada % 23,80%
Avance o Atraso Físico % -70,56%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada											
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**CURVA MARCELINO**	**HOMERO 1**	**HOMERO 2**	**SAN PEDRO LA ESCUELA**	**MORATO**	**JUAN DURAN**	**TOTAL**	**%**	**Descripción**	**Equipo Mínimo**	**Total Disponible**
PAVIMENTO CON PLACA HUELLA NO INCLUYE CUNETAS	KM	1,85	2023		Prog	79,88	91,00	66,91	270,10	91,50	127,95	727,34	39,32%	MOTONIVELADORA	1	
					Ejec	79,88	91,00	66,91	270,10	91,50	127,95	727,34	39,32%	VIBRO COMPACTADOR	1	
CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO REFORZADO	ML	3700	2023		Prog	159,76	182,00	133,82	540,20	183,00	255,90	1454,68	39,32%	RETRO EXCAVADORA	1	
					Ejec	159,76	182,00	133,82	540,20	183,00	255,90	1454,68	39,32%	VOLQUETA SENCILLA	2	
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	99000	2023		Prog									MEZCLADORA DE CONCRETO	4	
					Ejec											
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO	M3	402,36	2023		Prog											
					Ejec											
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	GL	1	2023		Prog											
					Ejec											
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA	GL	1	2023		Prog							1,00	50,00%			
					Ejec							1,00	50,00%			
														Total		
														Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: "CURVA MARCELINO"
TRAMO Y/O SECTOR 2: "HOMERO 1"
TRAMO Y/O SECTOR 3: "HOMERO 2"
TRAMO Y/O SECTOR 4: "SAN PEDRO LA ESCUELA"
TRAMO Y/O SECTOR 5: "MORATO"
TRAMO Y/O SECTOR 6: "JUAN DURAN"

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	CANTERA EL TRIANGULO	PERMISO MINERO:	SI X	NO		
	PAUNA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		
UBICACIÓN:	LA ESMERALDA	PERMISO MINERO:	SI	NO X		
	SIMIJACA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X		

OBSERVACIONES: EN ESTUDIO POR PARTE DEL CONTRATISTA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: EL CONSORCIO AIRCPT 2021 SOLICITÓ EL CIERRE DEL PAGA A CORTE 17/04/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, POR LO CUAL SE REVISÓ EL PAGA POR ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO Y SE ENVIÓ NUEVAMENTE A LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL LA APROBACIÓN DEL MISMO.
SE REALIZAN INFORMES TRIMESTRALES.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE LA REVISIÓN A TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE HACE PARTE A LA REVISIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CON RESPECTO A LA TOPOGRAFÍA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*SE PROGRAMARON ACTIVIDADES EN CONJUNTO CON LOS PROFESIONALES QUE HACEN PARTE DEL CONSOCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021, PARA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CON RESPECTO AL DISEÑO GEOMÉTRICO Y ESTRUCTURAL.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

A la fecha se tiene un avance programado en obra del 94,36 % teniendo en cuenta la reprogramación por prorroga 6 y presenta un avance ejecutado del 23,80 %, con un atraso del 70,56 %.
Ejecución en Agosto un solo tramo "Curva Marcelino" Tramo 1
Ejecución en Septiembre un solo tramo "Homero 1" Tramo 2
Ejecución en Octubre desde el 24 de Octubre un solo tramo " Homero 2" Tramo 3
Ejecución en Diciembre desde el 04 de Noviembre un solo tramo " San Pedro la Escuela" Tramo 4
Ejecución en Enero se encuentra suspendida, mediante acta de suspensión 1 desde el 31 de Diciembre de 2022, hasta el 09 de Enero de 2023.
Ejecución de actividades de Febrero se da terminación a la construcción de placa huella Tramo 5, "Morato".
Ejecucion de actividades mes de Marzo, se da terminación a la construcción de la placa huella tramo Juan Duran
Se suspenden actividades de obra mediante acta de Suspensión No.2 del 13 de abril de 2023

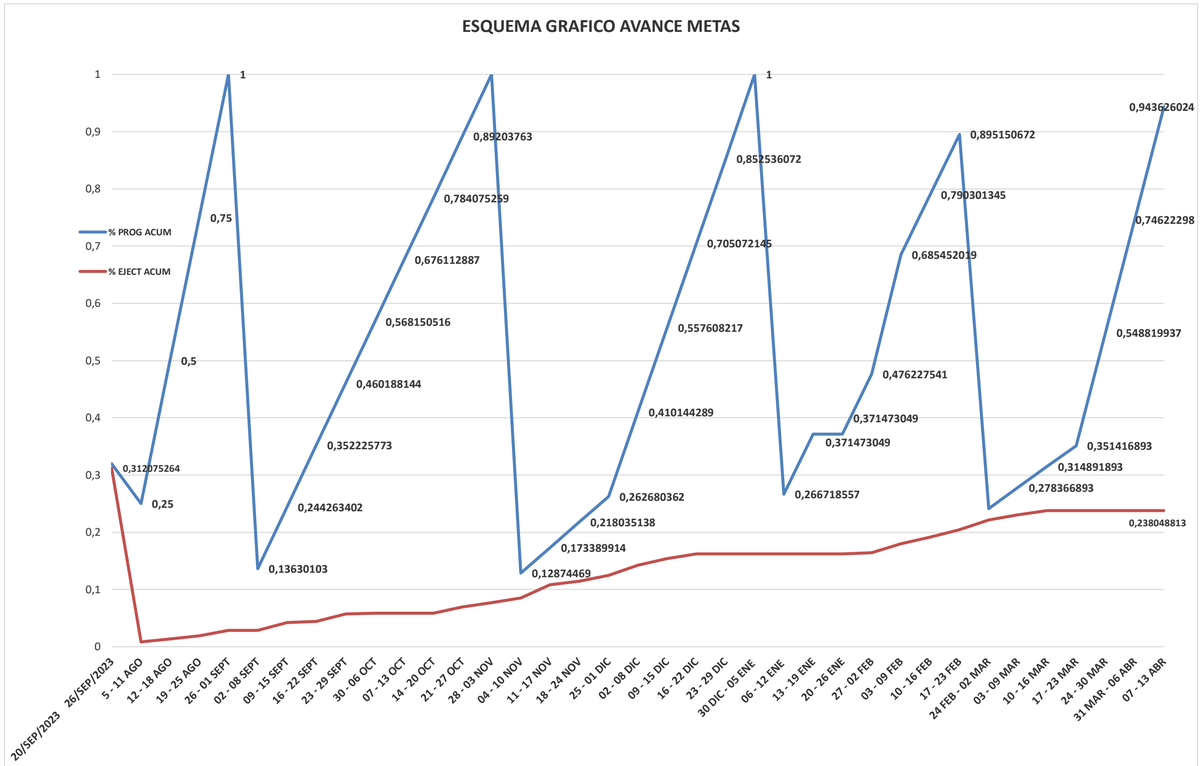

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Dar seguimiento y control con la ejecución de obras, verificando los trabajos realizados y la calidad de los mismos.		FIRMA Alvaro Lara. NOMBRE: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO Matrícula Profesional No.: 52202-82168

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Para ver el control de maquinaria y equipo del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 del Manual de Interventoría del INVIAS, para el presente periodo la maquinaria se encontraba disponible pero inactiva por la suspensión de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 05/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

CONTRATO No. CLP-202105002-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 NIT. 901.543.259-9

CONTRATO INTERVENTORÍA No. IP-DT-BOY-009-2023

INTERVENTORÍA: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																										
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 670 CH		BVISTA																		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
VIBROCOMPACTADOR		10 TON.	BVISTA																		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
RETROEXCAVADORA		416	BVISTA																		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
VOLQUETA		7 M3	BVISTA																		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
VOLQUETA		7 M3	BVISTA																		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL ACTIVO																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUSPENSIÓN																					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	65	100.00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0.00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0.00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0.00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUSPENSIÓN = S	65	100.00%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. S=SUSPENSION CONTRATO**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): NO SE UTILIZÓ MAQUINARIA DEBIDO A QUE NO SE HA REINICIADO ACTIVIDADES DE OBRA FÍSICA EN EL TERRENO

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ERIC ALBERTO SANDOVAL GUTIERREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-303424 NTS

Firma
Nombre: NELSON GERARDO BRAVO PORTILLA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-185014 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3 Personal y Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Para ver el control de personal del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 del Manual de Interventoría del INVIAS, para el presente periodo no se encuentra personal de obra laborando.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 05/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: CLP-202105002-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 NIT. 901.543.259-9

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: IP-DT-BOY-009-2023 **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3

NOMBRE ARL: N.A. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** N.A.

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JHON RONAL VELANDIA ROMERO	80108028	RL / CONSORCIO																																						

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN POR LO CUAL NO TIENE PERSONAL VINCULADO

El contratista adjunta la certificación de fecha JULIO/2023 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:MANUEL PATARROLLO MALAGON
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-17776 CUND

Firma
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-82168

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Para ver el informe financiero y presupuestal del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 del Manual de Interventoría del INVIAS, se presenta la ejecución a la fecha.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 05/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: CLP-202105002-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 NIT. 901.543.259-9

MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1981-2023

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	202111033	2306010202		NACION	CLP-202105002-2021	$ 2.767.505.806	$ 2.767.505.806
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.767.505.806,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
	ANTICIPO	ene-22	$ 807.700.000,00	$ 0,00	$ 807.700.000,00			$ 807.700.000,00	202111033 de 2021	$ 1.959.805.806	$ 1.959.805.806				
TOTALES			**$ 807.700.000**	**$ 0**	**$ 807.700.000**	**$ 0**	**$ 0,00**			**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTA: AL MES DE JULIO DE 2023 NO SE HAN COBRADO ACTAS PARCIALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ANTICIPO	$ 807.700.000	$ -	**$ 807.700.000**
*			**$ 0**
*			**$ 0**
*			**$ 0**
*			**$ 0**
*			**$ 0**
*			
VALOR TOTAL	$ 807.700.000	$ 0	**$ 807.700.000**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MANUEL PATARROLLO MALAGON
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:25202-17776 CUND

Firma
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-82168

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 Estado General del Tiempo

Para ver el informe del estado general del tiempo del contrato se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 del Manual de Interventoría del INVIAS, en el periodo de ejecución como no se desarrollaron actividades de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 05/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: CLP-202105002-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 NIT. 901.543.259-9

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: IP-DT-BOY-009-2023 **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
Seco																		24	24	24	24	24	24	18	24	24	24	24	24	24	306
Lluvias moderadas																		0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
Lluvias intensas																		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
Total horas																		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: ERIC ALBERTO SANDOVAL GUTIERREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:68202-095264 NTS

Firma
Nombre: NELSON GERARDO BRAVO PORTILLA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-185014 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Codigo Estacion	Nombre Estacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	Area Operativa	Departamento	Municipio	Fecha Instalacion	Fecha Suspension	IdParametro	Etiqueta	Descripcion Serie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Calificador	Nivel Aprobacion
23125100	BUENAVISTA	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 6 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993	0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/07/2023	0:00	0	50	900
23125100	BUENAVISTA	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 6 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993	0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/07/2023	0:00	0	50	900
23125100	BUENAVISTA	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 6 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993	0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/07/2023	0:00	0	50	900
23125100	BUENAVISTA	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 6 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993	0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/07/2023	0:00	0	50	900
23125100	BUENAVISTA	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 6 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993	0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/07/2023	0:00	0	50	900
23125100	BUENAVISTA	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 6 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993	0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/07/2023	0:00	0	50	900
23125100	BUENAVISTA	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 6 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993	0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/07/2023	0:00	0	50	900
23125100	BUENAVISTA	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 6 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993	0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/07/2023	0:00	0.7	50	900
23125100	BUENAVISTA	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 6 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993	0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/07/2023	0:00	13.5	50	900
23125100	BUENAVISTA	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 6 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993	0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/07/2023	0:00	0	50	900
23125100	BUENAVISTA	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 6 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993	0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/07/2023	0:00	0	50	900
23125100	BUENAVISTA	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 6 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993	0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/07/2023	0:00	0	50	900
23125100	BUENAVISTA	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 6 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993	0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	30/07/2023	0:00	0	50	900
23125100	BUENAVISTA	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 6 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993	0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	31/07/2023	0:00	0	50	900

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Para ver el informe del resumen de ensayos de laboratorio se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del Manual de Interventoría del INVIAS, para el presente periodo no hay seguimiento debido a la suspensión del contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1

FECHA: 05/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No.: CLP-202105002-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 NIT. 901.543.259-9

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: IP-DT-BOY-009-2023 **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	29/09/2023	Granulometrías, Límites, Proctor	INVE	Materila Base granular	3		PRODUCTO CONFORME	SI	

OBSERVACIONES:

EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre:MANUEL PATARROLLO MALAGON
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-17776 CND

Firma

Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-82168 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Para ver el informe de seguimiento de garantías y seguros del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 del Manual de Interventoría del INVIAS, se relacionan las garantías a la fecha del presente informe.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA	5 (Día)	8 (Mes)	2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No. CLP-202105002-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 30/12/2021

PLAZO INICIAL: 5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/04/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.767.505.806,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.767.505.806,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 77.882.470,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 77.882.470,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1981-2023 **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 276.750.581	30	12	2021	30	11	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100,00%	$ 807.700.000	30	12	2021	30	11	2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 553.501.161	30	12	2021	30	5	2025
Calidad del servicio	0,60%	$ 16.500.000	30	12	2021	30	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 830.251.742	30	12	2021	30	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101001649

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 08/02/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	13,13%	$ 363.410.400	30	12	2021	30	5	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 57-40-101000629 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 08/02/2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA	5 (Día)	8 (Mes)	2023 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 6 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 276.750.581	30	12	2023	30	9	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100,00%	$ 807.700.000	30	12	2021	30	9	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 553.501.161	30	12	2021	5	5	2026
Calidad del servicio	0,60%	$ 16.500.000	30	12	2021	30	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 830.251.742	30	12	2021	30	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101001649

Certificado de modificación o anexo No.: 14

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 08/03/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	13,13%	$ 363.410.400	30	12	2021	30	4	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 57-40-101000629 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 9

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 08/03/2023

OBSERVACIONES:

LA ÚLTIMA GARANTÍA APROBADA A LA FECHA ES LA DE PRÓRROGA N 6, EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-82168 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-44-101001649	14

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	03	2023	30	12	2021	00:00	30	12	2026	23:59	ANULACION DE ANEXO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021		NIT: 901.543.259-9
DIRECCIÓN: CR 29 NRO. 16 - 34	CIUDAD: ARAUCA, ARAUCA	TELÉFONO:	3165783210

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE BUENAVISTA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2		NIT: 891.808.260-0
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 4 - 44	CIUDAD: BUENAVISTA, BOYACA	TELÉFONO	7265631

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES CONTRACTUALES SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA N CLP-202105002 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL.

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA OPERA CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA CUAL LA ENTIDAD ESTATAL RECIBE A SATISFACCION LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/09/2023	30/09/2023	$276,750,580.60	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/12/2021	30/09/2023	$807,700,000.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2021	05/05/2026	$553,501,161.20	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/12/2021	30/12/2026	$830,251,741.80	
CALIDAD DEL SERVICIO	30/12/2021	30/12/2026	$16,500,000.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE SE ANULA EL ANEXO NO. 13, YA QUE ESTA COBRANDO UNA PRIMA MUY ALTA QUE NO CORRESPONDE A ESTE MOVIMIENTO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(8,836,656.00)	$ *****(8,000.00)	$ *(1,680,484.00)	$ ******(10,525,141.00)	$ **(2,484,703,483.60)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA	153990	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-44-101001649

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-40-101000629	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	03	2023	30	12	2021	00:00	30	04	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021		NIT: 901.543.259-9
DIRECCIÓN: CR 29 NRO. 16 - 34	CIUDAD: ARAUCA, ARAUCA	TELÉFONO:	3165783210

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE BUENAVISTA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2		NIT: 891.808.260-0
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 4 - 44	CIUDAD: BUENAVISTA, BOYACA	TELÉFONO	7265631
BENEFICIARIO:	891808260 - MUNICIPIO DE BUENAVISTA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N 202105002 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**30/12/2021**	**30/04/2023**	**$363,410,400.00**	**$363,410,400.00**

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA SEGUN PRORROGA N 006 FIRMADA EL 28 DE FEBRERO DE 2023 ASI:
TIEMPO EN PRORROGA N 06 = UN (1.5) MES Y MEDIO
FECHA DE TERMINACION SEGUN PRORROGA N 06 = 15 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE PRORROGA FEBRERO 28 DE 2023.
TODO LO DEMAS NO MODIFICADO CONTINUA VIGENTE

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******91,599.00	$ *******3,000.00	$ ******17,973.00	$ **********112,573.00	$ ******363,410,400.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA	153990	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-40-101000629

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Para ver el informe de seguimiento al plan de calidad del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 del Manual de Interventoría del INVIAS, para el presente periodo no se realiza seguimiento de calidad por la suspensión de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 05/08/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No. CLP-202105002-2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUVIAL RURAL MUZO

FECHA DE INICIO: 30/12/2021 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 5 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/04/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: IP-DT-BOY-009-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X N ---------- APROBADO: SI X NO ----- VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: 27/01/2022

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI --------- N ----------

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI --------- N ----------

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: .....
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: .....

FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ----- N ---------

APROBADO: SI ----- N -----

FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 1

No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 3

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ----- N -----

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: .....

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: .....

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: .....

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: .....

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: .....

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: .....

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: .....

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: .....

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: .....

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: .....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Manuel Patarroyo Malagón	Nombre:	Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-17776 CUND	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 52202-82168	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

El anticipo de obra fue girado con el acta de inicio por un valor de $807.700.000, del cual esta interventoría recibió el contrato con un anticipo girado por valor de $432.407.764.

A la fecha el contrato se encuentra en suspensión, por lo cual no se tiene solicitudes de inversión de anticipo, se anexa informe formato MEPI-MN1-IN-2-FR-2.

Se relaciona información del estado actual del anticipo.

En relación a la cuenta convenio a cargo del Municipio de Buenavista Boyacá se relaciona los rendimientos devueltos por la entidad a corte abril de 2023, se anexa extracto bancario del mes de julio de 2023.

DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA DEVOLUCIÓN
Descuentos	$13.277,35	23/05/2022
Rendimientos julio 2021 a abril 2022	$1.310.294,35	29/06/2022
Rendimientos julio 2021 a abril 2022 repetidos	$1.310.294,35	13/10/2022
Rendimientos mayo de 2022 a agosto 2022	$1.822.485,02	24/10/2022
Rendimientos septiembre de 2022 hasta abril 2023	$2.445.993,24	29/05/2023
TOTAL	$6.889.066,96	

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 35500000387

SUCURSAL SIMIJACA

CORREDOR VIAL MUNICIPIO DE BUENAVISTA

CL 4 4 44

BUENAVISTA (BOYACA) BOYACA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	2,078,245,926.49	*SALDO PROMEDIO*	$	2,078,408,631
TOTAL ABONOS	$	476,539.76	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	2,078,722,466.25	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/07	ABONO INTERESES CUENTA CTE			56,938.84	2,078,302,865.33
6/07	PAGO DE PROV PA FIDU BANCOLO			123,476.20	2,078,426,341.53
31/07	ABONO INTERESES CUENTA CTE			296,124.72	2,078,722,466.25
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2 .

FECHA: 05/08/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. CLP 202105002 DE 2021
(Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 14725 **DE** 2021 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 31700002004 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: 317
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 29,19 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 807.700.000,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA , DEPARTAMENTO DE BOYACA- COLOMBIA RURAL "

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1981 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
PROFORMA	1	23-may-22	AGREGADOS EL TRIANGULO SAS	$ 100.000.000,00	1	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA	FEI 11728	31-may-22	COMERCIALIZADORA EL IMPERIO	$ 59.963.235,00	1	COMPRA DE MATERIALES
PROFORMA	2036567322	11-jun-22	ACERIA PAZ DEL RIO	$ 188.496.000,00	1	COMPRA DE MATERIALES
PROFORMA	CT1 13	24-jun-22	COMERCIALIZADORA EL IMPERIO	$ 83.948.529,00	1	COMPRA DE MATERIALES
				$ 432.407.764,00		

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	COMPRA DE MATERIALES	$ 532.408.364,00	$ 432.407.764,00	$ -	$ 432.407.764,00	$ 100.000.600,00
2	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 275.291.636,00	$ -	$ -	$ -	$ 275.291.636,00
	TOTALES	$ 807.700.000,00	$ 432.407.764,00	$ -	$ 432.407.764,00	$ 375.292.236,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (JUNIO) : $ 123.476,20
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 2.843.843,69
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
EXTRACTO FEBRERO 2022		$ 11.042,25	feb-22	11/03/2022	$ 11.042,25
EXTRACTO MARZO 2022		$ 342.381,44	mar-22	12/04/2022	$ 353.423,69
EXTRACTO ABRIL 2022		$ 331.417,21	abr-22	13/05/2022	$ 684.840,90
EXTRACTO MAYO 2022		$ 342.433,39	may-22	09/06/2022	$ 1.027.274,29
EXTRACTO JUNIO 2022		$ 281.080,48	jun-22	14/07/2022	$ 1.308.354,77
EXTRACTO JULIO 2022		$ 160.846,50	jul-22	09/08/2022	$ 1.469.201,27
EXTRACTO AGOSTO 2022		$ 127.590,20	ago-22	08/09/2022	$ 1.596.791,47
EXTRACTO SEPTIEMBRE 2022		$ 123.469,70	sep-22	07/10/2022	$ 1.720.261,17
EXTRACTO OCTUBRE 2022		$ 127.583,90	oct-22	08/11/2022	$ 1.847.845,07
EXTRACTO NOVIEMBRE 2022		$ 123.469,40	nov-22	12/12/2022	$ 1.971.314,47
EXTRACTO DICIEMBRE 2022		$ 127.590,37	dic-22	12/01/2023	$ 2.098.904,84

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2 .

FECHA 05/08/2023
(Día / Mes / Año)

EXTRACTO ENERO 2023		$	127.590,71	ene-23	07/02/2023	$ 2.226.495,55
EXTRACTO FEBRERO 2023		$	115.235,68	feb-23	06/03/2023	$ 2.341.731,23
EXTRACTO MARZO 2023		$	127.581,32	mar-23	05/04/2023	$ 2.469.312,55
EXTRACTO ABRIL 2023		$	123.464,32	abr-23	08/05/2023	$ 2.592.776,87
EXTRACTO MAYO 2023		$	127.590,62	may-23	09/06/2023	$ 2.720.367,49
EXTRACTO JUNIO 2023		$	123.476,20	jun-23	06/09/2023	$ 2.843.843,69

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

El presente informe corresponde al anticipo girado por la anterior interventoría, en la actual no se han realizado desembolsos

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: Jhon Ronal Velandia Romero
Representante Legal o Delegado
Contratista
Cedula de ciudadania No.: 80.180.028 de Bogotá

Firma: ALVAREZ DOLARA.
Nombre: Alvaro Fernando Lara Zambrano
Representante Legal o Delegado
Interventor
Cedula de ciudadania No.: 18.127.171 de Mocoa

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)

P.A. ANT CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVIS
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2023/05/31 HASTA 2023/06/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 317-000020-04
317 SUCURSAL ARAUCA

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	***$***	376,549,456.54	***SALDO PROMEDIO***	***$***	376,483,780
TOTAL ABONOS	***$***	123,476.20	***CUENTAS X COBRAR***	***$***	.00
TOTAL CARGOS	***$***	128,100.98	***VALOR INTERESES***	***$***	123,476.20
SALDO ACTUAL	***$***	376,544,831.76	***RETEFUENTE***	***$***	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
8/06	ABONO INTERESES AHORROS			32,931.24	376,582,387.78
9/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-510.36	376,581,877.42
9/06	PAGO A PROVE MUNICIPIO DE BU			-127,590.62	376,454,286.80
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			90,544.96	376,544,831.76
	FIN ESTADO CUENTA				

4.9.2 Seguimiento Programa de Obra

A la fecha el contrato se encuentra en suspensión por lo cual las actividades de obra se deben reprogramar cuando el mismo reinicie.

4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones

Para el seguimiento al Programa de Inversiones se diligencian los formatos MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2 del Manual de Interventoría de INVIAS, para el presente informe no se encuentra ejecución del mismo, ya que se encuentra suspendido el contrato.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	05/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

PROGRAMA DE INVERSIONES ■

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. ■ 6
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: CLP - 202105002 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ -COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1981 DE 2023 **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: QUINCE (15) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/04/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 13/04/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **2.767.505.806,00** (Según contrato principal)


VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **2.767.505.806,00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	%Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		30 diciembre de 2021	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22 Reprogramación No.1	jul-22	ago-22 Reprogramación No.2	sep-22 Reprogramación No.3	oct-22	nov-22 Reprogramación No.4	dic-22	ene-23 Reprogramación No.5	feb-23	mar-23 Reprogramación No.6	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	
ITEM No. 1 Subbase granular clase C (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$176.925.012	6,65%	4,94%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	2,66%	3,99%	0,00%	2,00%	4,66%	0,51%	0,43%	5,71%	1,13%	4,52%	0,21%	4,03%	0,76%	3,05%				100%
			$131.428.869	$ P				$70.770.005	$106.155.007		$53.077.504	$123.847.508	$13.633.995	$11.430.371	$151.860.646	$30.068.072	$120.272.286	$1.636.646	$107.096.270	$20.304.666	$81.218.662				
				$ E									0,32%	0,41%	0,27%	0,71%	0,71%	0,08%	0,34%	2,11%	0,00%				
				% E									$8.233.556	$10.347.165	$7.113.033	$18.201.721	$18.033.721	$2.241.018	$8.597.670	$52.007.155	$0				
ITEM No. 2 Sello de juntas (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$29.138.225	1,10%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,88%	0,16%	0,93%	0,07%	0,95%	0,22%	0,88%	0,00%	1,10%	0,00%	0,00%	1,10%				90%
			$0	$ P					$5.827.645	$23.310.580	$4.370.734	$24.767.491	$1.900.095	$1.906.669	$25.331.461	$5.827.645	$23.310.580		$29.138.225		$29.138.225				
				$ E									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
				% E																					
ITEM No. 3 Excavaciones varias sin clasificar (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$35.556.623	1,34%	0,21%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,53%	0,80%	0,00%	0,40%	0,94%	0,02%	0,09%	1,23%	0,26%	0,04%	0,06%	1,20%	0,25%	2,00%				80%
			$5.491.580	$ P				$14.222.649	$21.333.974		$10.666.987	$24.889.636	$448.584	$2.457.563	$32.650.476	$6.920.374	$27.681.495	$1.680.870	$31.936.535	$6.666.922	$26.667.688				
				$ E									0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%	0,01%	0,12%	0,00%				
				% E									$201.558	$269.667	$303.400	$422.232	$402.232	$50.550	$220.230	$3.200.567	$0				
ITEM No. 4 Concreto resistencia 21MPa (D) (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$512.447.736	19,26%	7,72%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	7,71%	5,78%	5,78%	5,78%	13,48%	1,26%	1,26%	16,75%	3,35%	13,39%	0,70%	13,25%	2,62%	19,50%				70%
			$205.277.029	$ P				$204.979.094	$153.734.321	$153.734.321	$153.734.321	$358.713.415	$33.396.873	$33.533.560	$445.017.303	$89.061.548	$356.246.194	$18.564.087	$352.527.446	$69.614.965	$270.259.859				
				$ E									0,85%	0,99%	0,69%	1,40%	1,40%	0,17%	0,66%	1,58%	0,00%				
				% E									$2.810.830	$3.503.818	$1.930.818	$3.115.605	$3.715.605	$470.302	$1.655.377	$14.004.117	$0				
ITEM No. 5 Concreto Resistencia 21 MPa (G) (Ciclopeo) (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$258.609.532	9,72%	3,48%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	1,94%	3,89%	3,89%	2,92%	6,88%	0,36%	0,66%	8,71%	1,77%	7,06%	0,37%	7,06%	1,42%	5,09%				60%
			$92.593.529	$ P				$51.721.906	$103.443.813	$103.443.813	$77.582.860	$181.026.672	$9.477.358	$17.439.252	$231.692.822	$46.954.660	$187.818.640	$9.885.352	$187.071.691	$37.818.454	$151.873.818				
				$ E									0,27%	0,46%	0,17%	0,70%	0,70%	0,09%	0,29%	0,87%	0,00%				
				% E									$7.078.202	$12.214.690	$4.043.140	$18.531.129	$18.531.129	$1.722.554	$5.802.817	$23.076.203	$0				
ITEM No. 6 Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$445.892.261	16,76%	4,65%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	6,70%	6,70%	3,35%	5,03%	1,73%	0,80%	1,12%	14,18%	3,04%	12,47%	0,68%	12,84%	2,66%	1,41%				50%
			$123.611.487	$ P				$178.356.904	$178.356.904	$89.178.452	$133.767.678	$312.124.583	$21.166.906	$29.730.775	$394.564.581	$80.956.200	$323.824.798	$17.973.595	$341.798.301	$69.214.791	$276.859.163				
				$ E									0,54%	0,59%	0,41%	0,85%	0,85%	0,10%	0,06%	0,89%	0,00%				
				% E									$14.287.126	$15.900.188	$11.023.949	$22.654.551	$22.654.551	$2.679.588	$1.672.838.324	$23.703.180	$0				
ITEM No. 7 Subbase granular clase C (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$47.260.100	1,78%	1,20%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,89%	0,89%	0,71%	1,07%	0,16%	0,11%	1,60%	0,31%	1,23%	0,06%	1,14%	0,22%	0,88%				40%
			$31.942.776	$ P					$23.630.050	$23.630.050	$18.904.040	$28.356.060	$4.209.398	$3.013.549	$40.597.153	$8.155.997	$32.622.388	$1.602.634	$30.450.041	$5.924.580	$23.698.361				
				$ E									0,09%	0,10%	0,05%	0,16%	0,16%	0,02%	0,09%	0,52%	0,00%				
				% E									$2.367.728	$2.680.658	$1.433.729	$4.362.655	$4.362.655	$585.945	$2.343.779	$13.800.627	$0				
ITEM No. 8 Excavaciones varias en material comun en seco (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$13.571.600	0,51%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,00%	0,51%	0,00%	0,00%	0,04%	0,47%	0,10%	0,41%	0,03%	0,48%	0,10%	0,41%				30%
			$0	$ P					$13.571.600		$13.571.600		$0	$950.012	$12.621.588	$2.714.320	$10.857.280	$678.580	$12.893.020	$2.714.320	$10.857.280				
				$ E									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
				% E																					
ITEM No. 9 Concreto resistencia 21MPa (D) (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$446.900.800	16,80%	5,62%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,08%	6,72%	5,88%	10,92%	0,85%	1,12%	14,84%	3,05%	12,19%	0,66%	12,62%	2,54%	19,17%				20%
			$149.482.712	$ P					$268.140.480	$178.760.320	$156.415.280	$290.485.520	$22.510.177	$29.707.344	$394.683.279	$81.063.755	$324.255.019	$17.669.880	$335.727.728	$67.653.471	$270.613.884				
				$ E									0,57%	0,67%	0,33%	0,98%	0,98%	0,11%	0,45%	1,54%	0,00%				
				% E									$15.098.044	$17.715.038	$8.768.944	$25.960.583	$25.960.583	$3.026.051	$12.104.202	$40.849.267	$0				
ITEM No. 10 Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$505.194.300	18,99%	3,40%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,29%	5,70%	6,65%	12,34%	0,64%	1,26%	17,07%	3,60%	14,40%	0,83%	15,52%	3,22%	13,01%				10%
			$90.382.201	$ P					$353.636.010	$151.558.290	$176.818.005	$328.376.295	$17.008.139	$34.173.031	$454.013.130	$95.739.088	$382.956.353	$22.151.762	$420.883.473	$86.466.536	$346.221.732				
				$ E									0,32%	0,43%	0,24%	0,67%	0,67%	0,08%	0,31%	1,96%	0,00%				
				% E									$8.520.769	$11.462.930	$6.495.160	$17.830.103	$17.830.103	$2.651.814	$8.206.456	$47.869.066	$0				
ITEM No. 16 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$117.216.000	4,41%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,44%	1,32%	1,32%	1,32%	2,20%	2,20%	0,02%	0,04%	4,34%	0,88%	3,52%	0,22%	4,19%	0,88%	3,52%				0%
			$0	$ P				$11.721.600	$35.164.800	$35.164.800	$35.164.800	$58.608.000	$585.980	$1.166.300	$115.463.720	$23.443.200	$93.772.800	$5.940.850	$111.290.050	$23.443.200	$93.772.800				
				$ E									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
				% E																					
ITEM No. 17 AFIRMADO (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$61.176.143	2,30%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	0,00%	0,00%	2,30%	0,00%	2,30%	0,00%	2,30%	0,00%	2,30%				
			$0	$ P					$30.588.072	$30.588.072	$30.588.072	$30.588.072			$61.176.143		$61.176.143	$0	$61.176.143		$61.176.143				
				$ E									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
				% E																					
ITEM No. 21 IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$10.400.000	0,39%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,20%	0,20%	0,13%	0,13%	0,13%	0,08%	0,31%	0,00%	0,39%	0,00%	0,39%				
			$0	$ P			$2.600.000	$2.600.000	$2.600.000	$2.600.000	$5.200.000	$5.200.000	$3.466.667	$3.466.667	$3.466.667	$2.080.000	$8.320.000	$0	$10.400.000		$10.400.000				
				$ E									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
				% E																					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2.660.288.332,00**	**100%**	**$830.210.183,00**																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																									

Suspensión No. 1 (10 días) 30/12/2022 - 10/01/2023

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,54%**	**20,97%**	**48,72%**	**29,77%**	**33,58%**	**66,42%**	**4,80%**	**6,35%**	**88,84%**	**17,78%**	**73,42%**	**3,82%**	**76,42%**	**14,66%**	**62,43%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$0,00**	**$14.321.600,00**	**$557.815.359,20**	**$1.296.182.675,50**	**$791.968.697,30**	**$893.305.079,45**	**$1.766.883.252,55**	**$127.804.169,17**	**$168.975.093,49**	**$2.363.509.069,34**	**$472.984.458,40**	**$1.953.113.976,60**	**$101.694.205,55**	**$2.032.904.273,45**	**$390.010.811,80**	**$1.660.757.615,20**							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,54%**	**21,51%**	**70,23%**	**100,00%**	**33,58%**	**100,00%**	**4,80%**	**11,16%**	**100,00%**	**26,58%**	**100,00%**	**23,58%**	**100,00%**	**37,57%**	**100,00%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$0,00**	**$14.321.600,00**	**$572.136.959,20**	**$1.868.319.634,70**	**$2.660.288.332,00**	**$893.305.079,45**	**$2.660.288.332,00**	**$127.804.169,17**	**$296.779.262,66**	**$2.660.288.332,00**	**$707.174.355,40**	**$2.660.288.332,00**	**$627.384.058,55**	**$2.660.288.332,00**	**$999.530.716,80**	**$2.660.288.332,00**							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%									**2,86%**	**3,95%**	**2,19%**	**5,48%**	**6,58%**	**2,52%**	**8,36%**	**0,00%**								
	VALOR (Miles de Pesos)									**$78.677.853,00**	**$97.299.054,00**	**$58.212.990,00**	**$145.749.978,00**	**$145.749.978,00**	**$16.766.010,40**	**$67.064.041,60**	**$220.690.278,00**	**$0,00**							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									**2,86%**	**6,81%**	**9,00%**	**14,48%**	**21,06%**	**23,58%**	**31,94%**	**31,94%**	**31,94%**							
	VALOR (Miles de Pesos)									**$78.677.853,00**	**$175.976.907,00**	**$234.189.897,00**	**$379.939.875,00**	**$525.689.853,00**	**$542.455.863,40**	**$609.519.905,00**	**$830.210.183,00**	**$830.210.183,00**							

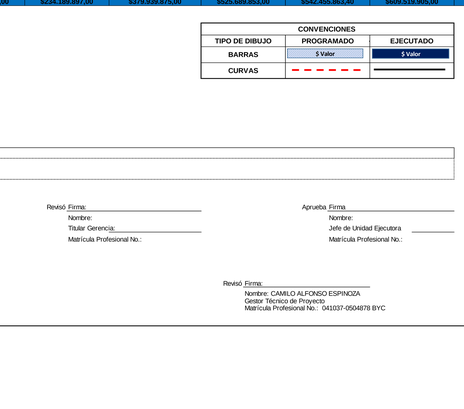

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
CARACTERIZACIÓN DEL CORREDOR VIAL POSTULADO	$ 10.447.454,00	$ -	%
	$ -		
REVISIÓN Y AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 55.000.000,00	$ 55.000.000,00	100,00%
	$ -		
IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORIA (CARACTERIZACIÓN DEL CORREDOR Y REVISIÓN Y AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS)	$ 12.435.016,00	$ 10.450.000,00	84,04%
	$ -		
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 29.335.004,00	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 107.217.474,00	$ 65.450.000,00	61,04%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 2.767.505.806,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ 895.660.183,00**	**32,36%**

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JHON RONAL VELANDIA ROMERO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-130487 CND

Aprueba Firma:
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Representante legal o Representante Suplente o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 52202-82168

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Director Territorial
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: CAMILO ALFONSO ESPINOZA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 041037-0504878 BYC

4.9.4 Actas de comité de obra

Para las actas de comité de obra se diligencia el formato MEPI-MN-IN-14-FR-1 del Manual de Interventoría de INVIAS, se relaciona acta de comité realizado.

4.9.5 Acta de reunión

Para las actas de reunión se diligencia el formato MEPI-MN-IN-14-FR-2 del Manual de Interventoría de INVIAS, se relaciona acta de reunión por visita realizada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 27/07/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No. CLP-202105002-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 NIT. 901.543.259-9

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1981-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

AVANCE A LA REVISIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

FECHA: 27/07/2023
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

• Teniendo en cuenta que hasta la fecha el contrato de obra se encuentra en suspensión, el representante legal del contrato de obra, pone a disposición las instalaciones de las oficinas, para que junto con su personal profesional de obra en conjunto con el personal de la interventoría externa, se revise y verifique toda la documentación que hace parte de los estudios y diseños del proyecto. Documentación que ya se había entregado a la interventoría externa. Teniendo en cuenta lo anterior para el día del presente comité se procedió a la verificación de toda la documentación concerniente al tema ambiental de la cantera el Triángulo con respecto a permisos requeridos para el normal desarrollo del proyecto.
• Se revisó y verifico toda la información ambiental con respecto a informes y al Programa de Adaptación a la Guía Ambiental P.A.G.A

FECHA: 27/07/2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Entrega de Caracterizaciones del material de Subbase y Triturado de la Cantera el Triangulo	17/08/2023	ING. ERIC ALBERTO SANDOVAL

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 17/08/2023 (Día / Mes / Año)



NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
ERIC ALBERTO SANDOVAL GUTIERREZ	ING. RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021	
JHON RONAL VELANDIA ROMERO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021	
ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	DIRECTOR DE OBRA	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 28/07/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No. CLP-202105002-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 NIT. 901.543.259-9

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1981-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Visita técnica a sitio de obra

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Inicio de revisión de estudios y diseños y sitios de ejecución de obras entre el contratista y la interventoría.
Recibo de información por parte de contratista.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	28/07/2023

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realizó visita al Municipio de Buenavista Boyacá por parte del Director de Interventoría con el fin de recibir la información y detalle de los estudios y diseños de las obras a ejecutar, así mismo se organizo como se iban a realizar las revisiones en conjunto para poder obtener una versión final del documento.

Se validaron los sitios de obra por intervenir y el estado actual del proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/07/2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	sábado, 29 de julio de 2023	INTERVENTORÍA



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	
JHON RONAL VELANDIA ROMERO	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021	
ERIC ALBERTO SANDOVAL GUTIERREZ	ING. RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

A continuación, se relacionan los datos generales del contrato 1981 de 2023.

Tabla 4. Información General del contrato de Interventoría

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".
Nombre del Contratista:	ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.
Representante Legal:	ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.
c.c.	18.127.171
Número del contrato:	1981-2023
Fecha de suscripción del contrato:	07 de junio de 2023
Valor Inicial del Contrato (A):	OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($82.176.975)
Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES.
Fecha de Inicio:	18 de julio de 2023
Fecha de Terminación Contrato Inicial:	17 de diciembre de 2023

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 5. Información de Ejecución del Contrato.

Valor Contrato 1981-2023					**$**		**82.176.975,00**
Acta No.	**Tipo de Acta**	**Mes/Año de Ejecución**	**Valor Acta sin IVA**	**Valor IVA**	**Valor Total**	**Porcentaje Ejecutado**	**Porcentaje Acumulado**
1	Interventoría	Julio 2023	$ 978.400	$ -	$ 978.400	1,19%	1,19%
TOTALES			**$ 978.400**	**$ -**	**$ 978.400,00**		**1,19%**

Fuente: Elaboración Propia

5.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato

A la fecha de elaboración del presente informe no se presentan anotaciones:

Tabla 6. Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones al contrato 1981 – 2023

CONTRATO PRINCIPAL INTERVENTORÍA				
Contrato	**Desde (Día/Mes/Año)**	**Hasta (Día/Mes/Año)**	**Plazo (meses)**	**Fecha de Vencimiento**
1981-2023	18/07/2023	17/12/2023	5	17/12/2023
PRÓRROGAS				
Prórroga	**Desde (Día/Mes/Año)**	**Hasta (Día/Mes/Año)**	**Plazo/Duración (dias)**	**Fecha de Vencimiento**

Fuente: Elaboración Propia

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Durante el periodo del 18 al 31 de julio, la interventoría realizó las siguientes actividades:

- Inicio de la revisión de la documentación inicial entregada por el contratista.
- Elaboración de informes semanales y actas.

5.3 Informes especialistas y profesionales

Durante el periodo del 18 al 31 de julio se presentó informe por el director de interventoría el cual se anexa con los documentos del acta numeral 18 y se relaciona en este apartado.

5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC

No aplica para este informe.

5.5 Informe Matriz de Riesgos

No aplica para este informe.

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

Se solicito la creación del proyecto en el aplicativo dispuesto por el Instituto Nacional de Vías y que se denomina **CIFRA**, en el cual se registran los informes semanales.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

Para ver el control de equipo y vehículos del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 del Manual de Interventoría del INVIAS, para este periodo no se utilizó el recurso.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 05/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1981-2023

INTERVENTORÍA: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

CONTRATO DE OBRA No. CLP-202105002-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Camioneta o Campero 4*4 de mas de 2000 c.c (Incluye peajes, Combustible y Conductor) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 en adelante	TOYOTA FORTUNER 2012																		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Motocicletas (125 cc o mayor modelo 2015 en adelante, incluye combustible y soat)	AKT AK125RL 2020																		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRÑ

Firma
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 01110-1037

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Para ver el control de personal y aportes del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 del Manual de Interventoría del INVIAS, y es presentado junto con las planillas de seguridad social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 5/8/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1981-2023

INTERVENTOR: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".

CONTRATO DE OBRA No.: CLP - 202105002 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR PUTUMAYO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																														% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	18.127.171	Director de Interventoría	$ 405.000																		X	X	X											0,09	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	$ 1.160.000	$ 80.736	V	NUEVA EPS	9454326552	$ 145.000	PORVENIR	9455613697	$ 185.600	$ 23.200	$ -	$ -	
2																																												
3																																												
4																																												
5																																												
6																																												
7																																												
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 405.000																																							

El Interventor adjunta la certificación de fecha 5 de agosto a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRÑ

Firma

Nombre: JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01110-1037

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18127171		LARA ZAMBRANO ALVARO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO HUASIPANGA	MOCOA-PUTUMAYO	4200313	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	172918638	9454326552	I	2023/08/17	2023/09/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	35	$367,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$0		$0		$0	$0		$353,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$0		$0		$0	$0		$353,800
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$0		$0		$0	$0		$353,800
1	CC 18127171	LARA ZAMBRANO ALVARO FERNANDO		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF63	30	$1,160,000	$23,200		0	$0	0.000%	$0	30	$0	$0	No	$353,800
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$0		$0		$0	$0		$353,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18127171		LARA ZAMBRANO ALVARO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO HUASIPANGA	MOCOA-PUTUMAYO	4200313	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	172918638	9454326552	I	2023/08/17	2023/09/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	35	$367,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$7,200	$0	$192,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$7,200	$0	$192,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$900	$0	$24,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$23,200	$900	$0	$24,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$5,700	$0	$150,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$5,700	$0	$150,700
TOTAL				**1**	**$353,800**	**$13,800**	**$0**	**$367,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18127171		LARA ZAMBRANO ALVARO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO HUASIPANGA	MOCOA-PUTUMAYO	4200313	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	564959444	9465500661	N	2023/08/17	2024/04/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	236	$99,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	18127171	LARA ZAMBRANO ALVARO FERNANDO										A				▫				23030 1	30	($1,160,000)	($185,600)	EPS037	30	($1,160,000)	($145,000)	CCF63	30	($1,160,000)	($23,200)	14-23	0	$0	0.000%	$0	30	$0	$0	No	($353,800)
2	CC	18127171	LARA ZAMBRANO ALVARO FERNANDO										C								23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF63	30	$1,160,000	$23,200	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$434,600
Total			**Afiliados(1)**																			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18127171		LARA ZAMBRANO ALVARO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO HUASIPANGA	MOCOA-PUTUMAYO	4200313	Si


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	564959444	9465500661	N	2023/08/17	2024/04/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	236	$99,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$18,500	$0	$99,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$80,800	$18,500	$0	$99,300
TOTAL				**1**	**$80,800**	**$18,500**	**$0**	**$99,300**

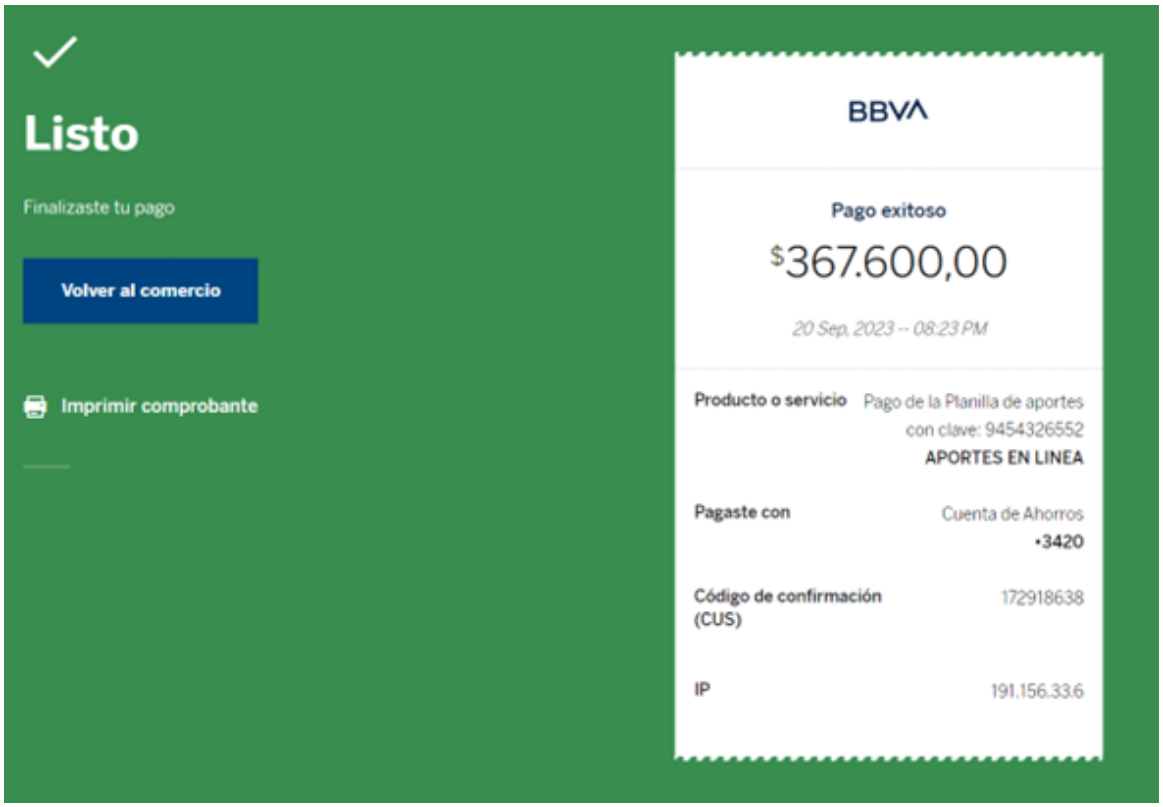
Listo
Finalizaste tu pago
Volver al comercio
Imprimir comprobante
BBVA
Pago exitoso
$367.600,00
20 Sep, 2023 -- 08:23 PM
Producto o servicio
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9454326552
APORTES EN LINEA
Pagaste con
Cuenta de Ahorros
•3420
Código de confirmación (CUS)
172918638
IP
191.156.33.6

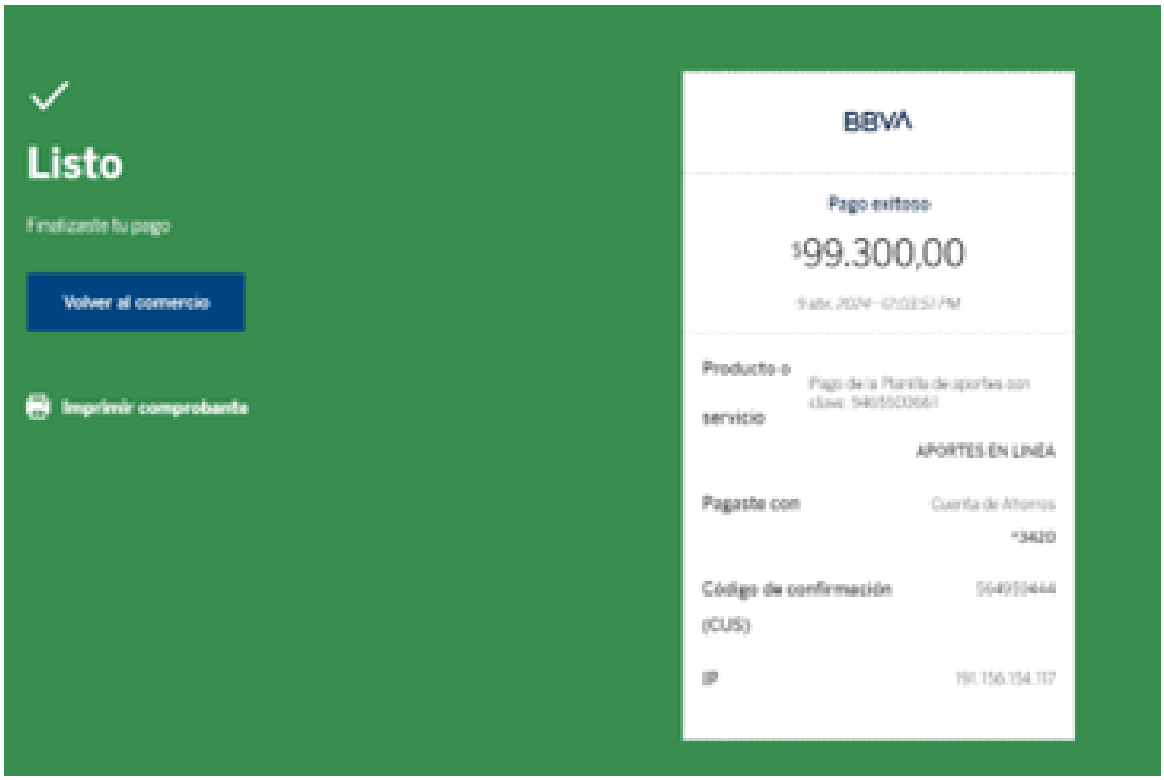
Listo
Volver al comercio
Imprimir comprobante
BBVA
Pago exitoso
$99.300,00
APORTES EN LINEA
Pagaste con
•3420

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Para ver el informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 del Manual de Interventoría del INVIAS, y es presentado a continuación.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 5/8/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1981-2023 **INTERVENTOR:** ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".

CONTRATO DE OBRA No: CLP - 202105002 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	639323	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	Contrato Principal 1981-2023	$ 82.176.975	$ 82.176.975
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 82.176.975**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**jul-23**	$ 978.400	$ -	$ 978.400	N/A	$ 978.400	N/A	104923 DE 12/05/2023	$ 81.198.575	$ 81.198.575		
TOTALES		**$ 978.400**	**$ -**	**$ 978.400**	**N/A**	**$ 978.400**	**N/A**		**$ 81.198.575**	**$ 81.198.575**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA COSTOS N 1 JULIO 2023	$ 978.400	$ -	$ 978.400
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRÑ

Firma
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01110-1037

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Para ver el control de seguimiento a garantías del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 del Manual de Interventoría del INVIAS, y es presentado a continuación.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÌAS CONTRATO DE INTERVENTORÌA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 05/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1981-2023 **INTERVENTOR:** ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".

FECHA DE INICIO: 18/07/2023

PLAZO INICIAL: 5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 82.176.975,00

VALOR ACUMULADO: $ 82.176.975,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 8.217.697,50	7	6	2023	17	5	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0,00%	$ 0,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 16.435.395,00	7	6	2023	17	6	2027
Calidad del servicio	30,00%	$ 24.653.092,50	30	11	2023	17	11	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 560-47-994000164384

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/06/2023

FECHA: 05/08/2023 (Día / Mes / Año)

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRÑ

Firma
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01110-1037

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607356077

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000164384 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	21	06	2023

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	21	06	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO** IDENTIFICACIÓN: CC **18.127.171**

DIRECCIÓN: CL 10 18 26 ESMERALDA CA 3 CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO TELÉFONO: 3108593447

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DESCRIPCION CONTRATO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	07/06/2023	31/05/2024	8,217,697.50
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	07/06/2023	30/06/2027	16,435,395.00
	CALIDAD DEL SERVICIO	30/11/2023	30/11/2028	24,653,092.50

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:
|

BENEFICIARIOS
NIT 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No 1981 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".

NOTA SE CORRIGE VIGENCIA DEL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****49,306,185.00	$ **********0	$********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
EGNA MAGALI LOPEZ ROMO	9462	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560735607

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE207F0C08FF7B56

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Dirección:** Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

No aplica para este contrato.

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

No aplica para este contrato ya que no tiene anticipo.

6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

Para ver el plan de cargas aprobado se utiliza el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2 del Manual de Interventoría del INVIAS, se presenta el plan de cargas inicial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-9-FR-2 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 2 FECHA: 18/07/2023

PLAN DE CARGAS INICIAL ☑

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ **No.** ____
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1981 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
RESOLUCIÓN No.: 033 DE 29 DE JUNIO DE 2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA CLP - 202105002 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021

PLAZO INICIAL: 5 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/07/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 17/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 82.176.975,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 82.176.975,00

No. de Orden	Cant	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha		AÑO - 2023												TOTAL	
											MES 1 - JULIO		MES 2 AGOSTO		MES 3 - SEPTIEMBRE		MES 4 - OCTUBRE		MES 5 - NOVIEMBRE		MES 6 - DICIEMBRE			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																						
	1	Director de Interventoria	$ 4.500.000		1,00	$ 4.500.000					0,09	$ 405.000	0,20	$ 900.000	0,20	$ 900.000	0,20	$ 900.000	0,20	$ 900.000	0,11	$ 495.000	1,00	$ 4.500.000,00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 3.500.000		4,00	$ 14.000.000					0,00	$ -	0,30	$ 1.050.000	0,70	$ 2.450.000	1,00	$ 3.500.000	1,00	$ 3.500.000	1,00	$ 3.500.000	4,00	$ 14.000.000,00
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 4.000.000		0,30	$ 1.200.000					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,30	$ 1.200.000		$ -	0,30	$ 1.200.000,00
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 4.000.000		0,30	$ 1.200.000					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,30	$ 1.200.000		$ -	0,30	$ 1.200.000,00
	1	Especialista Ambiental	$ 4.000.000		1,00	$ 4.000.000					0,00	$ -	0,00	$ -	0,33	$ 1.320.000	0,33	$ 1.320.000	0,34	$ 1.360.000		$ -	1,00	$ 4.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR TECNICO																						
	1	Inspector	$ 1.600.000		4,00	$ 6.400.000					0,00	$ -	0,50	$ 800.000	1,00	$ 1.600.000	1,00	$ 1.600.000	1,00	$ 1.600.000	0,50	$ 800.000	4,00	$ 6.400.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 31.300.000					**$ 405.000,00**		**$ 2.750.000,00**		**$ 6.270.000,00**		**$ 7.320.000,00**		**$ 9.760.000,00**		**$ 4.795.000,00**		**$ 31.300.000**	
FACTOR MULTIPLICADOR						2,00					**2,00**		**2,00**		**2,00**		**2,00**		**2,00**		**2,00**		**2,00**	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						**$ 62.600.000**					**$ 810.000**		**$ 5.500.000**		**$ 12.540.000**		**$ 14.640.000**		**$ 19.520.000**		**$ 9.590.000**		**$ 62.600.000**	

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO - 2023												TOTAL	
											MES 1 - JULIO		MES 2 AGOSTO		MES 3 - SEPTIEMBRE		MES 4 - OCTUBRE		MES 5 - NOVIEMBRE		MES 6 - DICIEMBRE			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																						
		VIATICOS																						
	1	Especialistas y Director	$ 150.000	dia	8,00	$ 1.200.000					1,00	$ 150.000	1,00	$ 150.000	1,00	$ 150.000	2,00	$ 300.000	2,00	$ 300.000	1,00	$ 150.000	8,00	$ 1.200.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPO Y OFICINA																						
	1	Camioneta o Campero 4*4 de mas de 2000 c.c (Incluye peajes, Combustible y Conductor) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 en adelante	$ 1.500.000	Mes	4,00	$ 6.000.000						$ -	0,20	$ 300.000	0,80	$ 1.200.000	1,00	$ 1.500.000	1,00	$ 1.500.000	1,00	$ 1.500.000	4,00	$ 6.000.000,00
	1	Motocicletas (125 cc o mayor modelo 2015 en adelante, incluye combustible y soat)	$ 300.000	Mes	4,00	$ 1.200.000						$ -	0,50	$ 150.000	0,50	$ 150.000	1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000	4,00	$ 1.200.000,00
	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	$ 1.000.000	Según comprobante por mes	4,00	$ 4.000.000						$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000	1,000	$ 1.000.000	4,00	$ 4.000.000,00
	1	Trabajos de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 1.000.000	Según comprobante por mes	4,00	$ 4.000.000						$ -	0,20	$ 200.000	0,80	$ 800.000	1,00	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000	4,00	$ 4.000.000,00
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 600.000	Según comprobante por mes	4,00	$ 2.400.000						$ -	0,00	$ -	1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000	4,00	$ 2.400.000,00

		OTROS COSTOS																					
	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, etc	$ 60.000	Según comprobante por mes	5,00	$ 300.000					0,46	$ 27.600	1,00	$ 60.000	1,00	$ 60.000	1,00	$ 60.000	1,00	$ 60.000	0,54	$ 32.400	5,00	$ 300.000,00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 40.000	Según comprobante por mes	5,00	$ 200.000					0,46	$ 18.400,00	1,00	$ 40.000	1,00	$ 40.000	1,00	$ 40.000	1,00	$ 40.000	0,54	$ 21.600	5,00	$ 200.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)						**$ 19.300.000,00**				**$ -**	**$ 196.000,00**		**$ 900.000,00**		**$ 4.000.000,00**		**$ 4.800.000,00**		**$ 4.800.000,00**		**$ 4.604.000,00**		**$ 19.300.000,00**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C.)						$ 81.900.000,00				$ -	$ 1.006.000,00		$ 6.400.000,00		$ 16.540.000,00		$ 19.440.000,00		$ 24.320.000,00		$ 14.194.000,00		$ 81.900.000,00
PROVISIONAL FRENTE ADICIONAL (D)						$ 276.975															$ 276.975,00		$ 276.975,00
VALOR TOTAL BÁSICO (E)						$ 82.176.975,00				$ -	$ 1.006.000,00		$ 6.400.000,00		$ 16.540.000,00		$ 19.440.000,00		$ 24.320.000,00		$ 14.470.975,00		$ 82.176.975,00
IVA = 19% * (E) = (F)																							
COSTO TOTAL = (E) + (F)						**$ 82.176.975,00**				**$ -**	**$ 1.006.000,00**		**$ 6.400.000,00**		**$ 16.540.000,00**		**$ 19.440.000,00**		**$ 24.320.000,00**		**$ 14.470.975,00**		**$ 82.176.975,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

PLAN DE CARGAS INICIAL

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma ALVAROFLARA.
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA Z
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 52202-82168 NRÑ

Firma:
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01110-1037
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo del informe, se recibió la documentación inicial entregada por el contratista de obra, para la revisión y verificación de los diseños de obra.

Hasta el 31 de julio de 2023 se cuenta con un 23,80% de avance físico de ejecución de la totalidad de las obras del proyecto que corresponde a 727.34 metros construidos de la meta física establecida, que corresponde a los tramos de CURVA MARCELINO, HOMERO 1, HOMERO 2, SAN PEDRO LA ESCUELA, MORATO Y JUAN DURAN.

8 ANEXOS


8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor

Se presenta la relación de la correspondencia entre contratista, interventor y supervisión del periodo del informe.

8.2 Registro fotográfico del avance de las obras

En el periodo del informe se realizaron actividades de oficina en la revisión de los estudios y diseños.





8.3 Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas

En el periodo del informe no se realizaron actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad ya que se realizaron actividades de oficina en la revisión de los estudios y diseños.

8.4 Bitácora del mes

Durante el periodo se realizaron actividades administrativas de revisión de estudios y diseños, las cuales se presentan en los informes semanales, y teniendo en cuenta que el contrato de obra se encuentra suspendido no se diligencia bitácora de obra.

	FORMATO RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL.
CONTRATO OBRA:	CLP-202105002 DE 2021
CONTRATO INTERVENTORÍA:	1981-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021
INTERVENTOR:	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
SUPERVISOR:	JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
FECHA:	jul-23

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
04/07/2023	Correo	Entrega hojas de vida y plan de cargas inicial	Interventoría	Supervisión
18/07/2023	SECOP II	Firma de acta de inicio	Interventoría	Supervisión
20/07/2023	Correo	Entrega estudios y diseños proyecto	Contratista	Interventoría

ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
M.P. 52202-282168 NRÑ
INTERVENTORÍA

Gmail **CATHERINE ALEXANDRA BONILLA CHIRIVI <cathebonilla@gmail.com>**

RV: Solicitud Urgente de entrega de documentos de hojas de vida y plan de cargas del Contrato de 1981 de 2023

1 mensaje

fernando lara <fernandolara7606@hotmail.com> 15 de diciembre de 2023, 11:24
Para: Ing Catherine Bonilla <Cathebonilla@gmail.com>

FERNANDO LARA Z.
Esp. Diseño Construcción y conservación de Vías
Escuela Colombiana de Ingeniería

De: fernando lara <fernandolara7606@hotmail.com>
Enviado: martes, 4 de julio de 2023 2:22 p. m.
Para: Jaime Alexander Gonzalez Choconta <jagonzalezc@invias.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud Urgente de entrega de documentos de hojas de vida y plan de cargas del Contrato de 1981 de 2023

Respetado ingeniero,
De acuerdo con lo solicitado adjunto hojas de vida del personal profesional

FERNANDO LARA Z.
Esp. Diseño Construcción y conservación de Vías
Escuela Colombiana de Ingeniería

De: Jaime Alexander Gonzalez Choconta <jagonzalezc@invias.gov.co>
Enviado: jueves, 29 de junio de 2023 8:58 a. m.
Para: fernando lara <fernandolara7606@hotmail.com>
Asunto: Solicitud Urgente de entrega de documentos de hojas de vida y plan de cargas del Contrato de 1981 de 2023

Cordial saludo,

El Supervisor del contrato en cumplimiento de sus funciones de supervisión del Contrato de 1981 de 2023 suscrito con el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS., de manera atenta y en consideración a sus obligaciones contractuales, se permite solicitar de manera urgente la entrega de:

- Hojas de vida del personal, de acuerdo con lo establecido en el anexo Técnico del proceso y por ende parte integral del contrato.

Cordialmente,

Ing. Jaime Alexander González Ch.
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Dirección Territorial Boyacá

Calle 23 No. 15-33 Tunja
jagonzalezc@invias.gov.co
Cel: 3143514134

MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS

Aviso legal: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

PROFESIONALES.zip
19565K

DT-BOY 41287

Tunja, 18 de julio de 2023

Ingeniero
ALVARO FERNANDO LARA Z.
Representante Legal
CONTRATO 1981 DE 2023
Calle 10 No. 18-26
3108593447
fernandolara7606@hotmail.com
Mocoa - Putumayo

Asunto: Orden de Inicio Contrato de Interventoría No. 1981 de 2023.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del Contrato de Interventoría No. 1981 de 2023 que tiene por objeto: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - COLOMBIA RURAL**, le informo que a partir del **18 de julio de 2023**, se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado contrato, que es la misma fecha del cambio de estado a ejecución que registra la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 639323 de fecha 08/06/2023 y Aprobación de las Garantías exigidas en SECOP II con fecha 27 de junio de 2023.

Para el control y vigilancia el INVIAS designó como Supervisor del Contrato de Interventoría a JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA, mediante Resolución No. 033 de fecha 29 de junio de 2023, con quien debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual. Dirección Territorial Boyacá (Calle 23 N. 15-33 de la ciudad de Tunja), teléfono fijo/celular: 3143514134, e-mail: jagonzalezc@invias.gov.co.

Cordialmente,

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
Director Territorial Boyacá

Proyecto: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
