INFORMES

INFORME DE AVANCE FISICO, FINANCIERO, TÉCNICO Y LEGAL

INDERVALLE	CONSORCIO PARQUES VALLE	Versión: 1
		CÓDIGO: PV-IM-001
	INFORME TÉCNICO, FINANCIERO, LEGAL MENSUAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Página __ de 2

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N° IND-23-4469
CONTRATANTE: INDERVALLE NIT. 805.012.896-4 ORDENADOR DEL GASTO: NICOLAS TRIANA CASTILLO
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES VALLE NIT. 901.772.637-1 **REPRESENTANTE LEGAL:** WILSON DE JESUS MARIN GONZALEZ C.C. 15.913.946
INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3 NIT. 901.769.200-6 **REPRESENTANTE LEGAL:** JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ, C.C. 16.700.426

OBJETO: Contratar por el sistema de Precios Unitarios Fijos: Mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos para los Municipios de Cartago, El Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca realizando la ejecución de los siguientes": GRUPO 1: FRENTE 1. Gimnasio al aire libre y Ecobikes, Urbanización La Cabaña, Municipio de Cartago – Departamento del Valle del Cauca. GRUPO 1: FRENTE 2. Adecuación Cerramiento – Barrio Decepaz – Distrito Especial de Cali – Departamento del Valle del Cauca. GRUPO 1: FRENTE 3. Adecuación Escenario Deportivo Barrio Comuneros II Municipio de Cali Valle del Cauca

VALOR TOTAL $	$2.515.722.785 M/CTE – INCLUIDO AIU		
PLAZO	Hasta el 30 de junio de 2024	PLAZO EN DIAS	185 Dias
FECHA DE INICIO	jueves, 28 de diciembre de 2023		
PRORROGA 1		DEL:	HASTA:
PRORROGA 2		DEL:	HASTA:
PRORROGA 3		DEL:	HASTA:
SUSPENSION 1		DEL:	HASTA:
SUSPENSION 2		DEL:	HASTA:
SUSPENSION 3		DEL:	HASTA:

2. ESTADO DE GARANTÍAS

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS			
CONCEPTO	VIGENTE DESDE	VIGENTE HASTA	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE DESDE	VIGENTE HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO ANEXO 0				CUMPLIMIENTO ANEXO 6			
Cumplimiento	6/12/2023	30/06/2024	503.144.557	Cumplimiento	28/12/2023	22/07/2024	503.144.557
Salarios	6/12/2023	30/06/2027	201.257.823	Salarios	28/12/2023	22/07/2027	201.257.823
Estabilidad y calidad de la obra	5 años		503.144.557	Estabilidad y calidad de la obra	5 años		503.144.557
Aseguradora Seguros del Estado SA	Poliza No. 21-44-101432524			Aseguradora Seguros del Estado SA	Poliza No. 21-44-101432524		
RCE ANEXO 0				RCE ANEXO 4			
responsabilidad civil extracontractual	6/12/2023	30/06/2024	348.000.000	responsabilidad civil extracontractual	28/12/2023	22/07/2024	348.000.000
Aseguradora Seguros del Estado SA	Poliza No. 21-40-101224153			Aseguradora Seguros del Estado SA	Poliza No. 21-40-101224153		

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE PERIODO		ACUMULADO	
FRENTE DE OBRA		VALOR INICIAL	VALOR REAL	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)
FRENTE DE OBRA 1	Gimnasio al aire libre y Ecobikes Cartago	$ 520.054.701	$ 520.054.701	$ 0	0,0%	$ 71.468.426	13,7%	$ 71.468.426	13,7%
FRENTE DE OBRA 2	Adecuación cerramiento, Decepaz Cali	$ 557.850.946	$ 557.850.946	$ 0	0,0%	$ 0	0,0%	$ 0	0,0%
FRENTE DE OBRA 3	Adecuación escenario deportivo Comuneros II, Cali	$ 1.437.817.138	$ 1.437.817.138	$ 0	0,0%	$ 576.269.786	40,1%	$ 576.269.786	40,1%

3.1 RESUMEN DEL CONTRATO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
DETALLE	MES	ACUMULADO	DETALLE	MES	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	9%	9%	OBRA FISICA EJECUTADA (%)	26%	26%
VALOR BASICO DE LA OBRA	$ 226.415.051	$ 226.415.051	VALOR BASICO DE LA OBRA	$ 647.738.212	$ 647.738.212

3.2 SEGUIMIENTO AL PLAZO DEL CONTRATO

CONDICION CONTRACTUAL				CONDICION REAL		PLAZO (DIAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS RESTANTES	FECHA CORTE
FRENTE DE OBRA		INICIO	FIN	INICIO	FIN				
FRENTE DE OBRA 1	Gimnasio al aire libre y Ecobikes Cartago	28-dic-23	30-jun-24	2-ene-24	30-jun-24	180	34	151	31-ene-24
FRENTE DE OBRA 2	Adecuacion cerramiento, Decepaz Cali	28-dic-23	30-jun-24	19-feb-24	30-jun-24	132	34	151	31-ene-24
FRENTE DE OBRA 3	Adecuación escenario deportivo Comuneros II, Cali	28-dic-23	30-jun-24	2-ene-24	30-jun-24	180	34	151	31-ene-24

4. RELACIÓN DE PAGOS

CONCEPTO	FECHA DE FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO	AMORTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR GIRADO
TOTALES					

5. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

INFORME MENSUAL No. 1 — **PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024**

OBJETO:Contratar por el sistema de Precios Unitarios Fijos: Mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos para los Municipios de Cartago, El Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca realizando la ejecución de los siguientes": GRUPO 1: FRENTE 1. Gimnasio al aire libre y Ecobikes, Urbanización La Cabaña, Municipio de Cartago – Departamento del Valle del Cauca. GRUPO 1: FRENTE 2. Adecuación Cerramiento – Barrio Decepaz – Distrito Especial de Cali – Departamento del Valle del Cauca. GRUPO 1: FRENTE 3. Adecuación Escenario Deportivo Barrio Comuneros II Municipio de Cali Valle del Cauca

INDERVALLE	CONSORCIO PARQUES VALLE	Version: 1
		CÓDIGO:
	INFORME TÉCNICO, FINANCIERO, LEGAL MENSUAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	PV-IM-001
		Página __ de 2

5.1. INFORMACION BASICA DEL FRENTE DE OBRA

FRENTE No. 03: ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

VALOR COSTO FRENTE: $1,437,817,138

Informe N°: 1 Fecha de Informe: 28/12/2023 A 31/01/2024

INFORMACION GENERAL CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra:	$1,437,817,138
Adiciones o mayor valor:	
Valor total:	$1,437,817,138
Fecha de Inicio:	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	-
Tiempo de suspensiones:	-
Plazo estipulado:	185
Fecha de terminacion:	30/06/2024
Tiempo transcurrido contrato:	35 dias

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Fecha de Inicio:	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	-
Tiempo de suspensiones:	-
Plazo actualizado:	185
Fecha de terminacion:	30/06/2024
Tiempo transcurrido Interventoria:	35 dias

SEGUIMIENTO DE OBRA AVANCE FISICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Mes actual	Acum. Mes	Adelanto/atraso
% Programado	0,00%	12,00%	12,00%	28%
% Ejecutado	0,00%	40,08%	40,08%	
Diferencia	0,00%	28,08%	28,08%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$0,00	$ 172.538.057,00	$ 172.538.056,56	12,00%
Ejecutado (%)	$0,00	$ 576.269.786,00	$ 576.269.786,00	40,08%
Diferencia	$0,00	$ 403.731.729,00	$ 403.731.729,00	28,08%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	Residente de Interventoría
Contratista:	Residente de obra, Profesional SST, 1 Maestro, 2 Oficiales, 7 ayudantes

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	Interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	Interventor	S
Normas ambientales	Interventor	S

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1: Excavacion de caisson



Foto 2: Fundicion de anillos para contención de paredes de excavación



Foto 3. Toma de muestras para ensayo de resistencia del concreto



INDERVALLE	CONSORCIO PARQUES VALLE	Versión: 1
		CÓDIGO:
	INFORME TÉCNICO, FINANCIERO, LEGAL MENSUAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	PV-IM-001
		Página __ de 2





ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
Se marcan las excavaciones y se inician prehuecos en pilotes	Excavacion de caisson
Se continua con el cargue y retiro de material de escombros hasta sitio de disposición final	Construcción de formaletas de anillos para contencion de paredes de excavación
Construcción de formaletas de anillos para contencion de paredes de excavación	Fundicion de anillos para caissons
Fundicion de anillos para caissons	Figuracion de acero para estructura de cimentación, caissons, vigas, dados y zapatas
Fundición de caissons y estructuras de cimentación	Fundición de caissons y estructuras de cimentación
Conformación de estructura metálica	Conformación de estructura metálica

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:
Acorde al cronograma aprobado por la interventoría, se tiene un adelanto de 0,5 días de las actividades definidas para el proyecto en este frente de trabajo.

2. Disponibilidad de Recursos:
No se ha presentado hasta la fecha actual, dificultad en la disponibilidad de los recursos necesarios para las actividades programadas.

3. Ejecución Financiera:
Debido al adelanto en las actividades programadas se obtiene un balance financiero positivo.

4. Calidad de los trabajos:
Permanentemente se encuentra personal profesional verificando la calidad de las actividades mediante inspección visual, registro fotográfico y registro escrito tanto en bitácora como en formatos implementados y validados

5. Manejo Ambiental:
El material de excavación se dispuso en botadero certificado el cual se cuenta con la certificación respectiva de disposición, la obra se encuentra en permanente limpieza para No afectar la ejecución de las obras.

6. Seguridad Industrial:
El personal con el que se dispuso esta semana cuenta con los implementos de protección personal pertinentes para el desarrollo de sus actividades

7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Continua la implementación acorde a las directrices del profesional de seguridad y salud en el trabajo el cual se hará entrega en el informe mensual.

8. Aspectos sociales:
En el transcurso de la semana no se han presentado dificultades a nivel social, la comunidad brinda el apoyo requerido para el normal desarrollo de las actividades. Solicitan una socialización con la entidad contratante

OBSERVACIONES:

FRENTE No. 01: **GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO**

VALOR COSTO FRENTE:

Informe N°: 1 Fecha de informe: 28/12/2023 A 31/01/2024

INFORMACION GENERAL

CONTRATISTA DE OBRA

Valor frente de obra:	$520.054.701
Adiciones o mayor valor:	
Valor total:	$520.054.701
Fecha de Inicio	28/12/2023
Tiempo de prorrogas	-
Tiempo de suspensiones	-
Plazo estipulado:	185
Fecha de terminacion:	30/06/2024
Tiempo transcurrido contrato:	35 días

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Fecha de Inicio:	28/12/2023
Tiempo de prorrogas:	-
Tiempo de suspensiones	-
Plazo actualizado:	185
Fecha de terminacion:	30/06/2024
Tiempo transcurrido Interventoria:	35 días

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Mes actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	13,74%
% Ejecutado	0,00%	13,74%	13,74%	
Diferencia	0,00%	13,74%	13,74%	

AVANCE FINANCIERO

				En %
Programado(%)	$0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Ejecutado (%)	$0,00	$ 71.468.426	$ 71.468.426	13,74%
Diferencia	$0,00	$ 71.468.426	$ 71.468.426	13,74%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	Residente de Interventoría
Contratista:	Residente de obra, Profesional SST, 1 Maestro, 2 Oficiales, 7 ayudantes

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Herramienta menor, Rana, Retroexcavadora, Volquetas

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	Interventor	S
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	Interventor	S
Normas ambientales	Interventor	S

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto 1: Socialización preliminar con comunidad para manifestar el inicio de las actividades del proyecto.



Foto 2: Identificación visual del área de trabajo en campo



Foto 3: Revisión de planos del proyecto con la interventoría en campo



Foto 4: Revisión de planos del proyecto por parte de la comunidad



Foto 5: Toma de puntos previo a inicio de replanteo y verificación de coordenadas de niveles.



Foto 6: Visita de Topógrafo para toma de puntos previo a inicio de replanteo del área de trabajo



Foto 7: Instalación de estación total para topografía



Foto 8: Excavación e instalación de guadua para cerramiento de delimitación del área de trabajo

INDERVALLE	CONSORCIO PARQUES VALLE	Versión: 1
	INFORME TÉCNICO, FINANCIERO, LEGAL MENSUAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: PV-IM-001
		Página __ de 2



Foto 9: Instalación de guadua para cerramiento perimetral del área de trabajo con tela verde



Foto 10: Instalación de tela de cerramiento para delimitación del área de trabajo



Foto 11: Localización y replanteo del área de trabajo, de ejes del proyecto e instalación de niveletas



Foto 12: Instalación de Guías del área de trabajo



Foto 13: Descapote del área de intervención



Foto 14: Excavación del área de trabajo hasta llegar al nivel establecido por la topografía



Foto 15: Retiro de sobrantes del Material de Excavación del área de trabajo



Foto 16: Excavación del área de trabajo



Foto 17: Conformación de subrasante del área de gimnasio al aire libre



Foto 18: Excavación manual para contenedor de raíces por debajo de canal Eje A



Foto 19: Excavación manual para contenedor de raíces por debajo de canal Eje F



Foto 20: Verificación de niveles del proyecto



Foto 21: Guías para ejes del proyecto



Foto 22: Llegada al sitio de geotextil tejido



Foto 23: Conformación de subrasante del área de gimnasio al aire libre previo a instalación de Geotextil tejido



Foto 24: Instalación geotextil Tejido para Mejoramiento de terreno entre subrasante y relleno Roca Muerta

INDERVALLE	CONSORCIO PARQUES VALLE	Versión: 1
		CODIGO:
	INFORME TÉCNICO, FINANCIERO, LEGAL MENSUAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	PV-IM-001
		Página __ de 2



Foto 25: Pausas Activas con profesional SST



Foto 26: Transporte de material e instalación del mismo para relleno en Roca Muerta



Foto 27: Instalación, extendido y compactación de material de relleno tipo Roca muerta en área de gimnasio al aire libre



Foto 28: Configuración-Nivelación de terreno previo a fundición de losas de concreto



Foto 29: Continúa instalación, extendido y compactación de relleno con Roca muerta en área de gimnasio al aire libre



Foto 30: Continúa Configuración-Nivelación de terreno previo a fundición de losas de concreto



Foto 31: Relleno con roca muerta en área de gimnasio al aire libre



Foto 32: Inician Excavaciones y encofrado para bordillos de concreto para confinamiento de losas de concreto

INDERVALLE	CONSORCIO PARQUES VALLE	Version: 1
		CÓDIGO: PV-IM-001
	INFORME TÉCNICO, FINANCIERO, LEGAL MENSUAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Página __ de 2



Foto 1: Instalación, extendido y compactación de material de relleno tipo roca muerta en área de gimnasio al aire libre





Foto 2: Se hace electrónico de red y retiro de poste de alumbrado público que se encontraba al interior del proyecto

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
* Visita de campo para identificación del frente de trabajo con los diferentes actores del Proyecto	* Excavación, fundición de solado, instalación de acero de refuerzo, encofrado y fundición de bordillos para losas
Se realiza acercamiento con la comunidad para manifestar el inicio de las actividades	en áreas definidas en planos para el confinamiento de los espacios donde se instalaran los equipos biosaludables
* Verificacion visual de área de trabajo	* Excavaciones para instalación de tubería de la red de iluminación del proyecto
* Se contó con la visita de la comisión de topografía donde una vez validadas las coordenadas de terreno se inicia con	* Excavaciones para cajas de la red de iluminación
la implantación de campo de la localización y replanteo, la colocación de los niveles de terreno para establecer las cotas de	* Excavaciones, solado de limpieza, instalación de acero de refuerzo y fundición de canales para aguas lluvias
excavación y relleno y la determinación de los volúmenes respectivos y posteriormente se instalan las guías	* Excavación e instalación de tubería para desague de canal de aguas lluvias
acorde a los datos obtenidos	
* Se realiza instalación de guaduas y cinta verde de confinamiento con el fin de delimitar el área de trabajo	
* Se inicia y termina con el descapote del área de trabajo donde se implantará el proyecto	
* Se inicia y termina con la excavación y posterior retiro de material sobrante a botadero certificado hasta llegar	
definido por la topografía del sitio donde se implantará el gimnasio biosaludable	
* Se terminó la Conformación de la superficie de la subrasante del área excavada en la zona de implantación del	
gimnasio al aire libre previo a la instalación de geotextil permitiendo un condicionamiento del terreno	
* Se realizó la instalación de geotextil tejido entre la subrasante y el relleno en roca muerta permitiendo un	
de terreno en sus propiedades mecánicas y un control de tensión superficial de agua en el sector de proyecto.	
* Se adelantó la llegada de material, extendido y compactación de material de relleno tipo Roca muerta en el	
implantará el gimnasio al aire libre, entre los ejes (A-F)(1-7)	
* Se terminó la configuración-Nivelación de terreno del material de roca muerta instalado previo a fundición de	
del gimnasio al aire libre	
* Se iniciaron las excavaciones y el encofrado de los bordillos de confinamiento de las losas en eje 4 (A-F) y eje	
* Se realizó el desmonte de redes y el posterior retiro de poste de alumbrado público que se encontraba	
área de intervención del proyecto y que obstaculizaba los espacios definidos en la obra	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:
Acorde al cronograma aprobado por la interventoría, se tiene un adelanto de 1,4 días de las actividades definidas para el proyecto en este frente de trabajo.

2. Disponibilidad de Recursos:
No se ha presentado hasta la fecha actual, dificultad en la disponibilidad de los recursos necesarios para las actividades programadas.

3. Ejecución Financiera:
Debido al adelanto en las actividades programadas se obtiene un balance financiero positivo.

4. Calidad de los trabajos:
Permanentemente se evalúa el avance de las actividades mediante inspección visual, registro fotográfico y registro escrito tanto en bitácora como en formatos implementados y validados

5. Manejo Ambiental:
El material de excavación se dispuso en botadero certificado el cual se cuente con la certificación respectiva de disposición, la obra se encuentra en permanente limpieza para No afectar la ejecución de las obras.

6. Seguridad Industrial:
* personal con el que se dispuso esta semana cuenta con los implementos de protección personal pertinentes para el desarrollo de sus actividades y se adelantan las capacitaciones respectivas por parte de la profesional

Programa salud ocupacional (si aplica):
continua la implementación acorde a las directrices del profesional de seguridad y salud en el trabajo el cual se hará entrega en el informe mensual.

8. Aspectos sociales:
En el transcurso de la semana no se han presentado dificultades a nivel social, la comunidad brinda el apoyo requerido para el normal desarrollo de las actividades. Solicitan una socialización con la entidad contratante a la

6. CONCLUSIONES

ASPECTOS GENERALES:
Las actividades programadas según cronograma de obra, han sido ejecutadas sin novedades.

ASPECTOS TECNICOS:
El cronograma aprobado por interventoria, se ha ejecutado conforme las actividds programadas.
No se han generado situaciones que afecten la ejecucion de las actividades programadas.
La comunidad ha participado activamente como veedores ciudadanos.
Los comites de obra se han realizado oportunamente, permitiendo avanzar proactivamente con las actividades en el area de intervencion.

ASPECTOS FINANCIEROS:
No se encuentran en curso cuentas o actas para ser pagadas por la entidad contratante.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:
En este periodo se han cumplido con todas las obligaciones contractuales suscritas entre las partes.
El contrato se encuentra en ejecución
El contrato actualmente cuenta con la poliza de cumplimiento No. 21-40-101224153 vigente hasta 22-07-2024
poliza de responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101224153 vigente hasta 22-07-2027

ASPECTOS JURIDICOS:

EL CONTRATISTA:	EL INTERVENTOR:	VB. INDERVALLE
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: WILSON DE JESUS MARIN REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA	Nombre: JUAN CARLOS NARANJO REP. LEGAL O DIRECTOR DE	Nombre: JUAN CARLOS RUEDA SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE MENSUAL

FRENTE COMUNEROS
FRENTE CARTAGO

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OBJETO CONTRACTUAL	:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES". GRUPO 1: FRENTE 1: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1: FRENTE 3. ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II - MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATANTE	:	INDERVALLE
CONTRATISTA	:	CONSORCIO PARQUES VALLE
INTERVENTORIA	:	CONSORCIO GRUPO 3
FRENTE:	:	03
UBICACIÓN:	:	BARRIO COMUNEROS 2
ACTA DE COBRO	:	01
FECHA DEL PRESENTE INFORME	:	30 DE ENERO DE 2024

EL CONTRATISTA	SUPERVISIÓN	INTERVENTORÍA
WILSON MARIN Consorcio Parques Valle Representante Legal	JUAN CARLOS RUEDA INDERVALLE	JUAN CARLOS NARANJO Consorcio Grupo 3 Representante Legal

CONTENIDO

1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 3
2 DIFICULTADES ENCONTRADAS 9
3 SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE OBRA 10
4 SEGUIMIENTO A FLUJO DE CAJA 12
5 PERSONAL EMPLEADO 13
6 CORRESPONDENCIA 14
7 DOCUMENTACIÓN DE OBRA 44
7.1 Actas de vecindad 44

1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Descripción de las actividades, cantidades ejecutadas, registro fotográfico por ítem.

Semana 1: 28 de diciembre de 2023 al 06 de enero de 2024

Actividades ejecutadas:

- Socialización del proyecto



Ilustración 1. Socialización con la comunidad.

- Cerramiento provisional



Ilustración 2. Cerramiento provisional

- Replanteo de ejes estructurales



Ilustración 3: Localización y replanteo

- Inicio de excavaciones (prehuecos)



Ilustración 4. Excavación para Caisson (2-F)

Semana 2: 08 de enero de 2024 a 13 de enero de 2024

- Demolición de andenes



Ilustración 5. Demolición de andenes de concreto con herramientas manuales y equipos neumáticos

- Figura de acero de refuerzo



Ilustración 6. Acero figurado

- Retiro de escombros y material de excavación para disposición final



Ilustración 7. Retiro de escombros

Semana 3: 15 de enero de 2024 a 20 de enero de 2024

- Excavación de caissons





Ilustración 8. Excavación manual de caissons

- Construcción de anillos

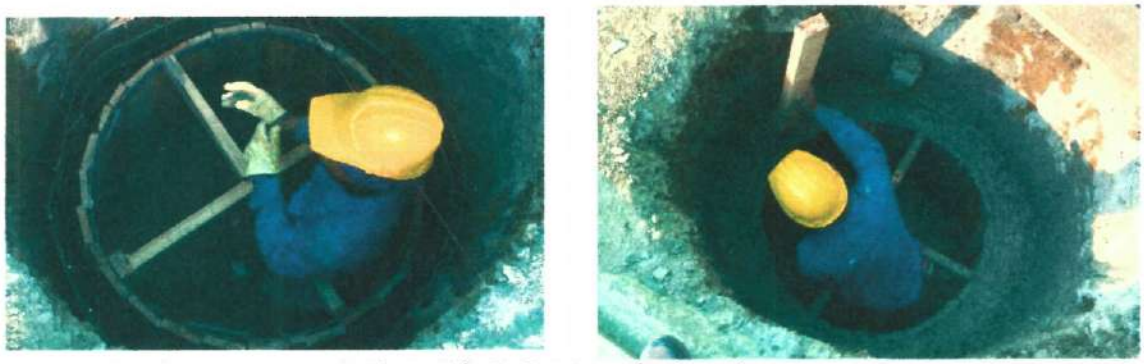


Ilustración 9. Construcción de anillos.

Semana 4: 22 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024

- Armado de refuerzo de caissons.



- Fundición de caissons



- Construcción de cerchas y vigas de amarre en celosía



-

2 DIFICULTADES ENCONTRADAS

Motivos de retraso o no ejecución de actividades, p. ejemplo: no haber hecho las socializaciones, la valla informativa, clima, etc.

Las actividades del área social como son presentación o socialización del proyecto a la comunidad y creación de comités de veeduría ciudadana presentaron retraso en su ejecución, sin embargo, se realizaron en conjunto con la entidad contratante, representantes de la gobernación y demás actores para poner en conocimiento a la comunidad sobre los ejecutores de la obra, la interventoría, fechas de inicio y finalización programadas e información general del proyecto.

La instalación de valla informativa se retrasó respecto a su fecha programada debido a la falta de diseño de arte oficial para las mismas por parte de la entidad, sin embargo, a la fecha del presente informe ya se encuentra instalada pues el día 25 de enero de 2024 se entregó el diseño del arte de la valla informativa para impresión y posterior instalación de la misma en el sitio del proyecto.

Se espera registro y aprobación del proyecto eléctrico por parte de EMCALI, para posterior apropiación del servicio de mantenimiento por parte de la misma entidad al momento de entrega del proyecto.


Se espera respuesta del DAGMA para tala de árboles al interior del escenario deportivo.

En cuanto a las condiciones climáticas adversas se presentaron tres (3) eventos:

- El día 10 de enero de 2024 las lluvias interrumpen las labores de excavación de caissons durante la jornada de la mañana las excavaciones. Debido a lo anterior, también es necesario evacuar el agua empozada de las excavaciones con bomba sumergible.
- El día 12 de enero de 2024 se presentan lluvias en la madrugada, ocasionando inundaciones que provocaron la suspensión de actividades de excavaciones y retiro de material sobrante para disposición final.
- El día 25 de enero de 2024 se presentan lluvias en la madrugada, ocasionando inundaciones que provocaron la suspensión de actividades de excavaciones y retiro de material sobrante para disposición final.

3 SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE OBRA

A continuación, se presenta el programa para ejecución de actividades calculado para el frente 3 con fecha de corte el 31 de enero de 2024.

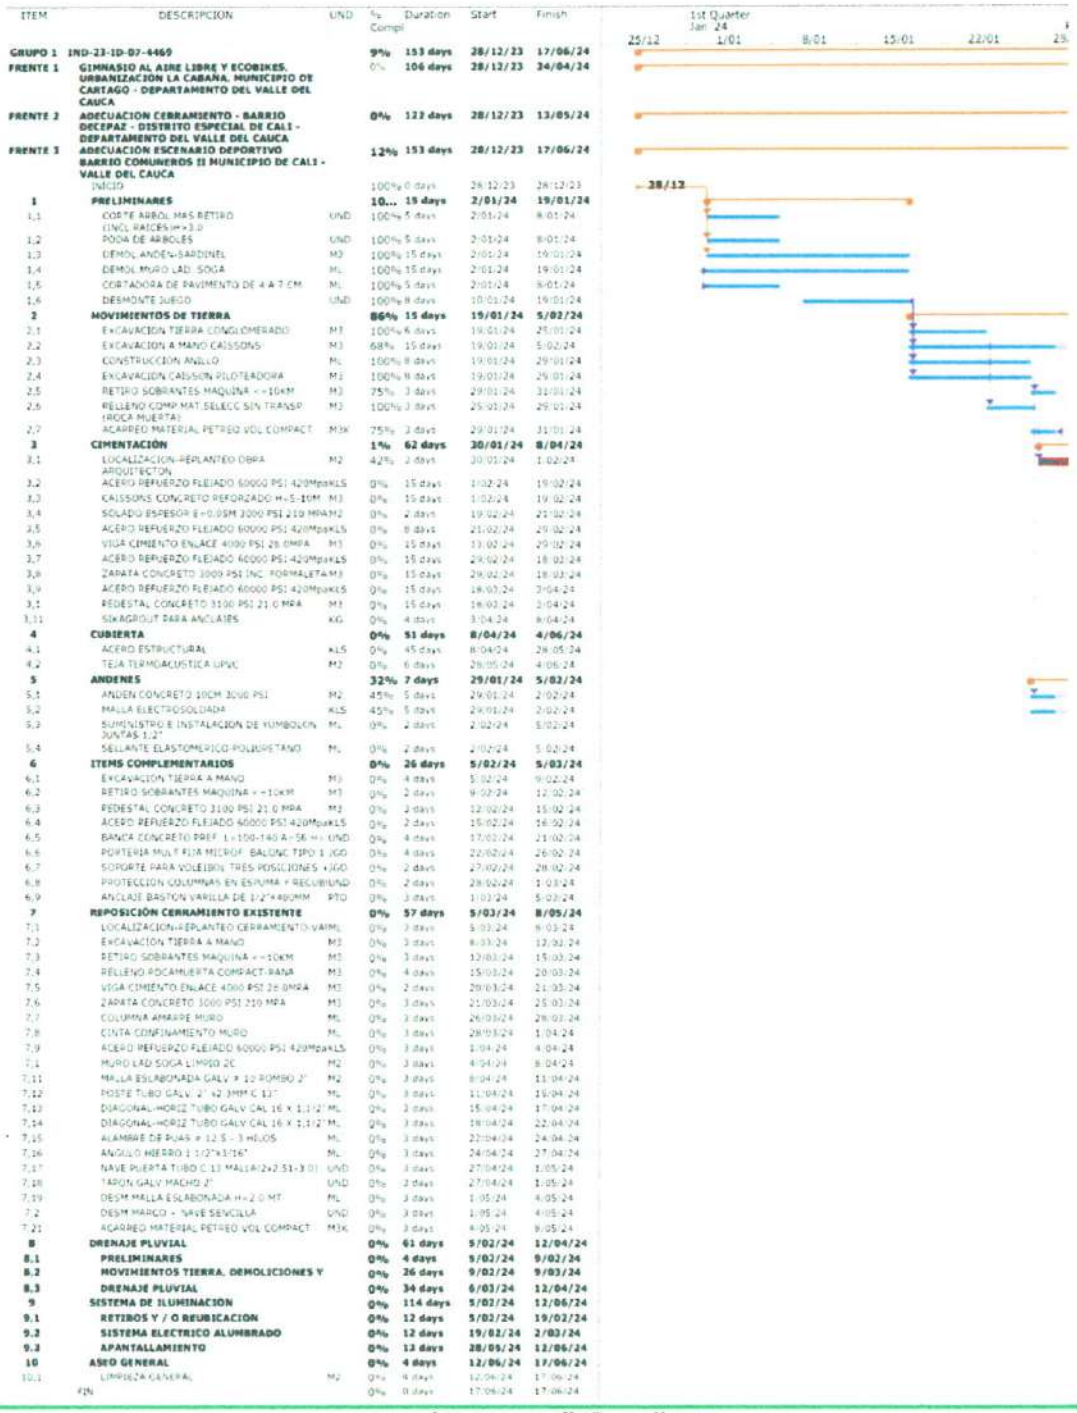

ITEM	DESCRIPCION	UND	% Compl	Duration	Start	Finish
GRUPO 1	IND-23-ID-07-4469		9%	153 days	28/12/23	17/06/24
FRENTE 1	GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES. URBANIZACION LA CABAÑA. MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0%	106 days	28/12/23	24/04/24
FRENTE 2	ADECUACION CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0%	122 days	28/12/23	13/05/24
FRENTE 3	ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA		12%	153 days	28/12/23	17/06/24
	INICIO		100%	0 days	28/12/23	28/12/23
1	PRELIMINARES		10...	19 days	2/01/24	19/01/24
1.1	CORTE ARBOL MAS RETIRO CINCL RAICES(H>3.0	UND	100%	5 days	2/01/24	8/01/24
1.2	PODA DE ARBOLES	UND	100%	5 days	2/01/24	8/01/24
1.3	DEMOL ANDEN-SARDINEL	M3	100%	15 days	2/01/24	19/01/24
1.4	DEMOL MURO LAD. SOGA	ML	100%	15 days	2/01/24	19/01/24
1.5	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM.	ML	100%	5 days	2/01/24	8/01/24
1.6	DESMONTE JUEGO	UND	100%	8 days	10/01/24	19/01/24
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA		86%	15 days	15/01/24	5/02/24
2.1	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	M3	100%	6 days	19/01/24	25/01/24
2.2	EXCAVACION A MANO CAISSONS	M3	68%	15 days	19/01/24	5/02/24
2.3	CONSTRUCCION ANILLO	ML	100%	8 days	19/01/24	29/01/24
2.4	EXCAVACION CAISSON PILOTEADORA	M3	100%	8 days	19/01/24	29/01/24
2.5	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM	M3	75%	3 days	29/01/24	31/01/24
2.6	RELLENO COMP MAT.SELECC SIN TRANSP. (ROCA MUERTA)	M3	100%	3 days	25/01/24	29/01/24
2.7	ACARREO MATERIAL PETREO VOL COMPACT	M3K	75%	3 days	29/01/24	31/01/24
3	CIMENTACIÓN		1%	62 days	30/01/24	8/04/24
3.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON	M2	42%	2 days	30/01/24	1/02/24
3.2	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MpaKLS		0%	15 days	1/02/24	19/02/24
3.3	CAISSONS CONCRETO REFORZADO H=5-10M	M3	0%	15 days	1/02/24	19/02/24
3.4	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPAM2		0%	2 days	19/02/24	21/02/24
3.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MpaKLS		0%	8 days	21/02/24	29/02/24
3.6	VIGA CIMIENTO ENLACE 4000 PSI 28.0MPA	M3	0%	15 days	13/02/24	29/02/24
3.7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MpaKLS		0%	15 days	29/02/24	18/03/24
3.8	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA M3		0%	15 days	29/02/24	18/03/24
3.9	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MpaKLS		0%	15 days	18/03/24	3/04/24
3.1	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	0%	15 days	18/03/24	3/04/24
3.11	SIKAGROUT PARA ANCLAJES	KG	0%	4 days	3/04/24	8/04/24
4	CUBIERTA		0%	51 days	8/04/24	4/06/24
4.1	ACERO ESTRUCTURAL	KLS	0%	45 days	8/04/24	28/05/24
4.2	TEJA TERMOACUSTICA UPVC	M2	0%	6 days	28/05/24	4/06/24
5	ANDENES		32%	7 days	29/01/24	5/02/24
5.1	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	45%	5 days	29/01/24	2/02/24
5.2	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	45%	5 days	29/01/24	2/02/24
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE YUMBOLON JUNTAS 1.2"	ML	0%	2 days	2/02/24	5/02/24
5.4	SELLANTE ELASTOMERICO POLIURETANO	ML	0%	2 days	2/02/24	5/02/24
6	ITEMS COMPLEMENTARIOS		0%	26 days	5/02/24	5/03/24
6.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	0%	4 days	5/02/24	9/02/24
6.2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM	M3	0%	2 days	9/02/24	12/02/24
6.3	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	0%	3 days	12/02/24	15/02/24
6.4	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MpaKLS		0%	2 days	15/02/24	16/02/24
6.5	BANCA CONCRETO PREF. L=150-140 A=56 H=	UND	0%	4 days	17/02/24	21/02/24
6.6	PORTERIA MULT FIJA MICROF. BALONC TIPO 1	JGO	0%	4 days	22/02/24	26/02/24
6.7	SOPORTE PARA VOLEIBOL TRES POSICIONES	JGO	0%	2 days	27/02/24	28/02/24
6.8	PROTECCION COLUMNAS EN ESPUMA Y RECUBRI	UND	0%	2 days	28/02/24	1/03/24
6.9	ANCLAJE BASTON VARILLA DE 1/2"X 480MM	PTO	0%	3 days	1/03/24	5/03/24
7	REPOSICIÓN CERRAMIENTO EXISTENTE		0%	57 days	5/03/24	8/05/24
7.1	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO VARIA	ML	0%	3 days	5/03/24	8/03/24
7.2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	0%	3 days	8/03/24	12/03/24
7.3	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM	M3	0%	3 days	12/03/24	15/03/24
7.4	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	0%	4 days	15/03/24	20/03/24
7.5	VIGA CIMIENTO ENLACE 4000 PSI 28.0MPA	M3	0%	2 days	20/03/24	21/03/24
7.6	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	0%	3 days	21/03/24	25/03/24
7.7	COLUMNA AMARRE MURO	ML	0%	3 days	26/03/24	28/03/24
7.8	CINTA CONFINAMIENTO MURO	ML	0%	3 days	28/03/24	1/04/24
7.9	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MpaKLS		0%	3 days	1/04/24	4/04/24
7.1	MURO LAD SOGA LIMPIO 2C	M2	0%	3 days	4/04/24	8/04/24
7.11	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2	0%	3 days	8/04/24	11/04/24
7.12	POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C 12'	ML	0%	3 days	11/04/24	15/04/24
7.13	DIAGONAL-HORIZ TUBO GALV CAL 16 X 1 1/2"	ML	0%	3 days	15/04/24	17/04/24
7.14	DIAGONAL-HORIZ TUBO GALV CAL 16 X 1 1/2"	ML	0%	3 days	18/04/24	22/04/24
7.15	ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	0%	3 days	22/04/24	24/04/24
7.16	ANGULO HIERRO 1 1/2"x1/16"	ML	0%	3 days	24/04/24	27/04/24
7.17	NAVE PUERTA TUBO C 13 MALLA#2x2.51-3.01	UND	0%	3 days	27/04/24	1/05/24
7.18	TAPON GALV MACHO 2"	UND	0%	2 days	27/04/24	1/05/24
7.19	DESM MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	ML	0%	3 days	1/05/24	4/05/24
7.2	DESM MARCO + NAVE SENCILLA	UND	0%	3 days	1/05/24	4/05/24
7.21	ACARREO MATERIAL PETREO VOL COMPACT	M3K	0%	3 days	4/05/24	8/05/24
8	DRENAJE PLUVIAL		0%	61 days	5/02/24	12/04/24
8.1	PRELIMINARES		0%	4 days	5/02/24	9/02/24
8.2	MOVIMIENTOS TIERRA, DEMOLICIONES Y		0%	26 days	9/02/24	9/03/24
8.3	DRENAJE PLUVIAL		0%	34 days	6/03/24	12/04/24
9	SISTEMA DE ILUMINACION		0%	114 days	5/02/24	12/06/24
9.1	RETIROS Y / O REUBICACION		0%	12 days	5/02/24	19/02/24
9.2	SISTEMA ELECTRICO ALUMBRADO		0%	12 days	19/02/24	2/03/24
9.3	APANTALLAMIENTO		0%	13 days	28/05/24	12/06/24
10	ASEO GENERAL		0%	4 days	12/06/24	17/06/24
10.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	0%	4 days	12/06/24	17/06/24
FIN			0%	0 days	17/06/24	17/06/24

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01

Durante el periodo comprendido entre el 28 de diciembre de 2023 y el 31 de enero de 2024 en el frente 1 se tiene el siguiente avance físico de obra:

Semana 1:

SEGUIMIENTO DE OBRA AVANCE FÍSICO (%)				
Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso [días]
% Programado	0.00%	3.00%	3.00%	0.0
% Ejecutado	0.00%	3.00%	3.00%	
Diferencia	0.00%	0.00%	0.00%	

Semana 2:

SEGUIMIENTO DE OBRA AVANCE FÍSICO (%)				
Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso [días]
% Programado	3.00%	3.00%	6.00%	5.4
% Ejecutado	3.00%	9.00%	12.00%	
Diferencia	0.00%	6.00%	6.00%	

Semana 3:

SEGUIMIENTO DE OBRA AVANCE FÍSICO (%)				
Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso [días]
% Programado	6.00%	1.00%	7.00%	15.3
% Ejecutado	12.00%	12.00%	24.00%	
Diferencia	-6.00%	11.00%	17.00%	

Semana 4:

SEGUIMIENTO DE OBRA AVANCE FÍSICO (%)				
Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	7.00%	6.00%	13.00%	24.4
% Ejecutado	24.00%	16.08%	40.08%	
Diferencia	17.00%	10.08%	27.08%	

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

4 SEGUIMIENTO A FLUJO DE CAJA

Actualización de la programación a la fecha de corte del acta (COSTOS)

Semana 1:

AVANCE FINANCIERO				En %
Programado (%)	$0.00	$ 43,134,514.14	$ 43,134,514.14	3.00%
Ejecutado (%)	$0.00	$ 43,134,514.14	$ 43,134,514.14	3.00%
Diferencia	$0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00%

Semana 2:

AVANCE FINANCIERO				En %
Programado (%)	$43,134,514.14	$ 43,134,514.14	$ 86,269,028.28	6.00%
Ejecutado (%)	$43,134,514.14	$ 129,403,542.42	$ 172,538,056.56	12.00%
Diferencia	$0.00	$ 86,269,028.28	$ 86,269,028.28	6.00%

Semana 3:

AVANCE FINANCIERO				En %
Programado (%)	$86,269,028.28	$ 14,378,171.38	$ 100,647,199.66	7.00%
Ejecutado (%)	$172,538,056.56	$ 172,538,056.56	$ 345,076,113.12	24.00%
Diferencia	$86,269,028.28	$ 158,159,885.18	$ 244,428,913.46	17.00%

Semana 4:

AVANCE FINANCIERO				En %
Programado (%)	$100,647,199.66	$ 86,269,028.28	$ 186,916,227.94	13.00%
Ejecutado (%)	$345,076,113.12	$ 231,193,672.88	$ 576,269,786.00	40.08%
Diferencia	$244,428,913.46	$ 144,924,644.60	$ 389,353,558.06	27.08%

5 PERSONAL EMPLEADO

Listado de personal en obra.

CONSORCIO PARQUES VALLE
PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 1 FRENTE 1: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI- DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1: FRENTE 3: ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DECALI - VALLE DEL CAUCA
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

8. GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

8.1 INFORMACIÓN DE TRABAJADORES, CONTROL DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES

Personal Administrativo

	Personal	Nombre completo	Cedula	Operador de planilla	No. Planilla
1	Director Administrativo	Diana Patricia Cerón Gil	29.112.229	Compensar	73435352
2	Residente de Obra	Fabian David Quintero Fajardo	1.144.039.291	Ach Soi	7913933308
3	Inspector SST	Brigitte Alexandra Hernández Ibarra	1.143.864.182	Vinculación Inicial	N/A

Personal Operativo

	Cargo	Nombre Completo	Cedula	Operador	No. Planilla
1	Ayudante	Héctor Fabio Rosero	98.351.495	Vinculación Inicial	N/A
2	Maestro	Clay Jorge Segura Cortes	1.192.965.443	Vinculación Inicial	N/A
3	Ayudante	Yesid Alexis Campo Burbano	1.062.280.454	Vinculación Inicial	N/A
4	Ayudante	German Francisco Lucio	16.460.100	Vinculación Inicial	N/A
5	Ayudante	Noe Taquinaz Ipia	10.633.355	Vinculación Inicial	N/A
6	Oficial	Evaristo Angelmiro Landazuri Caicedo	94.451.434	Vinculación Inicial	N/A
7	Oficial	Milton Cortes Cortes	94.412.727	Vinculación Inicial	N/A
8	Ayudante	Cristobal Paz Carabali	87.020.042	Vinculación Inicial	N/A
8	Ayudante	Freyman Alexis Cortes Castañeda	1.086.051.724	Vinculación Inicial	N/A
9	Ayudante	Eli Fredi Rodriguez Hurtado	12.798.381	Vinculación Inicial	N/A

6 CORRESPONDENCIA

Copia de los documentos y correos (enviados y recibidos)

CONSORCIO PARQUES VALLE
CONTRATO IND-23-ID-07-4469

Documento: PV001

Cali, 05 de enero de 2024

ING. JULIAN ANDRADE
CONSORCIO GRUPO 3
A quien corresponda

Asunto: PROGRAMACIÓN DE OBRA


Buenas tardes, Ing. Julián

me permito enviar para su revisión la programación o cronograma de ejecución actividades pertinentes a las obras correspondientes a los frentes 1, 2 y 3 del CONTRATO IND-23-ID-07-4469.

Quedo atento a sus comentarios o inquietudes. Cordialmente

FABIAN QUINTERO
Ingeniero Civil
Residente de Obra - Consorcio Parques Valle

consorcioparquesvalle@gmail.com

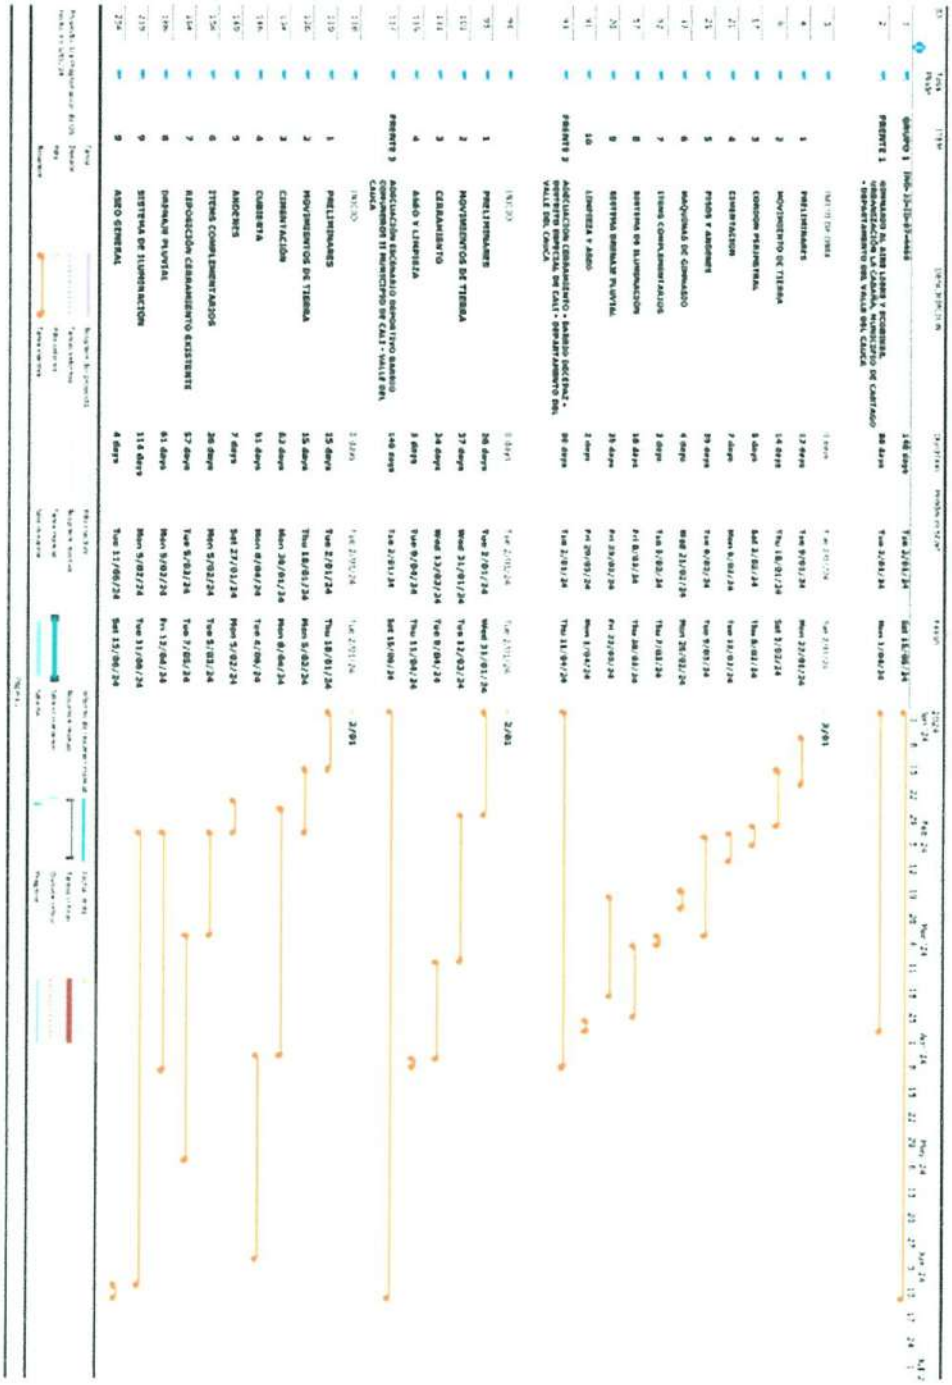

CONSORCIO PARQUES VALLE
CONTRATO IND-23-ID-07-4469

Documento: PV002

Cali, 11 de enero de 2024

ING. JULIAN ANDRADE
CONSORCIO GRUPO 3
A quien corresponda

Ref. CUBIERTA COMUNEROS II
Asunto: SOLITUD DE REGISTRO DE PROYECTO ELÉCTRICO

Buenas tardes, Ing. Julián

La presente tiene como objeto solicitar formalmente la información sobre el registro del proyecto eléctrico asociado a la obra de la referencia ante Empresas Municipales de Cali o EMCALI. Lo anterior, respondiendo a la solicitud de los representantes de la Junta de Acción Comunal del Barrio Comuneros II, quienes argumentan la necesidad del registro del proyecto ante EMCALI para que sean posibles los mantenimientos de las instalaciones eléctricas por parte de la misma entidad, una vez se finalice el proyecto.

Quedo atento a sus comentarios o inquietudes. Cordialmente,

FABIAN QUINTERO
Ingeniero Civil
Residente de Obra - Consorcio Parques Valle

CONSORCIO PARQUES VALLE
CONTRATO IND-23-ID-07-4469

Documento: PV003

Cali, 17 de enero de 2024

SRAS. Y SRES.
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO COMUNEROS II
YORMI MEDINA – PRESIDENTA JAC COMUNEROS II
A QUIEN CORRESPONDA

Ref. CUBIERTA COMUNEROS II
Asunto: INVENTARIO DE RECIBO DE ESCENARIO DEPORTIVO COMUNEROS II

Cordial saludo,

La presente tiene como objeto presentar el informe de recibo de espacios del escenario deportivo del barrio COMUNEROS II, el cual fue realizado mediante recorrido en compañía de representantes de la JAC del mismo barrio. A continuación, se presenta una relación de los espacios y las condiciones en las que se encuentran al momento de la entrega por parte de la JAC al Consorcio Parques Valle.

OBRA: CUBIERTA METALICA ESCENARIO DEPORTIVO COMUNEROS II				
Item	Descripcion	Estado	Observaciones	Registro fotografico
1	Caseta comunal #1. Exterior	Bueno.	Fachadas con recubrimiento en graniplast, pintadas, con manchas visibles por humedades. Cerchas de cubierta en buen estado aparente	


consorcioparquesvalle@gmail.com

CONSORCIO PARQUES VALLE
CONTRATO IND-23-ID-07-4469

2	Caseta comunal #1. Interior	Regular.	Ventana de fachada con vidrio roto	
3	Caseta comunal #1. Interior	Regular.	Loseta de enchape de piso deteriorada, con evidente desgaste (peladuras, loseta rota)	
4	Caseta comunal #1. Interior	Regular.	Pintura de muros en mal estado, manchadas	
5	Caseta comunal #1. Interior	Regular.	Baños: enchape en evidente deterioro	

consorcioparquesvalle@gmail.com

CONSORCIO PARQUES VALLE
CONTRATO IND-23-ID-07-4469

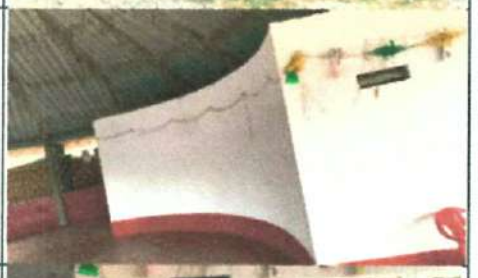6	Caseta comunal #1. Interior	Regular	Cocinetas: enchape en evidente deterioro.	
7	Caseta comunal #2. Exterior	Bueno	Bueno. Fachadas pintadas, con manchas visibles por humedades. Reja de cerramiento perimetral y cerchas de cubierta en buen estado aparente	
8	Caseta comunal #2. Interior	Bueno	Muros interiores con pintura en buen estado	
9	Caseta comunal #2. Interior	Bueno	Muros interiores con pintura en buen estado	

consorcioparquesvalle@gmail.com

CONSORCIO PARQUES VALLE
CONTRATO IND-23-ID-07-4469

10	Caseta comunal #2. Interior.	Bueno.	Ventana completa. Vidrio en buen estado.	
11	Malla Cerramiento Perimetral de cancha sintética.	Bueno.	Buen estado general, debe modificarse acceso a cancha (foto), construyendo nueva puerta sobre el costado occidental de la cancha debido a interferencia con la estructura a construirse. El cerramiento no tiene alambre de puas.	
12	Malla Cerramiento Perimetral de juegos infantiles.	Bueno.	Estructura en buen estado general. No tiene alambre de puas.	

consorcioparquesvalle@gmail.com

CONSORCIO PARQUES VALLE
CONTRATO IND-23-ID-07-4469

13	Acabado de cancha multiple en concreto reforzado	Bueno.	Estructura de pavimento en buen estado general. No se presentan agrietamientos. Se evidencian desgastes en algunas zonas y deterioro de la pintura y demarcacion.	
14	Acabado de cancha multiple en concreto reforzado	Bueno.	Estructura de pavimento en buen estado general. No se presentan agrietamientos. Se evidencian desgastes en algunas zonas y deterioro de la pintura y demarcacion.	
15	Juegos bio-saludables	Bueno.	Funcional. Pintura desgastada.	


consorcioparquesvalle@gmail.com

CONSORCIO PARQUES VALLE
CONTRATO IND-23-ID-07-4469

16	Juegos bio-saludables	Bueno.	Funcional. Pintura desgastada.	
17	Juegos bio-saludables	Bueno.	Funcional. Pintura desgastada.	
18	Juegos bio-saludables	Bueno.	Funcional. Pintura desgastada.	
19	Caneca de basura en acero inoxidable	Bueno.	Funcional. Lamina en buen estado.	

consorcioparquesvalle@gmail.com

CONSORCIO PARQUES VALLE
CONTRATO IND-23-ID-07-4469

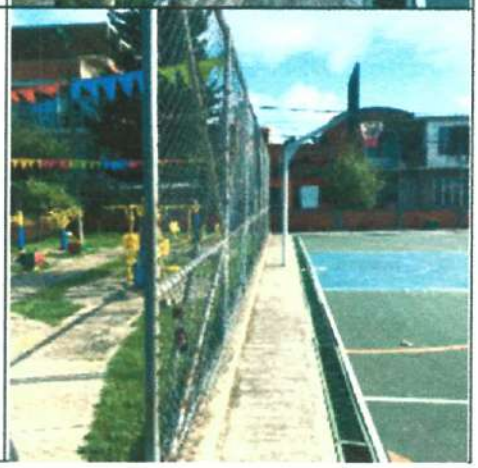20	Pantalla de proteccion en malla eslabonada (Oriental)	Bueno.	Funcional. Lamina en buen estado.	
21	Pantalla de proteccion en malla eslabonada (Occidental)	Bueno.	Funcional. Lamina en buen estado.	

FABIAN QUINTERO
Ingeniero Civil
Residente de Obra - Consorcio Parques Valle

consorcioparquesvalle@gmail.com

CONSORCIO PARQUES VALLE
CONTRATO IND-23-ID-07-4469

Documento: PV005

Cali, 19 de enero de 2024

ING. JAIRO ORTEGA
INDERVALLE
A quien corresponda

Ref. CUBIERTA COMUNEROS II
Asunto: SOLITUD DE PLANOS ESTRUCTURALES DEFINITIVOS

Cordial saludo,

La presente tiene como objeto solicitar formalmente el cambio de especificación de material estructural de las placas bases del proyecto de la referencia, de ASTM A572 a ASTM A36; lo anterior debido a la (no) disponibilidad en el mercado del material estructural especificado en los detalles iniciales.

De igual forma se solicita evaluar el cambio en la especificación de mallas de refuerzo de anillos para excavación manual de caissons. Actualmente, en los diseños se muestran mallas Ø8.0mm cada 150 mm (PLANO E-01); se solicita cambiar éstas por mallas Ø5.0mm cada 150 mm para adaptabilidad a las formaletas construidas para la fundición de los anillos.

Adicionalmente, se solicitan la definición de los siguientes temas:

1. Plantas y alzadas estructurales definitivas, donde se permita identificar secciones transversales y diámetros para tensores y contravientos.
2. Detalles de conexiones de cubierta (porta correas, tensores y contravientos)
3. Detalles estructurales de cerramiento propuesto. En el plano arquitectónico DET-01 (adjunto) se muestran detalles para la cimentación y estructura de andenes (relleno roca muerta e= 20 cm)

NOTA: Respondiendo a su solicitud adjunto plano con detalle de canal de cubierta.

Agradeciendo de antemano su atención,

FABIAN QUINTERO
Ingeniero Civil
Residente de Obra - Consorcio Parques Valle

consorcioparquesvalle@gmail.com

Gmail

Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com>

CITACION URGENTE GOBERNACION DEL VALLE

1 mensaje

infraestructura@indervalle.gov.co <infraestructura@indervalle.gov.co> 5 de enero de 2024, 11:32 a.m.
Para: consorcioparquesvalle@gmail.com, consorciogrupo3@gmail.com, acj@itecoltda.com, j hoyos@itecoltda com, construarte76@gmail com, ingevaldes@hotmail.com, cris jupe@hotmail com, Consorcioparques2023valle@gmail com, consorciopistasjrfa@gmail.com, Jicosasronald@gmail.com, interG1G3@hotmail.com, construpacicolsaszomac.info@gmail.com

Cordial Saludo:

De la manera mas atenta y respetuosa citamos a usted, a una reunión de carácter urgente en el despacho de la gobernadora Dra. Dilian Francisca Toro, Gobernación del Valle del Cauca.

Dia: Sábado 06 de enero de 2024
Hora: De 7:am a 3:pm .
Dirección: Carrera 6 entre calles 9 y 10 Edificio Palacio de San Francisco.

Solicitamos por favor confirmar su asistencia por este medio e indicar nombre y número de cedula de quien asistirá a la reunión.

Atentamente,

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
Subgerente de Infraestructura Deportiva
INDERVALLE

Gmail

Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com>

CONTRATO IND-23-ID-07-4469: Proyecto eléctrico COMUNEROS II

2 mensajes

Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com> 11 de enero de 2024, 9:36 a.m.
Para: consorciogrupo3@gmail.com
CC: japelaez@emcali.com.co, Juntacomunalcomuneros2@hotmail.com

Buenos días, Ing.

Atendiendo la solicitud de la JAC me permito enviar la solicitud de información sobre el registro del proyecto eléctrico de la obra del asunto ante EMCALI.

Quedo atento a sus comentarios.

--
FABIAN QUINTERO
Ingeniero Civil
Residente de Obra - Consorcio Parques Valle

4 archivos adjuntos

- **PV002.pdf** 211K
- **Ficha Técnica Iluminación.pdf** 581K
- **Memoria de Cálculo comuneros.pdf** 1216K
- **Estudio de Iluminación..pdf** 969K

consorciogrupo3 consorciogrupo3 <consorciogrupo3@gmail.com> 11 de enero de 2024, 11:09 a.m.
Para: Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com>
CC: japelaez@emcali.com.co, Juntacomunalcomuneros2@hotmail.com

OK, recibido.
[Texto citado oculto]

Gmail — Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com>

CONTRATO IND-23-ID-07-4469: Programación de obra

5 mensajes

Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com> — 5 de enero de 2024, 4:52 p.m.
Para: consorciogrupo3@gmail.com

Buenas tardes, Ing. Julian

me permito enviar para su revisión la programación de obra para la ejecución de las obras correspondientes a los frentes 1, 2 y 3 del Grupo 1 respectivamente.

Quedo atento a sus comentarios o inquietudes. Cordialmente

--
FABIAN QUINTERO
Ingeniero Civil
Residente de Obra - Consorcio Parques Valle

2 archivos adjuntos

PVV001.pdf
488K

PROGRAMACION PV 2024.mpp
807K

consorciogrupo3 consorciogrupo3 <consorciogrupo3@gmail.com> — 5 de enero de 2024, 5:21 p.m.
Para: Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com>

OK, recibido.
[Texto citado oculto]

Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com> — 9 de enero de 2024, 10:31 a.m.
Para: nicolaspc@outlook.com

Buenos días, arq.

me permito enviar para su p.s.i. la programación de obra propuesta para los tres frentes de trabajo del contrato IND-23-ID-07-4469
[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

PVV001.pdf
488K

PROGRAMACION PV 2024.mpp
807K

consorciogrupo3 consorciogrupo3 <consorciogrupo3@gmail.com> — 9 de enero de 2024, 12:33 p.m.
Para: Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com>, cardenascivil99@gmail.com, nico1999 ng3@gmail.com

Buenas tardes ingeniero.

Adjunto oficio de respuesta y aprobación del programa de obra.

Julian Andrade H.
Consorcio Grupo 3
Interventoria
[Texto citado oculto]

CG3-001-2024 APROBACION PROGRAMA DE OBRA 4469 (CARTAGO DECEPAZ COMUNEROS).pdf
585K

Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com> 12 de enero de 2024, 9:29 a.m.
Para: "cardenascivil99@gmail.com" <cardenascivil99@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Consorcio Parques Valle** <consorcioparquesvalle@gmail.com>
Date: vie, 5 ene 2024 a la(s) 4:52 p.m.
Subject: CONTRATO IND-23-ID-07-4469 Programación de obra
To: <consorciogrupo3@gmail.com>

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

PVV001.pdf
488K

PROGRAMACION PV 2024.mpp
807K

Gmail

Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com>

Requerimientos Iniciales Contrato No. IND - 23 - 4469

1 mensaje

consorciogrupo3 consorciogrupo3 <consorciogrupo3@gmail.com> 16 de enero de 2024, 6:37 a.m.
Para: cardenascivil99@gmail.com, Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com>, ortegajairo25@gmail.com, jupamalo1746@hotmail.com

CG3-002-2024 Requerimientos Iniciales IND - 23 -4469 (CARTAGO - DECEPAZ - COMUNEROS).pdf
389K

CG3

CONSORCIO GRUPO 3
INTERVENTORIA

Distrito Santiago de Cali, Enero 15 de 2024 CG3-002-2024

Señor
WILSON DE JESÚS MARIN GONZALEZ
Representante Legal **CONSORCIO PARQUES VALLE**
Contratista
Instituto del Deporte, la Educación Física y La Recreación
INDERVALLE
La Ciudad

Referencia: Contrato de obra IND-23-4469 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 1. FRENTE 1. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES. URBANIZACION LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1. FRENTE 2. ADECUACION CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1. FRENTE 3. ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA. "

Asunto: Requerimientos Iniciales

Cordial saludo.

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del contrato de la referencia y con el fin de poder efectuar el seguimiento, el CONTRATISTA debera tener en cuenta y atender las siguientes observaciones:

1 Para iniciar las obras, se debe agotar las instancias correspondientes a los procesos de socialización del contrato de obra y acreditación por parte del contratista que todo el personal asignado para la ejecución de los diferentes frentes de trabajo se encuentre afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgo laboral.

2 Aprobación por parte de la interventoria del cronograma de obra, el cual debe estar ajustado a la fecha de inicio del 28 de Diciembre 2023 y terminación hasta el 30 de Junio de 2024.

3 Una vez suscrito el acta de inicio, el contratista debe aportar al interventor, los soportes del pago de seguridad integral y las planillas de afiliacion al sistema de seguridad social integral.

4 Se realizara posterior a la visita la revisión conjunta del alcance de las obras, con el fin de garantizar el cabal cumplimiento del contrato y los cometidos de la contratación estatal, en aras de dejar obras debidamente terminadas, prever posibles falencias en el presupuesto inicial y poder informar oportunamente a la entidad.

5 Como contratista deberá implementar todas las medidas de seguridad, que garantice y salvaguarde la integridad física de todos los moradores del sector y del area de influencia de las obras y las propias de todo el personal asignado a la obra.

6 Toda comunicación entre el contratista y el interventor deberá ser ratificada en documento escrito.

CALLE 18 N # 3N-70
OFICINA 401
EDIFICIO NOYRA
CALI-COLOMBIA

consorciogrupo3@gmail.com
cardenascivil99@gmail.com

301 2759200; 316 4918891, 602 668 55 24

CG3

CONSORCIO GRUPO 3
INTERVENTORIA

7. El contratista deberá mantener en cada frente de obra un libro para la memoria diaria (bitacora) en donde se deben registrarán las actividades dianas de la obra, todas las acciones y determinaciones técnicas, legales y administrativas desde el inicio de obra hasta su liquidación, el cual forma parte integral de los documentos del contrato.

8. Las actas de pago parcial y final deberán incluir, la preacta debidamente diligenciada por el contratista en formato de la entidad, memorias de cálculo con sus respectivos esquemas, registro fotográfico, fotocopia de los registros de la bitácora de obra y demás documentos exigidos según contrato de obra.

9. Las obras que no sea medibles a simple vista tales como rellenos, excavaciones, estructuras enterradas, etc., deberán ser revisadas por el interventor antes de proseguir con la ejecución de las actividades siguientes.

10. Son obligaciones del contratista todo el cumplimento de las normas técnicas de construcción conforme a las especificaciones técnicas establecidas por INDERVALLE, las normas de construcción y los códigos de la contratación estatal vigentes.

11. Los pagos de actas parciales y finales de obra se realizarán sobre actividades debidamente ejecutadas terminadas y recibidas por la interventoría del contrato.

12. Todas las actividades que se ejecuten como parte de las obligaciones contractuales deberán estar contempladas dentro del contrato y/o debidamente aprobadas por la entidad.

13. No se reconocerán actividades dentro de la ejecución del contrato, que se realicen por instrucción de persona o entidad diferente o ajena a la supervisión del contrato.

14. El contratista está en la obligación de instalar una valla informativa en el sitio de la obra donde se indique por lo menos lo siguiente: No. del contrato, objeto, contratista, interventor, plazo de ejecución.

15. Presentar informes semanales de avance de obra y mensuales segun lo estipulado en la Clausula 10 Numerales 13 y 14, del contrato de la referencia.

16. Presentar flujo de fondos semanal por cada frente de obra.

Atentamente,

C.C. No 16.700.426 de Cali
Representante Legal CONSORCIO GRUPO 3
Interventoría

Copia: Ing. Jairo Libardo Ortega Torres – Supervisor Indervalle
Ing. Juan Pablo Martinez – Apoyo a la Supervisión de Indervalle
Archivo

CALLE 18 N # 3N-70
OFICINA 401
EDIFICIO NOYRA
CALI-COLOMBIA

consorciogrupo3@gmail.com
cardenascivil99@gmail.com

301 2759200; 316 4918891, 602 668 55 24

Gmail

Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com>

CONTRATO IND-23-ID-07-4469: Imagenes para vallas informativas

3 mensajes

Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com> 22 de enero de 2024, 10:30 a.m.
Para: jupamalo1746@hotmail.com
CC: cardenascivil99@gmail.com, consorciogrupo3@gmail.com

Buenos días, Ing.

Atendiendo su solicitud me permito enviar las imágenes disponibles en información antecedentes para generación de arte de vallas informativas para cada uno de los frentes de trabajo del contrato del asunto.

Quedo atento a sus comentarios.

Imagenes Cartago.zip

Imagenes Comuneros II.zip

Imagenes Decepaz.zip

--
FABIAN QUINTERO
Ingeniero Civil
Residente de Obra - Consorcio Parques Valle

Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com> 22 de enero de 2024, 10:43 a.m.
Para: Juanpa.martinezloz@gmail.com

[Texto citado oculto]

juan pablo martinez lozada <juanpa.martinezloz@gmail.com> 22 de enero de 2024, 11:05 a.m.
Para: Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com>

OK, recibido
[Texto citado oculto]

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

Gmail

Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com>

Solicitudes varias Contrato No. IND - 23 - 4469 -INDERVALLE

1 mensaje

consorciogrupo3 consorciogrupo3 <consorciogrupo3@gmail.com> 23 de enero de 2024, 8:00 a.m.
Para: Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com>, cardenascivil99@gmail.com, ortegajairo25@gmail.com, foscary@hotmail.com, "foscary@gmail.com" <foscary@gmail.com>

CG3-003-2024 Solicitudes varias Contrato de Obra No. IND - 23 -4469.pdf
476K

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01

CG3

CONSORCIO GRUPO 3
INTERVENTORIA

Distrito Santiago de Cali. Enero 22 de 2024 CG3-003-2024

Señor
WILSON DE JESÚS MARÍN GONZALEZ
Representante Legal **CONSORCIO PARQUES VALLE**
Contratista
Instituto del Deporte, la Educación Física y La Recreación
INDERVALLE
La Ciudad

Referencia: Contrato de obra IND-23-4469 "Contratar por el Sistema de Precios Fijos Unitarios Mejoramiento a Escenarios Deportivos y Recreativos para los Municipios de Cartago, El Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial De Cali en el Departamento del Valle del Cauca realizando la ejecución de los siguientes: Grupo 1. Frente 1. Gimnasio al Aire Libre y Ecobikes. Urbanización La Cabaña. Municipio de Cartago - Departamento del Valle del Cauca. Grupo 1. Frente 2. Adecuación Cerramiento - Barrio Decepaz - Distrito Especial de Cali - Departamento del Valle del Cauca Grupo 1. Frente 3. Adecuación Escenario Deportivo Barrio Comuneros II Municipio de Cali - Valle del Cauca. "

Asunto: Solicitudes varias

Cordial saludo

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del contrato de la referencia, le solicito la siguiente documentación:

- Plan de Calidad especifico del contrato.



- Hojas de vida del profesional (PMP) y técnico de acuerdo al pliego de condiciones.



CALLE 18 N # 3N-70
OFICINA 401
EDIFICIO NOYRA
CALI-COLOMBIA

consorciogrupo3@gmail.com
cardenascivil99@gmail.com

301 2759200; 316 4918891, 602 668 55 24

CG3 CONSORCIO GRUPO 3
INTERVENTORIA

- Diseño de mezcla de los concretos a emplear
- Balance general de contrato con sus memorias de cálculo.

Se da un plazo de entrega hasta el 25 de Enero de 2024.

Atentamente

Arq. Juan Carlos Naranjo Ramirez
Representante Legal Consorcio Grupo 3
Interventor

Copia: Ing. Jairo Ortega Torres – Supervisor Indervalle
Archivo

Gmail Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com>

informacion solicitada por la interventoria
2 mensajes

Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com> 25 de enero de 2024, 5:17 p.m.
Para: Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com>, "dianapatriciaceron@gmail.com" <dianapatriciaceron@gmail.com>

5 archivos adjuntos

- **oficio remisorio.docx** 914K
- **plan de calidad.zip** 8954K
- **DIANA YORFADY RESTREPO.zip** 2632K
- **ING. BRIGITTE HERNANDEZ.zip** 727K
- **ING ARON CASTRILLON.zip** 11368K

Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com> 26 de enero de 2024, 9:01 a.m.
Para: consorciogrupo3@gmail.com

Santiago de Cali, Enero 26 de 2024

Señores
CONSORCIO GRUPO 3

Cordial saludo

De manera respetuosa, adjunto oficio de respuesta e informacion solicitada mediante documento enviado el dia 23 de enero de 2024

Pido excusas, esta informacion fue enviada el dia de ayer a un correo equivocado.

5 archivos adjuntos

- **oficio remisorio.docx** 914K
- **plan de calidad.zip** 8954K
- **DIANA YORFADY RESTREPO.zip** 2632K

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

ING. BRIGITTE HERNANDEZ.zip
727K

ING ARON CASTRILLON.zip
11368K

Gmail

Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com>

Remision de fechas para socializar y auditorias visible Contrato NO. IND - 23 - 4469

1 mensaje

consorciogrupo3 consorciogrupo3 <consorciogrupo3@gmail.com> 28 de enero de 2024, 9:24 p.m.
Para: Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com>, cardenascivil99@gmail.com, ortegajairo25@gmail.com, arqangell@hotmail.com, arquitectura0564@gmail.com

CG3-005-2024 Socializaciones y Auditoria visible Contrato de Obra No. IND - 23 -4469.pdf
493K

CG3 CONSORCIO GRUPO 3
INTERVENTORIA

Distrito Santiago de Cali, Enero 28 de 2024 CG3-005-2024

Señor
WILSON DE JESÚS MARÍN GONZÁLEZ
Representante Legal **CONSORCIO PARQUES VALLE**
Contratista
Instituto del Deporte, la Educacion Fisica y La Recreación
INDERVALLE
La Ciudad

Referencia: Contrato de Obra IND-23-4469 "Contratar por el Sistema de Precios Fijos Unitarios: Mejoramiento a Escenarios Deportivos y Recreativos para los Municipios de Cartago, El Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial De Cali en el Departamento del Valle del Cauca realizando la ejecución de los siguientes: Grupo 1: Frente 1: Gimnasio al Aire Libre y Ecobikes. Urbanización La Cabaña, Municipio de Cartago - Departamento del Valle del Cauca. Grupo 1: Frente: 2: Adecuación Cerramiento - Barrio Decepaz - Distrito Especial de Cali - Departamento del Valle del Cauca Grupo 1: Frente: 3: Adecuacion Escenario Deportivo Barrio Comuneros II Municipio de Cali - Valle del Cauca. "

Asunto: Información de Socializaciones y Auditoria Visible

Cordial saludo.

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del contrato de la referencia, le remito la programación de las socializaciones y auditoria visible remitida por Indervalle para los frentes de obra:



CALLE 18 N # 3N-70
OFICINA 401
EDIFICIO NOYRA
CALI-COLOMBIA

consorciogrupo1@gmail.com
cardenascivil99@gmail.com

301 2759200; 316 4918891; 602 668 55 24

CG3

CONSORCIO GRUPO 3
INTERVENTORIA





Atentamente,

Arq. Juan Carlos Naranjo Ramírez
Representante Legal Consorcio Grupo 3
Interventor

Copia: Arquitecto Juan Carlos Rueda Angel – Supervisor Contrato de Interventoria No. IND – 23 - 4484
Archivo

Gmail

Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com>

Remisión Plano Estructural Actualizado Comuneros II

2 mensajes

consorciogrupo3 consorciogrupo3 <consorciogrupo3@gmail.com> 26 de enero de 2024, 2:29 p.m.
Para: Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com>, cardenascivil99@gmail.com, ortegajairo25@gmail.com, arqangell@hotmail.com

2 archivos adjuntos

CG3-004-2024 Remision de plano Estructural Comuneros II Contrato de Obra No. IND - 23 -4469.pdf
448K

Plano Estructural Comuneros II.dwg
372K

Consorcio Parques Valle <consorcioparquesvalle@gmail.com> 29 de enero de 2024, 4:09 p.m.
Para: consorciogrupo3 consorciogrupo3 <consorciogrupo3@gmail.com>

buenas tardes Ingeniero,

Seria tan gentil de volver a enviar el plano, ya que al abrir el archivo, muestra una imagen que no visualiza contenido.

quedo atento a sus comentarios,



El vie, 26 ene 2024 a la(s) 2:29 p.m., consorciogrupo3 consorciogrupo3 (consorciogrupo3@gmail.com) escribió:

CG3 CONSORCIO GRUPO 3
INTERVENTORIA

Distrito Santiago de Cali, Enero 25 de 2024 CG3-004-2024

Señor
WILSON DE JESÚS MARÍN GONZÁLEZ
Representante Legal **CONSORCIO PARQUES VALLE**
Contratista
Instituto del Deporte, la Educación Física y La Recreación
INDERVALLE
La Ciudad

Referencia: Contrato de Obra IND-23-4469 "Contratar por el Sistema de Precios Fijos Unitarios Mejoramiento a Escenarios Deportivos y Recreativos para los Municipios de Cartago, El Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial De Cali en el Departamento del Valle del Cauca realizando la ejecución de los siguientes: Grupo 1: Frente 1: Gimnasio al Aire Libre y Ecobikes, Urbanización La Cabaña, Municipio de Cartago - Departamento del Valle del Cauca. Grupo 1: Frente: 2 Adecuación Cerramiento - Barrio Decepaz - Distrito Especial de Cali - Departamento del Valle del Cauca Grupo 1: Frente: 3: Adecuación Escenario Deportivo Barrio Comuneros II Municipio de Cali - Valle del Cauca. "

Asunto: Remisión de plano Estructural Comuneros II

Cordial saludo.

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del contrato de la referencia, le remito plano estructural de la cubierta metálica en Autocad del Frente de obra: Adecuación Escenario Deportivo Barrio Comuneros II Municipio de Cali - Valle del Cauca. " y actualizado por el Ingeniero Jairo Libardo Ortega Torres – Profesional Universitario de Indervalle.

Atentamente,

Arq. Juan Carlos Naranjo Ramirez
Representante Legal Consorcio Grupo 3
Interventor

Copia: Arquitecto Juan Carlos Rueda Angel – Supervisor Contrato de Interventoria No. IND – 23 - 4484
Ing. Jairo Libardo Ortega Torres – Profesional Universitario Indervalle
Archivo

CALLE 18 N # 3N 70
OFICINA 401
EDIFICIO NOYRA
CALI-COLOMBIA

consorciogrupo1@gmail.com
cardenascivil99@gmail.com

301 2759200; 316 4918891, 602 668 55 24

7 DOCUMENTACIÓN DE OBRA

7.1 Actas de vecindad

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
5	ENERO	2021
DD	MM	AA
ACTA No.:	PV-AV01	

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE: 3 - BARRIO COMUNEROS II, CALI

CONTRATO N°: IND-23-ID-07-4469

Entidad contratante: INDERVALLE

Entidad Interventora: CONSORCIO GRUPO 3

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO PARQUES VALLE

Comuna: 13 Barrio: COMUNEROS II

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: GASPAR ÁNGULO GARCIA

Tenencia: Propietario [X] Arrendatario [ ] Poseedor [ ] Otro Cual? [ ]

Nombre del Propietario: GASPAR ÁNGULO GARCIA

Dirección: 3162833817

Teléfono: Carrera 28 B2 72T 25 No. de pisos: 2

Long. del frente (mts):

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[X]	[ ]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. Televisión cable	[X]	[ ]	
7. Otros	[ ]	[ ]	Cuál?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	[X]	5. Recreacional	[ ]	Garaje	SI [ ] NO [X]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]	Cuantos	
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]	El garaje se usa como comercio	SI [ ] NO [ ]
4. Institucional	[ ]	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: PÓRTICOS EN CONCRETO, BUEN ESTADO.	GRIETAS Y FISURAS: NO SE EVIDENCIAN MEDIANTE INSPECCIÓN VISUAL
MUROS: DIVISORIOS Y DE FACHADA EN BUEN ESTADO	HUMEDADES: NO SE EVIDENCIAN MEDIANTE INSPECCION VISUAL
CUBIERTA: BUEN ESTADO GENERAL, PRIMER PISO - LOSA MACIZA EN BUEN ESTADO; SEGUNDO PISO - ESTRUCTURA METÁLICA CON TEJA EN PIAS	HUNDIMIENTO PISO: NO SE EVIDENCIAN MEDIANTE INSPECCIÓN VISUAL
PISOS: ENCHAPE CERAMICO EN BUEN ESTADO.	DESPLAZAMIENTOS: NO SE EVIDENCIAN MEDIANTE INSPECCION VISUAL
FACHADA: ACABADO DE MUROS EN BUEN ESTADO, VENTANAS Y REJAS EN BUEN ESTADO	OTRO: ANDEN - DETERIORO MARCADO DEL CONCRETO, GRIETAS, ETC.

4. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO



FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre: GASPAR ANGULO GARCIA

C.C. O NIT:

Firma Representante de la Interventoria

Nombre: JUAN C. OSPINA P

C.C. 16.760.476

Representante de la entidad ejecutora

Nombre: FABIAN QUINTERO

C.C. 1.144.039.291

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
5	ENERO	2021
DD	MM	AA
ACTA No.:	PV-AV01	

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE : 3 - BARRIO COMUNEROS II, CALI

CONTRFATO N° IND-2340-07-4469

Entidad contratante: INDERVALLE

Entidad Interventora: CONSORCIO GRUPO 3

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO PARQUES VALLE

Comuna: 13 Barrio: COMUNEROS II

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: CASTULA OROBIO BIOJÓ

Tenencia: Propietario [X] Arrendatario [ ] Poseedor [ ] Otro Cual? [ ]

Nombre del Propietario: CASTULA OROBIO BIOJÓ

Dirección: 3136667353

Teléfono: Carrera 28 B2 72T 51 No. de pisos: 2

Long. del frente (mts)

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[X]	[ ]	
5. Gas	[ ]	[ ]	
6. Televisión cable	[ ]	[ ]	
7. Otros	[ ]	[ ]	Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	[X]	5. Recreacional	[ ]	Garaje SI [ ] NO [X]	
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]	Cuantos	
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]	El garaje es uso solo comercio SI [ ] NO [ ]	
4. Institucional	[ ]	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: PÓRTICOS EN CONCRETO, BUEN ESTADO.	GRIETAS Y FISURAS: NO SE EVIDENCIAN MEDIANTE INSPECCIÓN VISUAL
MUROS: DIVISORIOS Y DE FACHADA EN BUEN ESTADO	HUMEDADES: NO SE EVIDENCIAN MEDIANTE INSPECCIÓN VISUAL
CUBIERTA: BUEN ESTADO GENERAL. PRIMER PISO - LOSA MACIZA EN BUEN ESTADO; SEGUNDO PISO - ESTRUCTURA METÁLICA CON TEJA EN ZINC	HUNDIMIENTO PISO: NO SE EVIDENCIAN MEDIANTE INSPECCIÓN VISUAL
PISOS: ENCHAPE CERAMICO EN BUEN ESTADO.	DESPLAZAMIENTOS: NO SE EVIDENCIAN MEDIANTE INSPECCIÓN VISUAL
FACHADA: ACABADO DE MUROS EN BUEN ESTADO, VENTANAS Y REJAS EN BUEN ESTADO	OTRO: ANDEN - DETERIORO MARCADO DEL CONCRETO, GRIETAS, ETC.

4. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FÍLMICO



FIRMAS

Castula Orobio Biojó

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre: CASTULA OROBIO BIOJÓ

C.C. O NIT

Firma Representante de la Interventoría

Nombre: Juan C. Narvaez

C.C. 16.700.426

Representante de la entidad ejecutora

Nombre: FABIAN QUINTERO

C.C. 1.144.039.291

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
5	ENERO	2024
DD	MM	AA
ACTA No.:	PV-AV01	

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE: 3 - BARRIO COMUNEROS II, CALI

CONTRATO N°: IND-23-0-07-4469

Entidad contratante: INDERVALLE

Entidad Interventora: CONSORCIO GRUPO 3

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO PARQUES VALLE

Comuna: 21 Barrio: COMUNEROS II

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: SARA MONROY

Tenencia: Propietario [X] Arrendatario Poseedor Otro Cual?

Nombre del Propietario: SARA MONROY

Dirección: 3175246060

Teléfono: Carrera 28 B2 72T 47 No. de pisos: 2

Long. del frente (mts)

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[X]	[ ]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. Televisión cable	[X]	[ ]	
7. Otros	[ ]	[ ]	Cuál?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	[X]	5. Recreacional	[ ]	Garaje SI [ ]	NO [X]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]	Cuantos	
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]	El garaje se usa como comercio SI [ ]	NO [ ]
4. Institucional	[ ]	Cual?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: PÓRTICOS EN CONCRETO, BUEN ESTADO.	GRIETAS Y FISURAS: NO SE EVIDENCIAN MEDIANTE INSPECCIÓN VISUAL
MUROS: DIVISORIOS Y DE FACHADA EN BUEN ESTADO	HUMEDADES: NO SE EVIDENCIAN MEDIANTE INSPECCIÓN VISUAL
CUBIERTA: BUEN ESTADO GENERAL, PRIMER PISO - LOSA MACIZA EN BUEN ESTADO; SEGUNDO PISO - ESTRUCTURA METÁLICA CON TEJA EN ZINC	HUNDIMIENTO PISO: NO SE EVIDENCIAN MEDIANTE INSPECCIÓN VISUAL
PISOS: ENCHAPE CERAMICO EN BUEN ESTADO.	DESPLAZAMIENTOS: NO SE EVIDENCIAN MEDIANTE INSPECCIÓN VISUAL
FACHADA: ACABADO DE MUROS EN BUEN ESTADO, VENTANAS Y REJAS EN BUEN ESTADO	OTRO: ANDEN - DETERIORO MARCADO DEL CONCRETO, GRIETAS, ETC.

4. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO



FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre: SARA MONROY

C.C. O NIT

Firma Representante de la Interventoria

Nombre: [illegible]

C.C. 2116538

Representante de la entidad ejecutora

Nombre FABIAN QUINTERO

C.C. 1.144.039.291

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OBJETO CONTRACTUAL	:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES". GRUPO 1: FRENTE 1: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1: FRENTE 3. ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II - MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTRATANTE	:	INDERVALLE
CONTRATISTA	:	CONSORCIO PARQUES VALLE
INTERVENTORIA	:	CONSORCIO GRUPO 3
FRENTE:	:	01 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
UBICACIÓN:	:	URB. LA CABAÑA – CARTAGO VALLE DEL CAUCA
ACTA DE COBRO	:	01
FECHA DEL PRESENTE INFORME	:	31 DE ENERO DE 2024

EL CONTRATISTA
Wilson Marín
Consorcio Parques Valle
Representante Legal

SUPERVISIÓN
Juan Carlos Rueda
INDERVALLE

INTERVENTORÍA
Juan Carlos Naranjo
Consorcio Grupo 3
Representante Legal

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

CONTENIDO

1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 3
2 DIFICULTADES ENCONTRADAS 10
3 SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE OBRA 11
4 SEGUIMIENTO A FLUJO DE CAJA 12
5 PERSONAL EMPLEADO 13
6 CORRESPONDENCIA 14
7 DOCUMENTACIÓN DE OBRA 19
7.1 Actas de comité de obra 19
7.2 Actas de reunión 19
7.3 Actas de socialización 19
7.4 Actas de Vecindad 20
8 SOPORTE DE PARAFISCALES 51
9 ENSAYOS DE LABORATORIO 59
10 BITACORÁ DE OBRA 60
11 EQUIPOS Y MAQUINARIA EMPLEADOS 76
12 INFORME SST 77

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Descripción de las actividades, cantidades ejecutadas con su respectivo registro fotográfico:

- Semana 1: Del 28 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO
* Visita de campo para identificación del frente de trabajo con los diferentes actores del Proyecto
* Se realiza acercamiento con la comunidad para manifestar el inicio de las actividades
* Verificación visual de área de trabajo

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1: Socialización preliminar con comunidad para manifestar el inicio de las actividades del proyecto.



Foto 2: Identificación visual del área de trabajo en campo



Foto 3: Revisión de planos del proyecto con la interventoría en campo



Foto 4: Revisión de planos del proyecto por parte de la comunidad

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

- Semana 2: Del 01 de enero de 2024 al 07 de enero de 2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO
* Se contó con la visita de la comisión de topografía con el fin de validar las coordenadas de terreno en aras de
la verificación de campo que permitan contar con información primaria para la localización y replanteo, la colocación
niveles de terreno para establecer las cotas de excavación y relleno y la determinación de los volúmenes de
acorde a los datos obtenidos
* Se realiza instalación de guadua y tela verde de cerramiento con el fin de delimitar el área de trabajo

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1: Toma de puntos previo a inicio de replanteo y verificación de coordenadas de niveles.



Foto 2: Visita de Topógrafo para toma de puntos previo a inicio de replanteo del área de trabajo



Foto 3: Instalación de estación total para topografía



Foto 4: Excavación e instalación de guadua para cerramiento de delimitación del área de trabajo



Foto 5: Instalación de guadua para cerramiento perimetral del área de trabajo con tela verde



Foto 6: Instalación de tela de cerramiento para delimitación del área de trabajo

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

- Semana 3: Del 08 de enero de 2024 al 14 de enero de 2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO
* Se contó con la visita de la comisión de topografía donde una vez validadas las coordenadas de terreno se inicia con la implantación de campo de la localización y replanteo, la colocación de los niveles de terreno para establecer las excavación y relleno y la determinación de los volúmenes respectivos y posteriormente se instalan las guías
* Se inicia y termina con el descapote del área de trabajo donde se implantará el proyecto
* Se Inicia y termina con la excavación y posterior retiro de material sobrante a botadero certificado hasta llegar al definido por la topografía del sitio donde se implantará el gimnasio biosaludable

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1: Localización y replanteo del área de trabajo, de ejes del proyecto e instalación de niveletas



Foto 2: Instalación de Guías del área de trabajo



Foto 3: Descapote del área de intervención



Foto 4: Excavación del área de trabajo hasta llegar al nivel establecido por la topografía



Foto 5: Retiro de sobrantes del Material de Excavación del área de trabajo



Foto 6: Excavación del área de trabajo

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

- Semana 4: Del 15 de enero de 2024 al 21 de enero de 2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO
* Se adelantó la Conformación de la superficie de la subrasante del área excavada en la zona de implantación del gimnasio al aire libre previo a la instalación de geotextil permitiendo un condicionamiento del terreno
* Se adelantó la excavación manual del contenedor de raíces el cual se localiza debajo de la canal de aguas lluvias ejes A y F acorde a lo definido en los planos de diseño y en las dimensiones establecidas

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1: Conformación de subrasante del área de gimnasio al aire libre



Foto 2: Excavación manual para contenedor de raíces por debajo de canal Eje A



Foto 3: Excavación manual para contenedor de raíces por debajo de canal Eje F



Foto 4: Verificación de niveles del proyecto



Foto 5: Guías para ejes del proyecto



Foto 6: Llegada al sitio de geotextil tejido

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

- Semana 5: Del 22 de enero de 2024 al 28 de enero de 2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO
* Se terminó la Conformación de la superficie de la subrasante del área excavada en la zona de implantación del gimnasio al aire libre previo a la instalación de geotextil permitiendo un condicionamiento del terreno
* Se realizó la instalación de geotextil tejido entre la subrasante y el relleno en roca muerta permitiendo un de terreno en sus propiedades mecánicas y un control de tensión superficial de agua en el sector de proyecto.
* Se adelantó la llegada de material, extendido y compactación de material de relleno tipo Roca muerta en el área implantará el gimnasio al aire libre, entre los ejes (A-F)(1-7)
* Se adelantó la configuración-Nivelación de terreno del material de roca muerta instalado previo a fundición de losas

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1: Conformación de subrasante del área de gimnasio al aire libre previo a instalación de Geotextil tejido



Foto 2: instalación geotextil Tejido para Mejoramiento de terreno entre subrasante y relleno Roca Muerta



Foto 3: Pausas Activas con profesional SST



Foto 4: Transporte de material e instalación del mismo para relleno en Roca Muerta



Foto 5: Instalación, extendido y compactación de material de relleno tipo Roca muerta en área de gimnasio al aire



Foto 6: Configuración-Nivelación de terreno previo a fundición de losas de concreto

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

- Semana 6: Del 29 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO
* Se terminó la llegada de material, extendido y compactación de material de relleno tipo Roca muerta en el
implantará el gimnasio al aire libre, entre los ejes (A-F)(8-17)
* Se terminó la configuración-Nivelación de terreno del material de roca muerta instalado previo a fundición
del gimnasio al aire libre
* Se iniciaron las excavaciones y el encofrado de los bordillos de confinamiento de las losas en eje 4 (A-F) y
* Se realizó el desmonte de redes y el posterior retiro de poste de alumbrado público que se encontraba
área de intervención del proyecto y que obstaculizaba los espacios definidos en la obra
* Se instalación de malla electrosoldada y fundición de losas de concreto para piso de biosaludable

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1: Continúa instalación, extendido y compactación de relleno con Roca muerta en área de gimnasio al aire libre



Foto 2: Continúa Configuración-Nivelación de terreno previo a fundición de losas de concreto



Foto 3: Relleno con roca muerta en área de gimnasio al aire libre



Foto 4: Inician Excavaciones y encofrado para bordillos de concreto para confinamiento de losas de concreto

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024



Foto 5: Instalación, extendido y compactación de material de relleno tipo Roca muerta en área de gimnasio al aire libre



Foto 6: Se hace desmonte de red y retiro de poste de alumbrado público que se encontraba al interior del proyecto



Foto 7: Instalación de malla electrosoldada para losas de concreto



Foto 8: Fundición de losas de concreto

LOGROS Y/O DIFICULTADES
1. Cronograma:
Acorde al cronograma aprobado por la interventoria, se tiene un adelanto de 5,1 dias de las actividades definidas para el proyecto en este frente de trabajo
2. Disponibilidad de Recursos:
No se ha presentado hasta la fecha actual, dificultad en la disponibilidad de los recursos necesarios para las actividades programadas.
3. Ejecución Financiera:
Debido al adelanto en las actividades programadas se obtiene un balance financiero positivo.
4. Calidad de los trabajos:
Permanentemente se encuentra personal profesional verificando la calidad de las actividades mediante inspección visual, registro fotográfico y registro escrito tanto en bitácora como en formatos implementados y
5. Manejo Ambiental:
El material de excavación se dispuso en botadero certificado el cual se cuenta con la certificación respectiva de disposición, la obra se encuentra en permanente limpieza para No afectar la ejecución de las obras.
6. Seguridad Industrial:
El personal con el que se dispuso esta semana cuenta con los implementos de protección personal pertinentes para el desarrollo de sus actividades y se adelantan las capacitaciones respectivas por parte de la
7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Continúa la implementación acorde a las directrices del profesional de seguridad y salud en el trabajo el cual se hará entrega en el informe mensual.
8. Aspectos sociales:
En el transcurso de la semana no se han presentado dificultades a nivel social, la comunidad brinda el apoyo requerido para el normal desarrollo de las actividades. Solicitan una socialización con la entidad

2 DIFICULTADES ENCONTRADAS

Motivos de retraso o no ejecución de actividades, p. ejemplo: no haber hecho las socializaciones, la valla informativa, clima, etc.

Durante el periodo comprendido entre el 28 de diciembre de 2023 y el 31 de enero de 2024 en el frente 1 se encontraron las siguientes dificultades:

- Se presentaron 2 fechas con condiciones climáticas desfavorables:
  - El día 10 de enero de 2024 se presentó un vendaval desde las 04:30 p.m. con lluvia fuerte que fue amenizando hasta las 06:00 p.m., debido al evento el cerramiento perimetral que delimitaba el área de trabajo se vio afectado y se adelantaron acciones para su recuperación.
  - El día 12 de enero de 2024 siendo la 01:45 p.m. y hasta las 02:10 p.m. se presentaron lluvias fuertes y entre las 02:10 p.m. hasta las 03:20 p.m. se presentaron lluvias leves que provocaron la suspensión de actividades de excavaciones y retiro de material sobrante durante ese periodo de tiempo puesto que el sitio de disposición no presentaba buenas condiciones para la recepción del material
- En cuanto a condiciones sociales está pendiente la programación de la auditoría visible de inicio para que la comunidad en general, la administración municipal y demás actores conozcan de parte de la entidad contratante a los ejecutores, la interventoría, fechas de inicio, fechas de finalización, conocimiento general del proyecto y demás generalidades de la obra a entregar.
- Aún se encuentra pendiente la instalación de la valla informativa toda vez que se no se disponía de la definición del arte la misma, sin embargo, en la reunión del 25 de enero de 2024 esto fue subsanado por lo que por parte del contratista se procedió a darle trámite a la logística para su disposición en el sitio del proyecto.
- Aún no se ha podido iniciar con las actividades del componente eléctrico ya que se requiere aprobación de parte de la oficina de alumbrado público adscrita a la secretaría de planeación municipal, el proyecto ya fue radicado y se está a la espera de las observaciones y consideraciones que manifieste la entidad.

3 SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE OBRA

Actualización de la programación a la fecha de corte del acta (PORCENTAJE DE AVANCE)

Durante el periodo comprendido entre el 28 de diciembre de 2023 y el 31 de enero de 2024 en el frente 1 se tiene el siguiente avance físico de obra:

AVANCE FÍSICO (%)				
Avance	Acum. Anterior	Semana actual	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	4,37%	1,30%	5,67%	7,3
% Ejecutado	4,99%	8,75%	13,74%	
Diferencia	0,62%	7,45%	8,07%	

4 SEGUIMIENTO A FLUJO DE CAJA

Actualización de la programación a la fecha de corte del acta (COSTOS)

Durante el periodo comprendido entre el 28 de diciembre de 2023 y el 31 de enero de 2024 en el frente 1 se tiene el siguiente avance financiero de obra:

AVANCE FINANCIERO				En %
Programado(%)	$22.711.960,00	$ 6.769.895,00	$ 29.481.855,00	5,67%
Ejecutado (%)	$25.940.568,00	$ 45.527.858,00	$ 71.468.426,00	13,74%
Diferencia	$3.228.608,00	$ 38.757.963,00	$ 41.986.571,00	8,07%
Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				

5 PERSONAL EMPLEADO

Listado de personal en obra.

Durante el periodo comprendido entre el 28 de diciembre de 2023 y el 31 de enero de 2024 en el frente 1 se tiene el siguiente personal empleado:

PERSONAL DEL CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN		MES	DICIEMBRE				ENERO																													OBSERVACIONES		
			28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
CARGO	NOMBRE																																				
DIRECTOR	WILSON MARIN		X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
RESIDENTE	JEFERSON SANCHEZ BURITICA		X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
PROFESIONAL SST	DIANA YORFADY RESTREPO							X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
TOPOGRAFÍA	GIOVANNY BALLESTEROS											X				X																					CONTRATADO PARA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
MAESTRO	HEBER OSPINA GARCIA															X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
OFICIAL	SILVIO GUTIERREZ																X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
OFICIAL	JUAN ANDRES OSPINA G.															X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
AYUDANTE	JUAN PABLO URREA G.																X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	
AYUDANTE	DANIEL ROSAS																				X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
AYUDANTE	GREGORIO GUTIERREZ																							X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
AYUDANTE	RICHARD RAMIREZ																							X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
AYUDANTE	JAUNER ENRIQUE BERNAL																							X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
AYUDANTE	ELIANA OSORIO																																		X	X	X	
AYUDANTE	JHOAN HENAO																																		X	X	X	
AYUDANTE	CARLOS ANDRES GARZON																																				X	
PERSONAL CONTRATISTA		0	2	2	2	0	0	3	3	3	3	4	0	0	3	6	7	7	7	0	8	8	8	11	11	11	0	11	11	11	11	11	11	0	12	13	14	TOTAL PERIODO		214
PROCEDENCIA / CONDICIÓN		MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																																				SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2	2	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	0	6	7	8	75	35,05%	
De la región			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	0	6	6	7			
De fuera de la región			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1			
MANO OBRA CALIFICADA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	56	26,17%	
De la región			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
De fuera de la región			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3			
PROFESIONALES - TÉCNICOS			2	2	2	0	0	3	3	3	3	4	0	0	3	4	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	83	38,79%	
De la región			1	1	1	0	0	2	2	2	2	3	0	0	2	3	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2			
De fuera de la región			1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1			
POBLACIÓN VULNERABLE																																						0	0,00%	
En proceso de reinserción social																																								
En condición de desplazamiento																																								
MUJERES			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	2	2	2	28	13,08%	
Mano de Obra no Calificada			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1			
Mano de Obra Calificada																																								
Profesionales - Técnicos			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1			

6 CORRESPONDENCIA

Copia de los documentos y correos (enviados y recibidos)

Durante el periodo comprendido entre el 28 de diciembre de 2023 y el 31 de enero de 2024 en el frente 1 se tiene la siguiente correspondencia:

- **ENVIADA:**

CONSORCIO PARQUES VALLE
NIT 901772637-1
CONTRATO IND-23-ID-07-4469

Documento: PV004

Cartago (Valle del Cauca), 17 de enero de 2024

ALCALDÍA MUNICIPAL
VENTANILLA ÚNICA
17 ENE 2024
RECIBIDO
Dependencia 2 - 0 4 5 1
Firma
2.44

Dra:
JOANNA CAROLINA TRUJILLO CARDONA
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Cartago (Valle del Cauca)
E.S.D.

Ref. **CONTRATO IND-23-ID-07-4469.** Cuyo Objeto es: "Contratar por el sistema de Precios Unitarios Fijos: Mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos para los Municipios de Cartago, El Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca realizando la ejecución de los siguientes": **GRUPO 1: FRENTE 1. Gimnasio al aire libre y Ecobikes, Urbanización La Cabaña, Municipio de Cartago – Departamento del Valle del Cauca.** GRUPO 1: FRENTE 2. Adecuación Cerramiento – Barrio Decepaz – Distrito Especial de Cali – Departamento del Valle del Cauca. GRUPO 1: FRENTE 3. Adecuación Escenario Deportivo Barrio Comuneros II Municipio de Cali Valle del Cauca

Asunto: **SOLITUD TRASLADO POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO**

Cordial saludo respetada secretaria,

Conforme lo establece la referencia de este oficio, el Consorcio Parques Valle viene desarrollando con Indervalle el CONTRATO IND-23-ID-07-4469 donde uno de los frentes a atender corresponde a la realización de un gimnasio al aire libre en la urbanización La Cabaña del municipio de Cartago, dicho contrato cuenta con acta de inicio del 28 de diciembre de 2023 fecha en la cual se adelantaron todas las actuaciones para iniciar con las actividades en la obra y una de ellas es la localización y replanteo el cual define el área de intervención del proyecto, para lo cual se logró evidenciar que existen 2 postes de alumbrado público que no están incluidos en el trazado del producto final a entregar, razón por la cual acudo a su entidad como la encargada de las redes de alumbrado público para encomendarle

CALLE 3 OESTE 56 – 350 Santiago de Cali
3113007167
consorcioparquesvalle@gmail.com

muy comedidamente apoyo para realizar una visita de campo y adelantar las acciones que permitan el traslado de dichos postes sin que se afecte la prestación del servicio, de igual manera estaría al tanto de realizar las actuaciones que sean pertinentes de mi parte para brindar el apoyo que sea necesario para tal fin.

Los postes en mención están nomenclados y referenciados como:

- Poste 1: 056630 AP 00949 Coordenadas: 4° 45' 53" N, 75° 56' 16" W
- Poste 2: 056629 AP 00950 Coordenadas: 4° 45' 52" N, 75° 56' 15" W

A continuación, remito registro Fotográfico de los postes notificados:

POSTE 1:







CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

CONSORCIO PARQUES VALLE
NIT 901772637-1
CONTRATO IND-23-ID-07-4469

POSTE 2:

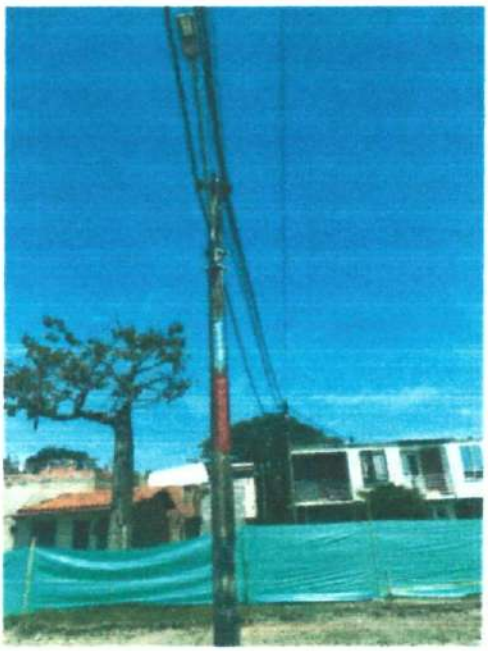

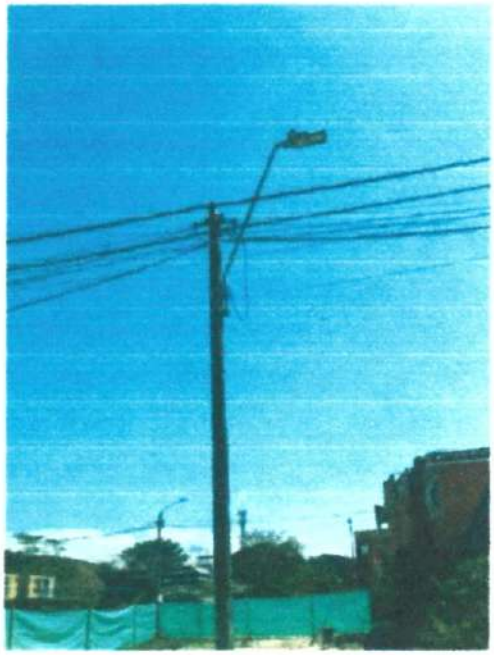

Agradeciendo la atención prestada y quedando atento a sus comentarios o inquietudes. Cordialmente

JEFERSON SÁNCHEZ BURITICA
Ingeniero Civil
Residente de Obra - Consorcio Parques Valle

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

CONSORCIO PARQUES VALLE
NIT 901772637-1
CONTRATO IND-23-ID-07-4469

INDERVALLE

Documento: PV006

Cartago (Valle del Cauca), 24 de enero de 2024

ALCALDÍA MUNICIPAL
VENTANILLA ÚNICA
24 ENE 2024
RECIBIDO 2-0634
Dependencia
Firma 9:33

Arquitecto:
HUGO ARMANDO BUENAVENTURA
Secretaria de Planeación
Municipio de Cartago (Valle del Cauca)
E.S.D.

Ref. **CONTRATO IND-23-ID-07-4469.** Cuyo Objeto es: "Contratar por el sistema de Precios Unitarios Fijos: Mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos para los Municipios de Cartago, El Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca realizando la ejecución de los siguientes": **GRUPO 1: FRENTE 1. Gimnasio al aire libre y Ecobikes, Urbanización La Cabaña, Municipio de Cartago – Departamento del Valle del Cauca.** GRUPO 1: FRENTE 2. Adecuación Cerramiento – Barrio Decepaz – Distrito Especial de Cali – Departamento del Valle del Cauca. GRUPO 1: FRENTE 3. Adecuación Escenario Deportivo Barrio Comuneros II Municipio de Cali Valle del Cauca

Asunto: **REMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPONENTE TÉCNICO RED DE ILUMINACIÓN DEL PROYECTO**

N° 00138 2024

Cordial saludo respetado secretario,

Conforme lo establece la referencia de este oficio, el Consorcio Parques Valle viene desarrollando con Indervalle el CONTRATO IND-23-ID-07-4469 donde uno de los frentes a atender corresponde a la realización de un gimnasio al aire libre en la urbanización La Cabaña del municipio de Cartago, dicho contrato cuenta con acta de inicio del 28 de diciembre de 2023 fecha en la cual se adelantaron todas las actuaciones para iniciar con las labores en la obra y una de ellas es la instalación del sistema de iluminación el cual acorde al presupuesto establecido para este frente cuenta con las siguientes actividades:

CONSORCIO PARQUES VALLE
NIT 901772637-1

CONTRATO IND-23-ID-07-4469

INDERVALLE

8	SISTEMA DE ILUMINACIÓN		
8,1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	28,80
8,2	CAJA ELECTRICA NORMA EPSA 0.5X0.5X0.8MT	UND	6,00
8,3	TAPA CAJA MARCO ANGULO 40X40 - 50X50	UND	6,00
8,4	ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4"	ML	168,00
8,5	APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS SECUNDARIA	UND	6,00
8,6	POSTE CONCRETO 9 X 510 KG CON D.I.	UND	6,00
8,7	APLOMADA POSTES DE CONCRETO SECUNDARIOS	UND	6,00
8,8	CONCRETADA DE POSTES SECUNDARIOS	UND	6,00
8,9	SOPORTE PARA REFLECTOR	UND	6,00
8,1	LUMINARIA 32 LED 72 W	UND	6,00
8,11	FOTOCELDA CON BASE	UND	6,00
8,12	CONECTOR PERFORACION AMFRAU KZ3-95 TRAFO	UND	3,00

Como las anteriores actividades hacen parte del alumbrado público el cual su control, seguimiento y mantenimiento corresponderá a su despacho una vez finalice el proyecto, por medio de la presente me permito remitir para su revisión la siguiente documentación:

1. Memorias de cálculo de instalaciones eléctricas.
2. Estudio Fotométrico del proyecto
3. Ficha Técnica de la Luminaria
4. Plano Eléctrico del Proyecto en formato carta (Se remite Plano en formato dwg por medio de correo electrónico)
5. Documentos del diseñador eléctrico
6. Presupuesto de Obra, resaltando las actividades del sistema de iluminación.

Agradeciendo la atención prestada y quedando atento a sus comentarios o inquietudes. Cordialmente

JEFERSON SÁNCHEZ BURITICA
Ingeniero Civil
Residente de Obra - Consorcio Parques Valle

Folios: 50
Copia: N/A
Anexos:
1. Memorias de cálculo de instalaciones eléctricas.
2. Estudio Fotométrico del proyecto
3. Ficha Técnica de la Luminaria
4. Plano Eléctrico del Proyecto
5. Documentos del diseñador eléctrico
6. Presupuesto de Obra

CALLE 3 OESTRE 56 – 350 Santiago de Cali
3113007167
consorcioparquesvalle@gmail.com

- **RECIBIDA:** En este periodo no se recibió para este frente.

7 DOCUMENTACIÓN DE OBRA

7.1 Actas de comité de obra

No se tienen actas de comité de campo desarrolladas solamente del frente 1 durante el periodo comprendido entre el 28 de diciembre de 2023 y el 31 de enero de 2024, se cuentan con actas conjuntas.

7.2 Actas de reunión


No se tienen actas de reunión de campo desarrolladas solamente del frente 1 durante el periodo comprendido entre el 28 de diciembre de 2023 y el 31 de enero de 2024, se cuentan con actas conjuntas.

7.3 Actas de socialización

Durante el periodo comprendido entre el 28 de diciembre de 2023 y el 31 de enero de 2024 en el frente 1 No se desarrollaron socializaciones

7.4 Actas de Vecindad

Durante el periodo comprendido entre el 28 de diciembre de 2023 y el 31 de enero de 2024 en el frente 1 se levantaron las siguientes actas de vecindad:

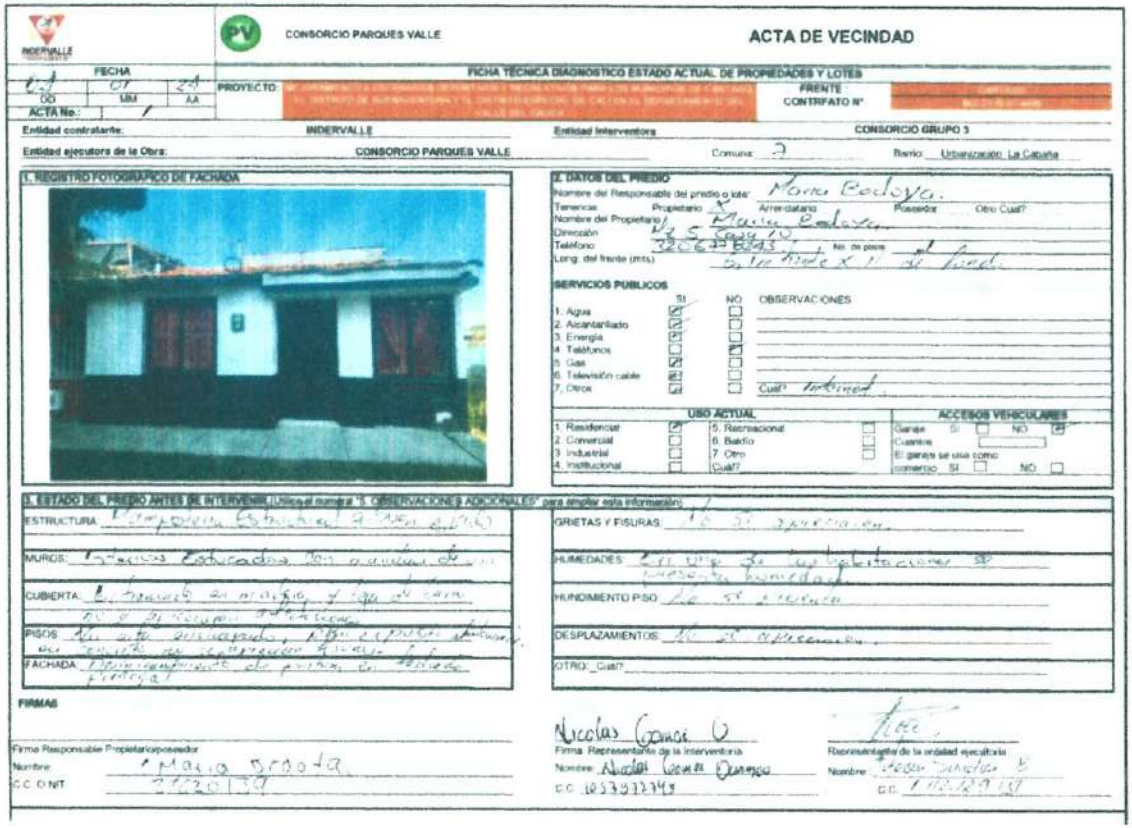

INDERVALLE — CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA: DD 27 | MM 01 | AA 24 — ACTA No.: 1

PROYECTO: [redacted] — FRENTE: — CONTRATO N°: [redacted]

Entidad contratante: INDERVALLE — Entidad Interventora: CONSORCIO GRUPO 3

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO PARQUES VALLE — Comuna: 7 — Barrio: Urbanización La Cabaña

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Maria Bedoya.
Tenencia: Propietario X — Arrendatario — Poseedor — Otro Cual?
Nombre del Propietario: Maria Bedoya.
Dirección: Cra 5 #94-10.
Teléfono: 3206[illegible]8943. — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts.): 9.00 Mts de X 11. de fondo.

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cual? Internet.

USO ACTUAL

1. Residencial X — 5. Recreacional
2. Comercial — 6. Baldío
3. Industrial — 7. Otro
4. Institucional — Cual?

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI NO X
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura Estructural en Muro en ladrillo
MUROS: Muros Estructurales con acabado de [illegible]
CUBIERTA: En teja de zinc en madera y teja de barro en regular estado.
PISOS: En este predio existen pisos en ceramica, baldosa, en regular estado de conservación.
FACHADA: Revestimiento de pintura en regular estado.
GRIETAS Y FISURAS: No se evidencian.
HUMEDADES: En el baño de las habitaciones se evidencia humedad.
HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian.
OTRO: Cual?

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre: Maria Bedoya
C.C. O NIT: 2720[illegible]39

Nicolas Correa U.
Firma Representante de la Interventoria
Nombre: Nicolas Correa Duarte
C.C. 1053773749

Firma Representante de la entidad ejecutora
Nombre: [illegible]
C.C. 1[illegible]

INDEPVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
04	01	24
DD	MM	AA

ACTA No.: 1

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: [redacted]

FRENTE :

CONTRFATO N°

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se aprecia la preexistencia de construcción de una segunda planta la cual está separada por lo que el señor dio a dó acciones ambientales se aprecian fisuras en la pintura del alrededor en la parte inferior evidencia desprendimiento en la misma.

5. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico) Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO



Paredes internas pintadas



Entramado de madera de cubierta en buen estado



Plancha sobre cocina con Bloquetón, pintado en buen estado



Presencia en suciedad de paredes de la cocina



Escaleras de acceso a proyección de segundo piso



Descascaramiento de pintura en entrepiso Bloquetón



Paredes y enchape de baño en buen estado



Presencia de Humedad en pared de habitación



Cielo Raso de Habitaciones en machimbre

2de2

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA		
04	01	24
DD	MM	AA

ACTA No.: 2

PROYECTO: [redacted]

FRENTE: [redacted]

CONTRATO N°: [redacted]

Entidad contratante: INDERVALLE

Entidad interventora: CONSORCIO GRUPO 3

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO PARQUES VALLE

Comuna: 7 Barrio: Urbanización La Cabaña

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Karina Loaiza

Tenencia: Propietario [ ] Arrendatario [X] Poseedor [ ] Otro Cual? [ ]

Nombre del Propietario: Claudia Patricia Lopez

Dirección: M2 S Casa 11

Teléfono: 3128413713

No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 6.1 frente X 11 de fondo.

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. Televisión cable	[X]	[ ]	
7. Otros	[X]	[ ]	Cual? Internet

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	5. Recreacional	[ ]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Institucional	[ ]	Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]

Cuantos [ ]

El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Ladrillo a la Vista en Pisos 1 en buen estado, ningun tipo estructural

MUROS: Ladrillo Estructural a la Vista en buen Estado

CUBIERTA: Teja con entramados de madera en buen estado

PISOS: Piso esta deteriorado, concreto a la vista

FACHADA: Ladrillo a la Vista Pintado y un local revestido en estuco en la segunda planta deteriorado

GRIETAS Y FISURAS: No.

HUMEDADES: Presenta Humedades en pisos y baños con algo de moho

HUNDIMIENTO PISO: No.

DESPLAZAMIENTOS: No

OTRO: Cual?

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre: KARINA LOAIZA SOTO

C.C. O NIT 1112 127 491

Firma Representante de la Interventoria: Nicolas Gomez O

Nombre: Nicolas Gomez Ocampo

C.C. 1053672748

Representante de la entidad ejecutoria

Nombre: Jefferson Saavedra B

C.C. 1.112 129 151

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA DD	MM	AA	PROYECTO:	FRENTE:
07	01	24	MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA, EL DARIEN DE MISERICORDIA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALLEN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	CONTRATO CONTRFATO N°

ACTA No.: 2

Entidad contratante: INDERVALLE

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO PARQUES VALLE

Entidad Interventora: CONSORCIO GRUPO 3

Comuna: 3 Barrio: Urbanización La Cabaña

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Karina Lozano

Tenencia: Propietario ☑ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual?

Nombre del Propietario: Karina Patricia Lopez

Dirección: M2 S 6 Casa 11

Teléfono: 3128473312 No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 6.1 de frente x 11 de fondo

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Telefonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. Televisión cable	☑	☐	
7. Otros	☑	☐	Cuál? Internet

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Mampostería confinada

MUROS: En buen estado

CUBIERTA: Teja eternit sobre madera y teja de barro en buen estado.

PISOS: No posee enchapado, concreto a la vista

FACHADA: en ladrillo a la vista

GRIETAS Y FISURAS: No se aprecian

HUMEDADES: En fachada por exposición a factores ambientales se aprecian humedades

HUNDIMIENTO PISO: NO

DESPLAZAMIENTOS: NO

OTRO: Cuál?

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre: KARINA LOZANO SOTO

C.C. O NIT 1112.471.415

Nicolas Gomez O

Firma Representante de la Interventoria

Nombre: Nicolas Gomez Ocampo

CC 1053827749

Representante de la entidad ejecutora

Nombre: Adriana Gonzalez B

CC 1.112.29.111

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA DD	MM	AA	PROYECTO:	FRENTE :
04	01	24	MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	CARTAGO

ACTA No.: 2

CONTRATO N° IND-23-4469

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Edificación con segunda planta construida, en obra negra, debido a la exposición a los agentes ambientales por su construcción es apreciable humedad en pegadillo el igual que en la parte interna del falso techo el cual cuenta con filtraciones de aguas que se dieron hasta que se instaló la cubierta de la estructura.

5. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico): Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO



Muro ladrillo con algunas humedades en cocina Piso 1



Muro ladrillo con presencia de algunas humedades en sala



Zona de patios expuesto a la intemperie



Muro ladrillo con algunas humedades en patio Piso 1



Muro ladrillo con algunas humedades en patio Piso 2



Habitaciones en buen estado piso 1



Habitaciones con algunas humedades en piso 2



Entrepiso en bloquelon con humedades en zona inferior



Muro ladrillo con algunas humedades en cocina Piso 2

2de2

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA: DD 04 | MM 01 | AA 24

ACTA No.: 2

PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE ZARAGOZA, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE :

CONTRATO Nº: CONTRATO IND-23-01-4469

Entidad contratante: INDERVALLE

Entidad interventora: CONSORCIO GRUPO 3

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO PARQUES VALLE

Comuna: 3

Barrio: Urbanización La Cabaña

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Maria Cristina Bernal Londoño.

Tenencia: Propietario ☑ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual?

Nombre del Propietario: Ruby del Socorro Vergara

Dirección: K 2 E Casa 13

Teléfono: 313 583 4061 No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 6.1 de frente X 11 de fondo

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. Televisión cable	☑	☐	
7. Otros	☑	☐	Cual? Internet

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Hampostería Continuada de 2 Pisos, Placa de Terminada, Pisonte en construcción

MUROS: Columnas estructurales y Pintadas con Excepción del muro de Fachada

CUBIERTA: No esta Cubierto por la construcción de segundo Piso

PISOS: No esta Enchapado, en concreto en la Vista, no se aprecian fisuras

FACHADA: Con pintura y Enchape en buen estado

GRIETAS Y FISURAS: No se Aprecian

HUMEDADES: En la losa de entrepiso puede existir de Goteras y en fachada por escorrentía o entrada

HUNDIMIENTO PISO: No

DESPLAZAMIENTOS: No.

OTRO: Cual?

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre: Maria Cristina Bernal Londoño

C.C. O NIT: 31940128

Nicolas Gomez O

Firma Representante de la Interventoría

Nombre: Nicolas Gomez Ocampo

C.C. 1053832748

Representante de la entidad ejecutora

Nombre:

C.C.

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA DD	MM	AA	PROYECTO:	FRENTE :
24	01	24	MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	CONTRATO N° IND-23-4469

ACTA No.: 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda proyectada a cuatro (4) segundo piso cuenta la casa esta terminada y en proceso de adecuación y mantenimiento, debido a la exposición a los factores ambientales se esta apreciando humedades en el bloqueo y del entorno en la parte interna. lo que esta ocasionando manchas en el concreto.

5. ANEXOS

Fotografías. (archivo fotográfico o "filmico") Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO



Cuarto de cocina



Cuarto de Baño



Ingreso a segunda planta desde zona de patios, expuesto a intemperie



Segunda Planta en proceso de construcción




Habitación Piso 1 en buen estado



Habitación con presencia de humedad



Elementos de Bloqueion por humedades



Elementos de Bloqueion por humedades



Piso en concreto a la vista

2de2

INDERVALLE — CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA: DD 04 | MM 01 | AA 24

PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CANTAGALLO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE: CANTAGALLO

CONTRFATO N°: IND-23-12-4469

ACTA No.: 4

Entidad contratante: INDERVALLE

Entidad Interventora: CONSORCIO GRUPO 3

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO PARQUES VALLE

Comuna: 7

Barrio: Urbanización La Cabaña

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Rigoberto Cano

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor X Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Abel Cano

Dirección: K 12 # Casa 44

Teléfono: 3135501237 No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 6.1 de frente x 11 de fondo

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros	X		Cuál? Internet

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldio	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ___ NO X

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ___ NO ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vemos buena estructura en buen estado

MUROS: Internos estucados y pintados se aprecian desconchamientos y suciedades

CUBIERTA: Entramado de madera y teja de barro en buen estado

PISOS: Enchapados en buen estado

FACHADA: Fachada frontal pintada y enchapada, color al gusto del propietario

GRIETAS Y FISURAS: No se aprecian

HUMEDADES: No

HUNDIMIENTO PISO: No

DESPLAZAMIENTOS: No

OTRO: Cuál? ___

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre: Rigoberto Cano Cano

C.C. O NIT: 94201146

Nicolas Gomez O

Firma Representante de la interventoría

Nombre: Nicolas Gomez Ocampo

C.C. 1053832749

Representante de la entidad ejecutoria

Nombre: Jhon Jaime Zuñiga

C.C. 1112 129 197

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
04	01	24
DD	MM	AA

ACTA No.: 1

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: [redacted]

FRENTE :

CONTRFATO N°: [redacted]

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda en buenas condiciones de terminados para la primera planta, la segunda planta se encuentra en proceso de construcción sin embargo esta fachada, demarcada la edificación de las acciones ambientales, mencionadas en el proceso constructivo que se deben revisar y en la fachada lateral se debe revisar posible fisuras que esté afectando y observando la pintura.

5. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico): Registro Fotográfico


REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO



Entramado de madera en cubierta en buen estado



Descascaramiento de pintura de pared



Pared estucada cuarto de cocina con algunas suciedades



Presencia de residuo de concreto en pared sobre estuco



Cuarto de patios



Segunda planta en proceso de construcción



Pisos enchapados en piso 1



Cuarto de baños enchapados



Descascaramiento de pared de fachada

2de2

INDERVALLE | CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA: DD 04 | MM 01 | AA 24

ACTA No.: 5

PROYECTO: [redacted] FRENTE: [redacted] CONTRATO No: [redacted]

Entidad contratante: INDERVALLE

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO PARQUES VALLE

Entidad Interventora: CONSORCIO GRUPO 3

Comuna: 7 Barrio: Urbanización La Cabaña

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Martha Lucia Giraldo

Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☒ Otro Cual?

Nombre del Propietario: Blanca Nidia Giraldo

Dirección: Cra 12 # 2 C

Teléfono: 3116648879 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 6,1 de frente x 11 de fondo

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energia	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	6. Baldio	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral 8. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Mampostería Estructural

MUROS: En ladrillo pintura sobre ladrillo, en regular estado

CUBIERTA: Estructura de madera y teja de barro en regulares condiciones

PISOS: Enchapado en buen estado

FACHADA: En ladrillo a la vista y pañetado sobre ladrillo

GRIETAS Y FISURAS: No se aprecian

HUMEDADES: En el cuarto de baños por [illegible] de la entrega

HUNDIMIENTO PISO: NO

DESPLAZAMIENTOS: No

OTRO: Cuál?

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre: Martha Giraldo

C.C. O NIT: 112760086

Nicolas Gomez O

Firma Representante de la Interventoria

Nombre: Nicolas Gomez Ocampo

C.C. 1053812744

Representante de la entidad ejecutoria

Nombre: [illegible]

C.C. [illegible]

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA		
04	01	24
DD	MM	AA

ACTA No.: 3

PROYECTO: [redacted]

FRENTE : [redacted]

CONTRFATO N° [redacted]

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Una de las habitaciones funciona como tienda (Comercio), estructura con algunas humedades y organismos, vive en la casa más cercana a la intervención, el cuarto no está enchapado.

5. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico) Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO



Piso enchapado, descascaramiento de pintura en cocina



Cuarto de patios expuesto a la intemperie



Presencia de organismos por humedad en patio



Presencia de organismos por humedad en patio



Enchape de Cocina en buen estado



Leves humedades en techo de cocina



Piso enchapado en habitaciones



Cuarto de baño, no está enchapado



Entramado de madera para cubierta

2de2

INDERVALLE — CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA: DD 04 | MM 01 | AA 24

PROYECTO: [redacted]

FRENTE: [redacted]

CONTRFATO N°: [redacted]

ACTA No.: 5

Entidad contratante: INDERVALLE

Entidad Interventora: CONSORCIO GRUPO 3

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO PARQUES VALLE

Comuna: 7

Barrio: Urbanización La Cabaña

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Nora Milena Cano

Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor Otro Cual?

Nombre del Propietario: Nora Milena Cano

Dirección: Mz 5 Casa 8

Teléfono: 320 6740465 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 6.5m de frente X 11.m de fondo

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros	X		Cuál? Internet

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldio	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI NO X

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Manipostería almacenada en buen estado

MUROS: Tenemos con pañetados pintura lisos y pintados en buenas condiciones algo de suciedad

CUBIERTA: Entramado de madera y teja de barro en buenas condiciones buen estado

PISOS: Enchapados en buen estado

FACHADA: En buenas condiciones con acabados y enchape de zocalo

GRIETAS Y FISURAS: Grieta leve en acceso a habitacion y fisura vertical de cabecera a piso

HUMEDADES: En techo por exposicion a condiciones ambientales

HUNDIMIENTO PISO: No

DESPLAZAMIENTOS: No

OTRO: Cuál?

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre: Nora Milena Cano

C.C. O NIT 31415883

Firma Representante de la interventoria

Nombre: Nicolas Gomez Ocampo

C.C. 10 255 1744

Representante de la entidad ejecutoria

Nombre: [redacted]

C.C. [redacted]

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA: DD 14 MM 01 AA 24

ACTA No.: 6

PROYECTO: [redacted]

FRENTE : [redacted]

CONTRFATO N° [redacted]

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda en buenas condiciones de terminados con algo de suciedad en los muros, el techo está expuesto a la intemperie se aprecian algunas tejas quebradas en los ladrillos, una fisuración fue apreciada al lado de acceso de la habitación 1 para tener en cuenta

5. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico) Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO



Paredes de sala en obra blanca estucada



Cielo falso en panel PVC en buen estado



Cocina enchapada y en obra blanca



Cocina con acabados



Cuarto de baños con acabados



Fisura en acceso a habitación 1



Habitaciones con acabados de paredes y con cielo falso PVC



Desprendimiento de enchape de guardaescoba



Piso enchapado en buen estado

2de2

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA: DD 01 MM 01 AA 23

ACTA No.: 7

PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIO DEL CAICEDO EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE : CAICEDO

CONTRFATO N° IND-23-4469 AMB

Entidad contratante: INDERVALLE

Entidad interventora: CONSORCIO GRUPO 3

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO PARQUES VALLE

Comuna: 7 Barrio: Urbanización La Cabaña

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Paola Andrea Pinedo

Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor Otro Cual?

Nombre del Propietario

Dirección: M2 5 Casa 10

Teléfono: 310 3329171 No. de pisos

Long. del frente (mts): 6 Lindo frente 2 Pisos de Altura

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál? Internet

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje	SI	NO	X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos			
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	SI	NO	
4. Institucional		Cual?					

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Mampostería Estructural en buenas condiciones.

MUROS: Muros con terminados de estuco y pintura en buenas condiciones

CUBIERTA: Entramado madera y teja de barro en buen estado

PISOS: En concreto en buen estado

FACHADA: Con acabados de Obra blanca.

GRIETAS Y FISURAS: En forma de techo se aprecia fisura vertical

HUMEDADES: En patio

HUNDIMIENTO PISO: No.

DESPLAZAMIENTOS: No

OTRO: Cuál?

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor: X

Nombre: Paola Andrea Pinedo

C.C. O NIT: 31436422

Firma Representante de la Interventoria: Nicolas Gomez O

Nombre: Nicolas Gomez Ocampo

CC 1053812744

Representante de la entidad ejecutora

Nombre: Jesus Saavedra M

CC 1.112.129.751

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AA	ACTA No.:
04	01	24	7

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CANTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE : CONTRATO N°: CONTRATO IND-23-4469

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda con terminados de Obra Blanca, piso en PVC en buen estado, Baño de baja enchapados, se apreciaron algunas suciedades en paredes, una humedad en el techo, que se pudo ocasionar por un asentamiento en el terreno para que al momento de la visita ya se encontraba y esto se dio antes de iniciar las Obras.

5. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico): Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FÍLMICO



Paredes internas en obra blanca con acabados en buen estado



Cielo falso en panel PVC en buen estado




Piso enchapado sala principal




Cocina con terminados en buen estado



Patio con exposición a la intemperie



Agrietamiento en pared del patio



Cuarto de baño con acabados en paredes con leve suciedad



Habitación con terminados de paredes, leve suciedad



Piso enchapado de cocina

2de2

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FICHA TECNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA: DD 07 MM 01 AA 24

ACTA No.: 2

PROYECTO: [redacted]

FRENTE: CONTRATO N°: [redacted]

Entidad contratante: INDERVALLE

Entidad interventora: CONSORCIO GRUPO 3

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO PARQUES VALLE

Comuna: 2

Barrio: Urbanización La Cabaña

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Brayan Jimenez.

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ✓ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Diana Alexa Lopez Sanchez.

Dirección: N 2 5 Casa 11

Teléfono: 304 45 22 525 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 6.1 m de frente x 11 de fondo.

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	✓		
2. Alcantarillado	✓		
3. Energía	✓		
4. Teléfonos		✓	
5. Gas		✓	
6. Televisión cable		✓	
7. Otros		✓	Cuál?

USO ACTUAL

1. Residencial	✓	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ___ NO ✓

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ___ NO ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "3. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Manifiesta Estructura de ladrillo a la vista Pintura sobre ladrillo en algunas Partes

MUROS: Interior ladrillo a la vista Pintura sobre ladrillo en algunas Partes

CUBIERTA: Entramado Madera teja de barro en buenas Condiciones

PISOS: No Esta enchapado, pero concreto en buen estado, no presentan fisuras

FACHADA: Pintura sobre ladrillo en buenas condiciones

GRIETAS Y FISURAS: No se aprecian

HUMEDADES: En la zona de baño y Cocina humedades por filtración de agentes externos

HUNDIMIENTO PISO: No

DESPLAZAMIENTOS: No

OTRO: Cual?

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre: Brayan Jimenez

C.C. O NIT: 1062 [illegible]

Firma Representante de la Interventoria

Nombre: Nicolas Gomez Ocampo

C.C. 1053677748

Representante de la entidad ejecutoria

Nombre: Jesson Sanchez B

C.C. 1 112 179 151

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FECHA: DD 04 MM 01 AA 24

ACTA No.: 8

PROYECTO: [illegible]

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FRENTE:

CONTRATO N°: [illegible]

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El Predio está desocupado por lo que se sugiere aplicar condiciones similares a propiedades, no se observan fisuras en los elementos de concreto, ni de asfalto, se evidencia presencia de humedad, vivienda en obra negra, se aplica Predio Solo Lote debido a su entorno no se aprecian desplazamientos.

5. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico): Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO



Piso de la vivienda en concreto a la vista



Entramado madera cubierta



Cuarto de cocina sin terminados



Paredes internas en ladrillo a la vista



Zona de patios con humedades por exposición a intemperie



Presencia de agentes orgánicos en paredes exteriores al piso del patio



Habitaciones con pintura en ladrillos



Cuarto de baño sin acabados, humedades leves



Paredes ladrillo a la vista

2de2

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA: 04 (DD) 01 (MM) 24 (AA)

ACTA No.: 03

PROYECTO: [redacted]

FRENTE:

CONTRFATO N°: [redacted]

Entidad contratante: INDERVALLE

Entidad Interventora: CONSORCIO GRUPO 3

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO PARQUES VALLE

Comuna: 7

Barrio: Urbanización La Cabaña

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Alexander Criollo Burbano.

Tenencia: Propietario [ ] Arrendatario [X] Poseedor [ ] Otro Cual? [ ]

Nombre del Propietario: Comunidad Granados

Dirección: Mz 7 Casa 8 Urb. Viento 2 ANDES

Teléfono: 3135264767 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): 6,1 m de frente x 11 de fondo.

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. Televisión cable	[ ]	[X]	
7. Otros	[ ]	[X]	Cual?

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	5. Recreacional	[ ]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Institucional	[ ]	Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI [ ] NO [X]

Cuantos:

El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Nomenclatura estructural en buenas condiciones

MUROS: Muros sin acabados, pintura sobre ladrillo, sin evidencia de asentamiento

CUBIERTA: En teja de barro en buenas condiciones

PISOS: En baldosa en buenas condiciones

FACHADA: Ladrillo a la vista con pintura sobre ladrillo, sin evidencia afectación de pinturas.

GRIETAS Y FISURAS: No se aprecian

HUMEDADES: En baño de patio se aprecian humedades por condiciones climáticas

HUNDIMIENTO PISO: No

DESPLAZAMIENTOS: No

OTRO: Cual?

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre: ALEXANDER Criollo BURBANO

C.C. O NIT: 16 750 742 Pal - VALLE

Firma Representante de la Interventoria

Nombre: Nicolas Leonel Ocampo

C.C. 1053833748

Representante de la entidad ejecutoria

Nombre: [illegible]

C.C. 1 112 139 [illegible]

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AA	ACTA No.:
04	01	24	9

PROYECTO: [redacted]

FICHA TECNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FRENTE :

CONTRFATO N° [redacted]

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

X [illegible] apariencia general presenta humedades en las zonas expuestas a la intemperie y se encuentra sometida a las condiciones climáticas, no tiene acabados de estuco en ninguna de las caras, sin embargo se aprecian daños causados en algunos fragmentos de la pintura sobre el ladrillo a la vista.

5. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico) Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO



Paredes internas de sala pintada sobre ladrillo



Piso de sala enchapado



Cielo falso en PVC



Paredes internas de habitaciones pintada sobre ladrillo




Paredes cuarto de baño pintada sobre ladrillo, no enchapado



Humedad en patio por exposicion al medio ambiente



Paredes internas de habitaciones pintada sobre ladrillo



Paredes internas de habitaciones pintada sobre ladrillo



Humedad en zona de baños por proceso constructivo

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA: DD 04 MM 01 AA 24

ACTA No.: 10

PROYECTO: [redacted]

FRENTE : [redacted]

CONTRFATO N° [redacted]

Entidad contratante: INDERVALLE

Entidad Interventora: CONSORCIO GRUPO 3

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO PARQUES VALLE

Comuna: 7 Barrio: Urbanización La Cabaña

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Oscar J. Buitrago

Tenencia: Propietario Arrendatario Poseedor X Otro Cual?

Nombre del Propietario: Oscar y Buitrago

Dirección: Urbanización El Cristalino Mz 3 Casa 3 Tramo 3 [illegible]

Teléfono: 322 [illegible] No. Depinos: 1

Long. del frente (mts): 6. Patiente 6 Mts de Ancho

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI NO X

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En [illegible] en buenas condiciones

MUROS: En [illegible] y pintura en [illegible]

CUBIERTA: En [illegible] en buenas condiciones

PISOS: En [illegible] en buenas condiciones

FACHADA: Ladrillo a la vista en algunas partes y en otras con [illegible]

GRIETAS Y FISURAS: No se aprecian

HUMEDADES: En [illegible] se presentan humedades por exposición a intemperie

HUNDIMIENTO PISO: No

DESPLAZAMIENTOS: No

OTRO: Cuál?

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre: Oscar J. Buitrago S

C.C. O NIT: 6 279 501.

Firma Representante de la Interventoría

Nombre: Nicolas Gomez Ocampo

C.C. 1053812749

Representante de la entidad ejecutoria

Nombre: [illegible]

C.C. 1112129 19

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FECHA: DD 04 / MM 01 / AA 24

ACTA No.: 16

PROYECTO: [redacted]

FICHA TECNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FRENTE : [redacted]

CONTRATO N° [redacted]

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se [illegible] inmediata en el techo debido a estar sometido a los factores ambientales, estructura presenta buenas condiciones, el baño se requiere ampliación y mantenimiento. Las paredes exteriores se recomiendan estucadas y pintadas.

5. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico) Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO


Piso de sala enchapado


Paredes con terminados de estuco y pintura


Hongos en ladrillo de paredes de patio


Muro de patio con ladrillo a la vista


Entramado de madera de cubierta en buenas condiciones


Paredes con terminados de estuco y pintura


Paredes con terminados de estuco y pintura


Cuarto de baño enchapado


Humedad mezclada con suciedad de canal en patio

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA: DD 04 MM 01 AA 24

ACTA No.: 11

PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CANTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE: CANTAGO

CONTRFATO N°: IND-23-D-4469

Entidad contratante: INDERVALLE

Entidad Interventora: CONSORCIO GRUPO 3

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO PARQUES VALLE

Comuna: _____ Barrio: Urbanización La Cabaña

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Luz Marina Bravo

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor X Otro Cual?

Nombre del Propietario: Wilson Mauricio Agudelo

Dirección: Vereda Yurumi - Sector Alto El Carmen

Teléfono: 3205 [illegible] No de pisos: 2

Long. del frente (mts): 6,1 de frente x 11 m de fondo

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros	X		Cual? Internet

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial	X	6. Baldio	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ___ NO X

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ___ NO ___

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vivienda de 2 plantas, se aprecia que son viejas aparentemente

MUROS: Aparentemente estructural con acabados enlucidos, los exteriores Planta 2 tiene repello

CUBIERTA: Actualmente no esta Cubierta por [illegible] a [illegible] plantas

PISOS: Enchapado en buenas condiciones.

FACHADA: Primera Planta; ladrillo a la vista, Segunda Planta con repello

GRIETAS Y FISURAS: No se aprecian

HUMEDADES: No se aprecian

HUNDIMIENTO PISO: Se observa apreciable fisuramiento de [illegible] en [illegible], sin embargo, no comprometen [illegible]

DESPLAZAMIENTOS: No se aprecian

OTRO: Cual?

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor: [illegible]

Nombre: [illegible]

C.C. O NIT: [illegible]

Firma Representante de la Interventoría: Nicolas Gomez O.

Nombre: Nicolas Gomez Ocampo

CC 1053917749

Representante de la entidad ejecutoria: [illegible]

Nombre: Wilson Sanchez M.

CC 1 [illegible]

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FECHA: DD 04 | MM 01 | AA 24

ACTA No.: 11

PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESTÁNDARES DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN PARA LOS MONUMENTOS DE CARÁCTER EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE:

CONTRATO N°: CONTRATO

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda de 2 plantas con proyección a 3 pp. la que plantea de entrepiso para la integrarse sin embargo no está habitada. Se aprecia en la viga del voladizo que existe descascaramiento del elemento, al igual una pequeña fisura en el piso de segunda, se hace sugerencia de contratista de geotecnista para verificar condiciones del suelo.

5. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico) Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO



Cuarto de cocina con acabados en buenas condiciones



Habitación con acabados en buenas condiciones



Zona de ducha separada del baño, enchapado buenas condiciones



Cielo falso en panel yeso en buenas condiciones




Viga en voladizo Planta 2 con descascaramiento en esquina



Aparente fenómeno de licuefacción que puede genera hundimiento



Piso enchapado en buenas condiciones



Proyección a comercio en cuarto Piso 1



Zona lavado espacio proyectado a comercio, buenas condiciones

INDERVALLE — CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA: DD 07 / MM 01 / AA 24 — ACTA No.: 12

PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE: CARTAGO — CONTRATO N°: IND-23-4469

Entidad contratante: INDERVALLE — Entidad Interventora: CONSORCIO GRUPO 3

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO PARQUES VALLE — Comuna: 7 — Barrio: Urbanización La Cabaña

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: María Cristina Sánchez
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor X Otro Cual? ___
Nombre del Propietario: Álvaro Vivas
Dirección: Cra 7 numero 24-22 Int 2 Casa 3.
Teléfono: 3223103633 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): 8m de frente x 14 de fondo

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros	X		Cual? Internet

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☒	
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	
4. Institucional		Cual?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Ladrillo estructural a la vista
En buenas condiciones a la vista pintadas
MUROS: internos en ladrillo a la vista pintados y en buen estado no se aprecian daños ni problemas
CUBIERTA: Entramado madera y cubierto con teja de barro en buenas condiciones
PISOS: No esta especificado, se encuentra en concreto pulido en buen estado no se aprecian daños ni deterioros
FACHADA: ladrillo a la vista pintado sobre capillos No se aprecian daños ni deterioros

GRIETAS Y FISURAS: No se aprecian
HUMEDADES: En partes hay humedad por exposición a la intemperie
HUNDIMIENTO PISO: No se aprecian
DESPLAZAMIENTOS: No se aprecian
OTRO: Cual?

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor — Nombre: María Cristina Sánchez — C.C. O NIT: 31224239

Firma Representante de la Interventoría — Nombre: Nicolás Gomez Ocampo — C.C. 1053812145

Representante de la entidad ejecutora — Nombre: Jhonatan Sánchez — C.C. 1112129151

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
DD	MM	AA

ACTA No.:

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARQUES MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE : CARTAGO
CONTRFATO N° [illegible]

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda en buenas condiciones con presencia de humedad en el piso debido al encharcamiento a las condiciones del ambiente de exposición a la intemperie, el acabado del muro exterior especialmente en el área de ducha, en los otros espacios está pulido a la vista pintado. El piso esta en concreto pulido para no se aprecian fisuraciones

5. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico) Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO



Piso en concreto pulido pintado en buenas condiciones



Muros internos ladrillo a la vista pintado



Cielo Raso en Machimbre en buenas condiciones



Paredes de ladrillo a la vista pintado entrada a habitaciones



Entramado madera cubierta en buenas condiciones



Humedad en patio por exposición a factores climáticos



Cuarto de baño, solo enchape en área de ducha



Area de ducha con enchape



Cocina con enchapado en buenas condiciones

2de2

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA: DÍA 04 | MES 01 | AÑO 24

ACTA No.: 15

PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE: CARTAGO

CONTRATO N°: IND-23-4469

Entidad contratante: INDERVALLE

Entidad Interventora: CONSORCIO GRUPO 3

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO PARQUES VALLE

Comuna: 7 Barrio: Urbanización La Cabaña

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Claudia Lorena Londoño

Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor Otro Cual?

Nombre del Propietario:

Dirección: Trv 32 B 1 Sur 38-30 Casa 20 Mz 5

Teléfono: 3136933221 No. de pisos:

Long. del frente (mts): 5m de frente y 10 de fondo

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable	X		
7. Otros		X	Cuál?

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Edificación con 5 conjs de existencia en mampostería simple con pañetes por fuera

MUROS: Enchapes con desprendimiento de pintura en algunas esquinas y pañetes

CUBIERTA: Estructura en perfiles metálicos A cubierta en fibrocemento en mal estado

PISOS: Enchapados en buen estado

FACHADA: En regulares condiciones en pintura en algunos sectores

GRIETAS Y FISURAS: No se especifican

HUMEDADES: No se especifican

HUNDIMIENTO PISO: No

DESPLAZAMIENTOS: No

OTRO: Cuál?

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor:

Nombre: Claudia Lorena Londoño

C.C. O NIT: 31 421 228

Firma Representante de la Interventoría: Nicolas Gomez O

Nombre: Nicolas Gomez Ocampo

C.C. 1053811149

Representante de la entidad ejecutora:

Nombre: Jhoseph Zuñiga R.

C.C. 1.112.129.351

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA DD	MM	AA	ACTA No.:	PROYECTO:	FRENTE : CONTRFATO N°
04	01	24	13	[redacted]	[redacted]

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda con placa - cuerpo de construida. Se observa que [illegible] en regular estado y vivienda se observa [illegible] grietas, pintura [illegible] hacia [illegible] con [illegible] que impide [illegible] [illegible] [illegible] de humedad en este cuarto.

5. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico) Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO



Entrepiso en Bloquelon pintado en buenas condiciones




Cuarto de cocina enchapado y con acabados, buh estado



Paredes de patio ladrillo a la vista en buen estado



Pisos enchapados en buen estado



Paredes de segunda planta con presencia de suciedad



Cielo falso segunda planta en icopor, buenas condiciones



Paredes segunda planta con acabados en buen estado



Puerta garaje para acceso de vehículo



Espacio Bloquelon para instalación de bombillo

2de2

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA: DD 01 MM 12 AA 23

ACTA No.: 14

PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS BARRIOS DE CANTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE :

CONTRATO N° [redacted]

Entidad contratante: INDERVALLE

Entidad Interventora: CONSORCIO GRUPO 3

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO PARQUES VALLE

Comuna: 5 Barrio: Urbanización La Cañaña

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Ricardo Poncelo

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Fernando Gutierrez

Dirección: 321 225 56 7 mnz 3) casa 12

Teléfono: 321 225 56 7 No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 8m de fro. 20 x 40 de fondo

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cual?

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO

Cuantos: 1

El garaje se usa como comercio SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En regular con 5 años de antigüedad

MUROS: Adobe, mixto, ladrillo a la vista y bloque, en regular estado

CUBIERTA: En zinc en regular estado y en teja de barro en buen estado

PISOS: Enchapados

FACHADA: En buen estado

GRIETAS Y FISURAS: No se aprecian

HUMEDADES: No se aprecian

HUNDIMIENTO PISO: No

DESPLAZAMIENTOS: No

OTRO: Cual?

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre: [redacted]

C.C O NIT: [redacted]

Firma Representante de la Interventoria

Nombre: Nicolas Gomez Ocampo

C.C: 1053817345

Representante de la entidad ejecutora

Nombre: [redacted]

C.C [redacted]

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA: DD 04 | MM 01 | AA 24

ACTA No.: 14

PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE: CONTRATO N°: CONTRATO IND-23-4469


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda en poco tiempo de construida. Se aprecian algunas sociedades en paredes por causa de humedades generadas por tuberías o por filtración y condensación de [illegible] evidencia a pie factura [illegible] que no se logro apreciar debido a vivienda en buen estado general.

5. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico): Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO




Piso enchapado en buenas condiciones




Pared interna primer piso con presencia de suciedad



Puerta garaje en buen estado



Pared interna Planta 2 en buenas condiciones



Entrepiso en bloquelon con acabado de estuco cielo pintado



Paredes patio, con acabado de repello



Cuarto de patio no se aprecian humedades



Cuarto de baño ppal enchapado y estucado, buen estado



Cuarto de baño auxiliar acabado en estuco y pintura, buen estado

2de2

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FECHA: DD 04 MM 01 AA 24 — ACTA No.: 75

PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CANDELO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE: CANDELO — CONTRFATO N°: IND-23-4469

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

Entidad contratante: INDERVALLE — Entidad Interventora: CONSORCIO GRUPO 3

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO PARQUES VALLE — Comuna: 7 — Barrio: Urbanización La Cabaña

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Carmen Rosa Correa.

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Encargado

Nombre del Propietario

Dirección: Transv 30 # 1 B5. Casa 3.

Teléfono: — No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): 6m de frente x 17 de fondo

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	
6. Televisión cable	☐	☑	
7. Otros	☐	☐	Cual?

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☑ NO ☐ — Cuantos: 1 — El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Solo se permite visualizar por fuera, sistema aporticado de concreto reforzado

MUROS: Solo fue posible ver desde las zonas exteriores que se observan en ladrillo tolete

CUBIERTA: Entramado en perfiles metálicos y cubierta de teja en concreto en buenas condiciones

PISOS: Desde fuera se ve enchapado en cerámica en buenas condiciones

FACHADA: Acabado a la vista en buen estado

GRIETAS Y FISURAS: Desde la parte exterior no se aprecian. No se puede verificar interior

HUMEDADES: Desde la parte exterior no se aprecian. No se puede verificar interior

HUNDIMIENTO PISO: Desde la parte exterior no se aprecian. No se puede verificar interior

DESPLAZAMIENTOS: Desde la parte exterior no se aprecian. No se puede verificar interior

OTRO: Cual? Encargado solo presenta la cedula original mas no tiene fotografia. No se puede verificar.

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre:
C.C. O NIT: 31006329

Nicolas Correa U
Firma Representante de la Interventoria
Nombre: Nicolas Correa Cuampe
C.C. 1023922748

Representante de la entidad ejecutora
Nombre: Jefferson Sanchez
C.C. 1112129157

INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA: DD 07 MM 24 AA — ACTA No.:

PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FRENTE: CONTRATO N°: CONTRATO IND-23-4469

Entidad contratante: INDERVALLE

Entidad interventora: CONSORCIO GRUPO 3

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO PARQUES VALLE

Comuna: 7 Barrio: Urbanización La Cabaña

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Cesario Luis Gomez

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Encargado

Nombre del Propietario

Dirección: Trans 3BB. 18B Casa 4

Teléfono: No de pisos:

Long. del frente (mts): 8 m del frente y 15 de fondo

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros			Cual?

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI X NO ___

Cuantos: 1

El garaje se usa como comercio SI ___ NO: X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Solo se presenta vandalismo hay [illegible] se observan vandalismo sobre la estructura misma

MUROS: Se observan [illegible] y [illegible] se encuentran con vandalismo

CUBIERTA: Estructura [illegible] y cubierta se encuentra [illegible] no [illegible]

PISOS: Piso [illegible] se encuentra en buenas condiciones

FACHADA: [illegible] a la vista se encuentra completamente

GRIETAS Y FISURAS: Desde la parte exterior no se observan No se puede verificar interior

HUMEDADES: Desde la parte exterior no se observan No se puede verificar interior

HUNDIMIENTO PISO: Desde la parte exterior no se observan No se puede verificar interior

DESPLAZAMIENTOS: Desde la parte exterior no se observan No se puede verificar interior

OTRO: Cual? El cerramiento solo permite revisar exterior inmueble no ofrece facilidades no se puede verificar

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre:

C.C. O NIT: 3140834

Nicolas Gomez O

Firma Representante de la Interventoria

Nombre: Nicolas Gomez Ocampo

C.C. 1253942148

Representante de la entidad ejecutora

Nombre:

C.C.

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

8 SOPORTE DE PARAFISCALES

Copia de las planillas de SS.

Para el periodo comprendido entre el 28 de diciembre de 2023 y el 31 de enero de 2024 en el frente 1 se cuenta con los siguientes soportes de seguridad social:

- **PERSONAL DE OBRA:**

AFILIACIONES ARL

ARL | sura

Medellín 24 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de REESTRUCTURAMOS TUS ESPACIOS SAS

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000005 MAESTROS Y AYUDANTES DE OBRA			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1554660	GUTIERREZ GARCIA SILVIO	25/01/2024		19712531	DEPENDIENTE	POR INICIAR

ARL | sura

Medellín 24 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de REESTRUCTURAMOS TUS ESPACIOS SAS

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
[illegible]						

ARL | sura

Medellín 24 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de REESTRUCTURAMOS TUS ESPACIOS SAS

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
[illegible]						

ARL | sura

Medellín 24 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de REESTRUCTURAMOS TUS ESPACIOS SAS


A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000005 MAESTROS Y AYUDANTES DE OBRA			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1002583575	URREA GUTIERREZ JUAN PABLO	25/01/2024		25121029	DEPENDIENTE	POR INICIAR

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

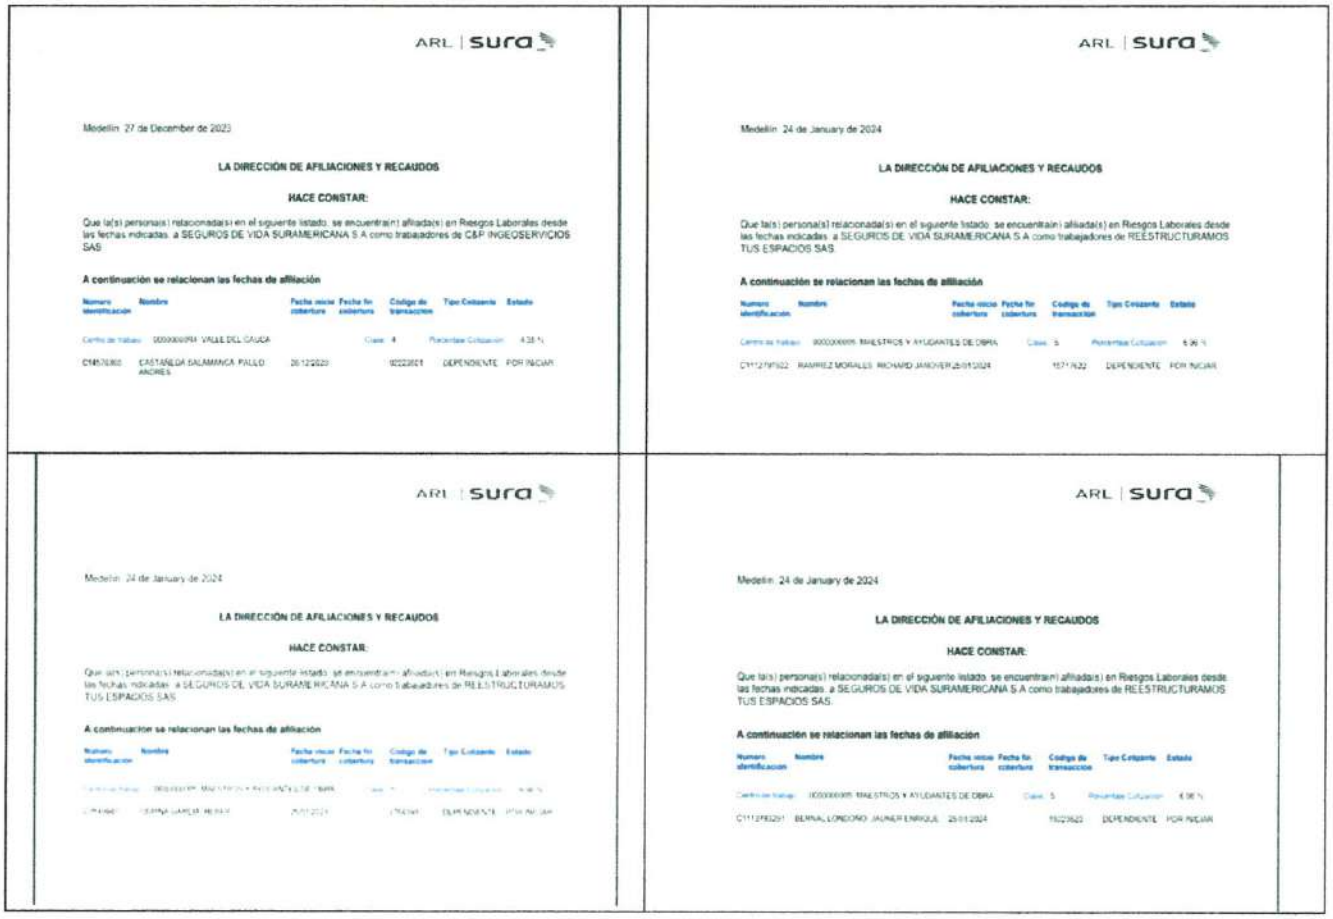

ARL | sura

Medellin 27 de December de 2023

LA DIRECCION DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S A como trabajadores de C&P INGEOSERVICIOS SAS

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Numero identificacion	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Codigo de transaccion	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 000000009R4 VALLE DEL CAUCA			Clase: 4		Porcentaje Cotizacion: 4.35 %	
C1152763502	CASTAÑEDA SALAMANCA PAULO ANDRES	26/12/2023		92223021	DEPENDIENTE	POR INICIAR

ARL | sura

Medellin 24 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S A como trabajadores de REESTRUCTURAMOS TUS ESPACIOS SAS

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Numero identificacion	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Codigo de transaccion	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 000000009R5 MAESTROS Y AYUDANTES DE OBRA			Clase: 5		Porcentaje Cotizacion: 6.96 %	
C1112797622	RAMIREZ MORALES RICHARD JANOVER	25/01/2024		1571622	DEPENDIENTE	POR INICIAR

ARL | sura

Medellin 24 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S A como trabajadores de REESTRUCTURAMOS TUS ESPACIOS SAS

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Numero identificacion	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Codigo de transaccion	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 000000009R5 MAESTROS Y AYUDANTES DE OBRA			Clase: 5		Porcentaje Cotizacion: 6.96 %	
C1112760251	BERNAL LONDOÑO JAUNER ENRIQUE	25/01/2024		15223622	DEPENDIENTE	POR INICIAR

➢ PERSONAL ENCARGADO DE RETIRO DE ESCOMBRO:

ARL | sura

Medellin 27 de December de 2023

LA DIRECCION DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S A como trabajadores de C&P INGEOSERVICIOS SAS.

A continuacion se relacionan las fechas de afiliacion

Numero identificacion	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Codigo de transaccion	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 000000009R4 VALLE DEL CAUCA			Clase: 4		Porcentaje Cotizacion: 4.35 %	
C1114091244	MONTOYA MENDOZA CRISTIAN MAURICIO	26.12.2023		52512221	DEPENDIENTE	POR INICIAR

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DÍA	HASTA LAS 24:00 HORAS DEL AÑO MES DÍA
2023-08-18	2023-08-19	2024-08-18

PREVISORA SEGUROS

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	KILOMETRAJE/ATOS	MODELO
1508005397455000	AIG182	CARGA O MIXTO	PARTICULAR	6000	1953

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	GMC	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: C-600

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
FVA30239	FVA30239		6.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CORREA GOMEZ, DAVID STIVEN	3117164324	CC	1112767662	CARTAGO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	15	12182	0	QUIBDO

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 776000	$ 403500	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1181600

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	701,68[2] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77 UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
	750 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

FIRMA AUTORIZADA

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento. usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono movil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A, enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 168340400

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO Y VERIFICACION AMBIENTAL CARTAGO

NIT: 900339941

No. de Certificado de Acreditación: 18-OIN-024-001

Fecha de expedición: 2023/09/11

Fecha de vencimiento: 2024/09/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	AIG182	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	GMC	**MODELO:**	1953
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	6000	**NRO. MOTOR:**	FVA30239
NRO. CHASIS:		**VIN:**	
LÍNEA:	C-600		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: DAVID S CORREA G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JOSE NORBERTO SANCHEZ MARTINEZ

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024150435

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
AIG182	GMC	C-600	1953

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.000	BLANCO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
FVA30239	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	******	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CORREA GOMEZ DAVID STIVEN	C.C. 1112767662

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
000	I	12/02/1998	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
12/02/1998	05/10/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOYTTE LA VIRGINI/



LT02006736961

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

ARL | sura

Medellín, 27 de December de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S A como trabajadores de C&P INGEOSERVICIOS SAS.

A continuacion se relacionan las fechas de afiliacion

Numero identificacion	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Codigo de transaccion	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo	00000000R4 VALLE DEL CAUCA		Clase 4	Porcentaje Cotizacion	4.35 %	
C14570360	CASTAÑEDA SALAMANCA PAULO ANDRES	28 12 2023		02222601	DEPENDIENTE	POR INICIAR

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN AAAA MM DD	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AAAA MM DD	HASTA LAS 2359 HORAS DEL AAAA MM DD
2023-12-22	2023-12-23	2024-12-22

PREVISORA SEGUROS

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/WATIOS	MODELO
1508005560220000	SAA938	CARGA O MIXTO	PUBLICO	6000	1960

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	DESOTO	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO			
SIN LINEA			

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
P26135786	000000		6.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CARVAJAL BARCO, ALEXANDER	3202532441	CC	14569713	CARTAGO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	15	13543	0	PEREIRA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 776000	$ 403500	$ 2100

TOTAL A PAGAR
$ 1181600

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA

	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACEÚTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 170552185

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO Y VERIFICACION AMBIENTAL CARTAGO

NIT: 900339941

No. de Certificado de Acreditación: 18-OIN-024-001

Fecha de expedición: 2023/12/23

Fecha de vencimiento: 2024/12/23

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SAA938	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	DESOTO	**MODELO:**	1960
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	6000	**NRO. MOTOR:**	P26135786
NRO. CHASIS:		**VIN:**	
LÍNEA:	SIN LINEA		
COLOR:	AZUL BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: NORBERTO SILVA B.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JOSE NORBERTO SANCHEZ MARTINEZ

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024





9 ENSAYOS DE LABORATORIO

Copia de los resultados de ensayos de laboratorio.

Para el periodo comprendido entre el 28 de diciembre de 2023 y el 31 de enero de 2024 en el frente 1 No se realizaron ensayos de laboratorio por lo tanto no se presentan en este informe

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

10 BITACORÁ DE OBRA

Escaneo de bitácoras de obra Frente 1

BITACORA DE OBRA.

OBJETO: "Contratar por el Sistema de Precios Unitarios Fijos: Mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos para los municipios de Cartago, El Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca. realizando la ejecución de los siguientes: GRUPO 1: FRENTE 1. Gimnasio al Aire Libre y Ecobikes, Urbanización La Cabaña, Municipio de Cartago - Departamento del Valle del Cauca.
GRUPO 1: FRENTE 2. Adecuación Corramiento - Barrio Decepaz - Distrito Especial de Cali - Departamento del Valle del Cauca.
GRUPO 1: FRENTE 3. Adecuación Escenario Deportivo Barrio Comunero II Municipio de Cali Valle del Cauca.

FRENTE DE TRABAJO: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

CONTRATISTA: Consorcio Parques Valle

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3.

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

FECHA: 28 de Diciembre de 2023., Jueves
Personal Obra: Ing. Residente
Personal Interventoría: Ing. Residente
Equipo: Equipos de Computo
Condiciones Climaticas: Seco de 07:00 a.m a 05:00 p.m.
Actividades realizadas:
Se firma Acta de Inicio de Obra para lo cual se adelantan labores administrativas y de logistica para el inicio de labores de campo como cotizaciones, consecución de bajas de vida de personal, bodegaje, equipo etc, se revisa planos y presupuesto
Se hace visita de campo de reconocimiento de sitio de trabajo

Residente de Obra. Nicolas Gomez O
Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 29 de Diciembre de 2023., Viernes
Personal de Obra: Ing. Residente
Personal Interventoría: Ing. Residente
Equipo: Equipos de Computo
Condiciones Climáticas: Seco de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.
Actividades Realizadas:
Continúan Actividades Logisticas de Consecución de materiales, personal, equipo, bodegaje, entre otras además de la revisión documental del proyecto previo al inicio de las actividades de Campo, además de las actividades administrativas para consolidación del cronograma y el balance económico acorde a las necesidades del proyecto.
Se adelanta reuniones con Comunidad para manifestar inicio de Obra

Residente de Obra. Nicolas Gomez O
Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 30 de Diciembre de 2023., Sabado
Personal de Obra: Ing. Residente
Personal de Interventoría: Ing. Residente.
Equipo: Equipos de Computo
Condiciones Climaticas: Seco de 07:00 a.m. a 12:00 p.m.

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

2

Actividades Realizadas:
Continúa la logística de Cotizaciones, consecución de material, mano de Obra, equipo, revisión de Planos, balance económico, Cronograma y demás acciones previas al inicio de actividades de campo.
Continuan reuniones con comunidad para solicitar apoyo logistico

Residente de Obra — Nicolas Gomez O — Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 31 de Diciembre de 2023, Domingo
No se programan actividades por día Dominical y celebracion de Año Nuevo

Residente de Obra — Nicolas Gomez O — Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 01 de Enero de 2024, Lunes Festivo
No se programan Actividades por día Festivo de Año Nuevo

Residente de Obra. — Nicolas Gomez O — Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 02 de Enero de 2024, Martes
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST.
Personal de Interventoría: Ing. Residente
Herramienta y Equipo: Equipos de Computo
Condiciones Climaticas: Soco. de 07:00 a.m a 05:00 p.m.
Actividades realizadas:
Se adelanta Visita de Campo y se hace acercamiento con la Comunidad toda vez que se logró evidenciar elementos de viviendas al interior del área del proyecto por lo que se solicita la reunión de estos elementos, de igual manera se cuanto con cronograma de Obra y balance economico acorde a la revisión de planos y verificación de Campo.

Residente de Obra — Nicolas Gomez O — Interventoria Consorcio Grupo 3

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

3

FECHA: 03 de Enero de 2024, Miercoles
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST.
Personal de Interventoría: Ing. Residente
Herramienta y Equipo: Equipo de Computo.
Condiciones Climáticas: Seco
Actividades Realizadas:
Continúa logistica de cotizaciones para insumos, mano. de Obra, Herramienta y Equipo, Alquiler de Bodegas, además de la Consolidación del balance económico y el cronograma del proyecto.

Residente de Obra. Nicolas Gomez O
Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 04 de Enero de 2024, Jueves
Personal de Obra: Ing Residente, Profesional SST, 2 Ayudantes
Personal de Interventoría: Ing. Residente.
Herramienta y Equipo: Equipo de Computo, Herram. Manu
Condiciones Climáticas: Seco. de 07:00 a.m a 05:00 p.m.
Actividades Realizadas:
Se coordina visita de topografo de tal manera que verifique en sitio el area de intervención del proyecto y así establecer los parametros del cerramiento perimetral en tela verde para delimitar el área del proyecto, una vez ya establecida se procede a hacer las excavaciones para instalación de guadua en los espacios definidos
Se adelanta las visitas a las viviendas aledañas al proyecto con el fin de hacer el levantamiento de las Actas de Vecindad y establecer así las condiciones actuales de dichas Viviendas
Continúa Consolidación del balance economico y Cronograma del proyecto y se hace revisión de las cotizaciones presentadas para el inicio de labores de campo
Se coordina alquiler de Bodega

Residente de Obra. Nicolas Gomez O
Interventoria Consorcio Grupo 3

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

4

FECHA: 05 de Enero de 2024, Viernes
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 2 Ayudantes
Personal de Interventoría: Ing. Residente.
Herramienta y Equipo: Equipo de Cómputo, herram. Menor.
Condiciones Climáticas: Seco. de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.
Actividades realizadas:
Se almuerza levantamiento de las Actas de Vecindad
Continuan excavaciones y se inicia la instalación de guadas para el cerramiento perimetral y delimitación del área de intervención del proyecto
Se revisan cantidades con interventoría para continuar con el balance económico, pendiente validación de los mismos, se identifica un parte que debe ser trasladado

Residente de Obra. Nicolas Gomez O
Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 06 de Enero de 2024, Sábado
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 2 Ayudantes, Comisión Topográfica (Topografo, Cadenero)
Personal de Interventoría: Ing. Residente.
Herramienta y Equipo: Equipo de Topografía, herram. Menor
Condiciones Climáticas: Seco de 09:00 a.m a 12:00 m.
Actividades realizadas:
Se avanza con la visita del topografo y su comisión con su respectivo equipo con el fin de verificar las coordenadas de terreno y así adelantar la información pertinente para la localización y replanteo, la instalación de los niveles de terreno, y la colocación de los ejes del proyecto, de igual manera entablar cotas de excavación y relleno y obtención de los volumenes de movimiento de tierra requerido para el proyecto.
Se instala malla cerramiento, tela verde delimitando así las áreas de intervención del proyecto
Continua verificación de Cantidades para balance económico

Residente de Obra. Nicolas Gomez O
Interventoria Consorcio Grupo 3

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

5

FECHA: 07 de Enero de 2024, Domingo — Nicolas Gomez O (Int. Consorcio Grupo 3)
No se programan Actividades por día dominical.

FECHA: 08 de Enero de 2024, Lunes Festivo
No Se programan Actividades por día Festivo
Nicolas Gomez O
Residente de Obra — Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 09 de Enero de 2024, Martes.
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, Maestro
Personal de Interventoría: Ing. Residente.
Herramienta y Equipo: Equipo de Cómputo Otros: Seco
Actividades desarrolladas:
Se hace recorrido de Obra con el maestro designado con el fin de hacerle presentación del proyecto y definir las labores a ejecutar.
Se hace presentación del Cronograma del proyecto
Se coordina con la comisión Topografica para hacer implantación en sitio del área de intervención.
Continúa verificación de cantidades del balance económico
Nicolas Gomez O
Residente de Obra — Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 10 de Enero de 2024, Miercoles
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro 1 Oficial, Comisión Topografica (Topografo Cadenero)
Personal de Interventoría: Ing. Residente
Herramienta y Equipo: Herramienta Menor
Actividades desarrolladas:
Se inicia con la comisión topografica, el maestro y el oficial la localización y replanteo del proyecto con la información tomada el día Sabado 06 de Enero de 2024 luego implantación de las áreas de intervención, posteriormente se instalan los niveletas para establecer las cotas de excavación y relleno y la determinación de los respectivos Volumenes, terminó se

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

6

colocan los ejes definidos en el proyecto y se demarca con cal el área de inicio de descapote. inicialmente con esta actividad en horas de la tarde

Condiciones Climaticas: Seco de 07:00 a.m a 04:30 p.m, Siendo las 04:30 se da inicio un Vendaval ocasionando lluvias fuertes las cuales se fueron aminorando hasta las 06:00 p.m., donde continuó con clima seco

Nicolas Gomez O
Residente de Obra — Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 11 de Enero de 2024, Jueves
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro, 2 Oficiales, 1 Ayudante
Personal de Interventoría: Ing. Residente
Herramienta y Equipo: Herramienta Menor
Actividades desarrolladas:
Continúa el descapote manual del area de intervenciones y se instalan los puentes guías de los ejes del proyecto esta actividad se desarrolla durante todo el día, se hace programacion con retroexcavadora para inicios excavaciones y se coordina con volqueta para retiro del material excavado el cual debe ser dispuesto en un botadero certificado.
Condiciones Climáticas: Seco de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.

Nicolas Gomez O
Residente de Obra — Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 12 de Enero de 2024, Viernes.
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro 2 Oficiales, 1 Ayudantes, Operario retro y Volquetas
Personal de Interventoría: Ing. Residente
Herramienta y Equipo: Retroexcavadora, herramienta Menor
Actividades desarrolladas:
Llega a Obra la retroexcavadora la cual da inicio a las excavaciones del area de trabajo entre ejes A-F (1-17) acorde a lo definido en el plano del proyecto

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

y posteriormente se hace retiro de material excavado en volqueta a botadero certificado, se solicita que una vez se culmine la actividad se expida el certificado de disposición, esta actividad es desarrollada en este día, por su parte el personal se encarga de verificar que no se presenten sobre excavaciones, acorde a los plasmados por el topógrafo en los niveles estas también se encargan de recordigomes el cumplimiento parametral todo vez que se vio afectado con el vendaval del día 10 de Enero de 2024; se suspendieron actividades por lluvias.
Condiciones Climáticas: Seco de 07:00 a 01:45 p.m, siendo la 01:45 p.m hasta las 02:10 p.m. se presentaron lluvias fuertes y entre las 02:10 p.m y 03:20 p.m se presentaron lluvias leves, esto ocasionó que se suspendieran actividades toda vez que el botadero no presentaba buenas condiciones para seguir recibiendo material.

Nicolas Gomez O
Residente de Obra. Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 13 de Enero de 2024, Sabado
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro, 2 Oficiales, 1 Ayudante, Operarios retro y Volqueta
Personal de Interventoría: Ing. Residente.
Herramienta y Equipo: Retroexcavadora, 2 Volquetas, herram. Menor
Actividades desarrolladas:
Continúa la excavación y retiro de Sobrantes del área de trabajo, disponiendo material en botadero certificado
Continúa verificación de niveles de excavación
Llega a Obra el geotextil tejido
La excavación finaliza siendo las 11:10 a.m.
Condiciones Climáticas: Seco de 07:00 a.m a 12:00 m.

Nicolas Gomez O
Residente de Obra Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 14 de Enero de 2024
No se programan actividades por día dominical
Residente Obra.

8

FECHA: 15 de Enero de 2024, Lunes.
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro
2 Oficiales, 2 Ayudantes.
Personal de Interventoría: Ing. Residente
Herramienta y Equipo: Herramienta Menor.
Actividades desarrolladas:
Se adelanta perfilación de áreas excavadas y se disparan terrenos del área de canal toda vez que acorde a los planos se tiene contemplado un contenedor de raíces debajo de este como se muestra en la siguiente figura en concreto ciclopeo en ejes A y F:



Se inicia excavaciones para contenedor de raíces
Condiciones climáticas: Seco de 07:00 a.m. a 05:00 p.m

Residente de Obra — Nicolas Gomez O, Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 16 de Enero de 2024, Martes
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro,
2 Oficiales, 2 Ayudantes.
Personal de Interventoría: Ing. Residente
Herramienta y Equipo: Herramienta Menor
Actividades desarrolladas:
Continúan las excavaciones para contenedor de raíces en los ejes A y Eje F acorde a lo definido en los planos del proyecto
Condiciones Climáticas: Seco de 07:00 a.m a 05:00 p.m.

Residente Obra — Nicolas Gomez O, Interventoria Consorcio Grupo 3

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

9

FECHA: 17 de Enero de 2024, Miercoles,
Personal de Obra: Ing. Residente, profesional SST, 1 Maestro
2 Oficiales, 5 Ayudantes
Personal de Interventoría: Ing. Residente
Herramienta y Equipo: Herramienta Menor
Condiciones Climáticas: Seco de 07:00a.m a 05:00p.m.
Actividades desarrolladas
Continuón excavaciones para contenedor de raices en el eje A y en el Eje F acorde a lo obtenido en el plano del proyecto, se vinculan 3 ayudantes mas para apoyar el desarrollo de la actividad.

Nicolas Gomez O
Ing. Residente de Obra. Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 18 de Enero de 2024, Jueves.
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro
2 Oficiales, 5 Ayudantes.
Personal de Interventoria: Ing. Residente.
Herramienta y Equipo: Herramienta Menor
Condiciones Climáticas: Seco de 07:00a.m a 05:00p.m.
Actividades desarrolladas:
Continúan excavaciones para contenedor de raíces en el eje A y eje F con todo el personal dispuesto para esta actividad, se solicita a interventoría revisión de este ítem toda vez que no se ve necesario dado que no se tienen árboles cercanos y no hay previsto siembra de árboles, se sugiere cambio a Filtro francés, a lo que solicitan que se presente en el balance y ellos validaran la actividad.
Se cuenta con la visita de funcionarios de la secretaría de Planeación municipal y de la oficina de alumbrado público con el fin de revisar parte que requieran ser trasladado toda vez que este no está incluido dentro del proyecto, puesto que fue instalado días después del proceso de formulación del proyecto, el encargado del área de alumbrado público solicita reducción del

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

10

Componente técnico eléctrico del proyecto para que este sea revisado y validado por la entidad toda vez que ellos serían los encargados del mantenimiento una vez se haga entrega al municipio, además que se debe verificar que se cumplan con los requerimientos normativos; por su parte los funcionarios de la secretaría de planeación solicitan urgente la socialización del proyecto a la entidad en aras de conocer los alcances de la Obra, además solicitan que se estudie la posibilidad de incluir dentro del cerramiento y una posible ampliación de un área de andenes, que si bien están demarcados en los planos, no está en el presupuesto contractual a lo que se indicó que se plantearía ante interventoría la solicitud.

Nicolas Gomez O
Residente de Obra. Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 19 de Enero de 2024, Viernes
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro, 2 Oficiales, 5 Ayudantes
Personal de Interventoría: Ing. Residente
Herramienta y Equipo: Herramienta Menor
Condiciones Climáticas: Seco de 07:00 a.m a 05:00 p.m.
Actividades realizadas:
Continuan excavaciones manuales para contención de raices en los ejes A y Eje F por debajo de la cota definida en el proyecto, la actividad se desarrolla en el transcurso del día.

Nicolas Gomez O
Residente de Obra. Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 20 de Enero de 2024 Sábado
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro, 2 Oficiales, 5 Ayudantes
Personal de Interventoría: Ing. Residente.

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024


Herramienta y Equipo: Herramienta Menor, Pala
Condiciones Climáticas: Seco de 07:00 a.m a 05:00 p.m.
Actividades desarrolladas:
Llega rana a la Obra se inicia con la conformación de la superficie de subrasante del área excavada en la zona de implantación del proyecto y previo a la instalación del geotextil.
Continúan excavaciones de contenedores de raíces en el eje A y eje F debajo de la zona de Canal

Residente de Obra — Nicolas Gomez O
Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 21 de Enero de 2024, Domingo
No se programan actividades por día dominical

Residente de Obra

FECHA: 22 de Enero de 2024, Lunes
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, Maestro
2 Oficiales, 5 Ayudantes
Personal de Interventoria: Ing. Residente
Herramienta y Equipo: Pala, Herramienta Menor
Condiciones Climáticas: Seco de 07:00 a.m a 05:00 p.m.
Actividades desarrolladas:
Continúa conformación de subrasante en el área excavada con rana al interior de la zona de implantación del proyecto y se inicia con la instalación de geotextil en el área intermedia entre subrasante y relleno con roca suelta acorde a los planos de la siguiente manera



La instalación de dicho geotextil permite mejoramiento de terreno

Residente de Obra. — Nicolas Gomez O
Interventoria Consorcio Grupo 3

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

12

FECHA: 23 de Enero de 2024, Martes
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro, 2 Oficiales, 5 Ayudantes.
Personal de Interventoría: Ing. Residente
Herramienta y Equipo: Pala, Herramienta Menor.
Actividades desarrolladas
Se termina Conformación de subrasante con roca al interior del área de implantación del proyecto
Se termina colocación de geotextil tejido en el área de implantación del proyecto previo a la instalación de roca muerta de tal manera que se mejore las propiedades mecánicas del suelo, de la superficie de apoyo
Llega a Obra material de roca muerta e inicia proceso de extendido de este material en capas de 10 cm el cual se compactará hasta alcanzar los 30 cm que se tiene contemplado en el proyecto.
Condiciones Climaticas: Seco de 07:00 a.m a 05:00 p.m.

Nicolas Gomez O
Residente de Obra. Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 24 de Enero de 2024, Miércoles
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro, 2 Oficiales, 5 Ayudantes
Personal de Interventoría: Ing. Residente
Herramienta y Equipo: Pala, Herramienta Menor
Actividades desarrolladas:
Continúa extendido de roca muerta hasta alcanzar capa de 10 cm posteriormente inicia compactación de primera capa de material, esta actividad se desarrolla en el día
Condiciones Climaticas: Seco de 07:00 a.m a 05 p.m.

Nicolas Gomez O
Ing. Residente de Obra Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 25 de Enero de 2024, Jueves
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro 2 Oficiales, 5 Ayudantes.

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

Personal de Interventoría: Ing. Residente
Herramienta y Equipo: Herramienta Menor, Rana.
Actividades desarrolladas
Continúa llegada de material, extendido y compactación de material de relleno tipo Roca Muerta en el área de implantación del proyecto de Gimnasio al aire libre entre ejes A-F(1-17) sin contemplar el espacio ocupado por los canales a construir, en eje A y eje E.
Esta actividad se desarrolla en el transcurso del día.
Condiciones Climáticas: Seco de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.

Nicolas Gomez O
Residente de Obra. Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 26 de Enero de 2024.
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro, 2 Oficiales, 5 Ayudantes
Personal de Interventoría: Ing. Residente.
Herramienta y Equipo: Rana, Herramienta Menor
Actividades desarrolladas:
Continúa, llegada de material, extendido y compactación de material de relleno tipo Roca muerta en el área del proyecto entre ejes A-F(1-17) sin contemplar espacio ocupado por canales a construir en eje A y eje E
Esta actividad se desarrolla en el transcurso del día.
Condiciones Climáticas: Seco de 07:00 a.m a 05:00 p.m.

Nicolas Gomez O
Residente de Obra Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 27 de Enero de 2024
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro, 2 Oficiales, 5 Ayudantes
Personal de Interventoría: Ing. Residente
Herramienta y Equipo: Herramienta Menor, Rana
Actividades desarrolladas.
Continúa llegada de material extendido y compactación de material de relleno tipo Roca Muerta:

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-4469

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PV-INF01
PERIODO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

14

por capas de 10 cm hasta alcanzar los 30 cm definidos en el area de implantación del proyecto entre ejes (A-F)(1-17) sin contar el espacio ocupado por los canales a construir en el eje A y en el eje F.
Esta actividad se desarrollo en el transcurso del día.
Condiciones Climaticas: Seco de 07:00 a.m a 12:00 p.m

Residente de Obra. Nicolas Gomez O
Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 28 de Enero de 2024, Domingo
No se programan actividades por día Dominical

Residente de Obra


FECHA: 29 de Enero de 2024, Lunes
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro, 2 Oficiales, 4 Ayudantes
Personal de Interventoría: Ing. Residente
Herramienta y Equipos: Pala, Herramienta Menor
Actividades desarrolladas:
Continúa llegado de material, extendido y compactación para relleno con Roca Muerta por capas hasta alcanzar los 30 cm definidos en el proyecto en el espacio donde se construirá las placas del gimnasio al aire libre, sin contar los espacios ocupados por los canales en el eje A y eje F.
La actividad se desarrolla en el transcurso del día
Se inicia la configuración y nivelación de terreno ejes (A-F)(1-4), humedeciendo el material instalado
Condiciones Climaticas: Seco de 07:00 a.m a 05:00 p.m.

Residente de Obra. Nicolas Gomez O
Interventoria Consorcio Grupo 3


FECHA: 30 de Enero de 2024, Martes
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro, 2 Oficiales, 6 Ayudantes.
Personal de Interventoría: Ing. Residente.

Herramienta y Equipo.: Pana, Herramienta Menor
Actividades desarrolladas:
Continúa llegada de material, extendido y compactación para relleno con Roca Muerta hasta alcanzar 30cm. de fondo en el proyecto, en el área donde se construirá las placas del gimnasio al aire libre.
Continúa configuración y nivelación de terreno, se avanza en ejes (A-F)(4-8) humedeciendo material instalado y se hace excavaciones para cumplir con las alturas detalladas en planos y pasteros previstos para bordillo de confinamiento en el eje 4 acorde a lo detallado en los planos de diseño, los cuales se fundirán con las siguientes especificaciones:


BORDILLO



ACERO LONGITUDINAL



ACERO TRANSVERSAL



Residente de Obra — Nicolas Gomez O
Interventoria Consorcio Grupo 3
FECHA: 31 de Enero de 2024, Miercoles
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro 2 Oficiales, 7 Ayudantes.
Personal Interventoría: Ing. Residente.
Herramienta y Equipo: Pana, Herramienta Menor
Condiciones Climaticas: Seco de 07:00a.m a 05:00p.m.
Actividades desarrolladas.
Continúa relleno con roca muerta compactado área bajo gimnasio
Continúa Nivelación y configuración de terreno eje (A-F)(B-10).
Llego Cemento a Obra
Residente de Obra. — Nicolas Gomez O Interventoria Consorcio Grupo 3

11 EQUIPOS Y MAQUINARIA EMPLEADOS

Relación de equipos empleados en la ejecución de la obra.

Para el periodo comprendido entre el 28 de diciembre de 2023 y el 31 de enero de 2024 en el frente 1 se cuenta con la siguiente relación de maquinaria y equipos empleados:

EQUIPO	PROGRAMADO		UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Estación Total	6/01/2024	10/01/2024	x		x	Área de construcción Gimnasio al aire libre	Localización y Replanteo	
Prisma para estación total	6/01/2024	10/01/2024	x		x	Área de construcción Gimnasio al aire libre	Localización y Replanteo	
Retroexcavadora	12/01/2024	13/01/2024	x		x	Área de construcción Gimnasio al aire libre	Excavación y cargue de material	
Volquetas	13/01/2024	13/01/2024	X		X	Área de construcción Gimnasio al aire libre	Retiro de material de excavación	
Rana	20/01/2024	31/01/2024	x		x	Área de construcción Gimnasio al aire libre	Conformación de subrasante, Compactación de roca muerta y nivelación de terreno	

12 INFORME SST

Informe SST realizado por personal SST

Se presenta anexo al presente informe.

INFORME SISO

CONSORCIO PARQUES VALLE
PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES. GRUPO 1. FRENTE 1. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI- DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1. FRENTE 3. ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DECALI - VALLE DEL CAUCA.
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETO DE CONTRATO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES. GRUPO 1. FRENTE 1. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI- DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1. FRENTE 3. ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DECALI - VALLE DEL CAUCA.

SITEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PERIODO MES DE ENERO 2024

CONSORCIO PARQUES VALLE
PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES. GRUPO 1. FRENTE 1. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI- DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1. FRENTE 3. ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DECALI - VALLE DEL CAUCA.
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo es actualmente una de las herramientas de gestión más importantes para el mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores en una organización, es ampliamente utilizada en todos los sectores, generando grandes beneficios como prevención de enfermedades laborales, ambientes sanos de trabajo y disminución de costos generados por accidentes; es muy efectiva cuando está centrada en la generación de una cultura de seguridad engranada con productividad, desarrollo del talento humano, gestión de calidad, mejoramiento de procesos y condiciones adecuadas de puestos de trabajo.

El propósito fundamental de la Interventoría es verificar el diseño e implementación del SGSST en la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con la normatividad legal vigente con el propósito fundamental de preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los colaboradores con el fin de evitar la ocurrencia de incidentes de trabajo (IT), accidentes de trabajo (AT) y enfermedades laborales (EL); de acuerdo a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. ASPECTOS GENERALES

3. OBJETIVO GENERAL

Registrar las actividades realizadas durante el mes de septiembre, garantizando la integridad física y mental de los empleados encargados de ejecutar las labores propias de la actividad contratada por el contratista, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Velar por el cumplimiento de las condiciones de seguridad requeridas durante la ejecución del contrato por parte de todo el personal.
- Realizar seguimiento a los de riesgos a los que se expone el personal de obra en el transcurso del periodo evaluado.
- Cumplir con las actividades programadas, planteadas y establecidas en el cronograma de actividades del SG-SST de obra.

Higiene industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificación a la evaluación y al control de los agentes y factores del ambiente de trabajo que pueden afectar la salud de los trabajadores.

Seguridad industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificación y control de las causas de los accidentes de trabajo.

Medicina del trabajo: Es el conjunto de actividades médicas y paramédicas destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad Laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones psico-biológicas.

Salud ocupacional: Se entenderá en adelante como Segundad y Salud en el Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servidos temporales que se encuentren en misión.

7. REFERENCIA LEGAL

Se citarán algunas normas, reglamentos y decretos colombianos que constituyen el marco legal de la seguridad y salud en el trabajo y su conocimiento. Estas permitirán que CONSORCIO PARQUES VALLE se oriente y desarrolle acciones establecidas en ellas.

Ley 9 de 1979, del Ministerio de salud, código sanitario nacional por la cual se dictan las disposiciones generales de salud ocupacional.

Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Protección Social, establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Decreto 614 de 1984 del Ministerio de Protección Social. Determina las bases legales para la organización y administración de la salud ocupacional en el país.

Resolución 2013 de 1986 del Ministerio de Protección Social. Reglamenta la organización y funcionamiento del comité paritario de salud ocupacional.

Resolución 1016 de 1989 del Ministerio de Protección Social. Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben implementar todos los patrones y empleadores.

Decreto ley 1295 de 1995 del Ministerio de Protección Social, determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales.

Resolución 1075 de 1992 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Los empleadores públicos y privados, incluirán dentro de las actividades del subprograma de medicina Preventiva, establecido por la resolución 1016 de 1989, campañas específicas tendientes a fomentar la prevención y el control de la fármaco-dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo dirigidas a sus trabajadores.

Resolución 1401 de 2007 del Ministerio de Protección Social, reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de Protección Social, reglamenta registro historias clínicas ocupacionales.

Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de Protección Social, establece disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y

LEY 1010 DE 2006: Acoso laboral, "Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo."

RESOLUCION 1443 de 2014: Por la cual se adopta el Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos y Registros, así como el Proceso de Evaluación de Desempeño.

DECRETO 1443 DE 2014: Por la cual se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

DECRETO 1477 DE 2014: Por la cual se reglamenta la tabla de enfermedades laborales.

DECRETO 1607 DE 2002: Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales.

RESOLUCION 2844/2007: Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional basadas en la Evidencia.

RESOLUCION 0312 DE 2019. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de. Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

RESOLUCION 4272 DE 2021. Requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.

8.2 REPORTE DE NOVEDADES (AT- EL- EG - IT)

TIPO DE ATENCION	CONTRATISTA	SUBCONTRATISTA	VISITANTES (Comunidad, visitantes del proyecto)	TOTAL
Accidente de trabajo				0
Incidente de Trabajo				0
Enfermedad Laboral				0
Accidente o Enfermedad de Origen Común				0
TOTAL	0	0	0	0


8.3 CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS

INDUCCIÓN SST A PERSONAL

Al ingreso del personal para laborar en el proyecto, de parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, socializa los deberes, obligaciones y responsabilidades que se debe cumplir según el Sistema de Gestión de Seguridad en el trabajo donde se especifica los factores de riesgos, y demás parámetros correspondientes delsistema de seguridad según el plan de inducción, se adjunta la evidencia fotográfica.

.

8.4 PAUSAS ACTIVAS

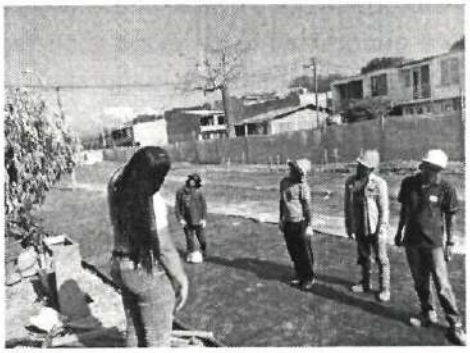FOTO	FOTO
	

8.5 CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION

SE REALIZA UNA DESCRIPCION DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ACTUALES DE CADA OBRA EN TEMAS DE CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION

FOTO	FOTO
	

CONSORCIO PARQUES VALLE
PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES. GRUPO 1. FRENTE 1. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI- DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1. FRENTE 3. ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DECALI - VALLE DEL CAUCA.
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

8.9 INSPECCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS (No se realizaron para el periodo)

TIPO DE INSPECCIÓN						
Máquinas y equipos	**Herramientas**	**EPP**	**Áreas de trabajo**	**Sustancias Químicas**	**Trabajos de alto riesgo**	**Elementos de emergencia**

8.10 GESTION TRABAJOS DE ALTO RIESGO

ACTIVIDAD REALIZADA	TIPO DE TAREA DE ALTO RIESGO			
	T. Alturas	T. Caliente	T. Excavación	Otros cual
No aplica para el periodo				

8.11 ACTIVIDADES EN OBRA (REGISTRO FOTOGRAFICO)





FORMULARIO VIA WEB

223

I. DATOS DEL TRÁMITE — Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

1. TIPO DE TRÁMITE	2. TIPO DE AFILIACIÓN	3. RÉGIMEN
A. AFILIACIÓN [✓] B. REPORTE DE NOVEDADES [ ]	A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia [✓] b) Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]	C. Contributivo [✓] S. Subsidiado [ ]

4. TIPO DE AFILIADO	5. TIPO DE COTIZANTE	CÓDIGO	FECHA DE LA SOLICITUD
CO Cotizante [✓] CF Cabeza de Familia [ ] BE Beneficiario [ ]	A. Dependiente [✓] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]		24 DIA 01 MES 2024 AÑO

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
ospina	garcia	heber	

7. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	8. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	9. SEXO	10. FECHA NACIMIENTO
RC TI [✓] CE PA CD SC	7549947	F [✓] M	04 DIA 12 MES 1965 AÑO

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. ORIGEN ETNICO	12. DISCAPACIDAD	13. PUNTAJE Y NIVEL DEL SISBEN	14. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL	15. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Código	Tipo F N M — Condición T P			

16. ADMINISTRADORA DE PENSIONES	17. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN - IBC	18. UBICACIÓN O DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	ZONA	LOCALIDAD / COMUNA	BARRIO
	1300000	mz 49 casa 16 kr 1	U. [✓] R. [ ]		

CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO FIJO	TELÉFONO MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	CÓDIGO IPS
la tebaida	quindio		3135718363		11822

IV. DATOS DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos de identificación del beneficiario (Conyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

19. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

20. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	21. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	22. SEXO	23. FECHA NACIMIENTO	CÓDIGO IPS
TI CC CE PA CD		F M	DIA MES AÑO	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	25. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	26. NÚMERO DE IDENTIDAD	27. SEXO	28. FECHA DE NACIMIENTO	29. PARENTESCO	30. ETNIA	31. DISCAPACIDAD Tipo	31. DISCAPACIDAD Condición
1				F M	DIA MES AÑO			F. N. M.	T. P.
2				F M	DIA MES AÑO			F. N. M.	T. P.
3				F M	DIA MES AÑO			F. N. M.	T. P.
4				F M	DIA MES AÑO			F. N. M.	T. P.

	32. DATOS DE RESIDENCIA Ciudad / Mpio.	Departamento	Zona	Teléfono Fijo	Teléfono Móvil	33. VALOR UPC AFILIADO ADICIONAL (Lo diligencia la EPS)	34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud (IPS)	NIVEL DE SISBÉN	GRUPO POBLACIONAL
1			R. U.					I. II.	
2			R. U.					I. II.	
3			R. U.					I. II.	
4			R. U.					I. II.	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o Razón Social	36. Tipo documento de identidad	37. Número documento de identidad	DV	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones
reestructuramos tus espacios	CC CE PA CD [✓]	901204712		

39. UBICACIÓN O DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO FIJO	TELÉFONO MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO
KR 3 12 50 PS 3	cartago	valle		3005707474	

FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL	CARGO	SALARIO
10 DIA 01 MES 2024 AÑO	AUXILIAR	1300000

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. TIPO DE NOVEDAD

1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN	[ ]	8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES	[ ]
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN	[ ]	9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR	[✓]
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD	[ ]	10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO	[ ]
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS	[ ]	11. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS	[ ]
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCION EN LA EPS Código [ ]	[ ]	12. DESVINCULACION A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS	[ ]
6. REINSCRIPCIÓN EN LA EPS	[ ]		
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES	[ ]		

13. MOVILIDAD A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	[ ]
B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	[ ]
14. TRASLADO A) MISMO RÉGIMEN	[ ]
B) DIFERENTE RÉGIMEN	[ ]
15. REPORTE DE FALLECIMIENTO	[ ]
16. REPORTE DEL TRAMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE	[ ]
17. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO	[ ]
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO	[ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO	FECHA NACIMIENTO
RC TI CC CE PA CD SC		F M	DIA MES AÑO

42. FECHA (a partir de)	43. EPS ANTERIOR Código	44. MOTIVO DE TRASLADO Código	45. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES
DIA MES AÑO			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Declaración Juramentada de convivencia: Declaro que convivo con afiliad Señor(a) _____ identificado(a) con _____ No. _____ desde el día _____ del mes _____ de año _____

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mi. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad. [ ]
49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la Historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]

VIII. FIRMAS

54. Firma de cotizante, cabeza de familia o beneficiario

55. Firma y sello del representante legal o delegado para la afiliación colectiva, institucional o de oficio

REESTRUCTURAMOS TUS ESPACIOS S.A.S
NIT 901204712-0

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ]
Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total [ ]

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

ARL | sura

Medellín, 24 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de REESTRUCTURAMOS TUS ESPACIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000005 MAESTROS Y AYUDANTES DE OBRA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C7549947	OSPINA GARCIA HEBER	25/01/2024		z76439IE	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/01/2024 16:51:11 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.0.16.4, 192.230.104.7, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 24 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de REESTRUCTURAMOS TUS ESPACIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000005 MAESTROS Y AYUDANTES DE OBRA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C7554850	GUTIERREZ GARCIA SILVIO	25/01/2024		19712531	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/01/2024 16:47:14 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.0.16.4, 192.230.104.7, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NUMERO DE RADICADO : 4815700

EPS Sanitas

Nuestro compromiso es contigo

Ciudad, 25 ENERO 2024

Señores

EPS Sanitas

Ciudad

Referencia: Solicitud Radiación Novedades Masivas

Respetados,

Por medio de la presente solicitamos realizar trámite de novedad a cargo del empleador identificado como NIT 901204712-0, RESTRUCTURAMOS TUS ESPACIOS, para las personas que se detallan a continuación

N	Tipo Doc Empleado	No. Doc Empleado	Nombre Empleado	IBC	Fecha Ingreso Empresa	Fecha Retiro Si Aplica**	Dirección Residencia	Municipio / Departamento	# Celular	Correo electrónico
1	CC	1006288141	JUAN ANDRES OSPINA GUTIERREZ	1.300.000	10/01/2024		MZ 47 C 21 NUEVA TEBAIDA	ARMENIA QUINDIO	3312692893	andresospina2662@gmail.com
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

** La fecha de retiro aplica solamente para los casos en los cuales aún el usuario se encuentra activo en el sistema bajo el mismo empleador

Cordialmente

Mabel Peláez G

JOHANNA MABEL PELÁEZ GALLEGO

Auxiliar Administrativa

ARL | sura

Medellín, 24 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de REESTRUCTURAMOS TUS ESPACIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000005 MAESTROS Y AYUDANTES DE OBRA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1006288441	OSPINA GUTIERREZ JUAN ANDRES	25/01/2024		16211170	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/01/2024 17:09:19 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.0.16.4, 192.230.104.7, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

220

ARL | sura

Medellín, 24 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de REESTRUCTURAMOS TUS ESPACIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000005 MAESTROS Y AYUDANTES DE OBRA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C4479804	GUTIERREZ GARCIA GREGORIO	25/01/2024		24821614	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/01/2024 16:43:08 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.0.16.4, 192.230.104.7, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

221

SOS Servicio Occidental de Salud

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [x] 9.Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10.Terminación de relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de Documento de Identidad	Número de documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento
		F [ ] M [ ]	D D M M A A A A

42. Fecha	43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de Pensiones
17/01/2024			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [x] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [x] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [x] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios.
- [x] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución prestadora de servicios de salud.
- [x] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [x] 51. Autorización para que la EPS reporte información que se genere de la afiliación o del reporte de no novedades o la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [x] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [x] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

NO FIRMA	REESTRUCTURAMOS TUS ESPACIOS S.A.S NIT 901.208.719-4
54. Cotizante , cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador o [illegible] responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio.

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: [ ] Total: [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la superintendencia nacional de salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del Municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBÉN Número de ficha	Puntaje	Nivel	68.Fecha de radicación
					D D M M A A A A

69. Fecha de Validación D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número del documento de identidad	71.Firma del funcionario

OBSERVACIONES: INICIO LABORAL DEL EMPLEADO 17/01/2024, EL SEÑOR NO SABE FIRMAR, SE ANEXA LA CONTRASEÑA DONDE SE VERIFICA QUE NO FIRMA.

FIRC 006

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

ARL | sura

Medellín, 24 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de REESTRUCTURAMOS TUS ESPACIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000005 MAESTROS Y AYUDANTES DE OBRA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1112783291	BERNAL LONDOÑO JAUNER ENRIQUE	25/01/2024		19223523	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/01/2024 16:56:36 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.0.16.4, 192.230.104.7, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 24 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de REESTRUCTURAMOS TUS ESPACIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000005 MAESTROS Y AYUDANTES DE OBRA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1002593079	URREA GUTIERREZ JUAN PABLO	25/01/2024		26131239	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/01/2024 17:06:21 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.0.16.4, 192.230.104.7, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 24 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de REESTRUCTURAMOS TUS ESPACIOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000005 MAESTROS Y AYUDANTES DE OBRA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1112791922	RAMIREZ MORALES RICHARD JANOVER	25/01/2024		15717622	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/01/2024 17:01:42 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.0.16.4, 192.230.104.7, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO PARQUES VALLE
SISTEMA GESTION DE CALIDAD
PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES. GRUPO 1. FRENTE 1. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI- DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1. FRENTE 3. ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DECALI - VALLE DEL CAUCA

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

FECHA: 24/01/24	HORA DE INICIO: 10:00 am	HORA FINALIZACIÒN: 11:00 am	
FORMADOR	Diana Yorfady Restrepo		
TIPO	CAPACITACIÓN (X)	REUNION ( )	INDUCCION / REINDUCCIÓN ( )
TEMA DE CAPACITACIÓN	Conocer los riesgos su clasificación y la importancia de pausas activas.		

NOMBRE	ID TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
Juan Pablo Urrea	1.002.593.079	ayudante	
Jaiver Bernal	1.112.783.291	ayudante	"Ricbar
Richart Ramirez	1.112.791.922	ayudante	
Silvio Gutierrez	75.548.50	oficial	Silvio Gutierrez G
Heber Ospina	7549947	maestro	
Juan Andres Ospina	1.006.288.441	oficial	Juan Andres Ospina G.
Gregorio Gutierrez	4.479.804	ayudante	Gregorio G.
Jeferson Sanchez B.	1112129157	Ing. Residente	

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES VALLE

PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES. GRUPO 1. FRENTE 1. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI- DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1. FRENTE 3. ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DECALI - VALLE DEL CAUCA.

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETO DE CONTRATO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES. GRUPO 1. FRENTE 1. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI- DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1. FRENTE 3. ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DECALI - VALLE DEL CAUCA.

SITEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PERIODO MES DE ENERO 2024

1. INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo es actualmente una de las herramientas de gestión más importantes para el mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores en una organización, es ampliamente utilizada en todos los sectores, generando grandes beneficios como prevención de enfermedades laborales, ambientes sanos de trabajo y disminución de costos generados por accidentes; es muy efectiva cuando está centrada en la generación de una cultura de seguridad engranada con productividad, desarrollo del talento humano, gestión de calidad, mejoramiento de procesos y condiciones adecuadas de puestos de trabajo.

El propósito fundamental de la Interventoría es verificar el diseño e implementación del SGSST en la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con la normatividad legal vigente con el propósito fundamental de preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los colaboradores con el fin de evitar la ocurrencia de incidentes de trabajo (IT), accidentes de trabajo (AT) y enfermedades laborales (EL); de acuerdo a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. ASPECTOS GENERALES

3. OBJETIVO GENERAL

Registrar las actividades realizadas durante el mes de septiembre, garantizando la integridad física y mental de los empleados encargados de ejecutar las labores propias de la actividad contratada por el contratista, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Velar por el cumplimiento de las condiciones de seguridad requeridas durante la ejecución del contrato por parte de todo el personal.

Condiciones de trabajo y salud: Son el conjunto de factores relacionados con las personas y sus acciones, los materiales utilizados, el equipo o herramienta empleados y las condiciones ambientales que pueden afectar la salud de los trabajadores.

Higiene industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificación a la evaluación y al control de los agentes y factores del ambiente de trabajo que pueden afectar la salud de los trabajadores.

Seguridad industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificación y control de las causas de los accidentes de trabajo.

Medicina del trabajo: Es el conjunto de actividades médicas y paramédicas destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad Laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones psico-biológicas.

Salud ocupacional: Se entenderá en adelante como Segundad y Salud en el Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.

7. REFERENCIA LEGAL

Se citarán algunas normas, reglamentos y decretos colombianos que constituyen el marco legal de la seguridad y salud en el trabajo y su conocimiento. Estas permitirán que CONSORCIO PARQUES VALLE se oriente y desarrolle acciones establecidas en ellas.

Ley 9 de 1979, del Ministerio de salud, código sanitario nacional por la cual se dictan las disposiciones generales de salud ocupacional.

Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Protección Social, establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Decreto 614 de 1984 del Ministerio de Protección Social. Determina las bases legales para la organización y administración de la salud ocupacional en el país.

Resolución 2013 de 1986 del Ministerio de Protección Social. Reglamenta la organización y funcionamiento del comité paritario de salud ocupacional.

Resolución 1016 de 1989 del Ministerio de Protección Social. Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben implementar todos los patrones y empleadores.

Decreto ley 1295 de 1995 del Ministerio de Protección Social, determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales.

Resolución 1075 de 1992 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Los empleadores públicos y privados, incluirán dentro de las actividades del subprograma de medicina Preventiva, establecido por la resolución 1016 de 1989, campañas específicas tendientes a fomentar la prevención y el control de la fármaco-dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo dirigidas a sus trabajadores.

Resolución 1401 de 2007 del Ministerio de Protección Social, reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de Protección Social, reglamenta registro historias clínicas ocupacionales.

Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de Protección Social, establece disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y

LEY 1010 DE 2006: Acoso laboral, "Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo."

RESOLUCION 1443 de 2014: Por la cual se adopta el Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos y Registros, así como el Proceso de Evaluación de Desempeño.

DECRETO 1443 DE 2014: Por la cual se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

DECRETO 1477 DE 2014: Por la cual se reglamenta la tabla de enfermedades laborales.

DECRETO 1607 DE 2002: Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales.

RESOLUCION 2844/2007: Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional basadas en la Evidencia.

RESOLUCION 0312 DE 2019. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de. Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

RESOLUCION 4272 DE 2021. Requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.

10	Ayudante	Yeison Stiven Noreña Rendon	1.004.628.956	Vinculación Inicial	N/A

8.2 REPORTE DE NOVEDADES (AT- EL- EG - IT)

TIPO DE ATENCION	CONTRATISTA	SUBCONTRATISTA	VISITANTES (Comunidad, visitantes del proyecto)	TOTAL
Accidente de trabajo				0
Incidente de Trabajo				0
Enfermedad Laboral				0
Accidente o Enfermedad de Origen Común				0
TOTAL	0	0	0	0

8.3 CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS

De parte de seguridad y salud en el trabajo se socializa los deberes, obligaciones y deberes que se debe cumplir según el Sistema de Gestión de Seguridad en el trabajo donde se especifica los factores de riesgos, y demás parámetros correspondientes delsistema de seguridad según el plan de inducción.


Se dictó charla de seguridad sobre: Riesgos en las excavaciones.

CONSORCIO PARQUES VALLE
PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES. GRUPO 1. FRENTE 1. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI- DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1. FRENTE 3. ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DECALI - VALLE DEL CAUCA.
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


8.5 CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION

Para la adecuación de escenario deportivo barrio comuneros II, se realizó cerramiento con polisombra en todo el perímetro y cerramiento externo por la cancha de futbol, la cual es contemplada como zona de acopio de material proveniente de las excavaciones y acopio de materiales pétreos (grava y arena).

Debido a las excavaciones presentes en la obra, se dispone de cinta de precaución para delimitar la zona de tránsito dentro de la obra.

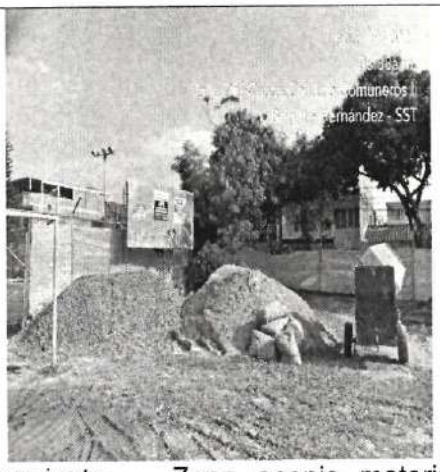

Cerramiento - Zona acopio materiales pétreos

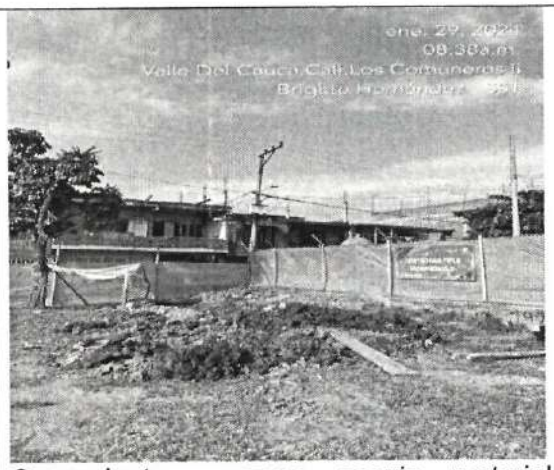

Cerramiento – zona acopio material proveniente de excavación



Cerramiento de obra.



Cerramiento de obra


CONSORCIO PARQUES VALLE
PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES. GRUPO 1. FRENTE 1. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI- DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1. FRENTE 3. ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DECALI - VALLE DEL CAUCA.
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO




LISTADO DE ASEO, ORDEN Y LIMPIEZA

No.	CEDULA	NOMBRE	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	94.412.727	Milton Cortes	X					
2	10.633.355	Noe Taquinas						
3	1.062.280.454	Yesic Campo		X				
4	16.460.100	Lucio German						
5	1.086.051.724	Alexis Cortes			X			
6	94.451.434	Evaristo Landaz						
7	1.004.628.956	Stiven Rendon				X		
8	12.798.381	Fredy Hurtado						
9	98.351.495	Hector Rosero					X	
10	1.192.965.443	Clay segura						
NOTA		La limpieza incluye: Baños, zona de almacen de herramientas y materiales, almacen de ropa (vestir)						

8.8 SERVICIOS DE BAÑO Y PUNTOS DE HIDRATACION

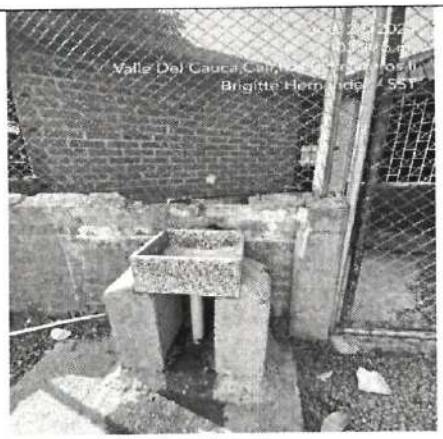


Punto para hidratación

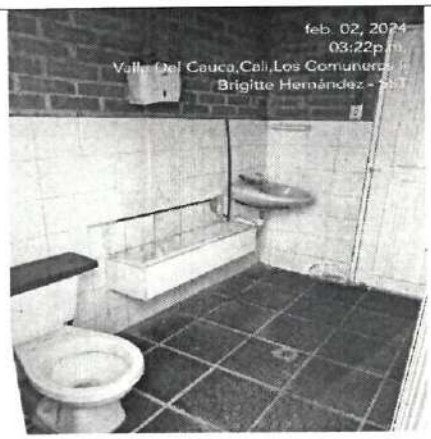

Servicio de Baños

asegurar el trabajador que se encuentra en la excavación como plan de rescate en caso de eventualidad.
Como método para la extracción de material de excavación se utiliza un sistema de polea con balde en la excavación en operación.

Se cuenta con dos motobombas para la extracción **diaria** de las aguas estancadas en las excavaciones de los caissons, para permitir la ejecución de las actividades y evitar la producción y proliferación de mosquitos.
No obstante, a pesar de que diariamente se realiza una evacuación de dichas aguas, estas se vuelven a presentar debido al nivel freático, y aguas propias del terreno acentuadas por las lluvias recientes.

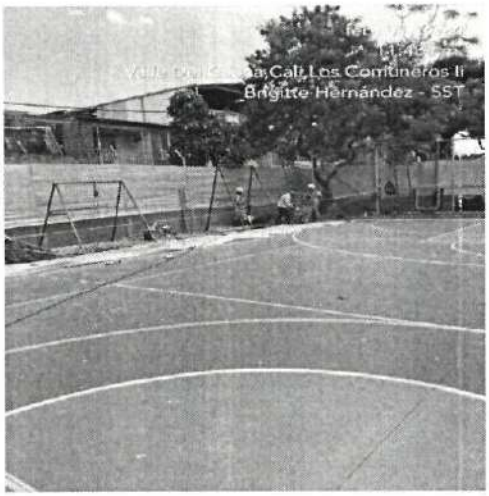

En conjunto con la interventoría se determina que a partir de los 2 metros de profundidad como procedimiento de trabajo seguro dentro de la excavación (espacio confinado) los trabajadores deben ingresar por medio de escaleras amarrada, con su respectivo arnes y anclados a un segundo sistema de polea con una línea de vida (cuerda), en caso de eventualidad, va a permitir el rescate del trabajador.

9. ANEXOS

CONSORCIO PARQUES VALLE
SISTEMA GESTION DE CALIDAD

PROYECTO: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES. GRUPO 1. FRENTE 1. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI- DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1. FRENTE 3. ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DECALI - VALLE DEL CAUCA

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

FECHA: 29/Enero/2029	HORA DE INICIO: 9:20 am	HORA FINALIZACIÒN: 9:40 am	
FORMADOR	Brigitte Hernandez – Inspector sst		
TIPO	CAPACITACIÒN	REUNION	INDUCCION / REINDUCCIÓN
TEMA DE CAPACITACIÓN	Importancia orden y aseo en la obra Uso de elemento de protección personal en la ejecución de las actividades Peligros y riesgos presentes en la Obra Prohibicion del uso de anillos, cadenas y demas accesorios de riesgo durante la ejecución de actividades.		

NOMBRE	ID TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
Jorge Segura	1192965443	Maestro	
Yeison estiven	1004628426	ayudante	Yeison
yesid campo	1062 280 454	ayudante	yesid
Evaristo	94451434	oficial	
Fabian Quintero	1144039291	Ing. Residente	

Powered by CamScanner

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PV

INDERVALLE

SEDE I PROYECTO: Comuneros II | SG-SST

DATOS DEL TRABAJADOR	EPP	P. CABEZA			P. PIES					P. INVERNAL		P. CORPORAL			P. MANOS							P. RESPIRATORIA					P. OJOS			P. AUDITIVA			EQUIPOS ESPECIALES				ROPA TRABAJO					OTRO.	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
		CASCO	CAPUCHÓN	GORRO	BOTAS CUERO SEGURIDAD	BOTAS CAUCHO SEG.	BOTAS DIELÉCTRICAS	POLAINAS	ZAPATOS/CALZADO	GABAN/PONCHO	CHAQ. Y PANT.	PETO CARNAZA	TRAJE PINTURA	PETO/OVEROL/CAUCHO	GUANTES CARNAZA	GUANTES VAQUETA	MANGAS SOLDADOR	GUANTES CAUCHO	GUANTES NYLON/NITRILO	GUANTES LATEX	GUANTES TELA	RESP. VAPORES ORGÁNICOS	RESP. HUMOS METÁLICOS	RESP. MATERIAL PARTICULADO	MASCARILLA DESECHABLE	TAPABOCAS	GAFAS SEGURIDAD	CARETA SOLDADOR	CARETA CONTRA IMPACTOS	COPA	INSERCIÓN	ENSAMBLE CASCO	ARNÉS	ESLINGAS	BARBIQUEJO	LÍNEA DE VIDA	CAMISA	JEAN/PANTALÓN	OVEROL	CHALECO			
Cley Segura	ME	1													1															1												14/01/24	
	CANT	1													1															1													
Milton cortes	ME	1				1									1											1	1			1												11/01/24	Milton
	CANT	1				1									1											1	1			1													
Evaristo londoño	ME	1																																							11/01/24	Evaristo S.
	CANT	1																																							
Yesi campo	ME	1				1									1											1	1			1												14/01/24	Yesid
	CANT	1				1									1											1	1			1													
Luis francisco	ME	1													1																											16/01/24	Germán Ucía
	CANT	1													1																											
Alexis Cortes	ME	1																																							14/01/24	
	CANT	1																																							
Hector rosero	ME	1				1									1												1				1										14/01/24	
	CANT	1				1									1												1				1											
Stiven Londoño	ME	1													1																											26/01/24	
	CANT	1													1																											
Fredy hurtado	ME	1													1																											26/01/24	Fred. H.
	CANT	1													1																											
Noe tapiros	ME																																							30/01/24	Noe
	CANT																																							
Milton	ME																																							
	CANT																																							
	ME																																							
	CANT																																							
	ME																																							
	CANT																																							
	ME																																							
	CANT																																							
	ME																																							
	CANT																																							

DEFINICIONES SOBRE MOTIVO DE ENTREGA (ME):

1. **ORDINARIA:** Entrega inicial o periodicidad establecida
2. **DESGASTE:** Reposición por desgaste del elemento
3. **DAÑO:** Reposición por daño del elemento
4. **PÉRDIDA:** Nueva entrega por pérdida del elemento

CANTIDAD (CANT): Número de EPP que se entregan.

Con la firma de este registro certifico que:

1. Recibí los elementos de protección personal señalados
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso.
4. Me comprometo a usarlo.
5. Me comprometo a mantenerlo en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlo

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901772637
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			CONSORCIO PARQUES DEL VALLE
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CL 3 OESTE 36 350	TELEFONO:	3113007
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			7913933308	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	enero AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO	2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/02/02	NUMERO AUTORIZACIÓN:			432765005

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	7	$ 561,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561,800	$ 0	$ 561,800
230201	230201- PROTECCION	1	$ 720,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 720,000	$ 0	$ 720,000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 152,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152,600	$ 0	$ 152,600
SUBTOTALES:										**$ 1,834,400**	**$ 0**	**$ 1,834,400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 62,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62,500	$ 0	$ 0	$ 62,500
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 19,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19,100	$ 0	$ 0	$ 19,100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 332,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332,100	$ 0	$ 0	$ 332,100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 26,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,000	$ 0	$ 0	$ 26,000
EPSIC3	EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 19,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19,100	$ 0	$ 0	$ 19,100
SUBTOTALES:													**$ 458,800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 458,800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 798,200	$ 798,200	$ 0	$ 0	$ 798,200
SUBTOTALES:									**$ 798,200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 798,200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	10	$ 458,800	$ 0	$ 458,800
SUBTOTALES:			**$ 458,800**	**$ 0**	**$ 458,800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **BRIGITTE ALEXANDRA HERNANDEZ IBARRA** identificado con **CC** No. **1143864182**, registra la siguiente información.

Datos de la Relación Laboral
Fecha de afiliación: 27/01/2024
Fecha de inicio de cobertura: 27/01/2024
Estado Afiliación: ACTIVO
Tipo Vinculación: TRABAJADOR INDEPENDIENTE VOLUNTARIO
Clase de Riesgo: 5
Cargo : AFILIACIÓN VOLUNTARIA

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401011572026.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 26 días del mes de enero de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

250

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **HERNANDEZ IBARRA BRIGITTE ALEXANDRA** identificado(a) con **CC** número **1.143.864.182** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 12 de septiembre de 2018 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.**

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 05 de febrero de 2024.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

20240205112900

EPS

sura

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL PBS DE EPS SURA

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. en desarrollo de su programa especial para la garantía del Plan de Beneficios en Salud denominado **EPS SURA**

CERTIFICA

Que **HECTOR FABIO ROSERO** identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANIA** número **98351495**, aparece registrado(a) en **EPS SURA** con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 98351495
NOMBRES Y APELLIDOS	HECTOR FABIO ROSERO
TIPO DE AFILIADO	TITULAR
PARENTESCO	TITULAR
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	TIENE DERECHO A COBERTURA INTEGRAL
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN	COBERTURA INTEGRAL
FECHA DE INGRESO A EPS SURA	11/09/2014
FECHA RETIRO EPS SURA	ACTIVO(A)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SURA	174
SEMANAS COTIZADAS ÚLTIMO AÑO	13
EMPLEADOR(ES)	NI 901248192 TRANSPORTES PASO FIRME LYD SAS DESDE 12/01/2024, NI 901443464 LOGISTICA Y TRANSPORTE DE YUMBO SAS DESDE 12/01/2024

DIRECCIÓN DE AFILIACIONES

Fecha de generación: **25/01/2024**

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS

ARL | sura

Medellín, 25 de Enero de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de LOGISTICA Y TRANSPORTE DE YUMBO SAS, en el centro de trabajo 0000000005 - RIESGO 5, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C94412727	CORTES CORTES MILTON	14/01/2024		5T822382	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C731980692402538222

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/01/2024 10:37:02 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.133.193.133, 192.230.104.12, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte de l trámite de protección al cedante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	1 2 0 1 2 0 2 4

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales..
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información adicional al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.

Viii. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio
Mitton Cortes	

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: Total: [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59 Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial al que declare la separación de cuerpos de escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad del bebeficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del depantamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario
[ ]		

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

ARL | sura

Medellín, 29 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SERVICIOS Y ASOCIADOS SEM PATIÑO SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000005 SERVICIO		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C10633355	TAQUINAZ IPIA NOE	30/01/2024		223e2418	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 29/01/2024 15:37:26 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.133.193.133, 192.230.104.12, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

255

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

NOE TAQUINAS IPIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **10.633.355**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Febrero del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

Empresa Solidaria de Salud
Emssanar
¡Siempre cerca de Usted!

ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD
EMSSANAR E.S.S CODIGO 118
RESOLUCIÓN 0150 FEB 22 DE 1996 SUPERSALUD
NIT. 814.000.337-1

No. de Radicación	Fecha de Radicación
	D D M M A A A A

I. DATOS DEL TRAMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo) Página 1 de 2

1. Tipo de Trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	A. Individual -Cotizante o Cabeza de Familia [X] -Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado	5.Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Cotizante [X] B. cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DEIDENTIFICACIÓN(del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
NOREÑA (Primer apellido)	RENDON (Segundo apellido)	YEISON (Primer nombre)	STIVEN (Segundo nombre)
7. Tipo de documento de identidad: CC	8. Número del documento de identidad: 1004628956	9. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X]	10. Fecha de nacimiento: 14/02/1997

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
	Tipo: F N M — Condición: T P		

15. Administradora de Riesgos Laborales -ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización -IBC
SURA	PORVENIR	1300000

18. Residencia	Teléfono fijo	Teléfono celular	Correo electrónico
CALLE 72 # 27B - 04	3106269	3106269246	LOGISTICATEAFILIO.COM@GMAI

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
CALI	Urbana [X] Rural [ ]	1	VALLE

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	23. Fecha de nacimiento: D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer apellido		bre	Segundo nombre	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					
	25. Tipo de documento de identidad	26. Núm		Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

RECIBIDO PARA ESTUDIO EPS
FECHA: 26/01/2024
GESTOR COMERCIAL
COD: C2424

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/ o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ETIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Numero del documento de identificación	38. Tipo de a portante o pagador pensiones (a registrar por la EPS)
SERVICIO Y ASOCIADOS SEM PATIÑO SAS	NIT	901249440-6	

39. Ubicación	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento
CALLE 11 # 59 - 22	3067792	seryasosempa@gmail.com	CALI	VALLE

254

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **NOREÑA RENDON YEISON STIVEN** identificado(a) con **CC** número **1.004.628.956** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 05 de noviembre de 2023 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.**

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 26 de enero de 2024.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

20240126104344

REPORTE DE NOVEDAD DE MOVILIDAD EN LA MISMA EPS.
TRABAJADOR DEPENDIENTE

Fecha: 15/01/2024

Señores:
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA
Popayán Cauca

Con la presente, nuestra empresa LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE YUMBO SAS, con NIT (sin digito de verificación) 901443464 solicita efectuar el proceso de registro de novedad de movilidad entre regímenes para ingresar el régimen Contributivo (x) o Subsidiado ( ) (*Marque con una (X) el régimen al cual desea afiliarse.)* De nuestro colaborador y su núcleo Familiar los cuales se encuentran actualmente activos en la Base de datos única de afiliados –BDUA en su entidad. A continuación se relaciona los principales datos del empleado.

Datos Empleado

TP_DOC	NUMERO DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
CC	1062280454	CAMPO	BURBANO	YESID	ALEXIS

TIPO DE SALARIO (marque con una X)			SALARIO BASE
Fijo (✓)	Variable ( )	Integral ( )	$ 1300000
Estado Civil: SOLTERO		**Ocupación:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Nivel educativo: SIN INFORMACION		**Fecha Ingreso a la Entidad** 12/01/2024	**Fecha Terminación Contrato**
Administrador de Riesgos: SURA		**Fondo de Pensión:** PORVENIR	
Dirección de Residencia: CALLE 43 # 15 - 21		**Ciudad:** CALI	
Localidad/Corregimiento: 1		**Barrio/Vereda:** CENTRO	
Teléfono Fijo: 3344954		**Teléfono Celular:** 3174956654	
Correo Electrónico empleado: LOGISTICATEAFILIO.COM@GMAIL.COM			
Sugiera una IPS de Atención cercana a su Residencia: (Opcional)			

preferiblemente digitados en Fuente Arial 10, para que la información sea legible.

260

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.
NIT 805.001.157 - 2
CERTIFICA:

El(la) señor(a) CLAY JORGE SEGURA CORTES , identificado(a) con CC 1192965443 se encuentra afiliado(a) en el Plan de Beneficios en Salud P.B.S. en la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. E.P.S., afiliado desde: 05/09/2008 y su estado de Afiliación a la fecha de generación este certificado es: ACTIVO por el Régimen CONTRIBUTIVO, en calidad de COTIZANTE

Su grupo familiar es:

Tipo de Documento	Número de documento	Nombre del afiliado	Estado de afiliación
CC	1192965443	CLAY JORGE SEGURA CORTES	VIGENTE
CC	1089539454	CLAUDIA MARINELA SEGURA GALLARDO	VIGENTE
CC	1143976616	JORGE ALEXANDER SEGURA GALLARDO	VIGENTE

Relación del histórico de afiliación y días pagados a la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A en el último año.

Tipo doc	Número de documento	Nombre del Cotizante	Tipo ID Empleador	NúmeroID Empleador	Razón Social	Período Cotización	Días Cotizados
CC	1192965443	CLAY JORGE SEGURA CORTES	NI	901360253	SERVINDUSTRIALES DEL PACIFICIO SAS	2023/01	4
CC	1192965443	CLAY JORGE SEGURA CORTES	NI	901588753	ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA R & R S.A.S.	2023/02	1
CC	1192965443	CLAY JORGE SEGURA CORTES				2023/03	27
CC	1192965443	CLAY JORGE SEGURA CORTES	NI	14963793	ARGEMIRO GIRON	2023/03	27
CC	1192965443	CLAY JORGE SEGURA CORTES				2023/04	10
CC	1192965443	CLAY JORGE SEGURA CORTES	CC	19161510	HENRY ARCE ARAGON	2023/04	15
CC	1192965443	CLAY JORGE SEGURA CORTES	NI	14963793	ARGEMIRO GIRON	2023/04	10
CC	1192965443	CLAY JORGE SEGURA CORTES	CC	19161510	HENRY ARCE ARAGON	2023/05	30
CC	1192965443	CLAY JORGE SEGURA CORTES	CC	19161510	HENRY ARCE ARAGON	2023/06	30
CC	1192965443	CLAY JORGE SEGURA CORTES	CC	19161510	HENRY ARCE ARAGON	2023/07	30
CC	1192965443	CLAY JORGE SEGURA CORTES	CC	19161510	HENRY ARCE ARAGON	2023/08	3

Para constancia de lo anterior se firma en la Ciudad de Santiago de Cali, a los VEINTICINCO (25) días del mes de ENERO del año 2024.

Información sujeta a verificación por parte de la EPS Servicio Occidental de Salud SOS S.A, "Esta información es propiedad privada del Ministerio de Salud y Protección Social."

Este documento no es válido como autorización de servicios o traslado entre EPS.

Atentamente,

Gerencia de Experiencia al Usuario

portal_webusr

CD3 5020480 Ene 25 2024 10:54AM

261

ARL | sura

Medellín, 25 de Enero de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de LOGISTICA Y TRANSPORTE DE YUMBO SAS, en el centro de trabajo 0000000005 - RIESGO 5, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C87020042	PAZ CARABALI CRISTOBAL	14/01/2024		2s18715I	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C731980692402538649

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/01/2024 10:44:09 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.133.193.133, 192.230.104.12, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

263

ARL | sura

Medellín, 25 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SERVICIOS Y ASOCIADOS SEM PATIÑO SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000005 SERVICIO		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C12798381	RODRIGUEZ HURTADO ELI FREDI	26/01/2024		91140N13	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/01/2024 21:03:24 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.86.52.29, 192.230.104.11, 172.16.42.57

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte de l trámite de protección al cedante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	2 6 0 1 2 0 2 4

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales..
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información adicional al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio
El: Rodriguez	26.06.

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: [ ] CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC

Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total: [ ]

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59 Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial al que declare la separación de cuerpos de escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad del bebeficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del depantamento	67. Datos del SISBÉN Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación D D M M A A A A	69. Fecha de validación D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad [ ]	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

ARL | sura

Medellín, 25 de Enero de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de LOGISTICA Y TRANSPORTE DE YUMBO SAS, en el centro de trabajo 0000000005 - RIESGO 5, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C94451434	LANDAZURI CAICEDO EVARISTO ANGELMIRO	14/01/2024		w1991992	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C731980692402538491

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/01/2024 10:41:31 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.133.193.133, 192.230.104.12, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

Emssanar SAS

Seguiremos Contigo

Toda certificación generada es almacenada en base de datos para su verificación, la modificación parcial o total de este documento puede incurrir en un delito.

ARL | sura

Medellín, 13 de January de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de LOGISTICA Y TRANSPORTE DE YUMBO SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000005 RIESGO 5		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1086051724	CORTES CASTAÑEDA FREYMAN ALEXIS	14/01/2024		18814312	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 13/01/2024 11:04:41 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 177.254.71.60, 192.230.104.8, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

268

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

FREYMAN ALEXIS CORTES CASTAÑEDA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.086.051.724**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 25 de Enero del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

No. de Radicacion SAT

Fecha de Radicación D D M M A A A A

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

I. DATOS DEL TRAMITE

1. Tipo de tramite	2. Tipo de Afiliacion	3. Regimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo
A. Afiliación ☐ B. Registro de Novedades ☑	A. Individual - Cotizante o cabeza de Familia ☑ - Beneficiario o afiliado adicional B. Colectivo ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐	A. Contributivo ☑ B. Subsidiado ☐	A. Cotizante ☑ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☑ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	(a registrar por la EPS)

A. AFILIACION II. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer Apellido: LUCIO	Segundo Apellido:	Primer Nombre: GERMAN	Segundo Nombre: FRACISCO

7. Tipo de documento de identidad	8. Numero del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	16460100	Femenino ☐ Masculino ☑	0 6 0 3 1 9 7 9

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
	Tipo ☐ Condición ☐			SURA	PORVENIR

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia				
1.300.000	CRA 47 # 49 - 54			3008574	3008574476
Dirección				Teléfono fijo	Teléfono celular
cortesclav36@gmail.com	CALI	Zona Urbana ☑ Rural ☐	1	VALLE	
Correo electrónico	Municipio		Localidad	Departamento	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Numero del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	D D M M A A A A

Datos básicos de identificacion de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Numero del documento de identidad	27. Sexo	28. Fecha de nacimiento
			Femenino / Masculino	D D M M A A A A
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

	31. Discapacidad			32. Datos de residencia			33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
	Tipo		Condición	Municipio / Departamento	Teléfono fijo	Teléfono celular	
	F	N	M	T	P				
B1									
B2									
B3									
B4									
B5									

RECIBIDO PARA ESTUDIO EPS
FECHA: 15 ENERO 2024
GESTOR COMERCIAL
COD: C2424

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Codigo de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Numero del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
SERVICIO Y ASOCIADOS SEM PATINO SAS	NIT	901249440-6	

39. Ubicacion				
CALLE 11 # 59 - 22	3067792	servasosempa@gmail.com	CALI	VALLE
Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio	Departamento

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación ☐ 3. Actualización del documento de identidad ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS ☐ Código ☐ 6. Reinscripción en la EPS ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 13. Movilidad A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado ☐ 14. Traslado A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen ☐ 15. Reporte de fallecimiento ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado ☐

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación				
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha novedad
		Femenino ☐ Masculino ☐	D D M M A A A A	1 5 0 1 2 0 2 4

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales. ☐
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. ☐
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. ☐
49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. ☐
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. ☐
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. ☐
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. ☐
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. ☐

VIII. FIRMAS

Firma del cotizante o Cabeza de familia o representante legal	Firma del funcionario que recibe la información
german lucio	k mendoza

IX. ANEXOS

56. Anexo: copia del documento de identidad: CN ☐ RC ☐ TI ☐ CE ☐ NS ☐ CR ☐ PAS ☐ CD ☐ Cantidad ☐ Total ☐

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. ☐
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. ☐
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. ☐
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. ☐
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. ☐
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. ☐
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. ☐
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. ☐
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. ☐

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del departamento	Número de la ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES

71. Firma del funcionario

VIGILADO Supersalud

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información reportada y de los documentos anexados, en el Capítulo VII del formulario.

cadenasa

- ORIGINAL ÚNICA -

270

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

GERMAN FRANCISCO LUCIO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **16.460.100**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 15 de Enero del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

BITÁCORAS

FRENTE – COMUNEROS
FRENTE – CARTAGO

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-ID-07-4469

Contrato de Obra: IND 23 ID 07 4469
Contratista: CONSORCIO PARQUES VALLE
Interventoría: Consorcio Grupo 3
Objeto Contractual: contratar por el sistema de precios fijos unitarios mejoramiento de escenarios deportivos y recreativos para los municipios de Cartago, el distrito de Buenaventura y el distrito especial de Cali en el departamento del Valle del Cauca, realizando la ejecución de los siguientes: " Grupo 1. Frente 1: Gimnasio al aire Libre y recabitos, urbanización La Colonia, municipio de Cartago - Valle del Cauca. Grupo 1. Frente 2: Adecuación de cerramiento - Barrio DECEPAZ, Distrito Especial de Cali. Departamento de Valle del Cauca. Grupo 1 Frente 3: Adecuación de escenario deportivo Barrio Comuneros 2. Municipio de Cali. Valle del Cauca.
Valor total del presupuesto $ 2.515.718.690
Origen del recurso: sistema general de regalías.

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-ID-07-4469

Nota #1 Fecha: 08 de enero de 2024

Actividades realizadas: se instala tela de cerramiento verde para aislamiento de las zonas a intervenir.
Tambien se realiza desmonte de bancas y dados en concreto.
Se realiza montaje de puerta de acceso en tuberia redonda y malla eslabonada hacia cancha sintética, esto teniendo en cuenta que la estructura de cubierta proyectada interfiere con la linea de movimiento de la puerta existente.
Se inician las demoliciones de andenes por medios manuales.

Nota #2 Fecha: 09 de enero de 2024

Actividades realizadas: se continua con las demoliciones de andenes por medio de equipos neumaticos. Se realiza acarreo de escombros para posterior disposición final al botadero (RCD). Se realiza replanteo de cimentación de la estructura tomando ejes longitudinal y transversalmente, para inicio de excavación manual de los caissons.

Nota #3 Fecha: 10 de enero de 2024.

Actividades realizadas: se continua con la excavación de los pilotes por medios manuales. hasta los dos (2) metros de profundidad medidos desde el nivel +/- 0.00 tomado como el NPT de la cancha en concreto. Se realiza transporte a botadero de escombros y tierra producto de excavaciones.

Nota #4 Fecha: 11 de enero de 2024

Actividades realizadas: se continua con la marcación de excavaciones para pilotes y "prebrocas" sobre el eje "2", de acuerdo a replanteo con topografía de eje A-G. En la excavación del pilote ubicado en la intersección 2-D se encuentra poste eléctrico en concreto reforzado el cual debe ser demolido pues interfiere con la estructura del pilote.

Nota #5 Fecha: 12 de enero de 2024

Actividades realizadas: En la continuación de las excavaciones de los pilotes ubicados en los ejes 2-A y 2-B se encuentra el nivel freático a una profundidad de -2,0 m medidos desde el nivel +/-0.00 ...

Cuenta con el N°1 de la malla multiple. Adicionalmente se encuentra en el borde de la viga de cimentación de las pantallas de protección en malla eslabonada.

Nota #6 Sábado 13 de enero de 2024
Actividades realizadas en sitio se construyan formaletas para construcción de anillos de contención de paredes de la excavación de los caissons. se continua con la excavación de caissons sobre el eje 2 hasta una profundidad de -2.00 m medidos desde el Nivel +/-0.00. Se realiza retiro de material de excavación hasta punto de acopio para posterior cargue y transporte hasta sitio de disposición final.

Nota #7 Fecha: Lunes 15 de enero de 2024
Actividades realizadas: se continuan mallas electrosoldadas para refuerzo de anillos de concreto reforzado se continua acarreo de material de excavación hasta punto de acopio para posterior retiro hasta sitio de disposición final. Se realiza limpieza de canalizaciones para evacuación de agua empozada en excavaciones. Se formaleta primer anillo en excavación de caisson 2D, donde se excavó para retiro de poste en concreto Posteriormente se funde concreto.

Nota #8 Fecha: Martes 16 de enero de 2024
Se profundiza excavación para caisson 2A hasta una profundidad de -3.00 m. Se recibe tubería de aguas activadas para conformación de vigas de amarre de cabezote

Nota #9 Fecha. Miercoles 17 de enero de 2024
Se profundiza excavación para caisson 2B hasta una profundidad de -3.00 m. Se inicia armado de refuerzo para caissons. Se realiza fundición de anillo en caisson 2A a una profundidad de -3m. Se inicia armado de vigas de amarre de cabezote con PTE 100x100

Nota #10 Fecha Jueves 18 de enero de 2024
Se realiza cerramiento provisional en lote verde de propileno para delimitación de área de fabricación de estructura metálica. Se realiza fundición de anillo en caisson a una profundidad de -3.00 m. (2B) Se continúa con armado de vigas de amarre de cabezote con PTE 100x100.

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-ID-07-4469

Nota #11 Fecha: Viernes 19 de enero de 2024
Se profundiza excavación para caisson 2D hasta una profundidad de -3 cm. Se funden anillos para los caissons 2C y 2D a una profundidad de -3.0 m. Continua el armado de refuerzo para caissons.

Nota #12 Fecha: Sábado 20 de enero de 2024
Se excava para caisson 2E hasta una profundidad de -3.0 m se continúa con el armado de vigas de amarre para celosía y armaduras de refuerzo para caissons. Se funde anillo para caisson 2E

Nota #13 Fecha: Lunes 22 de enero de 2024
Se continua la excavación de los caissons 2F y 2G hasta una profundidad de -3m. Se realiza instalación de formaletas para poder fundición de anillos en concreto reforzado p/ caisson 2F y 2G

Nota #14 Fecha: Martes 23 de enero de 2024
Alcanzado el nivel de fundición de anillos hasta una profundidad -4m se continúa con las excavaciones del eje 2 en los ejes 2F y 2G. Se continúa con el armado de vigas de amarre en celosía con PTE

Nota #15 Fecha: Miercoles 24 de enero de 2024
Se realiza fundición de anillos en concreto para los caisson 2F y 2G a una profundidad de -4m. Se continúa con el armado de refuerzo para caissons del eje 2.

Nota #16 Fecha: Jueves 25 de enero de 2024
Se continuan las excavaciones en los caisson 2D y 2E hasta una profundidad de -4m. Se funden anillos de concreto para los mismos caissons. Se continua con el armado de refuerzo para caissons.

Nota #17 Fecha: Viernes 26 de enero de 2024
Se realizan las excavaciones para los caissons 2A y 2B hasta una profundidad de -4m, se funden anillos para los mismos caissons

Nota #18 Fecha: Sabado 27 de enero de 2024
Se conforman cerchas de vigas de amarre en celosia con PTE [illegible] y entramados de PTE 50x50 se continua con el armado de refuerzo de caissons

Nota #19 Fecha: sábado 29 de enero de 2024
Se realiza fundición de anillos hasta una profundidad de -4m para los caissons 2F y 2G. Se continua con el armado de refuerzo para estructuras de cimentación.

CONSORCIO PARQUES VALLE

CONTRATO IND-23-ID-07-4469

Nota #20 Fecha: Martes 30 de enero de 2024.
Se profundiza excavación en caisson 2C hasta una profundidad -4m
Se instala formaleta de caisson 2D para posterior fundición de anillo en concreto reforzado.

Nota #21 Fecha: Miercoles 31 de enero de 2024
Se formaletea caisson para fundición de concreto en intersección 2E.
Se profundiza excavación de caisson 2D hasta una profundidad de -4m
Se realiza fundición de anillo en concreto reforzado para caisson 2D.

Nota #22 Fecha: Jueves 01 de febrero de 2024
Se profundiza excavación de caisson 2E hasta una profundidad de -5m
se instala formaleta de caisson 2F para fundición de anillo a prof. -4m
Se funde anillo para caisson 2E.

Nota #23 Fecha: Viernes 02 de febrero de 2024
Se profundiza excavación de caisson 2F hasta una profundidad de -5m
Se instala formaleta de caisson 2G para fundición de anillo a prof. -4m
Se funde anillo en concreto reforzado para caisson 2F.

Nota #24 Fecha: Sabado 03 de febrero de 2024.
Se profundiza excavación hasta el nivel -5.00 medidos desde el NPT.+4.00 en caisson 2-G. Se formaletea la excavación del pilote 2D a una profundidad de -4.0 m para posterior fundición de anillo.
Al final de la jornada se alcanza el hito de excavaciones hasta una profundidad mínima de 45m con fundición de anillos, de igual forma la conformación de castillos de refuerzo para caissons.

Nota #25 Fecha: Lunes 05 de febrero de 2024
Se excava caisson 2G hasta una profundidad de -5m, se instala formaleta para posterior fundición de anillo.
Se realiza instalación de armadura de refuerzo en caisson 2B, 2C, 2D, 2E. Se realiza conformación columnas HEA400 con placas base en lámina de 50mm de acuerdo a especificaciones dadas en planos estructurales. Se realiza fundición de concreto en caissons 2B, 2C y 2D hasta la cota -1m medidos desde el NPT.

Nota #26. Fecha: Martes 06 de febrero de 2024
Se realiza instalación de armaduras de refuerzo para caissons 2A 2F y 2G respectivamente. Se realiza fundición de concreto para caisson 2A, 2F y 2G por método tremie hasta la cota -1m medidos desde el N.P.T.

BITACORA DE OBRA.

OBJETO: "Contratar por el Sistema de Precios Unitarios Fijos: Mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos para los municipios de Cartago, El Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca. realizando la ejecución de los Siguientes: GRUPO 1: FRENTE 1. Gimnasio al Aire Libre y Ecobikes, Urbanización La Cabaña, Municipio de Cartago - Departamento del Valle del Cauca. GRUPO 1: FRENTE 2. Adecuación Cerramiento - Barrio Decepaz - Distrito Especial de Cali - Departamento del Valle del Cauca. GRUPO 1: FRENTE 3. Adecuación Escenario Deportivo Barrio Comuneros II Municipio de Cali Valle del Cauca.

FRENTE DE TRABAJO: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

CONTRATISTA: Consorcio Parques Valle

INTERVENTOR: CONSORCIO GRUPO 3.

Actividades Realizadas:
Continúa la Logística de Cotizaciones, consecución de material, mano de Obra, equipo, revisión de Planos, balance económico, Cronograma y demás aceiones previas al inicio de actividades de campo.
Continuan reuniones con comunidad para solicitar apoyo logistico

Residente de Obra — Nicolas Gomez O
Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 31 de Diciembre de 2023, Domingo
No se programan actividades por día Dominical y celebración de Año Nuevo

Residente de Obra — Nicolas Gomez O
Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 01 de Enero de 2024, Lunes Festivo
No se programan Actividades por día Festivo de Año Nuevo

Residente de Obra. — Nicolas Gomez O
Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 02 de Enero de 2024, Martes
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST.
Personal de Interventoría: Ing. Residente
Herramienta y Equipo: Equipo de Computo
Condiciones Climaticas: Seco. de 07:00 a.m a 05:00 p.m.
Actividades realizadas:
Se adelanta visita de Campo y se hace acercamiento con la Comunidad toda vez que se logró evidenciar elementos de viviendas al interior del área del proyecto por lo que se solicita la remoción de estos elementos, de igual manera se cuanta con cronograma de Obra y balance economico acorde a la revisión de planos y verificación de Campo.

Residente de Obra — Nicolas Gomez O
Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 05 de Enero de 2024, Viernes
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 2 Ayudantes
Personal de Interventoría: Ing. Residente.
Herramienta y Equipo: Equipo de Cómputo, herram. Menor.
Condiciones Climáticas: Seco. de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.
Actividades realizadas:
Se culmina levantamiento de las Actas de Vecindad
Continuan excavaciones y se inicia la instalación de guadas para el cerramiento perimetral y delimitación del área de intervención del proyecto
Se revisan cantidades con interventoría para continuar con el balance económico, pendiente validación de los mismos, se identifica un poste que debe ser trasladado

Nicolas Gomez O
Residente de Obra. Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 06 de Enero de 2024, Sábado
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 2 Ayudantes, Comisión Topográfica (Topografo, Cadenero)
Personal de Interventoría: Ing. Residente.
Herramienta y Equipo: Equipo de Topografía, herram. Menor
Condiciones Climáticas: Seco de 09:00 a.m a 12:00 m.
Actividades realizadas:
Se cuenta con la visita del topografo y su comisión con su respectivo equipo con el fin de verificar las coordenadas de terreno y así adelantar la información pertinente para la localización y replanteo, la instalación de los niveles de terreno, y la colocación de los ejes del proyecto, de igual manera establecer cotas de excavación y relleno y obtención de los volumenes de movimiento de tierra requeridos para el proyecto.
Se instala malla cerramiento tela verde delimitando así las áreas de intervención del proyecto
Continua verificación de Cantidades para balance económico

Nicolas Gomez O
Residente de Obra. Interventoria Consorcio Grupo 3

colocan los ejes definidos en el proyecto y se demarca con cal el área de inicio de descapote. iniciando con esta actividad en horas de la tarde
Condiciones Climáticas: Seco de 07:00 a.m a 04:30 p.m, siendo las 04:30 se da inicio un Vendaval ocasionando lluvias fuertes las cuales se fueron amainzando hasta las 06:00 p.m., donde continuó con clima seco


Nicolas Gomez O
Residente de Obra — Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 11 de Enero de 2024, Jueves
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro, 2 Oficiales, 1 Ayudante
Personal de Interventoría: Ing. Residente
Herramienta y Equipo: Herramienta Menor
Actividades desarrolladas:
Continúa el descapote manual del area de intervención y se instalan los puentes guías de los ejes del proyecto esta actividad se desarrolla durante todo el día, se hace progresivamente con retroexcavadora para iniciar excavaciones y se coordina con volqueta para retiro del material excavado el cual debe ser dispuesto en un botadero certificado.
Condiciones Climáticas: Seco de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.

Nicolas Gomez O
Residente de Obra — Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 12 de Enero de 2024, Viernes.
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro 2 Oficiales, 1 Ayudantes, Operario retro y Volqueta
Personal de Interventoría: Ing. Residente
Herramienta y Equipo: Retroexcavadora, herramienta Menor
Actividades desarrolladas:
Llega a Obra la retroexcavadora la cual da inicio a las excavaciones del area de trabajo entre ejes A-F (1-17) acorde a lo definido en el plano del proyecto

FECHA: 15 de Enero de 2024, Lunes.
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro
2 Oficiales, 2 Ayudantes.
Personal de Interventoría: Ing. Residente
Herramienta y Equipo: Herramienta Menor.
Actividades desarrolladas:
Se adelanta perforación de areas excavadas y se demarca terreno del area de canal toda vez que acorde a los planos se tiene contemplado un contenedor de raices debajo de esta como se muestra en la siguiente figura en concreto ciclopeo en ejes A y F:

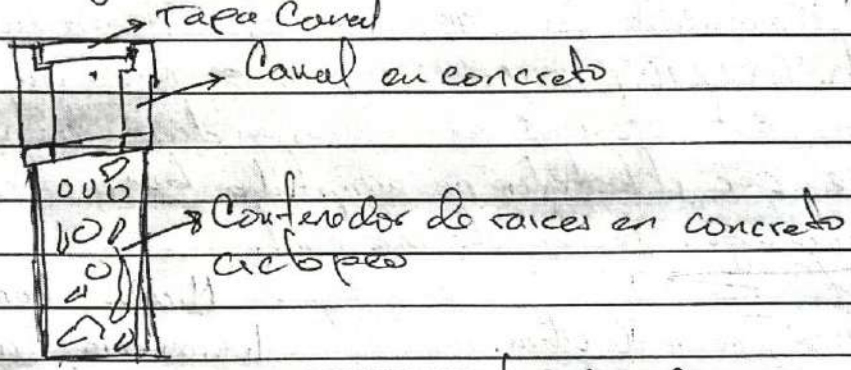

Se inicia excavacion para contenedor de raices
Condiciones climaticas: Seco de 07:00 a.m. a 05:00 p.m

Residente de Obra
Nicolas Gomez O
Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 16 de Enero de 2024, Martes
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro,
2 Oficiales, 2 Ayudantes.
Personal de Interventoría: Ing. Residente,
Herramienta y Equipo: Herramienta Menor
Actividades desarrolladas:
Continúan las excavaciones para contenedor de raices en los ejes A y Eje F acorde a lo definido en los planos del proyecto
Condiciones Climáticas: Seco de 07:00 a.m a 05:00 p.m.

Residente Obra
Nicolas Gomez O
Interventoria Consorcio Grupo 3

Componente técnico eléctrico del proyecto para que este sea revisado y validado por la entidad toda vez que ellos serían los encargados del mantenimiento una vez se haga entrega al municipio, además que se debe verificar que se cumplan con los requerimientos normativos; por su parte los funcionarios de la secretaría de planeación solicitan urgente la socialización del proyecto a la entidad en aras de conocer los alcances de la Obra, además solicitan que se estudie la posibilidad de incluir dentro del balance y una posible ampliación de un área de andenes, que si bien están demarcados en los planos, no está en el presupuesto contractual a lo que se indagó que se plantearía ante mediano la solicitud.

Nicolas Gomez O
Residente de Obra. Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 19 de Enero de 2024, Viernes
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro, 2 Oficiales, 5 Ayudantes
Personal de Interventoría: Ing. Residente
Herramienta y Equipo: Herramienta Menor
Condiciones Climáticas: Seco de 07:00 a.m a 05:00 p.m.
Actividades realizadas:
Continuan excavaciones manuales para contenedor de vacios en los ejes A y Eje F por debajo de la cota detallada en el proyecto, la actividad se desarrolla en el transcurso del día.

Nicolas Gomez O
Residente de Obra. Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 20 de Enero de 2024 Sábado
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro, 2 Oficiales, 5 Ayudantes
Personal de Interventoría: Ing. Residente.

FECHA: 23 de Enero de 2024, Martes
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro, 2 Oficiales, 5 Ayudantes.
Personal de Interventoría: Ing. Residente
Herramienta y Equipo: Pala, Herramienta Menor.
Actividades desarrolladas:
Se termina Conformación de subrasante con pala al interior del área de implantación del proyecto
Se termina colocación de geotextil tejido en el área de implantación del proyecto previo a la instalación de roca muerta de tal manera que se mejore las propiedades mecánicas del suelo, de la superficie de apoyo
Llega a Obra material de roca muerta e inicia proceso de extendido de este material en capas de 10 cm el cual se compactará hasta alcanzar los 30 cm que se tiene contemplado en el proyecto.
Condiciones Climaticas: Seco de 07:00 a.m a 05:00 p.m.

Residente de Obra. Nicolas Gomez O
Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 24 de Enero de 2024, Miércoles
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro, 2 Oficiales, 5 Ayudantes.
Personal de Interventoría: Ing. Residente
Herramienta y Equipo: Pala, Herramienta Menor
Actividades desarrolladas:
Continúa extendido de roca muerta hasta alcanzar capas de 10 cm posteriormente inicia compactación de primera capa de material, esta actividad se desarrolla a el día
Condiciones Climaticas: Seco de 07:00 a.m a 05 p.m.

Ing. Residente de Obra Nicolas Gomez O
Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 25 de Enero de 2024, Jueves
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro
2 Oficiales, 5 Ayudantes.

por capas de 10 cm hasta alcanzar los 30 cm definidos en el area de implantacion del proyecto entre ejes (A-F)(1-17) sin contar el espacio ocupado por los canales a construir en el eje A y en el eje F.
Esta actividad se desarrollo en el transcurso del dia.
Condiciones Climaticas: Seco de 07:00 a.m a 12:00 p.m.

Residente de Obra.

Nicolas Gomez O
Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 28 de Enero de 2024, Domingo
No se programan actividades por dia Dominical

Residente de Obra

FECHA: 29 de Enero de 2024, Lunes
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro, 2 Oficiales, 4 Ayudantes
Personal de Interventoria: Ing. Residente
Herramienta y Equipo: Pano, Herramienta Menor
Actividades desarrolladas:
Continua llegada de material, extendido y compactacion para relleno con Roca Muerta por capas hasta alcanzar los 30 cm definidos en el proyecto en el espacio donde se construira las placas del gimnasio al aire libre, sin contar los espacios ocupados por los canales en el eje A y eje F.
La actividad se desarrolla en el transcurso del dia
Se inicia la configuracion y nivelacion de terreno ejes (A-F)(1-4), humedeciendo el material instalado
Condiciones Climaticas: Seco de 07:00 a.m a 05:00 p.m.

Residente de Obra.

Nicolas Gomez O
Interventoria Consorcio Grupo 3

FECHA: 30 de Enero de 2024, Martes
Personal de Obra: Ing. Residente, Profesional SST, 1 Maestro, 2 Oficiales, 6 Ayudantes.
Personal de Interventoria: Ing. Residente.

REGISTRO FOTOGRAFICO



VALLA FRENTE 3. COMUNEROS II.



VALLA FRENTE 1. LA CABAÑA – CARTAGO.

CERTIFICACIÓN
ENSAYOS DE CALIDAD DEL CONCRETO
FRENTE COMUNEROS

INGENIERIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CONTROL DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD Y PATOLOGÍA DE ESTRUCTURAS

Santiago de Cali 7 febrero de 2024
LA-155835

Señores:
Consorcio Parques Valle
Comuneros II
Ing. Diana Patricia Ceron
Ciudad.

Diseño de mezcla de concreto 210 Kgf/Cm²

En atención a su amable solicitud, con mucho gusto le informamos los resultados del diseño de mezclas de concreto (1), realizados con los materiales enviados por ustedes a nuestro laboratorio.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
No. CO18.02947

AS-155835

INFORME DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO

1. NÚMERO DE SERIE DEL INFORME

   AS-155835

2. EMPRESA SOLICITANTE

   Nombre: **Consorcio Parques Valle**
   Correo: consorcioparquesvalle@gmail.com
   Teléfono: 3183253216

3. INTERESADO

   Ing. Diana Patricia Ceron

4. REFERENCIA

   Diseño de mezclas de concreto, para resistencia especificada 210 Kgf/Cm²

5. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

   Realizado por el interesado

6. IDENTIFICACION DE MUETRAS:

Material	Origen	Procedencia	Características
Cemento	San Marcos	San Marcos	General
Arena	Aluvial	Rio Cauca	Color gris
Grava 3/4"	Triturado	Guabinas	Triturado color gris

Calle 19 # 35-33 B/Cristobal Colón Teléfonos: 373 37 07- Cali Celular: 315 527 57 24
www.ingeomac.com - E-mail: ingeomacltda@hotmail.com - laboratorio@ingeomac.com

7. EQUIPOS DE ENSAYO

- Balanza con sensibilidad de 0.1 g
- Tamices que cumplen la Norma NTC 32
- Horno
- Varilla lisa compactadora de 16 mm de diámetro (5/8") y 600 mm de longitud, con extremo redondeado.
- Recipiente de medida
- Frascos de vidrio con tapa
- Canasta de alambre
- Recipiente para inmersión
- Molde metálico en forma tronco cónica
- Pisón metálico
- Moldes cilíndricos
- Cono de asentamiento que cumple la Norma NTC 396
- Mezcladora de hormigón mecánica
- Prensa hidráulica SOILTEST

8. MÉTODO Y/O PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - Normas de Referencia

NTC 77	:	Tamizado de materiales granulados
NTC 88	:	Determinación del material que pasa por el tamiz ICONTEC 74
NTC 92	:	Método para determinar la masa unitaria de los agregados
NTC 127	:	Determinación de la materia orgánica.
NTC 174	:	Especificaciones de los agregados para hormigón.
NTC 176	:	Método para determinar la densidad y la absorción de agregados gruesos.
NTC 237	:	Método para determinar el peso específico y la absorción de agregados finos.
NTC 1776	:	Agregados para hormigón. Determinación del contenido de humedad total.
NTC 1377	:	Hormigón. Elaboración y curado de muestras en el laboratorio.
NTC 396	:	Método de ensayo para determinar el asentamiento del hormigón.
NTC 504	:	Refrentado de cilindros de hormigón.
NTC 673	:	Ensayo de resistencia a compresión de cilindros normales de hormigón.

Calle 19 # 35-33 B/Cristobal Colón Teléfonos: 373 37 07- Cali Celular: 315 527 57 24
www.ingeomac.com - E-mail: ingeomacltda@hotmail.com - laboratorio@ingeomac.com

AS-155835

9. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS:

9.1 Diseño de concreto F´c : 210 Kgf/Cm²

ANALISIS DE MATERIALES			
Descripción / Ensayo	**Arena**	**Grava**	**Cemento**
Procedencia	Rio Cauca	Guabinas	San Marcos
Tamaño Máximo Nominal	N°4	3/4"	
Módulo de finura	2,50		
Masa Unitaria Suelta g/cm³	1,415	1,532	1,2
Masa Unitaria Compacta g/cm³	1,581	1,721	
Densidad aparente g/cm³	2,68	2,92	3,0
Absorción (%)	3,3	1,1	
Humedad%	4,1	0,8	

PROPORCIONES EN OBRA PARA MEZCLA DE CONCRETO						
Materiales	**Proporción masa**	**Cantidades en peso por m³**	**Vol Abs Materiales (dm3/m3)**	**Cantidades en volumen suelto**	**Cantidades para un (1) saco de cemento**	**Cajones de (33x33x33)**
Cemento	1	470 kg/m³	157	9,4 Sacos/m³	1 saco	1 saco
Arena	1,5	703 kg/m³	262	0,496 m3/m3	0,053 m³/saco	1,5 Cajones
Grava	2,2	1011 kg/m³	346	0,660 m3/m3	0,070 m³/saco	2,0 Cajones
Agua	0,50	235 kg/m³	235	235,0 litros	25,0 Litros	25,0 Litros
Asentamiento	4±1"	4±1"	4±1"	4±1"	4±1"	4±1"

10. ACLARACIÓN

El presente informe es válido únicamente para las muestras recibidas en el laboratorio, es absolutamente confidencial y se prohíbe su reproducción total o parcial.

Cualquier información adicional, gustosamente se les suministrará.

Cordialmente,

Andres Bellalcazar
Dpto de Materiales







Calle 19 # 35-33 B/Cristobal Colón Teléfonos: 373 37 07- Cali Celular: 315 527 57 24
www.ingeomac.com - E-mail: ingeomacltda@hotmail.com - laboratorio@ingeomac.com

	RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYOS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO NTC: 673: Ensayo de resistencia a la compresión simple de cilindros normales de concreto	Código: IO-FR-12 Versión: 07 Fecha: 28-ABR-2022 Página: 1 de 1

Obra:	Comuneros II	Consecutivo:	47665
		Cliente:	Consorcio Parques Valle
Código:	6757	Elaborado por:	Tec.: Jenny Grajales
Ordenado por:	Ing. Diana Patricia Ceron	Fecha de elaboración:	2024-02-06

CARACTERÍSTICA	MUESTRA					
Muestra N°	1					
Cilindro N°	A	A	B	B	C	C
Localización	ANILLOS EJES 2 A 1					
Diámetro (cm)	15.24	15.24	15.24	15.24	15.24	15.24
Altura (cm)	30.48	30.48	30.48	30.48	30.48	30.48
Área (cm2)	182.41	182.41	182.41	182.41	182.41	182.41
Volumen (cm3)	5560	5560	5560	5560	5560	5560
Fecha Toma de Muestra	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
Fecha de Ensayo	29/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
Edad Rotura (días)	7	7	14	14	28	28
Carga Máxima (kN)	187.6	182.2	251.4	243.8		
Resistencia Obtenida (Kgf/cm2)	105 x	102 x	141 x	136 x		
Resistencia Obtenida (%)	50%	49%	67%	65%		
Resistencia Esperada (%)	70%	70%	85%	85%	100%	100%
Resistencia Esperada (Kgf/cm2)	210	210	210	210	210	210
Tipo de Falla	C	F	B	E		
Remisión N°	102456					
Origen de Mezcla	DESCONOCIDO					
Cod. Calibración Prensa	F-056					

TIPO DE FALLA

TIPO 1 (A)	TIPO 2 (B)	TIPO 3 (C)	TIPO 4 (D)	TIPO 5 (E)	TIPO 6 (F)
					
CONOS RAZONABLEMENTE BIEN FORMADOS EN AMBOS EXTREMOS. FISURAS A TRAVÉS DE LOS CABEZALES DE MENOS DE 25mm (1 PULGADA)	CONO BIEN FORMADO EN UN EXTREMO, FISURAS VERTICALES A TRAVÉS DE LOS CABEZALES; CONO NO BIEN DEFINIDO EN EL OTRO EXTREMO	FISURAS VERTICALES ENCOLUMNADAS A TRAVÉS DE AMBOS EXTREMOS, CONOS MAL FORMADOS	FRACTURA DIAGONAL SIN FISURAS A TRAVÉS DE LOS EXTREMOS. GOLPEE SUAVEMENTE CON UN MARTILLO PARA DISTINGUIR DEL TIPO 1 (A)	RACTURAS EN LOS LADOS EN LAS PARTES SUPERIOR O INFERIOR (OCURRE COMÚNMENTE CON CABEZALES NO ADHERIDOS)	SIMILAR AL TIPO 5 PERO EL EXTREMO DEL CILINDRO ES PUNTIAGUDO

Firmas de aprobación		Descarga nuestra App	Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	DISPONIBLE EN Google Play	
Director de Laboratorio	Nombre:		*Certificado Número*: CO21.09404

ACTAS DE SOCIALIZACIÓN

CONSORCIO PARQUES VALLE
SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

ACTA DE REUNIÓN GENERAL

Fecha: 07 de febrero de 2024 Hora inicio: 10:00 a.m. Hora final: 11:30 a.m.

Lugar: Manzana 4 Casa 10 y Casa 11 Urbanización La Cabaña Municipio de Cartago (Valle del Cauca)

1. OBJETIVO REUNIÓN

- Auditoría visible de inicio de proyecto ADECUACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL BARRIO LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA el cual hace parte del Contrato de Obra IND-23-4469

2. AGENDA

ITEM	TIEMPO ESTIMADO	REPONSABLE.
Presentación del Equipo de trabajo (INDERVALLE, Interventoría y Contratista)	10 Minutos	Paula Andrea Olarte Trujillo – Gestión Social INDERVALLE
Presentación del Proyecto	40 Minutos	Paula Andrea Olarte Trujillo – Gestión Social INDERVALLE
Generalidades constructivas	10 Minutos	Jeferson Sánchez Buritica – Ing. Residente Contratista
Inquietudes de la comunidad y respuesta de las mismas	15 Minutos	Comunidad, Contratista, Interventoría. InderValle
CONCLUSIONES	15 Minutos	Paula Andrea Olarte Trujillo – Gestión Social INDERVALLE

3. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO.	ROLES.	FIRMA.
Se anexa Listado de Asistencia			

4. CODIGO DE CONDUCTA DENTRO DE LA REUNION.

Se socializa con la comunidad el código de conducta de la reunión la cual consiste en escuchar la presentación del proyecto que estará a cargo de parte de INDERVALLE como entidad contratante, contratista e interventoría y posteriormente se otorgará un espacio a la comunidad para que manifiesten sus inquietudes y se les dará solución a la misma

5. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

Inicia la reunión siendo las 10:00 a.m. tomando la palabra la Profesional apoyo de Gestión Social de parte de INDERVALLE, Paula Andrea Olarte Trujillo la cual representa a la entidad en compañía de la Profesional Apoyo a Supervisión Arq. Isabela Gutiérrez; del equipo contratista se presenta el Ingeniero Residente del proyecto Jeferson Sánchez Buritica y la Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Diana Yorfady Restrepo; y del equipo de la interventoría el Ingeniero Residente Nicolás Gomez Ocampo y el inspector de interventoría Alonso Gómez Barrera quienes se encargarán de hacer la presentación del proyecto.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Se inicia con la presentación del proyecto el cual está a cargo de la Subgerencia de Infraestructura del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación – INDERVALLE y donde el objetivo principal de esta reunión corresponde a la socialización de inicio de obra de los Contrato de Obra: IND-23-4469 y Contrato Interventoria: IND-23-4484 donde uno de los frentes de intervención corresponde a la ADECUACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL BARRIO LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGOEN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, con la finalidad de informar y dar a conocer el proyecto, su impacto y registrar las observaciones de la comunidad en el cual una vez dado a conocer el contenido de la presentación y se explica el rol de las diferentes entidades donde participan el Ente Territorial que en este caso es el municipio de Cartago el cual hace la gestión de la necesidad, se remite a la Gobernación del Valle del Cauca quien se encarga de Asignar los recursos para la ejecución, se transmite a INDERVALLE quien viabiliza el proyecto de forma técnica y Jurídica, publica la convocatoria y realiza la contratación y posterior supervisión técnica, legal, financiera y social durante la ejecución de la obra, posteriormente se asignan un contratista y una interventoría encargados de ejecutar físicamente el proyecto y finalmente el ente territorial y la comunidad reciben el proyecto terminado y se encarga de su sostenibilidad.

Se presenta la información general del proyecto donde se manifiesta que el contratista es el consorcio Parques Valle y la interventoría es el Consorcio Grupo 3 con un plazo de ejecución contractual definitivo de hasta el 30 de junio de 2024, sin embargo, para este frente se tiene previsto un periodo de ejecución de 04 meses iniciando el 28 de diciembre de 2024 y cuyo alcance es la Construcción de gimnasio al aire libre, para lo cual se realizará previo mejoramiento del suelo; excavación, relleno y compactación, se

fundirá cordón perimetral con pisos de circulación en concreto reforzado, se realizará la instalación de un sistema de iluminación y drenaje pluvial y se instalarán máquinas y dotación según diseños.

Se hace una presentación del plano general de implantación del proyecto que consiste en la instalación de 21 máquinas biosaludables localizadas en las áreas verdes de la urbanización la cabaña las cuales tendrán 5 zonas distribuidas de la siguiente manera: Zona A Calentamiento, Zona B Coordinación, Zona C Ejercicio, Zona D Eco-Bikes y Zona E PMR y permitirán otorgar espacios de sano esparcimiento y aprovechar el tiempo libre.

GENERALIDADES CONSTRUCTIVAS

Toma la palabra el Ingeniero Jeferson Sánchez quien hace muestra los planos de diseño y hace una explicación que las máquinas a instalar para el proyecto que se encargan de calentamiento, coordinación y ejercicio para uso general corresponden a volante, cintura, timón, esquí, patines, surf, barras, ascensor, pony, columpio y masaje; por su parte las máquinas correspondientes a uso de Personas con Movilidad Reducida son Timón adaptado, ascensor, ejercitador de brazos, pedaleo, timón volante, elevador, autobús y bicicleta de mano y finalmente se instalarán 3 EcoBikes simulando una bicicleta estática; de igual manera para este proyecto se tiene previsto 2 canales laterales encargadas del manejo de aguas lluvias; sistema de iluminación que permitirá el uso del espacio en horas de la noche; y finalmente obras de urbanismo que corresponden a señaiética de uso de las diferentes máquinas, canecas de basura para la disposición de residuos y bancas de concreto con espaldar perforado.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD Y RESPUESTA DE LAS MISMAS

Solicita la palabra la señora Rosalba Pérez quien solicita claridad sobre las EcoBikes a lo cual apoya al equipo presentador el señor Arles Arcila, líder social del sector y quien se presenta como la persona que adelantó las gestiones para que este proyecto se diera en el barrio cuando fue presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Cabaña y quien manifiesta que este equipo donde se hicieron las averiguaciones permitirá en un futuro generar energía en caso tal que se requiera para utilizar switches de piso evitando consumo de energía de la empresa prestadora del servicio.

Por su parte el señor Alfredo Vélez solicita la palabra preguntando sobre como serán los accesos a futuro hacia los espacios construidos toda vez que actualmente la vía de acceso está en tierra a lo que se responde que eso es gestión de la comunidad para que se adecúen estas vías y el líder social Arles Arcila manifiesta que se está adelantando dicho trámite.

El señor Arles Arcila, líder social toma la palabra e indica que se ha hecho varias gestiones para 3 proyectos para el sector los cuales los dará a conocer una vez se cuente con la aprobación respectiva, por su parte la señora Cielo Vargas agradece a los participantes tener en cuenta a esta comunidad con este proyecto y que espera que todo se ejecute de la mejor manera para beneficios de la comunidad.

CONSORCIO PARQUES VALLE
SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

ACTA DE REUNIÓN GENERAL

6. CONCLUSIONES

Para dar conclusión a la reunión se presentan los beneficios al proyecto los cuales consisten en:

1. Acceso al servicio recreo deportivo en condiciones de calidad.
2. Promover el desarrollo integral de los individuos para la convivencia y cohesión social.
3. Mayor oportunidad de practica de actividades físicas, recreativas y deportivas mediante escenarios deportivos que cumplan con los estándares técnicos requeridos.
4. Proporcionar espacios a nuevos semilleros que quieren llegar a ser deportistas de alto rendimiento y de competición.
5. Contribuir a la equidad social, con el acceso al deporte y la recreación.
6. Mejorar la economía del sector, dada la cercanía a los espacios recreativos.
7. Promover las oportunidades de realizar actividades físicas como correr, caminar o participar en otras actividades que harán un mejor aprovechamiento del tiempo libre.
8. Apoyar la salud pública mediante el fortalecimiento de la salud física.
9. Promover la participación comunitaria y el generar sentido de pertenencia de las obras.
10. Generar espacios de convivencia ciudadana que pueden ser un modelo de cambio para toda la comunidad.

Se explica que las acciones adelantadas por la gestión social son: Identificación de las necesidades de la comunidad, Visita de reconocimiento técnico y social, Socialización, Auditorías Visibles Ciudadanas otorgando así participación ciudadana.

Finalmente se entregan datos de contacto de INDERVALLE para que la comunidad manifieste sus inquietudes en caso de ser necesario.

Con esto se da finalización a la reunión de socialización siendo las 11:30 a.m. y se agradece a todos la participación a la misma

7. COMPROMISOS

Programar acercamientos nuevamente con la comunidad cuando el proyecto cuente con un avance del 50% y cuando se finalice la obra.

REGISTRO DE ASISTENCIA

LUGAR:	AÑO	MES	DIA
Barrio la Cabaña Cartago	2024	02	07

Proceso:

Objetivo de la reunión: Socialización proyecto

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Olmes Rodriguez	6233066	comunidad			
2	Maria Restrepo	31 29382686	Comunidad			
3	Rosalba Perez	42.764055	Comunidad.	3136592207		Rosalba Perez
4	Steven Garcia Usuga	1112759876	Interventoria Alumbrado Publico	3216523208	Interventoria Cartago2024 @gmail.com	
5	Alejandra Sepúlveda Espinosa	1112786623	Alumbrado Publico	3164900669		
6	JOHN MARIN	6982560	COMUNIDAD	3103880494		
7	Alfredo Velez	94.286937	Comunidad	3118687771		
8	Adiela Marin	25108501	comunidad	3178057202		Adiela
9	Maria oliva Valencia	31 47487	comunidad	3116237712		Maria oliva V.
10	Maria elena Vargas	31417350	COMUNIDAD	3104675876		Elena Vargas
11	Cielo Vargas	31426135	COMUNIDAD	3103646414		Cielo Vargas

NOMBRE DEL CAPACITADOR:	
CARGO Y/O PROFESION:	
FIRMA DEL CAPACITADOR:	

Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA

LUGAR:	AÑO	MES	DIA
Barrio la Cabaña (Cartago)	2024	02	07

Proceso:

Objetivo de la reunión: Socialización proyecto

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Angelica M Gonzalez M	42.130.922	Comunidad	3138281397		
2	HUMBERTO LIBREROS	16.209.362	IAC. GUAYACANES	3206801569	———	
3	Erika Maria Gallo	31426665	Subdeporte Cartago	3114198397	deportes@cartago.gov.co	
4	Enes Restrepo	29447462	Ama de casa	3232144657	n	
5	Ariel Ramo	6.480593	Comunidad	3107425141		
6	Daniel Builrago	6279501	Comunidad	49	3 X	
7	SEBASTIAN VELASQUEZ C	1.112785025	Org. Vallecaucana del Cauca	3215220114	Svelasquez@valledel cauca.gov.co	
8	Arles Areiza Velez	16228856	Líder Social	3105551771	arelavarles32@gmail.com	
9	Isabela Gutierrez	1.143.862465	Indervalle	3004751752		
10	Jeferson Sanchez	1112129857	Consorcio Parque V	3015400994	consorcioparquevalle@gmail.com	
11	Nicolas Gomez Campo	1053977743	Consorcio Grupo 3	3119114979	nico1999ng3@gmail.com	Nicolas Gomez C

NOMBRE DEL CAPACITADOR:	
CARGO Y/O PROFESION:	
FIRMA DEL CAPACITADOR:	

Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA

LUGAR:	AÑO	MES	DIA
Barrio La Cabaña (Cartago)	2024	02	07

Proceso:

Objetivo de la reunión:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Alexis Gomez Bedoya	14570114	Consolidado 3	3184158834	alexisxf@gmail.com	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

NOMBRE DEL CAPACITADOR:
CARGO Y/O PROFESION:
FIRMA DEL CAPACITADOR:

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN DISPOSICIÓN FINAL ESCOMBRERA

FRENTE COMUNEROS FRENTE CARTAGO

AUTORIZACION PARA DISPOCISION FINAL DE MATERIAL RCD –RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Por medio de la presente comunicación **GABRIEL RANGEL,** identificado con cedula de ciudadanía No. 14952905 de Cali, autorizo a la firma **SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS/ ALEJANDRO GARZON GUZMAN**, con Nit. 79308043-8, la cual se encuentra inscrita como gestor ante la CVC, y así poder adelantar labores de restauración y conformación del predio denominado **EL PESCADOR SENTADO,** localizado en inmediaciones del corregimiento del Carmelo, municipio de Candelaria; conforme a la matricula Inmobiliaria No. 378-100446, donde se dispondrán materiales RCD (Residuos Construcción y Demolición) de las diferentes obras de la ciudad de Cali, municipios vecinos, limpieza de los diferentes ríos , los cuales por su rico contenido de fosforo, nutrientes y abonos orgánicos se utilizara como mejorador del suelo, para futuras siembras de cultivos, los que permitirá el mejoramiento de las condiciones paisajísticas y ambientales del sector.

En constancia de lo anterior, firmo la presente en el Corregimiento del Carmelo Candelaria a los 26 días del mes de octubre de 2021.

Atentamente,

GABRIEL RANGEL
CC. 14952905 DE CALI.

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Citar este número al responder:
0721-397822022 - 456562022 - 562522022 -517822022

Palmira, julio 22 de 2022

Señor
ALEJANDRO GARZON
SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS A&G
Domicilio: Predio El pescador sentado
Corregimiento El Carmelo - Candelaria - Valle del Cauca
E-mail: asesoriasambientales.director@gmail.com

REF: Respuesta radicados No. 397822022 - 456562022 - 562522022 –517822022

En atención a su solicitud con radicado No. 397822022 - 456562022 - 562522022 y 517822022, esta dependencia le comunica que usted fue inscrito como Gestor de residuos de construcción y demolición - RCD para las actividades de operación de punto limpio, y disposición final de RCD, en el predio con matricula No. 378- 100446, localizado en el corregimiento El Carmelo - municipio de Candelaria, información que se encuentra publicada en la página Web de la CVC en el siguiente Link: http://www.cvc.gov.co/residuos-construccion-y-demolicion, dando cumplimiento al Artículo 18 de la Resolución 0472 de 2017.

Así mismo, se le recuerda las obligaciones que debe cumplir como Gestor de RCD, establecidas en los artículos 3 y 6 de la Resolución 1257 de 2021 relacionadas con:

1. Deberá dar estricto cumplimiento a las acciones planteadas en el documento denominado *"Programa de manejo ambiental para operar punto limpio, aprovechamiento RCD no pétreo y disposición final de RCD en el predio El pescador sentado con matricula No. 378-100446, localizado en el corregimiento El Carmelo - municipio de Candelaria".*

2. Deberá presentar ante la Dirección Ambiental Regional Suroriente de la CVC, dentro de los 15 días calendario posteriores a la finalización de cada trimestre del año, la información prevista en el anexo III de la citada resolución con la cantidad de RCD dispuestos en el trimestre inmediatamente anterior.

3. Deberá contar con equipos requeridos, de acuerdo con las actividades de manejo de los RCD que oferten.

4. Deberá expedir constancia al generador de la cantidad exacta de residuos gestionados en un tiempo máximo de 15 días calendario posteriores a la recepción de RCD para su gestión, conforme a la información requerida en el formato anexo II, que forma parte integral de la presente resolución.

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
ALEJANDRO GARZON GUZMAN
NIT. 901191011-8

CERTIFICACION N° 2024 – 168
BASCULA RCD - AGG
SUMINSTRAMOS Y CONTRATATAMOS AGG S.A.S
ALEJANDRO GARZON G.
NIT 901191011-8

La presente para certificar que la empresa: Volquetas y Tanques Cali S.A.S Con número de Nit 901081402-2 se le presto el servicio de báscula a la volqueta con placas, LFC579 de la obra PARQUE COMUNEROS 2 de cantidad pesada: 76,8TONELADAS de material RCD (Residuos de Construcción y Demolición), Del, 01 al 29 Enero del 2024 según certificación de disposición final TIERRA No. 168.

Se expide a solicitud del interesado, a los 29 dias del mes de Enero de 2024, para ser presentada ante la autoridad ambiental competente. *IMPORTANTE: Para confirmar la veracidad de esta autorización comuniquese con nuestra oficina,* ***al número 3848023 o al celular 3165354803.***

De antemano agradezco su amable atención.

Atentamente,

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
NIT. 901.191.011-8

79308043

ALEJANDRO GARZON GUZMAN
C.C.79.308.043
Gerente.


Eje METROLOGIA

NUMERO: [illegible]

PRUEBA EXCENTRICIDAD

CARGA (kg) 10000

POSICION	INDICACION (kg)	DIFERENCIA (kg)
1	10000,0	0,00
2	10000,0	0,00
3	9990,0	-10,00
4	10010,0	10,00
5	10000,0	0,00
E max / exc		20,00





6 -OBSERVACIONES:

6.1 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE Y/O ERRORES DE INDICACION ANTES DE AJUSTE Y OTROS ASPECTOS.CARGA MAXIMA DE TRABAJO 500 kg. RANGO DE CALIBRACION APROBADO POR EL CLIENTE HASTA 500 kg
Para la prestacion del servicio el contacto fue: WSS

El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en este certificado, excepto puntos de calibración, o cargas aplicadas en la prueba de repetibilidad, reglas de decisión y especificaciones para declaración de conformidad, códigos internos o números de inventario u otros datos que sean suministrados por el cliente.

168

7-INCERTIDUMBRE:

La estimacion de incertidumbre en cada punto de medicion se hizo tomando un factor de cobertura k de aproximadamente aproximadamente 2 para un nivel de confianza del 95% y se relaciona directamente con el equipo calibrado.

FIN DE CERTIFICADO


Eje METROLOGÍA

NUMERO: [illegible]

PRUEBA EXCENTRICIDAD

CARGA (kg) 10000

POSICION	INDICACION (kg)	DIFERENCIA (kg)
1	10000,0	0,00
2	10000,0	0,00
3	9990,0	-10,00
4	10010,0	10,00
5	10000,0	0,00
E max / exc		20,00





6 -OBSERVACIONES:

6.1 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE Y/O ERRORES DE INDICACION ANTES DE AJUSTE Y OTROS ASPECTOS.CARGA MAXIMA DE TRABAJO 600 kg. RANGO DE CALIBRACION APROBADO POR EL CLIENTE HASTA 600 kg

Para la prestacion del servicio el contacto fue: WSS

El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en este certificado, excepto puntos de calibración, o cargas aplicadas en la prueba de repetibilidad, reglas de decisión y especificaciones para declaración de conformidad, códigos internos o números de inventario u otros datos que sean suministrados por el cliente.

168

7-INCERTIDUMBRE:

La estimacion de incertidumbre en cada punto de medicion se hizo tomando un factor de cobertura k de aproximadamente aproximadamente 2 para un nivel de confianza del 95% y se relaciona directamente con el equipo calibrado.

FIN DE CERTIFICADO

EJE METROLOGIA SAS

[illegible]

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
ALEJANDRO GARZON GUZMAN
NIT. 901191011-8

CERTIFICACION N° 2024 – 168
BASCULA RCD - AGG
SUMINSTRAMOS Y CONTRATATAMOS AGG S.A.S
ALEJANDRO GARZON G.
NIT 901191011-8

La presente para certificar que la empresa: Volquetas y Tanques Cali S.A.S Con número de Nit 901081402-2 se le presto el servicio de báscula a la volqueta con placas. LFC579 de la obra PARQUE COMUNEROS 2 de cantidad pesada: 76,8TONELADAS de material RCD (Residuos de Construcción y Demolición), Del, 01 al 29 Enero del 2024 según certificación de disposición final TIERRA No. 168.

Se expide a solicitud del interesado, a los 29 días del mes de Enero de 2024, para ser presentada ante la autoridad ambiental competente. *IMPORTANTE: Para confirmar la veracidad de esta autorización comuníquese con nuestra oficina,* ***al número 3848023 o al celular 3165354803.***

De antemano agradezco su amable atención.

Atentamente,

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
NIT.: 901.191.011-8

79308043

ALEJANDRO GARZON GUZMAN
C.C.79.308.043
Gerente.

	MUNICIPIO DE CANDELARIA **CONCEPTO DE USO DE SUELO**	Código:54-PDM-FT-222 Fecha: 15-Julio-2019 Versión: 6 Página: 1 de 2

CONCEPTO DE USO DE SUELO No. 255-06-02-03-0482

El presente certificado de uso del suelo, se expide de conformidad a lo establecido en el numeral 3, del artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto Único Nacional 1077 de 2015, el Acuerdo Municipal 015 de 2005, la modificación excepcional al Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio de Candelaria, aprobado mediante el Acuerdo Municipal 002 del 29 de enero de 2015 y el ajuste realizado al Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Candelaria realizado mediante Acuerdo Municipal 021 del 28 de noviembre de 2015.

PREDIO

Número predial: 030000340065000
Solicitante: Jairo De Jesús Uribe Narvaez
Cédula o Nit: 4.645.740
Dirección del Predio: Lago El Pescador sentado El Carmelo
Nombre del Establecimiento: Se informan los usos de suelo permitidos y prohibidos en el predio. Las actividades permitidas son las clasificadas como principal o compatible únicamente.
Código CIU Solicitado en Cámara de Comercio:

REGIMEN DE USOS APLICABLES AL PREDIO
Área DE ACTIVIDAD: RESIDENCIAL

Área de actividad	*Residencial*
Principal	Residencial
Compatible	Comercio - Grupo 1, Equipamientos - Grupo 1.
Prohibido	Industrial - Grupo 1; Industrial - Grupo 2; Industrial - Grupo 3; Equipamiento – Grupo 2; Comercial - Grupo 2, Comercial - Grupo 3 y las demás que no se encuentren en la categoría principal o compatible.

OBLIGACIONES

- No puede ocupar el espacio público (antejardín, andén, zona verde, vías públicas) con los productos, mobiliario, vehículos de clientes y proveedores o elementos publicitarios del establecimiento.
- En áreas residenciales o de usos en los que se requiera tranquilidad, no se permitirá la operación de parlantes, amplificadores, instrumentos musicales o cualquier dispositivo similar que perturbe la tranquilidad ciudadana, o que genere hacia la vecindad o el medio ambiente, niveles de ruido superiores a los establecidos en la Resolución 0627 del 07 de abril de 2006 "por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental".
- Para la apertura y funcionamiento de Establecimientos Comérciales o Industriales, se debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley 232 de 1995, el cual fue reglamentado mediante Decreto Nacional 1879 de 2008. Así mismo, se debe tener en cuenta lo establecido en los Articulos 46 y 47 del Decreto Nacional 2150 de 1995, o las normas que los modifique, adicione, sustituya o complementen.

OBSERVACIONES

315

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Citar este número al responder
0771-936072021

Cartago, octubre 23 de 2021

Señor
JOHAN SEBASTÍAN GARCÍA LOPEZ
Representante legal contrato de concesión HDK -091
Carrera 3 11-60
Cartago – Valle del Cauca

Asunto: Radicados 936072021.

Cordial saludo.

El presente con el fin de informarle que dando atención a la información entregada por ustedes ante la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, ya se realizó lo referente a su inscripción como gestor RCD en la página WEB de la corporación, la cual ya puede ser verificada consultando la misma, para que se verifique las condiciones en que fue legalizada dicha inscripción; se adjunta listado actualizado de Gestores de residuos de construcción y demolición RCD inscritos en la corporación.

No obstante, lo anterior implica el cumplimiento de lo definido en la resolución 472 de 2017 de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.

Cualquier información respecto al presente comunicado con gusto será suministrada en nuestras oficinas ubicadas en Cartago en la carrera 4 No 9-73 piso 4, teléfono 2147110 Ext. 2111.

Atentamente,

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Norte

Anexo 1 folio
Elaboro Carlos Alberto Villamil Moreno – Profesional Especializado
Reviso Duver Humberto Arredondo Marin - coordinador UGC La Vieja-Obando

Archivese en 0771-017-0-2021

CARRERA 4 NO. 9-73 PISO 4°
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
TELÉFONO 2147110 EXT. 2101
LÍNEA VERDE 018000933093
atencionalusuario@cvc.gov.co
www.cvc.gov.co

VERSIÓN 09 – Fecha de aplicación 2019/01/21

CÓD FT 0710.02

EBEN FORTUNE

S.A.S

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR						
Nombre - razón social:	Gestor contrato de concesión HDK-091 - Eben Fortune SAS					
Número de identificación o NIT:	901256751-0					
Representante legal:	Johan Sebastian García					
Número de contacto:	3116122015 - 3116356268					
Dirección:	Carrera 3 # 11- 60					
Municipio o distrito:	Cartago					
TIPO GESTOR	Punto Limpio		Planta de aprovechamiento		Disposición final	X
TIPO DE RESIDUO RECIBIDO	Escombro y descapote					
CANTIDAD DE RESIDUO RECIBIDO EN METROS CUBICOS	210 m3					
DESTINO DEL RCD	Aprovechamiento				Disp. Final	X

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Nombre del generador	Consorcio Parques Valle
Número de identificación o NIT	901.772.637 - 1
Número de contacto	311 300 7167
Dirección domicilio	Calle 3 Oeste 56 - 350
Nombre proyecto	Parque Biosaludable La Cabaña
Dirección donde se generan los RCD	La Cabaña
Contratista que genera:	Consorcio Parques Valle
Actividad que desarrolla:	Desalojo de Escombros
Fecha de recepción de los RCD	12 - 13 de Enero del 2024

INSCRITOS EN LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

ATENTAMENTE

Johan Sebastian Garcia L
REPRESENTANTE LEGAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución No. 0472

(28 FEB 2017)

"Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones"

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

En ejercicio de sus facultades legales, y en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 34, 35 y 38 del Decreto - Ley 2811 de 1974 y los numerales 2, 10, 11 y 14 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, establecen que es deber del Estado proteger, prevenir, controlar y planificar la diversidad, integridad y aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de conservarlos, para garantizar no solo el desarrollo sostenible, sino el derecho que todas las personas tienen a gozar de un ambiente sano.

Que entre las afectaciones ambientales generadas por la inadecuada gestión de Residuos de Construcción y Demolición – RCD (anteriormente denominados escombros), se encuentran la contaminación al aire, al agua y al suelo.

Que se ha incrementado la generación de RCD, conforme al diagnóstico integral del modelo actual de la gestión de residuos en Colombia, en el año 2011 se produjeron en las ciudades de Bogotá, Medellín, Santiago de Cali, Manizales, Cartagena, Pereira, Ibagué, Pasto, Barranquilla, Neiva, Valledupar y San Andrés 22.270.338 toneladas de RCD.

Que se requiere adoptar disposiciones dirigidas al fortalecimiento de la gestión integral de residuos de construcción y demolición – RCD.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

CAPITULO I
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente acto administrativo establece las disposiciones para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD y aplica a todas las personas naturales y jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan Residuos de Construcción y Demolición – RCD de las obras civiles o de otras actividades conexas en el territorio nacional.

"Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones"

Programa de manejo ambiental de RCD (antes denominado programa de manejo ambiental de materiales y elementos en la Resolución 541 de 1994): Es el instrumento de gestión que contiene la información de la obra y de las actividades que se deben realizar para garantizar la gestión integral de los RCD generados.

Puntos limpios: Son los sitios establecidos para que el gestor realice la separación y almacenamiento temporal de los RCD.

Reciclaje de RCD: Es el proceso mediante el cual se transforman los RCD en materia prima o insumos para la producción de nuevos materiales de construcción.

Residuos de construcción y demolición – RCD (anteriormente conocidos como escombros): Son los residuos sólidos provenientes de las actividades de excavación, construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras actividades conexas, entre los cuales se pueden encontrar los siguientes tipos:

1. Residuos de construcción y demolición –RCD- susceptibles de aprovechamiento:

1.1. Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.
1.2. Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.
1.3. Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.
1.4. No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimientos de zinc o estaño, plásticos tales como PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, compuestos de madera o cartón-yeso (drywall), entre otros.

2. Residuos de construcción y demolición –RCD- no susceptibles de aprovechamiento:

2.1. Los contaminados con residuos peligrosos.
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.
2.3. Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.

Reutilización de RCD: Es la prolongación de la vida útil de los RCD recuperados que se utilizan nuevamente, sin que para ello se requiera un proceso de transformación.

Sitio de disposición final de RCD (anteriormente conocido como escombrera): Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición final controlada de RCD, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de dichos residuos.

"Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones"

4. Realizar acciones para evitar la dispersión de partículas.

Artículo 8. Puntos limpios. La separación y el almacenamiento temporal de RCD se realizará en los puntos limpios que deberán contar mínimo con las siguientes áreas de operación:

1. Recepción y pesaje.
2. Separación por tipo de RCD.
3. Almacenamiento.

Parágrafo. Para efectos de lograr economías de escala, los puntos limpios podrán ser de carácter regional.

Artículo 9. Aprovechamiento. El aprovechamiento de RCD se realizará en plantas de aprovechamiento fijas o móviles y deberán contar mínimo con las siguientes áreas de operación:

1. Recepción y pesaje.
2. Separación y almacenamiento por tipo de RCD aprovechables.
3. Aprovechamiento.
4. Almacenamiento de productos.

Artículo 10. Medidas mínimas de manejo ambiental en puntos limpios y en plantas de aprovechamiento. Los gestores de los puntos limpios y plantas de aprovechamiento, deberán elaborar un documento que contenga las siguientes medidas mínimas de manejo:

1. Describir el flujo de los procesos realizados con los RCD.
2. Diseñar y ejecutar las obras de drenaje y de control de sedimentos.
3. Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con la normatividad vigente.
4. Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores de la planta, cuando a ello hubiere lugar.
5. Realizar acciones para evitar la dispersión de partículas.
6. Mantener los RCD debidamente separados de acuerdo al tipo de RCD de que trata el anexo I.

Parágrafo 1. El gestor deberá remitir copia del documento de que trata el presente artículo a la autoridad ambiental competente, dentro de los 30 días calendario siguientes al inicio de actividades de los puntos limpios y plantas de aprovechamiento, para efectos de su seguimiento y control. A dicho documento se le anexarán copia de los permisos, licencias y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, así como copia de la certificación sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial - POT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT o Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT.

Parágrafo 2. Sin perjuicio de lo anterior y en cumplimiento del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 o aquella que la modifique o sustituya, el gestor deberá diseñar e implementar medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia.

"Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones"

Para una capacidad menor a 0.5 veces la producción de RCD generados en el municipio, distrito o región en treinta (30) años, 0 puntos.

5. **Caracteristicas geomorfológicas:** Hace referencia a la incidencia que puede tener sobre el paisaje y el entorno la infraestructura ubicada en el área potencial de disposición final de RCD, asi:

Zona quebrada y encajonada	6 puntos
Zona en media ladera parcialmente encajonada	4 puntos
Zona en media ladera abierta	2 puntos
Zona plana y abierta	0 puntos

6. **Distancia del centroide de generación:** Se refiere a la distancia del área donde se generan la mayor cantidad de RCD del municipio, distrito o región respecto al área potencial para la disposición final de RCD:

Menor a 10 km	4 puntos
Entre 10 Km y 50 km	2 puntos
Mayor a 50 km	0 puntos

7. **Disponibilidad de vías de acceso:** Corresponde a la facilidad y economía que el gestor tiene para llevar los RCD al área potencial en que se efectuará la disposición final de los RCD:

Condiciones de la vía principal (puntaje máximo 2 puntos)

Pavimentada	2 puntos
Afirmado o carreteable	1 punto
Trocha/no existe	0 puntos

Número de vías específicas o ramales de acceso que se desprendan de una vía principal (puntaje máximo 2 puntos)

Dos o más vías	2 puntos
Una vía	1 punto
No hay vías	0 puntos

Condiciones de la vía específica de acceso (puntaje máximo 2 puntos)

Pavimentada	2 puntos
Afirmado o carreteable	1 punto
Trocha/no existe	0 puntos

8. **Densidad poblacional en el área:** Evalúa la posible afectación de la población ubicada en el área de influencia directa del área potencial en la que se realizará la disposición final de RCD:

Entre 0 y 20 habitantes/hectárea	4 puntos
Mayor a 20 y menor a 50 habitantes/hectárea	2 puntos
Mayor o igual a 50 habitantes/hectárea	0 puntos

9. **Uso del suelo:** Evalúa la compatibilidad del área potencial para la disposición final de RCD con la destinación asignada al suelo por el POT, PBOT o EOT, según sea el caso, o los instrumentos que lo desarrollen o complementen.

Uso principal	10 puntos

"Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones"

competente con una antelación de 30 días calendario al inicio de las obras para su respectivo seguimiento y control. Así mismo, el reporte de su implementación con sus respectivos soportes deberá ser remitido a la autoridad ambiental competente dentro de los 45 días calendario siguientes a la terminación de la obra.

Artículo 14. Contenido del programa de manejo ambiental de RCD. El Programa de Manejo Ambiental de RCD, deberá contener como mínimo la información establecida en el Anexo I de la presente resolución.

CAPÍTULO IV
Obligaciones

Artículo 15. Obligaciones de los generadores de RCD. Son obligaciones de los generadores de RCD las siguientes:

1. Los grandes generadores deberán formular, implementar y mantener actualizado el Programa de Manejo Ambiental de RCD.
2. Cumplir con la meta para grandes generadores, establecida en el Artículo 19 de la presente resolución.
3. Los pequeños generadores tienen la obligación de entregar los RCD a un gestor de RCD para que se realicen las actividades de recolección y transporte hasta los puntos limpios, sitios de aprovechamiento o disposición final según sea el caso.

Artículo 16. Obligaciones de los gestores de RCD. Son obligaciones de los gestores de RCD de puntos limpios, plantas de aprovechamiento y sitios de disposición final, las siguientes:

1. Inscribirse ante la autoridad ambiental regional o urbana con competencia en el área donde desarrolla sus actividades.
2. Contar con equipos requeridos, de acuerdo a las actividades de manejo de los RCD que oferte.
3. Expedir constancia al generador que incluya la información contenida en el formato del anexo II, que forma parte integral de la presente resolución.
4. Reportar a la autoridad ambiental competente regional o urbana, en el primer trimestre de cada año, el reporte anual del año inmediatamente anterior, sobre la cantidad y el destino final de los residuos gestionados, de acuerdo con el formato del anexo III, que forma parte integral de la presente resolución.
5. Los gestores que operen puntos limpios o plantas de aprovechamiento, deberán formular e implementar el documento contentivo de las medidas mínimas de manejo ambiental de que trata el Artículo 10 de la presente resolución.
6. Los gestores responsables de la disposición final de RCD, deberán formular e implementar el documento contentivo de las medidas mínimas de manejo ambiental de que trata el Artículo 12 de la presente resolución.

Artículo 17. Obligaciones de los municipios y distritos. Son obligaciones de los municipios y distritos las siguientes:

1. Ajustar el Programa de Gestión de RCD del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS municipal o regional, teniendo en cuenta lo dispuesto en la presente resolución.
2. Promover campañas de educación, cultura y sensibilización sobre la Gestión Integral de RCD.

322

"Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones"

Artículo 21. Vigencia y derogatorias. La presente resolución entra en vigencia a partir del primero (1) de enero de 2018 y deroga a partir de la misma fecha la Resolución 541 de 1994.

El requisito establecido en el numeral 3 del Artículo 10 de la presente resolución, se hará exigible a los doce (12) meses, contados a partir de la vigencia de la misma.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los

LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Proyectó:
Carlos Jairo Ramírez R
Carlos Manuel Pineda T / Cristian Rivera Machado

Revisó:
Willer Edilberto Guevara H – Director de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana
Jaime Asprilla Manyoma – Jefe Oficina Asesora Jurídica
Claudia F Carvajal M / Luz Stella Rodriguez J

Aprobó:
Carlos Alberto Botero – Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

923

"Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones"

ANEXO I. FORMATO ÚNICO PARA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

1. DATOS DEL GENERADOR	
Nombre o razón social	
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	
Dirección	
Teléfono	
Correo electrónico	
2. DATOS DE LA OBRA	
Nombre de la obra	
Ubicación de la obra (Municipio o distrito, dirección o georreferenciación)	
Área del lote del proyecto (m^2) (si aplica)	
Área a construir (m^2)	
Copia de licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencia de intervención y ocupación del espacio público (si aplica)	
Copia de la orden judicial o administrativa o certificado expedido por la autoridad municipal o distrital competente según el caso, en los eventos previstos en el inciso 2 del numeral 7 del artículo 2.2.6.1.1.7. y el Parágrafo 2 del artículo 2.2.6.1.1.12. del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya (si aplica)	
Tiempo estimado de ejecución de la obra	
Fecha de inicio de la obra	
Fecha estimada de finalización de la obra	
Total de materiales de construcción a utilizar en la obra (t)	

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE GENERACIÓN DE RCD
Describa brevemente las actividades de prevención y reducción de generación de RCD que implementará en la obra

4. PROYECCION DE RCD A GENERAR	
TIPO DE RCD	**TONELADAS (t)**
1. **Residuos de construcción y demolición –RCD- susceptibles de aprovechamiento:**	
1.1. Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	
1.2. Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	
1.3. Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	
1.4. No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimientos de zinc o estaño, plásticos tales como PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, compuestos de madera o cartón-yeso (drywall), entre otros.	
2. **Residuos de construcción y demolición –RCD- no susceptibles de aprovechamiento:**	
2.1. Los contaminados con residuos peligrosos.	
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	
2.3. Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	

"Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones"

productos de la excavación, entre otros.					
1.2. Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.					
1.3. Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.					
1.4. No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimientos de zinc o estaño, plásticos tales como PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, compuestos de madera o cartón-yeso (drywall), entre otros.					
2. Residuos de construcción y demolición –RCD- no susceptibles de aprovechamiento:					
2.1. Los contaminados con residuos peligrosos.					
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.					
2.3. Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.					

9.2 INDICADORES

NUMERO	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR
1	Cantidad de materiales de construcción usados en la obra (t/obra)	
2	Cantidad de RCD generado en la obra (t/obra)	
3	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t/obra)	
4	Cantidad de RCD recibido en punto limpio (t/obra)	
5	Cantidad de RCD recibido en planta de aprovechamiento de RCD (t/obra)	
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t/obra)	

10. METAS

Para el cálculo de la meta de aprovechamiento (artículo 19), el generador tendrá en cuenta lo siguiente:

OPCIONES DE APROVECHAMIENTO	TONELADA (t)	PORCENTAJE
Materiales de construcción utilizados en la obra fabricados a partir RCD (certificado por el fabricante).		
RCD aprovechados en la Obra.		
RCD entregados a una Planta de aprovechamiento.		
Total (t)		

Cordialmente,

_____

FIRMA (Gestor de RCD)

C.C. o NIT

NOMBRE

"Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones"

ANEXO III. FORMATO PARA EL REPORTE ANUAL DE GESTORES A AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA AÑO_____

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN O NIT	REPRESENTANTE LEGAL	ACTIVIDAD REALIZADA POR EL GESTOR	TONELADAS AÑO DE RCD ALMACENADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS AÑO DE RCD APROVECHADO	TONELADAS AÑO DE RCD DISPUESTO FINALMENTE

Cordialmente,

_____

FIRMA (Gestor de RCD)

C.C. o NIT

NOMBRE

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901154120
N SOCIAL			AM ARCHITECS SAS
IO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
	CL 3 OE 66 350 C45	TELÉFONO:	3802434
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
ENTACIÓN:	ÚNICO		SI
INERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7907690762	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/01/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			398687332

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES	1	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,100	$ 0	$ 185,600	$ 1,100	$ 186,700
									$ 185,600	**$ 1,100**	**$ 186,700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 92,800	$ 0	$ 600	$ 0	$ 92,800	$ 600	$ 0	$ 93,400
												$ 92,800	**$ 600**	**$ 0**	**$ 93,400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 131,300	$ 131,300	$ 800	$ 0	$ 132,100
								$ 131,300	**$ 800**	**$ 0**	**$ 132,100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF57-COMFANDI	2	$ 92,800	$ 600	$ 93,400
		$ 92,800	**$ 600**	**$ 93,400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
ARIN CHEVERRY LEJANDRA	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO		SI																
ARIN GONZALEZ ALSON DE JESUS	DEPEND	AEQ COMP PENS	$ 1,160,000	FIJO		SI																

SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$

SALUD: ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES: IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 46,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,160,000	$	$ 50,500	$ 1,160,000	CCF57-COMFANDI	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 46,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,160,000	$	$ 80,800	$ 1,160,000	CCF57-COMFANDI	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 505,600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901772637
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CONSORCIO PARQUES DEL VALLE
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CL 3 OESTE 59 350	TELEFONO:	3113007
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7917240269	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre ANO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero ANO	2024
DIAS DE MORA:			50				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/03/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			485407926

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 0	$ 74.700	$ 3.400	$ 78.100
230201	230201- PROTECCIÓN	1	$ 95.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.400	$ 0	$ 96.000	$ 4.400	$ 100.400
SUBTOTALES:										**$ 170.700**	**$ 7.800**	**$ 178.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 42.700	$ 2.000	$ 0	$ 44.700
SUBTOTALES:													**$ 42.700**	**$ 2.000**	**$ 0**	**$ 44.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 74.500	$ 74.300	$ 3.400	$ 0	$ 77.700
SUBTOTALES:									**$ 74.300**	**$ 3.400**	**$ 0**	**$ 77.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	2	$ 42.700	$ 2.000	$ 44.700
SUBTOTALES:			**$ 42.700**	**$ 2.000**	**$ 44.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR	RESIDENTE FISCAL EN COLOMBIA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1112323151	SANCHEZ ROBLEDO JEFERSON	SUFENO		$ 2.000.000	FIJO			SI	27															230301-PORVENIR	4	$ 466.667	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 74.700	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 466.667	$ 18.700	$ 0	$ 18.700	14-11 - ARL SURA	4	$ 466.667	1	$ 32.500	4	$ 466.667	CCF57-COMFANDI	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1144033281	CONTRERAS PALACIO FABIAN DAVID	SUFENO		$ 4.000.000	FIJO			SI	27															230201-PROTECCIÓN	4	$ 600.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 95.900	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 24.000	14-11 - ARL SURA	4	$ 600.000	1	$ 41.800	4	$ 600.000	CCF57-COMFANDI	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 345.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901154130
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			AM ARCHITECS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CL 3 OE 50 350 C45	TELÉFONO:	3892434
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	7912205600	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS				
PERIODO COTIZACION OTROS:	MES enero AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2024				
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	432747476				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS			FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208,000	$ 0	$ 208,000	
SUBTOTALES:										**$ 208,000**	**$ 0**	**$ 208,000**	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104,000	$ 0	$ 0	$ 104,000
SUBTOTALES:													**$ 104,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 104,000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0			$ 147,100	$ 147,100	$ 0	$ 0	$ 147,100	
SUBTOTALES:									**$ 147,100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 147,100**	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	2	$ 104,000	$ 0	$ 104,000
SUBTOTALES:			**$ 104,000**	**$ 0**	**$ 104,000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IHS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DIAS	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1107054011	MARIN ECHEVERRY ALEJANDRA	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 0	$ 52,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,300,000		$ 58,600	30	$ 1,300,000	CCF57-COMFANDI	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1518948	MARIN GONZALEZ WILSON DE JESUS	DEPEND	REGTEMP PENS	$ 1,300,000	FIJO		SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 0	$ 52,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,300,000		$ 90,500	30	$ 1,300,000	CCF57-COMFANDI	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 563,100

3210

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Itaú

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901772637
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO PARQUES DEL VALLE
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALI DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CL 3 OESTE 56 350	TELÉFONO:	3113007
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7913933308	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			432765006

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 720.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 152.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	7	$ 961.800
		SUBTOTAL:	10	**$ 1.834.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	$ 19.100
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 332.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 26.000
817001773	EPSIC3	EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	1	$ 19.100
901021565	ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	4	$ 62.500
		SUBTOTAL:	10	**$ 458.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890303208	CCF57	CCF57-COMFANDI	10	$ 458.800
		SUBTOTAL:	10	**$ 458.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	10	$ 798.200
		SUBTOTAL:	10	**$ 798.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.550.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.550.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901772837
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO PARQUES DEL VALLE
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CL 3 OESTE 54 100	TELÉFONO:	3113007
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7913933308	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	enero AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/02/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			432785006

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	7	$ 961.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 961.800	$ 0	$ 961.800
230201	230201- PROTECCION	1	$ 720.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 720.000	$ 0	$ 720.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 152.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.600	$ 0	$ 152.600
SUBTOTALES:										**$ 1.834.400**	**$ 0**	**$ 1.834.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC19	ESSC19 - EMSSANAR S.A.S.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 62.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.500	$ 0	$ 0	$ 62.500
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 19.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 332.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.100	$ 0	$ 0	$ 332.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 26.000
EPS103	EPS103-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 19.100
SUBTOTALES:													**$ 458.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 458.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 798.200	$ 798.200	$ 0	$ 0	$ 798.200
SUBTOTALES:									**$ 798.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 798.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	10	$ 458.800	$ 0	$ 458.800
SUBTOTALES:			**$ 458.800**	**$ 0**	**$ 458.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: martes, 06 de febrero de 2024 03:41:56 PM

Período del informe: Desde el 01 de enero de 2024 hasta el 06 de febrero de 2024

Pagada 06/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	REESTRUCTURAMOS TUS ESPACIOS SAS	**Sucursal**	01 ATH GRUPO EMPRESARIAL
Documento	NI901204712	**Dirección**	CR 3 #12 - 50 PISO 3
Tipo de Empresa		**Teléfono**	2179293
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	CARTAGO	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	ARIAS LONDOÑO GIOVANNY ENRIQUE	**Identificación**	CC16930378

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras							IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1112783291	BERNAL LONDOÑO JAUNER ENRIQUE	1061108542	06/02/2024	202401	202402	X																	14	14	14	14	231001	EPS018	14-11	CCF30	$606.667	$606.667	$606.667	$1.000	$97.100	$24.300	$42.300	$100	$0	$0	$0	$0	$163.800
CC 1002593079	URREA GUTIERREZ JUAN PABLO	1061108542	06/02/2024	202401	202402	X	X																20	20	20	20	230301	EPS037	14-11	CCF30	$866.667	$866.667	$866.667	$1.000	$138.700	$34.700	$60.400	$100	$0	$0	$0	$0	$233.900
CC 1006268441	OSPINA GUTIERREZ JUAN ANDRES	1061108542	06/02/2024	202401	202402	X																	21	21	21	21	25-14	EPS005	14-11	CCF30	$910.000	$910.000	$910.000	$1.000	$145.600	$36.400	$63.400	$100	$0	$0	$0	$0	$245.500
CC 7554850	GUTIERREZ GARCIA SILVIO	1061108542	06/02/2024	202401	202402	X																	21	21	21	21	230301	EPS041	14-11	CCF30	$910.000	$910.000	$910.000	$1.000	$145.600	$36.400	$63.400	$100	$0	$0	$0	$0	$245.500
CC 7548947	OSPINA GARCIA HEBER	1061108542	06/02/2024	202401	202402	X																	21	21	21	21	231001	EPS037	14-11	CCF30	$910.000	$910.000	$910.000	$1.000	$145.600	$36.400	$63.400	$100	$0	$0	$0	$0	$245.500
CC 1112791922	RAMIREZ MORALES RICHARD JANOVER	1061108542	06/02/2024	202401	202402	X																	14	14	14	14	230301	EPS037	14-11	CCF30	$606.667	$606.667	$606.667	$1.000	$97.100	$24.300	$42.300	$100	$0	$0	$0	$0	$163.800
CC 4479304	GUTIERREZ GARCIA GREGORIO	1061108542	06/02/2024	202401	202402	X	X																14	14	14	14	231001	EPS037	14-11	CCF30	$606.667	$606.667	$606.667	$1.000	$97.100	$24.300	$42.300	$100	$0	$0	$0	$0	$163.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: martes, 06 de febrero de 2024 03:41:56 PM

Período del informe: Desde el 01 de enero de 2024 hasta el 06 de febrero de 2024

Pagada 06/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	REESTRUCTURAMOS TUS ESPACIOS SAS	**Sucursal**	01 ATH GRUPO EMPRESARIAL
Documento	NI901204712	**Dirección**	CR 3 #12 - 50 PISO 3
Tipo de Empresa		**Teléfono**	2179293
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	CARTAGO	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	ARIAS LONDOÑO GIOVANNY ENRIQUE	**Identificación**	CC16930378

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras							IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1112783291	BERNAL LONDOÑO JAUNER ENRIQUE	1061108542	06/02/2024	202401	202402	X																14	14	14	14	231001	EPS018	14-11	CCF30	$606.667	$606.667	$606.667	$1.000	$97.100	$24.300	$42.300	$100	$0	$0	$0	$0	$163.800
CC 1002593079	URREA GUTIERREZ JUAN PABLO	1061108542	06/02/2024	202401	202402	X	X															20	20	20	20	230301	EPS037	14-11	CCF30	$866.667	$866.667	$866.667	$1.000	$138.700	$34.700	$60.400	$100	$0	$0	$0	$0	$233.900
CC 1006288441	OSPINA GUTIERREZ JUAN ANDRES	1061108542	06/02/2024	202401	202402	X																21	21	21	21	25-14	EPS005	14-11	CCF30	$910.000	$910.000	$910.000	$1.000	$145.600	$36.400	$63.400	$100	$0	$0	$0	$0	$245.500
CC 7554850	GUTIERREZ GARCIA SILVIO	1061108542	06/02/2024	202401	202402	X																21	21	21	21	Z30301	EPS041	14-11	CCF30	$910.000	$910.000	$910.000	$1.000	$145.600	$36.400	$63.400	$100	$0	$0	$0	$0	$245.500
CC 7549947	OSPINA GARCIA HEBER	1061108542	06/02/2024	202401	202402	X																21	21	21	21	231001	EPS037	14-11	CCF30	$910.000	$910.000	$910.000	$1.000	$145.600	$36.400	$63.400	$100	$0	$0	$0	$0	$245.500
CC 1112791922	RAMIREZ MORALES RICHARD JANOVER	1061108542	06/02/2024	202401	202402	X																14	14	14	14	230301	EPS037	14-11	CCF30	$606.667	$606.667	$606.667	$1.000	$97.100	$24.300	$42.300	$100	$0	$0	$0	$0	$163.800
CC 4479804	GUTIERREZ GARCIA GREGORIO	1061108542	06/02/2024	202401	202402	X	X															14	14	14	14	231001	EPS037	14-11	CCF30	$606.667	$606.667	$606.667	$1.000	$97.100	$24.300	$42.300	$100	$0	$0	$0	$0	$163.800

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
