I. IDENTIFICACION

CONTRATO No. **423 de 2023**	CONVENIO No. **N/A**	OS No. **N/A**

INFORME DE: **SUPERVISIÓN** _____ **INTERVENTORÍA** __**X**__

CONTRATISTA: SOFOR INGENIEROS S.A.S

OBJETO: ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

FECHA DE SUSCRIPCION: 13 de octubre de 2023.

FECHA DE INICIO: 08 noviembre de 2023.

PLAZO INICIAL: Diez (10) meses a partir de la suscripción del acta de inicio.

FECHA DE SUSPENSION 1: N/A

FECHA DE REINICIO 1: N/A

FECHA DE OTROSI: 26 de marzo de 2024

FECHA DE TERMINACION: 07 de septiembre de 2024.

FECHA DEL INFORME: 06 de mayo de 2024.

II. ANTECEDENTES (BITACORA)

- El 13 octubre de 2023 se suscribe el contrato de obra No.423 de 2023, entre la entidad contratante CAM y el contratista de obra SOFOR INGENIEROS S.A.S.
- El 30 de octubre de 2023 se suscribe el contrato de consultoría No.437 de 2023, entre la entidad contratante CAM y el contratista de consultoría CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
- El 08 de noviembre de 2023 se firma el acta de inicio de los contratos No.423 y No.437 de 2023.
- A partir del 20 de noviembre de 2023 se iniciaron las visitas conjuntas a los predios objeto del contrato, entre contratista de obra, Interventoría y CAM, con el fin de realizar un diagnóstico de la situación real de las actividades a ejecutar en cada uno de los predios conforme al alcance de los ítems del contrato y así definir o resolver cada caso,

para que el contratista pueda programar y desarrollar la logística para el inicio de las actividades contractuales.

- El 06 de diciembre de 2023 se culminaron las visitas a los predios, se socializa con el Supervisor las situaciones encontradas que requieren de definiciones por parte de la Entidad contratante y se convoca a comité el 13 de diciembre de 2023.
- El 13 de diciembre de 2023 se realizó comité técnico entre las partes, donde se definieron situaciones en cuanto a: 1) Modificaciones en el trazado de aislamientos. 2) Decisiones de propietarios de predios sobre aceptación de las actividades contractuales. 3) Situaciones de áreas disponibles para la reforestación.
- Durante las últimas semanas del mes de diciembre se iniciaron las actividades propias para la instalación de aislamientos (ahoyado, hincado).
- Mediante comité técnico del día 22 de diciembre de 2023, se aceptó el cambio de material para los postes para pie de amigo y cuando haya cambio de dirección en madera rolliza, al igual que la solicitud de no corte del alambre a los 60 metros en algunos predios, los cuales fueron justificados técnicamente y soportados para la respectiva modificación al proceso constructivo.
- El 03 de enero de 2024, se aprobó por parte de la CAM el cambio de especies para la siembra en el predio Resguardo Huila Rionegro en el municipio de Iquira, de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista de obra, en atención a lo recomendado por la comunidad indígena, teniendo en cuenta las especies aptas para dicha zona.
- El 11 de enero de 2024, se hizo entrega del **primer informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 08 al 30 de noviembre de 2023, cargado al Secop II.
- El 22 de enero de 2024 se realizó comité técnico entre las partes, donde se definieron situaciones y pactaron compromisos en cuanto a: 1) Apisonado y profundidad de los postes, 2) Caso recibo por parte del propietario del predio ubicado en la vereda Mensura del municipio de Palestina, 3) Agilidad con la Gobernación para los cambios requeridos en los 5 predios del municipio de Santa María, en el predio del municipio de Elías y en un predio del municipio de Paicol, 4) Actas de recibo con visto bueno de la Interventoría.
- El 30 de enero de 2024, se hizo entrega del **segundo informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2023, cargado al Secop II.
- El 14 de febrero de 2024 se realizó comité técnico de obra, donde se definió el procedimiento a seguir en cuanto a las siguientes situaciones: 1) Actividad de siembra en el Resguardo Huila Río Negro en el municipio de Iquira, 2) Acta de aprobación de la Gobernación por el cambio de predios, 3) Mano de obra para las actividades en el municipio de Neiva, 4) Aprovechamiento forestal.
- El 22 de febrero de 2024, se hizo entrega del **tercer informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2024, cargado al Secop II.

- El 26 de marzo de 2024 se suscribió el Otrosí No.1 modificatorio al contrato de obra por cambio de predios en municipios del convenio entre la Gobernación del Huila y la CAM.
- El 01 de abril de 2024, se hizo entrega del **cuarto informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2024, cargado al Secop II.
- El 30 de abril de 2024, se hizo entrega del **quinto informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2024, cargado al Secop II.
- El 04 de mayo de 2024, se hizo entrega del **sexto informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2024, cargado al Secop II.
- El presente informe corresponde al periodo informado desde el 01 de marzo de 2024 al 30 de abril de 2024.

III. ANALISIS DE EJECUCION FISICA

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	GENERALIDADES		
1	Dar estricto y cabal cumplimiento a las actividades y cantidades enunciadas en las condiciones técnicas exigidas y contempladas en el análisis técnico del presente documento, y con las especificaciones y lugares allí enunciados.	**35,65%**	El contratista de obra durante el periodo informado dio cumplimiento a las actividades establecidas en el contrato conforme a las especificaciones técnicas.
2	Preparar y sustentar informes técnicos de avance mensual de las metas establecidas en cada una de las actividades. Dicho informe estará soportado con registros fotográficos, actas, entre otros que se puedan anexar.	**35,65%**	El contratista preparó y sustentó los informes técnicos de avance mensual.
3	Proponer a la Subdirección de Gestión Ambiental de la CAM, las medidas necesarias para optimizar la implementación de las actividades, si a ello hay lugar.	**35,65%**	El contratista propuso las medidas necesarias para optimizar la implementación de las actividades.

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4	Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato, según cronograma.	**35,65%**	El contratista presentó la reprogramación correspondiente a desarrollar durante el periodo, para el cumplimiento contractual. Anexo (1)
5	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la entidad contratante y/o la Interventoría contratada para tal fin.	**35,65%**	El contratista acató cada una de las instrucciones dadas por la interventoría y la entidad.
6	Realizar salidas de campo a que haya lugar para verificar con la cartografía entregada por la CAM de los predios a intervenir.	**35,65%**	El contratista realizó salidas de campo para verificar con la cartografía entregada por la CAM. Entregan track definitivos (en formato digital)
7	Realizar antes de dar inicio a las obras una (1) reunión con los propietarios de predios y las comunidades asentadas en el territorio donde se ejecutarán las actividades contractuales, de acuerdo a los sitios indicados en el presente estudio, así como también con el municipio de Neiva en su calidad de propietario de predios de la zona de la reserva, socializando el alcance de las actividades que se desarrollarán y el objetivo de conservación que se persigue con el desarrollo de la misma.	**35,65%**	El contratista durante el periodo realizó las reuniones con los propietarios de predios y las comunidades asentadas en el territorio donde se ejecutarán las actividades, antes de dar inicio a las obras. Actas de visita diagnóstico, las cuales fueron anexadas en los informes mensuales de obra No.1, No.2, No.3 y No.4
8	Coordinar el equipo interdisciplinario solicitado en el acápite 5.1.8 "PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, garantizando el cumplimiento del porcentaje de dedicación de los profesionales en la obra y sitios señalados en el presente estudio previo.	**35,65%**	El contratista coordinó el equipo interdisciplinario mínimo requerido, garantizando porcentaje de dedicación de los profesionales en la obra.
9	El Equipo técnico deberá prestar apoyo y acompañamiento	**35,65%**	El contratista prestó apoyo y acompañamiento con su equipo de trabajo a los beneficiarios, para realizar cambios donde fue necesario.

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	permanente a los beneficiarios de todas y cada una de las actividades del contrato, en el evento justificado en que se haga necesario el cambio de un usuario o beneficiario de las actividades a realizar, deberá informar a la interventoría del Contrato y a la CAM a efectos de que se proceda a analizar de manera conjunta el reemplazo del beneficiario.		
10	Levantar actas de entrega y recibo a satisfacción de todas y cada una de las actividades que se desarrollarán en el presente contrato, entre el Contratista y cada uno de los beneficiarios directos de las actividades, los formatos de estas actas deberán ser concertados aprobados por la Supervisión.	**35,65%**	El contratista de obra levantó actas de recibo a satisfacción a cada beneficiario de las actividades realizadas en el periodo para cada predio. Anexo (2)
11	Suministrar los materiales e insumos necesarios para la implementación de las actividades contempladas, los cuales deben tener el visto bueno de la interventoría.	**35,65%**	El contratista suministro los materiales necesarios para realización de las actividades.
12	Presentar los permisos de aprovechamiento forestal y de movilización de la madera que se utilizará para los respectivos aislamientos de zonas de nacimiento del recurso hídrico en los ecosistemas estratégicos.	**35,65%**	El contratista presento permisos de aprovechamiento forestal y de movilización de madera para los respectivos aislamientos. Anexo (3)
13	Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el artículo 1 Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2033, Ley 1122 de	**35,65%**	El contratista mantuvo asegurado el personal a todo lo exigido por la ley, tales como salud, pensión, ARL y aportes parafiscales. Entregados en el informe mensual de obra No.5 y 6.

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	2007, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concertantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) y aportes parafiscales, según el caso.		
14	El contratista deberá proveer mano de obra en un porcentaje no menor del 5% ni mayor al 10% de la ejecución contractual, a población en pobreza extrema, o desplazados por la violencia, o personas en proceso de reintegración o reincorporación y/o sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad del objeto contratado. La inobservancia de tal obligación, generará incumplimiento del nexo contractual, por lo que, la CAM, podrá utilizar la potestad sancionatoria respetando la garantía del debido proceso, para el oportuno cumplimiento de la obligación en cita.	**35,65%**	El contratista contrató la mano de obra con personal de la zona de influencia del proyecto.
OBLIGACIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
15	Realizar el pago de aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales, según el caso, durante la ejecución del objeto contractual;	**35,65%**	El contratista cumplió con los pagos a seguridad social del personal contratado. Entregados en los informes mensuales de obra No.4.
16	Los profesionales vinculados al proyecto deben contar con tarjeta profesional vigente;	**35,65%**	Los profesionales vinculados cuentan con tarjeta profesional vigente.
17	El personal vinculado a la ejecución del proyecto debe contar con el esquema de vacunas	**35,65%**	El personal vinculado cuenta con esquema de vacunación completo. Entregados en el informe mensual de obra No.1.

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td>completo para tétano y Hepatitis B. conforme al profesiograma de exámenes médico ocupacionales con vigencia máximo de 2 años y anexar el carné;</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td>Adoptar la política “Cero Papel” y demás programas de uso eficiente y ahorro de recursos, implementada por la CAM a través del Sistema Integrado de Gestión</td><td>35,65%</td><td>El contratista cuenta con política de “Cero papel” y demás programas de uso eficiente de los recursos.</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Mantener libre de residuos las áreas de trabajo y realizar la disposición adecuada de los mismos.</td><td>35,65%</td><td>El contratista cumplió con la limpieza de las áreas de trabajo una vez terminada la jornada laboral.</td></tr>
<tr><td colspan="4">OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Aislamiento en zonas de protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas.</td><td>47,96%</td><td>El contratista de obra ejecutó la actividad de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de obra.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Aislamiento en zonas de protección de la cuenca hidrográfica del rio Las Ceibas</td><td>ML</td><td>35.467,00</td><td>16.511,00</td><td>47,96%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del rio Las Ceibas.</td><td>0%</td><td>El contratista de obra en este periodo no realizo la restauración activa en la cuenca del rio Las Ceibas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del rio Las Ceibas</td><td>HA</td><td>10,00</td><td>0</td><td>0,00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA).</td><td>10%</td><td>El contratista de obra realizo la restauración activa en el macizo colombiano, de acuerdo a las especificaciones técnicas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)</td><td>HA</td><td>30,00</td><td>3,00</td><td>10,00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="4">OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA</td></tr>
<tr><td></td><td>Promedio de % Cumplimiento</td><td>35,65%</td><td>Según Acta de recibo parcial No.3 de obra y memoria de cantidades Anexo (4).</td></tr>
</table>

IV. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA

CONDICIONES ACTUALIZADAS						OBRA EJECUTADA			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%
1	Aislamiento en zonas de proteccion de la cuenca hidrografica del rio Las Ceibas	ML	35467	$ 1.043.663.666,70	69,30%	17.011	$ 500.571.308,0	33,24%	18.456	$ 543.092.359	36,06%
2	Procesos de restauracion activa en areas de conservacion de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrografica del rio Las Ceibas	HA	10	$ 99.271.144,25	6,59%	0,00	$ -	0,00%	10,00	$ 99.271.144	6,59%
3	Implementar procesos de restauracion activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)	HA	30	$ 363.029.655,05	24,11%	3,00	$ 36.302.966,00	2,41%	27,00	$ 326.726.689	21,70%
	VALOR TOTAL			**$ 1.505.964.466,00**	**100,00%**		**$ 536.874.274**	**35,65%**		**$ 969.090.192**	**64,35%**

Actividad o producto	Valor Programado	Valor Ejecutado	Valor por Ejecutar	% de Ejecución	OBSERVACIONES
Adelantar procesos de restauración activa y pasiva para consolidar las áreas de recarga hídrica en la zona de reserva forestal del río Las Ceibas, reservas naturales de la sociedad civil, bosque seco tropical, humedales y la ejecución del proyecto "fortalecimiento de los ecosistemas estratégicos en el macizo colombiano del departamento del Huila.	$1.505.964.466,00	$536.874.274,00	$969.090.192,00	35,65%	A la fecha las cantidades ejecutadas, en el valor del contrato alcanzó un porcentaje equivalente al 35,65% del valor inicial. En general, se está cumpliendo con las actividades de obra, conforme a los diseños y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

V. OTROS

CONCEPTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión)	X		Se anexa planilla de pago de seguridad social del equipo técnico en los meses de ejecución del presente contrato.
Modificación de garantías			No aplica
Cláusulas de responsabilidad ambiental	X		
Cláusulas de responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo.	X		
Otros (Explicar)			No aplica

VI. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (APLICA PARA INFORMES PARCIALES Y SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA)

Calificación Promedio mínima aceptable 3,5

VALORACION DE LA CALIFICACION

- **De 1 a 3,5: No confiable**
- **De 3,6 a 4,5: Confiable**
- **De 4,6 a 5: Muy confiable**

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño técnico	4.5
Oportunidad en entrega	5.0
Cantidad entregada	5.0
Responsabilidad Ambiental	4.7
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	4.7
PROMEDIO CALIFICACION	**4.8**

VII. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

El contratista de obra ha cumplido con las obligaciones específicas del contrato, entregando a satisfacción un total de 4.172 metros lineales de aislamiento los cuales fueron: (250 ml) parciales en el municipio de Paicol vereda El Carmen predio RNSC Pedregal, (1009 ml) parciales en el municipio de Neiva vereda San Miguel predio Buenavista, (500 ml) parciales predio Veraguas vereda Santa Lucia del municipio de Neiva; (200 ml) terminados en el municipio de Acevedo, vereda Tocora, predio La Rovira, (400 ml) en el municipio de El Pital vereda Alto Libado predio RNSC Frontera, (800 ml) en el municipio de Pitalito Vereda Charguayaco predio El Recreo, (200 ml) en el municipio de Aipe en la vereda San Isidro predio Granizo, (200 ml) en el municipio de Aipe en la vereda San Isidro predio Indial, (200 ml) en el municipio de Aipe en la vereda San Isidro predio Hospital (200 ml) en el municipio de Aipe en la vereda San Isidro predio Guacharacas y (213 ml) en el municipio de Aipe en la vereda San Isidro predio Guamitos, estas actividades son correspondientes al 7,18% de las actividades ejecutadas en el contrato por el valor de $ $ 122.766.651,00. En aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO: "…*La Corporación pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, mediante pagos parciales según avance de obra del objeto contractual y recibido a entera satisfacción, la cual se da por atendida mediante la suscripción del Acta de Recibo Parcial por parte de la interventoría. Todos los pagos deberán contar con el visto bueno del interventor designado por la Corporación y del supervisor del contrato de*

interventoría, y la certificación de recibo a satisfacción de las obras entregadas se realizará previa entrega del informe de actividades con el respectivo soporte fotográfico, informe de interventoría, parcial o final y suscripción de la respectiva acta parcial o final, así como la presentación de la factura correspondiente..."; la Interventoría considera conveniente adelantar el trámite para el segundo pago correspondiente a **$122.766.651,00** M/cte., según acta de recibo parcial No.3 de obra, que comprende el período de ejecución desde el 01 de marzo de 2024 al 30 de abril de 2024; de este modo se autoriza el correspondiente desembolso, de la siguiente manera:

DESCRIPCION	VALOR ($)
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 3	$ 122.766.651,00
RECURSOS - CONVENIO - CAM	$ 78.362.318,00
RECURSOS CEIBAS	$ 44.404.333,00
AMORTIZACION ANTICIPO	N/A
VALOR A PAGAR	**$ 122.766.651,00**

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista de Interventoría

ANEXO 1
REPROGRAMACIÓN INICIAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V.PARCIAL	% INCIDENCIA	MES 1				MES 2													
							SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17
							8/11/2023	19/11/2023	26/11/2023	3/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	24/12/2023	31/12/2023	7/01/2024	14/01/2024	21/01/2024	28/01/2024	4/02/2024	11/02/2024	18/02/2024	25/02/2024	3/03/2024	10/03/2024
1	VISITAS DIAGNÓSTICAS	Global	1																					
2	AISLAMIENTOS EN ZONAS DE PROTECCIÓN DE LA CUENCA HIDROGRAFRICA DEL RIO LAS CEIBAS	ML	35467	23408	$ 830.215.310	55,13%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.098.648	$ 29.336.349	$ 22.782.079	$ 17.749.336	$ 19.212.343	$ 19.212.343	$ 30.916.396	$ 29.846.311	$ 24.434.162	$ 16.592.446	$ 25.955.689	$ 25.831.472	$ 12.429.705	$ 48.711.015
	PROGRAMADO ACUMULADO										$ 7.098.648	$ 36.434.996	$ 59.217.075	$ 76.966.411	$ 96.178.754	$ 115.391.097	$ 146.307.492	$ 176.153.803	$ 200.587.965	$ 217.180.411	$ 243.136.100	$ 268.967.572	$ 281.397.277	$ 330.108.292
	EJECUTADO EN COSTOS DIRECTOS						$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.098.648	$ 29.336.349	$ 22.782.079	$ 17.749.336	$ 19.212.343	$ 19.212.343	$ 30.916.396	$ 29.846.311	$ 24.434.162	$ 16.592.446	$ 21.274.067	$ 25.831.472	$ -	$ -
	EJECUTADO ACUMULADO									$ -	$ 7.098.648	$ 36.434.996	$ 59.217.075	$ 76.966.411	$ 96.178.754	$ 115.391.097	$ 146.307.492	$ 176.153.803	$ 200.587.965	$ 217.180.411	$ 238.454.479	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951
	PROGRAMADO %						0%	0%	0%	0%	1%	4%	3%	2%	2%	2%	4%	4%	3%	2%	3%	3%	1%	6%
	EJECUTADO %						0%	0%	0%	0%	1%	4%	3%	2%	2%	2%	4%	4%	3%	2%	3%	3%	0%	0%
2.1	MUNICIPIO DE NEIVA	ML	20000	23408	$ 468.162.128	31%																	$ 12.429.705	$ 12.429.705
	EJECUTADO				$ -																		$ -	$ -
	Programado																						3%	3%
	Ejecutado																						0%	0%
2.1.1	VEREDA LA PLATA PREDIO LA CAROLINA	ML	6450	23408	$ 150.982.286	10,03%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							
	Hincado																							
	Templado y grapado																							
	EJECUTADO				$ -																			
	Programado																							
	Ejecutado																							
2.2	VEREDA LA PLATA PREDIO HIMALAYA	ML	1280	23408	$ 29.962.376	1,99%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							
	Hincado																							
	Templado y grapado																							
	EJECUTADO				$ -																			
	Programado																							
	Ejecutado																							
2.3	VEREDA LA PLATA PREDIO LA HURRACA	ML	230	23408	$ 5.383.864	0,36%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							
	Hincado																							
	Templado y grapado																							
	EJECUTADO				$ -																			
	Programado																							
	Ejecutado																							
2.4	VEREDA LA PLATA PREDIO LOTE No.4 LA CORPORCIÓN	ML	960	23408	$ 22.471.782	1,49%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							
	Hincado																							
	Templado y grapado																							
	EJECUTADO				$ -																			
	Programado																							
	Ejecutado																							
2.5	VEREDA LA PLATA PREDIO LA COLONIA	ML	400	23408	$ 9.363.243	0,62%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							
	Hincado																							
	Templado y grapado																							
	EJECUTADO				$ -																			
	Programado																							
	Ejecutado																							
2.6	VEREDA PUEBLO NUEVO PREDIO BARCELONA	ML	422	23408	$ 9.878.221	0,66%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							
	Hincado																							
	Templado y grapado																							
	EJECUTADO				$ -																			
	Programado																							
	Ejecutado																							
2.7	VEREDA PUEBLO NUEVO PREDIO EL CEDRAL	ML	836	23408	$ 19.569.177	1,30%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							
	Hincado																							
	Templado y grapado																							
	EJECUTADO				$ -																			
	Programado																							
	Ejecutado																							
2.8	VEREDA SAN BARTOLO PREDIO SAN ANDRES - LA ROSA	ML	1590	23408	$ 37.218.889	2,47%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							
	Hincado																							
	Templado y grapado																							
	EJECUTADO				$ -																			
	Programado																							
	Ejecutado																							
2.9	VEREDA SAN BARTOLO PREDIO ARMENIA	ML	2350	23408	$ 55.009.050	3,65%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							
	Hincado																							
	Templado y grapado																							
	EJECUTADO				$ -																			
	Programado																							
	Ejecutado																							
2.10	VEREDA SAN BARTOLO PREDIO VILLA CLAUDIA	ML	430	23408	$ 10.065.486	0,67%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							
	Hincado																							
	Templado y grapado																							
	EJECUTADO				$ -																			
	Programado																							
	Ejecutado																							
2.11	VEREDA SAN BARTOLO PREDIO LA ESPERANZA	ML	366	23408	$ 8.567.367	0,57%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							
	Hincado																							
	Templado y grapado																							
	EJECUTADO				$ -																			
	Programado																							
	Ejecutado																							
2.12	VEREDA SANTA LUCIA PREDIO VERAGUAS	ML	1770	23408	$ 41.432.348	2,75%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							


	Transporte menor																												
	Hincado																												
	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ -																								
	Programado																												
	Ejecutado																												
2.13	**VEREDA TUQUILA PREDIO LA CABAÑA**	ML	110	23408	$ 2.574.892	0,17%																							
	Trazado																												
	Ahoyado																												
	Transporte menor																												
	Hincado																												
	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ -																								
	Programado																												
	Ejecutado																												
2.14	**VEREDA TUQUILA PREDIO BUENA VISTA**	ML	310	23408	$ 7.256.513	0,48%																							
	Trazado																												
	Ahoyado																												
	Transporte menor																												
	Hincado																												
	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ -																								
	Programado																												
	Ejecutado																												
2.15	**VEREDA TUQUILA PREDIO VERSALLES**	ML	372	23408	$ 8.707.816	0,58%																							
	Trazado																												
	Ahoyado																												
	Transporte menor																												
	Hincado																												
	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ -																								
	Programado																												
	Ejecutado																												
2.16	**VEREDA SAN MIGUEL BUENA VISTA**	ML	2124	23408	$ 49.718.818	3,30%																						$ 12.429.705	$ 12.429.705
	Trazado																												
	Ahoyado																												
	Transporte menor																												
	Hincado																												
	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ -																								
	Programado																										25%	25%	
	Ejecutado																										0%	0%	
2.17	**MUNICIPIO DE AIPE**	ML	**1178**	23408	$ 27.574.749	1,83%																							$ 9.191.583
	EJECUTADO				$ -																								$ -
	Programado																												33%
	Ejecutado																												0%
2.17.1	**VEREDA SAN ISIDRIO PREDIO EL GRANIZO**	ML	200	23408	$ 4.681.621	0,31%																							$ 1.560.540
2.17.1.1	Trazado																												
2.17.1.2	Ahoyado																												
2.17.1.3	Transporte menor																												
2.17.1.4	Hincado																												
2.17.1.5	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ -																								
	Programado %																												33%
	Ejecutado %																												0%
2.17.2	**VEREDA SAN ISIDRIO PREDIO EL INDIAL**	ML	200	23408	$ 4.681.621	0,31%																							$ 1.560.540
2.17.2.1	Trazado																												
2.17.2.2	Ahoyado																												
2.17.2.3	Transporte menor																												
2.17.2.4	Hincado																												
2.17.2.5	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ -																								
	Programado																												33%
	Ejecutado																												0%
2.17.3	**VEREDA SAN ISIDRIO PREDIO EL GUACHARACAS**	ML	200	23408	$ 4.681.621	0,31%																							$ 1.560.540
2.17.3.1	Trazado																												
2.17.3.2	Ahoyado																												
2.17.3.3	Transporte menor																												
2.17.3.4	Hincado																												
2.17.3.5	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ -																								
	Programado																												33%
	Ejecutado																												0%
2.17.4	**VEREDA SAN ISIDRIO PREDIO EL HOSPITAL**	ML	200	23408	$ 4.681.621	0,31%																							$ 1.560.540
2.17.4.1	Trazado																												
2.17.4.2	Ahoyado																												
2.17.4.3	Transporte menor																												
2.17.4.4	Hincado																												
2.17.4.5	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ -																								
	Programado																												33%
	Ejecutado																												0%
2.17.5	**VEREDA SAN ISIDRIO PREDIO EL GUAMITOS**	ML	378	23408	$ 8.848.264	0,59%																							$ 2.949.421
2.17.5.1	Trazado																												
2.17.5.2	Ahoyado																												
2.17.5.3	Transporte menor																												
2.17.5.4	Hincado																												
2.17.5.5	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ -																								
	Programado																												33%
	Ejecutado																												0%
2.18	**MUNICIPIO DE RIVERA**	**ML**	**407**	23408	$ 9.527.099	0,63%					$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887									
	EJECUTADO				$ 9.527.099,31						$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887									
	Programado										13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%									
	Ejecutado										13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%									
2.18.1	**VEREDA TERMOPILAS PREDIO RNSC VILLA ESTEFANY**	ML	407	23408	$ 9.527.099	0,63%					$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887									
2.18.1.1	Trazado																												
2.18.1.2	Ahoyado																												
2.18.1.3	Transporte menor																												
2.18.1.4	Hincado																												
2.18.1.5	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ 9.527.099,31						$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887									
	Programado										13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%									
	Ejecutado										13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%									
2.19	**MUNICIPIO DE PAICOL**	**ML**	**3900**	23408	$ 91.291.615	6,06%							$ 2.808.973	$ 2.808.973	$ 4.271.979	$ 4.271.979	$ 4.271.979	$ 5.208.304	$ 5.208.304	$ 5.208.304	$ 14.571.546	$ 14.571.546		$ 9.363.243
	EJECUTADO				$ 58.520.266,03								$ 2.808.973	$ 2.808.973	$ 4.271.979	$ 4.271.979	$ 4.271.979	$ 5.208.304	$ 5.208.304	$ 5.208.304	$ 9.889.925	$ 14.571.546		$ -
	Programado												3%	3%	5%	5%	5%	6%	6%	6%	16%	16%		10%
	Ejecutado												3%	3%	5%	5%	5%	6%	6%	6%	11%	16%		0%
2.19.1	**VEREDA SANTA INÉS PREDIO HUMEDAL SANTA INÉS**	ML	500	23408	$ 11.704.053	0,78%									$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007		
2.19.1.1	Trazado																												
2.19.1.2	Ahoyado																												
2.19.1.3	Transporte menor																												
2.19.1.4	Hincado																												
2.19.1.5	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ 11.704.053,21										$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007		
	Programado														13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%		
	Ejecutado														13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%		
2.19.2	**VEREDA ALTO SAN MIGUEL PREDIO HUMEDAL SAN ANTONIO**	ML	800	23408	$ 18.726.485	1,24%							$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649		
2.19.2.1	Trazado																												
2.19.2.2	Ahoyado																												
2.19.2.3	Transporte menor																												
2.19.2.4	Hincado																												

| | | |


2.22.2	Ahoyado																													
2.22.3	Transporte menor																													
2.22.4	Hincado																													
2.22.5	Templado y grapado																													
	EJECUTADO				$ 14.044.863,85							$ 2.006.409	$ 2.006.409	$ 2.006.409	$ 2.006.409	$ 2.006.409	$ 2.006.409	$ 2.006.409											
	Programado											14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%											
	% Ejecutado											14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%											
2.23	**MUNICIPIO ELIAS**	ML	200	23408	$ 4.681.621	0,31%																								
	EJECUTADO				$ -																									
	Programado																													
	Ejecutado																													
2.23.1	**VEREDA DELICIAS PREDIO DELICIAS**	ML	200	23408	$ 4.681.621	0,31%																								
2.23.2	Trazado																													
2.23.3	Ahoyado																													
2.23.4	Transporte menor																													
2.23.5	Hincado																													
2.23.6	Templado y grapado																													
	EJECUTADO				$ -																									
	Programado																													
	Ejecutado																													
2.24	**MUNICIPIO PITALITO**	ML	4000	23408	$ 93.632.426	6,22%						$ 3.901.351	$ 7.412.567	$ 7.412.567	$ 7.412.567	$ 7.412.567	$ 7.412.567	$ 7.412.567	$ 7.412.567	$ 7.412.567	$ 7.412.567	$ 7.412.567	$ -	$ -	$ 500.000		$ 17.726.485			
	EJECUTADO				$ 63.701.887,31							$ 3.901.351	$ 7.412.567	$ 7.412.567	$ 7.412.567	$ 7.412.567	$ 7.412.567	$ 7.412.567	$ 7.412.567	$ 7.412.567	$ 7.412.567	$ 7.412.567	$ -	$ -	$ 500.000		$ -			
	Programado											4%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	0%	0%	1%		19%			
	Ejecutado											4%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	0%	0%	1%		0%			
2.24.1	**VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC EL CEDRO**	ML	1200	23408	$ 28.089.728	1,87%						-	$ 3.511.216	$ 3.511.216	$ 3.511.216	$ 3.511.216	$ 3.511.216	$ 3.511.216	$ 3.511.216	$ 3.511.216	$ 3.511.216	$ 3.511.216	-	-	-					
2.24.1.1	Trazado																													
2.24.1.2	Ahoyado																													
2.24.1.3	Transporte menor																													
2.24.1.4	Hincado																													
2.24.1.5	Templado y grapado																													
	EJECUTADO				$ 28.089.727,69								$ 3.511.216	$ 3.511.216	$ 3.511.216	$ 3.511.216	$ 3.511.216	$ 3.511.216	$ 3.511.216	$ 3.511.216	$ 3.511.216									
	Programado												13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%									
	Ejecutado												13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%									
2.24.2	**VEREDA EL CEDRO PREDIO RNSC EL CEDRO**	ML	2000	23408	$ 46.816.213	3,11%						$ 3.901.351	$ 3.901.351	$ 3.901.351	$ 3.901.351	$ 3.901.351	$ 3.901.351	$ 3.901.351	$ 3.901.351	$ 3.901.351	$ 3.901.351	$ -	$ -	$ -						
2.24.2.1	Trazado																													
2.24.2.2	Ahoyado																													
2.24.2.3	Transporte menor																													
2.24.2.4	Hincado																													
2.24.2.5	Templado y grapado																													
	EJECUTADO				$ 35.112.159,62							$ 3.901.351	$ 3.901.351	$ 3.901.351	$ 3.901.351	$ 3.901.351	$ 3.901.351	$ 3.901.351	$ 3.901.351	$ 3.901.351	$ 3.901.351	$ -	$ -	$ -						
	Programado											8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	0%	0%	0%						
	Ejecutado											8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	0%	0%	0%						
2.24.3	**VEREDA CHARGUAYACO PREDIO RNSC EL RECREO**	ML	800	23408	$ 18.726.485	1,24%																			$ 500.000		$ 17.726.485			
2.24.3.1	Trazado																													
2.24.3.2	Ahoyado																													
2.24.3.3	Transporte menor																													
2.24.3.4	Hincado																													
2.24.3.5	Templado y grapado																													
	EJECUTADO				$ 500.000,00																			$ 500.000					
	Programado																							3%		95%				
	Ejecutado																							3%		0%				
2.25	**MUNICIPIO ISNOS**	ML	500	23408	$ 11.704.053	0,78%																	$ 3.901.351	$ 3.901.351	$ 3.901.351					
	EJECUTADO				$ 11.704.053,21																		$ 3.901.351	$ 3.901.351	$ 3.901.351					
	Programado																						33%	33%	33%					
	Ejecutado																						33%	33%	33%					
2.25.1	**VEREDA BELLA VISTA PREDIO HUMEDAL LA UMATA**	ML	500	23408	$ 11.704.053	0,78%																	$ 3.901.351	$ 3.901.351	$ 3.901.351					
2.25.1.1	Trazado																													
2.25.1.2	Ahoyado																													
2.25.1.3	Transporte menor																													
2.25.1.4	Hincado																													
2.25.1.5	Templado y grapado																													
	EJECUTADO				$ 11.704.053,21																		$ 3.901.351	$ 3.901.351	$ 3.901.351					
	Programado																						33%	33%	33%					
	Ejecutado																						33%	33%	33%					
2.26	**MUNICIPIO PALESTINA**	ML	800	23408	$ 18.726.485	1,24%							$ 11.704.053	$ 7.022.432																
	EJECUTADO				$ 18.726.485,13								$ 11.704.053	$ 7.022.432																
	Programado												63%	38%																
	Ejecutado												63%	38%																
2.26.1	**VEREDA JERICO PREDIO RNSC MIRANDA**	ML	200	23408	$ 4.681.621	0,31%							$ 4.681.621																	
2.26.1.1	Trazado																													
2.26.1.2	Ahoyado																													
2.26.1.3	Transporte menor																													
2.26.1.4	Hincado																													
2.26.1.5	Templado y grapado																													
	EJECUTADO				$ 4.681.621,28								$ 4.681.621																	
	Programado												100%																	
	Ejecutado												100%																	
2.26.2	**VEREDA MENSURA PREDIO RNSC LA RESERVA**	ML	600	23408	$ 14.044.864	0,93%							$ 7.022.432	$ 7.022.432																
2.26.2.1	Trazado																													
2.26.2.2	Ahoyado																													
2.26.2.3	Transporte menor																													
2.26.2.4	Hincado																													
2.26.2.5	Templado y grapado																													
	EJECUTADO				$ 14.044.863,85								$ 7.022.432	$ 7.022.432																
	Programado												50%	50%																
	Ejecutado												50%	50%																
2.27	**MUNICIPIO ACEVEDO**	ML	200	23408	$ 4.681.621	0,31%							$ 4.681.621																	
	EJECUTADO				$ 4.681.621,28								$ 4.681.621																	
	Programado												100%																	
	Ejecutado												0%																	
2.27.1	**VEREDA TOCORA PREDIO ROVIRA**	ML	200	23408	$ 4.681.621	0,31%							$ 4.681.621																	
2.27.1.1	Trazado																													
2.27.1.2	Ahoyado																													
2.27.1.3	Transporte menor																													
2.27.1.4	Hincado																													
2.27.1.5	Templado y grapado																													
	EJECUTADO				$ 4.681.621,28								$ 4.681.621																	
	Programado												100%																	
	Ejecutado												100%																	
3	**PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA EN AREAS DE CONSERVACION DE LA ZONA DE RESERVA FORESTAL (PREDIOS ADQUIRIDOS Y OTROS) EN LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO LAS CEIBAS**	Ha	10	$ 7.896.838	$ 78.968.375	5%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	PROGRAMADO ACUMULADO						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJECUTADO						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJECUTADO ACUMULADO						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	PROGRAMADO %						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	EJECUTADO %						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.1	**MUNICIPIO DE NEIVA**	**Ha**	**10**	**$ 7.896.838**	**$ 78.968.375**	**5%**																								
	EJECUTADO				$ -																									
	Programado																													
	Ejecutado																													
3.1.1	**VEREDA PUEBLO NUEVO PREDIO BARCELONA**	**Ha**	**10**	**$ 7.896.838**	**$ 78.968.375**	**5%**																								
4.1.1.1	Roceria (preparación del terreno) limpia																													
4.1.1.2	Trazado																													
4.1.1.3	Plateo																													
4.1.1.4	Ahoyado																													
4.1.1.5	Siembra																													


4.1.1.6	Aplicación de fertilizantes y correctivos																										
4.1.1.7	Control fitosanitario																										
4.1.1.8	Reposición																										
	EJECUTADO				$ -																						
	Programado																										
	Ejecutado																										
4	**IMPLEMENTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA PARA LA CONECTIVIDAD EN EL MACIZO COLOMBIANA (A)**	Ha	30	$ 9.626.114	$ 288.783.434	19%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	PROGRAMADO ACUMULADO						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.609.793	$ 7.219.586	$ 10.829.379	$ 14.439.172	$ 18.048.965	$ 21.658.758	$ 25.268.550	$ 28.878.343	$ 28.878.343	$ 28.878.343	$ 28.878.343	$ 28.878.343	$ 28.878.343			
	EJECUTADO ACUMULADO						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.609.793	$ 7.219.586	$ 10.829.379	$ 14.439.172	$ 18.048.965	$ 21.658.758	$ 25.268.550	$ 28.878.343	$ 28.878.343	$ 28.878.343	$ 28.878.343	$ 28.878.343	$ 28.878.343			
	PROGRAMADO %						0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%			
	EJECUTADO %						0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%			
4.1	**MUNICIPIO SANTA MARÍA**	Ha	24	$ 9.626.114	$ 231.026.747	15%																					
	EJECUTADO				$ -																						
	Programado																										
	Ejecutado																										
4.1.1	**VEREDA JERUSALEN RNSC EL PARAISO**	Ha	2	$ 9.626.114	$ 19.252.229	1%																					
4.1.1.1	Rocería (preparación del terreno) limpia																										
4.1.1.2	Trazado																										
4.1.1.3	Plateo																										
4.1.1.4	Ahoyado																										
4.1.1.5	Siembra																										
4.1.1.6	Aplicación de fertilizantes y correctivos																										
4.1.1.7	Control fitosanitario																										
4.1.1.8	Reposición																										
	EJECUTADO				$ -																						
	Programado																										
	Ejecutado																										
4.1.1	**VEREDA BACHECITO RNSC EL JARDÍN**	Ha	5	$ 9.626.114	$ 48.130.572	3%																					
4.1.1.1	Rocería (preparación del terreno) limpia																										
4.1.1.2	Trazado																										
4.1.1.3	Plateo																										
4.1.1.4	Ahoyado																										
4.1.1.5	Siembra																										
4.1.1.6	Aplicación de fertilizantes y correctivos																										
4.1.1.7	Control fitosanitario																										
4.1.1.8	Reposición																										
	EJECUTADO				$ -																						
	Programado																										
	Ejecutado																										
4.1.1	**VEREDA SAN FRANCISCO PREDIO LA TRIGUEÑA DELICIAS**	Ha	5	$ 9.626.114	$ 48.130.572	3%																					
4.1.1.1	Rocería (preparación del terreno) limpia																										
4.1.1.2	Trazado																										
4.1.1.3	Plateo																										
4.1.1.4	Ahoyado																										
4.1.1.5	Siembra																										
4.1.1.6	Aplicación de fertilizantes y correctivos																										
4.1.1.7	Control fitosanitario																										
4.1.1.8	Reposición																										
	EJECUTADO				$ -																						
	Programado																										
	Ejecutado																										
4.1.1	**VEREDA SANTA MARÍA RNSC VILLA MARGARITA**	Ha	6	$ 9.626.114	$ 57.756.687	4%																					
4.1.1.1	Rocería (preparación del terreno) limpia																										
4.1.1.2	Trazado																										
4.1.1.3	Plateo																										
4.1.1.4	Ahoyado																										
4.1.1.5	Siembra																										
4.1.1.6	Aplicación de fertilizantes y correctivos																										
4.1.1.7	Control fitosanitario																										
4.1.1.8	Reposición																										
	EJECUTADO				$ -																						
	Programado																										
	Ejecutado																										
4.1.1	**VEREDA JERUSALEN RNSC VIFLOR**	Ha	6	$ 9.626.114	$ 57.756.687	4%																					
4.1.1.1	Rocería (preparación del terreno) limpia																										
4.1.1.2	Trazado																										
4.1.1.3	Plateo																										
4.1.1.4	Ahoyado																										
4.1.1.5	Siembra																										
4.1.1.6	Aplicación de fertilizantes y correctivos																										
4.1.1.7	Control fitosanitario																										
4.1.1.8	Reposición																										
	EJECUTADO				$ -																						
	Programado																										
	Ejecutado																										
4.2	**MUNICIPIO IQUIRA**	Ha	6	$ 9.626.114	$ 57.756.687	4%						$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.791	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	EJECUTADO				$ 28.878.343,40							$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Programado											6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	0%	0%	0%	0%	0%			
	Ejecutado											6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	0%	0%	0%	0%	0%			
4.1.1	**RESGUARDO HUILA RIONEGRO**	Ha	6	$ 9.626.114	$ 57.756.687	4%						$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
4.1.1.1	Rocería (preparación del terreno) limpia																										
4.1.1.2	Trazado																										
4.1.1.3	Plateo																										
4.1.1.4	Ahoyado																										
4.1.1.5	Siembra				$ 2.625.304																						
4.1.1.6	Aplicación de fertilizantes y correctivos																										
4.1.1.7	Control fitosanitario																										
4.1.1.8	Reposición																										
	EJECUTADO				$ 28.878.343,40							$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793								
	Programado											6,25%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	0%	0%	0%	0%	0%			
	Ejecutado											6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	0%	0%	0%	0%	0%			
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS				$ 1.197.967.119	80%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.098.648	$ 32.946.142	$ 26.391.872	$ 21.359.129	$ 22.822.136	$ 22.822.136	$ 34.526.189	$ 33.456.104	$ 28.043.955	$ 16.592.446	$ 25.955.689	$ 25.831.472	$ 12.429.705	$ 48.711.015			
	ADMINISTRACIÓN	**10%**	$ 119.796.712	8%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 709.865	$ 3.294.614	$ 2.639.187	$ 2.135.913	$ 2.282.214	$ 2.282.214	$ 3.452.619	$ 3.345.610	$ 2.804.395	$ 1.659.245	$ 2.595.569	$ 2.583.147	$ 1.242.970	$ 4.871.102			
	IMPREVISTO	**5%**	$ 59.898.356	4%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 354.932	$ 1.647.307	$ 1.319.594	$ 1.067.956	$ 1.141.107	$ 1.141.107	$ 1.726.309	$ 1.672.805	$ 1.402.198	$ 829.622	$ 1.297.784	$ 1.291.574	$ 621.485	$ 2.435.551			
	UTILIDAD	**9%**	$ 107.817.041	7%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 638.878	$ 2.965.153	$ 2.375.268	$ 1.922.322	$ 2.053.992	$ 2.053.992	$ 3.107.357	$ 3.011.049	$ 2.523.956	$ 1.493.320	$ 2.336.012	$ 2.324.833	$ 1.118.673	$ 4.383.991			
	IVA SOBRA LA UTILIDAD	**19%**	$ 20.485.238	1%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 121.387	$ 563.379	$ 451.301	$ 365.241	$ 390.259	$ 390.259	$ 590.398	$ 572.099	$ 479.552	$ 283.731	$ 443.842	$ 441.718	$ 212.548	$ 832.958			
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS (Programado)		$ 307.997.346	20%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.825.062	$ 8.470.453	$ 6.785.350	$ 5.491.432	$ 5.867.571	$ 5.867.571	$ 8.876.683	$ 8.601.564	$ 7.210.101	$ 4.265.918	$ 6.673.208	$ 6.641.272	$ 3.195.677	$ 12.523.602			
	COSTOS INDIRECTOS EJECUTADOS		$ 51.785.687	3%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.825.062	$ 8.470.453,01	$ 6.785.350,25	$ 5.491.432,05	$ 5.867.571,06	$ 5.867.571,06	$ 8.876.683,14	$ 8.601.564,32											
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO		$ 1.505.964.466	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.923.710	$ 41.416.595	$ 33.177.222	$ 26.850.561	$ 28.689.707	$ 28.689.707	$ 43.402.872	$ 42.057.668	$ 35.254.055	$ 20.858.364	$ 32.628.896	$ 32.472.744	$ 15.625.382	$ 61.234.617			
	ACUMULADO								$ 8.923.710	$ 50.340.305	$ 83.517.527	$ 110.368.088	$ 139.057.794	$ 167.747.501	$ 211.150.373	$ 253.208.041	$ 288.462.097	$ 309.320.460	$ 341.949.357	$ 374.422.101	$ 390.047.482	$ 451.282.100			
									0,59%	3,34%	5,55%	7,33%	9,23%	11,14%	14,02%	16,81%	19,15%	20,54%	22,71%	24,86%	25,91%	29,97%			
	FLUJO SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (COSTOS DIRECTOS)		$ 293.164.295	19%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.098.648	$ 32.946.142	$ 26.391.872	$ 21.359.129	$ 22.822.136	$ 22.822.136	$ 34.526.189	$ 33.456.104	$ 28.043.955	$ 16.592.446	$ 21.274.067	$ 25.831.472	$ -	$ -			
	COSTOS INDIRECTOS EJECUTADOS		**$ 51.785.687**	3%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.825.062	$ 8.470.453	$ 6.785.350	$ 5.491.432	$ 5.867.571	$ 5.867.571	$ 8.876.683	$ 8.601.564	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 344.949.982	23%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.923.710	$ 41.416.595	$ 33.177.222	$ 26.850.561	$ 28.689.707	$ 28.689.707	$ 43.402.872	$ 42.057.668	$ 28.043.955	$ 16.592.446	$ 21.274.067	$ 25.831.472	$ -	$ -			
	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.923.710	$ 50.340.305	$ 83.517.527	$ 110.368.088	$ 139.057.794	$ 167.747.501	$ 211.150.373	$ 253.208.041	$ 281.251.996	$ 297.844.442	$ 319.118.509	$ 344.949.982	$ 344.949.982	$ 344.949.982			
	% SEMANA EJECUTADO			23%		0%	0%	0%	1%	3%	2%	2%	2%	2%	3%	3%	2%	1%	1%	2%	0%	0%			

SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	SEM 30	SEM 31	SEM 32	SEM 33	SEM 34	SEM 35	SEM 36	SEM 37	SEM 38	SEM 39	SEM 40	SEM 41	SEM 42	SEM 43
17/03/2024	24/03/2024	31/03/2024	7/04/2024	14/04/2024	21/04/2024	28/04/2024	5/05/2024	12/05/2024	19/05/2024	26/05/2024	2/06/2024	9/06/2024	16/06/2024	23/06/2024	30/06/2024	7/07/2024	14/07/2024	21/07/2024	28/07/2024	4/08/2024	11/08/2024	18/08/2024	25/08/2024	1/09/2024	7/09/2024
$ 21.621.288	$ 41.315.935	$ -	$ 22.094.538	$ 22.094.538	$ 22.094.538	$ 20.533.998	$ 20.533.998	$ 20.533.998	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187
$ 351.729.580	$ 393.045.515	$ 393.045.515	$ 415.140.053	$ 437.234.592	$ 459.329.130	$ 479.863.128	$ 500.397.126	$ 520.931.124	$ 539.124.312	$ 557.317.499	$ 575.510.686	$ 593.703.874	$ 611.897.061	$ 630.090.249	$ 648.283.436	$ 666.476.623	$ 684.669.811	$ 702.862.998	$ 721.056.186	$ 739.249.373	$ 757.442.560	$ 775.635.748	$ 793.828.935	$ 812.022.123	$ 830.215.310
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951	$ 264.285.951
3%	5%	0%	3%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
$ 12.429.705	$ 12.429.705		$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187	$ 18.193.187
$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3%	3%		4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			$ 6.564.447	$ 6.564.447	$ 6.564.447	$ 6.564.447	$ 6.564.447	$ 6.564.447	$ 6.564.447	$ 6.564.447	$ 6.564.447	$ 6.564.447	$ 6.564.447	$ 6.564.447	$ 6.564.447	$ 6.564.447	$ 6.564.447	$ 6.564.447	$ 6.564.447	$ 6.564.447	$ 6.564.447	$ 6.564.447	$ 6.564.447	$ 6.564.447	$ 6.564.447
			4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			$ 1.302.712	$ 1.302.712	$ 1.302.712	$ 1.302.712	$ 1.302.712	$ 1.302.712	$ 1.302.712	$ 1.302.712	$ 1.302.712	$ 1.302.712	$ 1.302.712	$ 1.302.712	$ 1.302.712	$ 1.302.712	$ 1.302.712	$ 1.302.712	$ 1.302.712	$ 1.302.712	$ 1.302.712	$ 1.302.712	$ 1.302.712	$ 1.302.712	$ 1.302.712
			4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			$ 234.081	$ 234.081	$ 234.081	$ 234.081	$ 234.081	$ 234.081	$ 234.081	$ 234.081	$ 234.081	$ 234.081	$ 234.081	$ 234.081	$ 234.081	$ 234.081	$ 234.081	$ 234.081	$ 234.081	$ 234.081	$ 234.081	$ 234.081	$ 234.081	$ 234.081	$ 234.081
			4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			$ 977.034	$ 977.034	$ 977.034	$ 977.034	$ 977.034	$ 977.034	$ 977.034	$ 977.034	$ 977.034	$ 977.034	$ 977.034	$ 977.034	$ 977.034	$ 977.034	$ 977.034	$ 977.034	$ 977.034	$ 977.034	$ 977.034	$ 977.034	$ 977.034	$ 977.034	$ 977.034
			4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			$ 407.098	$ 407.098	$ 407.098	$ 407.098	$ 407.098	$ 407.098	$ 407.098	$ 407.098	$ 407.098	$ 407.098	$ 407.098	$ 407.098	$ 407.098	$ 407.098	$ 407.098	$ 407.098	$ 407.098	$ 407.098	$ 407.098	$ 407.098	$ 407.098	$ 407.098	$ 407.098
			4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			$ 429.488	$ 429.488	$ 429.488	$ 429.488	$ 429.488	$ 429.488	$ 429.488	$ 429.488	$ 429.488	$ 429.488	$ 429.488	$ 429.488	$ 429.488	$ 429.488	$ 429.488	$ 429.488	$ 429.488	$ 429.488	$ 429.488	$ 429.488	$ 429.488	$ 429.488	$ 429.488
			4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			$ 850.834	$ 850.834	$ 850.834	$ 850.834	$ 850.834	$ 850.834	$ 850.834	$ 850.834	$ 850.834	$ 850.834	$ 850.834	$ 850.834	$ 850.834	$ 850.834	$ 850.834	$ 850.834	$ 850.834	$ 850.834	$ 850.834	$ 850.834	$ 850.834	$ 850.834	$ 850.834
			4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			$ 1.618.213	$ 1.618.213	$ 1.618.213	$ 1.618.213	$ 1.618.213	$ 1.618.213	$ 1.618.213	$ 1.618.213	$ 1.618.213	$ 1.618.213	$ 1.618.213	$ 1.618.213	$ 1.618.213	$ 1.618.213	$ 1.618.213	$ 1.618.213	$ 1.618.213	$ 1.618.213	$ 1.618.213	$ 1.618.213	$ 1.618.213	$ 1.618.213	$ 1.618.213
			4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			$ 2.391.698	$ 2.391.698	$ 2.391.698	$ 2.391.698	$ 2.391.698	$ 2.391.698	$ 2.391.698	$ 2.391.698	$ 2.391.698	$ 2.391.698	$ 2.391.698	$ 2.391.698	$ 2.391.698	$ 2.391.698	$ 2.391.698	$ 2.391.698	$ 2.391.698	$ 2.391.698	$ 2.391.698	$ 2.391.698	$ 2.391.698	$ 2.391.698	$ 2.391.698
			4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			$ 437.630	$ 437.630	$ 437.630	$ 437.630	$ 437.630	$ 437.630	$ 437.630	$ 437.630	$ 437.630	$ 437.630	$ 437.630	$ 437.630	$ 437.630	$ 437.630	$ 437.630	$ 437.630	$ 437.630	$ 437.630	$ 437.630	$ 437.630	$ 437.630	$ 437.630	$ 437.630
			4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			$ 372.494	$ 372.494	$ 372.494	$ 372.494	$ 372.494	$ 372.494	$ 372.494	$ 372.494	$ 372.494	$ 372.494	$ 372.494	$ 372.494	$ 372.494	$ 372.494	$ 372.494	$ 372.494	$ 372.494	$ 372.494	$ 372.494	$ 372.494	$ 372.494	$ 372.494	$ 372.494
			4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			$ 1.801.406	$ 1.801.406	$ 1.801.406	$ 1.801.406	$ 1.801.406	$ 1.801.406	$ 1.801.406	$ 1.801.406	$ 1.801.406	$ 1.801.406	$ 1.801.406	$ 1.801.406	$ 1.801.406	$ 1.801.406	$ 1.801.406	$ 1.801.406	$ 1.801.406	$ 1.801.406	$ 1.801.406	$ 1.801.406	$ 1.801.406	$ 1.801.406	$ 1.801.406

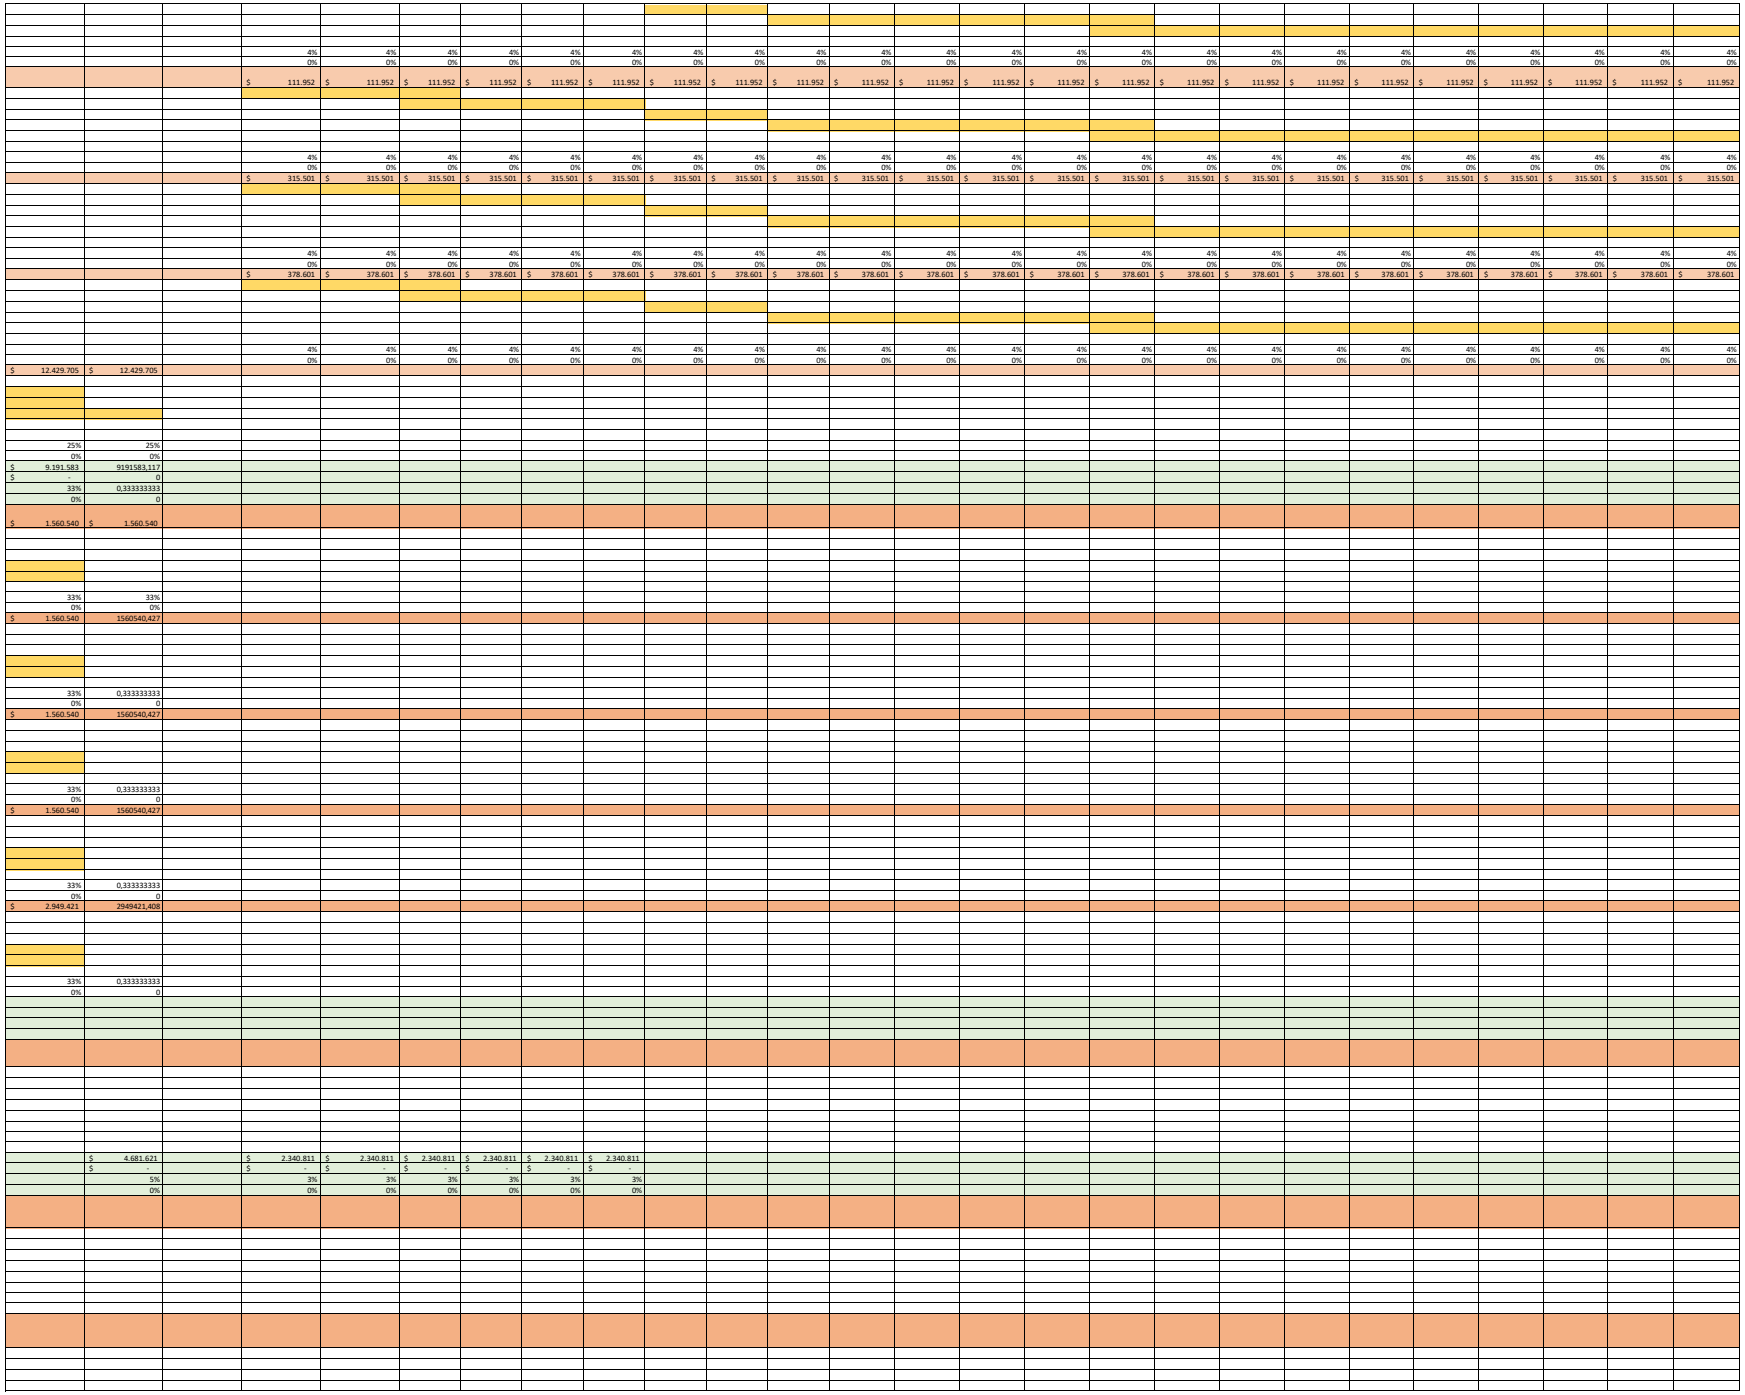

	4681621,282																								
	0,2																								
	0																								
			$ 2.340.811	$ 2.340.811	$ 2.340.811	$ 2.340.811	$ 2.340.811	$ 2.340.811																	
			17%	17%	17%	17%	17%	17%																	
			0%	0%	0%	0%	0%	0%																	
	0																								
	0																								
	0																								
	0																								
	0																								
	0																								
	2808972,769																								
	0																								
	0,248962656																								
	0																								
	2808972,769																								
	0,75																								
	0																								

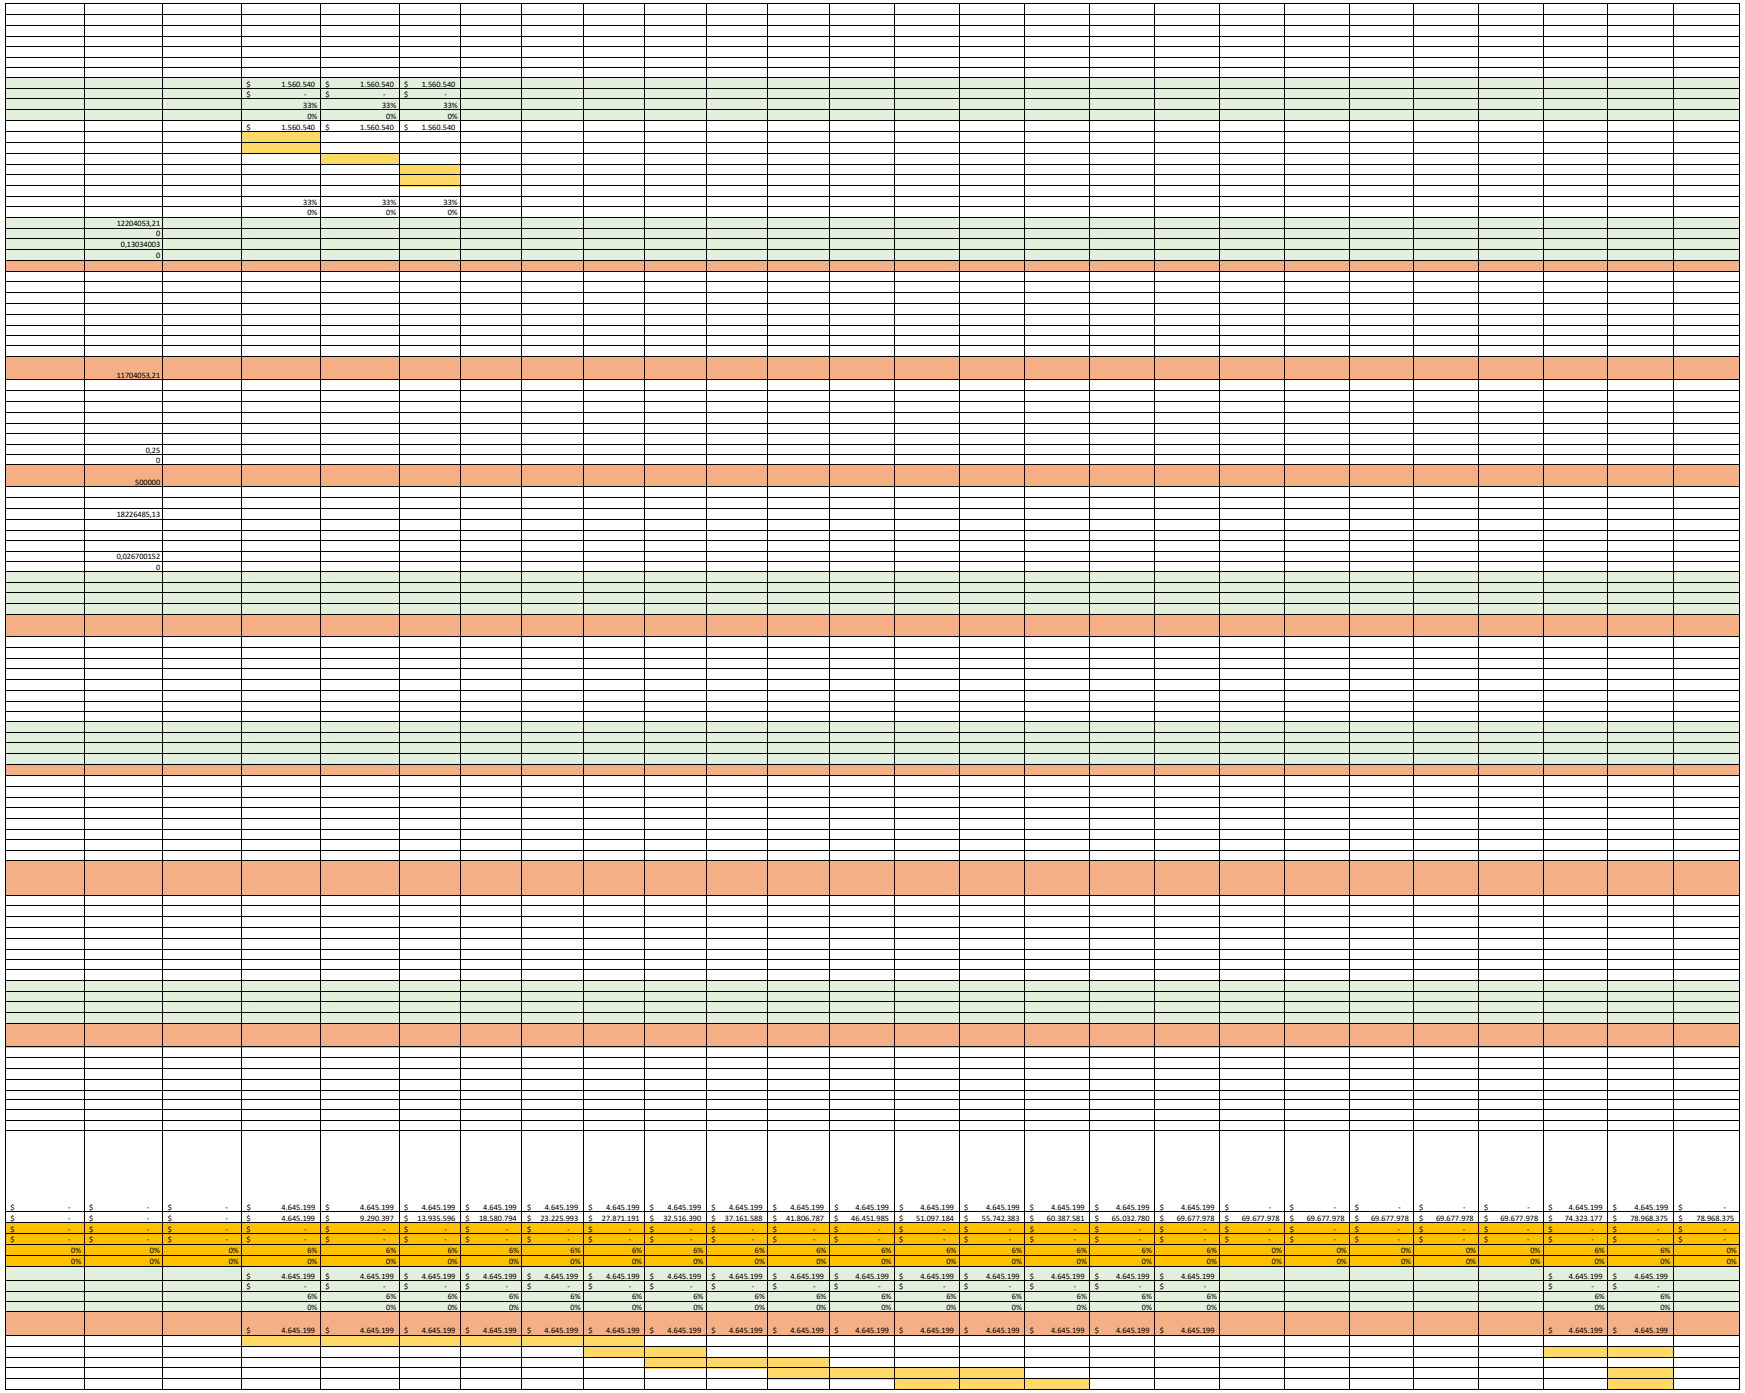

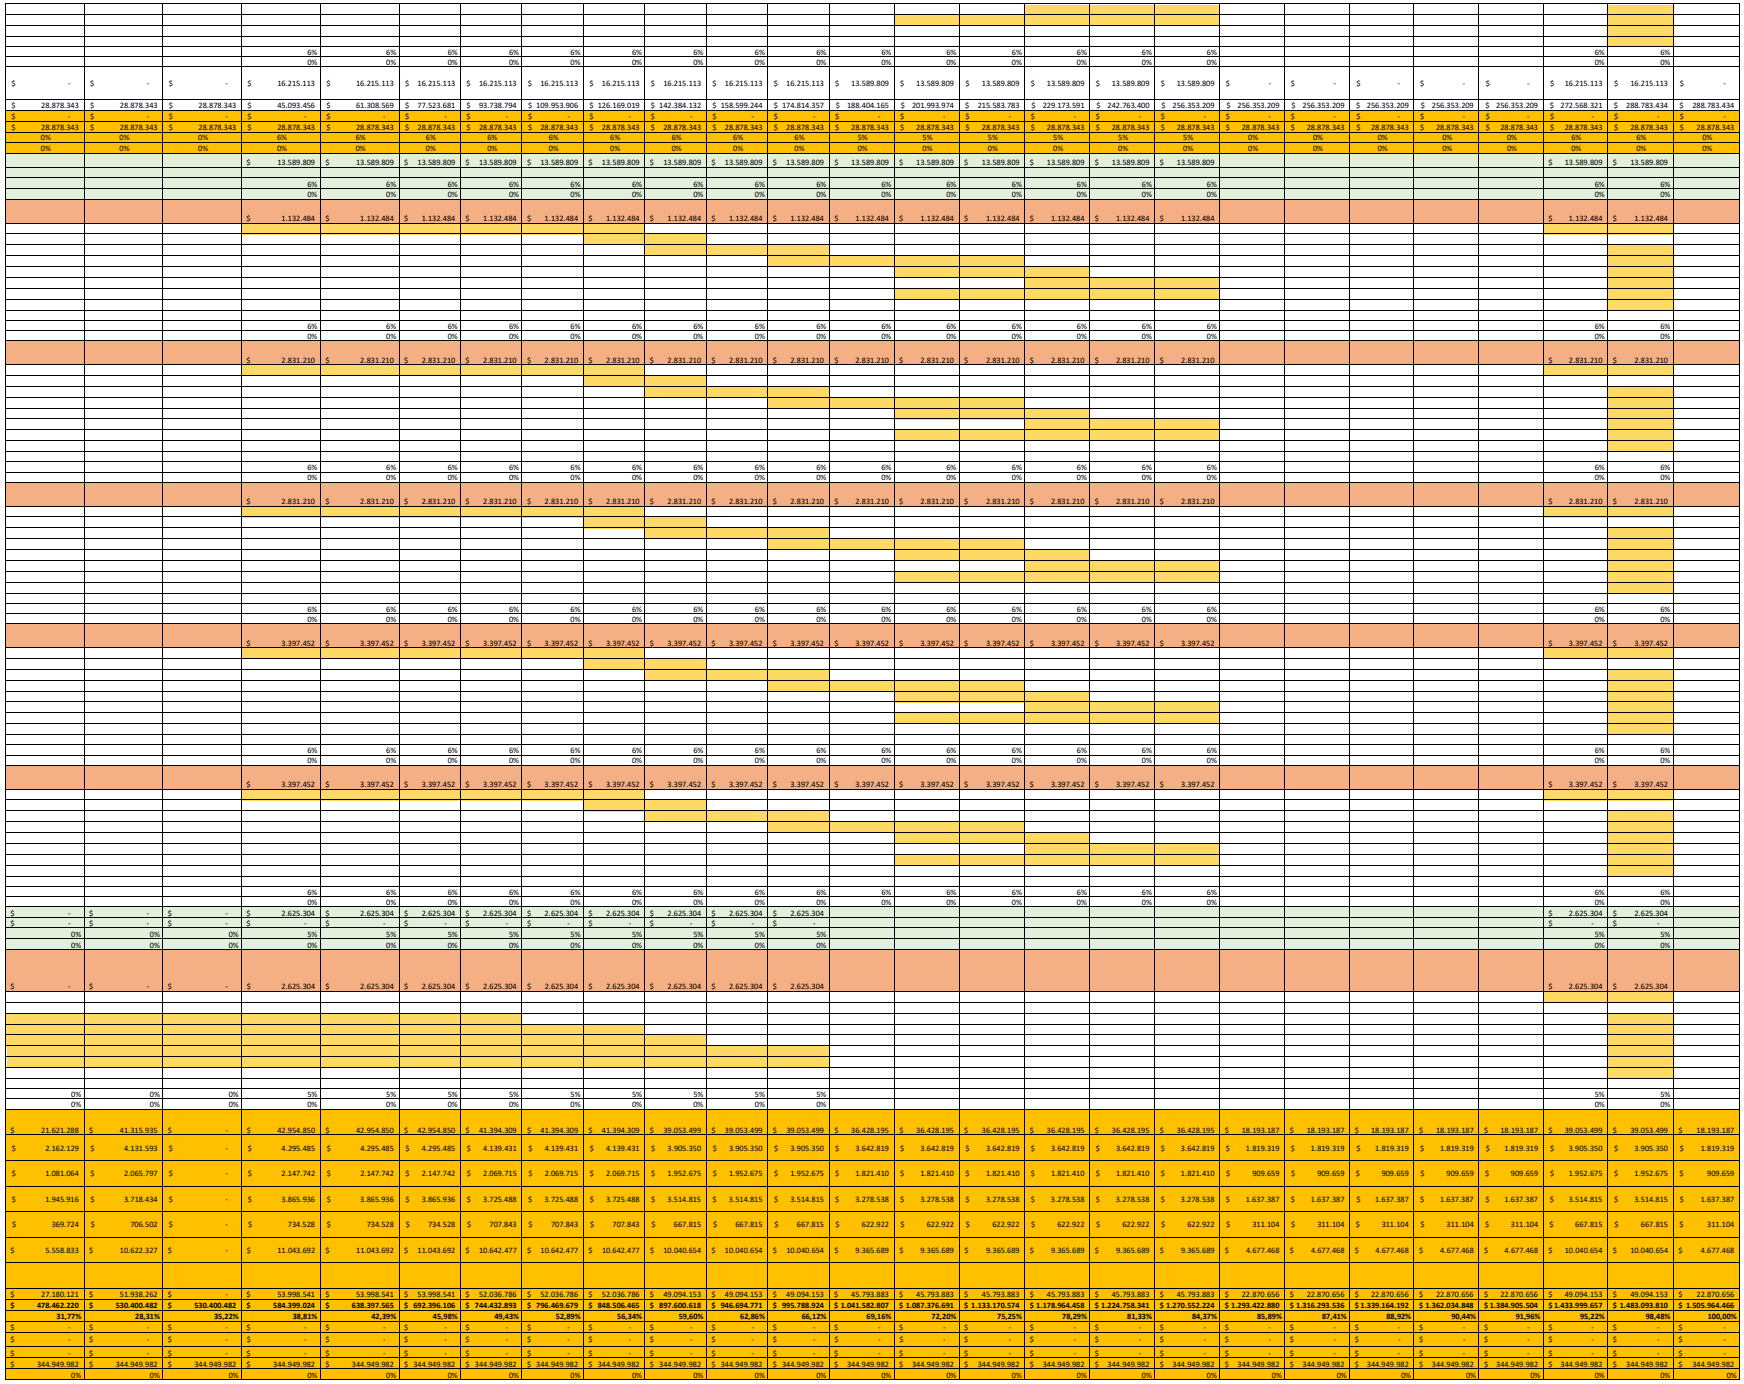

ANEXO 2
ACTAS DE RECIBO POR PREDIOS

SIG / CAM (CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA) ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 29/04/2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[X] Entrega Parcial [ ] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Eduardo Quintero R.
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	1.610.904
Contratista:	SOFOR Ingenieros S.A.S	Correo electrónico:	
Cargo:	técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	Veraguas Vda Santa Lucia
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio: Neiva.

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

· instalación de 500 metros lineales hasta la fecha, para este predio contractuales son 1.770metros.

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 29 de 04 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C.	Firma:	
Nombre:	Ferney Danilo Castro G.	Nombre:	Eduardo Quintero R

VoBo:
Maria Fda Alvarez
Insp. Interventoria

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** DD/MM/YYYY 28/12/2023

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Griselda Galindez
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	40600737
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	Robira
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio Acevedo Vereda la tocora

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Aislamiento de 200 metros lineales.

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 28 de 12 de 2023

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C.	Firma:	Griselda Galindez
Nombre:	Ferney danilo Castro	Nombre:	Griselda Galindez

VoBo Interventoria

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 14/03/2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Dora Lucia Ruiz Castro
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	36279824.
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	doralu7@gmail.com
Cargo:	técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	R.N.S.C. Ecofinca El Recreo.
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Cto Chonguayaco. Municipio - Pitalito

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

- Aislamiento de 800 metros lineales

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 14 de 03 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C.	Firma:	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Dora Lucia Perez Castro

VoBo: Inspector interventoria

SIG / CAM — CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA — ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** DD/MM/YYYY
   13/04/2024
2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [x] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Deuia	Nombre:	Rafael Olaya Ramirez
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	4884932
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Tecnico de Campo	Predio donde se realiza la entrega:	Granizo
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vereda San isidro Municipio de Aipe.

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Instalación de 200 metros lineales de aislamiento con cerco protector

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 13 de 04 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ramiro Devia G.	Nombre:	Rafael Olaya Ramirez

VoBo:
Maricy Fda Alvarez
Insp. Interventoria

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 30/03/2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Deva G.	Nombre:	Ramon Ruiz
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	4884542
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Tecnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	Guacharacas
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vereda San isidro Municipio de Aipe

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Instalación de 200 metros lineales de aislamiento con cerco protector

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 30 de 03 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Romiro Deva	Nombre:	Ramón Ruiz

Vo.Bo.

Insp. Intervventoria

SIG · CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 30/03/2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Devia G.	Nombre:	ARMIN GARZON
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	83168761
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Tecnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	Guamitos
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vereda San Isidro Municipio de Aipe.

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Instalacion de 213 metros lineales de aislamiento con cerco protector

SIG / cam CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:



A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día _____de_____de 20__

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ramiro Devia G.	Nombre:	Armin Garzon

VoBo.



SIG / CAM — CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA — ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** DD/MM/AA
   30/03/2024
2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Devia Galindo	Nombre:	Justo Olaya
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	4884624
Contratista:	Solor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Tecnico de Campo	Predio donde se realiza la entrega:	Hospital
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vereda San Isidro Municipio de Aipe

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Instalación de 200 metros lineales de aislamiento con cerco protector

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 30 de 03 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ramiro Devia G.	Nombre:	Justo Araya

VoBo

Ingr. Interventoría

SIG / CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** DD/MM/YYYY
   13/04/2024
2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ramiro Devia G.	Nombre:	Jose Daza cubillos
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	12104692
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Tecnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	INDIAL
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vereda San isidro Municipio de Aipe

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Instalacion de 200 metros lineales de aislamiento con cerco protector

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 13 de 04 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ramiro Devia G.	Nombre:	jose Data cubillos

Vo Bo.

Insp. Interventoría

SIG / cam — CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA — ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 30/01/2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

☐ Entrega Parcial ☒ Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	RAMIRO DEVIA	Nombre:	BONIFACIO ROJAS
Número de identificación:	93359578	Número de identificación:	12188146
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	TECNICO DE CAMPO	Predio donde se realiza la entrega:	LA FRONTERA
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vda ALTO LIBANO El PITAL - Huila

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe: Instalacion de cerco protector de 400 metros lineales, Cerco en alambre de puas y Postes plasticos. Cerco protector

SIG · CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 30 de 01 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ramiro Devia G.	Nombre:	Bonifacio Rojas

VoBo

Inspectora Interventoría

SIG / CAM — CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA — ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** DD/MM/YYYY 30/03/2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferneydarilo Castro G.	Nombre:	Miller Pobre Vargaz
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	4919605
Contratista:	SoFor Ingenieros S.A.S.	Correo electrónico:	
Cargo:	técnico de Campo	Predio donde se realiza la entrega:	Predio: El Pedregal. Vda: El Carmen
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio: Paicol

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

En la presente acta se recibe 250ml. para una instalación total de 1.000ml. de cerco de alambre de púas.

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 30 de 03 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Miller Pabon V

VoBo: Maria Fda Alvarez
Insp. Interventoria

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 30/03/2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney danilo castro	Nombre:	Alejandro perez R.
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	1003800841
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	Buena Vista Vda San Migel
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio : Neiva

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

- En esta acta se reciben 1009 metros lineales Para un total de aislamiento instalado en cerco protector de 2009 metros lineales.

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 30 de 03 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C.	Firma:	
Nombre:	Ferney danilo castro	Nombre:	Didier Alejandro perez

Vobo: Inspect. Interventoria

ANEXO 3
PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL Y DE MOVILIZACIÓN

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

REGISTRO DE CULTIVOS FORESTALES O SISTEMAS AGROFORESTALES CON FINES COMERCIALES

- Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante resolución 000159 de 2008 delegó en el ICA el registro de cultivos forestales o sistemas agroforestales con fines comerciales.
- Que la resolución 000182 de 2008 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, fijó el procedimiento y requisitos para el registro de cultivos forestales o sistemas agroforestales con fines comerciales, señalando en el artículo primero que toda persona natural o jurídica que se dedique a cultivos forestales o sistemas agroforestales con fines comerciales debe registrarse ante el ICA.
- Que se solicitado y acreditado los requisitos establecidos en el artículo primero de la Resolución en mención y realizada la visita correspondiente se comprobó la existencia del predio y del cultivo en la especie y área señalada, emitiendo concepto favorable, razón por lo que se expide el registro
- El presente registro no aplica para bosques naturales, áreas forestales protectoras, áreas de manejo especial o cualquier otra categoría de manejo de conservación o protección; así como ecosistemas estratégicos, tales como páramos, manglares, humedales y coberturas vegetales naturales secas y en general que tengan restricción ambiental, establecidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por las Corporaciones Autónomas, por los municipios, a través de los planes de ordenamiento territorial o cualquier otra autoridad con competencia en el tema.
- La violación a las disposiciones contenidas en la resolución 182 de 2008 y el uso indebido del registro, será sancionado por el ICA de acuerdo a lo señalado en el artículo 11 de la mencionada resolución.

INSCRIPCIÓN No 14707722 -73-0035.

INFORMACION DEL PREDIO

Nombre del predio	Matrícula Inmobiliaria No.	Coordenada Geográficas	
PARCELA 47	350-133293	Latitud N 04.61082	Longitud W -75.19292
Departamento TOLIMA	Municipio ANZOATEGUI	Vereda PALOMAR	

SISTEMA	Nombre de la especie maderable	Año de establecimiento	Hectáreas o número de árboles	Volumen m3
PLANTACION FORESTAL	Eucalipto blanco (*Eucalyptus globulus*)	1980	4 Hectáreas	1200
	Cipres (*Cupressus lusitanica Mill.*)	1980	3 Hectáreas	320

INFORMACION DEL TITULAR DEL REGISTRO

Propietario o Representante legal		Identificación CC
SAULO ENRIQUE AGUILAR ORTIZ Y CONNE MARÍA BOTERO RIOS		14707722
Dirección	Municipio	Departamento
CARRERA 6No.44-49Apto202 VILLA MARLEN 1	ANZOATEGUI	TOLIMA
Dirección de correo electrónico saulo962@hotmail.com		Teléfono (8)2702351

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

ICA SECCIONAL TOLIMA	CIUDAD IBAGUE	DIA 7	MES 5	AÑO 2007

VIGENCIA INDEFINIDA
(PARA LAS HECTAREAS O ÁRBOLES REGISTRADOS)

HUMBERTO ORJUELA ROZO
Nombre y Firma Coordinador Seccional

Powered by CamScanner

No. 022-1390419

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN VEGETAL - DIRECCIÓN TÉCNICA DE EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA
CERTIFICADO DE MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA PROVENIENTES DE PLANTACIONES FORESTALES Y/O SISTEMAS AGROFORESTALES COMERCIALES REGISTRADOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

GERENCIA SECCIONAL:	**Tolima**	**OFICINA ICA:**	**Ibagué**	**CERTIFICADO No.:**	**1475147**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE PLANTACIÓN

Nombre o razón social del titular del registro:		SAULO ENRIQUE AGUILAR ORTIZ Y CONNE MARÍA BOTERO RIOS	**C.C. o NIT:**		14270722
Tipo del cultivo:	Plantación Forestal		**No. de registro ICA y fecha:**		14707722-73-0035 - 07/05/2007
Registro ICA No:	14707722-73-0035	**Registro UMATA No:**		**Registro CAR No:**	
DEPARTAMENTO: TOLIMA		MUNICIPIO: ANZOATEGUI	VEREDA PREDIO: PALOMAR - PARCELA 47		

En caso de ser requerido de un tercero para gestionar el presente tramite, el interesado deberá estar debidamente autorizado y se requiere diligenciar la siguiente casilla.

Nombre o razón del solicitante:	SAULO ENRIQUE AGUILAR ORTIZ	**CC. o NIT:**	14,270,722

2. DATOS DE LA MOVILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA

Tipo de certificado :	MOVILIZACION(X)	Vigencia desde (27-FEB-24) Hasta (27-FEB-24)	
Fecha, hora y ciudad de expedición : 26-FEB-24 - ICA, IBAGUÉ		Lugar de origen de los productos a movilizar:	PARCELA 47/ANZOATEGUI
Ruta:	VEREDA PALOMAR - ANZOATEGUI, IBAGUÉ, SALDAÑA, AIPE, NEIVA-VDA SAN MIGUEL	Destino final (Ciudad):	NEIVA

ESPECIES			
NOMBRE COMÚN	**NOMBRE CIENTIFICO**	**AÑO PLANTACION VOLUMEN (m3) A MOVILIZAR**	**TIPO Y/O DESCRIPCIÓN DEL (OS) PRODUCTO (S)**
Eucalipto blanco	Eucalyptus globulus	1980 / 8	Postes
TOTAL →		8	

3. DESCRIPCION DEL MEDIO DE TRANSPORTE : Terrestre(X) Aéreo ( ) Otro ( ) Cuál:

Tipo de vehículo-Empresa Transportadora (si aplica):	CAMION TURBO / PARTICULAR	Identificación del medio de transporte (Placa vehiculo):	JVM-233
Conductor:	JOHN WILLER HERNANDEZ	Cedula de Ciudadania:	1,110,531,154

SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES Y DE POLICIA SELLAR EL PRESENTE DOCUMENTO CUANDO EL MISMO SEA VERIFICADO

PUESTO DE CONTROL UBICACIÓN, FECHA Y HORA DE VERIFICACION

NOMBRE, ENTIDAD Y CARGO DE QUIEN VERIFICA:

4. OBSERVACIONES:

NO. FACTURA 020240255932 del 26/02/2024. FIRMA LUISA HUERTAS PF FORESTAL, CUALQUIER INQUIETUD AL 3203509737-8234 - 3214320021No. Forma: 022-1390419

Este documento ha sido firmado digitalmente

Espacio para sello y/o escudo de seguridad

Nombre, C.C., sello y firma del propietario del registro o autorizado

Nombre, C.C., cargo y firma del funcionario ICA que expide el documento

OSCAR FERNANDO CARDOZO CARO

NOTA 1: Para la movilización de productos maderables de transformación primaria provenientes de plantaciones forestales y/o sistemas agroforestales con fines comerciales, los transportadores deberán portar el original del certificado de movilización que expida el ICA, completamente diligenciado.
NOTA 2: El certificado de movilización no es un documento negociable, ni transferible, y con él no se podrá amparar el transporte a terceros, ni de otras rutas o especificaciones diferentes a las contempladas en su expedición.
NOTA 3: Este documento sólo es válido por una vez, para las fechas establecidas, productos descritos, especies forestales y/o plantaciones forestales comerciales registradas.
NOTA 4: Las autoridades del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible deberán efectuar sellado o visado del documento original del certificado de movilización las veces que sea necesario, cuando a lo largo de la ruta de movilización autorizada se realicen o adelanten operativos de control en las vías del país. Las demás autoridades competentes podrán hacerlo cuando lo estimen necesario.

- USUARIO -

Forma 3-878 V. 3

Powered by CamScanner

ANEXO 4
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3
ACTA DE OBRA 3 Y MEMORIAS DE CANTIDADES

	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. **DESCRIPCIÓN GENERAL**				
CLASE DE ACTA:	**FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: __3__**			
_X_ CONTRATO DE:	**OBRA**	**Nº: 0423**	**AÑO:**	**2023**
___ CONVENIO DE:				

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**SOFOR INGENIEROS SAS**		
	NIT y/o CC:	**800082101-1**		
	DIRECCIÓN:	**Sector C casa #49 Vereda Santa teresa**	**TEL:**	**3183680947**
	CIUDAD:	**IBAGUE – TOLIMA**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**GEMBER CARDOZO CRUZ**		
OBJETO:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2023000036 del 23/10/2023** **2023001687 del 23/10/2023**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 1.505.964.466,00**			
	Valor en Letras: MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVENIENTE:	**NO APLICA**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$0.0		

VALOR TOTAL	**$ 1.505.964.466,00**		
PLAZO INICIAL:	**DIEZ (10) MESES**		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	N/A	
FECHA INICIO	07 de marzo de 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
	N° 2	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	6/05/2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 01/03/2024 al 30/04/2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	**SOFOR INGENIEROS SAS -** R.L GEMBER CARDOZO CRUZ	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	

2. **ACTAS**

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL	**08/11/2023**	**-**	**$ 1.505.964.466,00**	**$ 1.505.964.466,00**
VALOR ADICIONAL	N/A	-	$ 0,00	**$ 1.505.964.466,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 1	31/01/2024	$ 206.778.825,00	-	**$ 1.299.185.641,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 2	29/02/2024	$ 207.328.798,00	-	**$ 1.091.856.843,00**
PAGO PARCIAL ACTA 3	Por pagar	$ 122.766.651,00	-	**$ 969.090.192,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	31/03/2024	$ 536.874.274,00	-	**$ 969.090.192,00**

3. **RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)**

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato; recibiendo a satisfacción un total de 4.172 metros lineales de aislamiento los cuales fueron: (1.009 ml) en el municipio de Neiva vereda San Miguel predio Buenavista, (500 ml parciales) en el Municipio de Neiva vereda Santa Lucia predio Veraguas, (250 ml) en el municipio de Paicol vereda El Carmen predio RNSC Pedregal, (200 ml) en el Municipio de Aipe vereda San Isidro predio Granizo, (200 ml) en el Municipio de Aipe vereda San Isidro predio Indial, (200 ml) en el municipio de Aipe vereda San Isidro predio Guacharacas, (200 ml) en el municipio de Aipe vereda San Isidro predio Hospital, (213 ml) en el municipio de Aipe vereda San Isidro predio Guamitos, (200 ml) en el municipio de Acevedo en la vereda Tocora

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

predio Rovira, (800 ml) en el municipio de Pitalito vereda Charguayaco predio RNSC Recreo, (400 ml) en el municipio de Pital vereda Alto Líbano predio Frontera.

2. Teniendo a la fecha una ejecución total por valor de $122.766.651,00, conforme al Acta de Recibo Parcial 2; la interventoría, en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA SEPTIMA –FORMA DE PAGO, "*LA CORPORACIÓN pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales de avance de obra*…", por tanto, se autoriza el pago correspondiente a la suma de **$ 122.766.651,00** del valor del contrato ejecutado.

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo parcial No.3.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4.5
Oportunidad En Entrega	4.5
Cantidad Entregada	4.5
Responsabilidad Ambiental	4.5
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4.5
PROMEDIO CALIFICACION	**4.5**

GEMBER CARDOZO CRUZ
R/L CONSORCIO SIETE 2022
Contratista de Obra

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista de Interventoría

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
¡Cuida tu naturaleza!

OBJETO:	**ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO EL DEPARTE DEL HUILA"**				
CONTRATISTA DE OBRA:	SOFOR INGENIEROS SAS	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**FECHA DE INICIO:**	8/10/2023
R. LEGAL	GEMBER CARDOZO CRUZ	**R. LEGAL**	N.A	**FECHA SUSPENSION No. 1:**	N/A
VALOR OBRA:	$ 1.505.964.466,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 152.573.345,00	**FECHA REINICIACIÓN No. 1:**	N/A
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES	**PLAZO INICIAL:**	DIEZ (10) MESES	**FECHA SUSPENSION No.2:**	N/A
				FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A
PLAZO ADICIONAL:	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A
				FECHA TERMINACIÓN:	7/09/2024
PLAZO ACTUALIZADO:	DIEZ (10) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	DIEZ (10) MESES	**PERIODO:**	01/03/2024 a 30/04/2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3

FECHA: 6/05/2024

CONDICIONES INICIALES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			SALDO	
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR
1	INSTALACIÓN AISLAMIENTOS EN PREDIOS EN LA ZONA FORESTAL PROTECTORA DE LA CUENCA (ML) Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y RNSC	Ml	35.467	$ 23.408,11	$ 830.215.310,00	12.839	$ 300.536.678,00	4.172	$ 97.658.620,0	17.011	$ 398.195.298	47,96%	18.456	$ 432.020.012,00
2	IMPLEMENTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA PARA LA CONECTIVIDAD EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL (PREDIOS ADQUIRIDOS Y OTROS) (HA)	Ha	10	$ 7.896.837,53	$ 78.968.375,00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	10	$ 78.968.375,00
3	IMPLEMENTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA PARA LA CONECTIVIDAD EN EL MACIZO COLOMBIANA (HA)	Ha	30	$ 9.626.114,47	$ 288.783.434,00	3	$ 28.878.343,00	0	$ -	3	$ 28.878.343	10,00%	27	$ 259.905.091,00
	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 1.197.967.119,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 329.415.021,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 97.658.620**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 427.073.641**	**35,65%**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 770.893.478,00**
	ADMINISTRACION 10% =				$ 119.796.712,00	ADMINISTRACION 10% =	$ 32.941.502,00	ADMINISTRACION 10% =	$ 9.765.862,00	ADMINISTRACION 10% =	$ 42.707.364,00		ADMINISTRACION 10% =	$ 77.089.348,00
	IMPREVISTOS 5% =				$ 59.898.356,00	IMPREVISTOS 5% =	$ 16.470.751,00	IMPREVISTOS 5% =	$ 4.882.931,00	IMPREVISTOS 5% =	$ 21.353.682,00		IMPREVISTOS 5% =	$ 38.544.674,00
	UTILIDAD 9% =				$ 107.817.041,00	UTILIDAD 9% =	$ 29.647.352,00	UTILIDAD 9% =	$ 8.789.276,00	UTILIDAD 9% =	$ 38.436.628,00		UTILIDAD 9% =	$ 69.380.413,00
	IVA % sobre utilidad 19% =				$ 20.485.238,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 5.632.997,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 1.669.962,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 7.302.959,00		IVA % sobre utilidad 19% =	$ 13.182.279,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 307.997.347,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 84.692.602,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 25.108.031,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 109.800.633,00**		**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 198.196.714,00**
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)				$ 1.505.964.466,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 414.107.623,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 122.766.651,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 536.874.274,00		TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 969.090.192,00
						VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 414.107.623,00**	**VALOR TOTAL A PAGAR**	**$ 122.766.651,00**	**VALOR ACUMULADO A PAGAR**	**$ 536.874.274,00**		**VALOR TOTAL A PAGAR**	**$ 969.090.192,00**
									8,15%		**35,65%**			

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA $122.766.651,00

Son: CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Ing. GEMBER CARDOZO CRUZ
SOFOR INGENIEROS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
INTERVENTOR

PREACTAS No.3

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.423 DE 2023**		**FECHA DE INICIO: 08/11/2023**		**CONTRATISTA: SOFOR INGENIEROS SAS**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:**	N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"		**FECHA DE REINICIO 1:**	N/A	
			FECHA DE SUSPENSION 2:	N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: GEMBER CARDOZO CRUZ**
			FECHA DE REINICIO 2:	N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 1.505.964.466,00	**PLAZO: DIEZ (10) MESES**		**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA C.**
	VALOR TOTAL:	$ 1.505.964.466,00	**ADICIÓN EN PLAZO:**	N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	07/09/24	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO:	N/A			

ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**
1	**AISLAMIENTOS EN ZONAS DE PROTECCIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO LAS CEIBAS**	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	CANT. CONTRACTUAL	CANT. ACTA ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PRESENTE ACTA	POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Neiva Vereda San Miguel predio Buenavista	2.124	1.000	1.009	115	2.009
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Neiva Vereda Santa Lucia predio Veraguas	1.770		500	1.270	500
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Paicol Vereda el Carmen predio RNSC Pedregal	1.000	750	250	0	1.000
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Aipe Vereda Santa Isidro predio Granizo	200		200	0	200
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Aipe Vereda Santa Isidro predio Indial	200		200	0	200
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Aipe Vereda Santa Isidro predio Guacharacas	200		200	0	200
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Aipe Vereda San Isidro predio Hospital	200		200	0	200
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Aipe Vereda San Isidro predio Guamitos	213		213	0	213
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Acevedo Vereda Tocora predio Rovira	200		200	0	200
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Pitalito Vereda Charguayaco predio RNSC Recreo	800		800	0	800
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Pital Vereda Alto Libano predio Frontera	400		400	0	400
				4.172		

TOTAL	**4.172**
PRESENTE ACTA	**4.172**

GEMBER CARDOZO CRUZ RL.
SOFOR INGENIEROS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Predio Buenavista Vereda San Miguel Municipio de Neiva	Predio Veraguas Vereda Sannta Lucia Municipio de Neiva
 	 
Predio RNSC pedregal Vereda el Carmen Municipio de Paicol	**Predio Granizo Vereda San Isidro Municipio de Aipe**
 	 
Predio Indial Vereda San Isidro Municipio de Aipe	**Predio Guacharacas Vereda San Isidro Municipio de Aipe**
 	 
Predio Hospital Vereda San Isidro Municipio de Aipe	**Predio Guamitos Vereda San Isidro Municipio de Aipe**
 	 
Predio Rovira Vereda Tocora Municipio de Acevedo	**Predio RNSC Charguayaco Vereda Municipio de Pitalito**
 	 
Predio Frontera Vereda Alto Libano Municipio de Pital	
 	

GEMBER CARDOZO CRUZ
RL. SOFOR INGENIEROS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
