INFORME FINAL

CONTRATO No. 4034- 2023

CONTRATANTE:

SOACHA GOBIERNO·MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

OBJETO:

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA – FASE IV"

CONTRATATISTA:

GEOCAT Ingeniería SAS

NIT: 860.524.046-8

57+1 240 21 41 geocatltda@hotmail.com WWW.GEOCAT.COM.CO Calle 77 No. 63 -22 Bogotá, Colombia

TABLA DE CONTENIDO

1. **Resumen ejecutivo**..... 3
2. **Introducción** 4
3. **Conceptos** ..... 4 - 6
   3.1 . Plano Catastral 4-5
   3.2 Casco Rural y Urbano del Municipio
   de Soacha Recorrido en campo.....5
   3.3 Generación de listados 5
   3.4 Localización y acopio 6
4. **Actividades y labores realizadas** .....6 - 8
   4.1. Fabricación 6
   4.2 Entrega en Almacén 7
   4.3 Informe de instalación ..... 7 - 8
5. **Gestión Social** ..... 8 - 9
6. **Párrafo financiero**..... 9 -11
   6.1 Oferta económica y proyección final ..... 10 - 11
7. **Póliza y garantías** 11
8. **Prórroga del plazo de ejecución del contrato** ..... 11 - 13
9. **Obligaciones como contratista efectuadas** .....14 - 30
   9.1 Reporte resumen de pago ..... 26 - 30
10. **Anexos** ..... 31 -

57+1 240 21 41 geocatltda@hotmail.com WWW.GEOCAT.COM.CO Calle 77 No. 63 -22 Bogotá, Colombia

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 INFORMACION GENERAL

No. contrato	**4034- 2023**
Objeto	SUMINISTRO E INSTALACION DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA - FASE IV.
Contratista	GEOCAT INGENIERA S.A.S
Nit:	860.524.046-8
Representante Legal	JONATHAN DAVID BENAVIDES
No. Cedula	1.026.552.436
Entidad Contratante	ALCALDIA DE SOACHA
Nit:	800.094.755-7
Valor Contrato:	$ 400.000.000
Fecha De Contrato	31/08/2023
Plazo De Ejecución	HASTA 14/02/2024
Fecha De Inicio	4/09/2023
Fecha De Finalización	14/02/2024
Prorrogas En Tiempo	45 días
Suspensiones En Tiempo	Ninguna

57+1 240 21 41
geocatltda@hotmail.com
WWW.GEOCAT.COM.CO
Calle 77 No. 63 -22
Bogotá, Colombia

2. INTRODUCCIÓN

En el siguiente informe tiene como fin dar a conocer las actividades realizadas en la ejecución del contrato No. 4034-2023 desde el 4 de septiembre 2023, hasta el 14 de febrero de 2024.

3. CONCEPTOS

3.1 . PLANO CATASTRAL: es una representación cartográfica a escala de un sector comprendido por un conjunto de manzanas con sus vías colindantes y demás limites que pueden ser accidentes naturales como cerros, acequias, ríos, etc., las que deben estar georreferenciadas para su identificación catastral.

Predio: es el inmueble perteneciente a una persona natural o jurídica situado en un mismo municipio y no separado por otro predio público o privado, por una vía o drenaje



Acceso Principal: es el acceso o puerta por donde se encuentra la entrada y salida permanente de personal y elementos al predio.

Acceso Secundario: es el acceso o puerta situado en el mismo predio sobre la misma vía que se encuentra el acceso principal.

Vía: Es la zona de uso público o privado destinada al tránsito de vehículos y/o peatones.

57+1 240 21 41 geocatltda@hotmail.com WWW.GEOCAT.COM.CO Calle 77 No. 63 -22 Bogotá, Colombia

Malla Vial: es la representación de la nomenclatura vial del municipio mediante el trazo de líneas sobre el eje central de cada vía vehicular y/o peatonal.

Nomenclatura Vial: Es el conjunto de caracteres alfanuméricos que se utilizan para identificar una **vía,** se compone de **nomenclatura de vía principal** y **nombre común.**

3.2 CASCO RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE SOACHA RECORRIDO EN CAMPO.

Se hizo una calificación del estado de la placa instalada en cada acceso; calles, carreras, trasversales, diagonales y vías de acceso en general, previo al inventario de las placas faltantes a fabricar e instalar. En este proceso se evidencia la necesidad de instalar nuevas placas de nomenclatura, Viales y en ciertas zonas domiciliarias

3.3 GENERACIÓN DE LISTADOS:

El especialista en Sistemas de Información Geográfica, realizo el estudio de los resultados arrojados, y el estudio realizado en 2020 en campo según el estudio y recorrido realizado, allí asigna los puntos los cuales identifican los predios faltantes por placas, las Viales y domiciliarias necesarias y gestiona el complemento de la GDB , para llevar el manejo de la base de datos del municipio, se generaron el total de listados para su fabricación, los planos en campo, el Shape File y proceder a fabricar.

57+1 240 21 41
geocatltda@hotmail.com
WWW.GEOCAT.COM.CO
Calle 77 No. 63 -22
Bogotá, Colombia

3.4. LOCALIZACIÓN DEL ACOPIO

La zona donde se desarrollaron las labores y actividades fueron realizadas en la fábrica y bodega de la Compañía, Calle 77 # 63 -22. GEOCAT INGENIERIA SAS situada en la ciudad de Bogotá.

4. ACTIVIDADES Y LABORES REALIZADAS:

- Acondicionamiento Bodega y Planta de Producción
- Importación Jumbo Cinta Reflectiva
- Compra Rollos Aluminio
- Compra Pintura Electrostática Color Vinotinto
- Cortes a Medida Rollos Cinta Reflectiva
- Colaminado Blancos - Placas Domiciliarias

4.1 Fabricación:

- Se fabrican las placas según listados arrojados por el informe, el equipo de fabrica troquela placa a placa revisando el control de calidad para cumplir con el objetivo del contrato.
- Después de troquelar se revisa en fabrica para quitar errores y llevar a pintura
- Una vez en pintura, se pasa por los hornos para que reluzca el contraste del reflectivo.
- Una vez pintada pasa al área de retoque donde quitan los detalles que puedan impedir una visibilidad.
- Una vez esté bien la placa física, se introduce en una lámina de plástico para protegerla y llevarla al área de conteo.

57+1 240 21 41 geocatltda@hotmail.com WWW.GEOCAT.COM.CO Calle 77 No. 63 -22 Bogotá, Colombia

- En el área de conteo se verifica una a una, para que no haga falta en el lugar de instalación y se llevan al almacén para ser aprobadas.

4.2. ENTREGA EN ALMACÉN:

Una vez fabricadas las placas y hechas sus respectivas verificaciones, se lleva al almacén en Soacha, para allí ser revisado por el almacenista, dar su aprobación y proceder a instalar.

FECHA DE ENTREGA AMACEN	ENTREGAS	CANT PLACAS VIALES	CANT PLACAS DOMICILIARIAS
Viernes, 13 de octubre de 2023.	1	596	0
Jueves, 19 de octubre de 2023.	2	561	0
Martes, 07 de noviembre de 2023.	3	516	0
Jueves, 16 de noviembre de 2023.	4	450	0
Miércoles, 6 de diciembre de 2023.	5	646	0
Lunes 18 de diciembre de 2023.	6	414	413
Viernes, 12 de enero de 2024.	7	604	290
Viernes, 02 de febrero de 2024.	8	285	0
TOTAL		**4.072**	**703**

Nota: (116) Placas viales y (15) no instaladas relacionadas en el cuadro anterior corresponden a errores que se presentaron en el proceso de Georreferenciación y digitación. **Por lo anterior no se instalaron, ni tampoco serán cobradas ni su fabricación, ni su instalación**.

57+1 240 21 41 geocatltda@hotmail.com WWW.GEOCAT.COM.CO Calle 77 No. 63 -22 Bogotá, Colombia

4.3 INFORME DE INSTALACIÓN

TOTALES	
PLACAS VIALES FABRICADAS E INSTALADAS	**3.956**
PLACAS DOMICILIARIAS FABRICADAS E INSTALADAS	**688**

Nota: (21) Placas Domiciliarias fueron fabricadas e instaladas por PQR realizados por los ciudadanos y aprobados por parte de la supervisión, vigencia 2023.

DOMICILIARIAS

5. GESTIÓN SOCIAL:

Durante toda la ejecución del contrato en terreno en algunos sectores puntuales se presentaron algunos retrasos de instalación y bajo rendimiento, ya que en algunos sectores se les debía dar una pequeña charla social explicándoles por qué se estaba instalando la nomenclatura en su vivienda o cruce vial y sus beneficios, para que nos permitieran hacer la instalación y el registro fotográfico. En sitios específicos no permitirían la instalación y queda consignado y especificado a este informe.

El día 15 de noviembre de 2023 a la hora del mediodía se presentó un de asalto por una banda delincuencial mientras la comisión de campo se encontraba en trabajo de instalación en el Barrio Bella Vista instalado las viales , fueron asaltados por delincuentes, los cuales robaron sus pertenencias y la cámara que se usa para el registro fotográfico, por lo anterior se detuvo la instalación en ese punto, y fue solicitado a la entidad el apoyo y acompañamiento de la policía para poder terminar ese sector.

57+1 240 21 41 geocatltda@hotmail.com WWW.GEOCAT.COM.CO Calle 77 No. 63 -22 Bogotá, Colombia

El día 24 de noviembre de 2023 se envió un correo a la supervisión para solicitarle el apoyo de la impresión y entrega las cartas de socialización para poder ser repartidas en los barrios, a los cuales procederíamos a instalar la nomenclatura de placas domiciliarias, para así facilitar el proceso de instalación por parte de la comisión de campo. En los barrios Llanos de Soacha y El Rincón de Santa Fe lo cual nos permitió un mejor trabajo de instalación.

Por lo demás, no hubo PQRS, quejas, ni reclamos de daños de muros o fachadas. Y se logró una muy buena ejecución del contrato.

6. PARRAFO FINANCIERO:

De acuerdo con el contrato los pagos por parte de la Entidad serian mediante pagos parciales mensuales de acuerdo con el avance de intervención efectivamente realizado, previo reporte avalado por la supervisión, entrada al Almacén General de los elementos contratados.

A fecha de presentación de este informe final se enviaron las siguientes facturas de venta:

NO. FACTURA	VALOR FACTURA	PERIODO DE PAGO	ESTADO
FVE 48	$ 99.957.858	04/09/2023 AL 30/09/2023	PAGADA
FVE 50	$ 83.456.604	01/10/2023 AL 16/11/2023	PAGADA

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	FVE 48	10/19/2023 11:06:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	99,957,858 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	FVE 50	11/16/2023 12:37:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	83,456,604 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

57+1 240 21 41 geocatltda@hotmail.com WWW.GEOCAT.COM.CO Calle 77 No. 63 -22 Bogotá, Colombia

Nota: La factura electrónica de venta No. FVE 57 POR VALOR DE: POR VALOR DE: $ 110,189,240 - PERIODO FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO 01/12/2023 A 21/12/2023 fue devuelta por Secretaria de Hacienda porque no cumplir con los requisitos requeridos para el trámite del pago. Esta factura será anulada y se enviará nota crédito.

Pago 003	FVE 57	12/26/2023 11:53:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	-	110,189,240 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

6.1 OFERTA ECONOMICA Y PROYECCIÒN FINAL

Señalización Vial e Industrial
Nomenclatura Vial y Domiciliaria
Implementos de Dotación
Placas vehiculares

GEOCAT Ingeniería SAS

Estudios Catastrales
Sistemas de Información Geográfica
Cartografía Digital
Topografía

Formato 5. OFERTA OFRECIMIENTO ECONÓMICO.

ITEM	DESCRICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	FABRICACIÓN DE PLACAS DOMICILIARIAS	GL	$54.500	$10.355	$64.855
2	INSTALACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PLACAS DOMICILIARIAS	GL	$4.900	$931	$5.831
3	FABRICACIÓN DE PLACAS VIALES	GL	$67.200	$12.768	$79.968
4	INSTALACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PLACAS VIALES	GL	$5.400	$1.026	$6.426
	VALOR TOTAL DE LA UNIDAD INCLUIDO IVA				$157.080

El valor total del ofrecimiento económico corresponde a la suma de CUETROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400'000.000.00) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE, valor que incluye todos los impuestos de orden nacional y municipal y los costos asociados al cumplimiento total del objeto contratado, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por el municipio de Soacha – Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial.

Nota 1. El proponente, a la hora de estructurar su ofrecimiento económico deberá tener en cuenta todos y cada uno de los aspectos técnicos mínimos a satisfacer (Anexo 1 del pliego de Condiciones) con la prestación del servicio, a fin de plantear un ofrecimiento integral y ajustado al presupuesto.

Nota 2. Para efectos de determinar el menor valor, la entidad tomará el valor total de la fila denominada "**VALOR TOTAL DE LA UNIDAD INCLUIDO IVA**" este valor será el utilizado para realizar el proceso de puja dinámica.

Atentamente,

JONATHAN BENAVIDES.
Gerente
GEOCAT INGENIERIA S.A.S.
Nit: 860.524.046-8

57+1 240 21 41 - 649 15 91 comercial@geocat.com.co gerencia@geocat.com.co WWW.GEOCAT.COM.CO Calle 77 No. 63 -22 Bogotá, Colombia

PLACAS FABRICADAS E INSTALADAS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**VR. UNT INCLUIDO IVA**	**VR. TOTAL**
FABRICACION PLACAS DOMICILIARIAS	688	$ 64.855	$ 44.620.240
INSTALACION Y TOMA FOTOGRAFICA PLACASDOMICILIARIAS	688	$ 5.831	$ 4.011.728
FABRICACION PLACAS VIALES	3956	$ 79.968	$ 316.353.408
INSTALACION Y TOMA FOTOGRAFICA PLACAS VIALES	3956	$ 6.426	$ 25.421.256
			$ 390.406.632

$ 400.000.000	**VR. CONTRATO**
$ 99.957.858	**FACTURA 1**
$ 83.456.604	**FACTURA 2**
$ 9.593.368	**SALDO A FAVOR ENTIDAD**
$ 206.992.170	**VALOR POR PAGAR**

7. POLIZAS Y GARANTIAS:

Cargadas, enviadas y aprobadas por la Entidad en la plataforma del SECOP II

ID DE GARANTIA	TIPO DE POLIZA	EMISOR	FECHA FINALIZACION
CO1.WRT.13301100	Responsabilidad civil extra contractual	SURAMERICANA	8/24/2024
CO1.WRT.13302307	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	SURAMERICANA	2/19/2027
CO1.WRT.12391065	Responsabilidad civil extra contractual	SURAMERICANA	7/5/2024
CO1.WRT.12391063	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	SURAMERICANA	12/31/2026

8. PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO


Prórroga n° 1 al contrato de suministro n° 4034 del 31 de agosto de 2023.

El contrato se prorrogo a un plazo de ejecución del contrato de suministro N° 4034 del 31 de agosto de 2023 en cuarenta y cinco (45) días calendario, hasta el 14 de febrero de 2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y de la suscripción del acta de inicio.

VER CONTRATO

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	
CO1.CTRMOD.14197242	Modificar el contrato	12/26/2023 4:02 PM *(UTC -5 horas)*	12/26/2023 4:09 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle

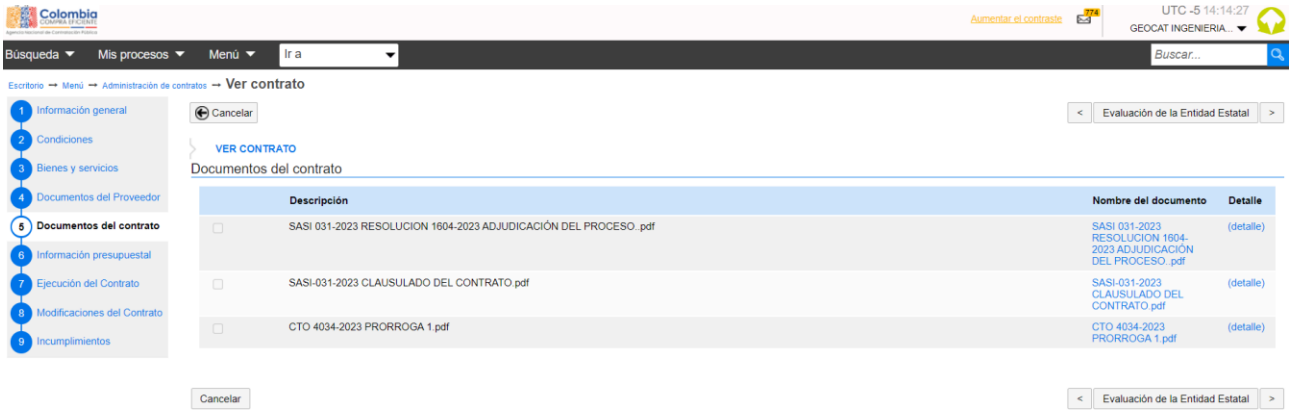


VER CONTRATO

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.11247739
Número del contrato	4034-2023
Versión del contrato	2
Objeto del contrato	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA - FASE IV.
Tipo de contrato	Suministros
Fecha de inicio del contrato	9/4/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2/14/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Duración del contrato	165 Días
Tiempo adiciones en días	45 días
Estado del contrato	En ejecución
Liquidación	(•) Sí ( ) No
Fecha de inicio de liquidación	2/15/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	8/16/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones Pos Consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

Resumen

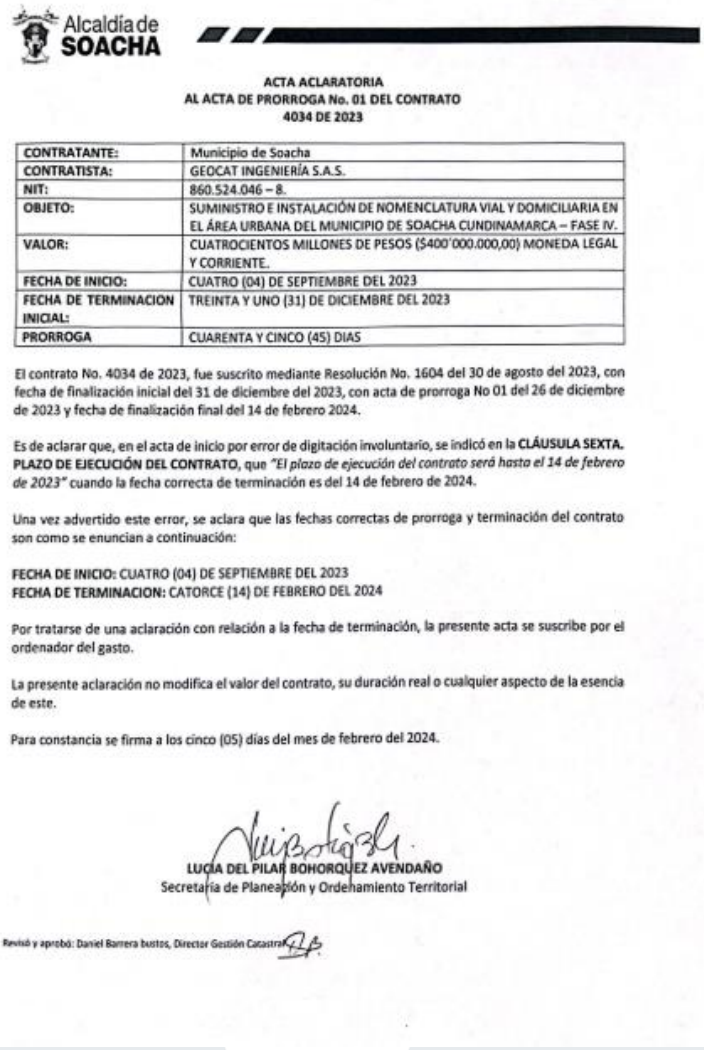

Alcaldía de SOACHA

ACTA ACLARATORIA
AL ACTA DE PRORROGA No. 01 DEL CONTRATO
4034 DE 2023

CONTRATANTE:	Municipio de Soacha
CONTRATISTA:	GEOCAT INGENIERÍA S.A.S.
NIT:	860.524.046 – 8.
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA – FASE IV.
VALOR:	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400'000.000,00) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE.
FECHA DE INICIO:	CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2023
PRORROGA	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

El contrato No. 4034 de 2023, fue suscrito mediante Resolución No. 1604 del 30 de agosto del 2023, con fecha de finalización inicial del 31 de diciembre del 2023, con acta de prorroga No 01 del 26 de diciembre de 2023 y fecha de finalización final del 14 de febrero 2024.

Es de aclarar que, en el acta de inicio por error de digitación involuntario, se indicó en la **CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**, que *"El plazo de ejecución del contrato será hasta el 14 de febrero de 2023"* cuando la fecha correcta de terminación es del 14 de febrero de 2024.

Una vez advertido este error, se aclara que las fechas correctas de prorroga y terminación del contrato son como se enuncian a continuación:

FECHA DE INICIO: CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACION: CATORCE (14) DE FEBRERO DEL 2024

Por tratarse de una aclaración con relación a la fecha de terminación, la presente acta se suscribe por el ordenador del gasto.

La presente aclaración no modifica el valor del contrato, su duración real o cualquier aspecto de la esencia de este.

Para constancia se firma a los cinco (05) días del mes de febrero del 2024.

LUCIA DEL PILAR BOHORQUEZ AVENDAÑO
Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial

Revisó y aprobó: Daniel Barrera bustos, Director Gestión Catastral

Nota: Se genera acta aclaratoria indicando la corrección, vigencia 2024.

9. OBLIGACIONES EFECTUADAS COMO CONTRATISTA:

Obligación 1: Se adjunta como anexo la certificación como fabricantes del material de calidad usado para la fabricación de las placas Viales y Domiciliarias, de acuerdo a la especificación técnica exigida.

Señalización Vial e Industrial
Nomenclatura Vial y Domiciliaria
Implementos de Dotación
Placas vehiculares

GEOCAT Ingeniería SAS

Estudios Catastrales
Sistemas de Información Geográfica
Cartografía Digital
Topografía

Bogotá, 10 Octubre 2023

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA – CUNDINAMARCA.

Referencia: CERTIFACION MATERIALEES COMO FABRICANTES
CONTRATO N° 4034 DE 2023. *"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURAL Y DOMICILIARIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA – FASE IV".*

Respetados señores:

Por medio del presente GEOCAT INGENIERIA SAS con Nit. 860.524.046-8 se permite certificar que las placas Domiciliarias estarán elaboradas en **ALUMINIO CON ESPESOR DE 0.9 MM**, con una aleación y temple "liso 3003 –H-14 "el cual es lo suficientemente flexible de tal forma que permite el procesamiento en alto relieve sin que este se rompa, con garantía y durabilidad mayor a (50) años, con resistencia a los efectos climáticos.

Atentamente,

JONATHAN DAVID BENAVIDES MUNERA
Gerente
GEOCAT INGENIERIA S.A.S
NIT 860524046-8

57+1 240 21 41 - 649 15 91 comercial@geocat.com.co gerencia@geocat.com.co WWW.GEOCAT.COM.CO Calle 77 No. 63 -22 Bogotá, Colombia

57+1 240 21 41 geocatltda@hotmail.com WWW.GEOCAT.COM.CO Calle 77 No. 63 -22 Bogotá, Colombia

Señalización Vial e Industrial
Nomenclatura Vial y Domiciliaria
Implementos de Dotación
Placas vehiculares

GEOCAT Ingeniería SAS

Estudios Catastrales
Sistemas de Información Geográfica
Cartografía Digital
Topografía

Bogotá, 10 Octubre 2023

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA – CUNDINAMARCA.

Referencia: CERTIFACION MATERIALEES COMO FABRICANTES
CONTRATO N° 4034 DE 2023. "*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURAL Y DOMICILIARIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA – FASE IV*".

Respetados señores:

Por medio del presente GEOCAT INGENIERIA SAS con Nit. 860.524.046-8 se permite certificar que el material de fondo será **PINTURA ELECTROSTÁTICA DE COLOR VINO TINTO** con resistencia a la intemperie, compatible con la película reflectiva, garantizando una durabilidad de (5) años sobre el material reflectivo, con permanencia del color y solidez a la luz ultravioleta.

Atentamente,

JONATHAN DAVID BENAVIDES MUNERA
Gerente
GEOCAT INGENIERIA S.A.S
NIT 860524046-8

Señalización Vial e Industrial
Nomenclatura Vial y Domiciliaria
Implementos de Dotación
Placas vehiculares

GEOCAT Ingeniería SAS

Estudios Catastrales
Sistemas de Información Geográfica
Cartografía Digital
Topografía

Bogotá, 10 Octubre 2023

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA – CUNDINAMARCA.

Referencia: CERTIFACION MATERIALEES COMO FABRICANTES
CONTRATO N° 4034 DE 2023. *"SUMINISTRO E INSTALACION DE NOMENCLATURAL Y DOMICILIARIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA – FASE IV".*

Respetados señores:

Por medio del presente GEOCAT INGENIERIA SAS con Nit. 860.524.046-8 se permite certificar que el material **CINTA REFLECTIVA** será de color blanco cumpliendo con los indicadores mínimos de desempeño fotométrico:

70 Candelas/Lux/Metro Cuadrado con un ángulo de observación de 0,2° e entre. -4°.
Garantía de (5) años.

Atentamente,

JONATHAN DAVID BENAVIDES MUNERA
Gerente
GEOCAT INGENIERIA S.A.S
NIT 860524046-8

Obligación 2:

Se anexa radicado del documento de la placa muestra de la referencia Viales y Domiciliarias a materializar, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas entregados el día 18 de agosto del 2023 a las 10:16 am, en la secretaria de planeación y ordenamiento territorial.

Obligación 3:

Se anexan los dos cronogramas de trabajo que fueron guía para la ejecución del contrato.

Obligación 4:

Se informo oportunamente el cambio en el cronograma debido a la prorroga solicitada y aproada por la entidad.



Obligación 5:

Durante la ejecución del contrato se usaron todos los elementos de dotación y seguridad Vial con el personal contratado para todo el desarrollo del proyecto, en fabricación y en campo.

En Fabricación:

- guantes especializados,

- botas punta de Aero,
- Tapabocas 3M con filtro
- overoles industriales
- Gafas de protección visual
- Respirador doble vía para pintura 3M
- Tapa oídos


Y demás materiales basicoso para el desempeño seguro de la fabricación de la nomenclatura.

En campo:

- Gafas de protección visual
- Chalecos y gorras
- Escaleras de 2 y 3 pasos
- Carro trasportador de placas

Entre otros elementos que surgen en el proceso de instalación.

57+1 240 21 41
geocatltda@hotmail.com
WWW.GEOCAT.COM.CO
Calle 77 No. 63 -22
Bogotá, Colombia

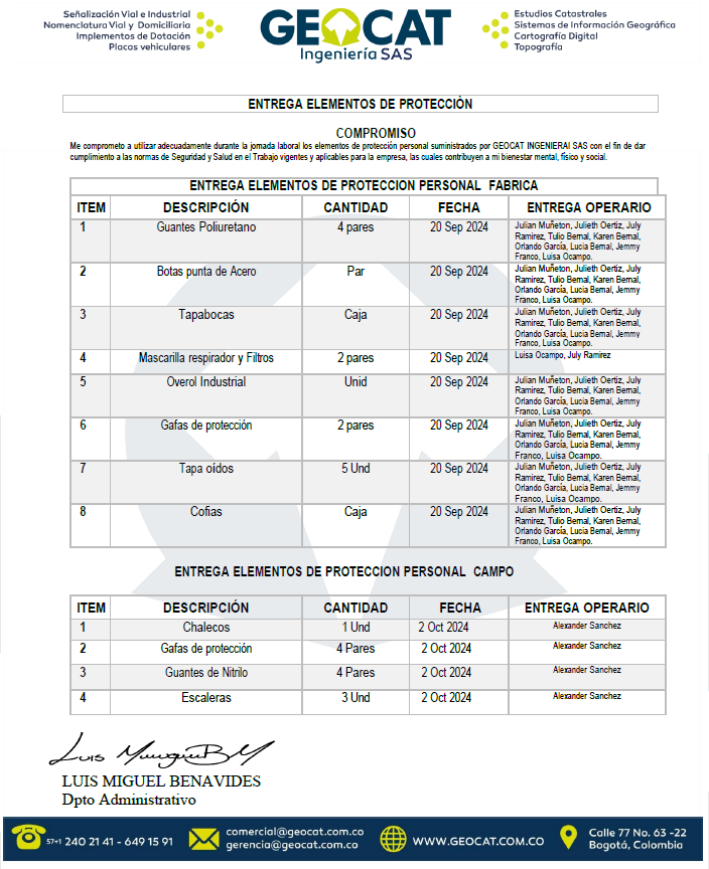

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por GEOCAT INGENIERAI SAS con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la empresa, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL FABRICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	ENTREGA OPERARIO
1	Guantes Poliuretano	4 pares	20 Sep 2024	Julian Muñeton, Julieth Oertiz, July Ramirez, Tulio Bernal, Karen Bernal, Orlando García, Lucia Bernal, Jemmy Franco, Luisa Ocampo.
2	Botas punta de Acero	Par	20 Sep 2024	Julian Muñeton, Julieth Oertiz, July Ramirez, Tulio Bernal, Karen Bernal, Orlando García, Lucia Bernal, Jemmy Franco, Luisa Ocampo.
3	Tapabocas	Caja	20 Sep 2024	Julian Muñeton, Julieth Oertiz, July Ramirez, Tulio Bernal, Karen Bernal, Orlando García, Lucia Bernal, Jemmy Franco, Luisa Ocampo.
4	Mascarilla respirador y Filtros	2 pares	20 Sep 2024	Luisa Ocampo, July Ramirez
5	Overol Industrial	Unid	20 Sep 2024	Julian Muñeton, Julieth Oertiz, July Ramirez, Tulio Bernal, Karen Bernal, Orlando García, Lucia Bernal, Jemmy Franco, Luisa Ocampo.
6	Gafas de protección	2 pares	20 Sep 2024	Julian Muñeton, Julieth Oertiz, July Ramirez, Tulio Bernal, Karen Bernal, Orlando García, Lucia Bernal, Jemmy Franco, Luisa Ocampo.
7	Tapa oidos	5 Und	20 Sep 2024	Julian Muñeton, Julieth Oertiz, July Ramirez, Tulio Bernal, Karen Bernal, Orlando García, Lucia Bernal, Jemmy Franco, Luisa Ocampo.
8	Cofias	Caja	20 Sep 2024	Julian Muñeton, Julieth Oertiz, July Ramirez, Tulio Bernal, Karen Bernal, Orlando García, Lucia Bernal, Jemmy Franco, Luisa Ocampo.

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CAMPO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	ENTREGA OPERARIO
1	Chalecos	1 Und	2 Oct 2024	Alexander Sanchez
2	Gafas de protección	4 Pares	2 Oct 2024	Alexander Sanchez
3	Guantes de Nitrilo	4 Pares	2 Oct 2024	Alexander Sanchez
4	Escaleras	3 Und	2 Oct 2024	Alexander Sanchez

LUIS MIGUEL BENAVIDES
Dpto Administrativo

57+1 240 21 41 - 649 15 91 comercial@geocat.com.co gerencia@geocat.com.co WWW.GEOCAT.COM.CO Calle 77 No. 63 -22 Bogotá, Colombia

Obligación 6:

No se presentó ningún requerimiento de placas Viales o domiciliare defectuosa. Si hubiera lugar a ellos se fabricaría sin consto adicional como garantía.

Obligación 7.

Visita de pre - reconocimiento:

Para la asignación de placas a instalar se realizan recorridos a lo largo y ancho de cada uno de los sectores a intervenir con planos físicos (papel) dónde se registran las placas instaladas y las posibles a instalar, diferenciadas por color, azul para las existentes y rojo para las posibles de instalar, para la asignación se tienen en cuenta aspectos como: sentido vial, visibilidad, altura de los predios, conveniencia o no de la

placa, puntos que dificultan la visibilidad, objetos que ocupan el espacio donde se debe instalar la placa (generalmente avisos), una vez terminado el recorrido se procede a entregar el material para su numeración y generación de listados para fabricación.

Al momento de realizar las actividades de pre -reconocimiento se debe tener en cuenta los "empalmes" entre barrios o sectores a fin de evitar duplicidad en la información, en algunos casos en las observaciones se deja constancia de lugares de mayor altura, de condiciones de seguridad y demás aspectos que puedan ser relevantes a la hora de realizar la instalación

Obligación 8 y 9.

Se tomo el estudio realizado en el 2020, tomando los planos que se usaron en los recorridos de todo el casco urbano de Soacha, para procesarlos y georreferenciarlos, una vez georreferenciado y digitalizado se procede a usar la base de datos para encontrar los ejes viales, y empezar a desarrollar el listado punto a punto, arrojando el número de placa y su ubicación. Con esto se procede a fabricar, y la confirmación final se hace en campo llegando al lugar físico marcado, para proceder a instalar o realizar alguna observación.

Obligación 10.

Las placas Viales y Domiciliarias fueron fabricadas siguiendo las especificaciones técnicas estipuladas en el pliego de condiciones. Se anexa como se dijo anteriormente certificación de calidad como fabricantes.

El proceso de fabricación para las placas Viales y Domiciliarias que se realizo fue el siguiente:

57+1 240 21 41
geocatltda@hotmail.com
WWW.GEOCAT.COM.CO
Calle 77 No. 63 -22
Bogotá, Colombia

1.. Acopio de Material en Bodega (Aluminio, Cinta efectiva y Pintura Electrostática, Vino Tinto)

2. Alistamiento y calibración de Maquina estampadora, Troque de Corte maquina Cola minadora, Bandejas de Troqueles, pastillas, dados y formatos.
3. Limpieza y Alistamiento de Cabina de Pintura.
4. Culminación Aluminio con cinta reflectiva
5. Limpieza de Blanco ya cola minado
6. Corte de lámina a medida de placa vial y medida de placa domiciliaria
7. Entrega de Listados para estampar en fabrica
8. Estampado y troquelado de nomenclatura en alto relieve de placas viales y domiciliarias

9. Limpieza de residuos en lamina ya estampada con su nomenclatura correspondiente
10. Numeración de barrio, manzana y sector
11. Alistamiento para subir a cabina de pintura
12. Recubrimiento y pintura electrostática en Cabina
13. Descubrimiento de Letras y números de Nomenclatura
14. Curado y brillo en Horno digital
15. Limpieza y Maquillaje
16. Control de Calidad
17. Empaque
18. Manzaneo y Organización por barrio y sector
19. Transporte a Almacén General

Obligación 11.

Informe sobre proceso de instalación y metodología, para desarrollar el proceso de instalación, una vez se han entregado las placas al almacén, para su revisión física y

57+1 240 21 41 geocatltda@hotmail.com WWW.GEOCAT.COM.CO Calle 77 No. 63 -22 Bogotá, Colombia

comprobación inicial de texto, se recogen y se llevan al lugar destinado para su almacenamiento provisional, se procede a la organización y priorización de sectores por cercanía, cantidades y facilidades de desplazamiento, otro factor a tener en cuenta ya es el clima ya que en las zonas altas en clima días de lluvia se dificulta un poco más la instalación, una vez definidas las zonas a trabajar se procede al alistamiento de material de instalación, puntilla, perno de fijación, silicona, spray para anulación, amarres plásticos y demás elementos propios de la actividad, cómo herramientas.

Una vez definida la ruta del día se procede al desplazamiento a la zona, iniciando por el punto más distante y procurando hacer un recorrido que permita obtener la mayor cobertura de terreno con la menor cantidad de desplazamiento, al llegar al primer punto de instalación se procede a golpear en la vivienda donde se debe realizar la instalación y se informa a la persona que atiende que se va a proceder a realizar la instalación de las placas viales faltantes del proceso inicial y para dar cumplimiento a lo estipulado en el acuerdo para la implementación de la nomenclatura en el municipio de Soacha, se realiza la instalación según el tipo de fachada del predio, se toma la fotografía de constancia de instalación, de la cual se lleva un registro en la planilla destinada para tal fin y se procede con el siguiente punto de instalación dónde se sigue el mismo proceso

Al momento de realizar la instalación de las placas se deben tener en cuenta aspectos cómo, estabilidad de los muros, en algunos casos, especialmente en las urbanizaciones los pegues de los bloques o ladrillos son muy escasos de cemento lo cual no permite una correcta fijación de la placa al muro para lo cual se debe complementar la instalación con puntilla de acero y silicona para asegurar su estabilidad ya que por asentamiento de los terrenos en oportunidades las placas se sueltan y se caen, son algunos de los casos en los que cuando se hace la actividad de reconocimiento las placas no se encuentran en la fachada, pero al momento de ir

57+1 240 21 41
geocatltda@hotmail.com
WWW.GEOCAT.COM.CO
Calle 77 No. 63 -22
Bogotá, Colombia

a hacer la instalación las personas las tienen al interior de las viviendas y pasa tanto con placas viales como placas domiciliarias, también aplica en los casos en los que han realizado remodelaciones a las fachadas, pañetes, ampliaciones, pintura, enchapes, las placas son retiradas y en pocas oportunidades las vuelven a colocar.

Otro aspecto que se debe tener era en cuenta al momento de llegar a un sector es la seguridad que en algunos casos se debe pedir el acompañamiento de la policía, no para el total del día, pero si para los lugares considerados como críticos.

Obligación 12.

No aplica, no se hicieron anulación de placas.

Obligación 13.

No hubo reporte de daños causas a fachadas durante la ejecución del contrato. Se usaron los materiales adecuados para dichas instalaciones para velar por el cuidado de los muros y la fachada.

Obligación 14.

Se suministro en los informes los sectores detallados, en los listados de fabricación e instalación.

Obligación 15.

Se anexa a este informe la radicación de las 8 entregas realizadas al almacén general, con su radicación de entrada, previa revisión y conteo de las mismas.

57+1 240 21 41 geocatltda@hotmail.com WWW.GEOCAT.COM.CO Calle 77 No. 63 -22 Bogotá, Colombia

Obligación 16 y 17.

Se entrega por medio magnético los registros fotográficos finales por sector son sus planillas en Excel.

Adjunto a este informe y por medio magnético, se hace entrega de las fotografías de las Viales y Domiciliarias instaladas, mencionadas en el cuadro de instalación, las tomas fotográficas se organizan por; barrios, fecha y se especifica el numero en cada registro de carpeta de campo para llevar una relación de la placa exacta.

Obligación 18.

Se hace entrega del informe final en formato PDF, con el resumen de la ejecución del contrato, en formato magnético y la GDB.

Obligación 19.

Se copero a la supervisión en todos los aspectos que requirieron de acuerdo con el objeto del contrato.

Obligación 20.

No hubo actos ni omisiones que hayan causado perjuicios a la administración o a terceros.

Obligación:21

Se dio cumplimiento.

Obligación:22

Como se dio cumplimiento, se guardó absoluta reserva de la información que en razón del servicio prestado se suministró.

57+1 240 21 41 geocatltda@hotmail.com WWW.GEOCAT.COM.CO Calle 77 No. 63 -22 Bogotá, Colombia

Obligación 23.

Como se dio cumplimiento, se garantizó las condiciones operativas (personal, herramienta, transporte, elementos de protección del personal) necesarias para el adecuado cumplimiento del contrato en los términos pactados.

Obligación 24.

Como se dio cumplimiento, sé pago de forma oportuna los salarios y todas las prestaciones sociales de ley de nuestro personal a cargo vinculado a la ejecución del contrato; así como se atendió cumplidamente el pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

57+1 240 21 41
geocatltda@hotmail.com
WWW.GEOCAT.COM.CO
Calle 77 No. 63 -22
Bogotá, Colombia

9.1 REPORTE RESUMEN DE PAGO

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	GEOCAT INGENIERIA SAS	**NIT:**	860524046
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2023
Número de Radicación:	72465608	**Total a pagar:**	$1.497.000
Fecha de vencimiento:	11/10/2023	**Total de empleados:**	7
Fecha de Pago:	20/11/2023	**Número de Administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	288494822
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	7		$0	$56,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$32,300
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$148,200
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$389,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$389,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	7		$0	$240,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$29,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$104,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0	$57,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$49,200
						$1.497.000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 72465608, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	GEOCAT INGENIERIA SAS	**NIT:**	860524046
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	nov-23
Número de Radicación:	73264974	**Total a pagar:**	$2.396.900
Fecha de vencimiento:	14/11/2023	**Total de empleados:**	8
Fecha de Pago:	18/12/2023	**Número de Administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	NEQUI	**Número Autorización:**	346387730
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	8		$0	$94,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$191,800
230301	800224808	Porvenir	3		$0	$569,100
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$386,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$386,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	8		$0	$383,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$48,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$143,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		$0	$143,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$48,800
						$2.396.900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 73264974, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	GEOCAT INGENIERIA SAS	**NIT:**	860524046
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2023
Número de Radicación:	73391808	**Total a pagar:**	$2.050.400
Fecha de vencimiento:	13/12/2023	**Total de empleados:**	7
Fecha de Pago:	19/12/2023	**Número de Administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	348449226
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	7		$0	$80,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$186,700
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$373,400
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$376,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$376,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	7		$0	$328,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$46,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$140,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0	$94,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$47,500
						$2.050.400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 73391808, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya

57+1 240 21 41
geocatltda@hotmail.com
WWW.GEOCAT.COM.CO
Calle 77 No. 63 -22
Bogotá, Colombia

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	GEOCAT INGENIERIA SAS	**NIT:**	860524046
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	diciembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	enero 2024
Número de Radicación:	74279453	**Total a pagar:**	$1.843.300
Fecha de vencimiento:	12/01/2024	**Total de empleados:**	7
Fecha de Pago:	16/02/2024	**Número de Administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	NEQUI	**Número Autorización:**	459541594
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	7		$0	$71,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$25,600
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$383,000
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$386,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	2		$0	$386,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	7		$0	$295,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$47,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$102,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0	$96,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$48,700
						$1.843.300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 74279453, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	GEOCAT INGENIERIA SAS	**NIT:**	860524046
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	enero 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	febrero 2024
Número de Radicación:	74919615	**Total a pagar:**	$1.043.200
Fecha de vencimiento:	12/02/2024	**Total de empleados:**	4
Fecha de Pago:	25/04/2024	**Número de Administradoras:**	7

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	596818038
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	4		$0	$36,700
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$442,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$228,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	4		$0	$167,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		$0	$57,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$55,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$55,300
						$1.043.200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 74919615, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya

~~JONATHAN DAVID BENAVIDES MUNERA~~.

C.C 1.026.552.436

REPRESENTANTE LEGAL

GEOCAT INGENIERIA S.A.S.

NIT: 860.524.046-8

comercial@geocat.com.co


ANEXOS

No	ANEXO
Anexo No. 1	Oficio radicación Placa Muestra
Anexo No. 2	Certificaciones de Materiales
Anexo No. 3	Cronograma de Trabajo 1
Anexo No. 4	Cronograma de Trabajo 2
Anexo No. 5	Remisiones de Entrega almacén (Remisión 1 a 8)
Anexo No. 6	Anexo Reporte Placas Fabricadas e Instaladas Unificado
Anexo No. 7	Registro Fotográfico fabricación
Anexo No. 8	Registro fotográfico instalación
Anexo No. 9	Oficio radicación Informe final USB (Archivos, planillas y registros fotográfico)

57+1 240 21 41
geocatltda@hotmail.com
WWW.GEOCAT.COM.CO
Calle 77 No. 63 -22
Bogotá, Colombia

ANEXOS

Anexo No. 1	Oficio radicación Placa Muestra

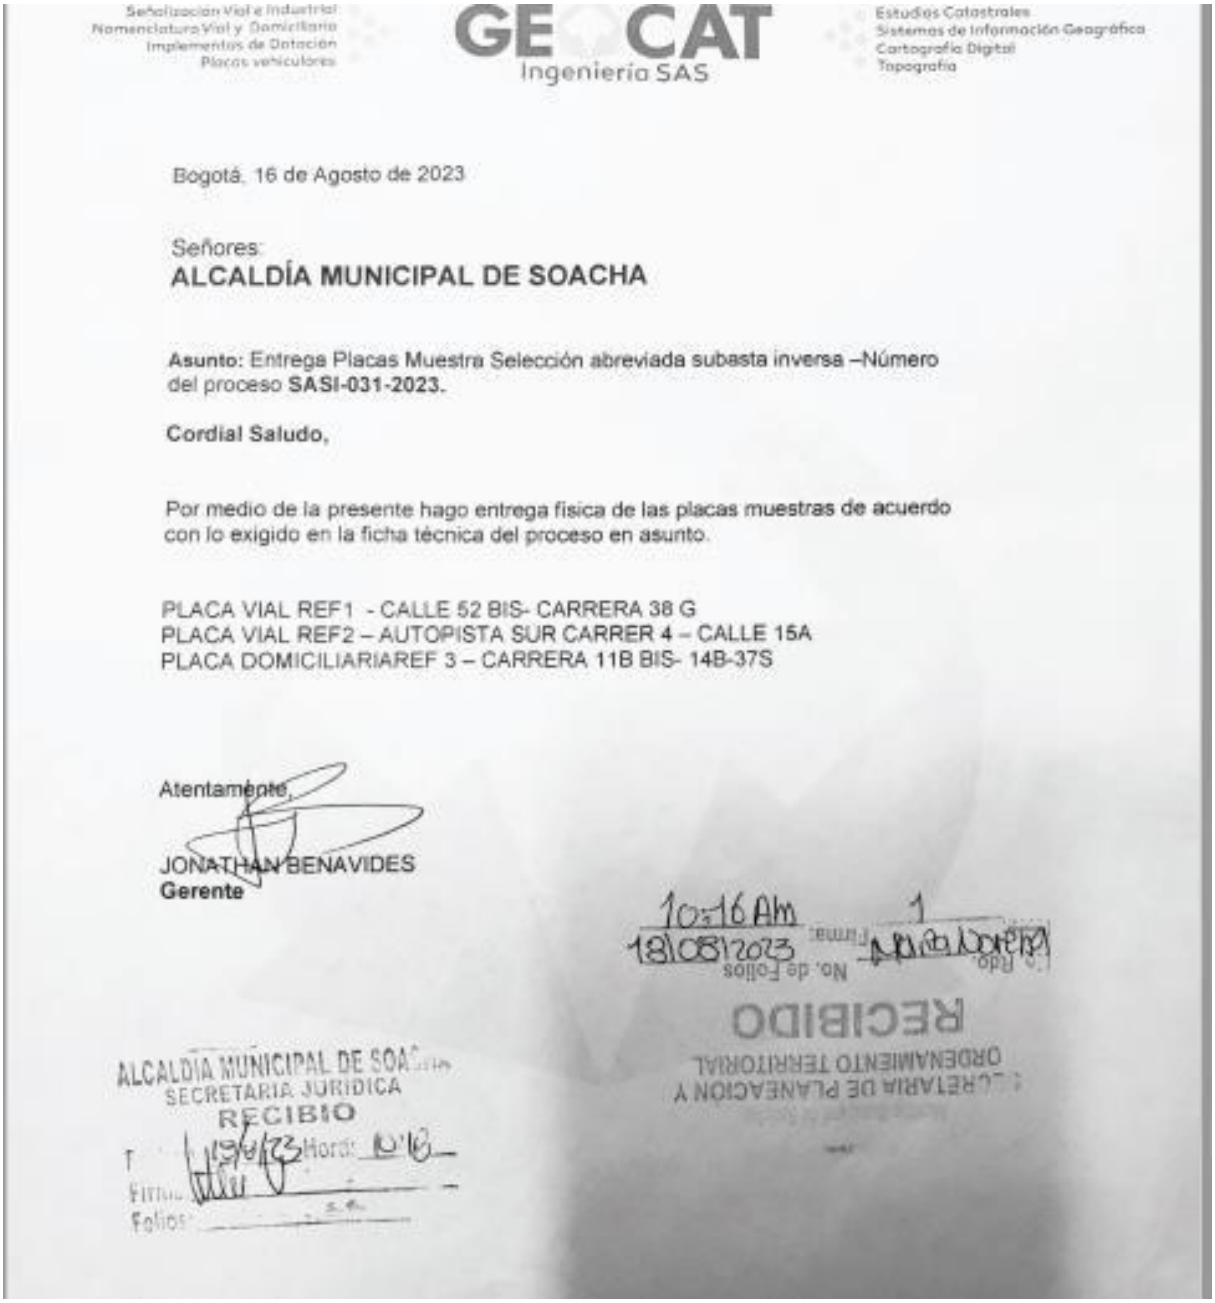

Señalización Vial e Industrial
Nomenclatura Vial y Domiciliaria
Implementos de Dotación
Placas vehiculares

GEOCAT Ingeniería SAS

Estudios Catastrales
Sistemas de Información Geográfica
Cartografía Digital
Topografía

Bogotá, 16 de Agosto de 2023

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

Asunto: Entrega Placas Muestra Selección abreviada subasta inversa –Número del proceso **SASI-031-2023.**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente hago entrega física de las placas muestras de acuerdo con lo exigido en la ficha técnica del proceso en asunto.

PLACA VIAL REF1 - CALLE 52 BIS- CARRERA 38 G
PLACA VIAL REF2 – AUTOPISTA SUR CARRER 4 – CALLE 15A
PLACA DOMICILIARIAREF 3 – CARRERA 11B BIS- 14B-37S

Atentamente,

JONATHAN BENAVIDES
Gerente

10:16 AM
18/08/2023

RECIBIDO
SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA JURIDICA
RECIBIO
Hora:

Anexo No. 2	Certificaciones de Materiales

Bogotá, 10 Octubre 2023

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA – CUNDINAMARCA.

Referencia: CERTIFACION MATERIALEES COMO FABRICANTES
CONTRATO N° 4034 DE 2023. "*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURAL Y DOMICILIARIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA – FASE IV".*

Respetados señores:

Por medio del presente GEOCAT INGENIERIA SAS con Nit. 860.524.046-8 se permite certificar que las placas Domiciliarias estarán elaboradas en **ALUMINIO CON ESPESOR DE 0.9 MM,** con una aleación y temple "liso 3003 –H-14 "el cual es lo suficientemente flexible de tal forma que permite el procesamiento en alto relieve sin que este se rompa, con garantía y durabilidad mayor a (50) años, con resistencia a los efectos climáticos.

Atentamente,

JONATHAN DAVID BENAVIDES MUNERA
Gerente
GEOCAT INGENIERIA S.A.S
NIT 860524046-8

Bogotá, 10 Octubre 2023

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA – CUNDINAMARCA.

Referencia: CERTIFACION MATERIALEES COMO FABRICANTES
CONTRATO N° 4034 DE 2023. "*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURAL Y DOMICILIARIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA – FASE IV".*

Respetados señores:

Por medio del presente GEOCAT INGENIERIA SAS con Nit. 860.524.046-8 se permite certificar que el material de fondo será **PINTURA ELECTROSTÁTICA DE COLOR VINO TINTO** con resistencia a la intemperie, compatible con la película reflectiva, garantizando una durabilidad de (5) años sobre el material reflectivo, con permanencia del color y solidez a la luz ultravioleta.

Atentamente,

JONATHAN DAVID BENAVIDES MUNERA
Gerente
GEOCAT INGENIERIA S.A.S
NIT 860524046-8

Bogotá, 10 Octubre 2023

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA – CUNDINAMARCA.

Referencia: CERTIFACION MATERIALEES COMO FABRICANTES
CONTRATO N° 4034 DE 2023. "*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURAL Y DOMICILIARIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA – FASE IV".*

Respetados señores:

Por medio del presente GEOCAT INGENIERIA SAS con Nit. 860.524.046-8 se permite certificar que el material **CINTA REFLECTIVA** será de color blanco cumpliendo con los indicadores mínimos de desempeño fotométrico:

70 Candelas/Lux/Metro Cuadrado con un ángulo de observación de 0,2° e entre. -4°.
Garantía de (5) años.

Atentamente,

JONATHAN DAVID BENAVIDES MUNERA
Gerente
GEOCAT INGENIERIA S.A.S
NIT 860524046-8

Anexo No. 3	Cronograma de Trabajo 1
Anexo No. 4	Cronograma de Trabajo 2

Contrato No .SASI 031-2023

Objeto: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA - FASE IV

Actividades	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18
	SEPTIEMBRE 04 al 09	SEPTIEMBRE 11 al 16	SEPTIEMBRE 18 al 22	SEPTIEMBRE 18 al 23	SEPTIEMBRE 25 a 30	OCTUBRE 2 al 7	OCTUBRE 9 al 14	OCTUBRE 16 al 21	OCTUBRE 23 al 28	OCTUBRE 30 a 4 de NOVIEMBRE	NOVIEMBRE 6 al 11	NOVIEMBRE 13 al 18	NOVIEMBRE 20 al 25	NOVIEMBRE 27 al 02 DICIEMBRE	DICIEMBRE 04 al 09	DICIEMBRE 11 al 16	DICIEMBRE 18 al 23	DICIEMBRE 25 al 29
ACTUALIZACION CASCO RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE SOACHA																		
Recorrido de campo por respectivas comisiones																		
identificacion de nomenclatura faltante y realizacion de listados																		
FABRICACIÓN DE PLACAS VIALES Y DOMICILIARIAS																		
Acopio material para fabricacion																		
fabciracion placas Viales y domiciliarias																		
ENTRGA EN ALMACEN																		
Primera y segunda entrega almacen Viales							25%											
Tercera entrega										35%								
Cuarta entrega													70%					
Quinta entrega															85%			
Sexta entrega																100%		
INSTALACION PLACAS Y TOMA DE FOTOGRAFIAS																		
Instalación Placas Viales y toma de fotografia																		
informes parciales y entrega de fotos																		
INFORME FINAL	25%																	

ELABORÓ: ING. JONATHAN DAVID BENAVIDES MUNERA
GEOCAT INGENIERA S.A.S - REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA:**_____

VERSION: 1.0 **FECHA: 16 / OCTUBRE / 2023**

Contrato No .SASI 031-2023
Objeto: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA - FASE IV

Actividades	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7
	2 DE ENERO AL 6	8 DE ENERO AL 12	15 DE ENERO AL 20	22 DE ENERO AL 27	29 DE ENERO A 3 DE FEBRERO	5 DE FEBRERO AL 13	14 DE FEBRERO
FABRICACIÓN DE PLACAS VIALES Y DOMICILIARIAS							
fabciracion placas Viales faltantes							
ENTRGA EN ALMACEN							
SEPTIMA ENTREGA A ALMACEN							
ULTIMA ENTREGA A ALAMACEN				ULTIMA ENTREGA			
INSTALACION PLACAS Y TOMA DE FOTOGRAFIAS							
Instalación Placas Viales y Domiciliarias toma de fotografia						100%	
informes parciales y entrega de fotos							
INFORME FINAL Y ENTREGA DE FOTOS							

ELABORÓ: ING. JONATHAN DAVID BENAVIDES MUNERA
GEOCAT INGENIERA S.A.S - REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA:** _____

VERSION: 2.0 **FECHA: 19 / ENERO / 2024**

Anexo No. 5	Remisiones de Entrega almacén (Remisión 1 a 8)

REMISION 01

Bogotá D.C
13 de octubre de 2023

Atención:
Ingeniera; Jheraldyn Trujillo
Ref.: **ENTREGA PLACAS DE NOMENCLATURA VIAL CONTRATO No.**

Cordial saludo,
Por medio de la presente me permito hacer **entrega de (596) unidades de Placas de Nomenclatura (Viales)** del contrato No. 4034-2023 que tiene por objeto "*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA - FASE IV.*"

BARRIO	CANTIDAD
LA PRADERA II	20
RINCON DEL LAGO	38
ESCONDITE DE JOSE	12
LA PRADERA I	10
VILLA ESPERANZA	31
PASEO REAL	58
CIEN FAMILIAS	9
CIUDAD LATINA II	18
LAS MARGARITAS	28
VILLA SOFIA	21
VILLA SOFIA II	123
VILLA JULIANA	44
LA FLORIDA I	40
CIUDAD LATINA III	37
VILLA ITALIA	107
TOTAL	**596**

RECIBIDO ANGEL ROJAS

REMISION 02

Bogotá D.C
19 de octubre de 2023

Atención:
Ingeniera; Jheraldyn Trujillo
Ref.: **ENTREGA PLACAS DE NOMENCLATURA VIAL CONTRATO No. 4034-2023**

Cordial saludo,
Por medio de la presente me permito hacer **entrega de (561) unidades de Placas de Nomenclatura (Viales)** del contrato No. 4034-2023 que tiene por objeto "*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA - FASE IV.*"

BARRIO	CANTIDAD
ABC SANTA ANA	31
CIUDADELA SUCRE SECTOR 3	87
BUENOS AIRES	33
CIUDAD DE QUITO	30
EL DIVINO NIÑO	38
EL DIVINO NIÑO PARTE ALTA	15
LA UNION	8
SAN BERNARDINO	17
VILLA NUEVA ALTA	36

EL SALITRE	19
LA FONTANA	13
SAN ATONIO II	19
SAN RAFAEL	109
LOS PINOS	53
LA CRISTALINA	27
SAN MARTIN	26
TOTAL	**561**

Relación precio:

VALOR UNIDAD PLACA VIAL SIN IVA	$ 72.600
SUB TOTAL SIN IVA	$ 40.726.800
IVA 19%	$ 7.738.092
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	$ 48.467.064

JONATHAN DAVID BENAVIDES MUNERA.
C.C 1.026.552.436
REPRESENTANTE LEGAL
GEOCAT INGENIERIA S.A.S.
NIT: 860.524.046-8
comercial@geocat.com.co

RECIBIDO
OCTUBRE 19-2023
ANGEL ROJAS

REMISION 03

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
Almacén General
RECIBIDO
Hora
Firma
07 NOV 2023

Bogotá D.C
7 de noviembre de 2023

Atención:
Ingeniera; Jheraldyn Trujillo

Ref.: **ENTREGA PLACAS DE NOMENCLATURA VIAL CONTRATO No.4034-2023**

Cordial saludo,
Por medio de la presente me permito hacer **entrega de (516) unidades de Placas de Nomenclatura (Viales)** del contrato No. 4034-2023 que tiene por objeto "*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA - FASE IV.*"

BARRIO	CANTIDAD
BELLA VISTA	137
QUINTAS DE LA LAGUNA	13
VILLA SANTA ISABEL	33
ARIZONA	16
DANUBIO III	17
EL TABACAL	9
LA LAGUNA	10
SANTA ANA	38
SANTA ANA CENTRAL	12
TIERRA BLANCA	23

VALLES DE SANTA ANA	14
LOS OLIVOS I	111
LOS OLIVOS II	83
TOTAL	**561**

Relación precio:

JONATHAN DAVID BENAVIDES MUNERA.
C.C 1.026.552.436
REPRESENTANTE LEGAL
GEOCAT INGENIERIA S.A.S.
NIT: 860.524.046-8
comercial@geocat.com.co

REMISION 04

Bogotá D.C

16 de noviembre de 2023

Atención:

Ingeniera; Jheraldyn Trujillo

Ref.: **ENTREGA PLACAS DE NOMENCLATURA VIAL CONTRATO No.4034-2023**

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer **entrega de (450) unidades de Placas de Nomenclatura (Viales)** del contrato No. 4034-2023 que tiene por objeto "*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA - FASE IV.*"

BARRIO	CANTIDAD
MIRADOR DE CORINTO	16
LOS OLIVOS IV	59
LOS OLIVARES	56
LOS OLIVOS III	75
SANTA HELENA NORTE	32
LA MAGDALENA	26
QUINTAS DE SANTA ANA I	24
AUTOPISTA SUR	70
LA FRAGUA	11

LA UNION	5
LA MARIA	42
LLANO GRANDE	20
VILLA JULIA	13
TOTAL	**450**

JONATHAN DAVID BENAVIDES MUNERA.
C.C 1.026.552.436
REPRESENTANTE LEGAL
GEOCAT INGENIERIA S.A.S.
NIT: 860.524.046-8
comercial@geocat.com.co

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
Almacén General
RECIBIDO
16-NOV-23
Hora
Firma
SE RECIBEN 450 UND

REMISION 05

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
Almacen General
RECIBIDO
Hora
Firma
06 DIC 2023

Bogotá D.C
7 de diciembre de 2023

Atención:
Ingeniera; Jheraldyn Trujillo
Ref.: **ENTREGA PLACAS DE NOMENCLATURA VIAL CONTRATO No.4034-2023**

Cordial saludo,
Por medio de la presente me permito hacer **entrega de (646) unidades de Placas de Nomenclatura (Viales)** del contrato No. 4034-2023 que tiene por objeto "*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA - FASE IV.*"

BARRIO	CANTIDAD
EL TUSO – LA ESMERALDA	19
LAS VILLAS	28
SAN JUAN	6
SAN HUMBERTO	14
EL LIBERTADOR	30
CHICO SUR	27
JULIO RINCON I	35
QUINTAS DE LA LAGUNA II	23
JUAN PABLO II TERCER SECTOR	15
LA ISLA	19
BOCHICA	26

EL DANUBIO	32
LA FLORIDA II	10
EL ZAPATO	12
COHABITAR	2
VILLAS DE SANTA ROSA	12
EL OASIS	60
EL PARAISO DE CORINTIO	1
SAN MATEO PRIMER SECTOR	14
ARBOLEDA DE SANTA ANA	2
LA AMISTAD , TOSCANA	7
VILLA SANDRA	39
ALTOS DEL PINO	29
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B	38
EL ROSAL	9
EL BOSQUE DE CAGUA CHIQUITA	16
LOS CRISTALES	10
LOS ROBLES	36
IGUAZU	3
CAMILO TORRES II	26

UBATE	30
LA CAÑADA	6
LINCON	10
TOTAL	**646**

JONATHAN DAVID BENAVIDES MUNERA.
C.C 1.026.552.436
REPRESENTANTE LEGAL
GEOCAT INGENIERIA S.A.S.
NIT: 860.524.046-8
comercial@geocat.com.co

REMISION 06

Bogotá D.C

16 de diciembre de 2023

Atención:

Ingeniera; Jheraldyn Trujillo

Ref.: **ENTREGA PLACAS DE NOMENCLATURA VIAL CONTRATO No.4034-2023**

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer **entrega de (806) unidades de Placas de Nomenclatura (Viales)** del contrato No. 4034-2023 que tiene por objeto "*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA - FASE IV.*"

BARRIO	CANTIDAD
El PARAISO	44
LAS VEGAS SECTOR SAN MATEO	45
SAN ANTONIO	43
SANTA ROSA	7
SAN CARLOS	1
EL PORVENIR	2
DUCALES II	27
LOS DUCALES I	16
LLANOS DE SOACHA	35
HOGAR DEL SOOL	79
CIUDAD LATINA I	6
TORRES DEL CAMINO, 1,3,4	6

SANTA HELENA	2
JULIO RINCON II	21
TERRANOVA	10
SAN LUIS	19
CARLOS PIZARRO	6
MINUTO DE DIOS	10
LAS FERIAS	1
CAGUA	20
VILLA CLARA	9
QUINTAS DEL PORTAL	2
ZAPAN 4	2
ZAPAN 2	1
LLANOS DE SOACHA DOMICILIARIAS	392
TOTAL	**806**

JONATHAN DAVID BENAVIDES MUNERA.
C.C 1.026.552.436
REPRESENTANTE LEGAL
GEOCAT INGENIERIA S.A.S.
NIT: 860.524.046-8

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
Almacén General
RECIBIDO
Hora
Firma
2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
Almacen General
RECIBIDO
Hora
Firma
12 ENE 2024

REMISION 07

Bogotá D.C

11 de enero de 2024

Atención:

Ingeniera; Jheraldyn Trujillo

Ref.: **ENTREGA PLACAS DE NOMENCLATURA VIAL CONTRATO No.4034-2023**

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer **entrega de 604 unidades de Placas de Nomenclatura (Viales) y 311 Placas domiciliarias** del contrato No. 4034-2023 que tiene por objeto "*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA - FASE IV.*"

VIALES	
BARRIO	**CANTIDAD**
12 de marzo	36
JUAN PABLO II SEGUNDA ETAPA	24
EL SOL	31
ANDALUCIA	18
JUAN PABLO II CUARTA ETAPA	23
EL PRADO DE LAS VEGAS	18
EL PROGRESO	15
EL DORADO	35
LA ESPERANZA	10
LAS VEGAS SECTOR SAN MATEO	2
SAN NICOLAS	11
EL RINCON DE SANTAFE	12

PABLO VI	54
SAN CARLOS	14
SAN ANDRES	2
LAGOS DE MALIBU	12
COMPARTIR	209
JUAN PABLO I	72
EUGENIO DIAZ CASTRO	6
TOTA	604
DOMICILIARIAS	
RINCON DE SANTAFE DOMICILIARIAS	290
DERECHOS DE PETICIONN DOMICILIARIAS	21
TOTAL	311

JONATHAN DAVID BENAVIDES MUNERA.
C.C 1.026.552.436
REPRESENTANTE LEGAL
GEOCAT INGENIERIA S.A.S.
NIT: 860.524.046-8

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
Almacén General
RECIBIDO
Hora
02 FEB 2024
Firma

REMISION 08

Bogotá D.C
02 de febrero de 2024
Atención:
Ingeniera; Jheraldyn Trujillo
Ref.: **ENTREGA PLACAS DE NOMENCLATURA VIAL CONTRATO No.4034-2023**

Cordial saludo,
Por medio de la presente me permito hacer **entrega de 285 unidades de Placas de Nomenclatura (Viales)** del contrato No. 4034-2023 que tiene por objeto *"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA - FASE IV."*

VIALES	
BARRIO CON NOMBRE COMUN	**CANTIDAD**
AUTOPISTA SUR	41
EL DANUBIO	1
LO DUCALES II	8
LA LAGUNA	1
NEMESIS	7
VILLA CAROLA	9
VILLA ROSITA	13
GRATAMIRA	3
EUGENIO DIAZ CASTRO	1
LA AMISTAD	1
LA FRAGUA	4

LINCOLN	3
QUINTAS DE SABTA ANA ETAPA 1B	7
VILLAS DE SANTA ROSA	1
VILLA JULIA	1
LOS OCALES	53
LA FONTANA	2
LA UNION	3
CIUDAD DE QUITO	1
CAMILO TORRES I	5
TIERRA BLACA	6
EL NOGAL	18
LEON XIII SECTOR III	14
LEON XII SECTOR II	11
LEON XIII SECTOR I	21
CIUDAD VERDE	37
SAN LUIS	3
CAMILO TORRES II	8
EL DORADO	1
SAN BERNARDINO	1

TOTAL	285

JONATHAN DAVID BENAVIDES MUNERA.
C.C 1.026.552.436
REPRESENTANTE LEGAL
GEOCAT INGENIERIA S.A.S.
NIT: 860.524.046-8

Anexo No. 6	Anexo Reporte Placas Fabricadas e Instaladas Unificado

REPORTE UNIFICADO MATERIALIZACION NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA - 2023 - 2024 SOACHA - CUNDINAMARCA					
No.	**BARRIO**	**TOTAL PLACAS SECTOR**	**INSTALADAS**	**NO INSTALADAS**	**TOTAL**
1	CIUDAD DE QUITO	**30**	30	0	30
2	CIUDAD LATINA II	**18**	18	0	18
3	CIUDAD LATINA III	**37**	37	0	37
4	VILLA ESPERANZA	**31**	31	0	31
5	VILLA SOFIA	**21**	19	2	21
6	ABC SANTA ANA	**31**	30	1	31
7	VILLA ITALIA	**107**	107	0	107
8	PASEO REAL	**58**	58	0	58
9	EL ESCONDITE DE JOSE	**12**	12	0	12
10	LA FONTANA I	**13**	13	0	13
11	SAN ANTONIO II	**19**	19	0	19
12	VILLA SOFIA I	**123**	121	2	123
13	CIEN FAMILIAS	**9**	9	0	9
14	EL SALITRE	**19**	19	0	19
15	LA FLORIDA 1	**40**	40	0	40
16	LA PRADERA 1	**10**	10	0	10
17	LA PRADERA 2	**20**	19	1	20
18	VILLA JULIANA	**44**	44	0	44
19	EL DIVINO NIÑO	**38**	38	0	38
20	EL DIVINO NIÑO PARTE ALTA	**15**	15	0	15
21	LA CRISTALINA	**27**	27	0	27
22	SAN MARTIN	**26**	26	0	26
23	CIUDADELA SUCRE III	**87**	87	0	87
24	VILLANUEVA ALTA	**36**	36	0	36
25	BUENOS AIRES	**33**	24	9	33
26	LAS MARGARITAS	**28**	26	2	28
27	SAN BERNARDINO	**17**	17	0	17
28	SAN RAFAEL	**109**	109	0	109
29	LOS PINOS	**47**	46	1	47
30	RINCON DEL LAGO	**38**	37	1	38
31	LOS OLIVOS I	**111**	111	0	111
32	DANUBIO III	**17**	17	0	17
33	EL TABACAL	**9**	9	0	9
34	LOS OLIVOS II	**83**	83	0	83
35	TIERRA BLANCA	**23**	23	0	23
36	VILLA SANTA ISABEL	**33**	33	0	33

37	BELLAVISTA	**137**	137	0	137
38	QUINTAS DE LA LAGUNA	**13**	12	1	13
39	SANTA ANA CENTRAL	**12**	12	0	12
40	LA LAGUNA	**10**	10	0	10
41	VALLES DE SANTA ANA	**14**	14	0	14
42	SANTA ANA	**38**	38	0	38
43	ARIZONA	**16**	14	2	16
44	LOS OLIVOS III	**75**	75	0	75
45	LOS OLIVARES	**56**	55	1	56
46	LOS OLIVOS IV	**59**	59	0	59
47	LA MARIA	**42**	42	0	42
48	VILLA JULIA	**13**	13	0	13
49	LLANO GRANDE	**20**	20	0	20
50	LOS PINOS II	**6**	6	0	6
51	LA UNION	**13**	13	0	13
52	LA FRAGUA	**11**	8	3	11
53	SANTA HELENA NORTE	**32**	32	0	32
54	LA MAGDALENA	**26**	26	0	26
55	QUINTAS DE SANTA ANA	**24**	24	0	24
56	EL DANUBIO	**32**	28	4	32
57	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 4	**2**	2	0	2
58	QUINTAS DE LA LAGUNA II SECTOR	**23**	22	1	23
59	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1	**15**	15	0	15
60	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 3	**21**	21	0	21
61	VILLAS DE SANTA ROSA	**12**	12	0	12
62	CHICO SUR	**27**	25	2	27
63	COHABITAR	**2**	2	0	2
64	EL LIBERTADOR	**30**	27	3	30
65	EL ROSAL	**9**	9	0	9
66	EL ZAPATO	**12**	10	2	12
67	LA FLORIDA II	**10**	9	1	10
68	SAN HUMBERTO	**14**	14	0	14
69	UBATE	**30**	30	0	30
70	BOCHICA	**26**	19	7	26
71	CAMILO TORRES II	**26**	26	0	26
72	LA AMISTAD	**3**	3	0	3
73	LA CAÑADA	**6**	1	5	6
74	LA TOSCANA	**4**	4	0	4
75	LAS VILLAS	**28**	28	0	28
76	LINCOLN	**10**	10	0	10

77	SAN JUAN	**6**	6	0	6
78	TUSO LA ESMERALDA	**19**	17	2	19
79	BOSQUE DE CAGUA CHIQUITA	**16**	16	0	16
80	IGUAZU	**3**	3	0	3
81	JUAN PABLO II 3er.SECTOR.	**15**	15	0	15
82	JULIO RINCON I	**35**	32	3	35
83	LOS CRISTALES	**10**	9	1	10
84	SAN MATEO 1er. SECTOR.	**14**	14	0	14
85	LLANOS DE SOACHA	**35**	34	1	35
86	HOGAR DEL SOL	**79**	78	1	79
87	LAS VEGAS DE SAN MATEO	**43**	43	0	43
88	EL RINCON DE SANTA FE	**12**	12	0	12
89	JUAN PABLO I	**72**	72	0	72
90	PABLO VI	**54**	54	0	54
91	COMPARTIR	**209**	209	0	209
92	ARBOLEDA DE SANTA ANA	**2**	2	0	2
93	CIUDAD LATINA I	**6**	6	0	6
94	SAN NICOLAS	**11**	10	1	11
95	EL PRADO DE LAS VEGAS	**18**	18	0	18
96	JUAN PABLO II 2o. SECTOR	**24**	24	0	24
97	DOCE DE MARZO	**36**	35	1	36
98	JUAN PABLO II 4o. SECTOR	**23**	23	0	23
99	ANDALUCIA	**18**	17	1	18
100	EL SOL	**31**	31	0	31
101	EL DORADO	**35**	35	0	35
102	SAN ANTONIO	**43**	43	0	43
103	EL PORVENIR	**2**	2	0	2
104	SANTA ROSA	**7**	6	1	7
105	LAS VEGAS SECTOR SAN MATEO	**2**	2	0	2
106	CAGUA	**20**	18	2	20
107	URBANIZACION SAN CARLOS	**1**	1	0	1
108	EL PARAISO	**44**	43	1	44
109	SAN CARLOS	**14**	13	1	14
110	DUCALES II	**27**	27	0	27
111	DUCALES I	**16**	16	0	16
112	LAGOS DE MALIBU	**10**	10	0	10
113	QUINTAS DEL PORTAL	**2**	2	0	2
114	ZAPAN 4	**2**	2	0	2
115	ZAPAN 2	**1**	1	0	1
116	LAGOS DE MALIBU II	**2**	2	0	2

117	SAN ANDRES	**2**	2	0	2
118	EUGENIO DIAZ CASTRO	**6**	5	1	6
119	LAS VEGAS	**2**	2	0	2
120	VILLA CAROLA	**9**	8	1	9
121	TORRES DEL CAMINO	**6**	6	0	6
122	SANTA HELENA	**2**	2	0	2
123	LAS FERIAS	**1**	1	0	1
124	LA ISLA	**19**	19	0	19
125	EL OASIS	**60**	60	0	60
126	LOS ROBLES	**36**	36	0	36
127	EL PROGRESO	**15**	15	0	15
128	ALTOS DEL PINO	**29**	24	5	29
129	EL PARAISO DE CORINTO	**1**	1	0	1
130	MIRADOR DE CORINTO	**16**	16	0	16
131	VILLA SANDRA	**39**	38	1	39
132	TERRANOVA	**10**	10	0	10
133	JULIO RINCON II	**21**	21	0	21
134	CARLOS PIZARRO	**6**	6	0	6
135	MINUTO DE DIOS	**10**	10	0	10
136	LA ESPERANZA (COM 4.)	**10**	10	0	10
137	SAN LUIS	**19**	18	1	19
138	LEON XIII TERCER SECTOR	**11**	11	0	11
139	LEON XIII SEGUNDO SECTOR	**14**	14	0	14
140	LEON XIII PRIMER SECTOR	**21**	21	0	21
141	LOS OCALES	**53**	39	14	53
142	VILLA ROSITA	**13**	13	0	13
143	LA FONTANA NC	**2**	2	0	2
144	CIUDAD DE QUITO NC	**1**	1	0	1
145	TIERRA BLANCA NC	**6**	6	0	6
146	VILLA CLARA	**9**	9	0	9
147	DUCALES II NC	**8**	8	0	8
148	LA LAGUNA NC	**1**	1	0	1
149	NEMESIS	**7**	7	0	7
150	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B NC	**7**	7	0	7
151	SAN BERNARDINO NC	**1**	1	0	1
152	VILLA JULIA NC	**1**	1	0	1
153	EL DORADO NC	**1**	1	0	1
154	CAMILO TORRES II NC	**8**	8	0	8
155	EL NOGAL	**18**	18	0	18
156	LA AMISTAD NC	**1**	1	0	1

157	CAMILO TORRES 1	**5**	4	1	5
158	NC LINCOLN	**3**	3	0	3
159	NC SAN LUIS	**3**	1	2	3
160	NC LA UNION	**3**	3	0	3
161	NC EUGENIO DIAZ CASTRO	**1**	1	0	1
162	NC VILLAS DE SANTA ROSA	**1**	1	0	1
163	NC LA FRAGUA	**4**	4	0	4
164	AUTOPISTA SUR	**70**	50	20	70
165	HOGARES DE SOACHA	**42**	42	0	42
166	CIUDAD VERDE	**37**	36	1	37
167	EL DANUBIO NC	**1**	0	1	1
168	GRATAMIRA	**3**	2	1	3
	SUB - TOTAL	**4072**	**3956**	**116**	**4072**

No.	BARRIO	TOTAL PLACAS SECTOR	INSTALADAS	NO INSTALADAS	TOTAL
1	LLANOS DE SOACHA	**392**	384	8	392
2	RINCON DE SANTA FE	**290**	289	1	290
3	DERECHOS DE PETICION	**21**	21	0	21
	SUB - TOTAL	**703**	**694**	**9**	**703**

TOTAL PLACAS	**4775**	**4650**	**125**	**4775**

Coordinacion Campo:

EDGARD ALEXANDER SANCHEZ ARAQUE
C.C. 79 609 489 DE BOGOTA.
CEL. 301 2020623.

Bogotá, Febrero 15 2024

Anexo No. 7	Registro Fotográfico fabricación

Proceso de Fabricación:













Calle


Carre




Anexo No. 8	Registro fotográfico instalación

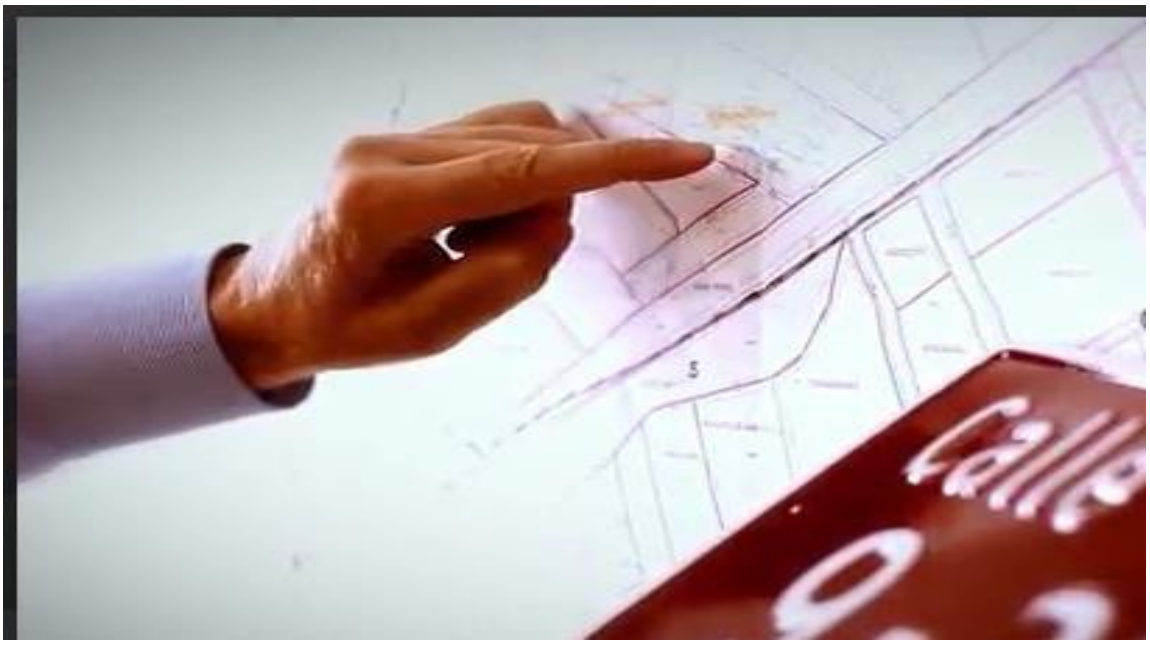



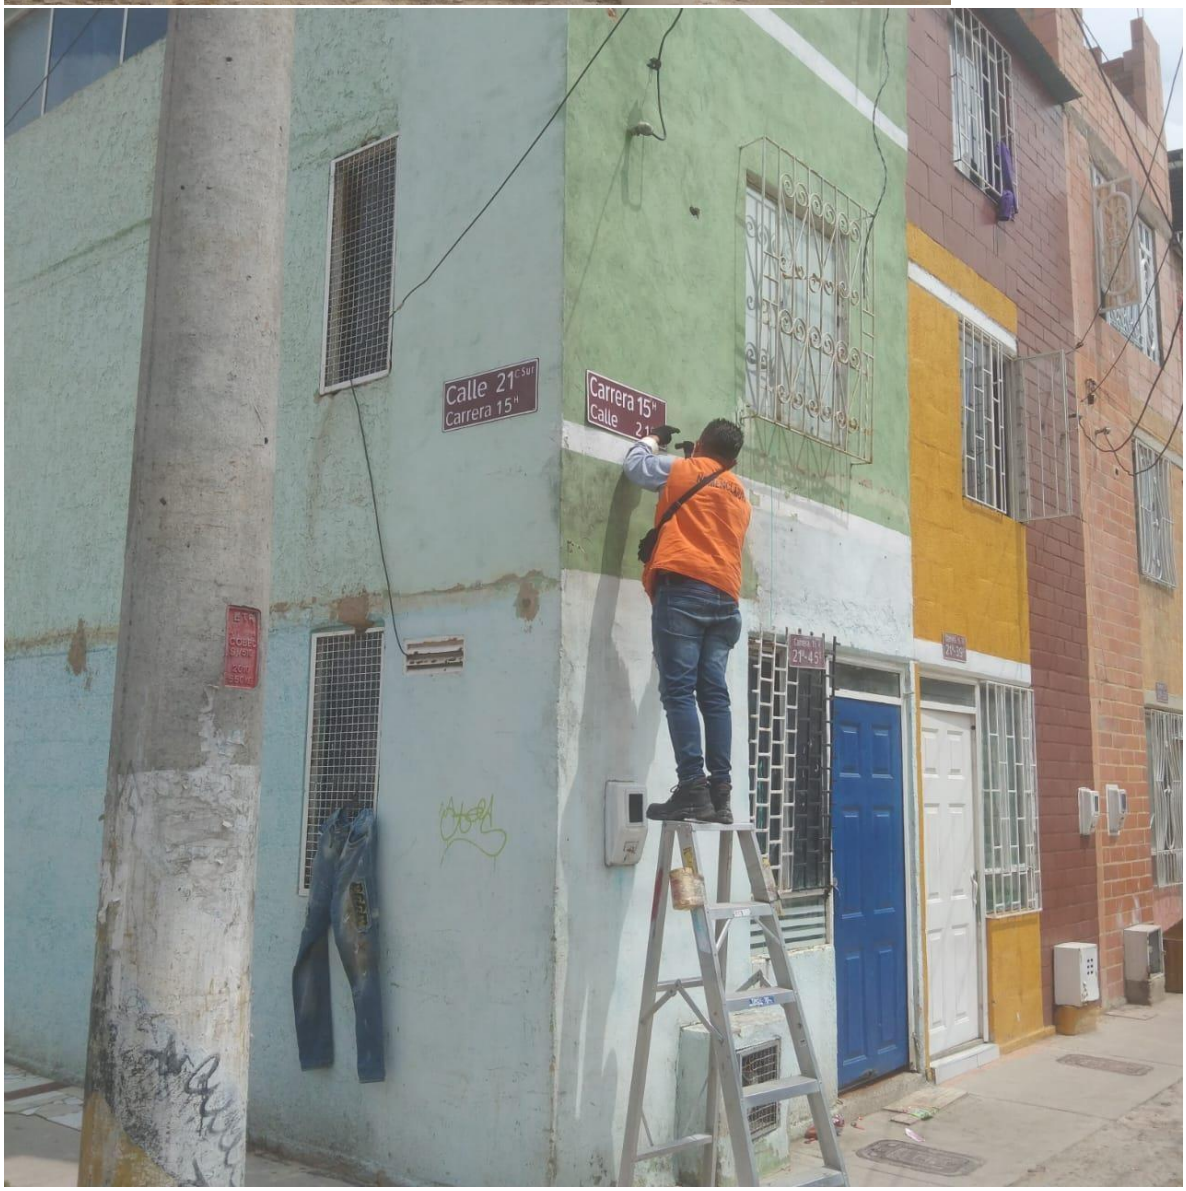


Calle 21 E SUR
Carrera 15 H
Carrera 15 H


Transv. 12
Carrera


Calle
Carrera
NOMENCLATURA
DESTAPE
CAÑERI
SIN ROM
314 389
ERNADORA
LIANA
ARCÍA

Anexo No. 9	Oficio radicación Informe final USB (Archivos, planillas y registros fotográfico)

Señalización Vial e Industrial
Nomenclatura Vial y Domiciliaria
Implementos de Dotación
Placas vehiculares

GEOCAT Ingeniería SAS

Estudios Catastrales
Sistemas de Información Geográfica
Cartografía Digital
Topografía

Bogotá D.C, 26 de febrero de 2024

Señores:
ALCALDIA DE SOACHA
Atn, Ingeniero Julián Yamid Mendoza Coronado
Ayuda a la supervisión.

Ref.: Entregas de informe final del contrato NO. 4034- 2023 que tiene por objeto *"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA – FASE IV"*.

Cordial saludo,
Por medio de la presente me permito hacer entrega de:

1. Informe final en físico.
2. USB con información de:
   - Registro fotográfico de placas instaladas con sus planillas de camp y planos
   - PDF de informe final
   - GDB
   - Excel de cobertura de campo
3. Placas viales y domiciliarias que durante la ejecución del contrato los usuarios de los predios no permitieron instalar:
   - Nueve (9) placas Viales

BARRIO		NOMVIAL_CR	NOM_COMUN	NO INSTALADA
VILLA SOFIA I	CALLE 14A SUR	CARRERA 9		NO PERMITEN INSTALAR
LAS MARGARITAS	CARRERA 36 ESTE	CALLE 34A		NO PERMITEN INSTALAR
SAN NICOLAS	CARRERA 7C	CALLE 38 SUR		NO PERMITE INSTALAR
ABC SANTA ANA	CARRERA 5B	CALLE 17 SUR		NO PERMITEN INSTALAR
VILLA SOFIA I	CARRERA 9	CALLE 14A SUR		NO PERMITEN INSTALAR
LAS MARGARITAS	CALLE 34A	CARRERA 36 ESTE		NO PERMITEN INSTALAR
LA FRAGUA	TRANSVERSAL 5B	CARRERA 5B		NO PERMITEN INSTALAR
SAN ANTONIO	CARRERA 3 ESTE	CALLE 16A		No PERMITEN INSTALAR
SAN ANTONIO	CALLE 16A	CARRERA 3 ESTE		No PERMITEN INSTALAR

Recibido por Fausto 26/02/2023 11:01am Julian Mendoza

(+57) 240 21 41 - 649 15 91
comercial@geocat.com.co
gerencia@geocat.com.co
WWW.GEOCAT.COM.CO
Calle 77 No. 63 - 22
Bogotá, Colombia

- Tres (3) placas domiciliarias

#	CONSECUTIVO	AN_C	RE_CC	NOMVIAL	PLACA_LIST	FECHA	FOTO	OBSERVACION
3	3482	0730	0006	CARRERA 16K	35-19 SUR	01/16/24		NO PERMITEN INSTALAR
10	3489	0730	0016	CARRERA 16K	35-45 SUR	01/16/24		NO PERMITEN INSTALAR
12	3553	0736	0003	CARRERA 16F	35-10 SUR	01/16/24		NO PERMITEN INSTALAR

Atentamente:

JONATHAN DAVID BENAVIDES MUNERA.
C.C 1.026.552.436
REPRESENTANTE LEGAL
GEOCAT INGENIERIA S.A.S.
NIT: 860.524.046-8
comercial@geocat.com.co
