	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No. CLP-202105002-2021 **Contratista:** CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021

Contrato de Interventoría No. 1981-2023 **Interventoría:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

Objeto Contrato de Obra:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		8
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		9
2.1	Localización		11
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		12
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		12
2.4	Características técnicas del proyecto		13
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		13
3.1	Información general del contrato		13
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		15
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		15
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		16
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		16
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	17
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	29
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	31
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	33
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	35
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	39
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	41
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	46
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	49
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	49
	• Seguimiento Programa de Obra		63
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	63
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	63
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	65
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	69
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		72
5.1	Información general del contrato		72
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		73
5.3	Informes especialistas y profesionales		73
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		73
5.5	Informe matriz de riesgos.		73
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		73
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		NA
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		82
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	82
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	84
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	90
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	92
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	96
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		96
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	96
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	96
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	97
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	97
7	**Conclusiones y recomendaciones**		99
8	**Anexos**		100
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		101
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		100
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		100
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		100

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 033 de fecha 29-06-2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 05/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **PERIODO MES:** AGOSTO

CONTRATO DE OBRA No.: CLP-202105002-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 NIT. 901.543.269-9

PLAZO INICIAL: CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO: 30/12/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN: 13/04/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: NO ASIGNADA A LA FECHA
FECHA DE VENCIMIENTO:
PLAZO ACUMULADO: QUINCE PUNTO CINCO (15,5) MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 2.767.505.806,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 0,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 2.767.505.806,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 807.700.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: IP-DT-BOY-009-2023 **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimento con Placa Huella no Incluye Cunetas (1.0 km)	Subbase granular clase C	m3	1108,15
	Sello de juntas	ml	6785,80
	Excavaciones varias sin clasificar	m3	969,40
	Concreto resistencia 21MPa (D)	m3	636,40
	Concreto Resistencia 21 MPa (G) (Ciclopeo)	m3	466,20
	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	42453,80
Construcción de Cuneta en Concreto Reforzado (ml)	Subbase granular clase C	m3	296,00
	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	370,00
	Concreto resistencia 21MPa (D)	m3	555,00
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	48100,04
Actividades de Mantenimiento Periódico	Conformación de la calzada existente	m2	99000,00
	Afirmado	m3	402,36

TRAMO	METROS LINEALES
CHICHIPI 1	64,48
CHICHIPI 2	68,83
CHICHIPI 3	65,09
CHICHIPI 4	24,01
CHICHIPI 5	100,35
CHICHIPI 6	61,62
BATEA EL TORO	67,55
TRAPICHE QUEMADO	87,04
SANTA ROSA DANILO MATALLANA	135,29
HOMERO 2	66,5
HOMERO 1	90
SAN PEDRO LA ESCUELA	270,08
CURVA MARCELINO	80
JUAN DURAN	126,59
MORATO	74,34
SANTA ROSA LA ESCUELA	55,22
LA HERRADURA	195,68
SABANETA EL ROBLE 3	114,7
SABANETA EL ROBLE 1	43,67
SABANETA EL ROBLE 2	58,93

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimento con Placa Huella no Incluye Cunetas (1.0 km)	Subbase granular clase C	m3	823,19	823,19
	Sello de juntas	ml	0,00	0,00
	Excavaciones varias sin clasificar	m3	149,72	149,72
	Concreto resistencia 21MPa (D)	m3	254,93	254,93
	Concreto Resistencia 21 MPa (G) (Ciclopeo)	m3	166,92	166,92
	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	11769,16	11769,16
Construcción de Cuneta en Concreto Reforzado (ml)	Subbase granular clase C	m3	200,07	200,07
	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	0,00	0,00
	Concreto resistencia 21MPa (D)	m3	185,64	185,64
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	8605,37	8605,37
Actividades de Mantenimiento Periódico	Conformación de la calzada existente	m2	0,00	0,00
	Afirmado	m3	0,00	0,00

TRAMO	METROS LINEALES	METROS EJECUTADOS
CHICHIPI 1	64,48	
CHICHIPI 2	68,83	
CHICHIPI 3	65,09	
CHICHIPI 4	24,01	
CHICHIPI 5	100,35	
CHICHIPI 6	61,62	
BATEA EL TORO	67,55	
TRAPICHE QUEMADO	87,04	
SANTA ROSA DANILO MATALLANA	135,29	
HOMERO 2	66,5	66,91
HOMERO 1	90	91
SAN PEDRO LA ESCUELA	270,08	270,1
CURVA MARCELINO	80	79,88
JUAN DURAN	126,59	127,95
MORATO	74,34	91,5
SANTA ROSA LA ESCUELA	55,22	
LA HERRADURA	195,68	
SABANETA EL ROBLE 3	114,7	
SABANETA EL ROBLE 1	43,67	
SABANETA EL ROBLE 2	58,93	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 2.660.288.332,00	N/A	$ 2.660.288.332,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 65.447.454,00	$ 12.435.016,00	$ 77.882.470,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 29.335.004,00	N/A	$ 29.335.004,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 2.767.505.806,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 633.278.481,00	$ 0,00	$ 633.278.481,00	$ 633.278.481,00
AJUSTES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 55.000.000,00	$ 10.450.000,00	$ 65.450.000,00	$ 65.450.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR EJECUTADO				$ 698.728.481,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 05/09/2023 (Dia / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 2.660.288.332,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 633.278.481,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	23,80%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.52202-82168

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1981 DE 2023.

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".


INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°02

PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

VOLUMEN 01

VERSIÓN 00

RESPONSABLE

ELABORACIÓN	Residente de Interventoría Ing. Nelson Bravo Portilla Mat. 52202-185014 NRÑ	
VALIDACIÓN	Director de Interventoría Ing. Álvaro F. Lara Zambrano Mat. 52202 – 82168 NRÑ	

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	CAPÍTULO	VERSIÓN	CAMBIOS
Agosto de 2023.		00	N/A

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 5

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6

2.1 Localización del Proyecto 8

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 9

2.3 Inventario y estado inicial de la vía 9

2.4 Características técnicas del proyecto. 10

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 10

3.1 Información general del contrato 10

3.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato 11

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 12

3.3 Seguimiento de ítems no previstos 12

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 13

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 13

4.1 Informe Semanal 13

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 14

4.3 Personal y Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 15

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 16

4.5 Estado General del Tiempo 17

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 18

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 19

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 20

4.9 Otros documentos seguimiento mensual 21

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 21

4.9.2 Seguimiento Programa de Obra 22

4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones 22

4.9.4 Actas de comité de obra 23

4.9.5 Acta de reunión 23

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 24

5.1 Información general del contrato 24
5.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato 25
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 25
5.3 Informes especialistas y profesionales 25
5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC 25
5.5 Informe Matriz de Riesgos 25
5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría 25
6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 26
6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 26
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 27
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 28
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 29
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 30
6.6 Otros documentos seguimiento mensual 30
6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 30
6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado 30
7 Conclusiones y recomendaciones 31
8 ANEXOS 32
8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor 32
8.2 Registro fotográfico del avance de las obras 32
8.3 Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas 32
8.4 Bitácora del mes 32

1 INTRODUCCIÓN

Mediante convenio N 1206 de 2021 entre INVIAS y el Municipio de Buenavista acuerdan iniciar el proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIATE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL.

La alcaldía municipal de Buenavista – Boyacá mediante la licitación pública CLP-202105002-2021, suscribió el Contrato de Obra No. CLP-202105002 DE 2021 con el CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIATE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL" por un valor de $2.767.505.806.

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS - ordenó el inicio del contrato No. 1981 de 2023 que tiene por OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL", por un valor de $82.176.975.


El acta de inicio del contrato de interventoría se firmó el 18 de julio de 2023.

El presente documento tiene como fin presentar el desarrollo y seguimiento de las actividades que se llevarán a cabo para el cumplimiento del objeto del contrato.


2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en la zona rural de municipio, el cual presenta una topografía principalmente montañosa y la composición de sus vías están conformadas principalmente por material pétreo en deficientes condiciones, carente de sistemas de drenajes que garanticen la correcta escorrentía de las aguas lluvias.


Como tal el proyecto contempla la construcción de diferentes tramos con una estructura de pavimento compuesta por placa huella, a través de las diferentes veredas mencionadas en la localización del proyecto. Adicional a lo anterior se tiene proyectado actividades de mantenimiento periódico a lo largo de las vías a intervenir. Todos los requisitos y demás especificaciones de los elementos a construir se rigen por los parámetros del Instituto Nacional de Vías INVIAS y específicamente en la Cartilla del Programa de Colombia Rural. A continuación, se presenta las diferentes secciones y/o esquemas generales que hacen parte del proyecto:

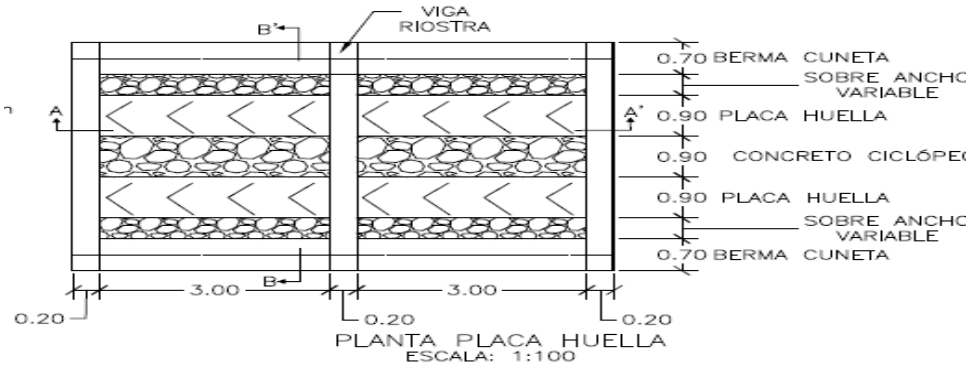


Vista en planta y sección en un tramo recto
Fuente: Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural INVIAS 2022




Sección longitudinal de Placa huella
Fuente: Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural INVIAS 2022



Corte Transversal Placa Huella
Fuente: Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural INVIAS 2020



Corte Longitudinal y transversal Riostra
Fuente: Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa Colombia Rural INVIAS 2020

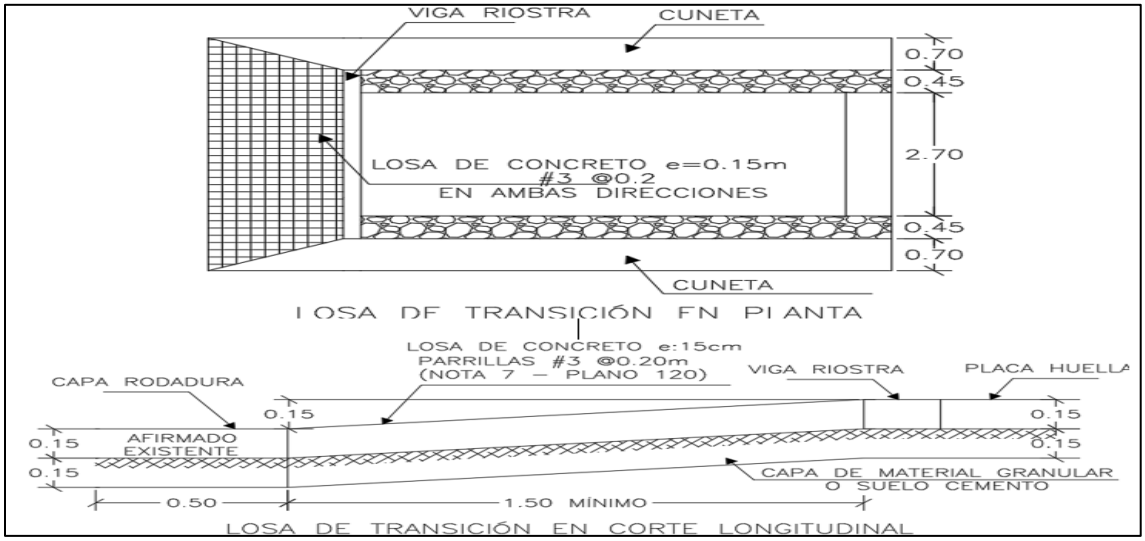

Losa de transición
Fuente: Obras menores de drenaje y estructuras viales Programa

Con el mantenimiento vial realizado se aumentan las condiciones de seguridad para los usuarios de la vía propiciando mejores condiciones de movilidad y conectividad para los habitantes de las zonas.

2.1 Localización del Proyecto

Buenavista es un Municipio Colombiano, ubicado en el departamento de Boyacá, en la provincia de Occidente, está situado a 115 Km de la ciudad de Tunja, capital de departamento y a 30 Km de la ciudad de Chiquinquirá cabecera de la provincia. Es conocido principalmente por sus extensos cultivos frutales, base de la economía del Municipio.

El proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIATE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL", está conformado por diferentes tramos vial del Municipio de Bellavista, del departamento de Boyacá. Éstos se encuentran ubicados en las veredas SARVITH - SAN PEDRO – IMPARAL – HERRADURA – SABANETA - SANTA ROSA-CONCEPCIÓN, en la siguiente figura se presenta la localización, coordenadas y una longitud aproximada de los tramos de estudio descrito.

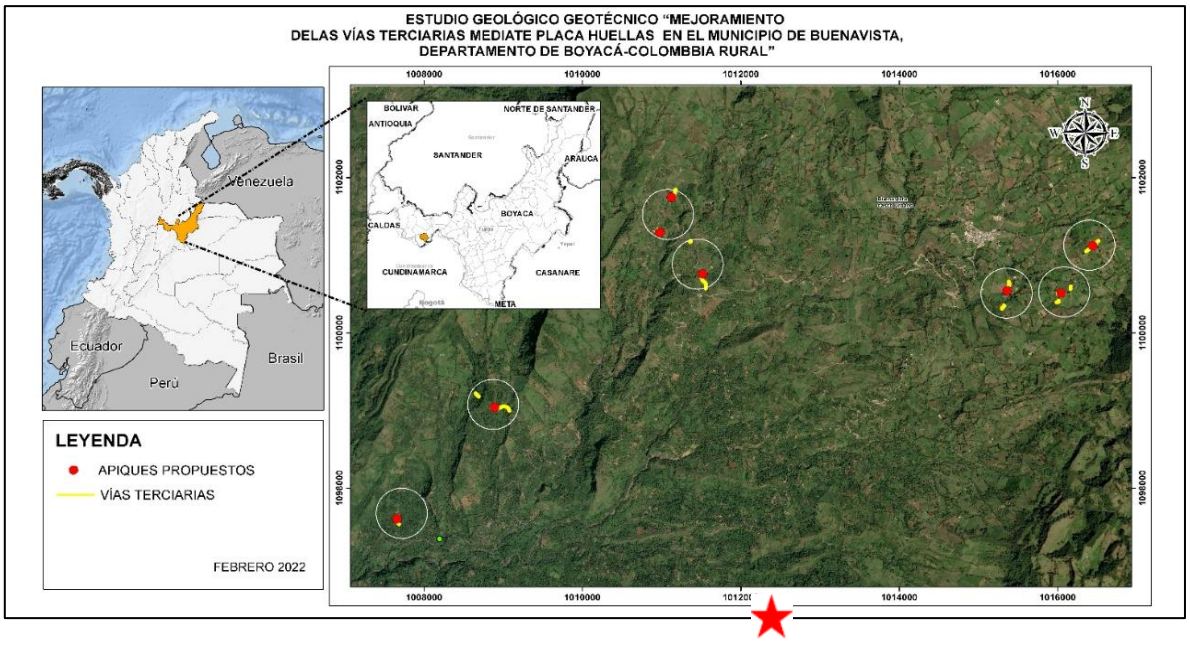


Figura 1. Localización de las vías a realizar intervención

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

El proyecto se encuentra localizado en el Municipio de Buenavista Boyacá, los Municipios cercanos son Otanche y Yacopí; la población de estos Municipios se beneficiará con los mejoramientos viales y conexión entre ellos.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía

Los sectores a intervenir son vías terciarias que se encuentran en material recebo, en su mayoría en mal estado, se tiene las longitudes a intervenir conforme al proyecto y las ya intervenidas por el contratista.

CONSOLIDADO TRAMOS A MEJORAR	LONGITUD TRAMO (M)	EJECUTADO (M)
CHICHIPI 1	64.48	
CHICHIPI 2	68,83	
CHICHIPI 3	65,09	
CHICHIPI 4	24,01	
CHICHIPI 5	100,35	
CHICHIPI 6	61,62	
BATEA EL TORO	67.55	
TRAPICHE QUEMADO	87,04	
SANTA ROSA DANILO MATALLANA	135,29	
HOMERO 2	66,5	66.91
HOMERO 1	90	91
SANPEDRO LA ESCUELA	270,08	270.1
CURVA MARCELINO	80	79.88
JUAN DURAN	126.59	127.95
MORATO	74,34	91.5
SANTA ROSA LA ESCUELA	55,22	
LA HERRADURA	195.68	
SABANETA EL ROBLE 3	114,7	
SABANETA EL ROBLE 1	43,67	
SABANETA EL ROBLE 2	58,96	
	1850,00	727.34

2.4 Características técnicas del proyecto.

El proyecto cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - COLOMBIA RURAL, contempla la intervención de puntos críticos identificados y ubicados en:

CURVA MARCELINO, HOMERO 1, HOMERO 2, SAN PEDRO LA ESCUELA, JUAN DURAN, MORATO, CHICHIPI 1, CHICHIPI 2, CHICHIPI 3, CHICHIPI 4, CHICHIPI 5 Y CHICHIPI 6, SABANETA EL ROBLE 1, SABANETA EL ROBLE 2 Y SABANETA EL ROBLE 3, SANTA ROSA LA ESCUELA, SANTA ROSA DANILO MATALLANA, TRAPICHE QUEMADO, BATEA EL TORO, LA HERRADURA

EL proyecto contempla la construcción de diferentes tramos con una estructura de pavimento compuesta por placa huella. Con la construcción de estas obras se aumenta las condiciones de seguridad para los usuarios de la vía y propiciando mejores condiciones de movilidad y conectividad para los habitantes de la zona.

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

A continuación, se relacionan los datos generales del contrato de obra N° CLP-202105002-2021.

Tabla 1. Información General del Contrato

TIPO DE PROCESO:	LICITACIÓN PUBLICA
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
NUMERO DE CONTRATO:	CLP-202105002 DE 2021
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUENAVISTA - BOYACÁ
NIT DEL CONTRATANTE:	891.808.260-0
NOMBRE CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021
NIT DEL CONTRATISTA:	901.543.259-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON RONAL VELANDIA ROMERO
OBJETO DEL CONTRATO:	“MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA,

	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL”
VALOR INICIAL:	$ 2.767.505.806 M/CTE
VALOR ADICIÓN:	$ -
VALOR TOTAL:	$ 2.767.505.806 M/CTE
PLAZO EJECUCIÓN:	5 MESES (SIN EXCEDER 31 JULIO 2022)
ANTICIPO:	$ 807.700.000,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/05/2022
PRORROGA No. 1:	SESENTA Y DOS (62) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31/JUL/2022
PRORROGA No. 2:	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	31/AGO/2022
PRORROGA No. 3:	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	31/OCT/2022
PRORROGA No. 4:	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	31/DIC/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	31/DIC/2022
FECHA DE REINICIO No. 1:	10/ENE/2023
PRORROGA No. 5	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	28/FEB/2023
PRORROGA No. 6:	UNO PUNTO CINCO (1,5) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 6:	15/ABR/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2:	13/ABR/2023

Fuente: Elaboración Propia

3.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato

A la fecha de elaboración del presente informe, se han presentado 6 prórrogas al contrato de Obra, conforme a la cual quedan 2 días de ejecución; el contrato se encuentra en la suspensión N 2 de fecha 13 de abril de 2023, la cual no tiene fecha prevista de reinicio.

TIPO DE ACTA Y/O MODIFICATORIO	FECHA	PLAZO
PRORROGA 1	27/05/2022	62 DÍAS CALENDARIO
PRORROGA 2	29/07/2022	1 MES
PRORROGA 3	31/08/2022	2 MESES
PRORROGA 4	28/10/2022	2 MESES
PRORROGA 5	10/01/2023	2 MESES
PRORROGA 6	28/02/2023	1,5 MESES

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto el contrato de obra continúa en suspensión si fecha probable de reinicio, sin embargo, se realizan actividades en conjunto con la interventoría, se realizaron las siguientes actividades:

Semana N° 70: del 01 al 07 de agosto

- Se realizó la revisión de la documentación correspondiente a los diseños geométrico y estructural del contrato de obra.

Semana N° 71: del 08 al 14 de agosto

- Se realizó la revisión de la documentación correspondiente a los diseños hidráulico e hidrológico del contrato de obra.

Semana N° 72: del 15 al 21 de agosto

- Se realizó la revisión del balance de cantidades de obra, memorias de cálculo y sabana de cantidades conforme a los estudios y diseños del contrato de obra.

Semana N° 73: del 22 al 28 de agosto

- Se realizó visita en terreno y verificación de las medidas para determinar las cantidades de obra establecidas en el proyecto y ejecutadas para el acta parcial de obra N 1.

3.3 Seguimiento de ítems no previstos

No se ha realizado inclusión de ítems no previstos a la fecha.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

A la fecha el contrato de obra se encuentra en suspensión con un avance del 23.80% del total de ejecución de obra.

Se realiza la revisión a los ajustes a diseños realizados por el contratista.

Se realiza toma de medidas en campo de actividades ejecutadas para proyección de acta de corte parcial de obra.

Se continuará con el acompañamiento a la ejecución de las actividades por parte de la interventoría.

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informe Semanal

Para ver los informes semanales del proyecto se utiliza el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 del Manual de Interventoría del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 07/08/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ — SEMANA No.: 70 del 01/08/2023 al 07/08/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTA — **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** CAMILO ALFONSO ESPINOSA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES EL MEJORAMIENTO DE 1.85 KM DE VÍA TERCIARIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS, JUNTO CON SUS OBRAS DE DRENAJES (CUNETAS) Y EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE 16.5 KM MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

PAVIMENTACIÓN MEDIANTE PLACA HUELLAS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE (CUNETAS) Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 NIT. 901.543.259-9		
INTEGRANTES:	60% CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JYM S.A.S. / 40% SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EMCONSUT S.A.S.		
CONTRATO No.	CLP-202105002-2021	**VALOR INICIAL:**	$ 2.767.505.806,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2021	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/05/2022	**VALOR ACUMULADO:**	$ 2.767.505.806,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/12/2023	**VALOR ANTICIPO:**	$ 807.700.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 807.700.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3		
INTEGRANTES:	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO		
CONTRATO No.	IP-DT-BOY-009-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 82.176.975,00
FECHA DE INICIO:	18/07/2023	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	17/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 82.176.975,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17/12/2023	**VALOR ANTICIPO:**	
		VALOR AMORTIZADO:	
		SALDO POR AMORTIZAR:	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 82.176.975,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 82.176.975,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.660.288.332,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.510.317.301,10	94,36%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 633.278.481,00	23,80%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-$ 1.877.038.820,10	-70,56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 27.500.000,00	50,00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.510.317.301,10	94,36%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 633.278.481,00	23,80%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	-$ 1.877.038.820,10	-70,56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 525.149.013,27	19,740%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: NO SE HA FACTURADO NADA

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.176.975,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 12.326.546,25	15,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.108.848,75	5,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.108.848,75	5,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 807.700.000,00
Amortizado $	
Saldo $	$ 807.700.000,00

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 94,36%

Meta Física Ejecutada % 23,80%

Avance o Atraso Físico % -70,56%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada											
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**CURVA MARCELINO**	**HOMERO 1**	**HOMERO 2**	**SAN PEDRO LA ESCUELA**	**MORATO**	**JUAN DURAN**	**TOTAL**	**%**	**Descripción**	**Equipo Mínimo**	**Total Disponible**
PAVIMENTO CON PLACA HUELLA NO INCLUYE CUNETAS	KM	1,85	2023		Prog	79,88	91,00	66,91	270,10	91,50	127,95	727,34	39,32%	MOTONIVELADORA	1	
					Ejec	79,88	91,00	66,91	270,10	91,50	127,95	727,34	39,32%	VIBRO COMPACTADOR	1	
CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO REFORZADO	ML	3700	2023		Prog	159,76	182,00	133,82	540,20	183,00	255,90	1454,68	39,32%	RETRO EXCAVADORA	1	
					Ejec	159,76	182,00	133,82	540,20	183,00	255,90	1454,68	39,32%	VOLQUETA SENCILLA	2	
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	99000	2023		Prog									MEZCLADORA DE CONCRETO	4	
					Ejec											
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO	M3	402,36	2023		Prog											
					Ejec											
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	GL	1	2023		Prog											
					Ejec											
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA	GL	1	2023		Prog							1,00	50,00%			
					Ejec							1,00	50,00%			
														Total		
														Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: "CURVA MARCELINO"

TRAMO Y/O SECTOR 2: "HOMERO 1"

TRAMO Y/O SECTOR 3: "HOMERO 2"

TRAMO Y/O SECTOR 4: "SAN PEDRO LA ESCUELA"

TRAMO Y/O SECTOR 5: "MORATO"

TRAMO Y/O SECTOR 6: "JUAN DURAN"

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA EL TRIANGULO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	PAUNA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: APROBADA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: EL CONSORCIO AIRCPT 2021 SOLICITÓ EL CIERRE DEL PAGA A CORTE 17/04/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, POR LO CUAL SE REVISÓ EL PAGA POR ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO Y SE ENVIÓ NUEVAMENTE A LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL LA APROBACIÓN DEL MISMO.
SE REALIZAN INFORMES TRIMESTRALES.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A

AVALÚOS APROBADOS: N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE LA REVISIÓN A TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE HACE PARTE A LA REVISIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CON RESPECTO AL DISEÑO GEOMÉTRICO Y ESTRUCTURAL

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*SE PROGRAMARON ACTIVIDADES EN CONJUNTO CON LOS PROFESIONALES QUE HACEN PARTE DEL CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021, PARA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CON RESPECTO AL DISEÑO HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

A la fecha se tiene un avance programado en obra del 94,36 % teniendo en cuenta la reprogramación por prorroga 6 y presenta un avance ejecutado del 23,80 %, con un atraso del 70,56 %.
Ejecución en Agosto un solo tramo "Curva Marcelino" Tramo 1
Ejecución en Septiembre un solo tramo "Homero 1" Tramo 2
Ejecución en Octubre desde el 24 de Octubre un solo tramo " Homero 2" Tramo 3
Ejecución en Diciembre desde el 04 de Noviembre un solo tramo " San Pedro la Escuela" Tramo 4
Ejecución en Enero se encuentra suspendida, mediante acta de suspensión 1 desde el 31 de Diciembre de 2022, hasta el 09 de Enero de 2023.
Ejecución de actividades de Febrero se da terminación a la construcción de placa huella Tramo 5, "Morato".
Ejecucion de actividades mes de Marzo, se da terminación a la construcción de la placa huella tramo Juan Duran
Se suspenden actividades de obra mediante acta de Suspensión No.2 del 13 de abril de 2023

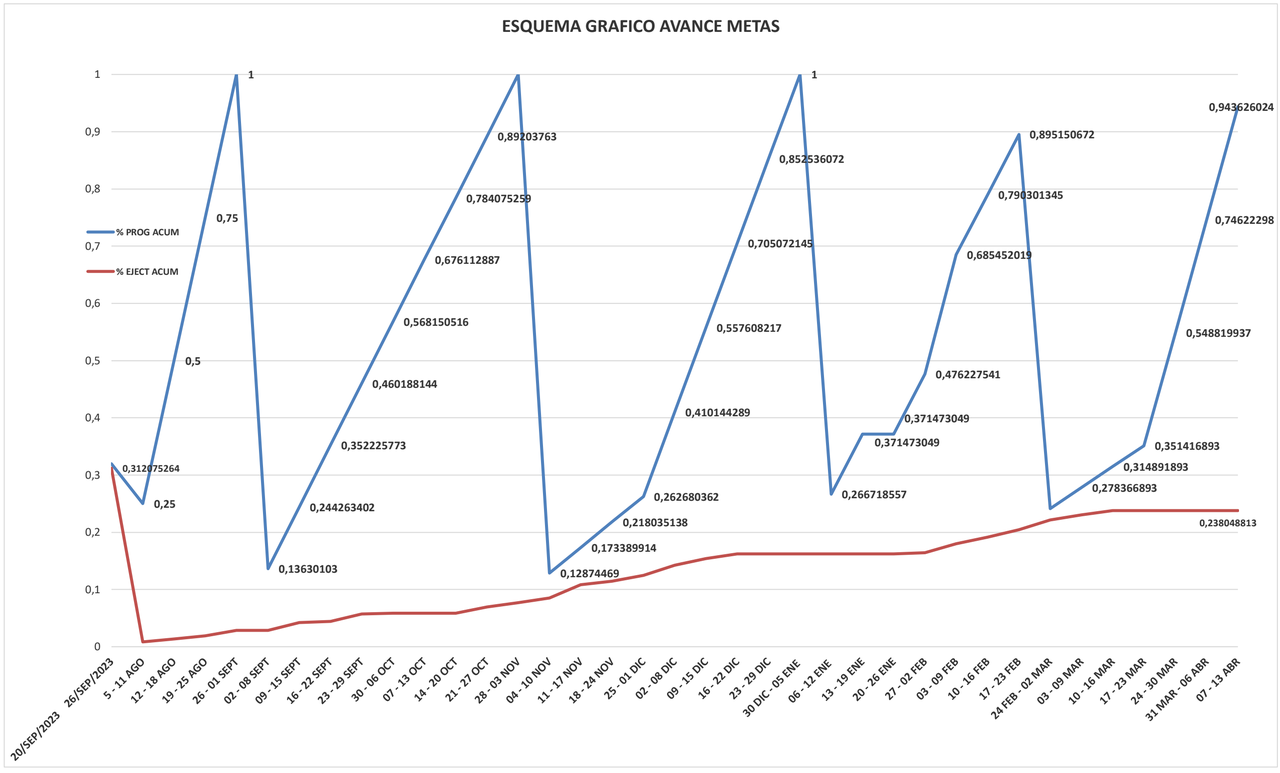

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
		FIRMA NOMBRE: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO Matrícula Profesional No.: 52202-82168

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 14/08/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ — SEMANA No.: 71 (Numeración consecutiva) del 08/08/2023 al 14/08/2023 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTA — **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** CAMILO ALFONSO ESPINOSA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES EL MEJORAMIENTO DE 1.85 KM DE VÍA TERCIARIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS, JUNTO CON SUS OBRAS DE DRENAJES (CUNETAS) Y EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE 16.5 KM MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

PAVIMENTACIÓN MEDIANTE PLACA HUELLAS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE (CUNETAS) Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 NIT. 901.543.259-9			**INTERVENTOR:**	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3		
INTEGRANTES:	60% CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JYM S.A.S. / 40% SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EMCONSUT S.A.S.			**INTEGRANTES:**	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO		
CONTRATO No.	CLP-202105002-2021	**VALOR INICIAL:**	$ 2.767.505.806,00	**CONTRATO No.**	IP-DT-BOY-009-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 82.176.975,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2021	**VALOR ADICIONES:**		**FECHA DE INICIO:**	18/07/2023	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/05/2022	**VALOR ACUMULADO:**	$ 2.767.505.806,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	17/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 82.176.975,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/12/2023	**VALOR ANTICIPO:**	$ 807.700.000,00	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	17/12/2023	**VALOR ANTICIPO:**	
		VALOR AMORTIZADO:				**VALOR AMORTIZADO:**	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 807.700.000,00			**SALDO POR AMORTIZAR:**	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**			$ 82.176.975,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 82.176.975,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.660.288.332,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.510.317.301,10	94,36%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 633.278.481,00	23,80%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-$ 1.877.038.820,10	-70,56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 27.500.000,00	50,00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.510.317.301,10	94,36%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 633.278.481,00	23,80%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	-$ 1.877.038.820,10	-70,56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 525.149.013,27	19,740%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: NO SE HA FACTURADO NADA

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.176.975,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 16.435.395,00	20,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.108.848,75	5,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.108.848,75	5,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 807.700.000,00
Amortizado $	
Saldo $	$ 807.700.000,00

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 94,36%
Meta Física Ejecutada % 23,80%
Avance o Atraso Físico % -70,56%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada											
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**CURVA MARCELINO**	**HOMERO 1**	**HOMERO 2**	**SAN PEDRO LA ESCUELA**	**MORATO**	**JUAN DURAN**	**TOTAL**	**%**	**Descripción**	**Equipo Mínimo**	**Total Disponible**
PAVIMENTO CON PLACA HUELLA NO INCLUYE CUNETAS	KM	1,85	2023		Prog	79,88	91,00	66,91	270,10	91,50	127,95	727,34	39,32%	MOTONIVELADORA	1	
					Ejec	79,88	91,00	66,91	270,10	91,50	127,95	727,34	39,32%	VIBRO COMPACTADOR	1	
CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO REFORZADO	ML	3700	2023		Prog	159,76	182,00	133,82	540,20	183,00	255,90	1454,68	39,32%	RETRO EXCAVADORA	1	
					Ejec	159,76	182,00	133,82	540,20	183,00	255,90	1454,68	39,32%	VOLQUETA SENCILLA	2	
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	99000	2023		Prog									MEZCLADORA DE CONCRETO	4	
					Ejec											
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO	M3	402,36	2023		Prog											
					Ejec											
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	GL	1	2023		Prog											
					Ejec											
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA	GL	1	2023		Prog							1,00	50,00%			
					Ejec							1,00	50,00%			
														Total		
														Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: "CURVA MARCELINO"
TRAMO Y/O SECTOR 2: "HOMERO 1"
TRAMO Y/O SECTOR 3: "HOMERO 2"
TRAMO Y/O SECTOR 4: "SAN PEDRO LA ESCUELA"
TRAMO Y/O SECTOR 5: "MORATO"
TRAMO Y/O SECTOR 6: "JUAN DURAN"

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA EL TRIANGULO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	PAUNA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO X	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	

OBSERVACIONES: APROBADO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVA EL CONSORCIO AIRCPT 2021 SOLICITÓ EL CIERRE DEL PAGA A CORTE 17/04/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, POR LO CUAL SE REVISÓ EL PAGA POR ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO Y SE ENVIÓ NUEVAMENTE A LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL LA APROBACIÓN DEL MISMO.
SE REALIZAN INFORMES TRIMESTRALES.**CIONES:**

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE LA REVISIÓN A TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE HACE PARTE A LA REVISIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CON RESPECTO AL DISEÑO HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*SE PROGRAMARON ACTIVIDADES EN CONJUNTO CON LOS PROFESIONALES QUE HACEN PARTE DEL CONSOCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021, PARA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CON RESPECTO AL DISEÑO GEOTÉCNICO Y GEOLÓGICO.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

A la fecha se tiene un avance programado en obra del 94,36 % teniendo en cuenta la reprogramación por prorroga 6 y presenta un avance ejecutado del 23,80 %, con un atraso del 70,56 %.
Ejecución en Agosto un solo tramo "Curva Marcelino" Tramo 1
Ejecución en Septiembre un solo tramo "Homero 1" Tramo 2
Ejecución en Octubre desde el 24 de Octubre un solo tramo " Homero 2" Tramo 3
Ejecución en Diciembre desde el 04 de Noviembre un solo tramo " San Pedro la Escuela" Tramo 4
Ejecución en Enero se encuentra suspendida, mediante acta de suspensión 1 desde el 31 de Diciembre de 2022, hasta el 09 de Enero de 2023.
Ejecución de actividades de Febrero se da terminación a la construcción de placa huella Tramo 5, "Morato".
Ejecucion de actividades mes de Marzo, se da terminación a la construcción de la placa huella tramo Juan Duran
Se suspenden actividades de obra mediante acta de Suspensión No.2 del 13 de abril de 2023

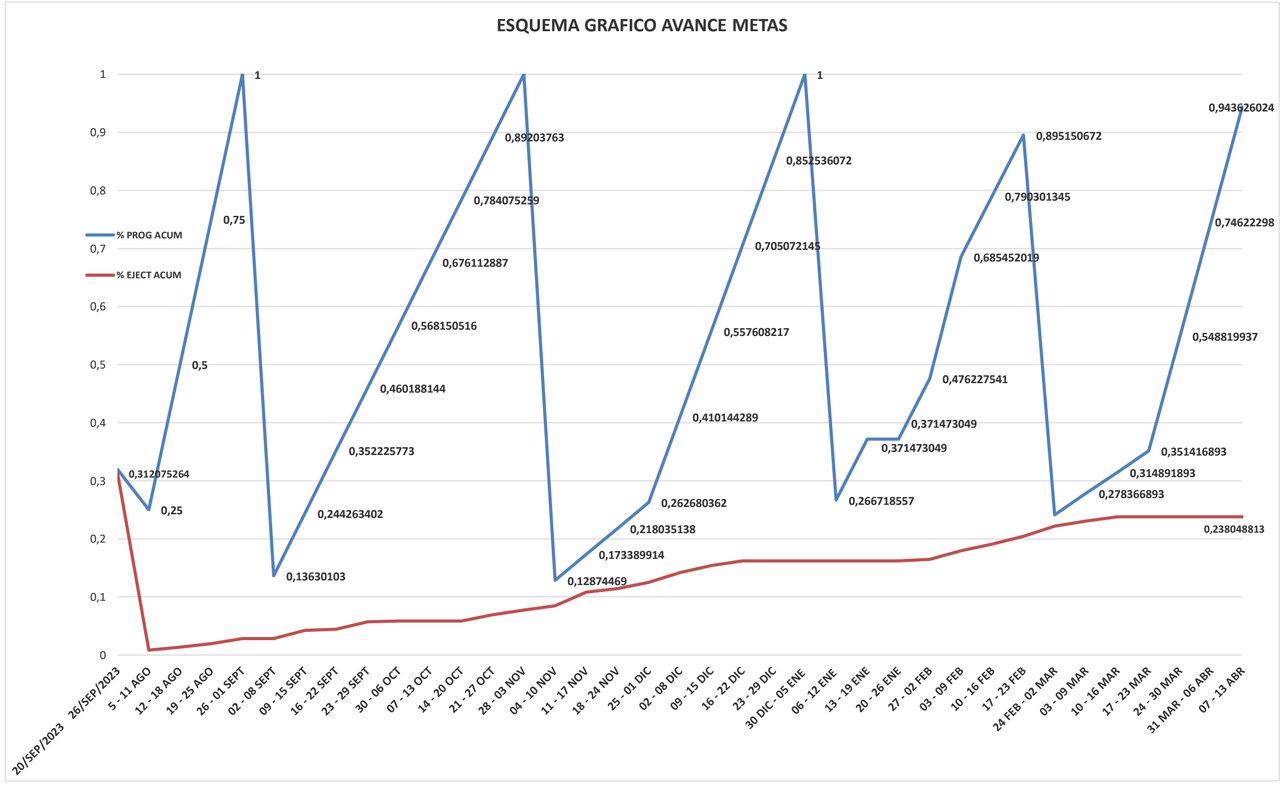

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
		FIRMA ALVAROFDOLARA. NOMBRE: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO Matrícula Profesional No.: 52202-82168

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 21/08/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ — SEMANA No.: 72 (Numeración consecutiva) del 15/08/2023 al 21/08/2023 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTA — **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** CAMILO ALFONSO ESPINOSA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES EL MEJORAMIENTO DE 1.85 KM DE VÍA TERCIARIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS, JUNTO CON SUS OBRAS DE DRENAJES (CUNETAS) Y EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE 16.5 KM MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

PAVIMENTACIÓN MEDIANTE PLACA HUELLAS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE (CUNETAS) Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 NIT. 901.543.259-9			**INTERVENTOR:**	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3		
INTEGRANTES:	60% CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JYM S.A.S. / 40% SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EMCONSUT S.A.S.			**INTEGRANTES:**	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO		
CONTRATO No.	CLP-202105002-2021	**VALOR INICIAL:**	$ 2.767.505.806,00	**CONTRATO No.**	IP-DT-BOY-009-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 82.176.975,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2021	**VALOR ADICIONES:**		**FECHA DE INICIO:**	18/07/2023	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/05/2022	**VALOR ACUMULADO:**	$ 2.767.505.806,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	17/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 82.176.975,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/12/2023	**VALOR ANTICIPO:**	$ 807.700.000,00	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	17/12/2023	**VALOR ANTICIPO:**	
		VALOR AMORTIZADO:				**VALOR AMORTIZADO:**	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 807.700.000,00			**SALDO POR AMORTIZAR:**	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 82.176.975,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 82.176.975,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.660.288.332,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.510.317.301,10	94,36%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 633.278.481,00	23,80%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-$ 1.877.038.820,10	-70,56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 27.500.000,00	50,00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.510.317.301,10	94,36%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 633.278.481,00	23,80%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	-$ 1.877.038.820,10	-70,56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 525.149.013,27	19,740%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: NO SE HA FACTURADO NADA

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.176.975,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.544.243,75	25,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.108.848,75	5,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.108.848,75	5,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 807.700.000,00
Amortizado $	
Saldo $	$ 807.700.000,00

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 94,36% **Avance o Atraso Físico %** -70,56%

Meta Física Ejecutada % 23,80%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada											
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**CURVA MARCELINO**	**HOMERO 1**	**HOMERO 2**	**SAN PEDRO LA ESCUELA**	**MORATO**	**JUAN DURAN**	**TOTAL**	**%**	**Descripción**	**Equipo Mínimo**	**Total Disponible**
PAVIMENTO CON PLACA HUELLA NO INCLUYE CUNETAS	KM	1,85	2023		Prog	79,88	91,00	66,91	270,10	91,50	127,95	727,34	39,32%	MOTONIVELADORA	1	
					Ejec	79,88	91,00	66,91	270,10	91,50	127,95	727,34	39,32%	VIBRO COMPACTADOR	1	
CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO REFORZADO	ML	3700	2023		Prog	159,76	182,00	133,82	540,20	183,00	255,90	1454,68	39,32%	RETRO EXCAVADORA	1	
					Ejec	159,76	182,00	133,82	540,20	183,00	255,90	1454,68	39,32%	VOLQUETA SENCILLA	2	
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	99000	2023		Prog									MEZCLADORA DE CONCRETO	4	
					Ejec											
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO	M3	402,36	2023		Prog											
					Ejec											
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	GL	1	2023		Prog											
					Ejec											
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA	GL	1	2023		Prog							1,00	50,00%			
					Ejec							1,00	50,00%			
														Total		
														Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: "CURVA MARCELINO"
TRAMO Y/O SECTOR 2: "HOMERO 1"
TRAMO Y/O SECTOR 3: "HOMERO 2"
TRAMO Y/O SECTOR 4: "SAN PEDRO LA ESCUELA"
TRAMO Y/O SECTOR 5: "MORATO"
TRAMO Y/O SECTOR 6: "JUAN DURAN"

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA EL TRIANGULO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	PAUNA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: APROBADO

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: EL CONSORCIO AIRCPT 2021 SOLICITÓ EL CIERRE DEL PAGA A CORTE 17/04/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, POR LO CUAL SE REVISÓ EL PAGA POR ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO Y SE ENVIÓ NUEVAMENTE A LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL LA APROBACIÓN DEL MISMO.
SE REALIZAN INFORMES TRIMESTRALES.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE LA REVISIÓN A TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE HACE PARTE A LA REVISIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOSCON RESPECTO AL BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA, MEMORIAS DE CÁLCULO Y SABANA DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO SEGÚN ESTUDIOS Y DISEÑOS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*SE PROGRAMARON VISITA AL MUNICIPIO DE BUENAVISTA PARA DETERMINAR CANTIDADES DE OBRA EN EL TERRENO PARA INICIAR TRAMITE DE ACTA PARCIAL No.1.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

A la fecha se tiene un avance programado en obra del 94,36 % teniendo en cuenta la reprogramación por prorroga 6 y presenta un avance ejecutado del 23,80 %, con un atraso del 70,56 %.
Ejecución en Agosto un solo tramo "Curva Marcelino" Tramo 1
Ejecución en Septiembre un solo tramo "Homero 1" Tramo 2
Ejecución en Octubre desde el 24 de Octubre un solo tramo " Homero 2" Tramo 3
Ejecución en Diciembre desde el 04 de Noviembre un solo tramo " San Pedro la Escuela" Tramo 4
Ejecución en Enero se encuentra suspendida, mediante acta de suspensión 1 desde el 31 de Diciembre de 2022, hasta el 09 de Enero de 2023.
Ejecución de actividades de Febrero se da terminación a la construcción de placa huella Tramo 5, "Morato".
Ejecucion de actividades mes de Marzo, se da terminación a la construcción de la placa huella tramo Juan Duran
Se suspenden actividades de obra mediante acta de Suspensión No.2 del 13 de abril de 2023

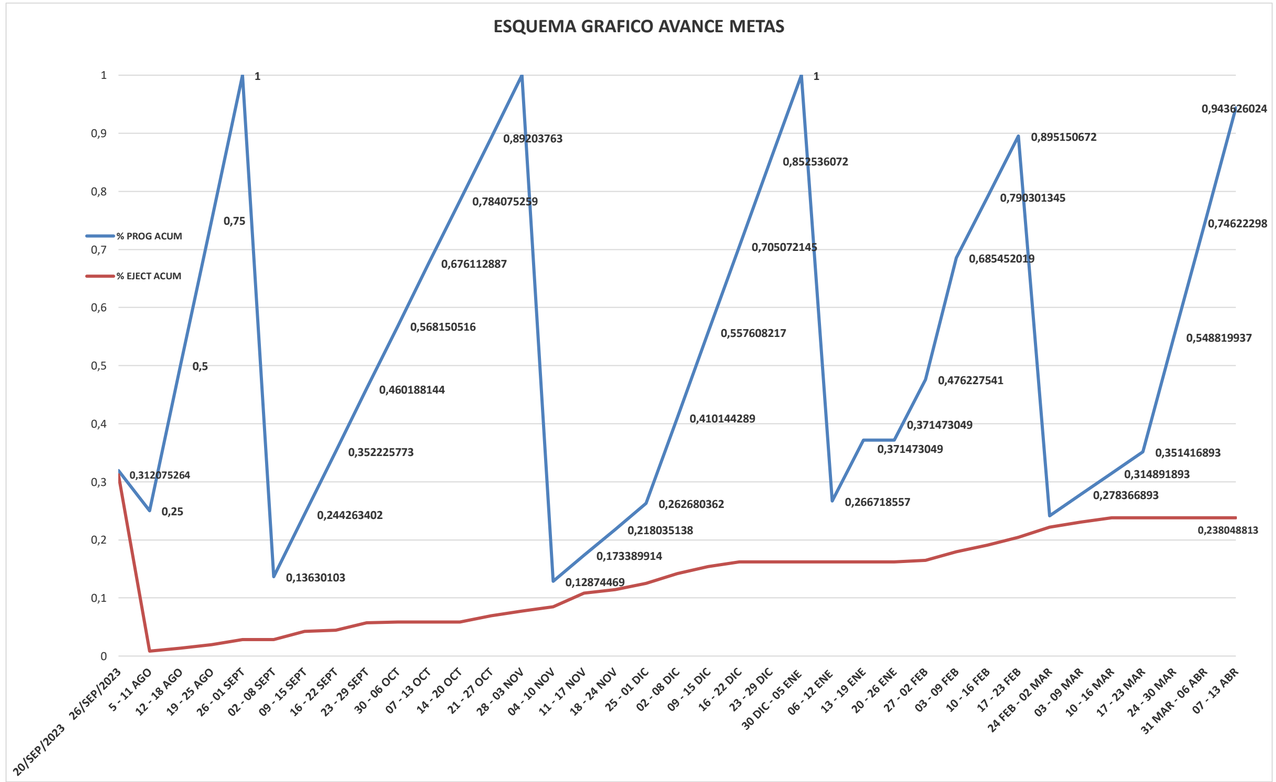

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
		FIRMA Alvaro Lara. NOMBRE: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO Matrícula Profesional No.: 52202-82168

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 28/08/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ — SEMANA No.: 73 (Numeración consecutiva) del 22/08/2023 al 28/08/2023 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTA — **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** CAMILO ALFONSO ESPINOSA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES EL MEJORAMIENTO DE 1.85 KM DE VÍA TERCIARIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS, JUNTO CON SUS OBRAS DE DRENAJES (CUNETAS) Y EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE 16.5 KM MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

PAVIMENTACIÓN MEDIANTE PLACA HUELLAS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE (CUNETAS) Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 NIT. 901.543.259-9			**INTERVENTOR:**	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3		
INTEGRANTES:	60% CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JYM S.A.S. / 40% SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EMCONSUT S.A.S.			**INTEGRANTES:**	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO		
CONTRATO No.	CLP-202105002-2021	**VALOR INICIAL:**	$ 2.767.505.806,00	**CONTRATO No.**	IP-DT-BOY-009-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 82.176.975,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2021	**VALOR ADICIONES:**		**FECHA DE INICIO:**	18/07/2023	**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/05/2022	**VALOR ACUMULADO:**	$ 2.767.505.806,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	17/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 82.176.975,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/12/2023	**VALOR ANTICIPO:**	$ 807.700.000,00	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	17/12/2023	**VALOR ANTICIPO:**	
		VALOR AMORTIZADO:				**VALOR AMORTIZADO:**	
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 807.700.000,00			**SALDO POR AMORTIZAR:**	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	$ 2.767.505.806,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 82.176.975,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA			$ 82.176.975,00	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2.660.288.332,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.510.317.301,10	94,36%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 633.278.481,00	23,80%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-$ 1.877.038.820,10	-70,56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 27.500.000,00	50,00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.510.317.301,10	94,36%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 633.278.481,00	23,80%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	-$ 1.877.038.820,10	-70,56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 525.149.013,27	19,740%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: NO SE HA FACTURADO NADA

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 82.176.975,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24.653.092,50	30,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.108.848,75	5,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.108.848,75	5,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 807.700.000,00
Amortizado $	
Saldo $	$ 807.700.000,00

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 94,36%

Meta Física Ejecutada % 23,80%

Avance o Atraso Físico % -70,56%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	CURVA MARCELINO	HOMERO 1	HOMERO 2	SAN PEDRO LA ESCUELA	MORATO	JUAN DURAN	TOTAL	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAVIMENTO CON PLACA HUELLA NO INCLUYE CUNETAS	KM	1,85	2023		Prog	79,88	91,00	66,91	270,10	91,50	127,95	727,34	39,32%	MOTONIVELADORA	1	
					Ejec	79,88	91,00	66,91	270,10	91,50	127,95	727,34	39,32%	VIBRO COMPACTADOR	1	
CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO REFORZADO	ML	3700	2023		Prog	159,76	182,00	133,82	540,20	183,00	255,90	1454,68	39,32%	RETRO EXCAVADORA	1	
					Ejec	159,76	182,00	133,82	540,20	183,00	255,90	1454,68	39,32%	VOLQUETA SENCILLA	2	
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	99000	2023		Prog									MEZCLADORA DE CONCRETO	4	
					Ejec											
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO	M3	402,36	2023		Prog											
					Ejec											
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	GL	1	2023		Prog											
					Ejec											
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA	GL	1	2023		Prog							1,00	50,00%			
					Ejec							1,00	50,00%			
														Total		
														Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: "CURVA MARCELINO"

TRAMO Y/O SECTOR 2: "HOMERO 1"

TRAMO Y/O SECTOR 3: "HOMERO 2"

TRAMO Y/O SECTOR 4: "SAN PEDRO LA ESCUELA"

TRAMO Y/O SECTOR 5: "MORATO"

TRAMO Y/O SECTOR 6: "JUAN DURAN"

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA EL TRIANGULO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	PAUNA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: APROBADO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSE RVACIONES: EL CONSORCIO AIRCPT 2021 SOLICITÓ EL CIERRE DEL PAGA A CORTE 17/04/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, POR LO CUAL SE REVISÓ EL PAGA POR ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO Y SE ENVIÓ NUEVAMENTE A LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL LA APROBACIÓN DEL MISMO.
SE REALIZAN INFORMES TRIMESTRALES.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A

AVALÚOS APROBADOS: N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


SE REALIZÓ ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN EN EL TERRENO, PARA DETERMINAR CANTIDADES DE OBRA ESTABLECIDAS EN LA PROYECCIÓN DEL ACTA PARCIAL No.1

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*SE PROGRAMA MESA TÉCNICA CON LOS PROFESIONALES QUE HACEN PARTE DEL CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021, PARA VERIFICAR Y DETERMINAR DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA PROYECCIÓN DE ACTA PARCIAL

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

A la fecha se tiene un avance programado en obra del 94,36 % teniendo en cuenta la reprogramación por prorroga 6 y presenta un avance ejecutado del 23,80 %, con un atraso del 70,56 %.
Ejecución en Agosto un solo tramo "Curva Marcelino" Tramo 1
Ejecución en Septiembre un solo tramo "Homero 1" Tramo 2
Ejecución en Octubre desde el 24 de Octubre un solo tramo " Homero 2" Tramo 3
Ejecución en Diciembre desde el 04 de Noviembre un solo tramo " San Pedro la Escuela" Tramo 4
Ejecución en Enero se encuentra suspendida, mediante acta de suspensión 1 desde el 31 de Diciembre de 2022, hasta el 09 de Enero de 2023.
Ejecución de actividades de Febrero se da terminación a la construcción de placa huella Tramo 5, "Morato".
Ejecucion de actividades mes de Marzo, se da terminación a la construcción de la placa huella tramo Juan Duran
Se suspenden actividades de obra mediante acta de Suspensión No.2 del 13 de abril de 2023

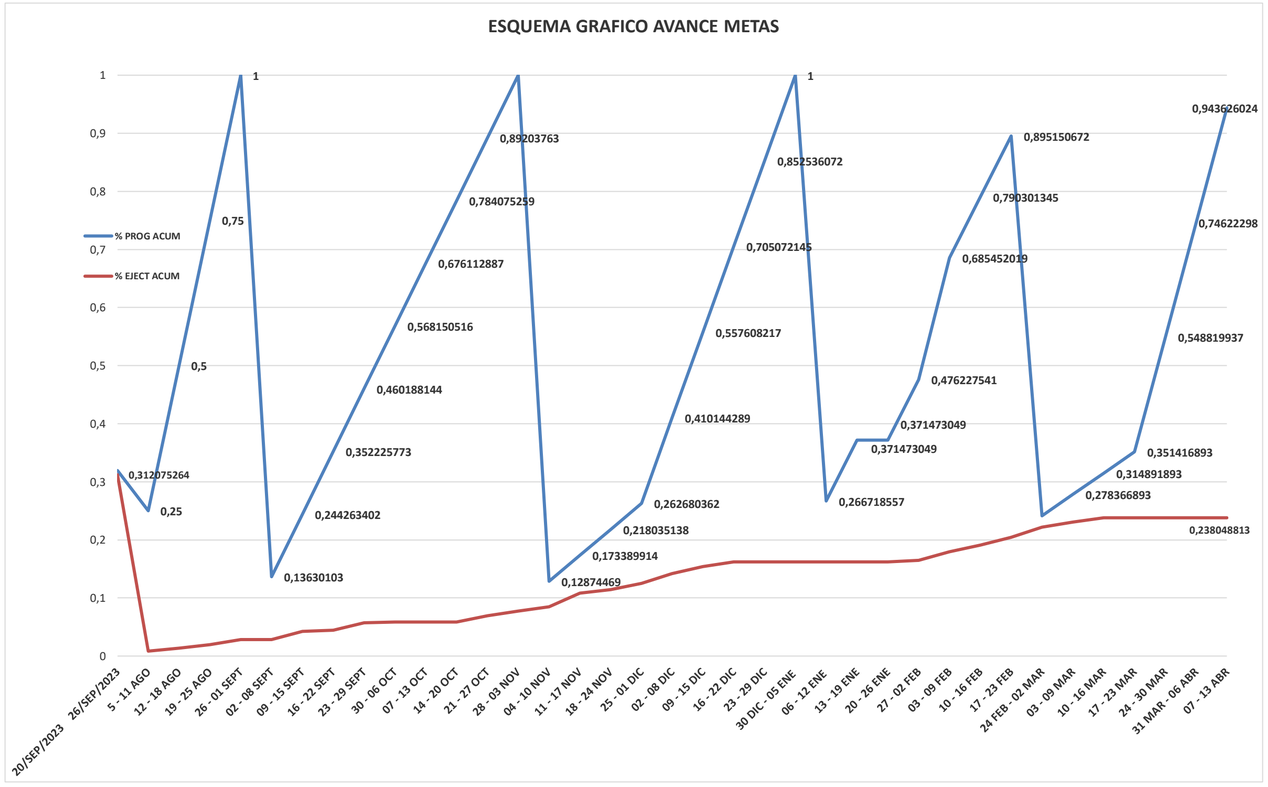

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
		FIRMA ALVAREZ LARA. NOMBRE: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO Matrícula Profesional No.: 52202-82168

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Para ver el control de maquinaria y equipo del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 del Manual de Interventoría del INVIAS, para el presente periodo la maquinaria se encontraba disponible pero inactiva por la suspensión de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 05/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2023

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

CONTRATO No. CLP-202105002-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 NIT. 901.543.259-9

CONTRATO INTERVENTORÍA No. IP-DT-BOY-009-2023

INTERVENTORÍA: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 670 CH		BVISTA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
VIBROCOMPACTADOR		10 TON.	BVISTA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
RETROEXCAVADORA		416	BVISTA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
VOLQUETA		7 M3	BVISTA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
VOLQUETA		7 M3	BVISTA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUSPENSIÓN				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150	100,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUSPENSIÓN = S	150	100,00%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. S=SUSPENSION CONTRATO**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): NO SE UTILIZÓ MAQUINARIA DEBIDO A QUE NO SE HA REINICIADO ACTIVIDADES DE OBRA FÍSICA EN EL TERRENO

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ERIC ALBERTO SANDOVAL GUTIERREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-303424 NTS

Firma
Nombre: NELSON GERARDO BRAVO PORTILLA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-185014 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3 Personal y Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Para ver el control de personal del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 del Manual de Interventoría del INVIAS, para el presente periodo no se encuentra personal de obra laborando.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 05/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: CLP-202105002-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 NIT. 901.543.259-9

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: IP-DT-BOY-009-2023 **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3

NOMBRE ARL: N.A. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** N.A.

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JHON RONAL VELANDIA ROMERO	80108028	RL / CONSORCIO																																						

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN POR LO CUAL NO TIENE PERSONAL VINCULADO

El contratista adjunta la certificación de fecha AGOSTO/2023 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:MANUEL PATARROLLO MALAGON
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-17776 CUND

Firma
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-82168

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Para ver el informe financiero y presupuestal del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 del Manual de Interventoría del INVIAS, se presenta la ejecución a la fecha, no se ha realizado pagos al contrato de obra por concepto de actas de corte.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 05/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: CLP-202105002-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 NIT. 901.543.259-9

MES INFORME MENSUAL: 31/08/2023

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: IP-DT-BOY-009-2023

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	202111033	2306010202		NACION	CLP-202105002-2021	$ 2.767.505.806	$ 2.767.505.806
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.767.505.806,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
	ANTICIPO	ene-22	$ 807.700.000,00	$ 0,00	$ 807.700.000,00			$ 807.700.000,00	202111033 de 2021	$ 1.959.805.806	$ 1.959.805.806				
TOTALES			**$ 807.700.000**	**$ 0**	**$ 807.700.000**	**$ 0**	**$ 0,00**			**$ -**	**$ -**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTA: AL MES DE JULIO DE 2023 NO SE HAN COBRADO ACTAS PARCIALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ANTICIPO	$ 807.700.000	$ -	**$ 807.700.000**
*			**$ 0**
*			**$ 0**
*			**$ 0**
*			**$ 0**
*			**$ 0**
*			
VALOR TOTAL	$ 807.700.000	$ 0	**$ 807.700.000**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MANUEL PATARROLLO MALAGON
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:25202-17776 CUND

Firma
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-82168

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 Estado General del Tiempo

Para ver el informe del estado general del tiempo del contrato se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 del Manual de Interventoría del INVIAS, en el periodo de ejecución no se desarrollaron actividades de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 05/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: CLP-202105002-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 NIT. 901.543.259-9

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: IP-DT-BOY-009-2023 **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
Seco	24	24	24	24	24	22	22	24	24	24	24	24	24	22	24	21	24	23	18	23	16	24	24	18	24	24	24	24	24	24	689
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	2	1	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	19
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	12
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: ERIC ALBERTO SANDOVAL GUTIERREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:68202-095264 NTS

Firma
Nombre: NELSON GERARDO BRAVO PORTILLA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-185014 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Codigo Estacion	Nombre Estacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	Area Operativa	Departamento	Municipio	Fecha Instalacion	Fecha Suspension	Id Parametro	Etiqueta	Descripcion Serie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Calificador	Nivel Aprobacion
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	01/08/2023 0:00	0	50		900
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	02/08/2023 0:00	0	50		900
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	03/08/2023 0:00	0	50		900
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	04/08/2023 0:00	0	50		900
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	05/08/2023 0:00	0	50		900
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	06/08/2023 0:00	0.5	50		900
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	07/08/2023 0:00	0.3	50		900
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	08/08/2023 0:00	0	50		900
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	09/08/2023 0:00	0	50		900
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/08/2023 0:00	0	50		900
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/08/2023 0:00	0	50		900
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/08/2023 0:00	0	50		900
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/08/2023 0:00	0	50		900
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/08/2023 0:00	0.3	50		900
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/08/2023 0:00	0	50		900
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/08/2023 0:00	4	50		900
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/08/2023 0:00	0	50		900
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/08/2023 0:00	1.5	50		900
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/08/2023 0:00	13	50		900
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/08/2023 0:00	1	50		900
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/08/2023 0:00	52.7	50		900
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/08/2023 0:00	0	50		900
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/08/2023 0:00	0	50		900

23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/08/2023 0:00	0	50		900	
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/08/2023 0:00	0	50		900	
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/08/2023 0:00	0	50		900	
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/08/2023 0:00	0	50		900	
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/08/2023 0:00	0	50		900	
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/08/2023 0:00	0	50		900	
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	30/08/2023 0:00	0	50		900	
23125100	BUENAVISTA [23125100]	55.149.166.670	-7.394.311.111	2200	ClimÃ¡tica Principal	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 06 - BoyacÃ¡-Casanare-Vichada	BoyacÃ¡	Buenavista	15/11/1993 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	31/08/2023 0:00	0	50		900	

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Para ver el informe del resumen de ensayos de laboratorio se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del Manual de Interventoría del INVIAS, para el presente periodo no hay seguimiento debido a la suspensión del contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1

FECHA: 05/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No.: CLP-202105002-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 NIT. 901.543.259-9

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: IP-DT-BOY-009-2023 **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	29/09/2023	Granulometrías, Límites, Proctor	INVE	Materila Base granular	3		PRODUCTO CONFORME	SI	

OBSERVACIONES:

EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre:MANUEL PATARROLLO MALAGON
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-17776 CND

Firma

Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-82168 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Para ver el informe de seguimiento de garantías y seguros del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 del Manual de Interventoría del INVIAS, se relacionan las garantías a la fecha del presente informe.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA	5	9	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No. CLP-202105002-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: 30/12/2021

PLAZO INICIAL: 5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/04/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.767.505.806,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.767.505.806,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 77.882.470,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 77.882.470,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1981-2023 **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 276.750.581	30	12	2021	30	11	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100,00%	$ 807.700.000	30	12	2021	30	11	2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 553.501.161	30	12	2021	30	5	2025
Calidad del servicio	0,60%	$ 16.500.000	30	12	2021	30	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 830.251.742	30	12	2021	30	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101001649

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 08/02/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	13,13%	$ 363.410.400	30	12	2021	30	5	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 57-40-101000629 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 08/02/2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA	5 (Día)	9 (Mes)	2023 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 6 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 276.750.581	30	12	2023	30	9	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100,00%	$ 807.700.000	30	12	2021	30	9	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 553.501.161	30	12	2021	5	5	2026
Calidad del servicio	0,60%	$ 16.500.000	30	12	2021	30	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 830.251.742	30	12	2021	30	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101001649

Certificado de modificación o anexo No.: 14
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 08/03/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	13,13%	$ 363.410.400	30	12	2021	30	4	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 57-40-101000629 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 08/03/2023

OBSERVACIONES:

LA ÚLTIMA GARANTÍA APROBADA A LA FECHA ES LA DE PRÓRROGA N 6, EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-82168 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-44-101001649	14

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	03	2023	30	12	2021	00:00	30	12	2026	23:59	ANULACION DE ANEXO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021		NIT: 901.543.259-9
DIRECCIÓN: CR 29 NRO. 16 - 34	CIUDAD: ARAUCA, ARAUCA	TELÉFONO:	3165783210

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE BUENAVISTA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2		NIT: 891.808.260-0
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 4 - 44	CIUDAD: BUENAVISTA, BOYACA	TELÉFONO	7265631

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES CONTRACTUALES SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA N CLP-202105002 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL.

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA OPERA CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA CUAL LA ENTIDAD ESTATAL RECIBE A SATISFACCION LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/09/2023	30/09/2023	$276,750,580.60	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/12/2021	30/09/2023	$807,700,000.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2021	05/05/2026	$553,501,161.20	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/12/2021	30/12/2026	$830,251,741.80	
CALIDAD DEL SERVICIO	30/12/2021	30/12/2026	$16,500,000.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE SE ANULA EL ANEXO NO. 13, YA QUE ESTA COBRANDO UNA PRIMA MUY ALTA QUE NO CORRESPONDE A ESTE MOVIMIENTO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(8,836,656.00)	$ *****(8,000.00)	$ *(1,680,484.00)	$ ******(10,525,141.00)	$ **(2,484,703,483.60)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA	153990	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-44-101001649

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-40-101000629	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	03	2023	30	12	2021	00:00	30	04	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021		NIT: 901.543.259-9
DIRECCIÓN: CR 29 NRO. 16 - 34	CIUDAD: ARAUCA, ARAUCA	TELÉFONO:	3165783210

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE BUENAVISTA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2		NIT: 891.808.260-0
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 4 - 44	CIUDAD: BUENAVISTA, BOYACA	TELÉFONO	7265631
BENEFICIARIO:	891808260 - MUNICIPIO DE BUENAVISTA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N 202105002 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA - COLOMBIA RURAL

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**30/12/2021**	**30/04/2023**	**$363,410,400.00**	**$363,410,400.00**

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA SEGUN PRORROGA N 006 FIRMADA EL 28 DE FEBRERO DE 2023 ASI:
TIEMPO EN PRORROGA N 06 = UN (1.5) MES Y MEDIO
FECHA DE TERMINACION SEGUN PRORROGA N 06 = 15 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE PRORROGA FEBRERO 28 DE 2023.
TODO LO DEMAS NO MODIFICADO CONTINUA VIGENTE

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******91,599.00	$ *******3,000.00	$ ******17,973.00	$ **********112,573.00	$ ******363,410,400.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA	153990	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-40-101000629

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Para ver el informe de seguimiento al plan de calidad del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 del Manual de Interventoría del INVIAS, para el presente periodo no se realiza seguimiento de calidad por la suspensión de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 05/09/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No. CLP-202105002-2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUVIAL RURAL MUZO

FECHA DE INICIO: 30/12/2021 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 5 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/04/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: IP-DT-BOY-009-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO NIT. 18.127.171-3

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X N --------- APROBADO: SI X NO ----- VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: 27/01/2022

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI --------- N ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI --------- N ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ----- N --------- APROBADO: SI ----- N ----- FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 1 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 3

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ----- N -----

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: .....

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: .....

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: .....

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: .....

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: .....

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: .....

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: .....

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: .....

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: .....

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: .....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Manuel Patarroyo Malagón	Nombre:	Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-17776 CUND	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 52202-82168	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

El anticipo de obra fue girado con el acta de inicio por un valor de $807.700.000, del cual esta interventoría recibió el contrato con un anticipo girado por valor de $432.407.764.

A la fecha el contrato se encuentra en suspensión, por lo cual no se tiene solicitudes de inversión de anticipo, se anexa informe formato MEPI-MN1-IN-2-FR-2.

Se relaciona información del estado actual del anticipo.

En relación a la cuenta convenio a cargo del Municipio de Buenavista Boyacá se relaciona los rendimientos devueltos por la entidad a corte abril de 2023, se anexa extracto bancario del mes de agosto de 2023.

DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA DEVOLUCIÓN
Descuentos	$13.277,35	23/05/2022
Rendimientos julio 2021 a abril 2022	$1.310.294,35	29/06/2022
Rendimientos julio 2021 a abril 2022 repetidos	$1.310.294,35	13/10/2022
Rendimientos mayo de 2022 a agosto 2022	$1.822.485,02	24/10/2022
Rendimientos septiembre de 2022 hasta abril 2023	$2.445.993,24	29/05/2023
TOTAL	$6.889.066,96	

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 35500000387

SUCURSAL SIMIJACA

CORREDOR VIAL MUNICIPIO DE BUENAVISTA

CL 4 4 44

BUENAVISTA (BOYACA) BOYACA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	2,078,722,466.25	*SALDO PROMEDIO*	$	2,078,896,127
TOTAL ABONOS	$	480,730.83	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	2,079,203,197.08	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/08	ABONO INTERESES CUENTA CTE			91,123.79	2,078,813,590.04
9/08	PAGO DE PROV PA FIDU BANCOLO			127,587.82	2,078,941,177.86
31/08	ABONO INTERESES CUENTA CTE			262,019.22	2,079,203,197.08
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2 .

FECHA: 05/09/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2 **MES:** AGOSTO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. CLP 202105002 DE 2021
(Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 14725 **DE** 2021 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 31700002004 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: 317
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 29,19 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 807.700.000,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA , DEPARTAMENTO DE BOYACA- COLOMBIA RURAL "

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1981 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
PROFORMA	1	23-may-22	AGREGADOS EL TRIANGULO SAS	$ 100.000.000,00	1	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA	FEI 11728	31-may-22	COMERCIALIZADORA EL IMPERIO	$ 59.963.235,00	1	COMPRA DE MATERIALES
PROFORMA	2036567322	11-jun-22	ACERIA PAZ DEL RIO	$ 188.496.000,00	1	COMPRA DE MATERIALES
PROFORMA	CT1 13	24-jun-22	COMERCIALIZADORA EL IMPERIO	$ 83.948.529,00	1	COMPRA DE MATERIALES
				$ 432.407.764,00		

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	COMPRA DE MATERIALES	$ 532.408.364,00	$ 432.407.764,00	$ -	$ 432.407.764,00	$ 100.000.600,00
2	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 275.291.636,00	$ -	$ -	$ -	$ 275.291.636,00
	TOTALES	$ 807.700.000,00	$ 432.407.764,00	$ -	$ 432.407.764,00	$ 375.292.236,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (JUNIO) : $ 127.587,82
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 2.971.431,51
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
EXTRACTO FEBRERO 2022		$ 11.042,25	feb-22	11/03/2022	$ 11.042,25
EXTRACTO MARZO 2022		$ 342.381,44	mar-22	12/04/2022	$ 353.423,69
EXTRACTO ABRIL 2022		$ 331.417,21	abr-22	13/05/2022	$ 684.840,90
EXTRACTO MAYO 2022		$ 342.433,39	may-22	09/06/2022	$ 1.027.274,29
EXTRACTO JUNIO 2022		$ 281.080,48	jun-22	14/07/2022	$ 1.308.354,77
EXTRACTO JULIO 2022		$ 160.846,50	jul-22	09/08/2022	$ 1.469.201,27
EXTRACTO AGOSTO 2022		$ 127.590,20	ago-22	08/09/2022	$ 1.596.791,47
EXTRACTO SEPTIEMBRE 2022		$ 123.469,70	sep-22	07/10/2022	$ 1.720.261,17
EXTRACTO OCTUBRE 2022		$ 127.583,90	oct-22	08/11/2022	$ 1.847.845,07
EXTRACTO NOVIEMBRE 2022		$ 123.469,40	nov-22	12/12/2022	$ 1.971.314,47
EXTRACTO DICIEMBRE 2022		$ 127.590,37	dic-22	12/01/2023	$ 2.098.904,84

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2 .

FECHA 05/09/2023
(Día / Mes / Año)

EXTRACTO ENERO 2023		$	127.590,71	ene-23	07/02/2023	$ 2.226.495,55
EXTRACTO FEBRERO 2023		$	115.235,68	feb-23	06/03/2023	$ 2.341.731,23
EXTRACTO MARZO 2023		$	127.581,32	mar-23	05/04/2023	$ 2.469.312,55
EXTRACTO ABRIL 2023		$	123.464,32	abr-23	08/05/2023	$ 2.592.776,87
EXTRACTO MAYO 2023		$	127.590,62	may-23	09/06/2023	$ 2.720.367,49
EXTRACTO JUNIO 2023		$	123.476,20	jun-23	06/09/2023	$ 2.843.843,69
EXTRACTO JULIO 2023		$	127.587,82	jul-23	09/08/2023	$ 2.971.431,51

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: Jhon Ronal Velandia Romero
Representante Legal o Delegado
Contratista
Cedula de ciudadania No.: 80.180.028 de Bogotá

Firma:
Nombre: Alvaro Fernando Lara Zambrano
Representante Legal o Delegado
Interventor
Cedula de ciudadania No.: 18.127.171 de Mocoa

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Grupo Bancolombia Capital

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.

P.A. ANT CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 (14725)

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE MAYO DE 2023

Grupo Bancolombia Confidencial - Externos

P.A. ANT CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

CONTENIDO

1. DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO 3
2. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO 4
3. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACION DE LOS BIENES 4
4. EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINIISTRADOS EN EL FIDEICOMISO 4
5. COMISIÓN FIDUCIARIA 6
6. EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO 7
7. HECHOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO 7
8. DISPONIBLE 7
9. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS 7
10. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADOS DE GARANTIAS 8
11. CESION DE BENEFICIOS 8
12. CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS 8
13. OTROS 8
14. ANEXOS 8
14.1.PAGOS/GIROS O ABONOS EN CUENTA 8
14.2.ESTADOS FINANCIEROS 8
14.3.EXTRACTOS 8

Confidencial

Grupo Bancolombia Confidencial - Externos

P.A. ANT CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

Circular básica jurídica
Superintendencia Financiera de Colombia

A continuación, se presenta la siguiente rendición semestral de cuentas:

1. DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

PERÍODO	:	Del 1 de diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2023
FIDEICOMISO	:	P.A. ANT CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021
TIPO DE CONTRATO	:	Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pago para el manejo de anticipos.
FIDEICOMITENTE	:	SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EMCONSUT S.A.S (40,0%) CONSTRUCTORES & CONSULTORES JYM S.A.S. (60,0%)
BENEFICIARIOS	:	En primera instancia lo es la parte FIDEICOMITENTE en cuyo nombre se realizan los pagos a los terceros instruidos por este en cumplimiento de lo previsto en el contrato, así como respecto de los giros que se autorizaron a su favor por concepto de desembolso y de los excedentes que le correspondían a la terminación del contrato fiduciario. En segunda instancia lo es MUNICIPIO DE BUENA VISTA entidad estatal exclusivamente en el evento en que la FIDUCIARIA transfiera los remanentes de los recursos del PATRIMONIO AUTÓNOMO, cuando la ENTIDAD ESTATAL lo comunique a la FIDUCIARIA por escrito.
FECHA DE INICIO	:	17 de Diciembre de 2021.
DURACIÓN	:	La duración del contrato es hasta el cumplimiento de su finalidad o hasta que se presentara alguna de las causales de terminación del mismo.
CONTRATO DE OBRA	:	Contrato de obra No. CLP-202105002 del 01 de diciembre de 2021 suscrito entre el fideicomitente y la entidad contratante.
INTERVENTOR	:	JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Confidencial

Grupo Bancolombia Confidencial - Externos

2. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la constitución de un patrimonio autónomo separado e independiente de los patrimonios de las partes que intervienen en el contrato, el cual actúa con plenos efectos jurídicos mediante vocería que del mismo ejerce la fiduciaria.

Los bienes que conforman el Patrimonio Autónomo se mantienen separados del resto de los activos de la fiduciaria y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, incluidos aquellos que existen o lleguen a existir entre las mismas partes respecto de otros bienes, a través del cual se realizan las actividades señaladas en la cláusula de finalidad del contrato fiduciario.

De acuerdo con lo anterior la finalidad del contrato de fiducia mercantil: (a) la transferencia por parte del Fideicomitente a la Fiduciaria de los recursos recibidos por concepto de anticipo, a título de fiducia mercantil. estos recursos son girados directamente por parte de la entidad estatal a la fiduciaria; (b) la administración de los recursos recibidos de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato y (c) la realización de los pagos ordenados por el fideicomitente con la aprobación del interventor y/o supervisor del contrato estatal,(d) la transferencia a la entidad estatal por parte de la fiduciaria de los recursos entregados por concepto de anticipo así como sus remanentes cuando la entidad estatal así lo solicite por escrito.

3. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACION DE LOS BIENES

A fecha de corte de la presente rendición semestral de cuentas, el fideicomiso se encuentra vigente.

Los bienes fideicomitidos se encuentran ubicados en la siguiente cuenta:

- Cuenta de ahorros en BANCOLOMBIA S.A No. 317-000020-04
- La totalidad de los recursos presentes o futuros provenientes del ANTICIPO del contrato estatal que la entidad estatal gira por cuenta del Fideicomitente al Patrimonio autónomo.
- Los recursos adicionales que el Fideicomitente reciba como ANTICIPO.
- Los demás recursos que aporte el Fideicomitente para atender el pago de la comisión fiduciaria, los gastos del contrato de fiducia mercantil o el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) ocasionados por la disposición de recursos desde el Patrimonio Autónomo.
- Los rendimientos que generen los recursos que constituyeron el ANTICIPO y los demás recursos que hagan parte del Patrimonio Autónomo.

4. EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINIISTRADOS EN EL FIDEICOMISO

4.1. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES

Confidencial

Grupo Bancolombia Confidencial - Externos

Aportes	Valor
Saldo inicial al 1 de Diciembre de 2022	$ 378,137,758.99
Aportes reintegro de gastos	$ 20,000.00
Saldo final al 31 de Mayo de 2023	$ 378,157,758.99

A continuación, se presenta la situación de los recursos administrados al cierre del periodo citado:

4.2. FUENTES Y USOS

A continuación, se detallan los movimientos realizados en las cuentas del fideicomiso durante el período objeto de rendición de cuentas, así como los rendimientos generados por los recursos invertidos en la cuenta de ahorros y el saldo disponible en la cuenta:

Cuenta Bancaria: 31700002004	Emisor: BANCOLOMBIA S.A
Tipo de ingreso / egreso	**Total**
RENDIMIENTOS	$ 749,053.02
INGRESOS EN DINERO	$ 20,000.00
GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	-$ 2,979.70
PAGO A PROVE MUNICIPIO DE BUENAVISTA	-$ 744,931.80
Total ingresos	**$ 769,053.02**
Total egresos	**-$ 747,911.50**
Saldo inicial	**$ 376,528,315.02**
Saldo Final	**$ 376,549,456.54**

Nota: Es importante mencionar que los datos detallados de los Flujos de caja se encuentran relacionados en el anexo **No. 14.3.**

4.3. PAGOS/GIROS O ABONOS EN CUENTA

Durante el período objeto de la presente rendición semestral de cuentas se registran pagos realizados a través traslados ACH y traslados a cuentas Bancolombia los cuales se relacionan en el anexo **No. 14.1** Informe ingresos y egresos.

4.4. CUENTAS POR PAGAR

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas los estados financieros del Fideicomiso no reflejan cuentas por pagar.

4.5. CUENTAS POR COBRAR

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas los estados financieros del Fideicomiso no reflejan cuentas por cobrar.

Confidencial

Grupo Bancolombia Confidencial - Externos

4.6. RENDIMIENTOS GENERADOS

Durante el corte de la presente rendición semestral los rendimientos financieros generados fueron girados a la cuenta corriente No. 355-000003-87de BANCOLOMBIA a nombre de MUNICIPIO DE BUENAVISTA tal como se detalla a continuación:

Periodo	Beneficiario	Rendimientos generados	Fecha de pago	Rendimientos pagados	Mecanismos de pago
dic-22	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	$ 127,590.37		$ 127,590.37	ACH
ene-23		$ 127,590.71		$ 127,590.71	
feb-23		$ 115,235.68		$ 115,235.68	
mar-23		$ 127,581.32		$ 127,581.32	
abr-23		$ 123,464.32		$ 123,464.32	
may-23		$ 127,590.62	Pendiente		
Total rendimientos		**$ 749,053.02**		**$ 621,462.40**	

5. COMISIÓN FIDUCIARIA

De acuerdo con lo estipulado en el Contrato Fiduciario, se causa una comisión equivalente a UNO PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES (1.5), correspondiente a la comisión por la administración del fideicomiso, esta se liquida y paga mes vencido dentro de los cinco (5) primeros días del siguiente mes al de su causación. Cubre DOS (02) recaudos y SIETE (07) transferencias de recursos mensuales. Cada recaudo adicional tiene un costo de QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($15,950.00) y cada transferencia adicional tiene un costo de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($29.950.00)

Durante el período correspondiente a la presente rendición semestral de cuentas, se causaron las siguientes comisiones fiduciarias:

Comisión fiduciaria					
Fecha	**No. Factura**	**Valor Base**	**Iva**	**Total**	**Estado**
dic-22	CS 2024390755	$ 1,500,000.00	$ 285,000.00	$ 1,785,000.00	PENDIENTE
mar-23	FE 434279	$ 1,500,000.00	$ 285,000.00	$ 1,785,000.00	
mar-23	FE 434278	$ 1,500,000.00	$ 285,000.00	$ 1,785,000.00	
mar-23	FE 434277	$ 1,500,000.00	$ 285,000.00	$ 1,785,000.00	
may-23	CS 2024402305	$ 812,000.00	$ 154,280.00	$ 966,280.00	
may-23	CS 2024402304	$ 812,000.00	$ 154,280.00	$ 966,280.00	
may-23	CS 2024402303	$ 812,000.00	$ 154,280.00	$ 966,280.00	
may-23	CS 2024402302	$ 812,000.00	$ 154,280.00	$ 966,280.00	
may-23	CS 2024404507	$ 1,740,000.00	$ 330,600.00	$ 2,070,600.00	
Total		**$ 10,988,000.00**	**$ 2,087,720.00**	**$ 13,075,720.00**	

A fecha corte de la presente rendición semestral de cuentas, los fideicomitentes adeudan la suma de **$ 23,785,720.00** (incluido IVA).

Confidencial

Grupo Bancolombia Confidencial - Externos

Desde la suscripción del contrato fiduciario y con corte a la presente rendición semestral de cuentas, el valor de las comisiones causadas incluido IVA, es de **$ 29.497.720,00**

6. EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO

6.1. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

Durante el periodo objeto de la presente rendición se realizaron las siguientes actividades, las cuales dan cumplimiento a lo establecido contractualmente:

- En cumplimiento de la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera, la fiduciaria remitió mediante correos electrónicos de 23 de junio de 2023, la Fiduciaria remitió a los Fideicomitentes, la rendición de cuentas del periodo comprendido entre el junio a noviembre de 2022.

- El 5 de mayo de 2023, se anularon las facturas de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2023.

6.2. GESTIÓN DE LA FIDUCIARIA

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Tercera del contrato fiduciario, Fiduciaria Bancolombia S.A., atendió las obligaciones contenidas en dicha cláusula y en las demás del contrato, realizando todos los actos necesarios para la completa ejecución del objeto del contrato fiduciario, conforme a las instrucciones contenidas en el mismo.

7. HECHOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO

Durante la vigencia del fideicomiso no se presentaron hechos o situaciones que impidieran el normal desarrollo del mismo y que retardarán o pudieran retardar de manera sustancial su ejecución y/o terminación, de suerte que comprometieran seriamente el logro de los objetivos perseguidos.

8. DISPONIBLE

8.1 PARTIDAS CONCILIATORIAS

A fecha de corte de la presente rendición semestral de cuentas, no existen partidas conciliatorias.

9. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el período de la presente rendición semestral de cuentas no se presentaron procesos, quejas o reclamos.

Confidencial

Grupo Bancolombia Confidencial - Externos

10. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADOS DE GARANTIAS

Este Fideicomiso no tiene acreedores garantizados.

11. CESION DE BENEFICIOS

Durante el período objeto de la presente rendición semestral no se presentaron cesiones de ninguna clase.

12. CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS

El fideicomiso no presentó condiciones suspensivas o resolutorias.

13. OTROS

13.1. ACTUALIZACION SARLAFT

Dando cumplimiento al requerimiento de la Superintendencia Financiera, que establece la obligatoriedad de actualizar la información de los clientes por lo menos una vez al año, nos permitimos informar que los fideicomitentes si contaron con su información actualizada al corte de la presente rendición semestral de cuentas.

13.2. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL

El contrato fiduciario no establece órganos de administración y/o control para el negocio.

14. ANEXOS

14.1. PAGOS/GIROS O ABONOS EN CUENTA

14.2. ESTADOS FINANCIEROS

14.3. EXTRACTOS

Confidencial

Grupo Bancolombia Capital

Cualquier inquietud u observación relacionada con la presente rendición de cuentas, con gusto será atendida directamente a través de nuestra(o) Gerente Administración Negocios Fiduciarios Luis Guillermo Castañeda Sepulveda, a quien pueden contactar al correo electrónico: lugucast@Bancolombia.com.co

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la presente rendición de cuentas, no hemos recibido observaciones sobre el particular, se entenderá que la misma ha sido aceptada y aprobada, sin que con ello se limite el derecho que les asiste de presentar quejas o reclamos.

En desarrollo de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2281 de 2010, las Sociedades Fiduciarias deben contar con un Defensor del Consumidor Financiero. En este sentido y con el propósito de garantizar un servicio eficiente, transparencia y una mejor asesoría a nuestros clientes, FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. cuenta con la figura del Defensor del Consumidor Financiero.

Para nuestra Fiduciaria esta función la desempeña el Dr. Juan Fernando Celi Múnera, quien es abogado de la UPB, con una amplia trayectoria en el sector financiero. Lo acompaña en el cargo de Defensor Suplente la Dra. Liliana Otero Alvarez, abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en derecho procesal de la misma Universidad y Magister de la Universidad de Turín en Italia, quien reemplazará al Dr. Celi en sus faltas absolutas o temporales.

Las quejas relacionadas con posibles incumplimientos por parte de la Sociedad Fiduciaria de las normas legales o intemas que rigen el desarrollo o ejecución de los servicios o productos que ofrecemos o prestamos o respecto de la calidad de los mismos pueden ser dirigidas al Defensor del Consumidor a través de la dirección electrónica defensor@bancolombia.com.co o dirigiendo la petición por escrito a la dirección Carrera 43 A # 1-188 oficina 709 Medellín; a través de las líneas telefónicas 604 3211586, o a través de la línea gratuita 01 8000 522622

Atentamente

Gustavo Eduardo Gaviria Trujillo
Representante legal suplente
Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria.

VIGILADO

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)

P.A. ANT CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVIS
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2023/05/31 HASTA 2023/06/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 317-000020-04
317 SUCURSAL ARAUCA

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	***$***	376,549,456.54	***SALDO PROMEDIO***	***$***	376,483,780
TOTAL ABONOS	***$***	123,476.20	***CUENTAS X COBRAR***	***$***	.00
TOTAL CARGOS	***$***	128,100.98	***VALOR INTERESES***	***$***	123,476.20
SALDO ACTUAL	***$***	376,544,831.76	***RETEFUENTE***	***$***	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
8/06	ABONO INTERESES AHORROS			32,931.24	376,582,387.78
9/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-510.36	376,581,877.42
9/06	PAGO A PROVE MUNICIPIO DE BU			-127,590.62	376,454,286.80
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			90,544.96	376,544,831.76
	FIN ESTADO CUENTA				

4.9.2 Seguimiento Programa de Obra

A la fecha el contrato se encuentra en suspensión por lo cual las actividades de obra se deben reprogramar cuando el mismo reinicie.

4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones

Para el seguimiento al Programa de Inversiones se diligencian los formatos MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2 del Manual de Interventoría de INVIAS, para el presente informe no se encuentra ejecución del mismo, ya que se encuentra suspendido el contrato.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	05/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

PROGRAMA DE INVERSIONES ■

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. ■ 6
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: CLP - 202105002 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ -COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1981 DE 2023 **INTERVENTOR:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: QUINCE (15) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/04/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 13/04/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **2.767.505.806,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **2.767.505.806,00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		1 30 diciembre de 2021	2 ene-22	3 feb-22	4 mar-22	5 abr-22	6 may-22	7 jun-22 Reprogramación No.1	8 jul-22	9 ago-22 Reprogramación No.2	10 sep-22 Reprogramación No.3	11 oct-22	12 nov-22 Reprogramación No.4	13 dic-22	14 ene-23 Reprogramación No.5	15 feb-23	16 mar-23 Reprogramación No.6	17 abr-23	18 may-23	19 jun-23	20 jul-23	
				% Programado																						100%
				$ Valor programado																						
				$ Valor Ejecutado																						
				%Ejecutado																						
ITEM No. 1 Subbase granular clase C (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$176.925.012	6,65%	4,94%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	2,66%	3,99%	0,00%	2,00%	4,66%	0,51%	0,43%	5,71%	1,13%	4,52%	0,21%	4,03%	0,76%	3,05%					
			$131.428.869	$ P				$70.770.005	$106.155.007		$53.077.504	$123.847.508	$13.633.995	$11.430.371	$151.860.646	$30.068.072	$120.272.286	$5.636.646	$107.096.270	$20.304.666	$81.218.662					
				$ E									$3.323.556	$10.347.165	$7.113.033	$18.801.721	$18.803.721	$2.241.018	$1.997.670	$25.007.155	$0					
ITEM No. 2 Sello de juntas (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$29.138.225	1,10%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,88%	0,16%	0,93%	0,07%	0,95%	0,22%	0,22%	0,88%	0,00%	1,10%	0,00%	1,10%					90%
			$0	$ P					$5.827.645	$23.310.580	$4.370.734	$24.767.491	$1.900.095	$1.906.669	$25.331.461	$5.827.645	$23.310.580		$29.138.225		$29.138.225					
				$ E									$0	$0	$0	$0	$0				$0					
ITEM No. 3 Excavaciones varias sin clasificar (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$35.556.623	1,34%	0,21%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,53%	0,80%	0,00%	0,40%	0,94%	0,02%	0,09%	1,23%	0,26%	1,04%	0,06%	1,20%	0,25%	1,00%					80%
			$5.491.580	$ P				$14.222.649	$21.333.974		$10.666.987	$24.889.636	$448.584	$2.457.563	$32.650.476	$6.920.374	$27.681.495	$1.680.870	$31.936.535	$6.666.922	$26.667.688					
				$ E									$201.558	$269.667	$303.400	$422.232	$402.232	$50.550	$220.230	$3.200.567	$0					
ITEM No. 4 Concreto resistencia 21MPa (D) (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$512.447.736	19,26%	7,72%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	7,71%	5,78%	5,78%	5,78%	13,48%	1,26%	1,26%	16,75%	3,35%	13,39%	0,70%	13,25%	2,62%	19,50%					70%
			$205.277.029	$ P				$204.979.094	$153.734.321	$153.734.321	$153.734.321	$358.713.415	$33.396.873	$33.533.560	$445.017.303	$89.061.548	$356.246.194	$18.564.087	$352.527.446	$69.614.965	$270.259.859					
				$ E									$2.810.830	$3.503.818	$1.930.818	$1.400%	$1.400%	$0.170	$0.660	$1.586	$0.000					
ITEM No. 5 Concreto Resistencia 21 MPa (G) (Ciclopeo) (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$258.609.532	9,72%	3,48%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	1,94%	3,89%	3,89%	2,92%	6,88%	0,36%	0,66%	8,71%	1,77%	7,06%	0,37%	7,06%	1,42%	5,09%					60%
			$92.593.529	$ P				$51.721.906	$103.443.813	$103.443.813	$77.582.860	$181.226.672	$9.477.358	$17.439.252	$231.692.822	$46.954.660	$187.818.640	$9.885.352	$187.821.691	$37.818.454	$151.673.818					
				$ E									$0.270	$0.460	$0.170	$0.700	$0.700	$0.090	$0.290	$0.870	$0.000					
ITEM No. 6 Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$445.892.261	16,76%	4,65%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	6,70%	6,70%	3,35%	5,03%	11,73%	0,80%	1,12%	14,18%	3,04%	12,17%	0,68%	12,84%	2,66%	14,41%					50%
			$123.611.487	$ P				$178.356.904	$178.356.904	$89.178.452	$133.767.678	$312.124.583	$21.166.906	$29.730.775	$394.564.581	$80.956.200	$323.824.798	$17.973.595	$341.798.301	$69.214.791	$276.859.163					
				$ E									$14.287.126	$15.900.188	$11.023.949	$22.654.551	$22.654.551	$2.679.588	$10.728.354	$23.703.180	$0					
ITEM No. 7 Subbase granular clase C (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$47.260.100	1,78%	1,20%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,89%	0,89%	0,71%	1,07%	0,16%	0,11%	1,60%	0,31%	1,23%	0,06%	1,14%	0,22%	0,88%					40%
			$31.942.776	$ P					$23.630.050	$23.630.050	$18.904.040	$28.356.060	$4.209.398	$3.013.549	$40.597.153	$8.155.597	$32.622.388	$1.602.634	$30.450.041	$5.924.590	$23.298.381					
				$ E									$0.090	$0.100	$0.050	$0.160	$0.160	$0.020	$0.090	$0.520	$0.000					
ITEM No. 8 Excavaciones varias en material comun en seco (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$13.571.600	0,51%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,00%	0,51%	0,00%	0,00%	0,04%	0,47%	0,10%	0,41%	0,03%	0,48%	0,10%	0,41%					30%
			$0	$ P					$13.571.600		$13.571.600		$0	$950.012	$12.621.588	$2.714.320	$10.857.280	$678.580	$12.893.020	$2.714.320	$10.857.280					
				$ E									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
ITEM No. 9 Concreto resistencia 21MPa (D) (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$446.900.800	16,80%	5,62%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,08%	6,72%	5,88%	10,92%	0,85%	1,12%	14,84%	3,05%	12,19%	0,66%	12,62%	2,54%	19,17%					20%
			$149.482.712	$ P					$268.140.480	$178.760.320	$156.415.280	$290.485.520	$22.510.177	$29.707.344	$394.683.279	$81.063.755	$324.255.019	$17.669.880	$335.727.728	$67.653.471	$270.613.884					
				$ E									$0.570	$0.670	$0.330	$0.980	$0.980	$0.110	$0.450	$1.540	$0.000					
ITEM No. 10 Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$505.194.300	18,99%	3,40%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,29%	5,70%	6,65%	12,34%	0,64%	1,26%	17,07%	3,60%	14,40%	0,83%	15,52%	3,22%	13,01%					10%
			$90.382.201	$ P					$353.636.010	$151.558.290	$176.818.005	$328.376.295	$17.008.139	$34.173.031	$454.013.130	$95.739.088	$382.956.353	$22.151.762	$420.883.473	$86.466.236	$346.221.732					
				$ E									$0.320	$0.430	$0.240	$0.670	$0.670	$0.080	$0.310	$1.060	$0.000					
ITEM No. 16 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$117.216.000	4,41%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,44%	1,32%	1,32%	1,32%	2,20%	2,20%	0,02%	0,04%	4,34%	0,88%	3,52%	0,22%	4,19%	0,88%	3,52%					0%
			$0	$ P				$11.721.600	$35.164.800	$35.164.800	$35.164.800	$58.608.000	$585.980	$1.166.300	$115.463.720	$23.443.200	$93.772.800	$5.860.850	$117.206.000	$23.443.200	$93.772.800					
				$ E									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
ITEM No. 17 AFIRMADO (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$61.176.143	2,30%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	0,00%	0,00%	2,30%	0,00%	2,30%	0,00%	2,30%	0,00%	2,30%					
			$0	$ P					$30.588.072	$30.588.072	$30.588.072	$30.588.072			$61.176.143		$61.176.143	$0	$61.176.143		$61.176.143					
				$ E									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
ITEM No. 21 IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (NOTA: SE INCLUYE EL VALOR A.I.U)	$10.400.000	0,39%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,20%	0,20%	0,13%	0,13%	0,13%	0,08%	0,31%	0,00%	0,39%	0,00%	0,39%					
			$0	$ P			$2.600.000	$2.600.000	$2.600.000	$2.600.000	$5.200.000	$5.200.000	$3.466.667	$3.466.667	$3.466.667	$2.080.000	$8.320.000	$0	$10.400.000		$10.400.000					
				$ E									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 2.660.288.332,00	100%	$830.210.183,00	% P																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')				$ E																						

Suspensión No. 1 (10 días) 30/12/2022 - 10/01/2023

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,54%	20,97%	48,72%	29,77%	33,58%	66,42%	4,80%	6,35%	88,84%	17,78%	73,42%	3,82%	76,42%	14,66%	62,43%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$14.321.600,00	$557.815.359,20	$1.296.182.675,50	$791.968.697,30	$893.305.079,45	$1.766.883.252,55	$127.804.169,17	$168.975.093,49	$2.363.509.069,34	$472.984.458,40	$1.953.113.976,60	$101.694.205,55	$2.032.904.273,45	$390.010.811,80	$1.660.757.615,20						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,54%	21,51%	70,23%	100,00%	33,58%	100,00%	4,80%	11,16%	100,00%	26,58%	100,00%	23,58%	100,00%	37,57%	100,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$14.321.600,00	$572.136.959,20	$1.868.319.634,70	$2.660.288.332,00	$893.305.079,45	$2.660.288.332,00	$127.804.169,17	$296.779.262,66	$2.660.288.332,00	$707.174.355,40	$2.660.288.332,00	$627.384.058,55	$2.660.288.332,00	$999.530.716,80	$2.660.288.332,00						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%									2,99%	3,49%	8,00%	14,29%	5,48%	6,63%	2,52%	8,36%	0,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)									$78.677.853,00	$97.299.054,00	$58.212.990,00	$145.749.978,00	$145.749.978,00	$16.766.010,40	$67.064.041,60	$220.690.278,00	$0,00						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									2,99%	6,48%	14,48%	28,77%	34,25%	40,88%	43,40%	51,76%	51,76%						
	VALOR (Miles de Pesos)									$78.677.853,00	$175.976.907,00	$234.189.897,00	$379.939.875,00	$525.689.853,00	$542.455.863,40	$609.519.905,00	$830.210.183,00	$830.210.183,00						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
CARACTERIZACIÓN DEL CORREDOR VIAL POSTULADO	$ 10.447.454,00 $ -	$ -	%
REVISION Y AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 55.000.000,00 $ -	$ 55.000.000,00	100,00%
IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORIA (CARACTERIZACIÓN DEL CORREDOR Y REVISIÓN Y AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS)	$ 12.435.016,00 $ -	$ 10.450.000,00	84,04%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 29.335.004,00 $ -	$ -	%
*	$ - $ -	$ -	%
*	$ - $ -	$ -	%
*	$ - $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 107.217.474,00 $ -	$ 65.450.000,00	61,04%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 2.767.505.806,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ 895.660.183,00**	**32,36%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JHON RONAL VELANDIA ROMERO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-130487 CND

Aprueba Firma: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Representante legal o Representante Suplente o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 52202-82168

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Director Territorial
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: CAMILO ALFONSO ESPINOZA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 041037-0504878 BYC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.4 Actas de comité de obra

Para las actas de comité de obra se diligencia el formato MEPI-MN-IN-14-FR-1 del Manual de Interventoría de INVIAS, se relacionan actas de comités realizados.

4.9.5 Acta de reunión

Para las actas de reunión se diligencia el formato MEPI-MN-IN-14-FR-2 del Manual de Interventoría de INVIAS, se relaciona acta de reunión por visita realizada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 17/08/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No. CLP-202105002-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 NIT. 901.543.259-9

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IP-DT-BOY-009-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

El Ingeniero Residente de Obra hace entrega de Caracterizaciones del material de Subbase y Triturado de la Cantera el Triangulo

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

AVANCE A LA REVISIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 3

FECHA	17/08/2023
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

• El ingeniero residente de obra junto con el ingeniero director de obra de la interventoría externa, continúan con la revisión y verificación de toda la documentación que hace parte de los Estudios Topográficos, Estudio Geométrico, Diseño Estructural y Geología y Geotecnia.
Se realiza reviisón inicial presupuestal.

FECHA: 17/08/2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
VISITA AL MUNICIPIO DE BUENAVISTA A CAMPO PARA VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL TERRENO	06/09/2023	ERIC ALBERTO SANDOVAL GUTIERREZ - ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 14/09/2023 (Día / Mes / Año)



NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ERIC ALBERTO SANDOVAL GUTIERREZ	ING. RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021	
JHON RONAL VELANDIA ROMERO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021	
ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	DIRECTOR DE OBRA	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 09/08/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No. CLP-202105002-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021 NIT. 901.543.259-9

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1981-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Visita técnica Municipio de Buenavista

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Seguimiento a la revisión de estudios y diseños y sitios de ejecución de obras entre el contratista y la interventoría. Revisión de documentación del balance general de obra entre contratista e interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	09/08/2023

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realizó visita al Municipio de Buenavista Boyacá por parte del Director de Interventoría con el fin de realizar el seguimiento y control a los ajustes de los estudios y diseños de las obras a ejecutar conforme a las observaciones realizadas por la interventoría.
Se inicia evaluación del presupuesto de obra y la priorización de los tramos a intevenir.
Se programa seguimiento mediante comité de obra en 8 días.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 09/08/2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
COMITÉ DE OBRA SEGUIMEINTO ENTREGA DISEÑOS	jueves, 17 de agosto de 2023	INTERVENTORÍA
ENTREGA AJUSTES A DISEÑOS	jueves, 17 de agosto de 2023	CONTRATISTA



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	
JHON RONAL VELANDIA ROMERO	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021	
ERIC ALBERTO SANDOVAL GUTIERREZ	ING. RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

A continuación, se relacionan los datos generales del contrato 1981 de 2023.

Tabla 4. Información General del contrato de Interventoría

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".
Nombre del Contratista:	ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.
Representante Legal:	ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.
c.c.	18.127.171
Número del contrato:	1981-2023
Fecha de suscripción del contrato:	07 de junio de 2023
Valor Inicial del Contrato (A):	OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($82.176.975)
Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES.
Fecha de Inicio:	18 de julio de 2023
Fecha de Terminación Contrato Inicial:	17 de diciembre de 2023

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 5. Información de Ejecución del Contrato.

Valor Contrato 1981-2023					**$**		**82.176.975,00**
Acta No.	**Tipo de Acta**	**Mes/Año de Ejecución**	**Valor Acta sin IVA**	**Valor IVA**	**Valor Total**	**Porcentaje Ejecutado**	**Porcentaje Acumulado**
1	Interventoría	Julio 2023	$ 978.400	$ -	$ 978.400	1,19%	1,19%
2	Interventoría	Agosto 2023	$ 6.340.000	$ -	$ 6.340.000	7,72%	8,91%
TOTALES			**$ 7.318.400**	**$ -**	**$ 7.318.400,00**		**8,91%**

Fuente: Elaboración Propia

5.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato

A la fecha de elaboración del presente informe no se presentan anotaciones:

Tabla 6. Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones al contrato 1981 – 2023

CONTRATO PRINCIPAL INTERVENTORÍA				
Contrato	**Desde (Día/Mes/Año)**	**Hasta (Día/Mes/Año)**	**Plazo (meses)**	**Fecha de Vencimiento**
1981-2023	18/07/2023	17/12/2023	5	17/12/2023
PRÓRROGAS				
Prórroga	**Desde (Día/Mes/Año)**	**Hasta (Día/Mes/Año)**	**Plazo/Duración (dias)**	**Fecha de Vencimiento**

Fuente: Elaboración Propia

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Durante el periodo del 01 al 31 de agosto, la interventoría realizó las siguientes actividades:

- Revisión de los diseños geométrico, estructural, hidráulico e hidrológico.
- Elaboración balance de cantidades de obra, memorias de cálculo y sábana de cantidades a ejecutar.
- Elaboración de informes semanales y actas.

5.3 Informes especialistas y profesionales

Durante el periodo del 01 al 31 de agosto se presentó informe por el director y residente de interventoría el cual se anexa con los documentos del acta numeral 18 y se relaciona en este apartado.

5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC

No aplica para este informe.

5.5 Informe Matriz de Riesgos

No aplica para este informe.

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

Se solicito la creación del proyecto en el aplicativo dispuesto por el Instituto Nacional de Vías y que se denomina **CIFRA**, en el cual se registran los informes semanales.

ÁLVARO FERNANDO LARA Z.
Ingeniero Civil
Esp. Diseño, Construcción y Conservación de vías

Buenavista, 01 de septiembre de 2023.

Ingeniero : **JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTÁ**
Supervisor de Interventoría.
Territorial Boyacá – INVIAS.

Referencia : **Contrato de Interventoría No. 1981 de 2023**. *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".*

Asunto : Resumen ejecutivo de actividades y gastos de visita de obra del mes de agosto de 2023, realizados por el Director de Interventoría.

Respetado Ingeniero.

En el presente documento se da a conocer un resumen ejecutivo de las diferentes actividades realizadas en el mes de agosto de 2023 por el Director de Interventoría, durante la ejecución del contrato de la referencia.

Cordialmente,



ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO.
Director de Interventoría
M.P. No. 52202-282168 NRÑ.

Teléfono 0984200313. Cel: 3108593447. E-mail: fernandolara7606@hotmail.com
Calle 10 N° 18 – 26. Mocoa, Putumayo.

ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1981-2023.

OBJETO: - “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL"

INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORÍA N 02.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023.

PRESENTADO A:

INVIAS TERRITORIAL BOYACÁ

ING. JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTÁ.
SUPERVISOR.

TABLA DE CONTENIDO

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 4
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
OBJETIVO GENERAL DE LA INTERVENTORÍA 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL PRESENTE INFORME 5
FINALIDAD DEL PROYECTO 5
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POR EL CONTRATISTA 5
CONDICIONES TÉCNICAS 5
AVANCE DE ACTIVIDADES. 5
AVANCE DE OBRA 6
RESUMEN TECNICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 7

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Buenavista es un Municipio Colombiano, ubicado en el departamento de Boyacá, en la provincia de Occidente, está situado a 115 Km de la ciudad de Tunja, capital de departamento y a 30 Km de la ciudad de Chiquinquirá cabecera de la provincia. Es conocido principalmente por sus extensos cultivos frutales, base de la economía del Municipio.

El proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIATE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBBIA RURAL", está conformado por diferentes tramos vial del Municipio de Bellavista, del departamento de Boyacá. Éstos se encuentran ubicados en las veredas SARVITH - SAN PEDRO – IMPARAL – HERRADURA – SABANETA - SANTA ROSA- CONCEPCIÓN, en la siguiente figura se presenta la localización, coordenadas y una longitud aproximada de los tramos de estudio descrito.

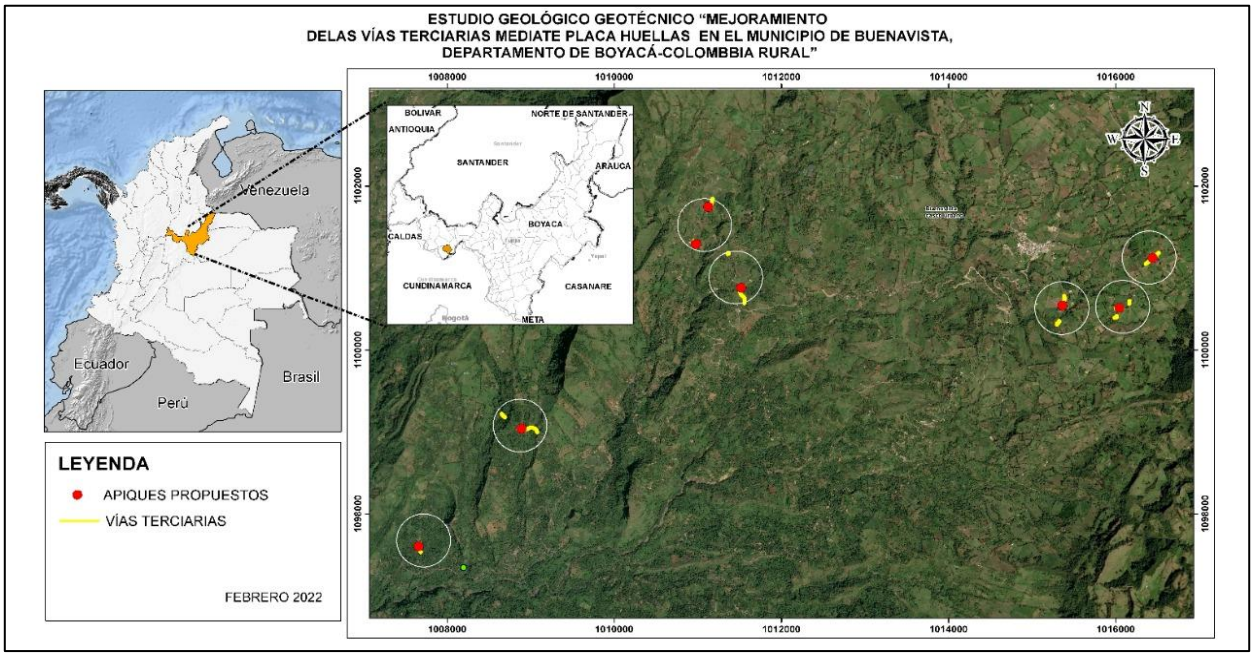


Figura 1. Localización general del área de estudio.
Fuente: Google Earth.

OBJETIVO GENERAL DE LA INTERVENTORÍA

A través de acciones que propendan por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad de los trabajos tiene como objetivo general: Analizar minuciosa y cuidadosamente los aspectos contractuales del contrato para emitir conceptos, sobre medidas y correcciones necesarias para cumplir con el objeto

del proyecto, así como propender por la correcta realización del inicio de las actividades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL PRESENTE INFORME

- ✓ Informar sobre el estado general del proyecto.
- ✓ Presentar el avance que tiene el proyecto con relación a los tiempos fijados inicialmente.
- ✓ Informar sobre las actividades realizadas por el contratista de obra.
- ✓ Informar sobre las actividades ejecutadas por la interventoría.

FINALIDAD DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como finalidad realizar el MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIATE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL con el fin de mejorar la calidad y condiciones del municipio de Buenavista Boyacá.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POR EL CONTRATISTA

CONDICIONES TÉCNICAS

Todas las actividades contratadas, se efectuarán siguiendo los lineamientos y recomendación dadas por la supervisión del contrato, diseños y planos suministrados y del anexo técnico.

AVANCE DE ACTIVIDADES.

Iniciando con la ejecución del contrato CLP-202105002 DE 2021 y en cumplimiento con el objeto del contrato de obra se desarrollaron las siguientes actividades durante el periodo del presente informe:

El objetivo inicial del proyecto, es el mejoramiento de 1.85 km de vía terciaria, mediante la construcción de placas huellas, junto con sus obras de drenajes (cunetas), longitud que está supeditada a cualquier clase de imprevistos u obras adicionales que puedan surgir para la futura estabilidad y duración del proyecto.

Se presenta la ejecución del contrato a la fecha, el cual se encuentra en suspensión desde el 13 de abril de 2023.

CONSOLIDADO TRAMOS A MEJORAR	LONGITUD TRAMO (M)	EJECUTADO
CHICHIPI 1	64.48	
CHICHIPI 2	68,83	
CHICHIPI 3	65,09	

CHICHIPI 4	24,01	
CHICHIPI 5	100,35	
CHICHIPI 6	61,62	
BATEA EL TORO	67.55	
TRAPICHE QUEMADO	87,04	
SANTA ROSA DANILO MATALLANA	135,29	
HOMERO 2	66,5	66.91
HOMERO 1	90	91
SANPEDRO LA ESCUELA	270,08	270.1
CURVA MARCELINO	80	79.88
JUAN DURAN	126.59	127.95
MORATO	74,34	91.5
SANTA ROSA LA ESCUELA	55,22	
LA HERRADURA	195.68	
SABANETA EL ROBLE 3	114,7	
SABANETA EL ROBLE 1	43,67	
SABANETA EL ROBLE 2	58,96	
	1850,00	727.34

AVANCE DE OBRA

A la fecha de corte del 31 de agosto de 2023, el contrato se encuentra suspendido con un porcentaje de ejecución del 23.80% del total del objeto contractual.

De acuerdo con la programación de obra, se tenía programado un 94.36% de ejecución, el cual a la fecha presenta un retraso del 70.56%.

El contrato se encuentra en la finalización de la revisión y ajuste de los tramos a intervenir y el balance en obra y proyección de acta de costos de obra N 1.

Se espera reinicio de ejecución de actividades para el mes de septiembre de 2023 previo cumplimiento y presentación de los ajustes a diseños y aprobación por parte de la interventoría.

RESUMEN TECNICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

La firma **ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO** con su personal administrativo y operativo adelanta la supervisión, control Técnico, Administrativo, Contable, financiero al desarrollo de las Obras del contrato de Obra N° CLP-202105002 DE 2021, donde se verificarán las actividades en ejecución, se corrigen y ajustan los procedimientos constructivos a que hubiese lugar y se exige al Contratista contar con el equipo y personal idóneo para el desarrollo de las obras.

Se realizó la revisión de los documentos que conforman los estudios y diseños del contrato de obra en las áreas geométrico, estructural, hidráulico e hidrológico, así mismo se realizo balance de obra con el alcance a ejecutar.

Se realizó visita a campo y toma de medidas de tramos ejecutados para realizar la proyección del acta parcial de obra N 1.

Se realizaron las observaciones pertinentes a los diseños presentados y se espera la presentación de los ajustes respectivos para aprobación por parte de la interventoría.

Previa aprobación de balance final se proyecta reinicio de obras para el mes de septiembre de 2023 y trámite de acta parcial de cobro.

INFORME EJECUTIVO MENSUAL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA N 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	01 DE AGOSTO DE 2023	Y EL	31 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL				
LOCALIZACIÓN	BUENAVISTA BOYACÁ				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA.**	
CONTRATO No.:	1981-2023	CONTRATO No.:	CLP-202105002 DE 2021
CONTRATISTA:	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES SIN EXCEDER 31 JULIO 2022
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de julio de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	30 de diciembre de 2021
FECHA PRORROGA No. 01		PLAZO DE PRORROGA No. 01 PLAZO DE PRORROGA No. 02 PLAZO DE PRORROGA No. 03 PLAZO DE PRORROGA No. 04 PLAZO DE PRORROGA No. 05 PLAZO DE PRORROGA No. 06	62 DÍAS 1 MES 2 MESES 2 MESES 2 MESES 1,5 MESES
PLAZO DE PRORROGA No. 01		FECHA PRORROGA No. 01 FECHA PRORROGA No. 02 FECHA PRORROGA No. 03 FECHA PRORROGA No. 04 FECHA PRORROGA No. 05 FECHA PRORROGA No. 06	27/05/2022 29/07/2022 31/08/2022 28/10/2022 10/01/2023 28/02/2023
		SUSPENSIÓN No. 01 SUSPENSIÓN No. 02	31/12/2022 13/04/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	17 de diciembre de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	REINICIO PREVISTO PARA SEPTIEMBRE 2023, RESTAN 2 DÍAS DE EJECUCI{ON
VALOR INICIAL :	$ 82.176.975,00	VALOR INICIAL :	$ 2.767.505.806,00
VALOR ADICIÓN(ES):	-	VALOR ADICIÓN(ES):	-
VALOR ACTUALIZADO:	$ 82.176.975,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.767.505.806,00
VALOR PAGADO:	$ 0,00	VALOR PAGADO:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR:	$ 82.176.975,00	VALOR POR PAGAR:	$ 2.767.505.806,00

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato.	07/06/2023	17/05/2024	$ 8.217.697,50
Pagos de salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales.	07/06/2023	17/06/2027	$ 16.435.395,00
Calidad del servicio.	30/11/2023	17/11/2028	$ 24.653.092,50

CONTRATO DE OBRA.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato.	30/12/2023	30/09/2023	$ 276.750.581,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30/12/2021	30/09/2023	$ 807.700.000,00
Pagos de salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales.	30/12/2021	05/05/2026	$ 553.501.161,00
Calidad del servicio	30/12/2021	30/12/2026	$ 16.500.000,00
Estabilidad y Calidad de la Obra.	30/12/2021	30/12/2026	$ 830.251.742,00

3. RESUMEN DE PAGOS


CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR

CONTRATO DE OBRA.

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR

4. CURVA "S"

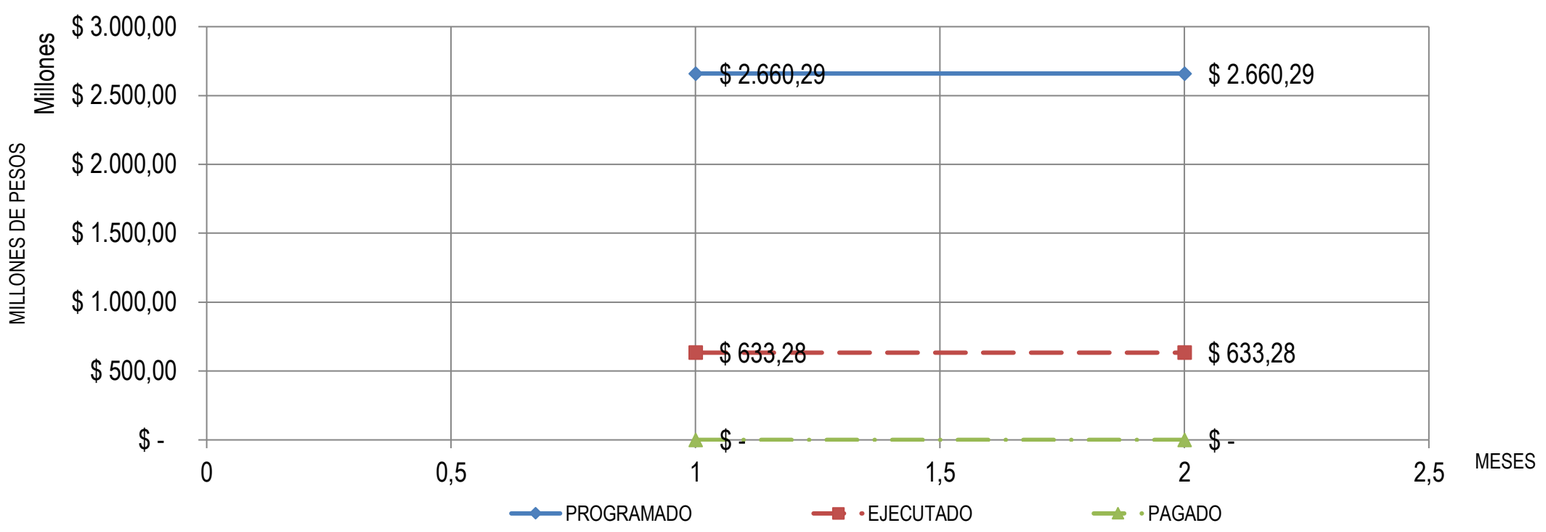

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No se han ejecutado actividades no previstas a la fecha.

ING. NELSON BRAVO PORTILLA
Residente de Interventoría.
En representación de ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

Para ver el control de equipo y vehículos del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 del Manual de Interventoría del INVIAS, se presenta formato de uso de vehículos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 05/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1981-2023 **INTERVENTORÍA:** ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

CONTRATO DE OBRA No. CLP-202105002-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Camioneta o Campero 4*4 de mas de 2000 c.c (Incluye peajes, Combustible y Conductor) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 en adelante	TOYOTA FORTUNER 2012	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I
Motocicletas (125 cc o mayor modelo 2015 en adelante, incluye combustible y soat)	AKT AK125RL 2020	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRÑ

Firma
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 01110-1037

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Para ver el control de personal y aportes del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 del Manual de Interventoría del INVIAS, y es presentado junto con las planillas de seguridad social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 05/09/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1981-2023 **INTERVENTOR:** ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2023 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".

CONTRATO DE OBRA No.: CLP - 202105002 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																													% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	18.127.171	Director de Interventoría	$ 900.000														X	X					X	X						X	X			0,20	ALVARO LARA	$ 1.160.000	$ 80.800	V	NUEVA EPS	9455613697	$ 145.000	PORVENIR	9455613697	$ 185.600	$ 23.200	$ -	$ -	
2	NELSON BRAVO PORTILLA	98.395.743	Residente de Interventoría	$ 1.050.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						0,30	ALVARO LARA	$ 1.160.000	$ 6.100	I	NUEVA EPS	9460450483	$ 46.400	PENSIONADO	9460450483		$ 46.400	$ -	$ -	
3	CARLOS VERA	18.145.174	Inspector	$ 800.000																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0,50	ALVARO LARA	$ 1.160.000	$ 6.100	I	NUEVA EPS	9460450483	$ 46.400	PROTECCIÓN	9460450483	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
4																																											
5																																											
6																																											
7																																											
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 2.750.000																																							

El Interventor adjunta la certificación de fecha 5 de septiembre a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma ÁLVARO LARA
Nombre: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRÑ

Firma
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01110-1037

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18127171		LARA ZAMBRANO ALVARO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO HUASIPANGA	MOCOA-PUTUMAYO	4200313	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	172924448	9455613697	I	2023/09/18	2023/09/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	3	$355,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$0	$0		$0	$0
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$0	$0		$0	$0
1	CC	18127171	LARA ALVARO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF63	30	$1,160,000	$23,200		0	$0	$0	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18127171		LARA ZAMBRANO ALVARO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO HUASIPANGA	MOCOA-PUTUMAYO	4200313	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	564974204	9465500874	N	2023/09/18	2024/04/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	204	$96,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	Novedades																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
				ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	18127171	LARA ZAMBRANO ALVARO FERNANDO										A				▫				23030 1	30	($1,160,000)	($185,600)	EPS037	30	($1,160,000)	($145,000)	CCF63	30	($1,160,000)	($23,200)	14-23	0	$0	0.000%	$0	30	$0	$0	No	($353,800)
2	CC	18127171	LARA ZAMBRANO ALVARO FERNANDO										C								23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF63	30	$1,160,000	$23,200	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$434,600
Total			**Afiliados(1)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18127171		LARA ZAMBRANO ALVARO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO HUASIPANGA	MOCOA-PUTUMAYO	4200313	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	564974204	9465500874	N	2023/09/18	2024/04/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	204	$96,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$15,700	$0	$96,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$80,800	$15,700	$0	$96,500
TOTAL				**1**	**$80,800**	**$15,700**	**$0**	**$96,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18127171		LARA ZAMBRANO ALVARO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO HUASIPANGA	MOCOA-PUTUMAYO	4200313	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	343927042	9460450483	E	2023/09/18	2023/12/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	91	$419,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$383,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$383,400
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$383,400
1	CC	98395743	BRAVO NELSON	X																	0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$98,900
2	CC	18145174	VERA CARLOS	X																230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Total		**Afiliados(2)**																				$1,160,000	$185,600			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$383,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18127171		LARA ZAMBRANO ALVARO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO HUASIPANGA	MOCOA-PUTUMAYO	4200313	Si


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	343927042	9460450483	E	2023/09/18	2023/12/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	91	$419,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$17,200	$0	$202,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$17,200	$0	$202,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$12,200	$1,200	$0	$13,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$12,200	$1,200	$0	$13,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,800	$8,600	$0	$101,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	$92,800	$8,600	$0	$101,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,800	$8,600	$0	$101,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800	$8,600	$0	$101,400
TOTAL				**2**	**$383,400**	**$35,600**	**$0**	**$419,000**

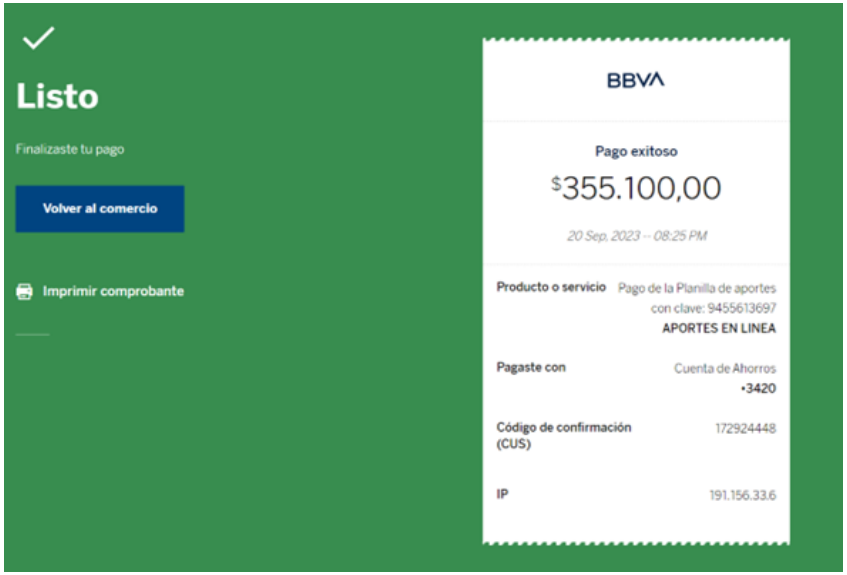
Listo
Finalizaste tu pago
Volver al comercio
Imprimir comprobante
BBVA
Pago exitoso
$355.100,00
20 Sep, 2023 - 08:25 PM
Producto o servicio
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9455613697
APORTES EN LINEA
Pagaste con
Cuenta de Ahorros
•3420
Código de confirmación (CUS)
172924448
IP
191.156.33.6

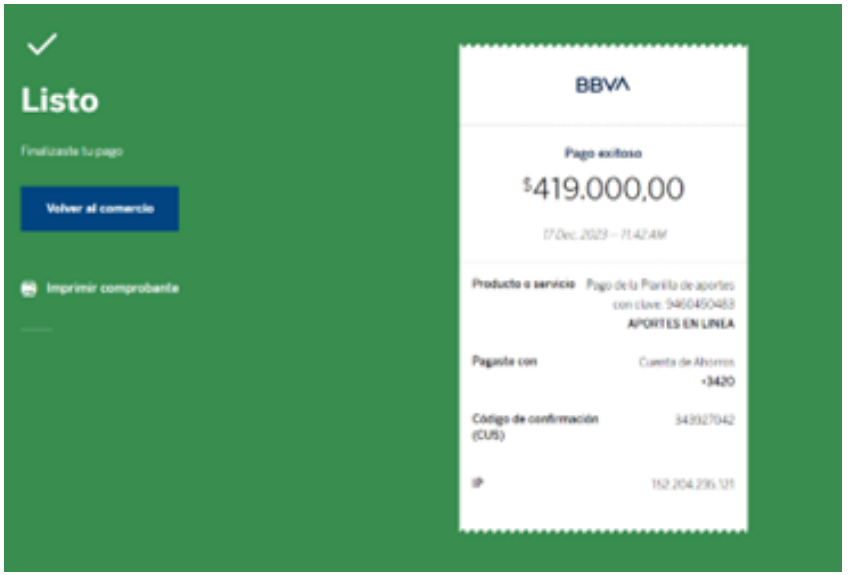
Listo
Finalizaste tu pago
Volver al comercio
Imprimir comprobante
BBVA
Pago exitoso
$419.000,00
17 Dec, 2023 - 11:42 AM
Producto o servicio
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9460450483
APORTES EN LINEA
Pagaste con
Cuenta de Ahorros
•3420
Código de confirmación (CUS)
343927042
IP
152.204.235.121


Listo
Finalizaste tu pago
Volver al comercio
Imprimir comprobante
BBVA
Pago exitoso
$96.500,00
9 abr, 2024 - 12:08:42 PM
Producto o servicio
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9465500874
APORTES EN LINEA
Pagaste con
Cuenta de Ahorros
•3420
Código de confirmación (CUS)
564974204
IP
N/A

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Para ver el informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 del Manual de Interventoría del INVIAS, y es presentado a continuación.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 05/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1981-2023

INTERVENTOR: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2023

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".

CONTRATO DE OBRA No: CLP - 202105002 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	639323	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	Contrato Principal 1981-2023	$ 82.176.975	$ 81.198.575
				TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 82.176.975**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**jul-23**	$ 978.400	$ -	$ 978.400	N/A	$ 978.400	N/A	104923 DE 12/05/2023	$ 81.198.575	$ 81.198.575		
2	**ago-23**	$ 6.340.000	$ -	$ 6.340.000	N/A	$ 6.340.000	N/A	104923 DE 12/05/2023	$ 74.858.575	$ 74.858.575		
TOTALES		**$ 7.318.400**	**$ -**	**$ 7.318.400**	**N/A**	**$ 7.318.400**	**N/A**		**$ 74.858.575**	**$ 74.858.575**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA COSTOS N 1 JULIO 2023	$ 978.400	$ -	$ 978.400
ACTA COSTOS N 2 AGOSTO 2023	$ 6.340.000	$ -	$ 6.340.000
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRÑ

Firma

Nombre: JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01110-1037

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Para ver el control de seguimiento a garantías del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 del Manual de Interventoría del INVIAS, y es presentado a continuación.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÌAS CONTRATO DE INTERVENTORÌA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 05/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1981-2023 **INTERVENTOR:** ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".

FECHA DE INICIO: 18/07/2023

PLAZO INICIAL: 5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 82.176.975,00

VALOR ACUMULADO: $ 82.176.975,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 8.217.697,50	7	6	2023	17	5	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0,00%	$ 0,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 16.435.395,00	7	6	2023	17	6	2027
Calidad del servicio	30,00%	$ 24.653.092,50	30	11	2023	17	11	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 560-47-994000164384

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/06/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÌAS CONTRATO DE INTERVENTORÌA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 05/09/2023 (Día / Mes / Año)

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRÑ

Firma

Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01110-1037

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607356077

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000164384 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	21	06	2023

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	21	06	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO** IDENTIFICACIÓN: CC **18.127.171**

DIRECCIÓN: CL 10 18 26 ESMERALDA CA 3 CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO TELÉFONO: 3108593447

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DESCRIPCION CONTRATO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	07/06/2023	31/05/2024	8,217,697.50
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	07/06/2023	30/06/2027	16,435,395.00
	CALIDAD DEL SERVICIO	30/11/2023	30/11/2028	24,653,092.50

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:
|

BENEFICIARIOS
NIT 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No 1981 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".

NOTA SE CORRIGE VIGENCIA DEL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****49,306,185.00	$ **********0	$********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
EGNA MAGALI LOPEZ ROMO	9462	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560735607

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE207F0C08FF7B56

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Dirección:** Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

No aplica para este contrato.

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

No aplica para este contrato ya que no tiene anticipo.

6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

Para ver el plan de cargas aprobado se utiliza el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2 del Manual de Interventoría del INVIAS, se presenta el plan de cargas inicial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-9-FR-2 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 2 FECHA: 18/07/2023

PLAN DE CARGAS INICIAL ☑

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ **No.** ____
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1981 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
RESOLUCIÓN No.: 033 DE 29 DE JUNIO DE 2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA CLP - 202105002 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021

PLAZO INICIAL: 5 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/07/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 17/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 82.176.975,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 82.176.975,00

No. de Orden	Cant	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha		AÑO - 2023												TOTAL	
											MES 1 - JULIO		MES 2 AGOSTO		MES 3 - SEPTIEMBRE		MES 4 - OCTUBRE		MES 5 - NOVIEMBRE		MES 6 - DICIEMBRE			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																						
	1	Director de Interventoria	$ 4.500.000		1,00	$ 4.500.000					0,09	$ 405.000	0,20	$ 900.000	0,20	$ 900.000	0,20	$ 900.000	0,20	$ 900.000	0,11	$ 495.000	1,00	$ 4.500.000,00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 3.500.000		4,00	$ 14.000.000					0,00	$ -	0,30	$ 1.050.000	0,70	$ 2.450.000	1,00	$ 3.500.000	1,00	$ 3.500.000	1,00	$ 3.500.000	4,00	$ 14.000.000,00
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 4.000.000		0,30	$ 1.200.000					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,30	$ 1.200.000		$ -	0,30	$ 1.200.000,00
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 4.000.000		0,30	$ 1.200.000					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,30	$ 1.200.000		$ -	0,30	$ 1.200.000,00
	1	Especialista Ambiental	$ 4.000.000		1,00	$ 4.000.000					0,00	$ -	0,00	$ -	0,33	$ 1.320.000	0,33	$ 1.320.000	0,34	$ 1.360.000		$ -	1,00	$ 4.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR TECNICO																						
	1	Inspector	$ 1.600.000		4,00	$ 6.400.000					0,00	$ -	0,50	$ 800.000	1,00	$ 1.600.000	1,00	$ 1.600.000	1,00	$ 1.600.000	0,50	$ 800.000	4,00	$ 6.400.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 31.300.000					**$ 405.000,00**		**$ 2.750.000,00**		**$ 6.270.000,00**		**$ 7.320.000,00**		**$ 9.760.000,00**		**$ 4.795.000,00**		**$ 31.300.000**	
FACTOR MULTIPLICADOR						2,00					**2,00**		**2,00**		**2,00**		**2,00**		**2,00**		**2,00**		**2,00**	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						**$ 62.600.000**					**$ 810.000**		**$ 5.500.000**		**$ 12.540.000**		**$ 14.640.000**		**$ 19.520.000**		**$ 9.590.000**		**$ 62.600.000**	

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO - 2023												TOTAL	
											MES 1 - JULIO		MES 2 AGOSTO		MES 3 - SEPTIEMBRE		MES 4 - OCTUBRE		MES 5 - NOVIEMBRE		MES 6 - DICIEMBRE			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																						
		VIATICOS																						
	1	Especialistas y Director	$ 150.000	dia	8,00	$ 1.200.000					1,00	$ 150.000	1,00	$ 150.000	1,00	$ 150.000	2,00	$ 300.000	2,00	$ 300.000	1,00	$ 150.000	8,00	$ 1.200.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPO Y OFICINA																						
	1	Camioneta o Campero 4*4 de mas de 2000 c.c (Incluye peajes, Combustible y Conductor) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 en adelante	$ 1.500.000	Mes	4,00	$ 6.000.000						$ -	0,20	$ 300.000	0,80	$ 1.200.000	1,00	$ 1.500.000	1,00	$ 1.500.000	1,00	$ 1.500.000	4,00	$ 6.000.000,00
	1	Motocicletas (125 cc o mayor modelo 2015 en adelante, incluye combustible y soat)	$ 300.000	Mes	4,00	$ 1.200.000						$ -	0,50	$ 150.000	0,50	$ 150.000	1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000	1,00	$ 300.000	4,00	$ 1.200.000,00
	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	$ 1.000.000	Según comprobante por mes	4,00	$ 4.000.000						$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000	1,000	$ 1.000.000	4,00	$ 4.000.000,00
	1	Trabajos de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 1.000.000	Según comprobante por mes	4,00	$ 4.000.000						$ -	0,20	$ 200.000	0,80	$ 800.000	1,00	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000	4,00	$ 4.000.000,00
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 600.000	Según comprobante por mes	4,00	$ 2.400.000						$ -	0,00	$ -	1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000	4,00	$ 2.400.000,00

		OTROS COSTOS																					
	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, etc	$ 60.000	Según comprobante por mes	5,00	$ 300.000					0,46	$ 27.600	1,00	$ 60.000	1,00	$ 60.000	1,00	$ 60.000	1,00	$ 60.000	0,54	$ 32.400	5,00	$ 300.000,00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 40.000	Según comprobante por mes	5,00	$ 200.000					0,46	$ 18.400,00	1,00	$ 40.000	1,00	$ 40.000	1,00	$ 40.000	1,00	$ 40.000	0,54	$ 21.600	5,00	$ 200.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)						**$ 19.300.000,00**				**$ -**	**$ 196.000,00**		**$ 900.000,00**		**$ 4.000.000,00**		**$ 4.800.000,00**		**$ 4.800.000,00**		**$ 4.604.000,00**		**$ 19.300.000,00**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C.)						$ 81.900.000,00				$ -	$ 1.006.000,00		$ 6.400.000,00		$ 16.540.000,00		$ 19.440.000,00		$ 24.320.000,00		$ 14.194.000,00		$ 81.900.000,00
PROVISIONAL FRENTE ADICIONAL (D)						$ 276.975															$ 276.975,00		$ 276.975,00
VALOR TOTAL BÁSICO (E)						$ 82.176.975,00				$ -	$ 1.006.000,00		$ 6.400.000,00		$ 16.540.000,00		$ 19.440.000,00		$ 24.320.000,00		$ 14.470.975,00		$ 82.176.975,00
IVA = 19% * (E) = (F)																							
COSTO TOTAL = (E) + (F)						**$ 82.176.975,00**				**$ -**	**$ 1.006.000,00**		**$ 6.400.000,00**		**$ 16.540.000,00**		**$ 19.440.000,00**		**$ 24.320.000,00**		**$ 14.470.975,00**		**$ 82.176.975,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

PLAN DE CARGAS INICIAL

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: ALVARO FERNANDO LARA Z
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 52202-82168 NRÑ

Firma:
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01110-1037
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

7 Conclusiones y recomendaciones

Durante el periodo del informe, se realizó la revisión y verificación de los diseños de obra y el balance de cantidades a ejecutar.

Hasta el 31 de agosto de 2023 se cuenta con un 23,80% de avance físico de ejecución de la totalidad de las obras del proyecto que corresponde a 727.34 metros construidos de la meta física establecida, que corresponde a los tramos de CURVA MARCELINO, HOMERO 1, HOMERO 2, SAN PEDRO LA ESCUELA, MORATO Y JUAN DURAN.

Se realizará una prorroga al contrato de obra para culminar con la ejecución de actividades, se prevé el reinicio del contrato de obra para el mes de septiembre de 2023.

8 ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor

Se presenta la relación de la correspondencia entre contratista, interventor y supervisión del periodo del informe.

8.2 Registro fotográfico del avance de las obras

En el periodo del informe se realizaron actividades de oficina en la revisión de los estudios y diseños.





8.3 Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas

En el periodo del informe no se realizaron actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad ya que se realizaron actividades de oficina en la revisión de los estudios y diseños.

8.4 Bitácora del mes

Durante el periodo se realizaron actividades administrativas de revisión de estudios y diseños, las cuales se presentan en los informes semanales, y teniendo en cuenta que el contrato de obra se encuentra suspendido no se diligencia bitácora de obra.

	FORMATO RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MEDIANTE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA RURAL.
CONTRATO OBRA:	CLP-202105002 DE 2021
CONTRATO INTERVENTORÍA:	1981-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021
INTERVENTOR:	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
SUPERVISOR:	JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
FECHA:	ago-23

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
NO SE RECIBIÓ NI EMITIÓ CORRESPONDENCIA POR REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				

ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
M.P. 52202-282168 NRÑ
INTERVENTORÍA
