Cereté, agosto 28 de 2023

Doctor
JORGE ISAAC NEGRETE LOPEZ
Alcalde
Santa Cruz de Lorica – Córdoba.

Referencia: Disponibilidad y estado de redes de acueducto y alcantarillado en distintas vías de la cabera urbana del municipio de Santa Cruz de Lorica.

Cordial Saludo.

En relación al oficio de la referencia me permito suministrar información del estado de redes de acueducto y alcantarillado en las calles objeto del proyecto *"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LA CR30 – CL14 Y 17ª; CL17A – CR30 Y 29ª; CR11 – R9003 Y CL17A; CL1 HACIA EL PLANCHÓN DE COTOCÁ ABAJO; CL25 – R9004 Y CR17; CL12 Y R9004 Y CR20; CR13 – R9003 Y CL17, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA".*, para sus trámites pertinentes.

ESTADO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DIFERENTES CALLES MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA				
No.	**BARRIO**	**DIRECCIÓN**	**ACUEDUCTO**	**ALCANTARILLADO**
1	Los Andes	Calle 25 entre Ruta 9004 y Carrera 21	8" PVC gris y 16" PEAD	Sin Redes
		Calle 25 entre Carrera 21 y Carrera 19ª	8" PVC Gris y 2" PVC Gris	Sin Redes
		Calle 25 entre Carrera 19ª y Carrera 19	8" PVC Gris y 3" PVC Gris	Sin Redes
		Calle 25 entre Carrera 19 y Carrera 17	3" PVC Gris	8" PVC
2	Bajo Kennedy	Calle 12 entre Ruta 9004 y Carrera 20	3" PVC	8" Concreto


3	San Gabriel	Calle 1 desde el Inicio del Pavimento hasta la entrada Loma Clodo	3” PVC Gris	8” Concreto
		Calle 1 desde la entrada Loma Clodo Hacia el Planchón de Cotoca Abajo (9°13'29.9"N 75°50'06.8"W)	2 1/2” PVC Gris	Concreto
		Calle 1 Coordenadas (9°13'29.9"n 75°50'06.8"w) hasta fin del Pavimento.	2 1/2” PVC Gris	Sin Redes
4	San Francisco	Carrera 13 entre Ruta 9003 y Calle 17	4" PVC	8" PVC
5	Vista Hermosa	Carrera 11 entre Ruta 9003 y Calle 18Bis	3” PVC Gris	8” PVC
		Carrera 11 entre Calle 18 Bis y 17	2” PVC Gris	8” PVC
		Carrera 11 entre Calle 17B y Calle 17ª	2” PVC Gris	Sin Redes
6	San Carlos	Calle 17ª entre Carrera 30 y 29ª	Sin Redes	Sin Redes
		Carrera 30 entre Calle 17 y 17ª	Sin Redes	8” PVC
		Carrera 30 entre Calle 17 y 14.	3” PVC	8” PVC

Para los proyectos de construcción de pavimento en las direcciones mencionadas las redes de acueducto que se encuentren en material de Asbesto Cemento (AC), y PVC Gris se deberán reemplazar por PVC RDE 21 con sus respectivas acometidas domiciliarias en manguera PF+UAD 20mm. Así mismo se deberán ajustar los diámetros al proyecto de sectorización del municipio de Santa Cruz de Lorica.
Los colectores que estén en concreto se deben reemplazar a PVC estructural con sus respectivas acometidas domiciliarias.

De igual manera aquellas calles que no cuenten con redes de acueducto y alcantarillado se deberán proyectar su inclusión de acuerdo los lineamientos del Plan Maestro de Alcantarillado del municipio.

Agradecemos su disposición y apoyo a la gestión de operación de acueducto y alcantarillado en el municipio.

Atentamente

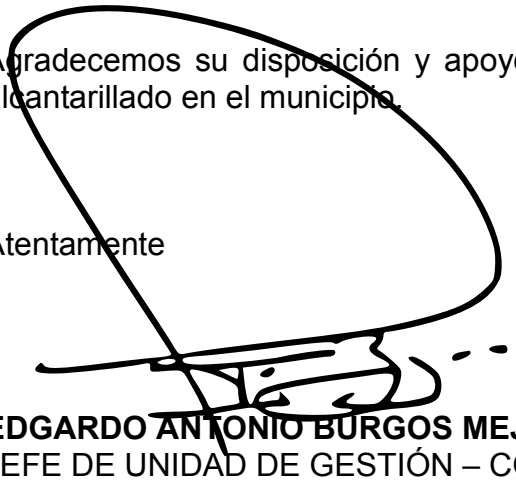

EDGARDO ANTONIO BURGOS MEJÍA
JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN – CÓRDOBA
AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.

Elaboró: Osnaider Berrocal Vergara – Jefe de Redes Córdoba.
Reviso: Carlos Daneys González Morelo – Ingeniero operativo Lorica - Córdoba.
Aprobó: Armando Enrique Velilla Rebollo – Jefe de Servicios Zona Norte - Córdoba
