INFORME SEMANAL DE OBRA No 63

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 16 de marzo de 2024

- Excavación manual sobre talud en eje 1 para instalación de geo dren.
- Fundición muro M-7, columnas E-3 y F-3 en concreto de 6.000 psi sobre piso 1.
- Fundición de muro de contención en sótano y semisótano en concreto de 4.000 psi.
- Armado de acero para columna F-1 y F-2 en piso 1.
- Desencofrado de losa de piso 1 fundida el 11 de marzo.

Domingo 17 de marzo de 2024

- No se realizaron actividades en obra.

Lunes 18 de marzo de 2024

- Excavación manual sobre talud en eje 1 para instalación de geo dren.
- Desencofrado de casetón para losa de piso 1.
- Armado de acero para columna E-1, F-1 y F-2 en piso 1.
- Armado de acero para losa de piso 1 entre ejes C-E/1-3.
- Encofrado de muro M-8 y M-9 en la losa de piso 1.

Martes 19 de marzo de 2024

- Inicia Replanteo para armado de escalera E-2 de sótano a semisótano.
- Excavación manual sobre talud en eje 1 para instalación de geo dren.
- Encofrado de muro M-8 y M-9 en la losa de piso 1.
- Desencofrado de losa de piso 1 fundida el 11 de marzo.
- Retiro y readecuación de casetón para uso en losa de primer piso.
- Armado de acero de columna F-1 en piso 1.

Miércoles 20 de marzo de 2024

- Armado de borde de losa para piso 1 eje 1-3/C-F.
- Continúa Replanteo para armado de escalera E-2 de sótano a semisótano.
- Continúa Desencofrado de losa de piso 1 fundida el 11 de marzo.
- Instalación de casetón para losa de piso 1 ejes 1-3/C-F.
- Excavación manual sobre talud en eje 1 para instalación de geo dren.

Jueves 21 de marzo de 2024

- Inicia armado de acero para escalera E-2 de sótano a semisótano.
- Continúa Instalación de casetón para losa de piso 1 ejes 1-3/C-F.
- Instalación de malla electrosoldada 7mm 15x15 para losa de primer piso ejes 1-3/C-F.
- Excavación manual sobre talud en eje 1 para instalación de geo dren.

Viernes 22 de marzo de 2024

- Inicia encofrado de losa de piso 2.
- Instalación de pasantes para las diferentes redes que intervienen en losa de piso 1.
- Continúa armado de acero para escalera E-2 de sótano a semisótano.
- Fundición de muro M-8 y M-9 en concreto de 6.000 psi en primer piso.
- Excavación manual sobre talud en eje 1 para instalación de geo dren.
- Instalación de Tecdren sobre eje 1 entre B-C y E-F.
- Fundición de losa piso 1 en concreto de 4.000 psi entre ejes 1-3/B'-F.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 61 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Luz Damaris Salcedo – Milson Castilla.
Maestro – Rafael Moreno
Tecnólogo en dibujo – Daniel Ciprian
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
Operativos: 37 Personas

Alquir: 31 Personas
Kelly Vargas: 3 Personas

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Arq. Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Ing. Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Carlos Sierra
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Laura Figueroa
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
CIMENTACION	92,35%	99,97%
SOTANO	70,98%	88,86%
SEMISOTANO	80,64%	88,68%
ESTRUCTURA PISO 1	100,00%	45,40%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
SOLEADO																x	x	x	x	x	x	x							
NORMAL																													
NUBLADO																													
LLOVIZNA																													
LLUVIOSO																													

Nota:


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúan con el plan de contingencia para recuperar los tiempos perdidos por la conflagración ocurrida en el sótano del proyecto tales como jornadas extendidas de trabajo entre semana y trabajos diurnos durante el fin de semana, adicionalmente se usan concretos acelerados para la pronta recuperación de equipo de encofrado horizontal y casetón a usar en el siguiente nivel.

REGISTRO FOTOGRÀFICO




Armado de acero para escalera E-2 / Armado de acero para columnas piso 1.

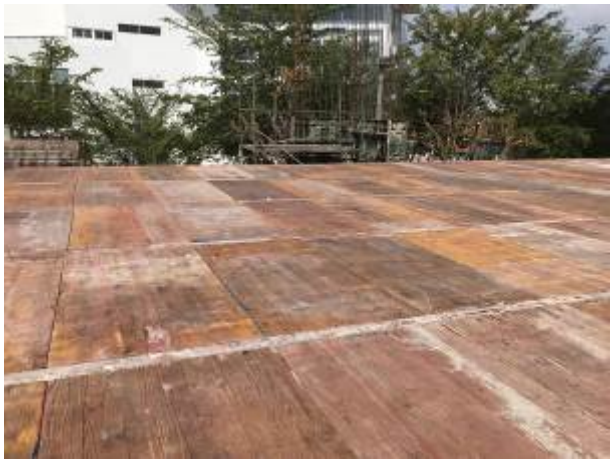


Armado de encofrado horizontal para losa de piso 2 / Armado de acero para muros en piso 1.




Fundición de columnas en piso 1 / Fundición de losa de piso 1.
