UNIÓN TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO
901.716.870-3

"SERVICIO, GESTIÓN Y CALIDAD"

¡Porque hacemos parte de ti!

MUNICIPIO DE URRAO

CONTRATO DE OBRA Nro. 04 – 2023

26 DE MAYO DE 2023

CONTRATACION POR EL SISTEMA DE OPERACIÓN CON INVERSION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN, REPOTENCIACIÓN (MODERNIZACIÓN), ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, EXPANSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE URRAO – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

UNIÓN TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO

INFORME DE AVANCE

JULIO – DICIEMBRE 2023

Carrera 15B No. 52-53 Barrio Monteverde
Tel: (604)789 71 88 – 300 661 00 31
Email: gealumbradopublico@hotmail.com
Montería - Córdoba

INTRODUCCIÓN

La UNIÓN TEMPORAL URRAO ILUMINADO firmó contrato con las EMPRESAS PUBLICAS DE URRAO E.S.P, para la atención integral del sistema de ALUMBRADO PÚBLICO el día 26 de Mayo de 2023; por otra parte el acta de inicio da inicio a ejecución contractual a partir del uno (1) de Julio de 2023, fecha establecida para el efecto.

El presente informe resume las actividades adelantadas por el contratista en virtud del contrato en mención durante el período comprendido de Julio de 2023 hasta Diciembre de 2023.

UNIÓN TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO

CONTENIDO

1.	**ADMINISTRACION DE LA INFRAESTRUCTURA**		**4**
1.1.	Oficina De Atención		4
1.2.	Recepción y solución de PQR		5
1.3.	Vehículo para la operación y Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público.		6
1.4.	Personal Administrativo y Técnico		7
1.5.	Protección y Señalización		8
1.6.	Planes de Información y Educación		**¡Error! Marcador no definido.**
1.7.	Plan de Manejo Ambiental		9
1.8.	Plan Anual de Servicio de Alumbrado Público		9
2.	**SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SG-SST)**		**10**
3.	**GARANTIAS**		**11**
4.	**CENSO DE INFRAESTRUCTURA**		**11**
5.	**MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO**		**15**
6.	**MANTENIMIENTOS SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO**		**21**

UNION TEMPORAL URRAO ILUMINADO


1. ADMINISTRACION DE LA INFRAESTRUCTURA

Al contratista le corresponde el manejo idóneo y eficiente de los recursos materiales y humanos para alcanzar el grado óptimo en la prestación del servicio de Alumbrado público para lo cual se cuenta con lo siguiente:

1.1. Oficina De Atención

Se cuenta con una oficina de atención al Usuario ubicada en xxxxxxxxx y con un horario de atención de lunes a viernes de 7:30am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm y sábados de 7:30 am a 12:00m, con una asistente administrativa encargada de atender todas las quejas y reclamos de los usuarios.

Nuestra oficina se encuentra debidamente dotada con todos los equipos y muebles y enseres para una cómoda y eficiente atención a los usuarios que visiten nuestras instalaciones, con el fin de atender las P.Q.R.S de estos, igualmente se cuenta con todos los equipos comunicación como celulares, internet que garantizan el buen desarrollo de todas las actividades derivadas de la atención integral del sistema de ALUMBRADO PÚBLICO en el MUNICIPIO DE URRAO - ANTIOQUIA. **(Ver anexo 1)**

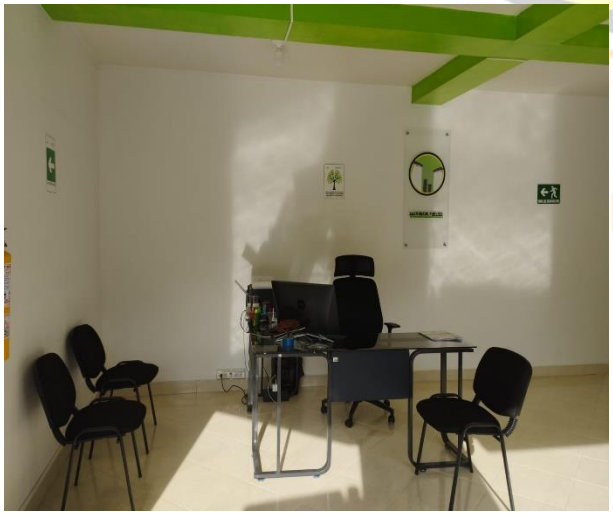



1.2. Recepción y solución de PQR

Dentro de las obligaciones establecidas en el contrato se deben recibir y atender todas las Peticiones, Quejas, Recursos o Sugerencias (PQRS), para lo cual se relaciona a continuación todo lo recibido en la oficina de atención durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2023 y se anexa solución de cada una de las PQRS **(Ver anexo 2).**

CONSOLIDADO P.Q.R MES POR MES				
ITEM	**FECHA**	**NOMBRE**	**P.Q.R**	**TIPO DE SOLICITUD**
1	02 de noviembre de 2023	Juan Diego Sepulveda Moreno	Cobro excesivo del impuesto de Alumbrado Publico	Verbal
2	04 de diciembre de 2023	Martha Isabel Vasco	Cobro del impuesto de Alumbrado Publico en zona Rural	Verbal
3	12 de diciembre de 2023	Libia Rosa Durango	Cobro excesivo del impuesto de Alumbrado Publico	Verbal

UNIÓN TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO

1.3. Vehículo para la operación y Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público.

La concesión cuenta con un vehículo y una motocicleta equipado con los elementos necesarios para la instalación, mantenimiento, adecuación, repotenciación y expansión del Sistema de Alumbrado Publio en todo el territorio urbano y rural del municipio de Urrao.

Cabe resaltar que nuestros vehículos cuentan con todos los documentos legales propios para su libre circulación tales como Tarjeta de Propiedad, SOAT Vigente, Certificado tecno mecánica vigente y adicional póliza de seguro todo riesgo. **(Ver anexo 3)**







1.4. Personal Administrativo y Técnico

Contamos con el personal idóneo y capacitado para realizar cada una de las actividades relacionadas con la prestación del servicio de Alumbrado Público. Este personal está uniformado con calzado y prendas de vestir apropiadas para el buen desempeño de las labores y dotado con los elementos y herramientas necesarias para la atención de las actividades planificadas. **(Ver anexo 4 y 5)**

FOTO DEL PERSONAL

UNIÓN TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO

1.5. Protección y Señalización

Durante las actividades de instalación, mantenimiento, adecuación, repotenciación, modernización y expansión del sistema de alumbrado Publio en todo el territorio urbano y rural del municipio de Urrao, la Concesión está cumpliendo con los mecanismos de protección y señalización en las vías públicas durante la ejecución de las actividades incluyendo la seguridad de los técnicos, vehículos y transeúntes.







1.6. Plan de Manejo Ambiental

El plan de Manejo Ambiental tiene como objetivo mitigar, compensar o eliminar progresivamente en plazos racionales, los impactos ambientales negativos que puede causar el ejercicio de las actividades de mantenimiento y operación del Alumbrado Público en el Municipio. Este se aplica a la reposición, modernización, operación y mantenimiento del sistema de Alumbrado Público del Municipio de URRAO - ANTIOQUIA; que incluyen actividades de reparación de luminarias, reparación de redes eléctricas, instalación de luminarias, construcción de redes eléctricas.

1.7. Plan Anual de Servicio de Alumbrado Público

El Plan Anual de Servicio de Alumbrado Público establecer una guía para la realización de las obras de expansión en el Municipio de Amagá, buscando que el servicio sea consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación, que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del Municipio y garantice la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como peatonales, sobre vías públicas, es decir los senderos peatonales y públicos, calles y avenidas de tránsito vehicular.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 2424 de 2006, los municipios y distritos deben elaborar un plan anual del Servicio de Alumbrado Público que contemple entre otros la expansión del mismo, a nivel de factibilidad e ingeniería de detalle, armonizado con el plan de ordenamiento territorial y con los planes de expansión de otros servicios públicos, cumpliendo con las normas técnicas y de uso eficiente de energía que para tal efecto expidió el Ministerio de Minas y Energía.

De acuerdo al contrato de concesión el Municipio se compromete a expedir anualmente el Plan de Expansiones, bajo criterios jurídicos, técnicos y financieros de la provisión o cálculo del rubro de expansiones dentro del modelo financiero de la concesión.

2. SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SG-SST)

UNIÓN TEMPORAL URRAO ILUMINADO	ACTA DE DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL SG-SST	**Código:** GS-FR-22
		Versión: 01
		Fecha de Vigencia: 01 de julio de 2023

La empresa **UNION TEMPORAL URRAO ILUMINADO** y su representante legal **JUAN CARLOS DUQUE NUÑEZ** toma el compromiso de realizar la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), por tanto, designa como responsable del SG-SST a la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES RYS SAS** identificada con **NIT 900.574.338** con licencia ocupacional N° Resolución 000214 de 04 de agosto del 2017 y su profesional designado, **WILLIAM DAVID BELTRÁN MIRANDA** identificado con Licencia SST **N°202230001115 – Montería** con **vigencia a partir del 02 de Enero de 2023**, quienes realizarán las siguientes funciones:

- Planear, diseñar, organizar, dirigir, desarrollar, mejorar y aplicar el SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año realizar su evaluación.
- Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST y de cualquier necesidad de mejora en materia de seguridad y salud en el trabajo o de recursos necesarios para su implementación y mantenimiento.
- Promover la participación de todo el personal de la empresa, en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
- Contribuir a la promoción de la salud y prevención de riesgos laborales (Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales).

La responsabilidad consistirá en documentar, implementar, ejecutar y controlar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en el ciclo PHVA, así como las responsabilidades inmersas en el perfil que le competen.

CERTIFICACIONES

- Licencia de prestación de servicios de salud ocupacional.
- Contrato Comercial de Servicios
- Curso Virtual de 50 horas del SG-SST

En concordancia a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015 (Artículo 2.2.4.6.8), Soluciones Integrales R Y S S.A.S y *William David Beltrán Miranda* asumirá las funciones establecidas anteriormente, teniendo en cuenta los aspectos y restricciones que haya a lugar en el vínculo contractual establecido.

Se firma en la ciudad de Montería a los **01** días del mes de **Julio** del año **2023**

FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**
Soluciones Integrales R&S ... CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Resolución 000214 de 2017		
Responsable del SG-SST	**Profesional SG-SST**	**Representante legal**

(Ver Anexo 6)

3. GARANTIAS

Dentro del CONTRATO DE OBRA Nro. 04 – 2023 uno de los compromisos adquiridos son las garantías las cuales el concesionario de comprometer a constituir a favor del CONTRATANTE (EMPRESAS PUBLICAS DE URRAO E.S.P) las cuales se deben mantener vigentes durante la duración del contrato, estas garantías son:

a. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
b. Póliza de Cumplimiento

(Ver anexo 7)

4. CENSO DE INFRAESTRUCTURA

La unión temporal en los meses de julio y agosto desarrollo las actividades de levantamiento de la infraestructura (censos) en toda el área urbana y rural del Municipio de Urrao los cuales quedaron de la siguiente manera. **(Ver anexo 8)**

CENSO INFRAESTRUCTURA MUNICIO URRAO - LUMINARIAS		
TECNOLOGIA	**POTENCIA**	**CANTIDAD DE LUMINARIAS**
LED	100	4
	200	6
	50	129
	56	2
	90	19
SODIO	150	54
	250	3
	70	1000
TOTAL		**1217**

UNIÓN TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO
901.716.870-3

"SERVICIO, GESTIÓN Y CALIDAD"

¡Porque hacemos parte de ti!


BARRIO/VEREDA	ZONA		CANTIDAD DE LUMINARIAS
	RURAL	URBANA	
20 DE JULIO		84	84
ALEU		75	75
BARRIO OBRERO		12	12
BUENOS AIRES		64	64
CRISTO REY		57	57
DOLIBETH		4	4
EL CENTRO		142	142
EL CHUSCAL		1	1
EL FOVIS		56	56
EL GUAYABITO		8	8
EL LLANO		46	46
EL PASO		7	7
EL PROGRESO		28	28
GUAPANTAL		20	20
HOYO RICO		3	3
JAIPERA		62	62
LA CANOA		7	7
LA ENCARNACION	26		26
LA HONDA		5	5
LA LUCIA		1	1
LA MONTA		2	2
LA PLAZUELA		92	92
LA QUEBRADITA		32	32
LA RONDA		6	6
LA SAN JOSE		38	38
LA ULTIMA LAGRIMA		8	8
LA VARIANTE		29	29
LA VENTA		6	6
LA VUELTA		34	34
LAS ORQUIDEAS		65	65
LAURELES PARTE ALTA		24	24
LAURELES PARTE BAJA		17	17
LOS BARRANCOS	5		5
LOS CHORRITOS		41	41
MIRADORES DEL PENDERISCO		4	4
MORAVIA		28	28
OROBUGO		2	2
PATIO BONITO		27	27
SAN AGUSTIN		25	25
SAN BARTOLOME		18	18
SAN FERNANDO		3	3
TARRO LISO		3	3
TOTAL GENERAL	**31**	**1186**	**1217**

Carrera 15B No. 52-53 Barrio Monteverde
Tel: (604)789 71 88 – 300 661 00 31
Email: gealumbradopublico@hotmail.com
Montería - Córdoba

UNIÓN TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO
901.716.870-3

"SERVICIO, GESTIÓN Y CALIDAD"

¡Porque hacemos parte de ti!

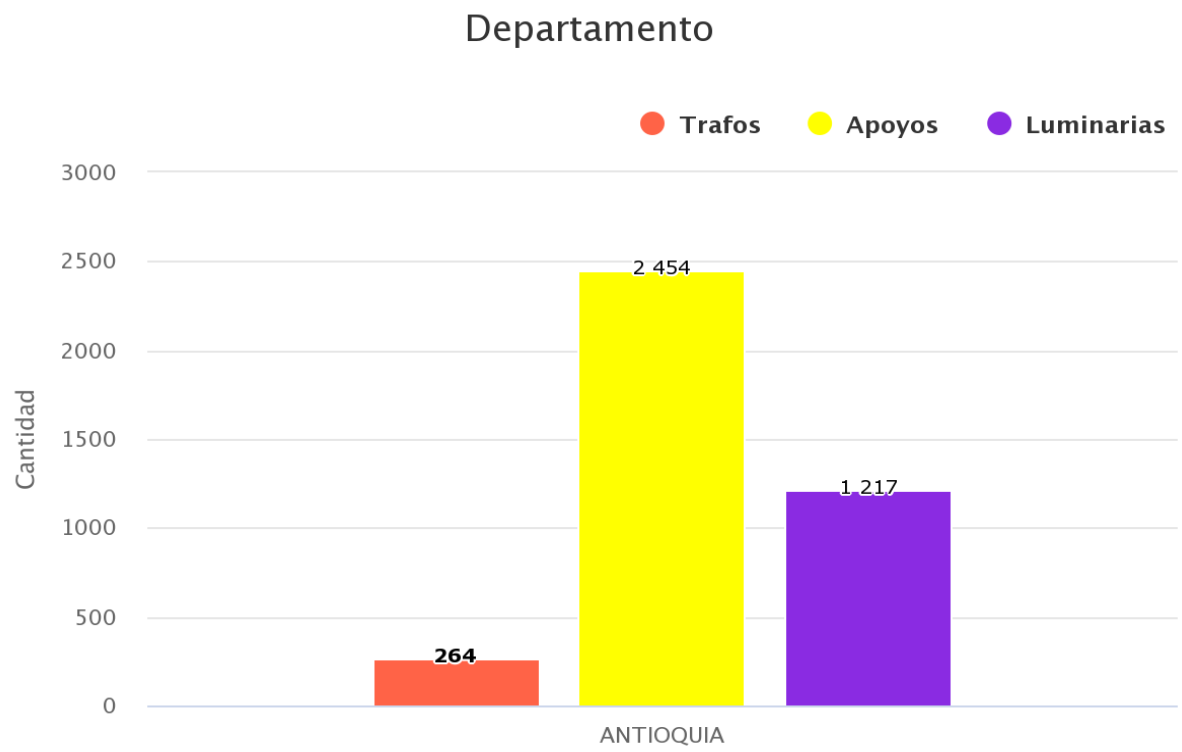


UNIÓN TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO


Carrera 15B No. 52-53 Barrio Monteverde
Tel: (604)789 71 88 – 300 661 00 31
Email: gealumbradopublico@hotmail.com
Montería - Córdoba

UNIÓN TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO
901.716.870-3

"SERVICIO, GESTIÓN Y CALIDAD"

¡Porque hacemos parte de ti!

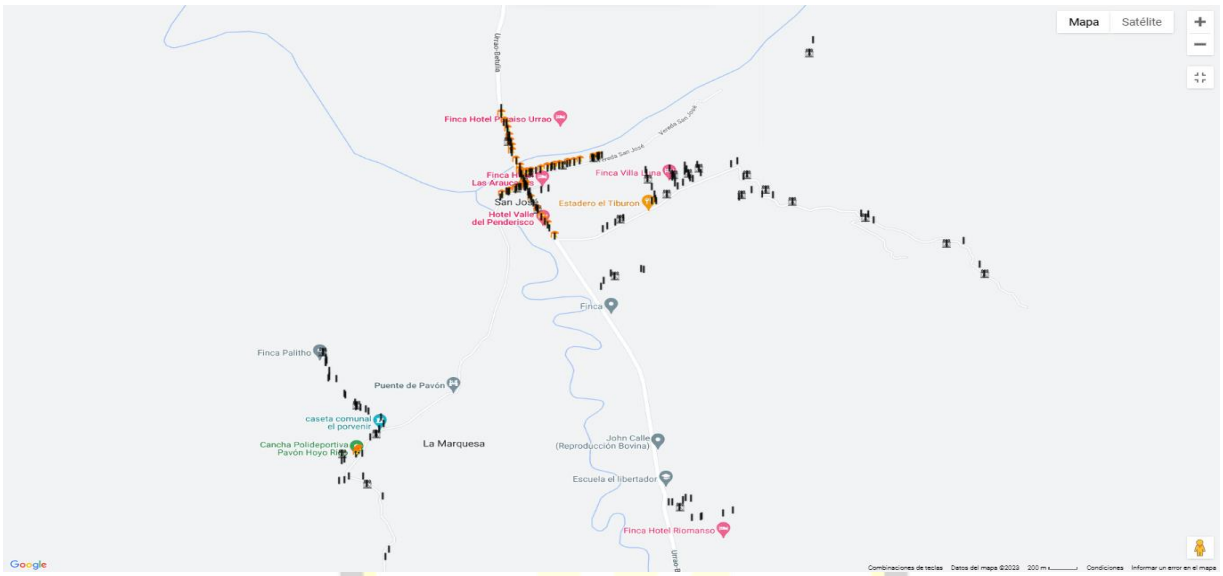

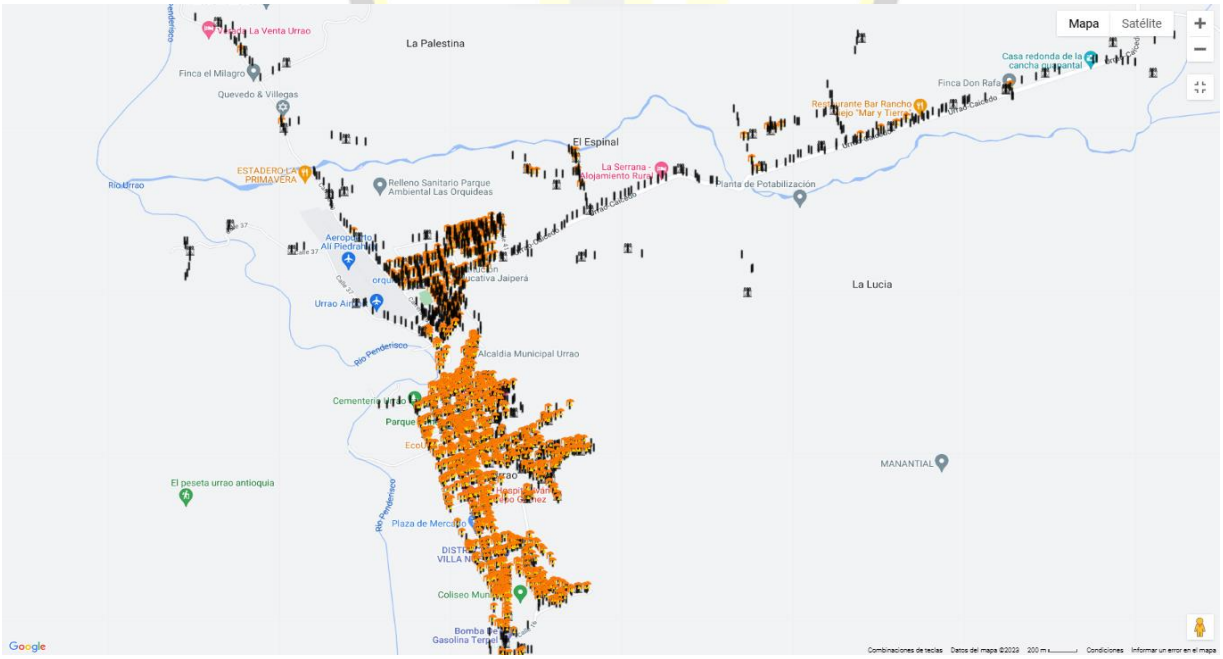

Carrera 15B No. 52-53 Barrio Monteverde
Tel: (604)789 71 88 – 300 661 00 31
Email: gealumbradopublico@hotmail.com
Montería - Córdoba

5. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO

Dentro de las actividades a desarrollar por la UNION TEMPORAL URRAO ILUMINADO, se encuentra la modernización del sistema de Alumbrado público que se encuentra actualmente instalado en el municipio de Urrao, durante el mes de Septiembre y Octubre la UNION TEMPORAL URRAO ILUMINADO desarrollo las actividades de modernización a luminarias LED del parque lumínico del MUNICIPIO DE URRAO – ANTIOQUIA, cabe resaltar que el inventario inicial del sistema de alumbrado público es el siguiente:

(Ver anexo 9 y 10)

INVENTARIO		
LUMINARIA NA 70W	UNID.	851
LUMINARIA NA 150W	UNID.	202
LUMINARIA NA 250W	UNID.	-
LUMINARIA NA 400W	UNID.	-
LUMINARIA LED 20-60W	UNID.	48
LUMINARIA LED 60-80W	UNID.	99
LUMINARIA LED 80-120W	UNID.	28
LUMINARIA LED 120-160W	UNID.	-
LUMINARIA LED 160-260W	UNID.	10
LUMINARIA LED 40-80W SOLAR	UNID.	-
TOTAL		**1,238**

El sistema de alumbrado público después de terminada la modernización es el siguiente

MUNICIPIO DE URRAO - ANTIOQUIA
RESUMEN DE INVERSIÓN

ITEM UCAP	CANTIDAD
LUMINARIA LED 20-60W	1,251
LUMINARIA LED 60-80W	252
	1,503

Se presenta el detalle de las luminarias LED instaladas finalizadas las actividades de MODERNIZACION del SISTEMA alumbrado público del Municipio de URRAO - ANTIOQUIA.

TIPO DE LUMINARIA	TOTAL A INSTALAR	INSTALADAS A SEPTIEMBRE 30 DE 2023 ACTA AVANCE Nr. 001	INSTALADAS A OCTUBRE 12 DE 2023 ACTA AVANCE Nr. 002	INSTALADAS A OCTUBRE 27 DE 2023 ACTA AVANCE Nr. 003	TOTAL AVANCE INSTALACION	PORCENTAJE DE EJECUCION
LUMINARIA LED 20-60W	1251	632	415	204	1251	100,00%
LUMINARIA LED 60-80W	252	121	82	49	252	100,00%
TOTAL	1503	753	497	253	1503	100,00%

UNIÓN TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO
901.716.870-3

"SERVICIO, GESTIÓN Y CALIDAD"

¡Porque hacemos parte de ti!

A continuación, se presenta el detalle de las luminarias LED instaladas en la modernización por BARRIO/VEREDA.


MODERNIZACION LUMINARIAS LED MUNICIPIO DE URRAO JULIO - DICIEMBRE 2023							
BARRIO/VEREDA	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
20 DE JULIO	0	0	1	116	0	0	117
AGUACATES	0	0	0	6	0	0	6
ALEU	0	0	17	82	0	0	99
ARENALES	0	0	0	16	0	0	16
BARRIO OBRERO	0	0	15	2	0	0	17
BUENOS AIRES	0	0	21	53	0	0	74
CRISTO REY	0	0	5	68	0	0	73
DOLIBETH	0	0	0	7	0	0	7
EL CENTRO	0	0	92	16	0	0	108
EL FOVIS	0	0	60	7	0	0	67
EL GUAYABITO	0	0	0	17	0	0	17
EL LLANO	0	0	64	15	0	0	79
EL PASO	0	0	0	8	0	0	8
EL PROGRESO	0	0	7	35	0	0	42
EL SALVADOR	0	0	0	3	0	0	3
GUAPANTAL	0	0	0	35	0	0	35
HOYO RICO	0	0	0	16	0	0	16
JAIPERA	0	0	41	23	0	0	64
LA ANA	0	0	0	1	0	0	1
LA CANOA	0	0	8	0	0	0	8
LA LUCIA	0	0	0	11	0	0	11
LA MONTA	0	0	0	13	0	0	13
LA PLAZUELA	0	0	97	7	0	0	104
LA QUEBRADITA	0	0	11	9	0	0	20
LA RONDA	0	0	6	0	0	0	6
LA SAN JOSE	0	0	0	70	0	0	70
LA ULTIMA LAGRIMA	0	0	9	0	0	0	9
LA VARIANTE	0	0	32	3	0	0	35
LA VENTA	0	0	0	16	0	0	16
LA VUELTA	0	0	25	1	0	0	26
LAS ORQUIDEAS	0	0	67	33	0	0	100
LAURELES PARTE ALTA	0	0	26	0	0	0	26
LAURELES PARTE BAJA	0	0	22	2	0	0	24
LOS CHORRITOS	0	0	24	0	0	0	24
MIRADORES DEL PENDERISCO	0	0	4	0	0	0	4
MORAVIA	0	0	37	0	0	0	37
PATIO BONITO	0	0	20	18	0	0	38
PAVON LA CONCENTRACION	0	0	0	2	0	0	2
PAVON LA PRIMERA	0	0	0	4	0	0	4
SAN AGUSTIN	0	0	16	14	0	0	30
SAN BARTOLOME	0	0	23	0	0	0	23
SAN FERNANDO	0	0	0	2	0	0	2
SAN JOSE MONTAÑITAS	0	0	0	19	0	0	19
TARRO LISO	0	0	3	0	0	0	3
TOTAL	0	0	753	750	0	0	1503

Carrera 15B No. 52-53 Barrio Monteverde
Tel: (604)789 71 88 – 300 661 00 31
Email: gealumbradopublico@hotmail.com
Montería - Córdoba

UNIÓN TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO
901.716.870-3

"SERVICIO, GESTIÓN Y CALIDAD"

¡Porque hacemos parte de ti!

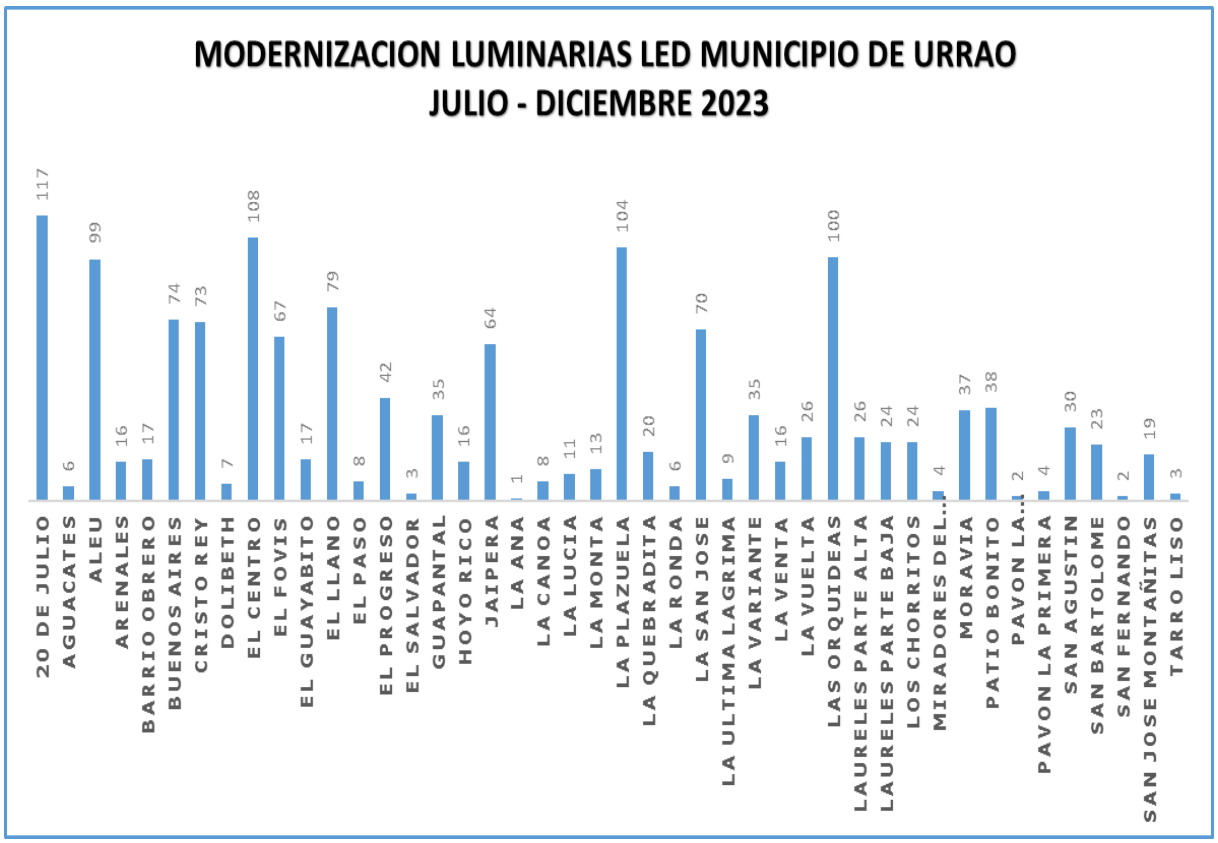

URRAO
ILUMINADO


Carrera 15B No. 52-53 Barrio Monteverde
Tel: (604)789 71 88 – 300 661 00 31
Email: gealumbradopublico@hotmail.com
Montería - Córdoba


UNIÓN TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO
901.716.870-3

"SERVICIO, GESTIÓN Y CALIDAD"

¡Porque hacemos parte de ti!

Se presenta mapa del parque lumínico al finalizar la modernización en el MUNICIPIO DE URRAO- ANTIOQUIA

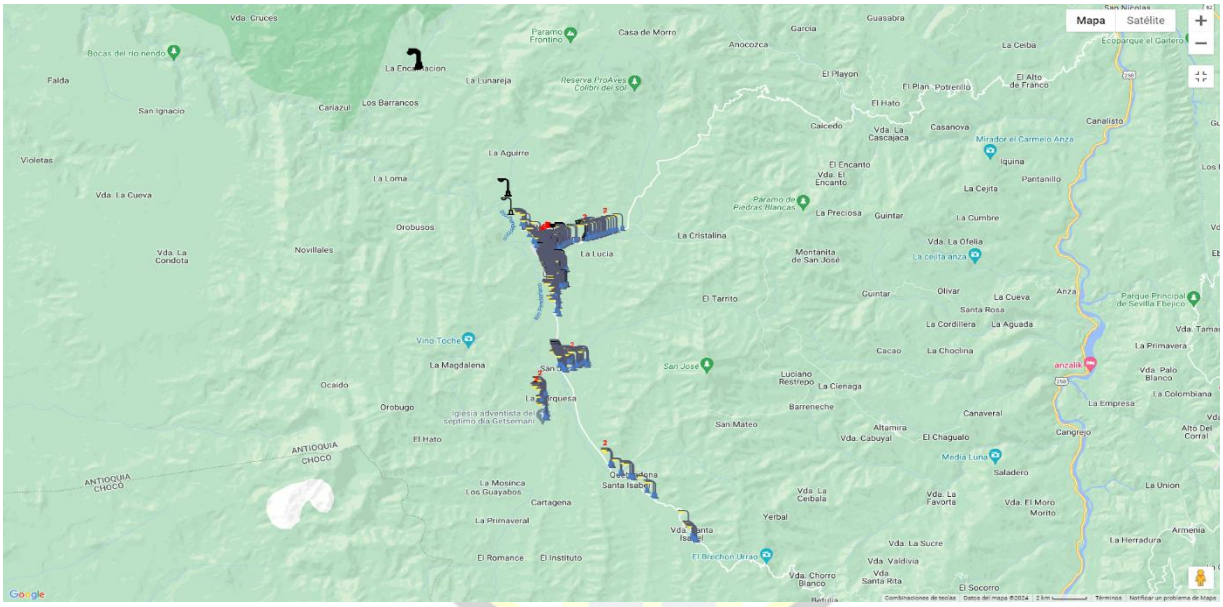

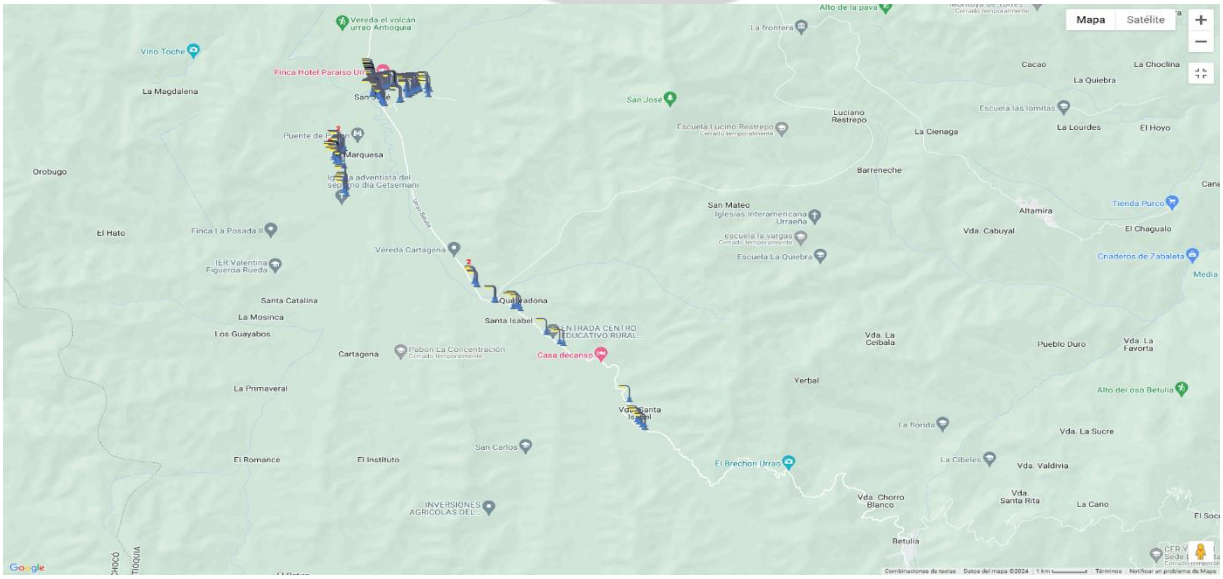

Carrera 15B No. 52-53 Barrio Monteverde
Tel: (604)789 71 88 – 300 661 00 31
Email: gealumbradopublico@hotmail.com
Montería - Córdoba

UNIÓN TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO
901.716.870-3

"SERVICIO, GESTIÓN Y CALIDAD"

¡Porque hacemos parte de ti!



UNIÓN TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO

Carrera 15B No. 52-53 Barrio Monteverde
Tel: (604)789 71 88 – 300 661 00 31
Email: gealumbradopublico@hotmail.com
Montería - Córdoba

6. MANTENIMIENTOS SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO


Dentro de las obligaciones relacionadas con la adecuación y el mantenimiento la UNION TEMPORAL URRAO ILUMINADA realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes e infraestructuras destinadas para la prestación del servicio de Alumbrado público a continuación se detallan los mantenimientos correctivos a luminarias de Sodio y otras tecnologías en los meses comprendidos de Julio de 2023 hasta Diciembre 2023. **(Ver anexo 11)**

DESCRIPCION DE TIPOS DE ORDENES ATENTIDAS MUNICIPIO URRAO 2023							
DESCRIPCIÓN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INSPECCION OCULAR	0	1	0	0	0	0	1
MODERNIZACION	0	0	0	0	0	0	0
INSTALACION NUEVA DE REFLECTOR	0	0	0	0	0	0	0
INSTALACION POR RETIRO TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0
INSTALACION TEMPORAL	0	0	0	4	0	1	5
MTTO CORRECTIVO POR REPORTE EXTERNO	6	102	14	0	0	0	122
MTTO CORRECTIVO POR REPORTE INTERNO	76	39	9	1	2	1	128
MTTO PREVENTIVO	0	0	0	0	1	0	1
PODA	0	5	0	0	0	0	5
RECORRIDO DIURNO	0	5	7	0	2	2	16
RECORRIDO NOCTURNO	0	4	0	0	3	2	9
RETIRO DE LUMINARIA PERMANENTE	0	0	0	0	0	0	0
RETIRO DE LUMINARIAS TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0
RETIRO TEMPORAL POR DAÑO	0	0	0	0	3	2	5
REUBICACION DE LUMINARIA	0	0	0	0	11	0	11
TOTAL ORDENES ATENDIDAS	82	156	30	5	22	8	303

UNIÓN TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO
901.716.870-3

"SERVICIO, GESTIÓN Y CALIDAD"

¡Porque hacemos parte de ti!

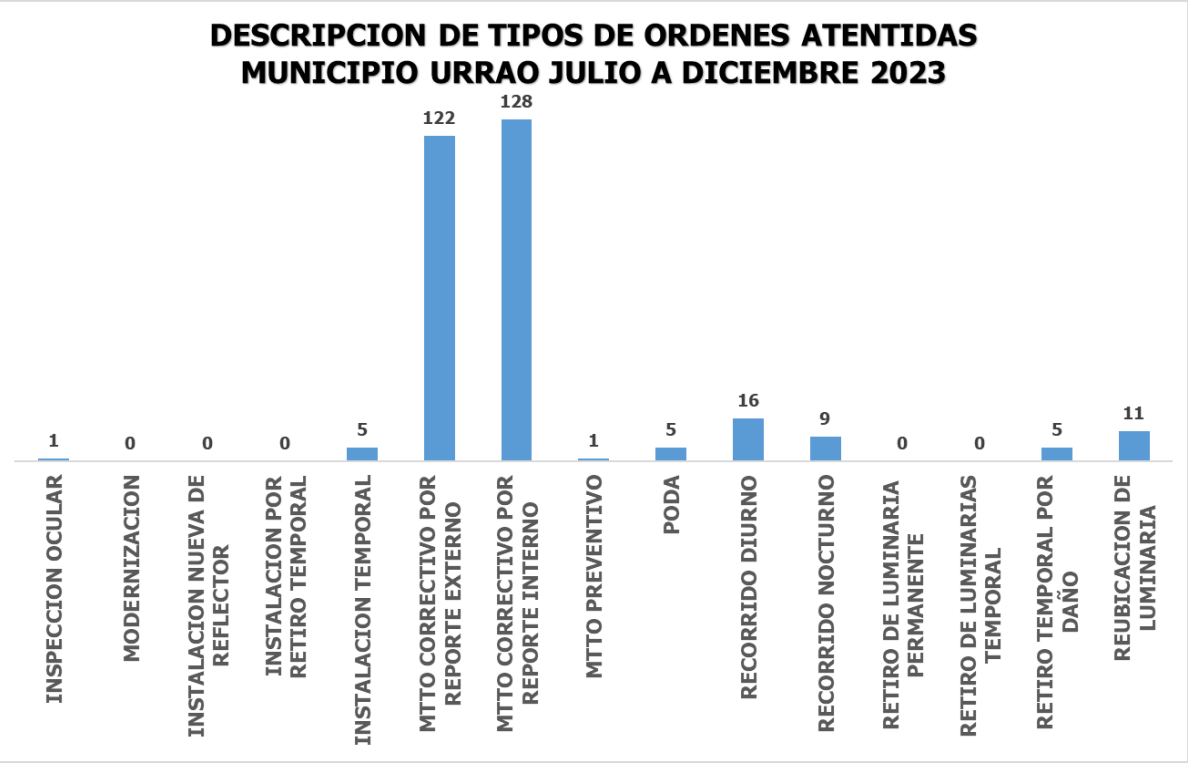

UNIÓN TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO

Carrera 15B No. 52-53 Barrio Monteverde
Tel: (604)789 71 88 – 300 661 00 31
Email: gealumbradopublico@hotmail.com
Montería - Córdoba

UNIÓN TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO
901.716.870-3

"SERVICIO, GESTIÓN Y CALIDAD"

¡Porque hacemos parte de ti!

A continuación, se presenta resumen de todos los mantenimientos correctivos atendidos, clasificados por Barrio y/o Vereda.


RESUMEN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS MUNICIPIO URRAO							
BARRIO/VEREDA	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
LA VENTA	2	2	0	0	0	0	4
EL CENTRO	8	13	4	0	0	0	25
LAS ORQUIDEAS	7	1	2	0	0	0	10
PATIO BONITO	3	1	0	0	0	0	4
JAIPERA	2	6	1	0	0	0	9
LA PLAZUELA	7	12	6	1	0	0	26
LA LUCIA	1	1	0	0	0	0	2
20 DE JULIO	12	5	0	0	0	0	17
EL FOVIS	7	10	0	0	0	0	17
LA CANOA	2	3	0	0	0	0	5
LA RONDA	1	0	0	0	0	0	1
CRISTO REY	1	3	2	0	0	0	6
ALEU	8	17	1	0	0	0	26
EL PROGRESO	9	1	0	0	0	0	10
EL LLANO	2	9	1	0	0	0	12
BUENOS AIRES	1	14	1	0	2	0	18
LA MAGDALENA	2	0	0	0	0	0	2
BARRIO OBRERO	3	2	0	0	0	0	5
LA SAN JOSE	4	11	0	0	0	0	15
CALLE DEL BOLLO	0	1	0	0	0	0	1
TARRO LISO	0	2	0	0	0	0	2
LAURELES PARTE BAJA	0	5	0	0	0	0	5
SAN AGUSTIN	0	5	0	0	0	0	5
MORAVIA	0	1	1	0	0	0	2
EL GUAYABITO	0	5	0	0	0	0	5
LA VARIANTE	0	9	0	0	0	0	9
EL PASO	0	1	0	0	0	0	1
LA QUEBRADITA	0	1	2	0	0	1	4
BALBOA	0	0	1	0	0	0	1
SAN JUDAS	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL	82	141	23	1	2	1	250

Carrera 15B No. 52-53 Barrio Monteverde
Tel: (604)789 71 88 – 300 661 00 31
Email: gealumbradopublico@hotmail.com
Montería - Córdoba

UNIÓN TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO
901.716.870-3

"SERVICIO, GESTIÓN Y CALIDAD"

¡Porque hacemos parte de ti!

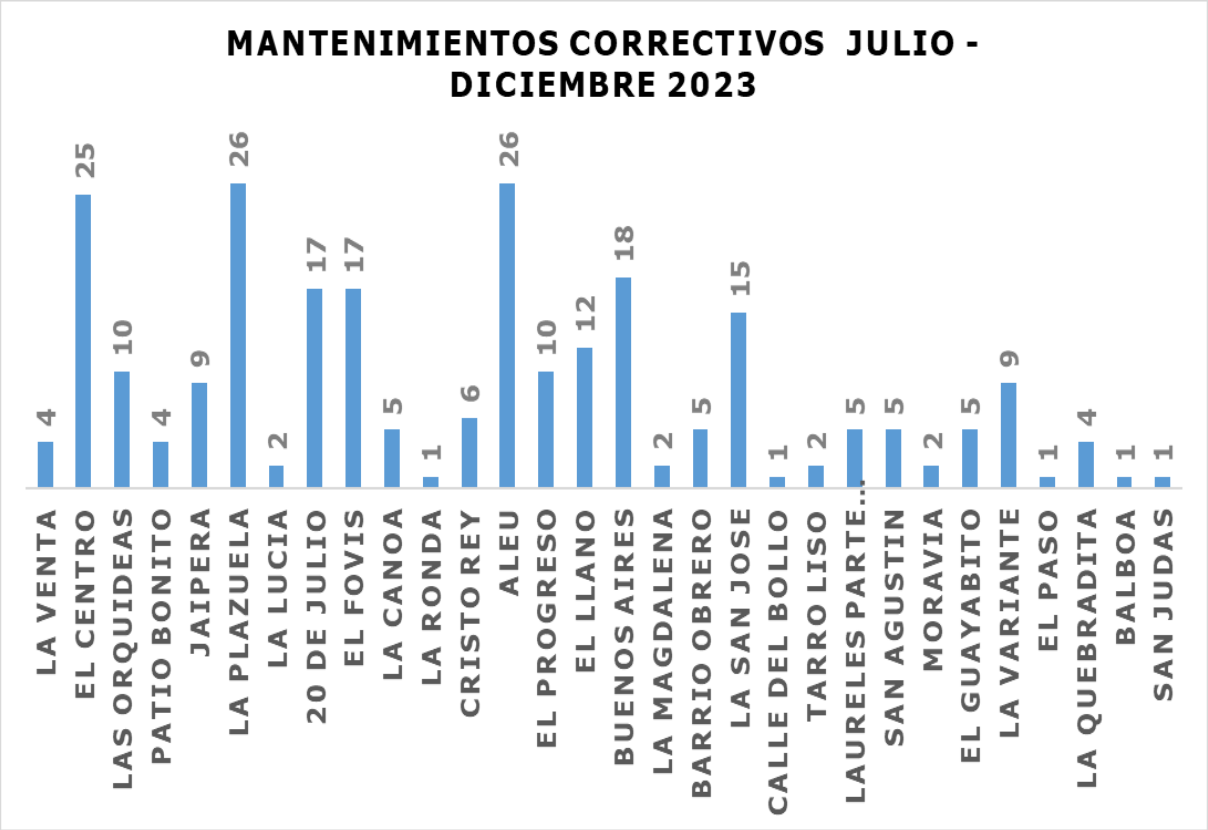

Teniendo en cuenta la información anterior, es posible evidenciar que en los barrios Aleu, La Plazuela y el Centro, se presento el mayor número de reportes atendidos entre los meses de julio de 2023 y Diciembre 2023.

Carrera 15B No. 52-53 Barrio Monteverde
Tel: (604)789 71 88 – 300 661 00 31
Email: gealumbradopublico@hotmail.com
Montería - Córdoba
