Lunes 13 de Marzo de 2023

En el día de hoy se empezo con
Sacar los encofrados en las sitios de
la Carrera, sitio el Tesoro, sitio Panama
y sitio Jose Hilario Lopez con central
ayuda se negocio 3 Volqueta, de 6 m³ de
el concreto en el día de hoy estuvieron
El Maestro Julio Alberto Medina cc. 3219612354
ayudante Oscar Alexander Arrieta Diaz cc. 1005722510
Jornalero Barreiro Fernandez cc. 1083840784
Marco Aurelio Gonzalez cc. 1079182420
Fabian Yasno Bermeo cc. 1079186843

Residente de obra.

Interventoria

Sábado 11 de Marzo de 2023.

Clima: Soleado
Personal: : maestro: 5 ayudantes, residente de obra.

Equipo: Herramienta menor.
Actividades: En la sede Encarnación continuamos con trabajos de armado de columnas con fleges. Continuamos durante la jornada con la remocion de escombros.
En la sede Ariela: El técnico electrico continúa diagnosticando la red eléctrica para poder intervenirla y realizar las instalaciones de lámparas, tomas e interruptores acordes al desarrollo del proyecto.

Residente de obra.

Interventoría

Viernes 10 de Marzo de 2023

clima: soleado
Personal: : maesho: 5 ayudantes, residente de obra, residente interventoría.

Equipo: Herramienta menor.
Actividades: Continuamos con el personal en la sede encamacion con el amarre de flejes en las columnas, tambien se realizan actividades con el personal para el retiro de escombros, acopiando material en la parte exterior para facilitar el cargue a la volqueta.
En la sede aledaña continuamos con actividades de desmonte de teja; el personal o tecnico electri visita la sede y realiza trabajos de diagnostico de las redes instaladas.

Residente de obra

Interventora

Jueves 09 de Marzo de 2023

Es un día lluvioso con tempestad, todo el día llovio, en el día de hoy se estuvo terminando de armar dos castillos y los formaletas para la fundición de las columnas, tambien se estuvo alineando los fleies de la columna y se estuvo alineando la columna en las demas Jardines se estuvo sacando la arena para Rifleha y se estuvo trayendo la arena

En el sitio de obra se encuentra cemento, arena, grava, asi mismo hay 100 bultos de cemento

Residente de obra

Interventoría

Miercoles 08 de Marzo de 2023

clima: Soleado
personal: 1 maestro, 4 oficiales, 5 ayudantes, dos residentes de obra, dos residentes de interventoría, almacenista

Equipo: Mezcladora y herramienta menor
Actividades: Se realiza armado de viga de cimentacion columnas y se deja columneta para instalacion de puerta de acceso a patio por el lado de este muro, segun solicitud por oficio dado por la institucion. el dia 3 de marzo. En la sede Encarnacion Se realiza el proceso de fundicion de viga de cimentacion y zapatas para este muro.
Se realiza prueba de asentamiento y se toman muestras de concreto. de la viga y zapatas. en la sede encarnacion.
Se realiza recorrido por las sedes para la realizacion de acta. entre los puntos tratados se recalca el retraso en las actividades ejecutadas hasta el momento en las cinco sedes en las cuales sucede esto a la fecha.
Se solicita: una plan de choque para poder nivelar las actividades programadas.
Igualmente se solicita el retiro de escombros de las instituciones lo cual no se ha realizado hasta la fecha segun compromiso adquirido. mediante actas de comites

Visto el
R.O

Interventoria.

Martes 07 de Marzo de 2023

Fue un dia lluvioso en horas de la Mañana.
y en horas de la tarde un dia Nublos
en el Frente de obra estan presentes 10 trabajadores
1 Maestro de obra, 2 oficiales y 7 ayudantes,
ellos se encuentra afiliados a Salud y a riesgos
en el dia de hoy llegaron - 6 Camiones Para las
tomas de muestras de Concreto que se va ha
a realizar en la Fundicion de las Vigas y columnas
en la sede de encarnacion. en el sitio de obra
se cuenta con una Mezcladora de Concreto, Pala,
Picas alambre. No se alcanzo a fundir en el dia
de hoy Para Poder dejar todo nivelado y organizado
los castillos.

Revisando el avance dado. se presenta un atraso de acuerdo al cronograma de obra presentado en 5 sedes. las cuales a la fecha deberian estar entregadas. las cuales son: La sede encarnacion de la institucion Eugenio falla; la sede Central mixta de la institucion Jose Hilario Lopez; la sede Delia feno falla de la institucion educativa Ecopetrol; la sede Panama de la institucion educativa Ecopetrol; la sede cincuentenario de la institucion educativa Jose Hilario Lopez.
y las tres institucines que son la sede central de la institucion educativa Eugenio falla; la sede Jardin de la institucion educativa Jose Hilario Lopez; y la institucion educativa Eugenio feno falla sede Arcelia son las unicas que hasta la fecha se encuentran acorde al cronograma de actividades.
Se hace necesario realizar un plan de choque por parte del contratista para poder nivelar las actividades programadas dentro del cronograma de actividades presentado.

R.D

Interventoria

Jueves 06 de Abril de 2023

En el día en la sede de Encarnación se encuentra armando las Castillas de las Zapatas de las Vigas de cimentación y las Columnas. Las Columnas quedan de 3,65 m distancia de cada Fleje cada 0,20 m. Las Varillas Longitudinales de las Columnas fueron de 4 Varillas de 1/2 y 4 Varillas de 5/8 c/ 0.20 Las dimensiones de la Zapata.

Estado de Antioquia Sede Las Vegas

No se observo actividad con personal en las sedes restantes como lo son cincuentenario, el Jardín, central mixta, Delia, Panama, Arcelia. No se observa igualmente como material la teja comprada.

Interventora

Residente de Obra.

Sabado 4 de Marzo de 2023

En el dia de hoy se termino de
Fundir en todos los ejes los Pisos, menos el de encamación
Sin ningun Contratiempo, En el dia
de hoy se esta haciendo aseo a las
alas, se esta dejando Limpia la
obra con el Proposito de dejarla
aseadas. Todos los Pisos se fundieron menos encamación
y los trabajadores han Cumplido
con el uso de la Planta de Fundir
los Pisos, la Mezcladora de concreto
y las herramientas se contaron Sin
ningun Contratiempo.

Es importante la toma de la muestra de concreto para poder medir el grado de resistencia requerida de acuerdo a la especificacion dada.

Victor Rafael
R.O

Interventora

Viernes 3 de Marzo de 2023

En el dia de hoy se continua con la misma labor del dia anterior con la revision en las oficinas de la interventoria segun lo cantidades de obra

Tambien se sigue fundiendo el concreto de los pisos en las zonas de la encamacion, Parqueo, Jardineria zona central y en la fuente.
Para la fundicion de los suelos en los pisos se cuenta con los elementos de construccion como cemento, la parrilla de acero, la mezcladora de concreto gravilla y arena. Para la fundicion

En el dia de hoy no se presento ningun contratiempo laboral

Vicky Andrea
Residente Obra

Interventoria

Jueves 02 de Marzo de 2023

En el dia de hoy se reunio los residentes de interventoria y de obra en las oficinas de la interventoria con el proposito de sacar y unificar las cantidades de obra en el Municipio de campo alegre.

Tambien en el dia de hoy se dieron Fundiendo los pisos en la sede de Alba y en la sede de Jose eustaco sede central en ambos sitio se encuentra Material como elemento, Arena y grava y demas Para la fundicion del Piso se le esta Colocando la Malla electrosoldada tambien se estara tomando Muestra del concreto Para la fundicion. en las sedes de encarnacion y demas Fundiciones necesarias

Victor Daniel Toro
Residente Obra

Interventoria

Miercoles, 01 de Marzo de 2023

En el dia de hoy se estuvo fundiendo
los Pisos del Colegio Sede Panama
en esta sede se fundio la totalidad
de los pisos.
Asimismo se estuvo armando los castillos
que hicemos y se estará fundiendo la
viga de cimentacion para los proximos dias.

En el sitio de obra se encuentra los
andamios, el roto martillo y las herramienta
Menores. Sigue en el area de trabajo
lo trabajadores con su respectivo
elementos de proteccion de trabajo.

Se realiza recorrido para verificar avance y cantidades de obra, se ve. que hay falta de personal para el desarrollo de las actividades en todos los frentes.
Se realiza la observacion de revisar cronograma de trabajo ya que se evidencia con la visita que entra. en un retraso en relacion con las actividades programados.
Se reitera el retiro inmediato de los escombros de todos lo sedes intervenidas ya que fue parte del compromiso dado segun el acta realizada el dia 21 de febrero., igualmente la entrega de las actas de los materiales desmontados. y entregados al coordinador o rector de cada institucion.

Interventoria

Victor Manuel
Residente Obra

Martes 028 de Marzo de 2023

En el Jardín infantil de encarnación se empezó con las actividades de abertura de la brecha de las columnas y viga de cimentación y también se hizo de tumbar la totalidad del muro, en el día de hoy se encuentra 1 maestro 4 oficiales y 4 ayudantes

En el día de hoy en el sitio de obra están los cadenero, el rolo martillo, Herramienta Menor, cinta. ha sido un día Soleado y se presento la interventoría con ella se coordinaron actividades sacando las cantidades de obra en todos los Jardines infantiles estuvo. haciendo los ejercicios de cantidades de obra

Residente Obra

Interventoría

Lunes 27 de Febrero 2023

En el día de hoy la obra se encuentra Normal, en sitio de la obra llegaron 30 bultos de cemento, Acero, tuberia llego Arena, Ramon, Ferro Varilla, encargados JOSE Estructuras del centro en ella les llego 5 cubos de Mixto y 5 cubos de grava triturada.
En el día de hoy se comenzaron los Aferrados y en la Fundición intermedia se comenzaron las cubiertas.

En la obra se encuentra trabajando 8 Personas 1 Maestro 5 Oficiales y 2 Ayudantes.

Se recomienda la ubicación adecuada de los materiales dentro de cada institución con su respectiva señalización para evitar futuros accidentes con la comunidad estudiantil.

Interventoria

Visto y aprobado
R.D

Sabado 25 de febrero de 2023

En el dia de hoy se llevo el pago de la quincena a los 12 trabajadores en el pago de los 2 vigilantes, 6 oficiales y 8 ayudantes.
En las 3 horas del Jornal se pago el personal.
El dia no pudimos tener contratiempos todos se pago el personal como Jornal laboral.

Victoria de la R.D

Interventora

Viernes 24 de Febrero de 2023

en la sede de Sabanalarga Felicia (Sede Arcolis)
se recogieron 60 tejas y 56 cachillas
la dimensiones de las tejas son de
1.86 x 2,43m.
tambien se recogio 56 cachillas de 1.14±0,30

En Sabanalarga Felicia se toco bajar y
desmontar los tanques de Agua
las alturas de los muros se toco desmontarlas
aumentando la cantidad de escombros
tambien se hizo la desmantelacion
de las instalaciones electricas y los
tomas corrientes de cada uno ellos
si tros.

Se desmontan los cielofalsos alrededor por fachada necesarios para poder realizar los desmontes de cubierta Se recuerda realizar las actas de entrega de materiales desmontados al señor rector de cada institucion para que ellos dispongan de estos materiales.

Victoria del Prof
R. O

Interventoria

Jueves 23 de Febrero

Es un día despejado y soleado en la
obra de salidas Felices otra 8 personas (Catalina)
2 maestros y 6 ofrenda y 2 ayudantes
todos ellos tienen elementos de seguridad
y con las herramientas menores como
destornilladores, martillo, cuadrados, sinceles,
alicates.

En labores en Salidas Felices el personal (Catalina)
labores de desmonte de toda la cubierta en la
área de los 2 salones, los baños, en la sala
de informática y el kiosko.

asimismo en los demás frentes se
está laborando normalmente sin ningún
inconveniente.

Es importante que para el manejo del desmonte de las cubiertas, se tenga los respectivos cursos de alturas y los elementos necesarios para el desarrollo correcto de la actividad.

Interventoría

R-O

Miercoles 22 de Febrero

En el dia de hoy se inicio trabajos en el Jardin llamado Felices, en sabado Felices comenzaron el desmonte de todas las cobertas.
En el sitio de obra se encuentra los andamios y elementos de seguridad para los trabajadores.

En Conjunto de la interventoria se observo Mayor Cantidad de escombros en el desmonte de la obra.

Tambien en el dia de hoy se esta terminando el desmonte de la cobertura en las demas sedes del municipio.

R.O.

Interventora

Martes 21 de febrero de 2023

En horas de la mañana se presentaron los residentes y los residentes de interventoría junto con los de obra. En horas de la mañana se hizo la visita a los jardines infantiles Fenix Falla, la arcadia y panamericano, en cada uno de ellos también se hizo presente los rectores, los coordinadores durante de la visita se recomendó que los colores de los piso no fueran oscuros. La profesora de encargada solicito que las ventanales sean grandes y gentil así mismo solicito una puerta en el aula posterior.

Los residentes de interventoría hicieron las actas de obra en las horas de la tarde se hicieron las visitas de los demas jardines infantiles y se encontraron que se encuentra laborando normalmente. en cada uno de ellos

Durante el recorrido se revisa el avance de obra, y se solicita el retiro de los escombros en cada una de las instituciones intervenidas ya que son un riesgo para la comunidad estudiantil su almacenamiento. Se deja compromiso en acta.

Interventora

Vigilancia
R-d

Junes 20 de Febrero de 2023

El día de hoy se encuentra desperfecto y se inicia labores en los 7 jardines, en la sede del Sabio los Felices no se ha iniciado porque no se han entregado las llaves y en el sitio se necesita un vigilante para el cuidado de los bienes y se arrancara labores el día sabado se piensa arrancar el Jueves.

En todos los jardines en labores de desmonte de piso, de ventana y cielo raso.

En la fecha conocida como Sabados de Ires hay material pedagogico y se esta esperando que los docentes los desmonte los pedimos el favor de desocupar el salon de informatica. en el dia de hoy se cuenta con 12 trabajadores con Herramienta menor y un poco martillo.

Es necesario llevar un acta como inventario donde conste los materiales o elementos dejados en cada area de trabajo. Asi mismo es necesario llevar a cabo un acta de entrega de los materiales desmontados como ventiladores, ventanas fega. y demás elementos electricos para ser entregado al rector de la institución para que el disponga de ellos.

Vigilante
R.D

Interventoria

Sábado 18 de febrero de 2023

En el día de hoy se encuentra fundido un día soleado, se abrió frente de obra en el Ferro Falla, en la encarnación en la silla Pensum y en el Jose cuervo sede central en el día de hoy se esta trabajando desde las 7 AM hasta las 11 AM. es orden de eliminación de cobertor Piso.

Es necesario estar pendiente del personal, para el uso de los elementos de dotación personal. Verificar las herramientas antes de ser usadas para garantizar su buen funcionamiento.. Como recomendación llevar un cuadro de clima

R. U

Interventoria

Viernes 17 de febrero de 2023

Se encuentra despejado no se ha venido presentado ningun contratiempo y en los colegios Aeronautica y la encuesta se encuentro con el mismo personal, a la interventoria se le entrego la seguridad social de los trabajadores que esta trabajando

Enesta dia se ingresaron tres nuevos personas para empezar en el colegio Jose Eustacio Rivera central. estas 3 personas que se suman a 2 oficiales 1 ayudante. Asi mismo ellos cuenta con herramienta menor como el martillo, barra, y como herramienta tambien cuenta con un roto martillo para las demoliciones del piso.

Se hace hincapie en acordar en cada institucion el lugar adecuado para el almacenamiento de los escombros, con la respectiva senalizacion

Vicente Ortiz
R.O

Interventoria.

Jueves 16 de Febrero de 2023

Se inicio obra en el Perro Feliz, se empezo con la demolicion de pisos y demonte de ventanas ha sido un dia tranquilo como hoy como el dia de ayer, no se ha presentado ningun contratiempo. en la obra esta presente 1 maestro, 1 oficial y 2 ayudantes

En el segundo Colegio donde se ha venido trabajando el en el Paraiso y hoy se empezo con el Colegio de la encarnacion. En todos los Colegios se ha venido haciendo la demolicion de pisos y techo, el personal cuenta con la dotacion de labor que se le entrego

Interventoria

Vicente Cano Fernandez
R.O

Miercoles 15 de Febrero del 2023

Se llevo a cabo el comite tecnico entre las partes interesadas. En la reunion se presentaron representantes de la gobernacion, representante de la interventoria, docentes de los Jardines infantiles, asi mismo los Padres de familia tambien asistieron

La Primera reunion se hizo en el colegio Perro Falla sede Central a las 7 AM de la reunion se Pactaron los siguientes compromisos

- El Salon de informatica es el sitio donde se intervendra
- Se hara demolicion del Piso, Cambio de la baldosa del Piso Pintura y arelo raso

El segundo Punto donde se hizo visita es en la sede de Julia en este sitio donde lo principal es el cambio de cubierta

La tercera visita se hizo en el colegio Paraiso en este colegio es el cambio del Piso Pintura y cielo raso

El cuarto, colegio a intervenir fue el central del Jose Eustacio donde el mayor cambio es en el cielo raso y cambio de Piso

El Quinto a intervenir Fue la encarnacion y el sexto en visitar Fue la arcadia donde se colocara 2 Columnas, 1 Viga y se construira un nuevo 1 muro en la arcadia se hara Pintura

La ultima visita Fue en el Jardin donde se hara Piso y cielo raso.

Nota: No se realizó comite, sino una visita de control técnico a los diferentes sedes del municipio, no se dejó ninguna acta.

Verificado
R.V

Martes 14 de Febrero de 2023

En el dia de hoy no se ha venido presentando ningun inconveniente, se abrio otro frente de trabajo en el Jardin de la Panama hoy se esta laborando en 2 Jardines en el primer Jardin esta 1 Maestro y 1 oficial haciendo las actividades de Mamposteria de Piso y pared tanto en las gradas del Ferro Feria y fachada de Panama, tambien se ejecuto la Limpieza en el Salon. En esta Semana la hora de ingreso laboral esta de la 7 AM Salen a las 12 pm y regresan a las 1 pm Para luego Salir de la Labor a las 4 pm.

Se recomienda ubicar un sitio adecuado para el acopio temporal de los escombros.. debidamente señalizado.

Victoria Ruiz
R.O

Interventoria

Lunes 13 de Febrero de 2023

Se inician obra con 2 Maestros y 2 Ayudantes, se comenzo obra en el Jardin infantil Ferro Falla sede central, las labores se empezo con las herramientas menores como Cordel, Zincal, Pica, Pala y demas. Se arrancaron con la labor de Cambio del Piso. Se empezo como primera Medida en el cambio de piso. Se Programo una reunion de visita de obra el dia miercoles con la Comunidad, la gobernacion y la interventoria para realizar una visita de obra en el Municipio de Cambao legal.

Se recomienda el uso constante de los elementos de proteccion personal a todos los trabajadores involucrados dependiendo de la actividad realizada.

Victor Cardona
R.O

Interventoria

Viernes 10 de febrero de 2023

El día de hoy se encuentra dispuesto
No ha presentado Ninguna Problema
Se ha venido haciendo sus mismas Labores
de la Semana que corresponde, a realizar
actividades a los trabajadores, en la
cotización de precios, también se ha venido
realizando actividades de organización
de logística, se hizo el cronograma de
actividades - se hizo la Cotización de los
Materiales y el cronograma de actividades

Interventoría

Victor Cabal
R-O

Fecha 9 de Febrero de 2023

En el día de hoy se encuentra desarrollando se ha hecho entrega de trabajo de los oficiales y ayudantes de obra se ha presentado con su herramienta 2 maestros y oficiales y 4 ayudantes se está realizando registro de asistencia a los trabajadores, ya los resultados de obra ya se encuentra asegurados en la compañía de seguros

Interventoría

Victoria Del Real
R-D

Miercoles 8 de febrero

Es un dia hábil Ya se organizo el Personal y la logistica Administrativa se encuentra trabajando los residentes de obra de sun tree los residentes de obra asignado por la Empresa de sun tree son el ingeniero Victor Alfredo Alvear y el Ingeniero Ivan Manell. Se encuentra en el dia de hoy realizando las Cotizaciones organizacion de acta de cronograma de obra

Victor Alfredo
R.O

Interventoria

Martes 7 de febrero de 2023

En el día de hoy se comenzo hacer logística, el estuvo realizando trabajo de oficina como sacar el cronograma de actividades de cotizar precios y de organizar la oficina.
En día trabajado no se presentaron ningún contratiempo

Victor Valdez
RO

Interventoria

Lunes 6 Febrero de 2023

En el día de hoy en la Gobernación y el Contratista Suntree CP con el Nit 901551920 Siendo el representante legal Laura Maria Hoyos El objeto del Contrato se llama Mejoramiento de las Condiciones de infraestructura de las Aulas de Primera infancia en las Sedes Educativas de la Zona Norte del Departamento Huila Se firma el acta de inicio de obra.

Interventoría

Victoria del Pino
R.D

Lunes 18 de septiembre de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 1 ayudante
Hora: 7:00am
Se continua pintando los interiores y exteriores de los 2 salones y a su vez se procede a abrir los hueco e instalar las luminarias de tipo led de 60x60 en el salón #2 y luminarias de 24w en los baños del mismo para terminar el dia con el aseo general y retiro de escombros para dar por finalizado las actividades de esta institución.

INTERVENTORIA

Contratista.

Viernes 15 de septiembre de 2023
Clima Nublado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1oficial, 1 ayudante
Hora 7:00 am 12:00 m
Se inicia la instalación de la estructura del PVC del salon #2 y abrir los huecos en el salón #1 para la instalación de las luminarias led de 60x60 y luminarias de 24w
Hora 2:00pm – 5:00pm
Se continua con las actividades programadas del dia.

Interventoria Contratista

Sabado 16 de septiembre de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1oficial, 1 ayudante
Hora: 7:00am 12:00m
Se inicio el dia con la aplicación de pintura vinilo tipo 1 al interior de los 2 salones y pintura Coraza para los exteriores y a su vez se instala las laminas de PVC del salon #2

Interventoria Contratista

Jueves 14 de septiembre de 2023
Clima Nublado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00am 12:00m
Se procede a pasar los cables electricos sobre las tuberias ya instaladas anteriormente para dejar los puntos electricos como iluminarias y tomacorrientes y al terminar esta actividad se comienza a instalar las laminas en PVC del salon #1
Hora 2:00 pm 5:00 pm
Se continuo con las actividades del dia con normalidad

Interventoria

Contratista

Miercoles 13 de septembre 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00am — 12:00 m
Una vez terminado de instalar el enchape de paso y pared de los baños del salon #1 se procoden a emboquillar para sellar sus juntas y darle el acabado final, al terminar esta actividad se instalan los sanitarios y lavamanos
Hora 2:00pm a 5:00pm
Se continua con las actividades programadas del dia con normalidad

DA

Interventoria

Contratista

Martes 12 de septiembre de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00am - 12:00m
Una vez terminado de instalar el enchape de piso se procede a instalar el enchape de la pared, y a su vez se inicia a aplicar pintura en esmalte a toda ornamentación instalada existente de los 2 salones
Hora 2:00pm - 5:00pm
Se continua con las actividades del dia con normalidad

Interventoria

Contratista

el día instalando los sanitarios y los-
manos de los mismos

Interventoria Contratista

Lunes 11 de septiembre
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, maestro de
obra, 1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00 am 12:00 m
Se inicia el día instalando el enchu-
pe de piso de los baños del salon
#1 localizando los puntos sanitarios y
dejando un pequeño desnivel para que el
agua corra hacia el sifón y no se estan
que
Hora 2:00 pm - 5:00 pm
Se continua con las actividades del día
con normalidad y se hace la ins-
talacion del canal en lamina galvanizado
Cal. 20.

Interventora Contratista

Viernes 8 de septiembre de 2023
Clima : Soleado
Equipo : Herramienta menor
Personal: Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 1 ayudante
Horal: 7:00 am - 12:00m
Una vez instalado el enchape de piso en los baños nuevos del salon #2 se procede a instalar el enchape en las paredes de los mismos a la altura de 1.50 m
Hora 2:00 pm - 5:00 pm
Se continua con las actividades programadas del dia con normalidad

Interventoria Contratista

Sabado 9 de septiembre de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00 am - 12:00m
Ya terminado de instalar los enchapes de piso y pared en los nuevos baños de salon #2 se procede a emboquillas todo el enchape para sellar sus juntas y asi darle el acabado final para terminar

Hora 2:00pm – 5:00pm
Se continua con normalidad las actividades programadas del dia

Interventoria Contratista

Martes 5 de Septiembre de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 Oficial, 1 ayudante
Hora 7:00am – 12:00m
Se inicia con la instalación de ceramica trafico 5 tipo granilla en el Salon #2 garantizando que esten a nivel y escuadra para una perfecta instalación
Hora 2:00 pm – 5:00 pm
Se continua con las actividades programadas del dia.

Interventoria Contratista

Sabado 2 de Septiembre de 2023
Clima Nublado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial. 1 ayudante
Hora 7:00am - 12:00m
Una vez estucados las paredes del salon #2 se procede a lijar para retirar los excesos de estuco y dejar una superficie lisa y uniforme, a la vez se inicia con la aplicacion del pañete en los baños nuevos del salon #2 como en el baño que se esta adecuando del salon #1

Interventoria Contratista.

Lunes 4 de Septiembre de 2023
Clima Nublado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial 1 ayudante.
Hora 7:00 am - 12:00 m
Una vez pañetadas las paredes de los baños del salon #1 y #2, se procede a estucar el exterior de los baños nuevos del salon #2 y hasta la mitad de las paredes interiores de los baños de los 2 salones ya que ira enchape hasta la altura de 1.50m

Hora 2:00pm - 5:00pm
Se continua con las actividades programadas en el dia con normalidad

Interventora Contratista

Viernes 1 de Septiembre de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra 1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00am - 12:00 m
Se continua con el estucado en las paredes del salon # 2, garantizando un buen acabado en estas para posteriormente lijarlas.
Hora 2:00pm - 5:00pm
Se continua con las actividades programadas en el dia con normalidad

Interventoria Contratista.

Miercoles 30 de Agosto de 2023.
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00 am - 12:00 m
Se continua instalando la tubería conduit en PVC para las instalaciones electricas de luminaria y tomacorrientes y una vez instalados se procede a resanar y tapar con mortero quedando 95% introducidas dentro del muro
Hora 2:00 pm - 5:00 pm
Se continua con las actividades programadas del dia con normalidad.

Interventoria Contratista

Jueves 31 de Agosto de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de Obra 1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00 am - 12:00 m
Una vez ya tapadas con mortero la tubería conduit de los tomacorrientes e interruptores, instalados en la pared se procede a aplicar estuco sobre las paredes del Salon #2

dan realizar de una manera adecuada esta actividad
Hora 2:00pm – 5:00pm
Se continua realizando las actividades programadas del día con normalidad.

Interventoria Contratista.

Jueves: 24 de Agosto de 2023.
Clima nublado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, Maestro de obra, 1oficial, 1ayudante
Hora 7:00am – 12:00pm
Una vez instaladas las correas en perfiles metalicos se procede a instalar la teja especifico dentro del presupuesto contractual, garantizando que el personal a cargo de esta actividad use sus elementos de protección personal.
Hora 2:00pm – 5:00pm
Se continua con las actividades programadas del día con normalidad

Interventoria Contratista

Martes 22 de Agosto de 2023.
Clima: Nublado
Equipo Herramienta Menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de Obra,
1 oficial, 2 ayudantes
Hora 7:00 am - 12:00m
Se inicia el dia con las actividades de pintura con anticorrosivo para los perfiles que soportaran la cubierta en teja master 1000 especificada dentro del proyecto, y se procede a adecuar la superficie y cuchillas para posteriormente instalar las correas
Hora 2:00 pm - 5:00 pm
Una vez pintados los perfiles se procede a realizar la instalación de estos, garantizando que esten a nivel con ayuda del hilo para una adecuada ejecución.

Interventoria Contratista.

Miercoles 23 de Agosto
Clima nublado
Equipo Herramienta Menor
Personal Ingeniero residente, Maestro de obra
1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00 am - 12:00m
Se continua instalando las correas en perfiles metalicos, garantizando que el personal a cargo de esta actividad use los elementos de protección personal para que pue-

Viernes 18 de Agosto de 2023
Clima Nublado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de Obra, 1 oficial, 2 ayudantes
Hora 7:00am-12:00m
Una vez puesta la formaleta y compactado el relleno para el andén se procede a fundirlo, llevando con cautela la dosificacion de los materiales para así garantizar que lleguen a la resistencia requerido
Hora 2:00pm - 5:00pm
Se continua con las actividades del dia con normalidad

Interventoria Contratista

Sabado 19 de Agosto de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de Obra, 1 oficial, 2 ayudantes
Hora 7:00am - 12:00m
Se retira la formaleta del anden ya fundido el dia anterior para posteriormente aplicarle agua y así curarlas garantizando que llegue a la resistencia requerido

Interventoria Contratista.

Jueves 17 de Agosto de 2023.
Clima Soleado
Equipo Herramienta Menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra
1 oficial, 2 ayudantes
Hora 7:00 am - 12:00 m
Despues de fundir la placa de contrapiso del baño se le aplica agua para curarla y asi garantizar que llegue a la resistencia requerida, y se inicia formaleteando el anden del salón #1 que quedara enfrente y a su vez un anden que conectara el salón #1 con el anden ya existente en los espacios de esparcimiento de la institución
Hora 2:00pm - 5:00pm
Una vez formaleteado el anden se procede a hacer el relleno de mismo y compactado con rana, para garantizar que sedo por el peso del mismo

Interventoria

Contratista.

Hora 7:00am - 12:00m
Una vez fundida las vigas se retira la formaleta en madera, para posteriormente aplicarles agua para curarlas y así garantizar que llegue a la resistencia

requerido y se inicia con la fundición de la placa de contrapiso del baño una vez este colocada la malla electrosoldada.
Hora 2:00pm - 5:00pm

en las excavaciones anteriormente hechas, para llevarlos hasta las cajas de inspección y así poder fundirlos.
Hora 2:00pm — 5:00pm
Se continua con las actividades del día con normalidad.

Interventora Contratista.

Sabado 12 de Agosto de 2023
Clima Nublado
Equipo Herramienta Menor
Personal Ingeniera, Maestro de obra, 3 oficial, 2 ayudantes
Hora 7:00am — 12:00m
Se inicia a levantar muro en mampostería del baño nuevo del salon #2, llevando las especificaciones de los planos, para las alturas y localizaciones de los mismos.

Interventora Contratista.

Jueves 10 de agosto de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, Maestro de obra 1 oficial, 2 ayudantes
Hora 7:00am - 12:00m
Se inicia con la formaleta de las columnas del baño nuevo en el salon #2 y la formaleta de las columnas para el baño del salon #1 el cual se adecuara, para posteriormente fundirlas, llevando con cautela la dosificación de los materiales para así garantizar que lleguen a la resistencia requerida.
Hora
Se continua con las actividades del dia con normalidad

Interventora

Contratista

Viernes 11 de Agosto de 2023.
Clima Soleado
Equipo Herramienta Menor
Personal Ingeniero residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 2 ayudantes
Hora 7:00am - 12:00m
Una vez fundidas las columnas se desencofran para posteriormente aplicarles agua para curarlas y así garantizar que lleguen a la resistencia requerida, y se comienza a instalar la tuberia de 4"

Hora
Se continua con las actividades del dia con normalidad

Interventoria Contratista

Miercoles 9 de Agosto de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra 1 oficial, 2 ayudantes
Hora 7:00 am - 12:00m
Se realizan las excavaciones para las cajillas de inspección que recibirán los tubos de 4" y la vez conducirán hacia el colector final que es al tubo madre del alcantarillado.
Hora
Se continuan las actividades del dia con normalidad

Interventoria Contratista

Lunes 7 de Agosto de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 2 ayudante
Hora 7:00 am - 12:00m
Se inicia formaleteando las vigas de cimentación y pasando la tubería sanitaria y domiciliaria de agua potable, para posteriormente comenzar a fundir estas misma, manteniendo la dosificación de los materiales de concreto para garantizar llegar a la resistencia requerida.
Hora 2:00 pm -5:00 pm
Se continua con las actividades del día

Interventoria Contratista.

Martes 8 de Agosto de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 2 ayudantes
Hora
Una vez ya fundida las vigas de cimentación se procede a retirar la formaleta para posteriormente aplicarles agua y curarlas para garantizar que lleguen a resistencia requerida, y se comienza a realizar las excavaciones y demoliciones para la tubería de 4" que conduciran las aguas negras de los baños que se van a adecuar.

Viernes 4 de agosto de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra
1 oficial, 2 ayudantes
Hora 7:00am - 12:00m
Una vez fundido la placa del salon #3, se procede a aplicar agua para curarlo y garantizar su resistencia requerida, luego se comienza las excavaciones para las vigas de cimentación donde va a ir la nueva construccion de los baños.
Hora 2:00 pm - 5:00pm
Se continuan con las actividades del día

Interventoria Contratista

Sabado 5 de agosto de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra
1 oficial, 2 ayudantes
Hora 7:00am
Se comienza a realizar el figurado y armado del hierro para las vigas de cimentación y columnas, de los nuevos baños que se construiran en el salon #2.
Hora 2:00pm - 5:00pm
Se continuan las actividades del dia con normalidad

Interventoria Contratista

Jueves 3 de agosto de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra
1 oficial, 1 ayudante

Hora
Se hace el acopio de los escombros provenientes de las demoliciones en un lugar adecuado y señalizado para posteriormente ser retirados.
y a la vez se hace el desmonte de puertas y ventanas que estan en mal estado y que seran cambiadas por unas nuevas y más grandes para el salón #2.
Una vez despejada el salón #2 se procede a colocar la malla electrosoldada requerida en el estudio de mezclas, para garantizar la resistencia solicitada en las especificaciones del proyecto
Hora 2:00pm - 5:00pm
Se continuan con las actividades programadas del día

Interventoria

Contratista

Hora 2:00pm — 5:00pm
Se continua con normalidad las actividades del día

Interventoria Contratista.

Miercoles 2 de Agosto de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, Maestro de obra 1oficual, 2ayudantes

Hora
Una vez terminada las demoliciones en el Salon 2, se inicia a realizar las demoliciones del enchape de piso y de pared del salón 1 y demolicion de muro para el nuevo baño que se pretende adecuar, y muro donde iria la nueva ventana de este salón
Hora 2:00 pm — 5:00pm
Se continuar las actividades con normalidad

Interventoria Contratista

Lunes 31 de Julio de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramiento Menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de Obra
1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00 am - 12:00 m
Se comienzan actividades de demdición de placa de piso existente en el salon 2, garantizando que el personal a cargo de la labor use sus elementos de protección personal.
Hora 2:00 pm - 5:00 pm
Se continuan con las actividades del día con normalidad.

Interventoria Contratista

Martes 1 de Agosto de 2023
Clima Nublado
Equipo Herramiento menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra
1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00 am - 12:00 m
Se continua con la actividad de demdición de placa de piso del salon 2 a la vez se comienza a demder los muros donde iran las nuevas ventanas con las medidas ya especificadas por interventoria y las nuevas entradas a los nuevos baños que se construiran.

Municipio de Colombia
IE Pablo VI Sede Gonzalez y Cifuentes
Contrato # 1571
Mejoramiento de las condiciones de infraestructura de las aulas de primera Infancia en las sedes educativas de la zona Norte del Departamento del Huila
Contratista Consorcio Suntree CP
Interventoria Consorcio Interventoria Sedes Educativas

Viernes 8 de Septiembre
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de Obra, 1 oficial, 1 ayudante, 2 señoras del Aseo
Hora 7:00 am - 12:00 m
Una vez ya instalados los canales de aguas lluvias se procede a realizar el aseo y limpieza de los salones y exteriores de la institución y a su vez se retiran los escombros provenientes de la ejecución de la obra, para darle por finalizado la obra de mejoramiento en la institución.

Interventoria

Contratista.

Miercoles 6 de Septiembre
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 1 ayudante
Hora: 7:00 am - 12:00 pm
Se continúa con la instalación del canal en lámina galvanizada cal 20 de la parte posterior de la institución donde también se hizo necesario la instalación de este
Hora 2:00 pm - 5:00 pm
Se continuan con las actividades del día con normalidad

Interventoria | Contratista

Jueves 7 de Septiembre
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 1 Ayudante
Hora: 7:00 am - 12:00 m
Se instala tubería de 4" en los canales anteriormente instalados, para usarlos como bajantes de aguas lluvias, que conduscan el flujo de agua a las cunetas existentes
Hora 2:00 pm - 5:00 pm
Se continúa con las actividades con normalidad

Interventoria | Contratista

Lunes 4 de Septiembre
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra
1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00 am – 12:00 m
Una vez pintadas las puertas y marcos de las mismas, se procede a pintar las ventanas existentes y lucetas de la fachada principal de los salones
Hora 2:00 pm – 5:00 pm
Se continua con las actividades programadas en el dia

Interventoria | Contratista

Martes 5 de Septiembre
Clima Nublado
Equipo Herramienta menor
Personal: Ingeniero residente, 1 maestro de obra
1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00 am – 12:00 m
Se inicia con la instalacion del canal aguas lluvias en la parte frontal de los salones, anclando los soportes a los perfiles existentes y garantizando sus pendientes, para que el flujo de agua se conduzca hacia las bajantes y no se quede estancada.

Interventoria | Contratista

Viernes 1 de Septiembre de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal 1 Ingeniero residente, 1 maestro de Obra
1 oficial, 1 Ayudante
Hora: 7:00am - 12:00m
Se continua aplicando pintura en vinilo tipo coraza en las paredes exteriores de los salones objeto de intervención
Hora 2:00pm - 5:00pm
Se continua con las actividades del dia con normalidad

Interventoria | Contratista

Sabado 2 de Septiembre
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 1 Ayudante
Hora 7:00am - 12:00m
Una vez terminada las actividades de pintura en vinilo de los salones como de la parte interna al igual que la externa, se procede a pintar las puertas y marcos existentes con compresor para darles un buen acabado

Interventoria | Contratista

Miercoles 30 de Agosto
Clima Nublado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, Maestro de Obra, 1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00am - 12:00m
Se continua aplicando pintura en vinilo tipo 1 en las paredes internas de los salones garantizando que sean 2 manos las que se apliquen como se especifica en el item del contrato.
Hora 2:00pm - 5:00pm
Se continua con las actividades del dia con normalidad

Interventoria Contratista

Jueves 31 de Agosto
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de Obra 1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00am - 12:00m
Una vez terminado de pintar las paredes internas de los salones se continua con las paredes externas aplicando pintura en vinilo tipo coraza recomendado para exteriores y garantizar una buena durabilidad de la misma.

Interventoria Contratista

Hora: 2:00 pm — 5:00 pm
Se continua con las actividades del dia

Interventoria Contratista

Martes 29 de Agosto
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra
1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00 am — 12:00 m
Una vez estando listas las parcdes lijadas y limpiadas se continua con la aplicación de la pintura en vinilo tipo 1 en la parte interna de los salones objeto de intervención
Hora 2:00 pm — 5:00 pm
Se continua con las actividades del dia con normalidad

Interventoria Contratista

Hora 2:00pm – 5:00pm
Se continua con las actividades del día con normalidad

Interventoria Contratista

Sabado 26
Clima : Soleado
Equipo : Herramienta menor
Personal : Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 1 Ayudante
Hora 7:00am - 12:00m
Una vez realizados los huecos donde iran situadas las luminarias led de 60x60 y luminarias de 24w, se procede a instalarlas para dar terminado esta actividad

Interventoria Contratista

Lunes 28 de Agosto
Clima : Soleado
Equipo: Herramienta menor
Personal: Ingeniero residente, 1 maestro de obra 1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00am - 12:00m
Se instalan láminas de Super board para ocultar las puntas de las cerchas que quedaron visibles, y parte frontal del pasillo

Jueves 24 Agosto de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de Obra
1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00 am - 12:00 m
Una vez finalizada la instalación de la estructura del cielo raso en PVC para el pasillo se continua con la instalación de lámina en PVC garantizando que queden bien ajustados con tornillos cabeza de lenteja para una adecuada instalación
Hora 2:00 pm - 5:00 pm
Se continuan con las actividades del dia

Interventoría Contratista

Viernes 25 de Agosto de 2023
Clima Nublado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de Obra, 1 oficial, 1 ayudante
Hora: 7:00 am - 12:00 m
Una vez terminado de instalar el cielo raso en PVC del pasillo se procede a abrir huecos en las laminas de PVC instaladas donde van a ir localizadas tanto las luminarias led de 60x60 en los salones como las luminarias de 24W en el pasillo, garantizando que queden bien distribuidas uniformemente dentro del espacio en cada uno de los salones

Martes 22 de Agosto de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de Obra
1 oficial, 1 Ayudante
Hora 7:00 am - 12:00 m
Se comienza con la instalacion de la estructura del cielo razo en PVC en el pasillo, garantizando los niveles para una adecuado ejecucion de la actividad
Hora 2:00 pm - 5:00 pm
Se continua con las actividades programadas

Interventoria Contratista

Miercoles 23 de Agosto de 2023
Clima Nublado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de Obra
1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00 am - 12:00 pm
Se continua instalando la estructura del cielo razo en PVC en el pasillo anclando las vigetas de carga principales con ángulos a los perfiles de la cubierta para una adecuada instalación
Hora 2:00 pm - 5:00 pm
Se continua con las actividades de la mañana con normalidad

Interventoria Contratista

Viernes 18 de Agosto de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta Menor
Personal Ingeniero residente, Maestro de Obra
1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00am - 12:00m
Ya terminado de fundir las cajillas de inspección de 60x60 se procede a fundir las tapas de las mismas y a su vez rellenar y fundir las placas donde anteriormente se dañaron por las excavaciones de instalación de tubería de 6"
Hora
Se continuan las actividades del dia con normalidad

Interventoría Contratista

Sabado 19 Agosto de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, maestro de obra
1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00am - 12:00m
Se termina de pañetar la pared que hacia falta para dejar todas las paredes conformes

Interventor Contratista

Se continuan las actividades programadas de la manera con normalidad

Interventoria / Contratista

Jueves 17 de Agosto de 2023
Clima : Soleado
Equipo : Herramienta Menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de Obra 1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00 am - 12:00m
Se inicia el dia instalando la tuberia de 6" para conducir las aguas lluvias a la cajilla existente ya propuesto conjunto a la interventoria, garantizando las pendientes para que el flujo de agua fluya con normalidad y posteriormente fundir las cajillas de 60x60 como se especifica en el proyecto.
Hora 2:00pm - 5:00pm
Clima Soleado
Se continuan las actividades del dia con normalidad

Interventoria Contratista.

Martes 15 de Agosto de 2023
Clima Soleado.
Equipo: Herramienta Menor
Personal: Ingeniero residente, 1 maestro de obra,
1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00 am - 12:00m
Una vez estucadas las paredes externas. se continua a estucar las paredes internas de los salones, sin antes darle una limpieza con ayuda de una escoba a las paredes quitando cualquier Suciedad que afecte la aplicación de este
Hora 2:00pm - 5:00pm
Se continua con las actividades de la manera con normalidad.

Interventoria Contratista

Miercoles 16 de Agosto de 2023
Clima Nublado.
Equipo Herramienta Menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de Obra
1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00 am - 12:00m
Una vez terminado de estucar las paredes internas y externas de los salones se procede a lijar los excesos de estuco y asi evitar que estas queden rugosas y asu vez. se revisa las diferentes imperfecciones que puedan haber para aplicar nuevamente estuco y darle el mejor acabado posible.
Hora 2:00pm - 5:00pm

Sabado 12 de Agosto de 2023.
Clima Nublado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00am - 12:00 m
Se continúa con la actividad de retiro de estuco y pintura en mal estado para una vez terminado esta actividad se prosiga a estucar tanto las paredes externas como internas de los salones. de objeto a intervención.

Interventoria Contratista.

Lunes 14 de Agosto de 2023.
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, maestro de Obra, 1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00 am - 12:00m
Se inicia con la actividad de aplicación de estuco de las paredes externas de los salones de objeto de intervención para darle un mejor acabado de las mismas
Hora 2:00pm - 5:00pm
Clima Soleado
Se continua las actividades del dia con normalidad

Interventoria Contratista

Jueves 10 de Agosto de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta Menor
Personal Ingeniero residente, Maestro de obra, 1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00 am - 12:00 m
Se comienza con ayuda de espatulas a retirar el estuco y pintura en las paredes que estan en mal estado, debido a factores de humedad y falta de mantenimiento a los salones objeto de intervención
Hora 2:00pm - 5:00 pm
Clima Soleado
Se continua realizando las actividades programadas del dia con normalidad.

Interventoria Contratista

Viernes 11 de Agosto de 2023
Clima Nublado
Equipo Herramienta Menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra 1 oficial, 1 ayudante
Hora 7:00 am - 12:00 m.
Se continúa retirando el estuco y pintura en mal estado de las paredes internas de los salones objeto de intervención
Hora: 2:00pm - 5:00pm
Se continuan las actividades del dia con normalidad

Interventoria Contratista

Miercoles 9 de Agosto de 2023
Clima Soleado
Equipo Herramienta Menor
Personal 1 ingeniero residente, 1 maestro
1oficial, 1tecnico electrico
Hora 7:00 am - 12:00m
Una vez instalada la tuberia EMT se instala los breakers en el tablero de 2 circuitos, uno para luminarios y el otro para tomas corrientes y a la vez se introduce el cable dentro de la tuberia EMT ya instalado para energizar el tablero.
Hora 2:00pm - 5:00pm
Clima Soleado
Se continuan realizando las actividades del dia con normalidad

Interventoria

Contratista

Martes 8 de Agosto
Clima Soleado
Equipo Herramienta Menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro,
1 tecnico electrico, 1 ayudante
Hora 7:00am - 12:00m
Una vez dejado los puntos eléctricos de toma-
Corriente e luminarias, se comenza a instalar
la tuberia EMT para energizar desde el
tablero principal de la institución al table-
ro de 2 circuitos que se instalaran en el
primer salon, que distribuira la energia
a los salones objeto de intervención
Hora 2:00pm - 5:00pm
Clima Soleado
Se continua realizando las activida-
des programadas

Interventoria

Contratista

Viernes 4 Agosto de 2023.
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, 1 maestro de obra
1 tecnico electrico, 1 ayudante
Hora 7:00am - 12:00m.
Se inicia el cableado por los salones a intervenir por la tubería conduit de PVC ya instalada anteriormente dejando los puntos electricos
Hora 2:00pm - 5:00pm
Se continua con las actividades del dia con normalidad.

Interventoria Contratista.

Sabado 5 Agosto de 2023.
Clima Soleado
Equipo Herramienta menor
Personal Ingeniero residente, maestro de obra
1 tecnico electrico, 1 ayudante.
Hora 7:00am - 12:00m
Se continua con el cableado para energizar los puntos eléctricos de los salones a intervenir por la tubería anteriormente instalada.

Interventoria Contratista.

Jueves 3 de Agosto - 2023

Clima: Soleado
Equipo: Herramienta menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 2 ayudantes

Hora: 7am - 12pm


Se continua instalando la tubería conduit para luminarias para finalizar esta actividad, y posteriormente continuar con el alambrado de tomacorrientes, interruptores y luminarias

Hora: 2pm - 5pm
Clima: Nublado

Se continua ejecutando las actividades programadas del día con normalidad.

Interventoría.

Contratista de obra.

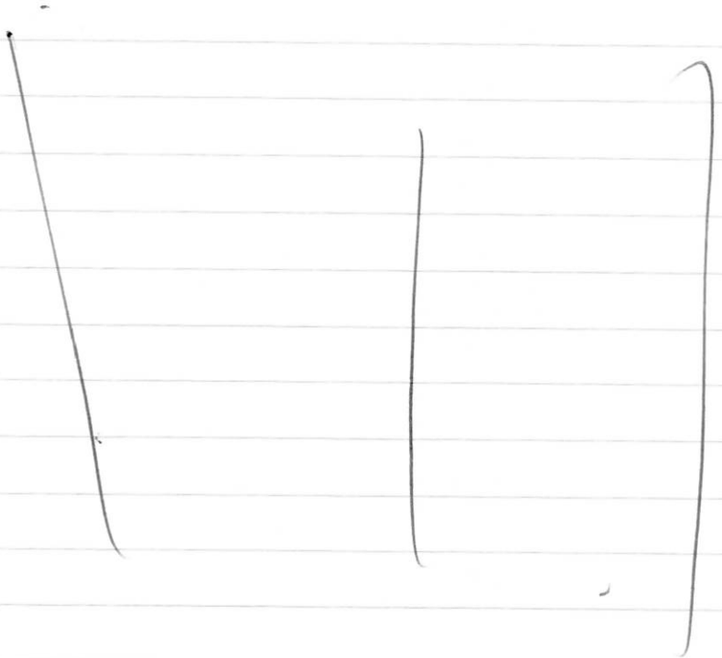

Miercoles 2 de Agosto de 2023

Clima: Soleado
Equipo: Herramiento Menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 maestro de obra, 1 oficial
1 ayudante

Hora: 7am - 12pm

Se continua instalando la tuberia, conduit y
a su vez las cajas de reparticion para
cada luminaria contemplada dentro del proyecto.

Hora: 2pm a 5pm
Clima: Soleado

Se continua ejecutando las actividades progxmadas
del dia, con normalidad.

Interventoria

Contratista de obra.

Martes 1 de agosto - 2023

Clima: Soleado
Equipo: Herramienta Menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 Maestro de obra, 1 oficial, 2 ayudantes.

Hora: 7am a 12pm


Se comienza el dia instalando la tuberia conduit, de las luminarias, Sobre la estructura del reloj Brazo ya instalado.

Hora: 2pm a 5pm
Clima: Nublado

Se continua las actividades del dia sin ningun Contratiempo.

Interventoria

Contratista de obra

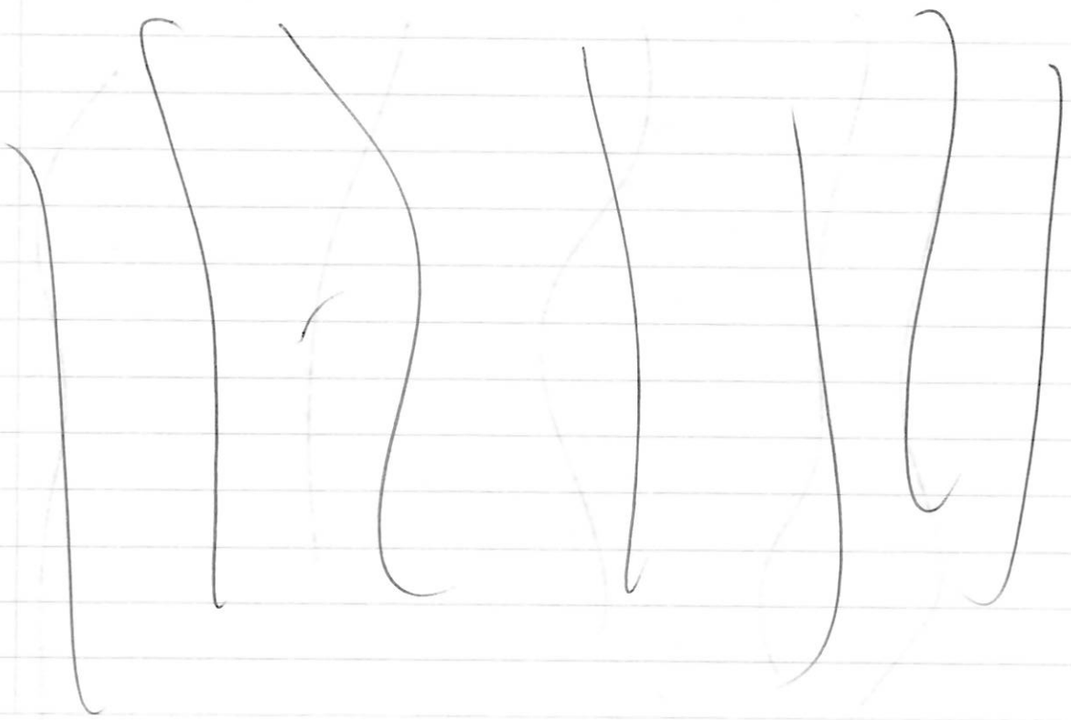

Lunes 31 de julio - 2023

Clima: Soleado
Equipo: Herramiento Menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 2 ayudantes.

Hora: 7am - 12pm


Se continua colocando la tuberia conduit dentro de las regatas anteriormente hechas, y a su vez, ir tapandolas, con mezcla en mortero.

Hora: 2pm - 5pm
Clima: Nublado

Se continua realizando las actividades programadas del dia con normalidad

Interventoria

Contratista de obra

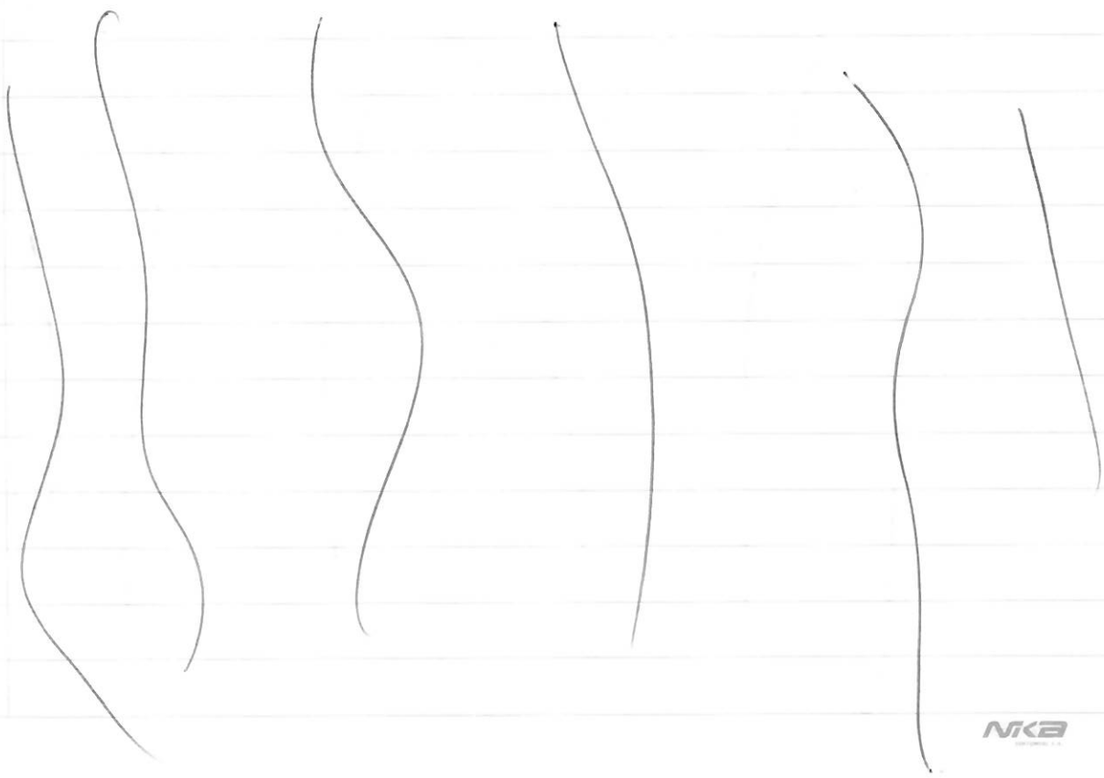

Sabado 29 de julio - 2023


Clima: Nublado
Equipo: Herramienta Menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 2 Ayudante

Hora: 7am - 2pm

Se comienza a colocar la tubería dentro de las regatas anteriormente hechas,

Fiscalizadora

Contratista de obra

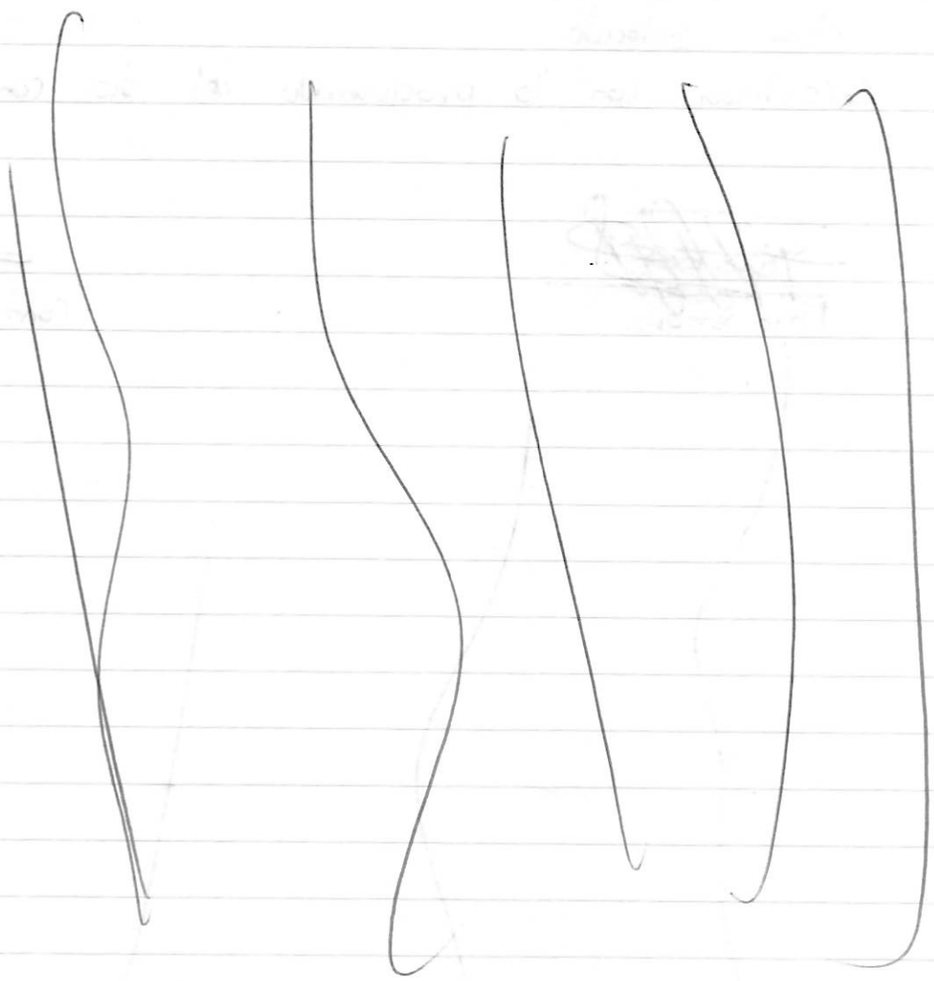

Viernes 28 de Julio - 2023

Clima: Soleado
Equipo: Herramienta menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 maestro de obra, 2 Ayudades, 1 oficial.

Hora 7am - 12pm
Se comienza el dia realizando las regatas en las paredes existentes, donde va pasar la tuberia conduit para los tomacorrientes e interruptores contemplados dentro del proyecto.

Hora: 2pm - 5pm
Clima: Soleado
Se continua con lo programado del dia con normalidad

Interventoria

Contratista de obra

Jueves 27 Julio -2023.

Clima: Soleado
equipo: Herramienta Menor
personal: Ingeniero, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial, 2 ayudantes

Hora:
7am- 12 pm

Se Continúa Realizando las excavaciones para la instalacion de tubería de 6" en pvc para Conducir las aguas lluvias, hacia el Colector final

Hora 2pm - 5pm

Clima: Soleado

Se Continúa Realizando las actividades programadas del dia.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

Martes 27 Junio

@lima: Soleado
Equipo: Herramienta Menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 Maestro de obra, 1 oficial, 2 ayudantes

Hora: 7am- 12pm.

Una vez finalizado instalado el Cielo Raso en PVC se procede a Realizar la demolicion de placa y excavaciones para la instalacion de tuberia de 6" y Cajas de inspeccion, para conducir las aguas lluvias hasta el colector principal.

Hora 2pm- 5pm.
Clima: Soleado

Se continúa Realizando las actividades Programadas del dia con normalidad.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

Miércoles 28 de Junio -2023
Se Suspende el Contrato desde el 28 Junio, hasta el 27 Julio 2023.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

(lunes) 26 Junio - 2023

Clima: Soleado
Equipo: Herramienta menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 Maestro de obra, 1 Oficial, 2 ayudantes

Hora 7am - 12pm

Una Vez instalada la estructura del puc, Se Continúa Con la instalacion de laminas en puc


Hora 2pm - 5pm.

Clima Soleado

Se Continúa ejecutando las actividades programadas del día Con normalidad.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

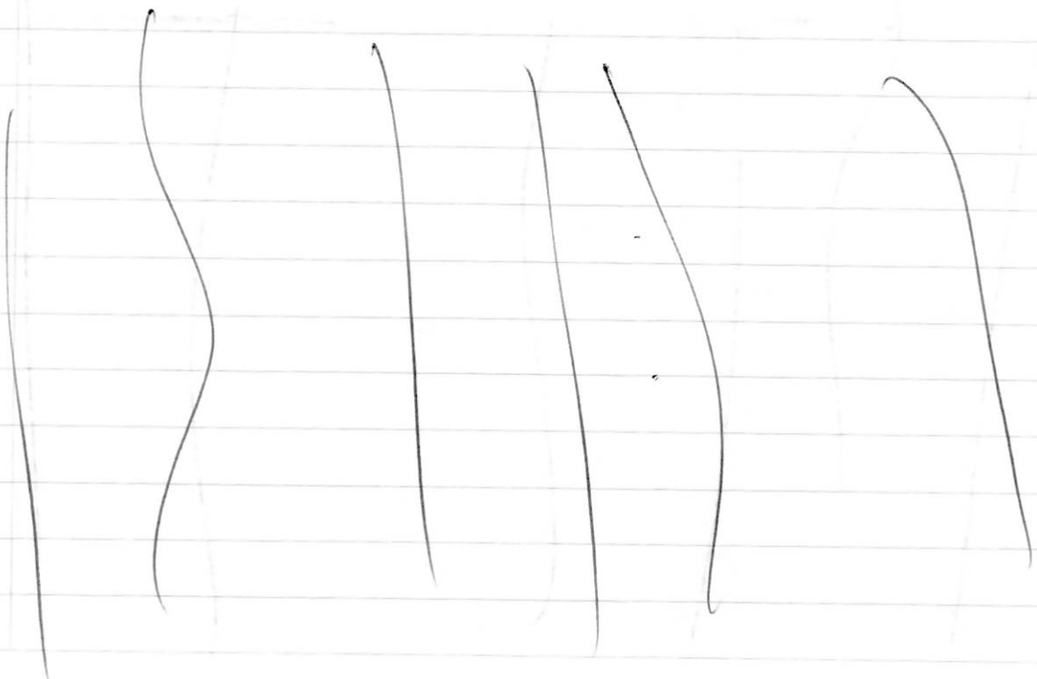

Sabado 24 - Junio - 2023.

Clima Soleado.
equipo: Herramienta Menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 Maestro de obra, 1 oficial, 2 ayudantes

Hora: 7am - 2pm.

Se continúa instalando la estructura del Cielo Raso en PVC, hasta terminar el día.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

Viernes 23 Junio 2023

Clima: Soleado
Equipo: Herramienta menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 Maestro de obra, 1 Oficial, 2° ayudantes

Hora: 7am - 12 pm.

Se Continúa Instalando la estructura del Cielo Raso en pvc, enclando los Viguetas de Carga principales con angulos a los perfiles de la Cubierta, para una adecuada instalacion.

Hora 2pm - 5 pm.

Se Continúa ejecutando las actividades programadas del dia con normalidad.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

Jueves 22 Junio- 2023.

Clima: Soleado
equipo: Herramienta menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 Maestro de obra
1 oficial, 2 ayudantes

Hora 7am- 12 pm.

Se Comienza con la instalacion de la estructura del Cielo Raso en pvc, garantizando los niveles de este, para una adecuada ejecucion de la actividad.

Hora: 2pm- 5pm.

Clima: Soleado

Se Continúa con las actividades programadas del dia con normalidad

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

Miercoles 21 Junio - 2023.

Clima: Soleado
Equipo: Herramienta menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 Maestro de obra, 1 oficial, 2 ayudantes

Hora: 7 am - 12 pm.

Se comienza a instalar el guardaescobas de los salones donde ya fue instalada la ceramica del piso

Hora.
2 pm - 5 pm.

Clima: Soleado

Se continua ejecutando las actividades programadas del dia con normalidad.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

Martes 20 Junio - 2023.
Clima: Soleado
Equipo: Herramienta Menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 Maestro de obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes

Hora: 7am - 12pm

Se continúa instalando la cerámica de piso tipo granilla trafico 5 en los Salones objeto de intervención, garantizando que esten todos a nivel y escuadra, Con ayuda de herramienta menor como lo Son los niveles y perfil en aluminio tipo boquillera.

Hora: 2-pm. - 5pm.

Clima: Soleado

Se continúa con las actividades programadas del día con normalidad.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

Sabado 17 de junio - 2023.

Clima: Soleados
Equipo: Herramienta Menor
Personal: Ingeniero Residente, Maestro obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes

Hora: 7am - 12 pm.

Se continúa instalando la Ceramica de piso tipo granilla trafico 5 en los Salones objeto de intervencion.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA



Viernes 16 Junio 2023

Clima: Soleado
Equipo: Herramienta menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 Maestro de obra, 1 oficial de obra, 2 Ayudantes

Hora: 7am- 12 pm.

Se Continúa Instalando la Ceramica de piso tipo granilla trafico 5 en los Salones objeto de intervencion

Hora: 2- 5 pm

Se Continúan Con las actividades programadas del dia Con normalidad.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

Jueves 15 junio-2023.

Clima: Soleado
Equipo: Herramienta menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 Maestro de obra
1 oficial, 2 ayudantes

Hora: 7am- 12pm.

Una vez fundidas las cunetas, se comienta con la instalacion de la cerámica para piso tipo granilla trafico 5.


Hora 2pm-5pm

Clima: Soleado

Se continúa ejecutando las actividades programadas del dia sin ningun contratiempos.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

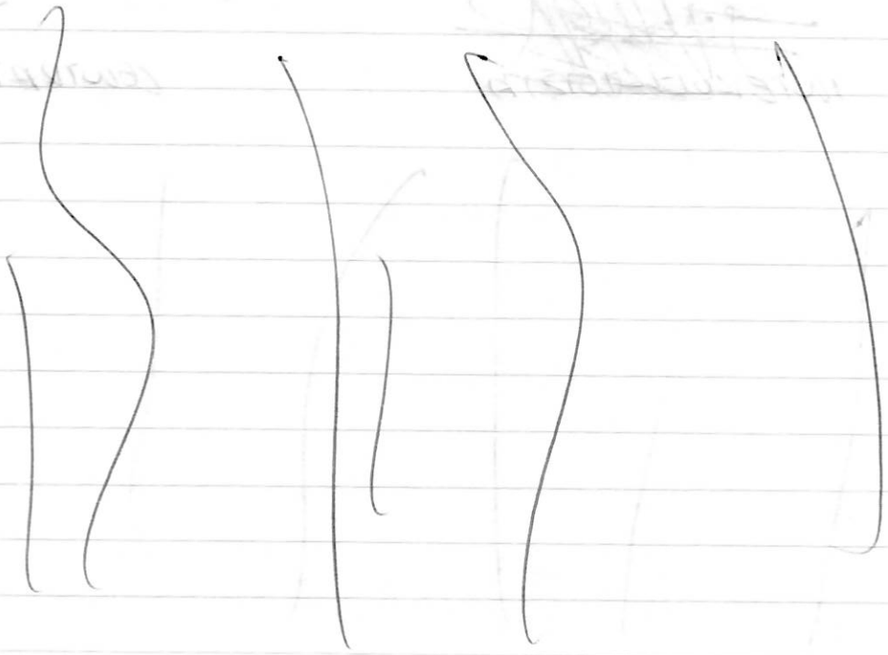

Miercoles 14 Junio - 2023.

Clima: Soleado
equipo: Herramienta Menor.
Personal: Ingeniero Residente, 1 Maestro de obra
1 oficial, 2 ayudantes

Hora 7am - 12pm.

Una vez fundida la cuneta de la parte Principal de los Solares intervenidos se procede a fundir la cuneta de la parte posterior a estos, mezclando el concreto con la dosificacion del concreto, para garantizar, la Resistencia Requerida.

Hora
2pm - 5pm

Se continúa ejecutando las actividades programadas del día con normalidad.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

Martes 13-Junio-2023.

Clima: Soleado
equipo: Herramienta Menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 Maestro de obra
1 oficial, 2 ayudantes

Hora: 7am - 12pm.

Una vez armada la formaleta para los cunetas y colocada la malla electrosoldada para la misma, se procede a Realizar la fundicion de la Solada en la fachada principal de los Salones intervenidos

Hora:
2pm - 5pm
Clima: Soleado

Se Continúa con las actividades programadas del día con normalidad.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

Sabado 10 Junio-2023

Clima: Soleado
Equipo: Herramienta Menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 Maestro de obra, 1 Oficiales, 2 ayudantes

Hora: 7 am- 12 pm.

Se Continúa armando la formaleta para las cunetas que van a conducir las aguas lluvias, garantizando sus pendientes y colocando la malla electrosoldada para una adecuada ejecucion de esta actividad.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

Viernes 09- Junio -2023.

Clima: Soleado
equipo: Herramienta Menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 Maestro de obra
1 oficial, 2 ayudantes

Hora: 7am- 12 pm.

Se Continúa aplicando mortero en las paredes de la fachada de los Salones intervenidos

Hora: 2pm- 5pm
Clima Soleado:

Una vez finalizada la actividad de aplicacion de paños, Segun la clasificacion Requerido, se Comienza con el armado de la formaleta para los Cunetas que Van a Conducir las Aguas Lluvias.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA



Jueves 08 Junio-2023

Clima: Soleado
equipo: Herramienta menor
Personal: 1 Ingeniero Residente, 1 Maestro de obra, 1 oficial, 2 ayudantes

Hora: 7am - 12 pm

Se continúa aplicando el mortero en las paredes de las fachadas principales para darle un buen alabado a estas.

Hora: 2pm - 5pm.
Clima: Soleado

Se continúa ejecutando actividades programadas del día con normalidad.

INSPECTOR SUPERVISIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Miercoles de 07 Junio - 2023

Clima: Soleado
Equipo: Herramienta Menor.
Personal: Ingeniero Residente, 1 Maestro de obra, 1 oficiales, 2 ayudantes


Hora: 7 - 12 pm
Una vez estando adecuada la Superficie de las fachadas, se procede a aplicar el pañete en estas garantizando los Plomos, y niveles, Con ayuda de herramienta menor Como niveles y Plomadas, para una bíena ejecucion de este item.

Hora 2 - 5 pm.
Clima: Soleado

Se Continua ejecutando las actividades Programadas del día Con normalidad

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

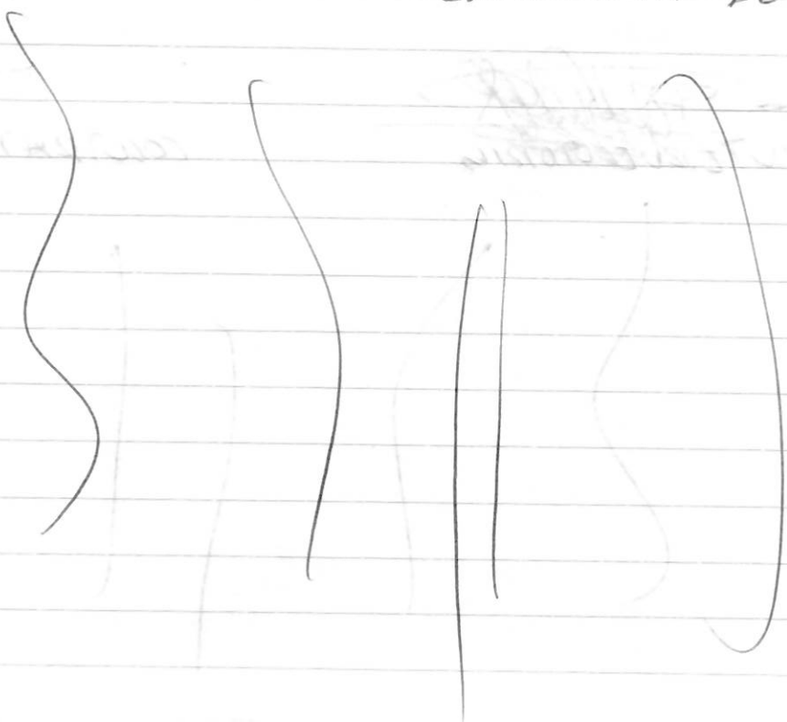

Martes 06 de Junio

Clima: Soleado
equipo: Herramienta Menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 Maestro de obra, 1 oficiales, 2 oyudantes
Hora: 7am-12pm.
Clima: Soleado.

Se Continúa Realizando la actividad del día anterior, Picando el ladrillo a la vista para que haya adherencia entre este y el mortero que se le vaya aplicar.

Hora: 2pm- 5pm
Clima: Soleado

Una Vez picado el ladrillo a la vista se Procede a Recoger los Residuos generados por esta actividad y Realizar un acopio en un lugar adecuado que no haya ninguna afectacion con los estudiantes que a diario asisten a la institucion.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

Lunes 05, Junio - 2023.

Clima: Soleado
Equipo: Herramienta Menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 Maestro de obra, 1 oficial, 2 ayudantes
Hora: 7 am - 12 pm
Clima Soleado
Una Vez fundido el anclan posterior de los Salones intervenidos, se aplica agua para garantizar que llegue a su Resistencia Requerida, y asu vez se comienta a adecuar la superficie de las fachadas picando el ladrillo a la vista existente para que haya adherencia a la hora de aplicar el pañete en estas.

Hora: 2pm - 5pm

Clima: Soleado

Se continúa ejecutando las actividades programadas del día con normalidad.

INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA


Sabado 03- Junio- 2023

Clima: Soleado
equipo: Herramienta Menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 Maestro de obra, 1 oficial, 2 ayudantes.
Hora: 7 am - 2pm.

Una vez armado la formaleta del anden y colocado de manera adecuada la malla electrosoldada. Se Comienza a fundir el anden, garantizando que se haga de manera Adecuada la dosificacion de la mezcla del Concreto, hasta terminar el día, dejando fundido este.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

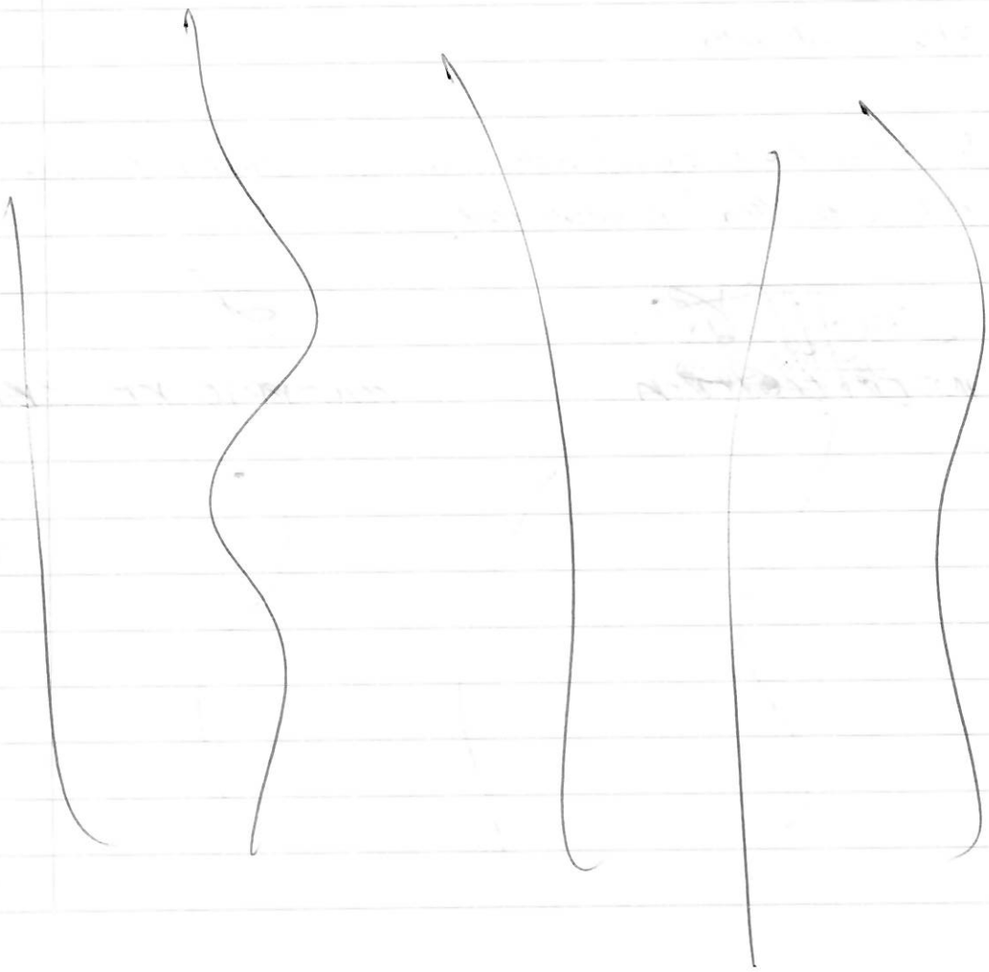

Viernes 02 Junio de 2023.

Clima: Soleado
Equipo: Herramiento Menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 Maestro de obra,
1 oficial, 2 Ayudantes
Hora: 7 am - 12pm.

Una Vez fundido el anden de fachada Principal, Se procede a aplicar agua para curarlo y garantizar su resistencia Requerida, y a su Vez Se comienza a armar la formaleta del anden de la parte trasera de los salones intervenidos

Hora: 2pm - 5pm.
Clima: Soleado

Se continúa armando la formaleta para fundir el andén posterior y a su vez colocando la malla electrosoldada,

CONTRATISTA DE OBRA

INTERVENTORIA

Jueves 1 de Junio 2023

Clima soleado.
Equipo:
Personal: Residentes de obra, maestro, 20 fundidos, 4 ayudantes
Hora inicio: 7am

Una vez colocado la formaleta y la malla electrosoldada, se procede a fundir el anden de la parte de la fachada principal de los salones intervenidos, Sacando muestras de concreto utilizado para posteriormente analizarlos en el laboratorio
Hora
Clima //
Se continua realizando la fundición del anden de la fachada principal de los salones intervenidos

Residente de Obra

Residente Interventoria



Martes 14 de Marzo de 2023

En el dia hoy Amaneció nublado, se estuvo laborando en el asentecho de la cubierta en la sede de la cancha, asi mismo se llevo en el dia de hoy 5 viajes de escombros en las sedes del Jardin, en las sedes de Remo Falla, en la sede Jose Hilario Lopez sede central, en la sede de la isla

En el dia de Hoy se elaboro 8 personas 2 Maestros 1 Oficial y 5 ayudantes

algunos se trabajaron Horas extras los siguientes trabajadores
Horas extras de 1 Hora:
- Favian Yasno cc. 1079186843
- Sebastian Costa Diaz c. 1079173615 No se trabajo la hora extra.

Horas extras 2 Horas Cuatro horas Salieron a las 9 PM

- Juan Felipe Kintero cc. 1079187069 oficial
- Mario Aurelio Gonzalez cc. 1079182728
- Wilson Prentes cc. 1081160390
- Boyer cerquera cc. 1004063617
- Oscar alexander olaya cc. 1005712510
- Julio Alberto Merino cc. 1588407

Residente de obra.

Interventoria

Miercoles 15 de marzo 2023.

Clima: Nublado.

Equipo: Herramienta menor.

Personal: Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 2 oficales, 5 ayudantes.

Hora: 7 am a 12 m.

Se inician actividades del día con los distintos frentes en cada una de las sedes

IE. JOSE HILARIO LOPEZ Sede CINCUENTENARIO: Se comienza con las actividades de desmonte de cubierta en fibrocemento, garantizando que el personal use los correspondientes elementos de proteccion personal retirando las tejas en un lugar seguro fuera del alcance de los estudiantes de la institución para evitar accidentes

IE. FERRO FAPIA. Sede ENCARNACIÓN: Se arman cajones para las columnas, manteniendo recubrimiento y plomos establecidos en las especificaciones técnicas, con ayuda de herramienta menor como lo son nivel y plomada

IE. JOSE HILARIO LOPEZ Sede JARDIN. Se procede a retirar escombros procedentes de las demoliciones realizadas para despejar el area y no afecte a ningún estudiante de la sede

Hora 1pm a 5 pm.
Clima: Soleado
Equipo: Herramienta menor.

Personal: Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes

Se continua realizando actividades programadas

Residente de obra.

Interventoría

Jueves. 16 de marzo 2023
Clima: Nublado.
Equipo: Herramienta menor.
Personal: Ingeniero residente, 1 maestro de obra, 2oficiales, 5 ayudantes
Hora: 7 am a 12 m.

Se comienza el día con el descargue de los insumos para las cubiertas de las sedes IE. Jose Hilario Lopes Sede el Jardin, IE Jose Hilario Lopez. Sede Cincuentenario, y posterior a ésta actividad, se comienzan los trabajos de instalación de la teja en las mismos, garantizando que el personal a cargo use los correspondientes elementos de protección personal.

Hora 1 pm a 5 pm.
Clima: Soleado.

Se continua con actividades programadas del día, instalando la teja, teniendo en cuenta las especificaciones, tecnicas y a la vez supervisando que el personal de obra use los correspondientes EPP

Residente de obra.

Interventoría.

Martes 21 de Marzo de 2023
clima: Soleado
Equipo: Herramienta menor
Hora: 7am a 12pm
Personal: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 2


Actividades:


Sede cincuentenario: Se realizan trabajos de instalacion de cubierta, en esta sede no se considera la instalacion de perfileria metalica, ya que la estructura existente esta en buenas condiciones para recibir la nueva cubierta.

Sede excavacion: Se realizan actividades iniciales de cerramiento en la parte posterior del salon

Residente de obra

Interventoria

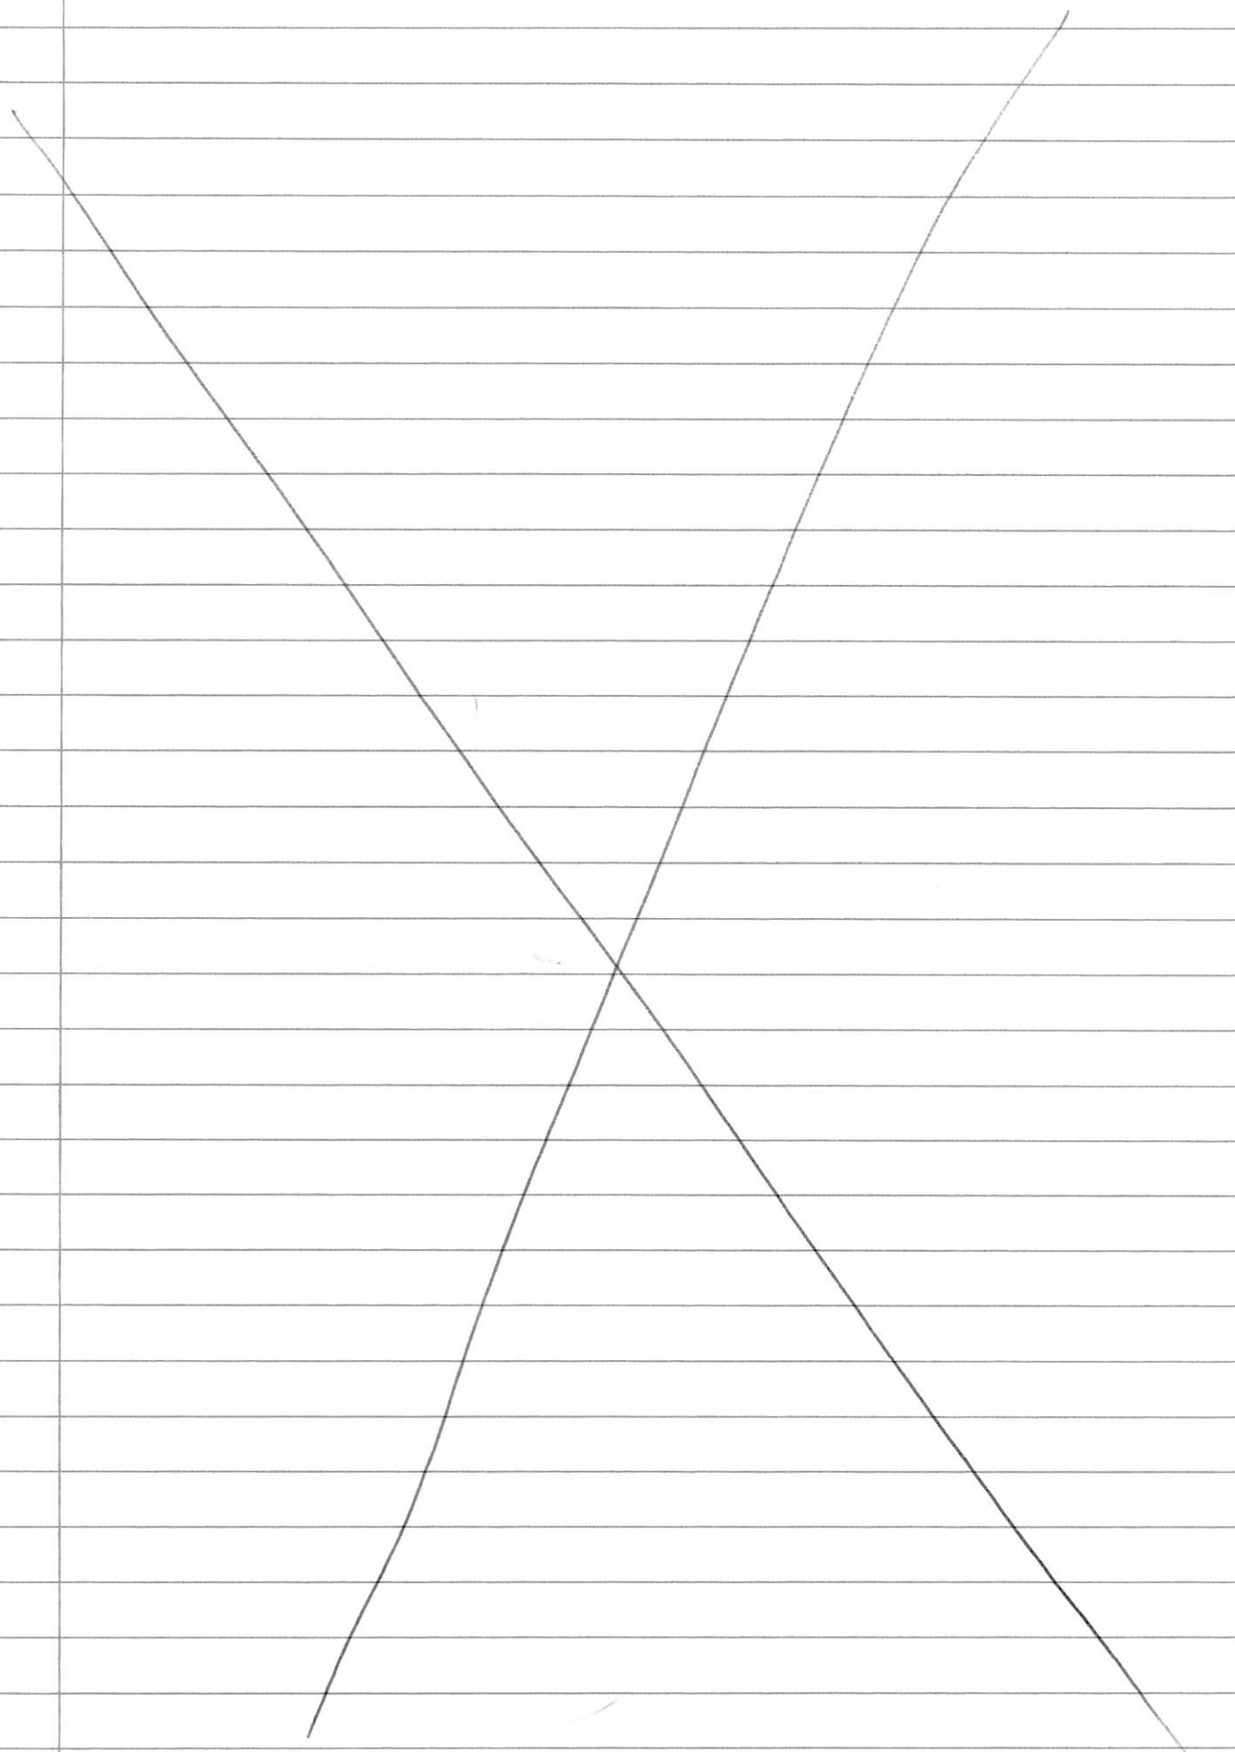

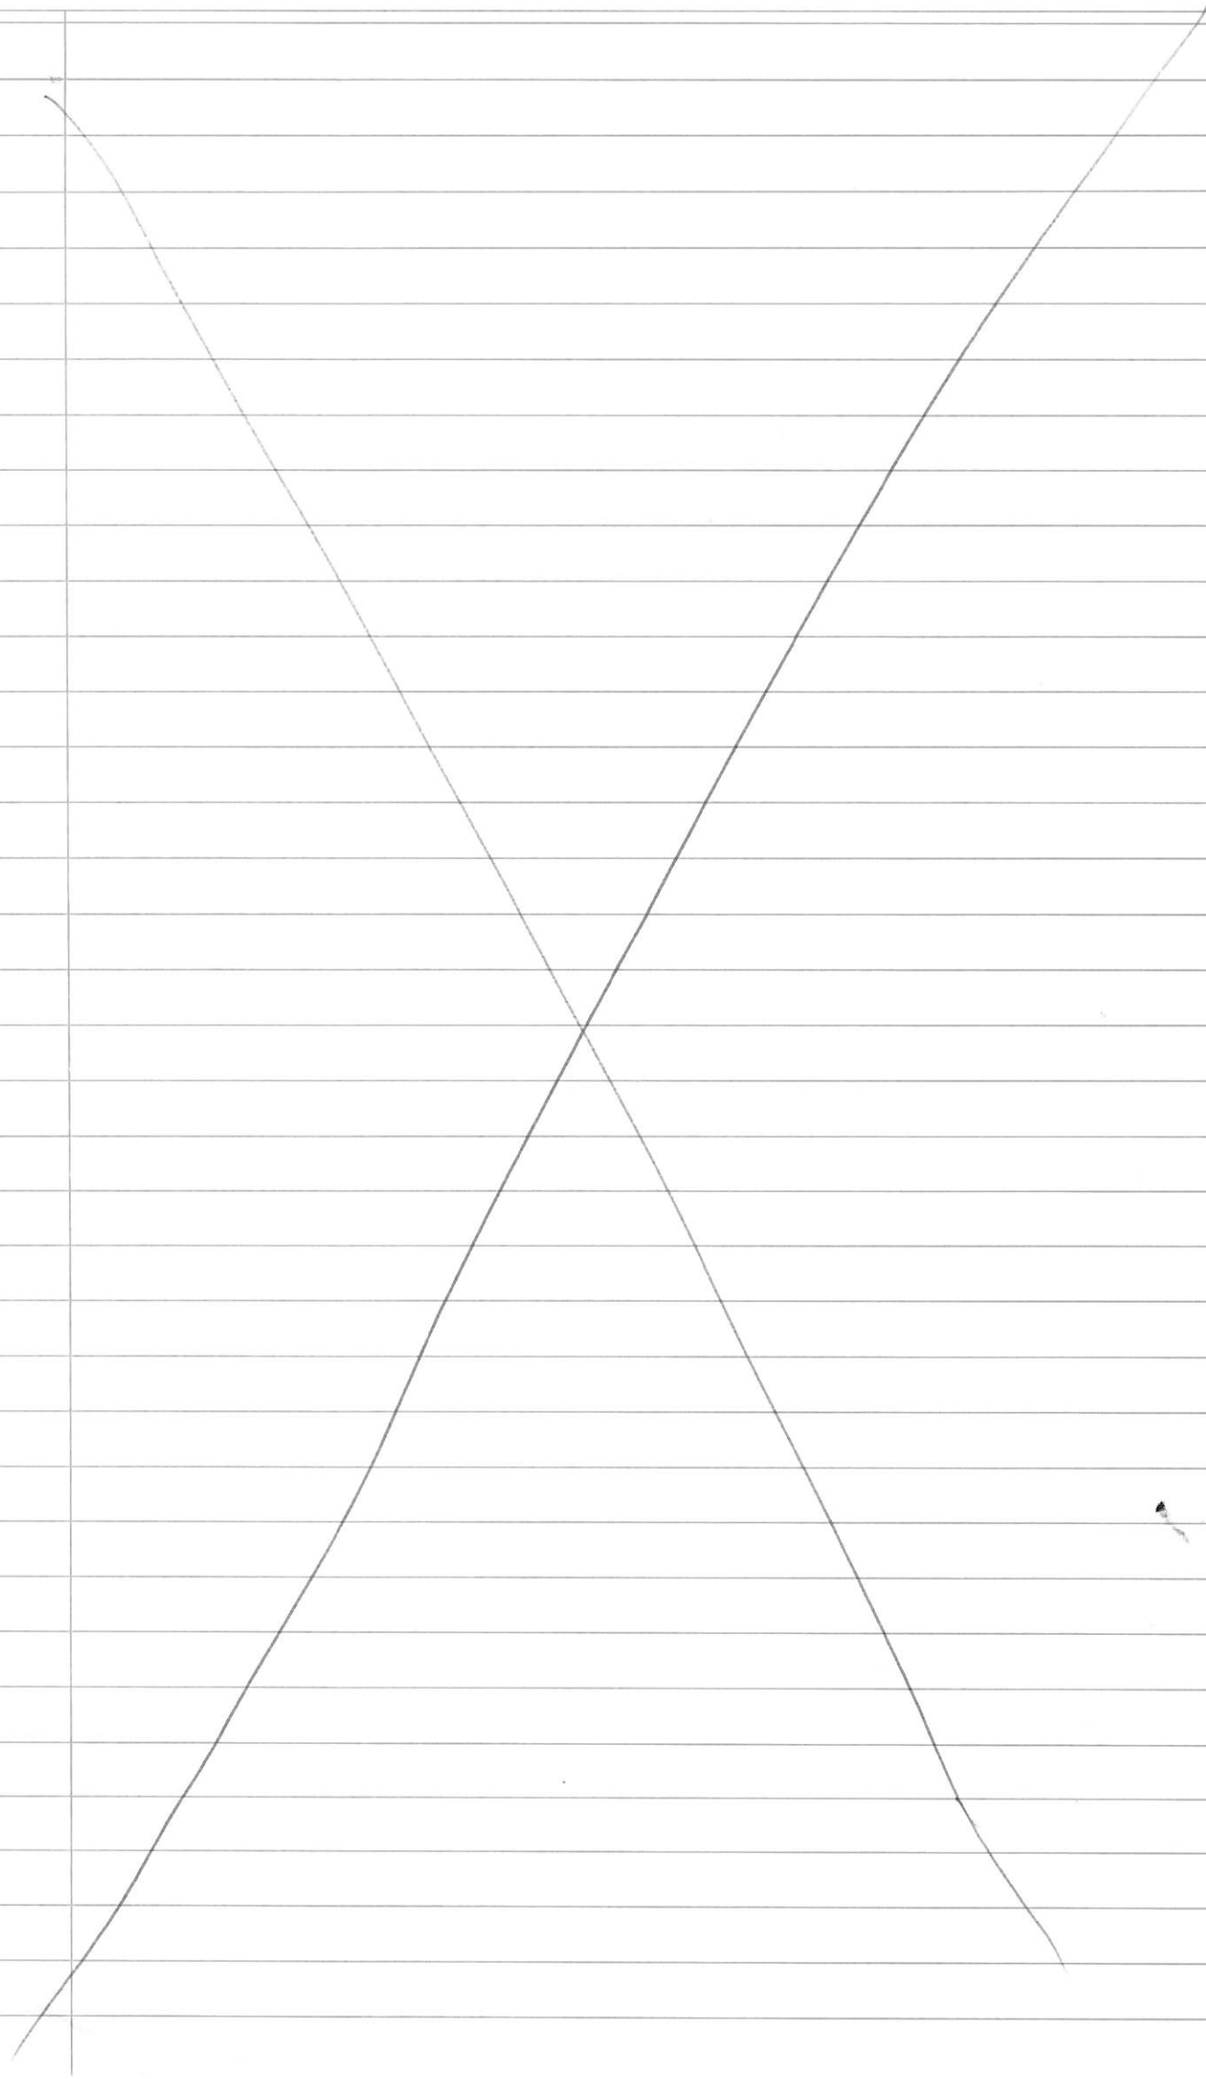

Miercoles 22 de Marzo de 2023.

Clima: soleado.
Personal: 2 maestros, 2 oficiales, 4 ayudantes, tres residentes de obra, dos residentes de interventoría, supervisor.
Equipo: taladros, herramienta menor.
Actividades:
Se realiza recorrido a las obras en compañía de la supervisión de obras, interventoria, contratista en cada una de las sedes.
sede. Arcelia. no se han iniciado labores de cubierta no hay personal laborando en este sector.
sede. Delia: no se encuentra personal laborando
sede cincuentenario = Se encuentra personal laborando. en la instalación de cubierta, se recomienda realizar los cambios de teja necesaria en donde por perforaciones mal realizadas. ameriten su cambio y así evitar goteras.
Sede. Encamación = Se encuentra personal laborando en la estructura del muro. del aula.
sede Jardín = No se encuentra personal laborando en las ventanas que se abrieron se recomienda la instalación de una hilera más de ladrillo para guardar el nivel de la ventana que siempre ha estado instalada. Se recomienda asegurar más la teja.
Sede: Jose hilario Sede central mixta: No se observa personal laborando.
Sede panamá = No se encuentra personal laborando
sede: IE Eugenio perro palla sede central: No se encuentra personal laborando.

En general se presenta una baja actividad en el desarrollo de las actividades dentro de lo estipulado en el cronograma y en si se ve la falta de personal y el material en obra. Se hace un llamado

Viernes 24 de MAYO. de 2023

clima soleado.

Personal: maestro, 3 oficiales, 5 ayudantes, residente de obra.

Equipos: soldadura, pulidora,

Actividades:

sede Arcelia: Entra a la sede material para los trabajos de estructura metálica, se descarga y se realiza el acopio adecuado del mismo dentro de la sede, se realizan conexiones adecuadas por parte del técnico electrico para el manejo del equipo de soldadura y pulidora.

Residente de obra

Interventoria

Sábado 25 de Marzo de 2023.

clima: Soleado
personal: maestro, 2 oficiales, 5 ayudantes.

Actividades:
Sede Arcelia: El personal inicia labores de corte y soldadura de perfilería para la estructura de cubierta.

Sede cincuentenario = Se realizan actividades de corte de tejas para la cubierta, Se realiza trabajos de demolición de una parte del enchape de muro del salón.

Residente de obra

Interventora

Domingo 26 de Marzo de 2023 No se laboró

Residente de obra.

Interventora

Lunes 27 de marzo de 2023

clima: soleado.
Personal: maestro, 2 oficiales, 5 ayudantes
Equipos:
Herramienta: menor.

Actividades: Dada una evaluación del trabajo hasta el momento realizado en la sede el Jardín, es necesario realizar el desmonte de la cubierta para poder corregir los desniveles que presenta esta y darle una pendiente uniforme.

Sede central mixta se realiza el acopio de material necesario para el alistado de nivelación a instalar dentro del aula.

Residente de obra.

Residente interventoría

Martes 28 de Marzo de 2023

Clima: Soleado

Personal: 5 ayudantes, un maestro general, Director de obra, inspector de obra y 2 ingenieros residentes.

equipo: herramienta menor

las actividades del Presente dia Son las Siguientes

Sede Cincuentanuevo: desmonte de Cobierta para cambio de tejas mal instalados

Sede Jardin: desmonte de Cobierta

Sede encamacion: levantamiento y Nivelacion de muro + Columneta, como tambien se inicio la apliacion de pañete

Sede Central mixta: Se realizo la respectivo nivelacion del piso, y asi mismo adecuar el terreno, para poder instalar el enchape sin ninguna dificultad

Residente de obra.

Residente interventoria

Miercoles 29 Marzo 2023.

Clima: Soleado.

Personal: 9 ayudantes., un maestro general, director -de obra, inspector de obra, 2 ingenieros residentes.

Equipo: Soldadura, herramienta menor.

Sede Arcelia: . Refuerzo en perfileria metálica para la estructura del kiosko.

Sede cincuentenario: Montura de cubierta.

Sede Encarnación: Pañete de muro levantado.

Sede Jardin: Remoción de pañete. parte inferior del muro.

Sede Cincuentenario: Se realizo la aplicacion de estuco sobre los muros del salon

Sede Encarnacion: Se realizo la respectiva fundicion de concreto reforzado para la columneta 0,15 x 0,25 y se termino de pañetar el Muro Nuevo, con columnas y viga, tanto la zona interna como la cara externa

Residente de obra

Interventoria

Jueves 30 de Marzo 2023.

Clima: Soleado.

Personal: 9 ayudantes, 1 maestro de obra, 1 oficial. Director de obra, inspector de obra, 2 ingenieros residentes.

Equipo: Soldadura, herramienta menor.

Sede Jardin: Se realizó el levantamiento de muros para conseguir la nivelación de la cubierta. pañete de muro.

Sede Arcelia: Refuerzo en estructura metálica.

Sede Central mixta: Se inicio con la respectiva instalacion del enchape de piso, segun a las especificaciones e it con contratado (Ceramio trafico)

Sed Encarnación: Se realizo el estucado de los muros internos del salon y se adecuo el piso con la respectiva Nivelacion.

Residente de obra

Interventoria

Viernes 31 de Marzo de 2023

clima: soleado

Personal: 9 Ayudantes. 1 Maestro general. Electrico, 1 persona carpintería metálica, Director de obra, inspectora de obra, 2 ingenieros residentes, 2 residentes interventoría

Equipo: herramienta menor

Se realiza recorrido en compañía de personal técnico eléctrico para evaluación eléctrica de cada sede, y con contratista de carpintería metálica para la construcción de la ventanería y puertas acorde a cada modelo presente por cada sede.
Se realizan compromisos para las actividades eléctricas y de construcción de la Carpintería metálica haciendo hincapie que teniendo en cuenta el plan de contingencia presentado es necesario por parte del contratista evaluar las actividades para poder dar cumplimiento a las obras por cada sede, ya que no se encuentra personal en todas laborando y también con el suministro debido de materiales.
A excepción de las sedes: Arelia, sede central mixta, encarnación en las cuales se encontro el poco personal laborando.
Con el personal contratista se acordo tener:

* Carpintería Metalica para ventanas para el día Viernes 7 de Abril.
* Instalaciones Electricas, inician labores el día de mañana 1 de Abril.
* Estructura cielo-raso en sede central mixta inicia labores el día 3 de abril.

Residente de obra.

Sabado 1de Abril 2023

Clima: Soleado

Personal: 9 residente, maestro, de obra,, electrico.

Equipo: Herramienta menor

Central mixta: Se dio por terminado la instalacion del enchape de piso, como tambien se instalo el respectivo guarda Escoba, tambien se realizo el estucado del salon.

Sede Panama: Se Aplico el esturco sobre los muros del salon, como tambien se hizo la demolicion del borde del tablero y se pañeto los vanos posteriores del Muro [8], como tambien se pañeto el vano al lado de la ventana y el borde del tablero que se hizo la anterior demolicion

Residente de obra

Interventoría

Lunes 3 de abril 2023.

Clima: Soleado.

Personal: 12 ayudantes, 1 maestro de obra, 3 oficiales. Director de obra, inspector de obra, 2 ingenieros residentes.

Equipo: Herramienta menor, Soldadura.

Sede Central: Montura de cubierta, alistado de piso.

Sede Jardin: Montura de perfileria para cubierta.

Sede Arcelia: Refuerzo de estructura de cubierta.

Sede Delia: Regateo para instalaciones eléctricas

Sede Central mixta: Se inicio con la instalacion de la Estructura para el cielo raso en PVC

Sede cincuentenario: se hizo la respectiva Instalacion de la estructura del cielo raso en pvc

Sede Encarnacion: se Inicio con la construccion de la alfajia en la parte inferior del lvano en donde se Instara las ventanas dobles, con el acero indicado segona lo contratado, Como tambien se inicio con la instalacion del enchape de piso del salon.

Residente de obra.

Interventora
