INDEPORTES ANTIOQUIA	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	F-AC-14	Versión 1
			Fecha aprobacion: 27/09/2022

Documento para ser diligenciado por el Supervisor de INDEPORTES Antioquia

F-AC-14

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - INDEPORTES

Fecha	Número		Período	
5/03/2024	1		3/04/2024	3/05/2024


Número de Convenio	Municipio
890 de 2023	Nariño
Subregión	Oriente

Objeto	Ejecutar obras de adecuación de la cancha de fútbol ubicada en el predio Carrera 11 N°12 - 153 con matrícula N°028 - 13509, del Corregimiento de Puerto Venus del municipio Nariño - Antioquia.		
Valor	$ 514.516.813	**Banco**	
		# de cuenta	
Plazo			
	Ampliación 1	N/A	
	Ampliación 2	N/A	

Supervisor Municipio	**Contacto**	
	Correo	
	Número	

Interventoría	MUNICIPIOS UNIDOS DEL SUR DE ANTIOQUIA (MUSA).	**Contrato**	LP -004 DE 2023
Contratista	CONSORCIO ESCENARIOS 2023 NIT: 901759117-1	**Contrato**	890 DE 2023

	Avance de Obra Fisico		Avance Financiero		Tiempo (días)	
	% Proyectado	100	% Proyectado		Plazo	100
	% Ejecutado	58	% Ejecutado	58%	Transcurridos	2 meses
Avance a fecha de corte						

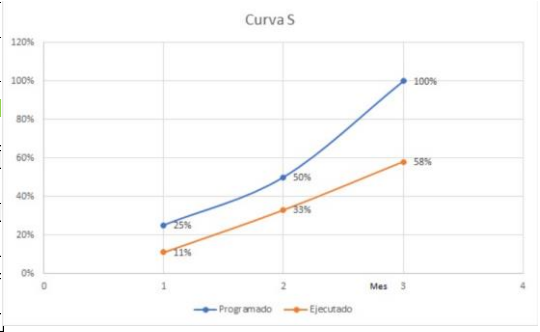

Observaciones

Durante éste periodo se llevaron a cabo las actividades correspondientes al proyecto sin embargo se detectaron las siguientes observaciones a) debido a la falta del material manto geotextil la ejecución física del sistema de drenaje se encuentra de la siguiente manera: filtros N°1 = 100% , filtro N°5 = 99%. los mismos se encuentran en un 100% por la ejecución de los otros filtros : N° 2, N°3 y N°4. b) las cajas de empalme se encuentran aún estan ejecutadas en un 95% , el 5% restante obedece a fraguado para instalación de tapas. impermeabilizante que no se ha aplicado añadiendo además la no instalación de los herrajes y las tapas. c) En función a los dos puntos anteriores es necesario culminar en su totalidad el sistema de drenaje para que posteriormente se pueda ejecutar de manera ordenada la limpieza general, retiro de material rocoso y nivelación con equipo mecánico.

Situación Crítica

las actividades que aún están pendientes por ser ejecutadas en su totalidad de todo el sistema de dreanje aun se encuentran a destiempo en función a lo programado (filtros 29/03/2024 al 06/04/2024 y cajas de empalme 06/04/2024 al 15/04/2024) esto ha generado que el avance físico del mismo no alcance todavía el 100% de su ejecución a la fecha 03/05/2024. Ahora bien es importante añadir que a pesar de que se iniciaron los trabajos de la construcción de los filtros antes de la fecha de inicio programada se habían presentado retrasos debido a la aparición de rocas de gran tamaño que ocasionaron obstrucciones considerables y que tuvieron que ser intervenidas afectando el rendimiento técnico del mismo. Cabe destacar que el día 09/04/2024 se evidenció roca de gran volumen que supera los 1,10m de diámetro en la parte final del filtro N° 5 el cual afectó el proceso de continuidad constructiva del mismo y el nivel de la cancha está situación está ocasionando otro retraso a tener en cuenta en función al cumplimiento total de la actividad. Se espera la culminación de los compromisos pendientes mediante la aplicación de estrategias que permitan ir avanzando en la ejecución de la obra.

Modificaciones Aprobadas al Proyecto

El día jueves 04/04/2024, se aprueba modificatorio del proyecto que consistio en lo siguiente: a) ampliación del área de la cancha de futbol de 37,20m x 80m a 86m x 41m . b) Inclusión de un quinto filtro con su respectiva caja de empalme así como también la prolongación de cada uno a 86m de largo, c) Anulación del cerramiento Ítems 3,1; 3,2; 3,3; 5,1; 5,2; 5,3. d) Inclusión de obras extras Items OE1; OE2; OE3 y OE4.

Nombre: Diomar Pino Ramírez
Supervisor

Nombre
Apoyo a la Supervisión

Fin del documento
