## INFORME SEMANAL

Semana Número: 6 Del: 1 de enero de 2024 Al: 7 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 33 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE LA MESA SUPERVISOR CESAR BURGOS

**OBJETO:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: ¨REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1¨.

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra programada (%) | 2,66% | 29,55% |
| Valor básico de la Obra | $ 842.995,26 | $ 9.364.853,35 |

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Física Ejecutada (%) | 0,36% | 90,82% |
| Valor básico de la Obra | $ 114.089,58 | $ 28.782.266,72 |

**CONTRATO DE OBRA**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | CONSORCIO SEDE MARSAF |
| Contrato No. | 2391 de 2023 |
| Valor Inicial: | 600.182.493,03 |
| Valor Actualizado: | 600.182.493,03 |
| Plazo Inicial: | 31 de diciembre de 2023 |
| Plazo Actualizado: | 24 de febrero de 2024 |
| Fecha de Iniciación: | 22 de noviembre de 2023 |
| Fecha de Vencimiento: | 24 de febrero de 2024 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

| | |
|---|---|
| **Interventor:** | CONSORCIO INTERAGRUPACIONES |
| Contrato No. | 2528 de 2023 |
| Valor Inicial: | 106.896.795,60 |
| Valor Actualizado: | 106.896.795,60 |
| Plazo Inicial: | 31 de diciembre de 2023 |
| Plazo Actualizado: | 24 de febrero de 2024 |
| Fecha de Iniciación: | 22 de noviembre de 2023 |
| Fecha de Vencimiento: | 24 de febrero de 2024 |

**IMAGEN OFICINA**

**IMAGEN OFICINA**

**AVANCE**

Se llevó a cabo la ejecución de las siguientes actividades: Aplicación remates de estuco y de pintura en superficies de muro del patio posterior, en Área de Atención al Público, en Cocina, en Área de Bodega - Archivo. Instalación de cinta antidslizante en peldaños de escaleras. Personal en Obra: 1 Oficial Ornamentador, 1 Oficial de Acabados, 1 Ayudante.

**IMAGENES AVANCE**



Comentario: Aplicación remates de estuco y pintura en Área de Atención al Público.




Comentario: Aplicación remates de estuco y de pintura en Cocina y nreparación tapa registro en PVC.



Comentario: Aplicación remates de estuco y de pintura en superficies de muro de Cocina.



Comentario: Aplicación remates de estuco y de pintura en superficies de muro del Área de Bodega - Archivo.

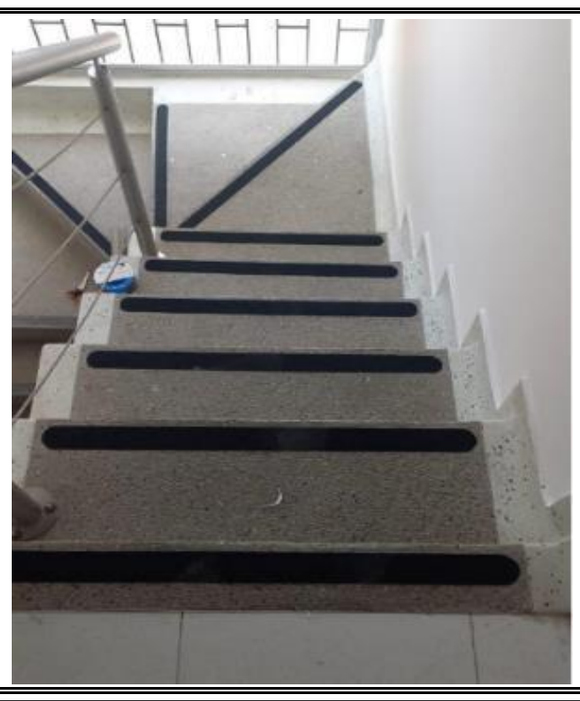

Comentario: Aplicación remates de estuco y de pintura en superficies de muro e Instalación de cinta antidslizante en peldaños de escaleras.



Comentario: Aplicación remates de estuco y de pintura en superficies de muro del patio posterior.

| OBSERVACIONES | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA |
|---|---|
| | Firma<br>Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M.<br>Matrícula No.:A25012004-80055117 CND |
