INFORME SEMANAL

Semana Número: 5 Del: 25 de diciembre de 2023 Al: 31 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 26 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ZIPAQUIRÁ SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: ¨REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1¨.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	7,36%	48,10%
Valor básico de la Obra	$ 2.089.856,65	$ 13.657.894,67

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	6,51%	95,27%
Valor básico de la Obra	$ 1.848.500,92	$ 27.051.717,79

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF
Contrato No.	2391 de 2023
Valor Inicial:	600.182.493,03
Valor Actualizado:	600.182.493,03
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO INTERAGRUPACIONES
Contrato No.	2528 de 2023
Valor Inicial:	106.896.795,60
Valor Actualizado:	106.896.795,60
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

Se llevó a cabo la ejecución de las siguientes actividades: Sustitución cielo raso. Aplicación de estuco y pintura a superficies de muros internos y externos. Falta instalar sanitarios.

IMAGENES AVANCE




Comentario: Aplicación de estuco y pintura a superficies de muros internos y externos.



Comentario: Sustitución cielo raso.




Comentario: Aplicación de estuco y pintura a suerficies de cielo raso.

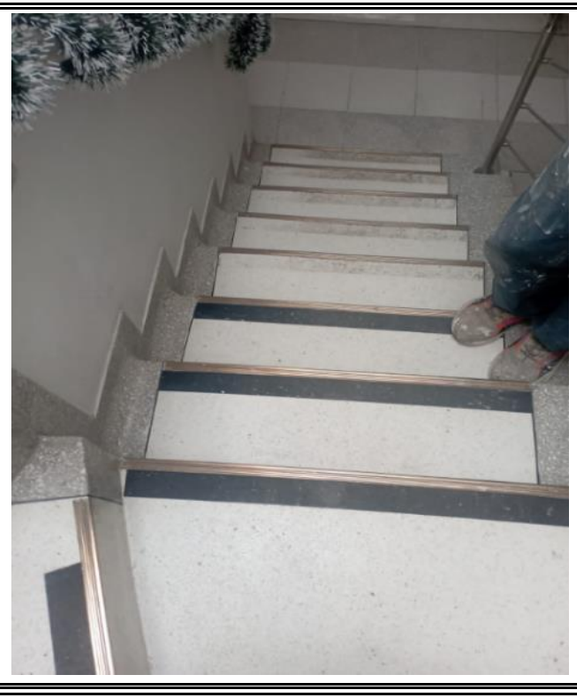

Comentario: Instalación de pasamanos en acero inoxidable, cinta antideslizante de piso en peldaños de escaleras.



Comentario: Aplicación de estuco y pintura a superficies de muros internos y externos.

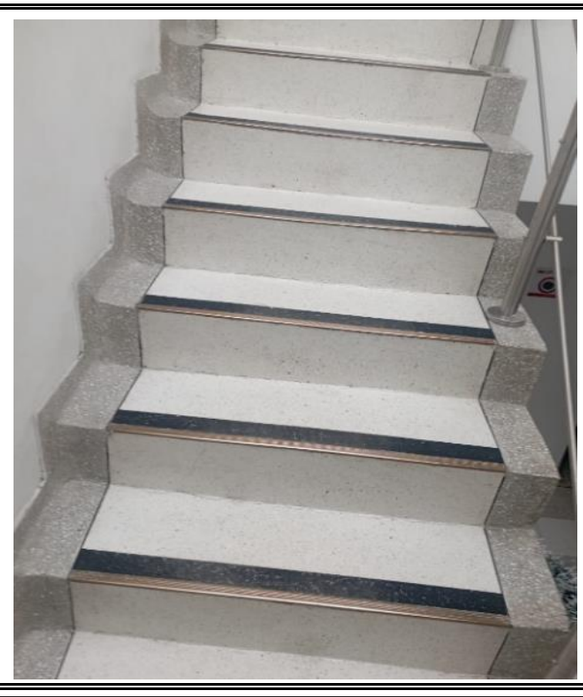

Comentario: Instalación de pasamanos en acero inoxidable, cinta antideslizante de piso en peldaños de escaleras.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M. Matrícula No.:A25012004-80055117 CND
