INFORME SEMANAL

Semana Número: 6 Del: 1 de enero de 2024 Al: 7 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 33 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ZIPAQUIRÁ SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: ¨REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1¨.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	8,85%	56,94%
Valor básico de la Obra	$ 2.512.939,04	$ 16.167.994,23

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,30%	95,57%
Valor básico de la Obra	$ 85.184,37	$ 27.136.902,16

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF
Contrato No.	2391 de 2023
Valor Inicial:	600.182.493,03
Valor Actualizado:	600.182.493,03
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO INTERAGRUPACIONES
Contrato No.	2528 de 2023
Valor Inicial:	106.896.795,60
Valor Actualizado:	106.896.795,60
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024


IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

Se llevó a cabo la ejecución de las siguientes actividades: Aplicación de remates de estuco y pintura a superficies de cielo raso en Oficina del Registrador. Aplicación de remates de estuco y pintura a superficies de muros de circulación interna y en superficies de cielo raso de oficinas administrativas. Aplicación de remates de estuco y pintura a superficies de muros de circulación interna. Falta instalar sanitarios. Personal en Obra: 2 Oficiales de Acabados, 1 Ayudante.

IMAGENES AVANCE

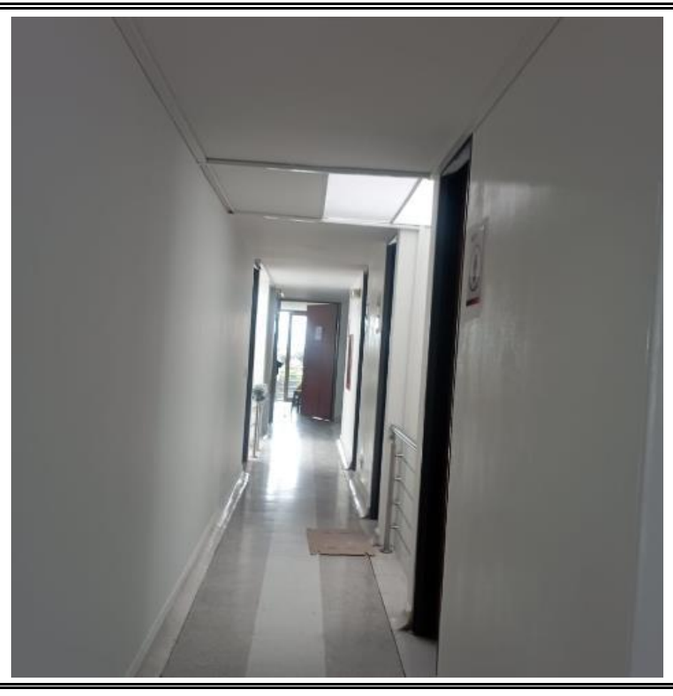

Comentario: Aplicación de remates de estuco y pintura a superficies de muros de circulación interna.



Comentario: Aplicación de remates de estuco y pintura a superficies de cielo raso en Oficina del Registrador.




Comentario: Aplicación de estuco y pintura a suerficies de cielo raso y pared en Área de Cocina.



Comentario: Instalación de pasamanos en acero inoxidable, cinta antideslizante de piso en peldaños de escaleras.



Comentario: Aplicación de estuco y pintura a superficies de muros internos y externos del Área Administrativa.

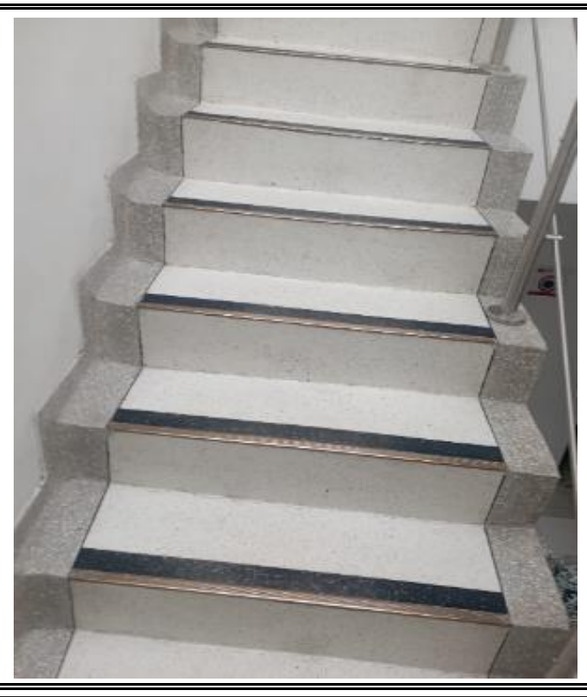

Comentario: Instalación de pasamanos en acero inoxidable, cinta antideslizante de piso en peldaños de escaleras.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma _____ Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M. Matrícula No.:A25012004-80055117 CND
