Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23		
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS		
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9		
Periodo del Informe:	20	2	2024	al	19	3	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746		
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO										

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 692.999.995	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	$ 693.211.736	Número CDP	3092 -2023	Fecha CDP		Fuente de Recursos	FONDIGER
			Valor RP	$ 692.999.995	Número RP	9140 -2023	Fecha RP	13/02/2023		
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	14	**Valor Total**	$ 692.999.995		**Descripción**					
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique								
		Valor Total	$ 692.999.995							

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio		**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
Cantidad de meses de prórroga 1			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Subtotal	$ 0							
		Valor Total (Inicial +	$ 692.999.995							
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	14	**Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique**			**Descripción**					
		Valor Total	$ 692.999.995							

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	2	2024	al	19	3	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) SI Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:		**Valor disminución :**	

Descripción del motivo de la disminución

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	0	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 692.999.995	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses Inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	14

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo **(Si Aplica)**	NO APLICA	**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**	NO APLICA	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

(Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y el estado que reporte la entidad que adelante la contratación derivada en caso que no sea directamente el IDIGER O IDIGER - FONDIGER)

NO APLICA CONTRATACIÓN DERIVADA

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del informe:	20	2	2024	al	19	3	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
1. 20 de feb al 19 de marzo 2023	4 de agosto 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 1 - 2023ER17545_Pago 1
2. 20 de marzo al 19 de abril 2023	4 de agosto 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 2 - 2023ER17544_Pago 2
3. 20 de abril al 19 de mayo 2023	20 de septiembre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 3 - 2023ER21358_ Pago 3
4. 20 de mayo al 19 de junio 2023	20 de septiembre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 4 - 2023ER21357_Pago 4
5. 20 de junio al 19 de julio 2023	20 de octubre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 5 - 2023ER24133_ Pago 5
6. 20 de julio al 19 de agosto 2023	20 de octubre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 6 - 2023ER24132_ Pago 6
7. 20 de agosto al 19 de septiembre	13 de diciembre 2023	24.254.998	Corresponde al mensual 7 - 2023ER28146 _ Pago 7
8. 20 de septiembre al 19 del octubre	13 de diciembre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 8 - 2023ER28148 _ Pago 8
9. 20 de octubre al 19 de noviembre	13 de diciembre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 9 - 2023ER28149 _ Pago 9
10. 20 de Noviembre al 19 de Diciembre	20 de febero 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 10 - 2024ER3749 _ Pago 10
11. 20 de Diciembre 2023 al 19 de Enero 2024	04 de Marzo 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 11 - 2024ER4612 _ Pago 11

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	2	2024	al	19	3	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	Pilar del Rocio Garcia Garcia Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
Mensual 1	24.254.999	OP 23296 (11-08-2023)	Corresponde al mensual 1 - 2023ER17545_Pago 1
Mensual 2	24.254.999	OP 23298 (11-08-2023)	Corresponde al mensual 2 - 2023ER17544_Pago 2
Mensual 3	24.254.999	OP 23672 (22-09-2023)	Corresponde al mensual 3 - 2023ER21358_ Pago 3
Mensual 4	24.254.999	OP 23671 (22-09-2023)	Corresponde al mensual 4 - 2023ER21357_Pago 4
Mensual 5	24.254.999	OP-23971 (27-10-2023)	Corresponde al mensual 5 - 2023ER24133_ Pago 5
Mensual 6	24.254.999	OP-23968 (25-10-2023)	Corresponde al mensual 6 - 2023ER24132_ Pago 6
Mensual 7	24.254.998	OP-24558 (18-12-2023)	Corresponde al mensual 7 - 2023ER28146 _ Pago 7
Mensual 8	24.254.999	OP-24560 (18-12-2023)	Corresponde al mensual 8 - 2023ER28148 _ Pago 8
Mensual 9	24.254.999	OP-24561 (18-12-2023)	Corresponde al mensual 9 - 2023ER28149 _ Pago 9
Mensual 10	24.254.999	OP-25131 (26-02-2024)	Corresponde al mensual 10 - 2024ER3749 _ Pago 10
Mensual 11	24.254.999	OP-25205 (08-03-2024)	Corresponde al mensual 11 - 2024ER4612 _ Pago 11
	-		
TOTALES	**266.804.988**		

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	2	2024	al	19	3	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

8. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	SEGUROS MUNDIAL	21-44-101406042	20/02/2023	20/04/2025	9/03/2023	138.599.999
Pago de salarios			20/02/2023	20/04/2027	9/03/2023	34.650.000
Calidad del servicio			20/02/2023	20/042027	9/03/2023	138.599.999
Responsabilidad civil extra contractual	SEGUROS MUNDIAL	21-40-101205844	20/02/2023	20/04/2024	9/03/2023	232.000.000

MODIFICACIÓN 1

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato						
Pago de salarios						
Calidad del servicio						
Responsabilidad civil extra contractual						

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	2	2024	al	19	3	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) SI Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								
Objeto Contractual:									
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.									

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si		No	X

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento técnico del contrato, así como análisis respecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso etc.).

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del informe:	20	2	2024	al	19	3	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								
Objeto Contractual:									
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.									

Resumen del desarrollo del contrato

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2023 al 19 de enero de 2024, los contratos de consultoría FONDIGER 010 DE 2023 e interventoría FONDIGER 013 de 2023 se encuentran en el décimo primer mes de desarrollo del proyecto, que corresponde al 93% del tiempo de ejecución del contrato. En el periodo se desarrollaron mesas de trabajo, reuniones de seguimiento, se emitieron y recibieron conceptos mediante oficios como soportes de las actividades del contrato de consultoría e interventoría.

Dentro de los alcances y la aprobación del cronograma del plan de contingencia y por medio de la estructura de valor ganado. Los avances durante el mes del presente informe para consultoría se relacionan a continuación: Avance programado consultoría :82.6% Avance Real Consultoría 31.64%.

La interventoría informa "que los avances presentados durante el periodo del informe son poco significativos dada la época de ejecución, en donde no se presentaron aprobaciones adicionales a los documentos y productos remitidos por la consultoría.

Resumen administrativo: Se realizaron todas las gestiones de seguimiento que han permitido el desarrollo del contrato.
Resumen jurídico: Se cumplieron los requisitos precontractuales y de inicio.
Resumen financiero:

Técnicos	31.6%	Técnico	31.6%
Financieros consultoría	10.0%	Financieros Interventoría	38.5%

Se anexa el informe de supervisión correspondiente

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	2	2024	al	19	3	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Miltán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La supervisión verifico el cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales conforme a los documentos (planillas, pagos, certificaciones) allegados por el contratista para el pao del producto 1, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002: "(....) verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. (...) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal(...)"

Fecha emisión de Informe	27	3	2024

Firma

Pilar del Rocio García García
Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Técnico: en caso que haya sido designado): Sin personal Asignado

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

IDIGER

SEGUIMIENTO A CONTRATOS Y CONVENIOS

Informe de Supervisión Contrato de interventoría FONDIGER 13-2023

Fecha de elaboración del informe	27 de Marzo de 2024
Periodo de seguimiento	20 de Febrero de 2024 al 19 de Marzo de 2024
Fecha de inicio	20 de febrero de 2023
Fecha de terminación	19 de abril de 2024
Valor del Contrato	$ 692.999.995
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE
Nombre de contratista	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Nombre del Supervisor	PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA
PLAZO DE EJECUCIÓN	14 meses

Avance


(INCLUIR EL PORCENTAJE DE AVANCE TÉNCICO Y FINANCIERO)

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 20 de Enero de 2024 al 19 de febrero de 2024, los contratos de consultoría FONDIGER 010 DE 2023 e interventoría FONDIGER 013 de 2023 se encuentran en el décimo tercer mes de desarrollo del proyecto, que corresponde al 93% del tiempo de ejecución del contrato. En el periodo se desarrollaron mesas de trabajo, reuniones de seguimiento, se emitieron y recibieron conceptos mediante oficios como soportes de las actividades del contrato de consultoría e interventoría.

Dentro de los alcances y la aprobación del cronograma del plan de contingencia y por medio de la estructura de valor ganado. Los avances durante el mes del presente informe para consultoría se relacionan a continuación: Avance programado consultoría: 82.60% Avance Real Consultoría 31.64%.

La interventoría informa "*Durante el periodo del informe se han entregado documentos que no cuentan con la calidad y pertinencia para el estudio, por lo que no representan un avance significativo,* ***pese a lo anterior, se reconoce el desarrollo de mesas de trabajo en las cuales se evidencian avances en la ejecución de los componentes*** *, aunque se espera que los documentos entregados reflejen dicha información para validar los productos. En principio, el consultor reporta actividades inherentes al plan de exploración y el componente de Jarillones, como principales elementos que son trabajados durante el periodo del presente informe. Con respecto a los demás componentes, se hace la entrega de la metodología de hidráulica e hidrología. Lo anterior, demuestra los retrasos del proyecto dado que no se presentan avances en los componentes y por tanto en la entrega de documentos y actividades que hacen parte del cronograma y del contrato, de los cuales se ha recomendado adelantar y ajustar la información* "

Figura 4-1 Avance real vs programado

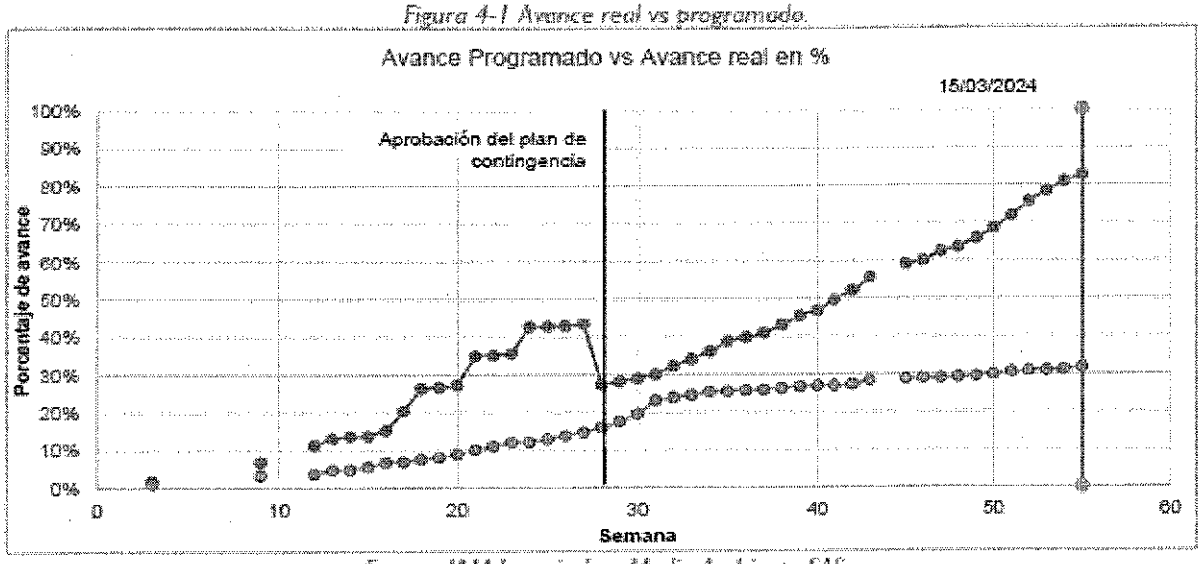

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente SAS

Técnicos	31,6%	**Técnico**	31,6%
Financieros consultoría	10,0%	**Financieros Interventoría**	38,5%

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

(RELACIONAR CORREOS, RESPUESTAS OFICIALES, REUNIONES Y TRÁMITES REALIZADOS EN EL PERÍODO DE SEGUIMIENTO)

Fecha	Actividad	Soporte
20/02/2024	Comité de seguimiento - Estado actual del proyecto	Acta
20/02/2024	Se radica cuentas de cobro correspondiente al los informes mensuales de interventoría No. 10 y No. 11, la correspondiente al informe 11 fue devuelta por la oficina de pagos	Comunicación 2024ER3746, Comunicación 2024ER3747
20/02/2024	Comité de seguimiento - Estado actual del proyecto	Comunicación 2024ER3747
22/02/2024	Mesa de trabajo Metodología AVR	Acta

22/02/2024	La entidad solicita a consultoría documentos para dar continuidad a la modificación del contrato para adicionar nuevo ítem	Correo Electrónico
22/02/2024	Mesa de trabajo Hidrología e Hidráulica (Consultoría, Interventoría y supervisión)	Acta
23/02/2024	Audiencia presunto incumplimiento 2, consultoría envía informe de descargos	Audiencia - Correo electrónico
23/02/2024	Se remite informe semanal del 12 DE FEBRERO AL 18 DE FEBRERO DE 2024	Comunicación 2024ER4022
27/02/2024	Comité de seguimiento - Estado actual del proyecto	Acta
28/02/2024	Se remite Informe mensual de interventoría No .12	Comunicación 2024ER4266
29/02/2024	Se solicita a interventoría ajustar documento de solicitud acorde con las observaciones realizadas por la oficina jurídica para la modificación por la adición de nuevo ítem	Correo electrónico
4/03/2024	Se radica cuenta de cobro correspondiente al informe mensual de interventoría No. 11	Comunicación 2024ER4612
5/03/2024	Comité de seguimiento - Estado actual del proyecto	Acta
8/03/2024	Mesa de trabajo Hidráulica (Consultoría, Interventoría y supervisión)	Acta
8/03/2024	Solicitud de cambio por parte de Interventoría del profesional Ambiental por la Ing. Carolina Figueroa para el cargo de ingeniero ambiental.	Comunicación 2024ER5057
8/03/2024	Remisión informes semanal de 19 de febrero al 25 de febrero 2024	Comunicación 2024ER5131
11/03/2024	Se remite observaciones realizadas por supervisión al Informe mensual de interventoría No .12	Comunicación 2024EE4387
12/03/2024	Comité de seguimiento - Estado actual del proyecto	Acta
13/03/2024	Mesa de trabajo Hidráulica y Geotecnia (Consultoría, Interventoría y supervisión)	Acta

14/03/2024	Mesa de trabajo Metodología AVR	Acta
14/03/2024	Se remite Informe mensual de interventoría No .12, ajustado con las observaciones realizadas	Comunicación 2024ER5449
14/03/2024	Remisión informes semanal de 26 de febrero al 3 de marzo 2024	Comunicación 2024ER5482
15/03/2024	Remisión de informe por parte de la interventoría frente al informe de descargos del consultor en el marco del segundo presunto incumplimiento	Comunicación 2024ER5567
15/03/2024	Solicitud de información a la EAAB por parte de consultoría, la entidad realiza la respectiva gestión interinstitucional	Correo Electrónico
15/03/2024	Remisión informes semanal de 4 de marzo al 10 de marzo 2024	Comunicación 2024ER5604
15/03/2024	alcance al informes enviado por parte de la interventoría frente al informe de descargos del consultor en el marco del segundo presunto incumplimiento	Comunicación 2024ER5803
19/03/2024	Comité de seguimiento - Estado actual del proyecto	Acta

SEGUIMIENTO TECNICO:

(RELACIONAR INFORMES Y/O APORTES TÉCNICOS REALIZADOS N EL PERÍODO DE SEGUIMIENTO)

Producto	Fecha	Actividad	Soporte
Informes Mensual	14/03/2024	Informe Mensual 12 de interventoría en V2	Comunicación 2024ER5449

PROFESIONAL RESPONSABLE

PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA - SUPERVISORA DEL CONTRATO
