
ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999

NIT: 900.002.220-8

INFORME DE EJECUCIÓN

CONVENIO SOLIDARIO No. 007 DE 2024,

"PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA"

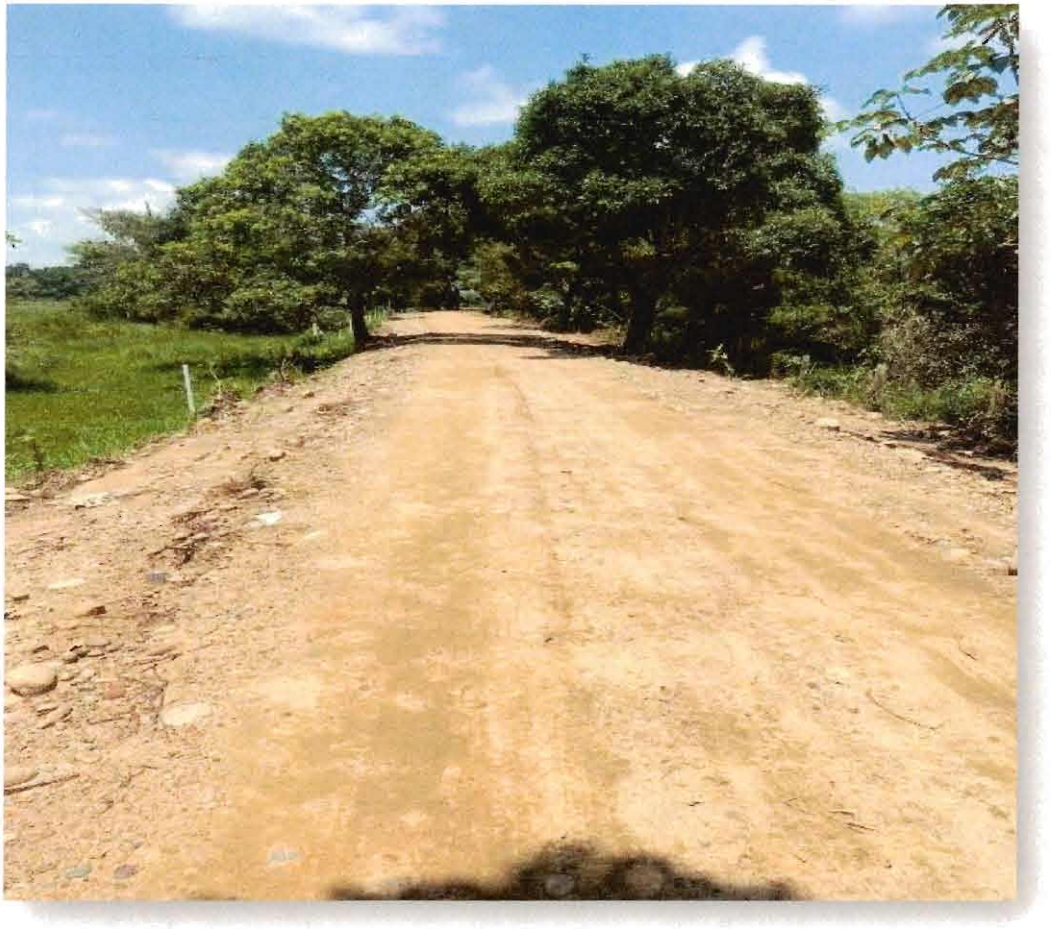

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"

R/L: HENRY PAUL ALFONSO

TAURAMENA - CASANARE,

22 DE MARZO – 26 DE ABRIL 2024

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

PRESENTACIÓN

El presente informe refleja las actuaciones de la Contratación directa No. CDMT-SI-018-2024 que tiene por objeto "PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA", durante el período de ejecución del contrato y la supervisión, seguimiento, control y acompañamiento del mismo.

ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y VIABILIZACIÓN.

De acuerdo a lo expuesto, el presente proceso contractual se realizó de acuerdo al cumplimiento de los estatutos de "la ASOJUNTAS" *en el capítulo cuarto numeral 18, según naturaleza de los convenios, ítem 3, "Asamblea General: desde (60) salarios mínimo legales mensuales vigentes, mas de un peso ($1,00)…"* se le solicita autorización a la asamblea, para que el presidente HENRY PAUL ALFONSO celebre el convenio RED VIAL "PLAN DE VERANO" 2024 HASTA LA MENOR CUANTIA ($364.000.000) CON EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL "PLAN VERANO" 2024 MUNICIPIO DE TAURAMENA, elaborado y aprobado para tal fin, con un concepto favorable de las siguientes características:

ALCANCE.

Teniendo en cuenta que el municipio de Tauramena cuenta con diferentes vías de acceso que comunican la zona urbana y la zona rural entre sí. Actualmente, dichas vías de acceso conducen a varios sectores de gran importancia y son la garantía de movilidad para la comunidad de las veredas, cuya actividad económica principal es la ganadería y la agricultura, hoy se encuentran en mal estado, dificultando el paso normal de los usuarios, lo que conlleva a que el uso de la vía pueda comprometer la seguridad y el bienestar de estos, generando la ocurrencia de accidentes, el desgaste excesivo de los vehículos de transporte y el aumento del costo de los fletes dadas las deplorables condiciones del carreteable.

La comunidad requiere que se mejore y realice mantenimiento a la malla vial rural, teniendo en cuenta que por la condición de "vías a nivel de afirmado" y en algunos sectores a "nivel de subrasante", se deterioran aceleradamente con el uso y con el efecto de las condiciones de intemperismo. Las vías rurales que presentan gran deterioro, dificultan en gran manera el desarrollo de los proyectos agrícolas y pecuarios. Es muy difícil el acceso a las fincas, el transporte de insumos para cultivos y ganadería, y en general se está viendo perjudicada la población rural al ver frustradas sus aspiraciones de desarrollo por no contar con vías en buen estado que facilite su actividad diaria y el acceso a los servicios.

La Asociación, deberá ejecutar dentro del proyecto las siguientes actividades:

Mejoramiento vial: Conformación subrasante mejorada (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación).

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

BENEFICIARIOS. Habitantes de la zona rural de Tauramena.

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: CINCO (05) MESES

PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA: 23,08%.

PLAN FINANCIERO: el proyecto corresponde a $ 331.055.656.00 (Aporte del Municipio: $300.055.656.00 y Aporte de la asociación $ 31.000.000)

CÓDIGO	PROYECTO	VALOR A EJECUTAR	Registro Presupuestal No.	ORIGEN RECURSOS
2.3.24.2402.0600.2020854100036	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS, TERCIARIAS, CAMINOS, PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES, EN EL MUNICIPO DE TAURAMENA.	$150.000.000	273 14/03/2024	1.2.1.0.00 I.C.L.D
		$150.055.656		1.2.4.3.04 SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MIUNICIPIOS CATEGORIAS 4,5 Y 6
VALOR TOTAL		**$300.055.656**		

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999

NIT: 900.002.220-8

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONVENIO SOLIDARIO N.º	007 DE 13 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA"
CONTRATISTA	ASOJUNTAS TAURAMENA
REPRESENTANTE LEGAL	HENRY PAUL ALFONSO
SUPERVISOR	ING. LINO RODRIGUEZ OCHOA
TIEMPO DE EJECUCIÒN	CINCO (05) MESES
ACTA DE INICIO	22 DEMARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE AGOSTO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILONES CERO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 331.055.656.00)
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	TRESCIENTOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($300.055.656.00)
VALOR APORTE DE LA ASOCIACIÓN	TREINTA Y UN MILLON DE PESOS M/CTE ($ 31.000.000)
ANTICIPO	SE INFORMÓ POR PARTE DE ASOJUNTAS TAURAMENA LA RENUNCIA DEL ANTICIPO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL CONVENIO SOLIDARIO

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	%	ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
BYC 10004086 (Anexo 1)	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	MUNDIAL DE SEGUROS	$ 66.211131,20	13/03/2024	23/12/2024
	BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO	100%	MUNDIAL DE SEGUROS	$60.011.131,00	13/03/2024	23/12/2024
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	MUNDIAL DE SEGUROS	$ 16.552.782,80	13/03/2024	23/08/2027
BYC 100005628 (Anexo 1)	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	200S MLV	MUNDIAL DE SEGUROS	$ 260.000.000	13/03/2024	23/08/2024

ESTADIO FINANCIERO ACTUAL DEL PROYECTO

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	VALOR
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	22-03-2024	$ 331.055.656,00
APORTE DE LA ASOCIACIÓN		$31.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 331.055.656,00**

ACTIVIDADES ADELANTADAS.

- Se realizó visita de control y seguimiento con el coordinador de maquinaria para evaluar las condiciones de las vías terciarias a intervenir.
- Se inician las actividades en las vías terciarias del Municipio de Tauramena para la conformación de subrasante mejorada de los cuales se procede a la escarificación, perfilación, conformación y compactación y no es necesario el riego de terreno debido a las lluvias presentadas en la zona.

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

Se ejecutaron los siguientes ítems contractuales dando óptimo cumplimiento al Convenio Solidario con el fin de satisfacer las necesidades de las vías terciarias.

APORTE DEL MUNICIPIO:

ITEM 1. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE MEJORADA (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación), las maquinas son del Municipio de Tauramena, No incluye costo equipo).

Se adelantaron actividades de disgregación de la superficie del terreno por medio de la motoniveladora y la retroexcavadora así mismo se llevó a cabo limpieza, formación, reconstrucción y perfilado de cunetas para cumplir la función de protección de la calzada, especialmente de la acción erosiva del agua, pues favorecen la conducción del agua de escorrentía hacia los drenajes, posterior a esto se realiza la compactación con el cilindro compactador para eliminar los espacios vacíos, aumentar su densidad, la capacidad de soporte y estabilidad de la vía, no fue necesario el riego al terreno debido a las lluvias que se habían presentado ya que esto favoreció en la humedad necesaria para su intervención.

APORTE DE ASOCIACION DE ASOJUNTAS DE TAURAMENA "ASOJUNTAS":

ITEM 2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA, representada en 4 ayudantes.

Se apoyó en la ejecución de la actividad de conformación de subrasante mejorada por medio de los ayudantes que aportó la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Tauramena "ASOJUNTAS".

De esta manera se intervinieron 30 kms de vías terciarias del Municipio de Tauramena, localizados en las veredas, Jaguito, Bendiciones, Sector la Y Guafal del Caja y Piñalito bajo, de los cuales se dividieron en 10 tramos.

VEREDAS	TRAMOS INTERVENIDOS	TOTAL INTERVENIDO KM
Jaguito, Bendiciones, sector la Y hacia Guafal del caja.	Tramo 1, 2 Y 3	7,2 km
Piñalito Bajo.	Tramo 4,5,6,7,8,9 y 10	22,8 km

A continuación, se anexa avance de ejecución del Convenio Solidario;

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE TAURAMENA
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
CAMARA DE COMERCIO No. 1077 DE MARZO DE 1999
Nit. 900.022.220-8

DESDE EL 22 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2024


DÍAS	KM INTERVENIDO		FECHA LABORADA	TRAMOS INTERVENIDOS kms		VEREDAS
0	Inicio de actividades revision de la zona		22/03/2024			
1	0,7	km	23/03/2024	TRAMO 1	2,6	
2	1,5	km	25/03/2024			
3	0,4	km	26/03/2024			Jaguito, Bendiciones, sector la Y hacia Guafal del caja.
4	0,7	km	27/03/2024	TRAMO 2	3	
5	2	km	28/03/2024			
6	0,3	km	29/03/2024			
7	0,2	km	30/03/2024	TRAMO 3	1,6	
8	0,8	km	1/04/2024			
9	0,6	km	2/04/2024			
10	2	km	3/04/2024	TRAMO 4	3,35	Piñalito Bajo.
11	0,75	km	4/04/2024			
12	0,6	km	5/04/2024			
13	2	km	6/04/2024	TRAMO 5	3,9	
14	1	km	8/04/2024			
15	0,9	km	9/04/2024			
16	0,8	km	10/04/2024	TRAMO 6	6,8	
17	1	km	11/04/2024			
18	5	km	12/04/2024			
19	0,5	km	13/04/2024	TRAMO 7	1,9	
20	0,4	km	15/04/2024			
21	1	km	16/04/2024			
22	2	km	17/04/2024	TRAMO 8	3,7	
23	1	km	18/04/2024			
24	0,7	km	19/04/2024			
25	0,65	km	20/04/2024	TRAMO 9	1,85	
26	0,9	km	22/04/2024			
27	0,3	km	23/04/2024			
28	0,4	km	24/04/2024	TRAMO 10	1,3	
29	0,5	km	25/04/2024			
30	0,4	km	26/04/2024			
TOTAL	30	km				

KATTIA JULIETH VIASUS CACERES
Ing. Residente
C.S. 007/2024

BERNABE VIVAS BAUTISTA
Coordinador de Maquinaria
C.S. 007/2024

Se realiza la Localización Geográfica (Fig.1) y registros fotográficos de un antes, durante y después de la ejecución de las actividades del Convenio de 3 tramos intervenidos localizados en las Veredas; Jaguito, Bendiciones y sector la Y Guafal del Caja, en donde se obtuvo un total de vía terciaria intervenida de **7,2 kms.**

Fig. 1 Localización Geografica de 3 tramos intervenidos.

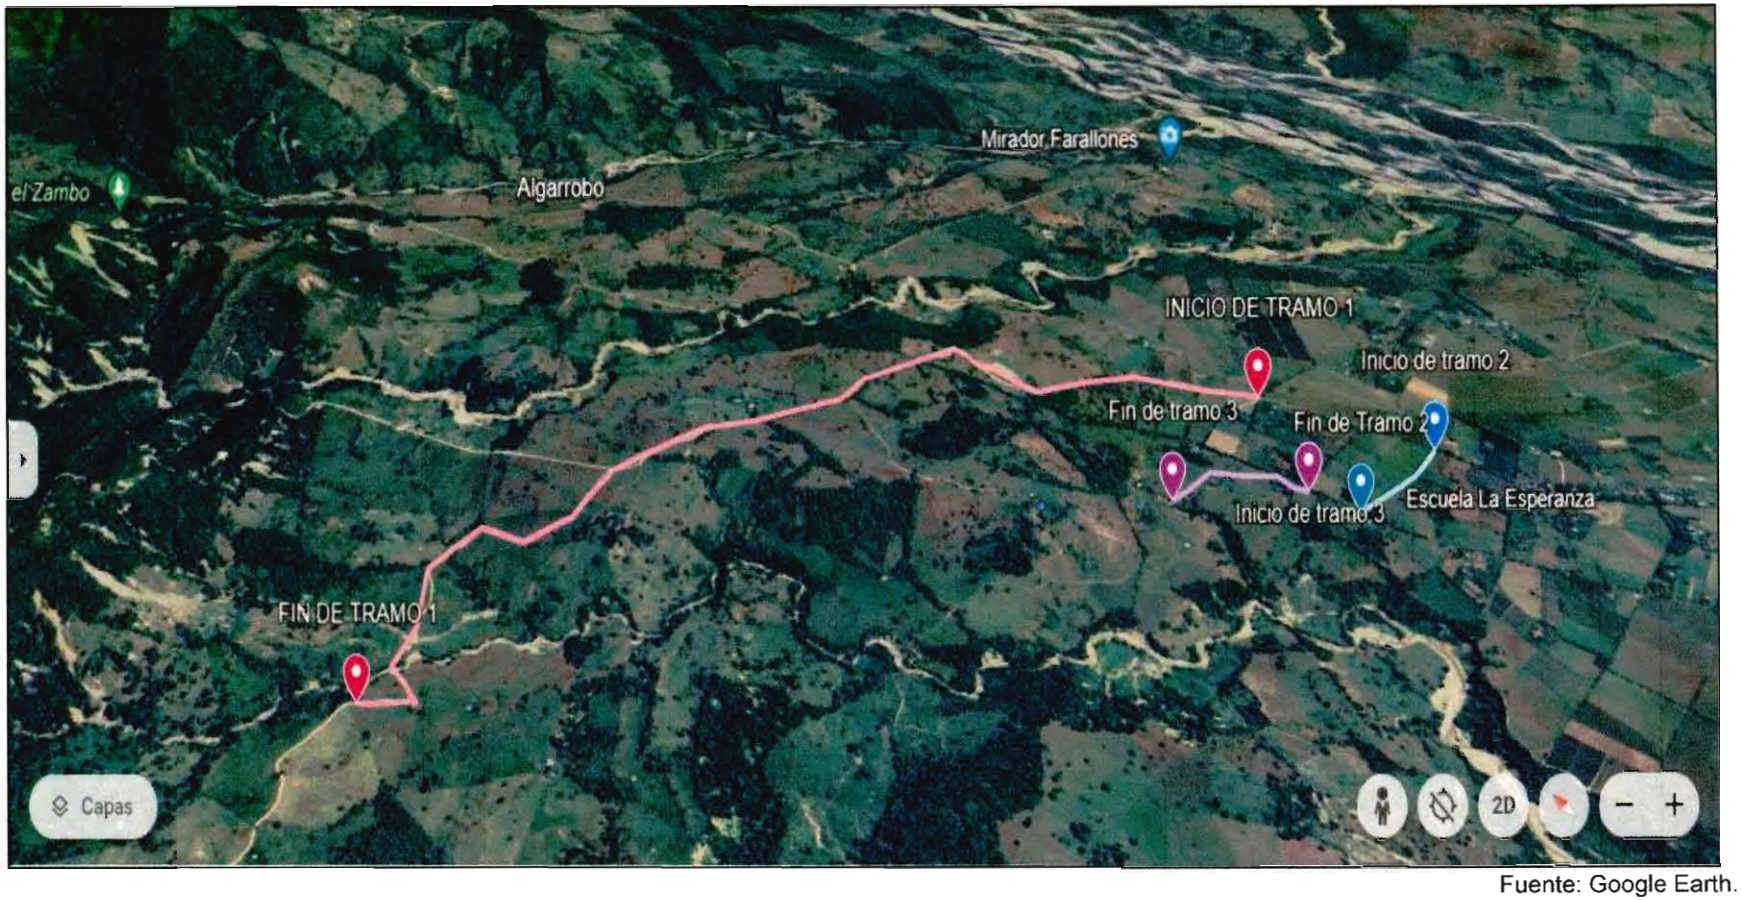

Fuente: Google Earth.

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

INTERVENCIÓN TRAMO 1	
ANTES	DURANTE
	
DESPUES	
	

Dirección: Calle 10 N° 14 -47/57 Barrio Centro
Email: presidente.asojuntastauramena@gmail.com

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

INTERVENCIÓN TRAMO 2	
ANTES	DURANTE
	
DESPUÉS	
	

Dirección: Calle 10 N° 14 -47/57 Barrio Centro
Email: presidente.asojuntastauramena@gmail.com


ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

INTERVENCIÓN TRAMO 3	
ANTES	DURANTE
	
DESPUÉS	
	

Dirección: Calle 10 N° 14 -47/57 Barrio Centro
Email: presidente.asojuntastauramena@gmail.com


A continuación, se realiza la Localización Geográfica (Fig.2) y registros fotográficos de un antes, durante y después de la ejecución de las actividades del Convenio de 7 tramos intervenidos localizados en las Vereda; Piñalito Bajo, en donde se obtuvo un total de vía terciaria intervenida de **22,8 kms.**

Fig.2 Localización Geográfica de 7 tramos intervenidos.

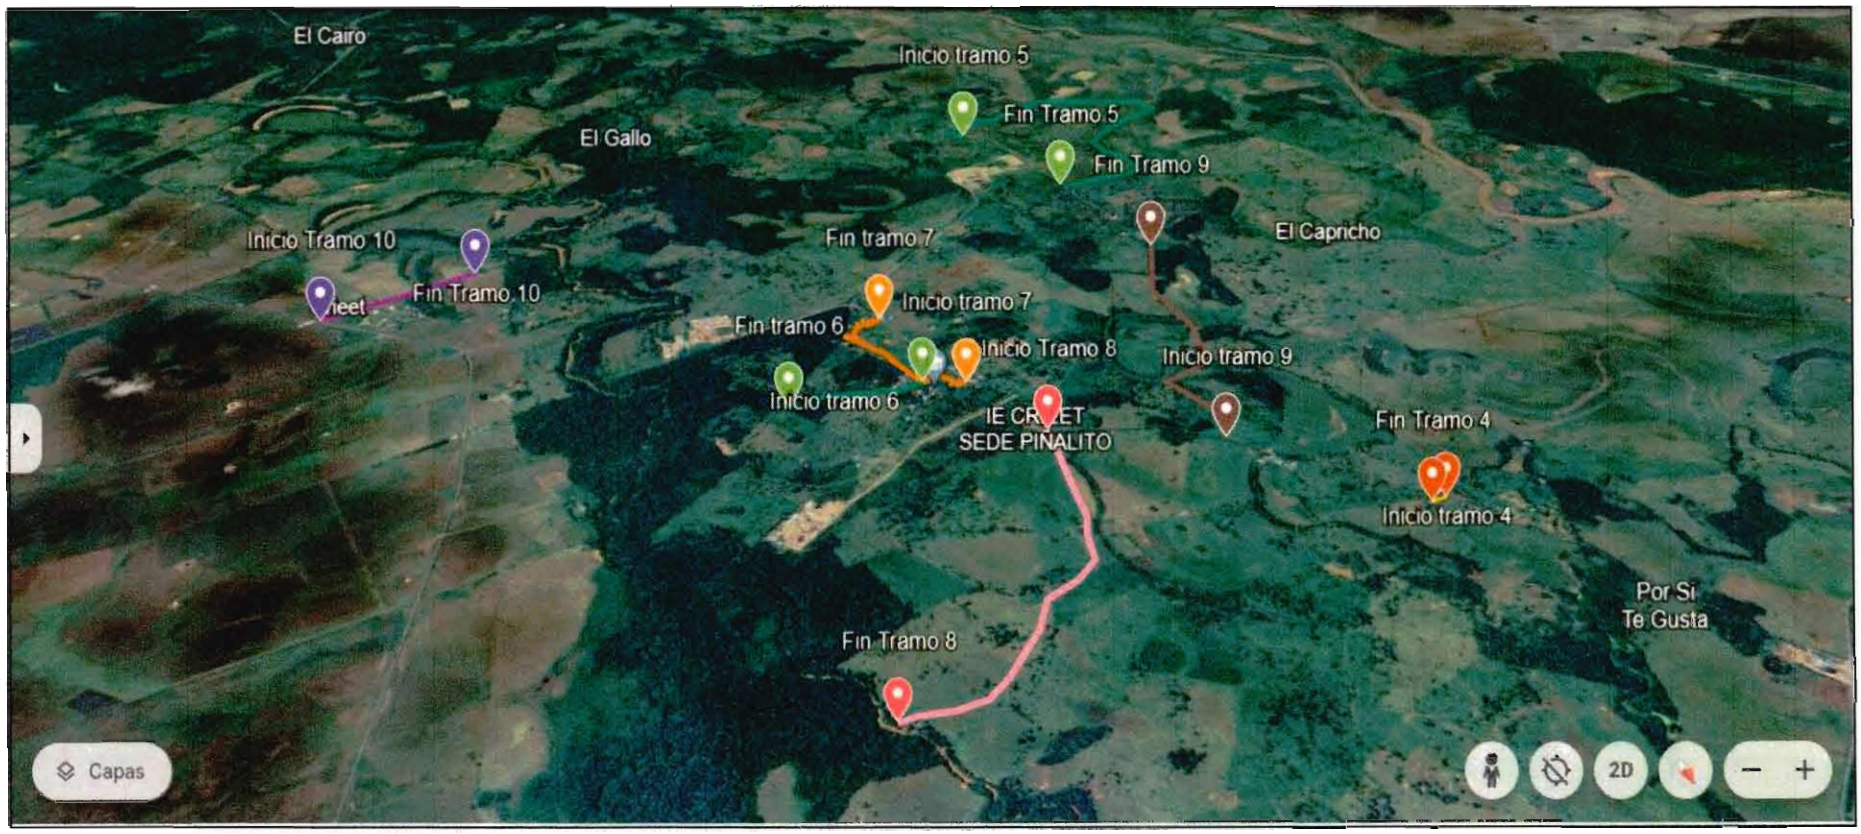

Fuente: Google Earth

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

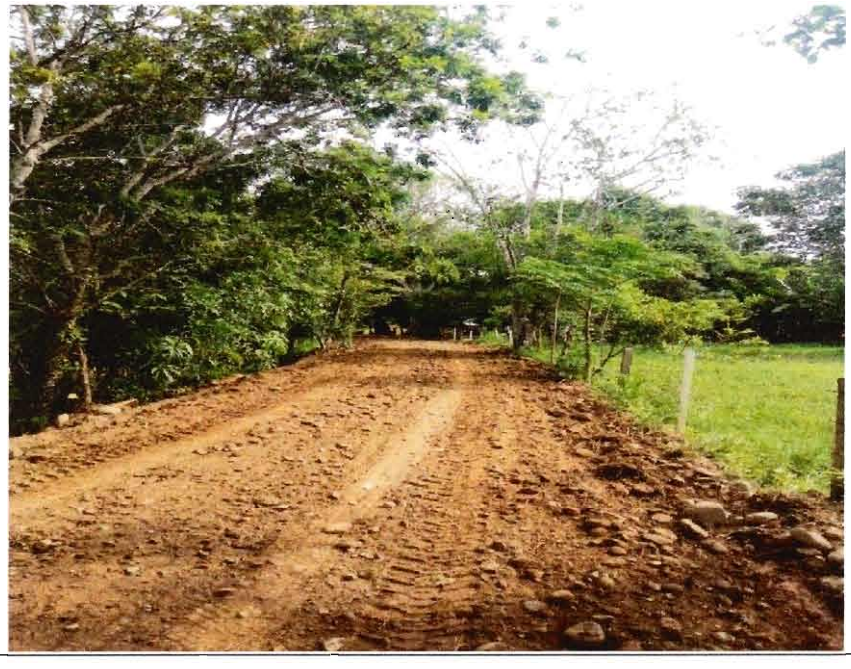INTERVENCIÓN TRAMO 4	
ANTES	DURANTE
	
DESPUÉS	
	

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

INTERVENCIÓN TRAMO 5

ANTES	DURANTE
	

DESPUÉS




Dirección: Calle 10 N° 14 -47/57 Barrio Centro
Email: presidente.asojuntastauramena@gmail.com
"Por la Unidad del Desarrollo Integral y Comunitario"

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

INTERVENCIÓN TRAMO 6	
ANTES	DESPUÉS
	
DESPUES	
	

Dirección: Calle 10 N° 14 -47/57 Barrio Centro
Email: presidente.asojuntastauramena@gmail.com
"Por la Unidad del Desarrollo Integral y Comunitario"

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

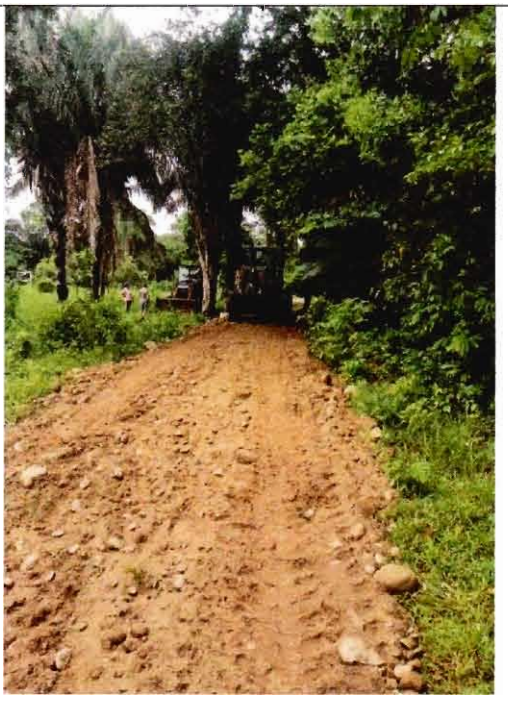INTERVENCIÓN TRAMO 7	
ANTES	DURANTE
	
DESPUÉS	
	

Dirección: Calle 10 N° 14 -47/57 Barrio Centro
Email: presidente.asojuntastauramena@gmail.com

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999


NIT: 900.002.220-8

INTERVENCIÓN TRAMO 8	
ANTES	DESPUÉS
	
DESPUÉS	
	

Dirección: Calle 10 N° 14 -47/57 Barrio Centro
Email: presidente.asojuntastauramena@gmail.com

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999


NIT: 900.002.220-8

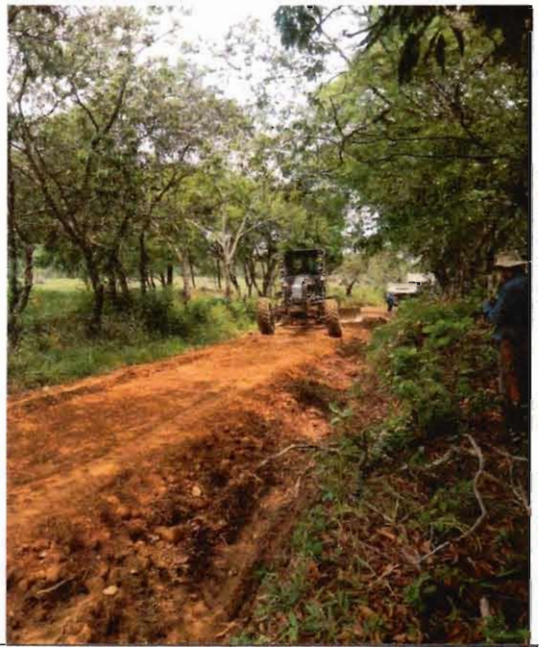INTERVENCIÓN TRAMO 9	
ANTES	DURANTE
	
DESPÚES	
	

Dirección: Calle 10 N° 14 -47/57 Barrio Centro
Email: presidente.asojuntastauramena@gmail.com
"Por la Unidad del Desarrollo Integral y Comunitario"

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999

NIT: 900.002.220-8

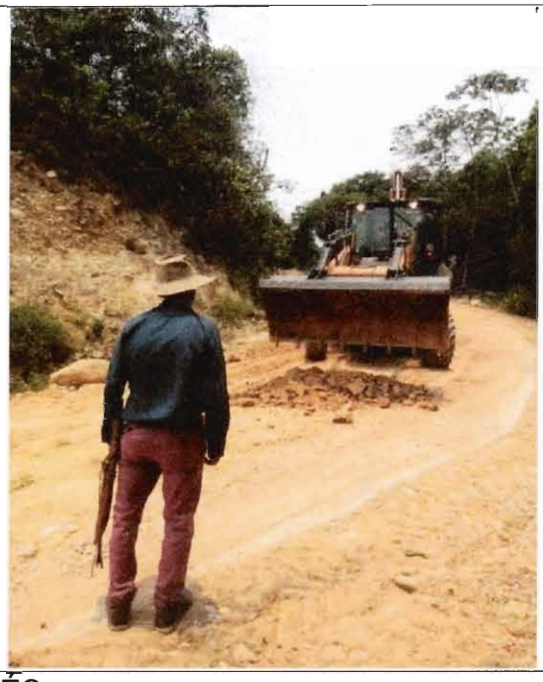INTERVENCIÓN TRAMO 10	
ANTES	DURANTE
	
DESPUÉS	
	

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

- Todo el personal del presente convenio solidario, se encuentran afiliados al sistema de Seguridad Social integral (Salud, pensiones y riesgos laborales y la caja de compensación Comfacasanare (se anexan planillas de pago).

- A todo el personal del presente convenio Solidario se le realizo entrega de dotación.

- Se realizaron pausas activas durante el desarrollo de las actividades en el día.

- Se realizaron listas de chequeo preoperacionales de toda la maquinaria amarilla y la volqueta. (se anexan listas de chequeo).

- Se realizó visita técnica por parte de Partequipos para la revisión de la maquinaria amarilla de acuerdo a las fallas que presentaba. (se anexa reporte).

- Se realizó revisión de la Volqueta de placas OSE966 por parte de Navitrans en la Ciudad de Duitama, por parte de garantía.

INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.

Durante la ejecución del presente Convenio Solidario, se presentaron diferentes inconvenientes de los cuales afectaron en mínima medida el avance del desarrollo de las actividades de este;

- El día 24 de Abril de 2024, se realizó el cargue y transporte de la volqueta de placas OSE966 a una grúa que provee la Previsora S.A, que se encontraba ubicada en el patio de maquinarias - Vereda Aceite alto, para ser llevada a un centro de servicios de Navitrans ubicado en el Kilómetro 1 Vía Duitama – Paipa para el respectivo mantenimiento de Garantía.


- El día Viernes 26 de Abril de 2024, se agendó la visita técnica de Mantenimiento y Garantía para el día 30 de Abril de 2024, para la maquinaria amarilla, por parte de Parte - Equipos de acuerdo a las diferentes fallas que se presentaban las maquinarias y de las cuales estaba afectando la ejecución del presente convenio.

- El día Miércoles 29 de Abril de 2024, se solicitó la renuncia del anticipo de acuerdo a inconvenientes presentados con el proceso de la apertura de la cuenta en el Banco Agrario el cual se demoró 20 días hábiles, y la solicitud de un modificatorio para la Cláusula 7. y Cláusula 8, de la minuta del contrato y así evitar afectaciones la ejecución del convenio.

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO.

El presente Convenio Solidario No. 007 del 13 de Marzo de 2024 presenta un avance de ejecución a la fecha del 23,08% representado en 30 días calendario y 30 kms intervenidos,.

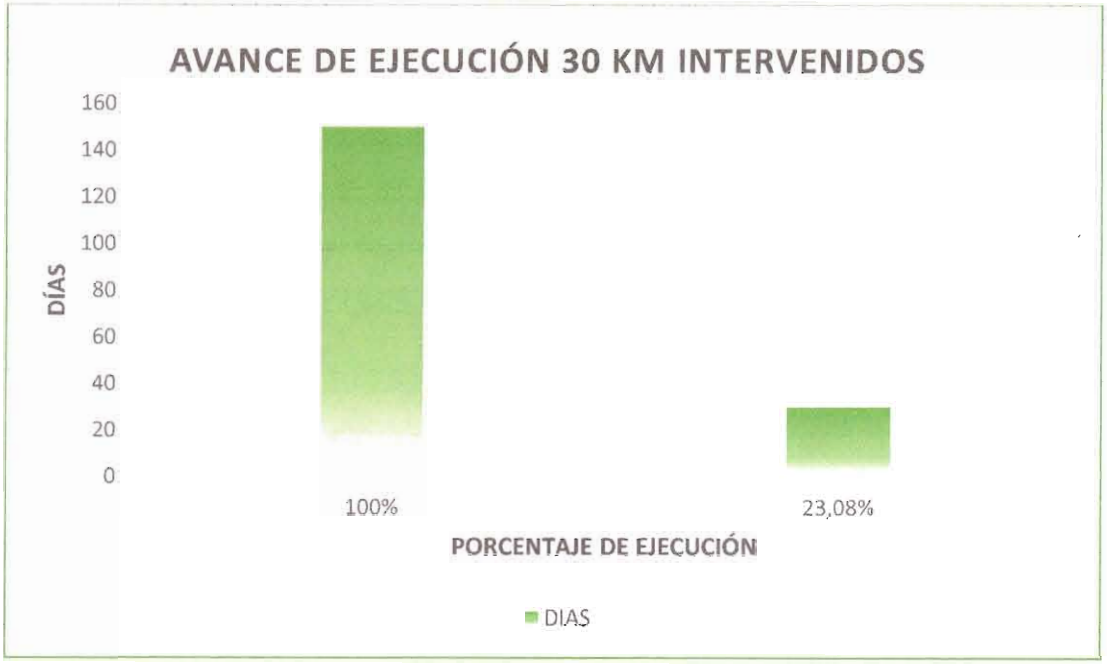

HENRY PAUL ALFONSO
Representante legal ASOJUNTAS
NIT. No. 900.002.220-8

KATTIA JULIETH VIASUS CACERES
Ing. Residente
C.S. 007/2024

ANEXOS

1. BITÁCORA

INFORME SEMANAL DE OBRA
FCO09-20
Versión: 3

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	007 DE 2024
		13	DE MARZO	DE 2024		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: 1 de 20 Del: 22-mar-24 Al: 29-mar-24

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 7 Días. Tiempo faltante: 143 Días

Nombre del Supervisor: Wilson Villamil Hernandez % Tiempo transcurrido: 5%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,00%	5,00%	Obra Ejecutada (%)	5,00%	5,00%
Valor de la Obra programada:	$16.552.782,80	$ 16.552.782,80	Valor de la Obra	$ 16.552.782,80	$ 16.552.782,80
Diferencia semanal:		0,00%	**Diferencia acumulada:**		**0,00%**

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"	**Interventor:**	N/A
Contrato No.	007 de 2024	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$ 331.055.656,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES	Plazo Inicial:	N/A
Plazo Actualizado:		Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	22/03/2024	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Términación:	21/08/2024	Fecha de Términación:	N/A
Estado del contrato:	EJECUCION	Estado del contrato:	N/A
Avance financiero:		Avance financiero:	N/A
% avance financiero:		% avance financiero:	N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se realiza inspección de las zonas a intervenir en compañia del Coordinador de la maquinaria para conocer las necesidades del terreno, de acuerdo a esto, se inician las actividades para la conformacion de subrasante mejorada de los cuales se procede a la escarificación, perfilación, conformación y compactación y no es necesario el riego de terreno debido a las lluvias presentadas en la zona.
2. Las actividades se llevan a cabo con todo el equipo de maquinaria amarilla propiedad de la Administración Municipal de Tauramena.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se procede a seguir con actividades de escarificación, perfilación, conformación y compactación de las vias terciarias.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El presente contrato cuenta con acta de inicio desde el día 22 de Marzo de 2024, igualmente se anexa el acta de entrega de la maquinaria amarilla (motoniveladora, cilindro compactador, volqueta y retroexcavadora sobre llanta) por parte del secretario de Infraestructura y del Almacenista Municipal al representante legal de ASOJUNTAS, la cual será utilizada en la ejecución del presente contrato, cabe acalarar que la maquinaria se recibio con diferentes fallas, por la cual se estará gestionando las visitas correspondientes de los técnicos de Navitrans y Parte equipos, la actividad de conformación de subrasante mejorada se realizará en las vias Terciarias del Municipio de Tauramena.

OBSERVACIONES

La Maquinaria amarilla (motoniveladora, cilindro compactador, volqueta y retroexcavadora sobre llanta), esta a la espera de una visita de mantenimiento de Garantia por parte de Navitrans y Parteequipos.

RESIDENTE DE OBRA

KATTIA JULIETH VIASUS CACERES

Firma

INFORME SEMANAL DE OBRA
FCO09-20
Versión: 3

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	007 DE 2024
		13 DE MARZO DE 2024				

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número 2 de 20 Del: 30-mar-24 Al: 7-abr-24

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 14 Días. Tiempo faltante: 136 Días

Nombre del Supervisor: Wilson Villamil Hernandez % Tiempo transcurrido: 9%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,00%	9,00%	Obra Ejecutada (%)	9,00%	9,00%
Valor de la Obra programada:	$29.795.009,04	$ 29.795.009,04	Valor de la Obra	$ 29.795.009,04	$ 29.795.009,04
Diferencia semanal:		0,00%	**Diferencia acumulada:**		**0,00%**

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"	**Interventor:**	N/A
Contrato No.	007 de 2024	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$ 331.055.656,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES	Plazo Inicial:	N/A
Plazo Actualizado:		Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	22/03/2024	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Términación:	21/08/2024	Fecha de Términación:	N/A
Estado del contrato:	EJECUCION	Estado del contrato:	N/A
Avance financiero:		Avance financiero:	N/A
% avance financiero:		% avance financiero:	N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se realiza inspección de las zonas a intervenir en compañia del Coordinador de la maquinaria para conocer las necesidades del terreno, de acuerdo a esto, se inician las actividades para la conformacion de subrasante mejorada de los cuales se procede a la escarificación, perfilación, conformación y compactación y no es necesario el riego de terreno debido a las lluvias presentadas en la zona.
2. Las actividades se llevan a cabo con todo el equipo de maquinaria amarilla propiedad de la Administración Municipal de Tauramena.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se procede a seguir con actividades de escarificación, perfilación, conformación y compactación de las vias terciarias.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El presente contrato cuenta con acta de inicio desde el día 22 de Marzo de 2024, igualmente se anexa el acta de entrega de la maquinaria amarilla (motoniveladora, cilindro compactador, volqueta y retroexcavadora sobre llanta) por parte del secretario de Infraestructura y del Almacenista Municipal al representante legal de ASOJUNTAS, la cual será utilizada en la ejecución del presente contrato, cabe acalarar que la maquinaria se recibio con diferentes fallas, por la cual se estará gestionando las visitas correspondientes de los técnicos de Navitrans y Parte equipos, la actividad de conformación de subrasante mejorada se realizará en las vias Terciarias del Municipio de Tauramena.

OBSERVACIONES

La Maquinaria amarilla (motoniveladora, cilindro compactador, volqueta y retroexcavadora sobre llanta), esta a la espera de una visita de mantenimiento de Garantia por parte de Navitrans y Parteequipos.

RESIDENTE DE OBRA

KATTIA JULIETH VIASUS CACERES

Firma

INFORME SEMANAL DE OBRA
FCO09-20
Versión: 3

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	007 DE 2024
		13 DE MARZO DE 2024				

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: 3 de 20 Del: 8-abr-24 Al: 15-abr-24

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Días. Tiempo faltante: 129 Días

Nombre del Supervisor: Wilson Villamil Hernandez % Tiempo transcurrido: 14%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	14,00%	14,00%	Obra Ejecutada (%)	14,00%	14,00%
Valor de la Obra programada:	$46.347.791,84	$ 46.347.791,84	Valor de la Obra	$ 46.347.791,84	$ 46.347.791,84
Diferencia semanal:		0,00%	**Diferencia acumulada:**		**0,00%**

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"	**Interventor:**	N/A
Contrato No.	007 de 2024	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$ 331.055.656,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES	Plazo Inicial:	N/A
Plazo Actualizado:		Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	22/03/2024	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Términación:	21/08/2024	Fecha de Términación:	N/A
Estado del contrato:	EJECUCION	Estado del contrato:	N/A
Avance financiero:		Avance financiero:	N/A
% avance financiero:		% avance financiero:	N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se inician las actividades para la conformacion de subrasante mejorada de los cuales se procede a la escarificación, perfilación, conformación y compactación.
2. Las actividades se llevan a cabo con todo el equipo de maquinaria amarilla propiedad de la Administración Municipal de Tauramena.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se procede a seguir con actividades de escarificación, perfilación, conformación y compactación de las vias terciarias.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El presente contrato cuenta con acta de inicio desde el día 22 de Marzo de 2024, igualmente se anexa el acta de entrega de la maquinaria amarilla (motoniveladora, cilindro compactador, volqueta y retroexcavadora sobre llanta) por parte del secretario de Infraestructura y del Almacenista Municipal al representante legal de ASOJUNTAS, la cual será utilizada en la ejecución del presente contrato, cabe acalarar que la maquinaria se recibio con diferentes fallas, por la cual se estará gestionando las visitas correspondientes de los técnicos de Navitrans y Parte equipos, la actividad de conformación de subrasante mejorada se realizará en las vias Terciarias del Municipio de Tauramena.

OBSERVACIONES

La Maquinaria amarilla (motoniveladora, cilindro compactador, volqueta y retroexcavadora sobre llanta), esta a la espera de una visita de mantenimiento de Garantia por parte de Navitrans y Parteequipos.

RESIDENTE DE OBRA

KATTIA JULIETH VIASUS CACERES

Firma

INFORME SEMANAL DE OBRA
FCO09-20
Versión: 3

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	007 DE 2024
		13 DE MARZO DE 2024				

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: 4 de 20 Del: 16-abr-24 Al: 23-abr-24

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 28 Días. Tiempo faltante: 122 Días

Nombre del Supervisor: Wilson Villamil Hernandez % Tiempo transcurrido: 19%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	19,00%	19,00%	Obra Ejecutada (%)	19,00%	19,00%
Valor de la Obra programada:	$62.900.574,64	$ 62.900.574,64	Valor de la Obra	$ 62.900.574,64	$ 62.900.574,64
Diferencia semanal:		0,00%	**Diferencia acumulada:**		**0,00%**

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"	**Interventor:**	N/A
Contrato No.	007 de 2024	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$ 331.055.656,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES	Plazo Inicial:	N/A
Plazo Actualizado:		Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	22/03/2024	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Términación:	21/08/2024	Fecha de Términación:	N/A
Estado del contrato:	EJECUCION	Estado del contrato:	N/A
Avance financiero:		Avance financiero:	N/A
% avance financiero:		% avance financiero:	N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se inician las actividades para la conformacion de subrasante mejorada de los cuales se procede a la escarificación, perfilación, conformación y compactación y no es necesario el riego de terreno debido a las lluvias presentadas en la zona.
2. Las actividades se llevan a cabo con todo el equipo de maquinaria amarilla propiedad de la Administración Municipal de Tauramena.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se procede a seguir con actividades de escarificación, perfilación, conformación y compactación de las vias terciarias.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El presente contrato cuenta con acta de inicio desde el día 22 de Marzo de 2024, igualmente se anexa el acta de entrega de la maquinaria amarilla (motoniveladora, cilindro compactador, volqueta y retroexcavadora sobre llanta) por parte del secretario de Infraestructura y del Almacenista Municipal al representante legal de ASOJUNTAS, la cual será utilizada en la ejecución del presente contrato, cabe acalarar que la maquinaria se recibio con diferentes fallas, por la cual se estará gestionando las visitas correspondientes de los técnicos de Navitrans y Parte equipos, la actividad de conformación de subrasante mejorada se realizará en las vias Terciarias del Municipio de Tauramena.

OBSERVACIONES

La Maquinaria amarilla (motoniveladora, cilindro compactador, volqueta y retroexcavadora sobre llanta), esta a la espera de una visita de mantenimiento de Garantia por parte de Navitrans y Parteequipos.

RESIDENTE DE OBRA

KATTIA JULIETH VIASUS CACERES

Firma

FUNDACIÓN OLEODUCTO VIVO

BITACORA
MARZO - 2024
CONVENIO SOLIDARIO 007-2024

- 22/03/2024
- Clima = mañana = soleado
  Tarde = Nublado
- PERSONAL = 4 operadores
  1 coordinador maquinaria

* Se hace una visita de inspección a las vías terciarias para intervenirlas, con todos los operadores
  Responsable: [illegible]
  Ing. Residente

- 23/03/2024
  Clima = mañana = nublado
  Tarde = nublado
  PERSONAL = 4 operadores
  1 coordinador de maquinaria
* Se hacen actividades de escarificación y perfilación al terreno a intervenir de 700 m
  Responsable = [illegible] Ing. Residente

25/03/2024
clima: mañana = soleado
Tarde = nublado.
Personal = 4 operadores
1 coordinador maquinaria

Se realizan actividades de perfilacion conformacion y compactacion de 1500m de terreno.
Responsable = ~~Ingeniero~~
Ing. residente

26/03/2024
clima: mañana - nublado
Tarde = nublado
personal 4 operadores
1 coordinador maquinaria

Se realizan actividades de escarificación perfilación y compactacion de 400m del terreno.
Responsable: ~~Ingeniero~~
Ing. residente

27/03/2024

- Clima - mañana = nublado
  Tarde = nublado
- Personal = 4 operadores
  1 coordinador maquinaria

Se realizan actividades de conformación subrasante, con actividades de compactación de 100 m.

Responsable: Kayfultu
Ing. residente

28/03/2024

Clima = mañana = soleado
Tarde = soleado

personal = 4 operadores
1 coordinador de maquinaria

Se efectuan actividades de escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación de 2000 m. de terreno.

Responsable - Kayfultucol
Ing. residente

29/03/2024
Clima= mañana = lluvioso
tarde = lluvioso - tormenta
personal= 4 operadores
1 coordinador de maquinaria
Se desarrollan actividades de perfilación y compactación del terreno, se debieron pausar las actividades por lluvia con tormentas.
Responsable: Kayla Lucas
Ing. Residente

30/03/2024
Clima= mañana = lluviosa con tormenta
tarde - lluviosa con tormenta
personal= 4 operadores
1 coordinador de maquinaria

Se intervinieron solo 200 m debido a la presencia de lluvias con tormenta que dificultaron el desarrollo de las actividades
Responsable: Kayla Lucas
Ing. residente

ABRIL - 2024
FUNDACIÓN OLEODUCTO VIVO

01/04/2024
- clima = mañana = lluvioso
  Tarde = nublado
- personal = 4 operadores
  1 coordinador de maquinaria

- Se desarrollan actividades de conformación, perfilación y compactación en 600 m del terreno.
Responsable = ~~Kayfaltda~~
Ing. Residente

02/04/2024
- clima = mañana = Soleado
  Tarde = Soleado
- operadores = 4 operadores
  1 coordinador maquinaria
- Se desarrollan actividades de escarificación, perfilación y compactación en 600 m.
Responsable = ~~Kayfaltda~~
Ing. Residente

03/04/2024
- Clima = nublado - mañana
soleado - tarde
- personal = 4 operadores
1 coordinador maquinaria

Se desarrollan actividades de escarificacion y compactacion, no fue necesario el riego debido a que el terreno cuenta con alta humedad debido a las lluvias, se intervinieron 2000 m
Responsable: Kathe Ing. residente

04/04/2024
- Clima = mañana = soleado
tarde = soleado
- personal = 4 operadores
1 coordinador maquinaria

Se desarrollaron actividades de escarificacion, perfilacion y compactacion de 750 m de terreno.
Responsable: Kathe Ing. residente

05/04/2024

- clima = mañana = soleado
  tarde = nublado
- personal = 4 operadores
  1 coordinador maquinaria

- Se efectúan actividades de escarificación perfilación y compactación de 600 m de terreno.
  Responsable = ~~Inspectores~~
  Ing. residente

06/04/2024

- clima = mañana = soleado
  tarde = lluvioso
- personal = 4 operadores
  1 coordinador maquinaria

Se desarrollaron actividades de escarificación, perfilación y compactación en 2000 m. de la vía.
Responsable = ~~Inspectores~~
Ing. residente.

08/04/2024

Clima: mañana - soleado
tarde: soleado

personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria

Se desarrollan actividades de escarificación perfilación y compactación de 1000 m de vía.

Responsable: Kenjy Cubillos
Ing. residente

09/04/2024

- clima: mañana = nublado
tarde - nublado

- personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria

Se desarrollan actividades de escarificación, conformación y compactación de 900 m de vía.

Responsable: Kenjy Cubillos
Ing. residente

10/04/2024
Clima= mañana = Soleado
Tarde = Soleado
personal = 4 operadores
1 coordinador de maquinaria

Se desarrollan actividades de escarificación y compactación en 800 m de vía.
Responsable: ~~Kaefutáca~~
Ing. Residente

11/04/2024
Clima= mañana = soleado
Tarde = Soleado
personal= 4 operadores
1 coordinador de maquinaria

Se desarrollan actividades de compactación en 1000 m de terreno.
Responsable= ~~Kaefutáca~~
Ing. Residente

12/04/2024

clima. mañana = Soleado
Tarde. soleado

personal. 4 operadores
1 coordinador maquinaria

Se desarrollan actividades de escarificación, perfilación, compactación en 5000 m de vía.

Responsable. Kontratista con
Ing. Residente

13/04/2024

clima= mañana = soleado
Tarde = soleado

Personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria

Se desarrollan actividades de escarificación, perfilación y compactación en 500 m. de vía.

Responsable: ~~Kontratista con~~
Ing. Residente

15/04/2024
clima= mañana: soleado
Tarde: soleado
personal= 4 operadores
1 coordinador maquinaria

Se desarrollan actividades de excavación y compactación en 400m de Terreno
responsable: ~~Katherine~~
Ing. residente

16/04/2024
clima= mañana = nublado
Tarde = lluvioso
personal = 4 operadores
1 coordinador maquinaria

Se ~~efectuan~~ actividades de disgregación de la base del terreno, se realiza perforación en 1000m.
responsable: ~~Katherine~~
Ing. residente

17/04/2024
Clima= mañana = poca lluvia
Tarde = poca lluvia
personal= 4 operadores
1 coordinador maquinaria

Se desarrollan actividades de disgregación de la superficie del terreno, la reconstrucción y perfilación de las cunetas.
Responsable: Ingeniero
Ing. Residente

18/04/2024
Clima= mañana = nublado
Tarde = nublado
personal= 4 operadores
1 coordinador maquinaria

Se efectuan actividades de excavación, perfilado y compactación de 1000 m de via.
Responsable= Ingeniero
Ing. Residente

19/04/2024

Clima: mañana = Soleado
Tarde = soleado

personal = 4 operadores
1 coordinador vaquiranga

Se desarrollan actividades de escarificación, compactación de 400 m de vía.

Responsable = ~~Kajatica~~
Ing. Residente

20/04/2024

Clima = mañana = Soleado
Tarde = Soleado

personal = 4 operadores
1 coordinador vaquiranga

Se desarrollan actividades de excavación y compactación en 650 m de vía.

Responsable = ~~Kajatica~~
Ing. Residente

22/04/2024

Clima: mañana: nublado
tarde: nublado

personal: A operadores
1 coordinador maquinaria

Se desarrollan actividades de escarificación, perfilación de cuneta y sangas y compactación de 900 m.

Responsable: Ingeniero
Ing. Residente

23/04/2024

Clima: mañana nublado
tarde: lluvioso

personal: A operadores
1 coordinador maquinaria

Se desarrollan actividades de escarificación y compactación en 300 m de terreno.

Responsable: Ingeniero
Ing Residente

24/04/2024

Clima: Mañana: soleado
Tarde: Soleado

Personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria

- Se desarrollan actividades de escarificación, perfilación y compactación en 400m de vía.
- Se realizó el cargue y transporte de placas CSE966 a una grúa que provee la Previora S.A, que se encontraba ubicada en el patio de maquinarias. Vereda ACEITE ALTO, para ser llevada a un centro de servicios de Nautivans ubicado en el Km 1 Vía Ouhama-Pampa para el respectivo mantenimiento de la Garantía.

Responsable: Yojan Ortiz
Ing. residente

25/04/2024
Clima- mañana = lluvioso
tarde = lluvioso
personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria

Se desarrollan actividades de escarificación, compactación en 500 m de vía terciaria.
Responsable= Kathe Ortiz
Ing. Residente

26/04/2024
Clima: mañana lluvioso
tarde lluvioso
personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria

- Se desarrollan actividades de escarificación, perfilación y compactación de 400 m, no es necesario riego ya que el terreno presenta la humedad necesaria
- Se agenda cita para visita técnica de mantenimiento y Garantía para el día

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

ANEXOS

2. PLANILLAS DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900002220	8	ASOJUNTAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HENRY121	calle 4 n 5 67	TAURAMENA-CASANARE	3114425252	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	558456226	9465424348	E	2024/04/04	2024/04/08	BANCOLOMBIA	4	$1,558,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	74856553	ALFONSO JOSE	X																230301	10	$500,000	$80,000	EPS005	10	$500,000	$20,000	CCF69	10	$500,000	$20,000	14-25	10	$500,000	$34,800	10	$0	$0	SI	$154,800
2	CC	96341464	CORTES BENITO	X																230301	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF69	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0	SI	$134,400
3	CC	17549430	DIAZ EDILBERTO	X																230301	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF69	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0	SI	$134,400
4	CC	1115916665	DUEÑAS DEISY	X																230301	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF69	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0	SI	$134,400
5	CC	80129998	MELO WILLMAN	X																25-14	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF69	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0	SI	$134,400
6	CC	23467565	MONROY ADELA	X																230301	10	$433,334	$69,400	EPSC25	10	$433,334	$17,400	CCF69	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0	SI	$134,400
7	CC	74754960	NIÑO JORGE	X																230301	10	$600,000	$96,000	EPS005	10	$600,000	$24,000	CCF69	10	$600,000	$24,000	14-25	10	$600,000	$41,800	10	$0	$0	SI	$185,800
8	CC	9505424	RODRIGUEZ ISAIAS	X																	0	$0	$0	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF69	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0	SI	$65,000
9	CC	1115912895	SEGURA DERLY	X																230301	10	$433,334	$69,400	EPSC25	10	$433,334	$17,400	CCF69	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0	SI	$134,400
10	CC	1116549915	VIASUS KATTIA	X																230301	10	$500,000	$80,000	MIN002	10	$500,000	$20,000	CCF69	10	$500,000	$20,000	14-25	10	$500,000	$34,800	10	$0	$0	SI	$154,800
11	CC	74856459	VIVAS BERNABE	X																25-14	10	$600,000	$96,000	EPS037	10	$600,000	$24,000	CCF69	10	$600,000	$24,000	14-25	10	$600,000	$41,800	10	$0	$0	SI	$185,800
Total	**Afiliados(11)**																					$4,800,004	$768,400			$5,233,338	$209,800			$5,233,338	$209,800			$5,233,338	$364,600		$0	$0		$1,552,800

2024/05/14 03:01 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900002220	8	ASOJUNTAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HENRY121	calle 4 n 5 67	TAURAMENA-CASANARE	3114425252	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	558456226	9465424348	E	2024/04/04	2024/04/08	BANCOLOMBIA	4	$1,558,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$768,400	$2,700	$0	$771,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$165,400	$600	$0	$166,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$603,000	$2,100	$0	$605,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$364,600	$1,300	$0	$365,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	11	$364,600	$1,300	$0	$365,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$209,800	$800	$0	$210,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	11	$209,800	$800	$0	$210,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$209,800	$900	$0	$210,700
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$34,800	$200	$0	$35,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$20,000	$100	$0	$20,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$76,200	$300	$0	$76,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$78,800	$300	$0	$79,100
TOTAL				11	$1,552,600	$5,700	$0	$1,558,300

2024/05/14 03:01 PM

69

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900002220	8	ASOJUNTAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HENRY121	calle 4 n 5 67	TAURAMENA-CASANARE	3114425252	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	1000000223	9466684770	E	2024/05/07	2024/05/03	BANCO DE BOGOTA	0	$2,848,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	74856553	ALFONSO JOSE																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
2	CC	96341464	CORTES BENITO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
3	CC	80129998	MELO WILLMAN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	74754960	NIÑO JORGE																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
5	CC	1116549915	VIASUS KATTIA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	MIN002	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
6	CC	74856459	VIVAS BERNABE																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
Total	**Afiliados(6)**																						$9,200,000	$1,472,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000	$368,000			$9,200,000	$640,400		$0	$0		$2,848,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900002220	8	ASOJUNTAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HENRY121	calle 4 n 5 67	TAURAMENA-CASANARE	3114425252	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	1000000223	9466684770	E	2024/05/07	2024/05/03	BANCO DE BOGOTA	0	$2,848,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,472,000	$0	$0	$1,472,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$496,000	$0	$0	$496,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$976,000	$0	$0	$976,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$640,400	$0	$0	$640,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	6	$640,400	$0	$0	$640,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$368,000	$0	$0	$368,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	$368,000	$0	$0	$368,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$368,000	$0	$0	$368,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$60,000	$0	$0	$60,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$124,000	$0	$0	$124,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$184,000	$0	$0	$184,000
TOTAL				6	$2,848,400	$0	$0	$2,848,400

809

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

ANEXOS

3. LISTAS DE CHEQUEO MAQUINARIA

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE TAURAMENA
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
CAMARA DE COMERCIO No. 1077 DE MARZO DE 1999
Nit. 900.022.220-8

INSPECCIÓN DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 57SSV (SIN LINEA HUMEDA)

FECHA: 22/03/2024	PROYECTO: CONVENIO SOLIDARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA	UBICACIÓN: TAURAMENA - CASANARE
INSPECCIONADO POR:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"	

INSTRUCCIONES

Utilice la siguiente lista de control como guía para inspeccionar el vehículo **(Denominación Técnica del Bien o Servicio)** Esta lista se debe usada para asegurar que la maquinaria se encuentra en condiciones de funcionamiento adecuadas, cualquier problema que se identifique debe ser corregida lo mas pronto posible.
1. Marque con una "X" según aplique. **(Bueno)** si el ítem a inspeccionar se encuentra en buen estado de funcionamiento o **(Regular)** se encuentra funcional, pero esta pendiente a un próximo cambio o reemplazo de alguna pieza, (Malo) en mal estado o presenta un peligro para la actividad y se requiere una reparación inmediata

Cualquier vehículo que no funcione correctamente debe retirarse de uso, hasta que se repare de modo que corresponda, esto evitara daños adicionales en el vehículo y posibles lesiones debidas a condiciones no seguras.

ÍTEM	CRITERIO	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MALO	
1. SISTEMA ELECTRICO	1.1. Funciona adecuadamente los 2 tomas de alimentacion a 30A totales?	X			
2. AMBIENTE DEL OPERADOR	2.1. Funciona adecuadamente la cabina de proteccion certificado ROPS FOPS?	X			
	2.2. Se encuentran en buenas condiciones las extensiones de guardabarros traseros?	X			
	2.3. condiciones de los ganchos de ropa?	X			
	2.4. Se encuentra en condiciones el espejo retrovisor interno convexo de mínimo 90mm de alto y 275mm de ancho?	X			
	2.5. Funciona el asiento de vinilo sin suspension con esleabon giratorio de 180 ?.	X			
	2.6. Funciona el cinturon de seguridad retractil de 50mm (2")?	X			
	2.7. Funciona el portavasos portadocumentos y con compartimiento de almacenamiento con tapa)?	X			
3. CARGADOR	3.1. Funciona adecuadamente el indicador de posicion del balde, control de autonivelacion y retorno a excavacion mediante una sola palanca?	X			
	3.2. Se encuentran en buenas condiciones el control de auto nivelacion y retorno a excavacion?	X			
	3.3. Funciona adecuadamente el interruptor de inhibicion de la transmision, situado en la palanca de cambios y otra en la palanca de control?.	X			
	3.4. Se encuentra en condiciones el espejo retrovisor interno convexo de mínimo 90mm de alto y 275mm de ancho?.	X			
	3.5. Funciona adecuadamente el control el control del cargador de funciones mediante una sola palanca: elevacion, descarga, inhibicion de la transmision y traba del diferencial ?.	X			
	3.6. Funciona el cinturon de seguridad retractil de 50mm (2")?.	X			
	3.7. Funciona el portavasos portadocumentos y con compartimiento de almacenamiento con tapa)?.	X			
4. RETROEXCAVADORA	4.1. Funciona adecuadamente el Sistema Hidraulico de centro abierto o cerrado?	X			
	4.2. Funciona correctamente el torque de giro mínimo de 22 000N m?	X			
	4.3. Funciona adecuadamente rotacion del balde de 180 ?	X			
	4.4. Funciona correctamente el giro por pedal con control de 3 palancas, estabilizadores tipo ala con zapatas?	X			
	4.5. Funciona correctamente el limpiabrisas superior delantero con lavador, luz de techo, retrovisores interno y externos, toma de 12V?	X			
	4.6. Funciona adecuadamente el cinturon de seguridad retractil de 50mm (2")?	X			
	4.7. Funciona correctamente la llave de ignicion, escalones de acceso a la cabina en ambos lados ?	X			
5. CARGADOR	5.1. Funciona adecuadamente el indicador de posicion del balde, control de autonivelacion y retorno a excavacion mediante una sola palanca?	X			
	5.2. Se encuentran en buenas condiciones el control de auto nivelacion y retorno a excavacion?	X			
	5.3. Funciona adecuadamente el interruptor de inhibicion de la transmision, situado en la palanca de cambios y otra en la palanca de control?.	X			
	5.4. Se encuentra en condiciones el espejo retrovisor interno convexo de mínimo 90mm de alto y 275mm de ancho?.	X			
	5.5. Funciona adecuadamente el control el control del cargador de funciones mediante una sola palanca: elevacion, descarga, inhibicion de la transmision y traba del diferencial ?.	X			
	5.6. Funciona el cinturon de seguridad retractil de 50mm (2")?.	X			
	5.7. Funciona el portavasos portadocumentos y con compartimiento de almacenamiento con tapa)?.	X			
6. INSTRUMENTACIÓN	6.1. Funcionan adecuadamente los indicadores de temperatura del agua del motor, temperatura del aceite del convertidor?	X			
	6.2. Funcionan adecuadamente el nivel de combustible, tacometro horometro, voltimetro?	X			
	6.3. Funcionan correctamente luces de advertencia para restriccion del filtro de aire, alternador alta presion de A/A, arranque de frio, presion baja del aceite del motor, obstruccion del filtro de aceite hidraulico, acoplamiento del freno de estacionamiento, bajo nivel de combustible?	X			
	6.4. Funcionan correctamente las alarmas sonoras de temperatura refrigerante, presion del aceite de motor, acoplamiento del freno de estacionamiento, acoplamiento de posicion del asiento?	X			
	6.5. Funcionan correctamente la bocina con interruptor doble delantero y trasero?	X			

EL VEHICULO ESTA EN CONDICIONES ESTANDAR PARA SU OPERACIÓN VoBo PERSONA QUE INSPECCIONA	CUMPLE	SI	NO
		X	

OBSERVACIONES GENERALES
NO funciona el velocimetro, la maquinaria presenta golpes y rayones, las llantas presentan fisuras, el soporte para abrir la ventana se encuentra rota.

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA Y RECIBE	FIRMA DE QUIEN CONDUCE

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE TAURAMENA
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
CAMARA DE COMERCIO No. 1077 DE MARZO DE 1999
Nit. 900.022.220-8

INSPECCION DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR MARCA AMMAN ASC70

FECHA: 22/03/2024	PROYECTO: CONVENIO SOLIDARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA	UBICACIÓN: TAURAMENA - CASANARE
INSPECCIONADO POR:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCCIÓN COMUNAL DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"	

INSTRUCCIONES

Utilice la siguiente lista de control como guia para inspeccionar el vehiculo **(Denominación Técnica del Bien o Servicio)** Esta lista se debe usada para asegurar que la maquinaria se encuentra en condiciones de funcionamiento adecuadas, cualquier problema que se identifique debe ser corregida lo mas pronto posible.
1. Marque con una "X" según aplique: **(Bueno)** si el ítem a inspeccionar se encuentra en buen estado de funcionamiento o **(Regular)** se encuentra funcional, pero esta pendiente a un próximo cambio o remplazo de alguna pieza. **(Malo)** en mal estado o presenta un peligro para la actividad y se requiere una reparación inmediata.

Cualquier vehiculo que no funcione correctamente debe retirarse de uso, hasta que se repare de modo que corresponda, esto evitara daños adicionales en el vehiculo y posibles lesiones debidas a condiciones no seguras.

ÍTEM	CRITERIO	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MALO	
1. CABINA	1.1. Funciona adecuadamente la Cabina de proteccion certificado ROPS y FOPS?	X			
	1.2. Funciona adecuadamente el aire acondicionado de la Cabina?	X			
	1.3. Condiciones de la paltaforma con barandilla del operario ?	X			
	1.4. Condiciones del izado manual del capo/cabina/plataforma ?	X			
	1.5. Condiciones de las luces del trabajo (delanteras y traseras)?	X			
2. OTROS	2.1. Condiciones de las Amplitudes de vibracion:Modo de vibracion 1: (Minimo frecuencia 29Hz, fuerza centrifuga 114 Kn?	X			
	2.2. Condiciones de las Amplitudes de vibracion:Modo de vibracion 2: Minimo frecuencia 30Hz, fuerza centrifuga 55 Kn?	X			
	2.3. Condiciones del freno de estacionamiento?	X			
	2.4 Condiciones de la palanca para control de velocidad?	X			
	2.5. Condiciones del chasis articulado?	X			
	2.6.Cumple con la Velocidad maxima de desplazamiento: minimo 10 km/h?	X			
	2.7.El peso del tambor es de 3000 kg	X			
	2.8.Condiciones de la Direccion: Radio minimo de giro interno de 2900mm?	X			
	2.9. Condiciones del tanque de combustible (capacidad minima de 30 galones)?	X			
	2.10. Condiciones del tambor liso con rascadores?	X			
	2.11. Condiciones de las llantas?	X			

EL VEHICULO ESTA EN CONDICIONES ESTANDAR PARA SU OPERACIÓN VoBo PERSONA QUE INSPECCIONA	CUMPLE	SI	NO
		X	

OBSERVACIONES GENERALES Se presenta alerta en pantalla y presenta varias fugas de aceite, Presenta ruido en el cilindro cuando se activa el modo vibración.

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA Y RECIBE	FIRMA DE QUIEN CONDUCE

DIRECCIÓN: CALLE 10 N° 14 -47/57 BARRIO CENTRO
EMAIL: PRESIDENTE.ASOJUNTASTAURAMENA@GMAIL.COM
"POR LA UNIDAD DEL DESARROLLO INTEGRAL Y COMUNITARIO"

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE TAURAMENA
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
CAMARA DE COMERCIO No. 1077 DE MARZO DE 1999
Nit. 900.022.220-8

INSPECCION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA MARCA CASE MODELO 845B

FECHA: 22/03/2024	**PROYECTO: CONVENIO SOLIDARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA**	**UBICACIÓN: TAURAMENA - CASANARE**
INSPECCIONADO POR:	**ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCCIÓN COMUNAL DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"**	

INSTRUCCIONES

Utilice la siguiente lista de control como guía para inspeccionar el vehículo **(Denominación Técnica del Bien o Servicio)** Esta lista se debe usada para asegurar que la maquinaria se encuentra en condiciones de funcionamiento adecuadas, cualquier problema que se identifique debe ser corregida lo mas pronto posible.
1. Marque con una "X" según aplique: **(Bueno)** si el ítem a inspeccionar se encuentra en buen estado de funcionamiento o **(Regular)** se encuentra funcional, pero esta pendiente a un próximo cambio o remplazo de alguna pieza, **(Malo)** en mal estado o presenta un peligro para la actividad y se requiere una reparación inmediata.

Cualquier vehículo que no funcione correctamente debe retirarse de uso, hasta que se repare de modo que corresponda, esto evitara daños adicionales en el vehículo y posibles lesiones debidas a condiciones no seguras.

ÍTEM	CRITERIO	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MALO	
1.SISTEMA ELECTRICO	1.1. Funcionan adecuadamente la bomba hidraulica de pistones axiales de flujo variable, con valvula de control de 9 secciones y 8 acopladores para diagnóstico?	X			
2.SISTEMA DE TRANSMISION	2.1. Funcionan adecuadamente la transmision de mínimo 6 velocidades+3 de reserva, control electrónico de desplazamiento automático con palanca unica tipo pulante y modulo automático, con sistema de falla a bordo?	X			
3.SISTEMA ELÉCTRICO	3.1. Funcionan adecuadamente los 2 faros frontales con indicador de dirección	X			
	3.2. Funcionan adecuadamente las 2 luces de freno e indicadores de direccion 2?	X			
	3.3. Funcionan adecuadamente 2 faros de trabajo trasero en el tope de la cabina ?	X			
	3.4. Funciona adecuadamente 2 faros de trabajo frontal en el tope de la cabina, con monitoreo de los sistemas electronicos?	X			
4. COMPARTIMENTO DEL OPERADOR	4.1. Funciona adecuadamente la Cabina de proteccion certificado ROPS/FOPS, aire acondicionado?	X			
	4.2. Funciona correctamente el asiento ajustable con suspension forrido en vinil y cinturon de seguridad de 50.8mm?	X			
	4.3. Funciona adecuadamente el ajuste de la consola del operador ?	X			
	4.4. Funciona correctamente el acelerador del pedal, acelerador manual?	X			
	4.5. Funciona correctamente el limpia brisas superior delantero con lavador, luz de techo, retrovisores interno y externos, toma de 12V?	X			
	4.6. Funciona adecuadamente el cinturon de seguridad retractil de 50mm (2")?	X			
	4.7. Funciona correctamente la llave de ignicion, escalones de acceso a la cabina en ambos lados ?	X			
5. CARGADOR	5.1. Funciona adecuadamente el indicador de posicion del balde?	X			
	5.2. Funciona adecuadamente el control de auto nivelacion y retorno a excavacion mediante una sola palanca ?	X			
	5.3. No se encuentran abultamientos o deformaciones?	X			
	5.4. La presión de los neumáticos es la adecuada 18 a 20 Psi (124 a 138 Kpa)	X			
6. INSTRUMENTACIÓN	6.1. Funcionan adecuadamente los indicadores de temperaturas de refrigeracion del motor, temperatura del aceite del convertidor?	X			
	6.2. funciona adecuadamente el nivel de combustible, tacometro, direccion seleccionadaF/N/R, modos de transmision automatico/manual, marcha seleccionada?.	X			
	6.3. funcionan adecuadamente los indicadores del aceite hidraulico, horometro, consumo de combustible, diagnosticos del motor ?	X			
	6.4. funcionan adecuadamente , luces indicadores de bajo nivel de combustible, luces direccionales, faro alto, presion de los frenos, alerta principal, freno de estacionamiento, alertas onoras de precaucion, emergencia y retroceso ?	X		X	
7. OTROS	7.1. Condiciones de la hoja en acero alto carbono de curva envolvente con 2 cuchillas de corte, desplazamiento lateral y de angulo hidraulicos?	X			
	7.2. Las condiciones del escarificador y/o ripper ancho mínimo (2195) milimetros mínimo 5 dientes?	X			
	7.3. condiciones del control hidraulico para las funciones de levantamiento de la hoja, gira-circulo, desplazamiento lateral del circulo, inclinacion de las ruedas, articulación del chasis, desplazamiento lateral y angular de la hoja?.	X			
	7.4. condiciones de Articulación accionada hidraulicamente con alcance de 25° hacia la derecha o izquierda y controles hidráulicos?.	X			
	7.5. condiciones del peso operacional en eje trasero mínimo de 10855kg, en eje frontal mínimo de 4145kg y fuerza en hoja mínima de 7280kg?.	X			

EL VEHICULO ESTA EN CONDICIONES ESTANDAR PARA SU OPERACIÓN VoBo PERSONA QUE INSPECCIONA	CUMPLE	SI	NO
		X	

OBSERVACIONES GENERALES La motoniveladora presenta fugas de aceite en varias partes y la tapa del filtro se encuentra suelta., Presenta fugas en el tanden.

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA Y RECIBE	FIRMA DE QUIEN CONDUCE

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE TAURAMENA
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
CAMARA DE COMERCIO No. 1077 DE MARZO DE 1999
Nit. 900.022.220-8

INSPECCION DE VEHICULO VOLQUETA AUMAN SUPER FORCE 17T

FECHA: 21/03/2024	**PROYECTO: CONVENIO SOLIDARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA**	**UBICACIÓN: TAURAMENA - CASANARE**
INSPECCIONADO POR:	**ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCCIÓN COMUNAL DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"**	

INSTRUCCIONES

Utilice la siguiente lista de control como guía para inspeccionar el vehículo **(Denominación Técnica del Bien o Servicio)**. Esta lista se debe usada para asegurar que el vehiculo se encuentra en condiciones de funcionamiento adecuadas, cualquier problema que se identifique debe ser corregida lo mas pronto posible.
1. Marque con una "X" según aplique: **(Bueno)** si el ítem a inspeccionar se encuentra en buen estado de funcionamiento o **(Regular)** se encuentra funcional, pero esta pendiente a un próximo cambio o remplazo de alguna pieza, **(Malo)** en mal estado o presenta un peligro para la actividad y se requiere una reparación inmediata.

Cualquier vehiculo que no funcione correctamente debe retirarse de uso, hasta que se repare de modo que corresponda, esto evitara daños adicionales en el vehiculo y posibles lesiones debidas a condiciones no seguras.

ÍTEM	CRITERIO	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MALO	
1. ELEMENTOS	1.1. Se encuentra Llaves de encendido (2)?	X			
	1.2. Se encuentra llanta de repuesto (1)?	X			
	1.2. Se encuentra Botiquin de primeros auxilios (1)?	X			
	1.3. Se encuentra Juego de destornillador de seis piezas de estrella y pala (1)?	X			
	1.4. Se encuentra el extintor cargado?	X			
	1.5. Se encuentran alicates de 9 pulgadas?	X			
	1.6. Se encuentran los triangulos reflectivos (2)?	X			
	1.7. Se encuentra la caja de herramientas (1)?	X			
	1.8. Se encuentran los tacos para el bloqueo de la volqueta (2)?	X			
	1.9. Se encuentra el juego de manuales ?	X			
	1.10. Se encuentran los adhesivos de emblemas?	X			
	1.11. Se encuentran los cables de ignicion 110 amp?	X			
	1.12. Se encuentra el gato hidraulico?	X			
	1.13. Se encuentra el engrasador manual?	X			
	5.1.Se encuentra la copa y palanca para pernos?	X			
	1.14. funciona adecuadamente la palanca de levantar cabina?.	X			
	1.15. Se encuentra la llave expansiva 12-300MM?	X			
	1.16. Se encuentran las señales de carreteras con funda roja?	X			
	1.17.Se encuentra la caja de herramientas para soltar filtros?	X			
	1.18. Funcionan adecuadamente los sensores de reversa y camara?.	X			
	1.19. Se encuentra 1 pinza?	X			
	1.20. Se encuentran en buen estado los tapetes (2)?	X			
	1.21. Se encuentran losganchos de tiro trasero con sus lineas?	X			

EL VEHICULO ESTA EN CONDICIONES ESTANDAR PARA SU OPERACIÓN VoBo PERSONA QUE INSPECCIONA	CUMPLE	SI	NO

OBSERVACIONES GENERALES La volqueta presenta ruidos en la caja de cambios o transmision, el freno presenta falla de presion de aire, y presenta fallas cuando esta en marcha (se apaga), la volqueta se recibio con nivele bajo de aceite hidraulico y de motor, el horometro no funciona. (se anexa lista de chequeo).

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA Y RECIBE	FIRMA DE QUIEN CONDUCE
	Beto Cel C

DIRECCION: CALLE 10 N° 14 -47/57 BARRIO CENTRO
EMAIL: PRESIDENTE.ASOJUNTASTAURAMENA@GMAIL.COM
"POR LA UNIDAD DEL DESARROLLO INTEGRAL Y COMUNITARIO"

615

INSPECCIÓN DE VOLQUETA AUMAN SUPER FORCE 17T

FECHA: 21/03/2024	LUGAR: Tauramena - Casanare	PLACA: OSE966	No. INTERNO:
KM ACTUAL: 3194		KM ULTIMO MANTENIMIENTO:	


INSPECCION DE DOCUMENTOS

LICENCIA DE CONDUCCION				LICENCIA DE TRANSITO (FECHA DE MATRICULA)				TARJETA DE OPERACIÓN			
MANEJO DEFENSIVO				SOAT	29	09	24	REV. TECNICOMECANICA			
REVISION PREVENTIVA				SEGURO EXTRACONTRACTUAL				EXTRACTO CONTRATO			
PLANILLA PREOPERACIONAL	21	03	24	SEGURO CONTRACTUAL				POLIZA TODO RIESGO	9	11	24

DIA: D	MES: M	AÑO: A	CONFORME: C	NO CONFORME: NC	CANTIDAD: #

INSPECCION AL COFRE

SIN FUGAS DE FLUIDOS	X	
NIVEL DE LIQUIDO HIDRAULICO		X
NIVEL ACEITE MOTOR		X
ESTADO DE LAS CORREAS	X	
NIVEL AGUA LIMPIABRISAS	X	
NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	X	
BATERIA SIN HUMEDAD NI BORNES SULFATADOS	X	
TRAMPA DEL FILTRO DEL COMBUSTIBLE	X	

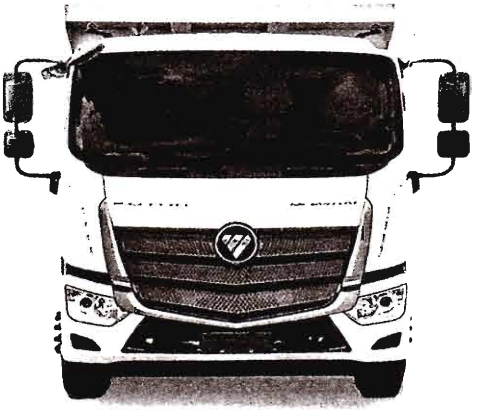

INSPECCION EN CABINA

X		PITO ELECTRICO
X		ILUMINACION INTERIOR DE LA CABINA
X		FUNCIONAMIENTO EQUIPO DE SONIDO
	X	VERIFICAR DE TESTIGOS
X		ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION
X		ESTADO SISTEMA DESEMPAÑADO
X		FUNCIONAMINTO LIMPIABRISAS Y PLUMILLAS

INSPECCION A LUCES IZQ / DELANTERAS


LUZ BAJA	X	
LUZ ALTA	X	
LUZ DIRECCIONAL	X	
LUCES EXPLORADORAS	—	—

INSPECCION A LUCES DER / DELANTERAS

X		LUZ BAJA
X		LUZ ALTA
X		LUZ DIRECCIONAL
—	—	LUCES EXPLORADORAS

INSPECCION A LUCES IZQ / TRASERAS

LUZ DIRECCIONAL	X	
LUZ DE NAVEGACION	X	
LUZ FRENO	X	
LUZ REVERSA	X	



INSPECCION A LUCES DER / TRASERAS

X		LUZ DIRECCIONAL
X		LUZ DE NAVEGACION
X		LUZ FRENO
X		LUZ REVERSA

INSPECCION KIT CARRETERA

LLANTA DE REPUESTO BUEN ESTADO	1	X	
2 TACOS DE MADERA	2	X	
GATO MECANICO O HIDRAULICO	1	X	
LLAVE PARA RUEDAS O CRUCETA	1	X	
2 CONOS Y/O TIRIANGULOS	2	X	
1CHALECO REFLECTIVO			X
1LINTERNA (PILAS DE REPUESTO)	1	X	
1 LLAVE EXPANSIVA	1	X	
JUEGO DE LLAVES FIJAS	—	—	—
DESTORNILLADOR DE ESTRELLA	3	X	
DESTORNILLADOR DE PALA	2	X	
ALICATES	1	X	
MANILA (10 m)	—	—	—
CALIBRADOR DE PRESIÓN DE AIRE	—	—	—
CABLE DE INICIO	1	X	
CADENA DEL CARDAN O SIMILAR	1	X	

ESTADO DE CARROCERIA

GOLPES [X] RAYONES X ROTURA ⊕

ALARMA O PITO DE REVERSA	X	
GUARDA POLVO		X
ESTADO TAPA COMBUSTIBLE	X	
BARRA ANTIVOLCO	—	—
VERIFICAR SUJECIÓN DEL TIRO	—	—
DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	—	—
DIPOSITIVO DE GPS	—	—
PORTA EQUIPAJE APROPIADO (CARPADO O CUBIERTO)	—	—
RECIPIENTE O BOLSA PARA DESECHOS	X	

INSPECCION BOTIQUIN

—	—	—	1 MASCARA RCP (REANIMACION CARDIO PULMONAR)
		1	1 ISODINE SOLUCION
		1	1 ESPUMA
		1	1 GEL ANTIBACTERIAL O JABON LIQUIDO

INSPECCION BOTIQUIN

—	—	—	10 APLICADORES
		4	4 APOSITOS / COMPRESAS
		10	10 BAJALENGUAS
		1	1 ROLLO ESPARADRAPO 4"
		10	10 UND. GASAS ESTERIL PRECORTADA
			1 JUEGO DE INMOVILIZADORES EXTREMIDADES PARA ADULTOS
			1 INMOVILIZADOR CERVICAL GRADUABLE PARA ADULTO
			1 SOLUCION SALINA (FISIOLÓGICO)
			2 SOBRES DE SUERO ORAL
		1	1 BOLSA DE ALGODÓN
		2	2 PARES GUANTES QUIRURGICOS
		2	2 PROTECTOR RESPIRATORIO (TAPABOCAS)
			1 VENDAS ELASTICAS GRA,MEDI,PEQ
			2 VENDAS FIJAS GRANDES
			1 VENDAS TRIANGULARES DE TELA
		1	1 ALCOHOL
			1 TIJERA UNIVERSAL O DE TRAUMA
			10 CURAS
			2 PARCHE OCULAR
			1 TERMOMETRO DIGITAL
			1 MANUAL PRIMEROS AUXILIOS
			2 BOLSA ROJA

INSPECCIÓN DE VOLQUETA AUMAN SUPER FORCE 17T

INSPECCION LLANTA 4

PROFUNDIDAD LABRADO (3mm)	X	
ESPARRAGOS UNIDADES	X	
PRESION	X	
SIN CORTES Ó DEFORMACIONES	X	

INSPECCION SUSPENSION TRACERA IZQ.

ESTADO MUELLE Y AMORTIGUADOR	X	

VERIFICACION PUERTA TRASERA

VERIFICAR QUE LA CHAPA FUNCIONA	—	—
VERIFIQUE QUE EL VIDRIO NO TIENE FISURAS	—	—
VERIFICAR QUE LA PUERTA ABRE Y CIERRA	—	—
VERIFIQUE EL CINTURON DE SEGURIDAD	—	—

VERIFICACION PUERTA DELANTERA

VERIFICAR QUE LA CHAPA FUNCIONA	X	
VERIFIQUE QUE EL VIDRIO NO TIENE FISURAS	X	
VERIFICAR QUE LA PUERTA ABRE Y CIERRA	X	
VERIFIQUE EL CINTURON DE SEGURIDAD	X	
VERIFIQUE QUE ESPEJO ESTE FIJO Y BUENO	X	


INSPECCION LLANTA 2

SIN CORTES Ó DEFORMACIONES	X	
PROFUNDIDAD LABRADO (3mm)	X	
ESPARRAGOS UNIDADES	X	
PRESION	X	

INSPECCION SUSPENSION DELATERA IZQ.

ESTADO MUELLE Y AMORTIGUADOR	X	

X		VERIFICACION VIDRIO PANORAMICO TRASERO



X		VERIFICACION VIDRIO PANORAMICO DELANTERO

INSPECCION LLANTA 3

X		PROFUNDIDAD LABRADO (3mm)
X		ESPARRAGOS UNIDADES
X		PRESION
X		SIN CORTES Ó DEFORMACIONES

INSPECCION SUSPENSION TRACERA DER.

X		ESTADO MUELLE Y AMORTIGUADOR

VERIFICACION PUERTA TRASERA

—	—	VERIFICAR QUE LA CHAPA FUNCIONA
—	—	VERIFIQUE QUE EL VIDRIO NO TIENE FISURAS
—	—	VERIFICAR QUE LA PUERTA ABRE Y CIERRA
—	—	VERIFIQUE EL CINTURON DE SEGURIDAD

VERIFICACION PUERTA DELANTERA

X		VERIFICAR QUE LA CHAPA FUNCIONA
X		VERIFIQUE QUE EL VIDRIO NO TIENE FISURAS
X		VERIFICAR QUE LA PUERTA ABRE Y CIERRA
X		VERIFIQUE EL CINTURON DE SEGURIDAD
X		VERIFIQUE QUE ESPEJO ESTE FIJO Y BUENO

INSPECCION LLANTA 1

X		SIN CORTES Ó DEFORMACIONES
X		PROFUNDIDAD LABRADO (3mm)
X		ESPARRAGOS UNIDADES
X		PRESION

INSPECCION SUSPENSION DELANTERA DER.

X		ESTADO MUELLE Y AMORTIGUADOR

INSPECCION PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS

ESTADO DE FRENO DE SERVICIO		X
FRENO DE SEGURIDAD		X
ARRANQUE		X
CAJA DE CAMBIOS		X
RUEDA LIBRE		X
CAJA DE FUSIBLES	X	
CAJA DE DIRECCION	X	
ESTADO RADIADOR	X	
TUBOS Y MANGUERAS	X	
TERCER STOP	—	—

INSPECCION EXTINTOR

PRESIÓN (MANOMETRO)	X	
SEGURO Y MANIJA	X	
SIN CORROSIÓN	X	
PROTECCION Y SOPORTE	X	
ETIQUETA Y ROTULADO	X	
ESTADO DE LA MANGUERA Y *BOQUILLA*	X	
FECHA PROXIMA RECARGA	01	04	24

INSPECCION A KIT AMBIENTAL

1 PALA ANTI CHISPA	—	—
1 GUANTES DE NITRILO	—	—
2 BOLSAS PLÁSTICAS ROJAS	—	—
1 GAFAS TRASPARENTES	—	—
TELA O MAT. ABSORBENTE (OLEOFÍLICA)	—	—
CINTA DE SEÑALIZACION	—	—
1 MASILLA EPOXICA	—	—
*MASCARILLA PARA VAPORES ORGGANICOS	—	—

OBSERVACIONES DE LA INSPECCION: LA VOLQUETA PRESENTA RUIDOS EN LA CAJA DE CAMBIOS O TRANSMISION, EL FRENO PRESENTA FALLA DE PRESION DE AIRE, Y PRESENTA FALLAS CUANDO ESTA EN MARCHA (SE APAGA).
LA VOLQUETA SE RECIBIO CON NIVELES BAJOS DEL ACEITE HIDRAULICO Y DEL MOTOR, EL HOROMETRO NO FUNCIONA.

NOMBRE DE QUIEN REVISO VEHICULO	FIRMA	NOMBRE DE QUIEN CONDUCE EL VEHICULO	FIRMA
Katia J. Vicios C.		Benito cortes G	Benito cortes G

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
Cámara de Comercio No.1077 de marzo 18 de 1999
NIT: 900.002.220-8

ANEXOS

4. REPORTE DE MANTENIMIENTO DE GARANTIA POR PARTE DE PARTEQUIPOS

618

AQUITECNO	GESTIÓN DE SERVICIO TÉCNICO INTERNO EXTERNO Y POSVENTA REPORTE TÉCNICO	CÓDIGO:	FO_STP_ 15
		FECHA DE VIGENCIA:	15/09/2021

FECHA Y HORA DE INICIO: 30-04-24 8am
CLIENTE: alcaldia fagramena.
EQUIPO: Vibrocompactador
SERIE: AC206818AN303 7862

LUGAR: vereda piñalito
TÉLEFONO: 321 206 2963
MODELO: 09 / 22
HOROMETRO: 964.9

Nº 0169

TIPO DE TRABAJO DEL EQUIPO: Diagnostico garantia
TEMPERATURA AMBIENTE: ORDEN DE TRABAJO:
TIPO DE SERVICIO: DIAGNOSTICO [x] MANTENIMIENTO [ ] REPARACIÓN [ ] GARANTÍA [ ]

DESCRIPCION DE LA FALLA Y/O SOLICITUD:

Diagnostico por garantia.

CAUSA DE LA FALLA:

presenta fugas por motores de traslacion y fugas por amortiguador de cabina, tambien presenta ruido anormal por rodillo vibratorio.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

se retiran Ruedas para corregir fuga de ambos motores de traslacion. se ajusta manguera de amortiguador de la cabina.

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS Y RECOMENDACIONES:

mantener niveles de aceites si persisten las fugas.

EQUIPO DISPONIBLE: SI [x] NO [ ] POR QUE?

TIEMPOS DE ESPERA

FECHA	MOTIVO	HORAS	FECHA	MOTIVO	HORAS

REPUESTOS UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.

OBSERVACIONES TÉCNICAS:
presenta un golpe en sistema vibratorio se sugiere una inspeccion general a dicho sistema

TÉCNICOS: Arley Gomez

RECIBÍ A CONFORMIDAD LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS TÉCNICOS SOBRE LA MÁQUINA, LOS CUALES APARECEN DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO

FIRMA Y C.C. TÉCNICO

Bernardo Vivas
FIRMA, C.C. Y SELLO DEL CLIENTE

FECHA Y HORA FINALIZACIÓN

"Una Marca Que Evoluciona Contigo"

MAQUITECNO

GESTIÓN DE SERVICIO TÉCNICO INTERNO EXTERNO Y POSVENTA

REPORTE TÉCNICO

CÓDIGO:	FO_STP_ 15
FECHA DE VIGENCIA:	15/09/2021

Nº 0165

FECHA Y HORA DE INICIO: 01-05-24 7am
CLIENTE: alcaldia faramena.
EQUIPO : motoniveladora.
SERIE: NNAF09GE0

LUGAR: Vereda piñalito
TÉLEFONO: 321 206 2963
MODELO: 845 B
HOROMETRO: 593.18

TIPO DE TRABAJO DEL EQUIPO:
TEMPERATURA AMBIENTE: ORDEN DE TRABAJO:

TIPO DE SERVICIO: *DIAGNOSTICO* ☑ *MANTENIMIENTO* ☐ *REPARACIÓN* ☐ *GARANTÍA* ☐

DESCRIPCION DE LA FALLA Y/O SOLICITUD:

Diagnostico por garantia. fugas por motor formamera
Fuga por control de valvula y manguera de cilindros
y fuga por eje motriz

CAUSA DE LA FALLA:

fuga por manguera por gravado. fuga de aceite por capuchones
de espaol, fuga por eje motriz por sellos.
fuga por sello tapa motor de formamez

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se ajustan capuchones de espaol cinas se corrigio la fuga
y otra fuga al gatico se corrigo la fuga de la tapa de formamez
el hilo se presentaba mordida.

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS Y RECOMENDACIONES:

EQUIPO DISPONIBLE: *SI* ☐ *NO* ☐ POR QUE?

TIEMPOS DE ESPERA

FECHA	MOTIVO	HORAS	FECHA	MOTIVO	HORAS

REPUESTOS UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.

OBSERVACIONES TÉCNICAS:
Se Requiere bajar el eje motriz para corregir la fuga
tambien se Requiere el cambio de una manguera de Cilindros
Seguido cambiar Sellos de capuchones

TÉCNICOS: Adrey Gomez

RECIBÍ A CONFORMIDAD LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS TÉCNICOS SOBRE LA MÁQUINA, LOS CUALES APARECEN DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO

Barnabe Vivas

FIRMA Y C.C. TÉCNICO | FIRMA, C.C. Y SELLO DEL CLIENTE | FECHA Y HORA FINALIZACIÓN

620

MAQUITECNO	GESTIÓN DE SERVICIO TÉCNICO INTERNO EXTERNO Y POSVENTA **REPORTE TÉCNICO**	CÓDIGO:	FO_STP_ 15
		FECHA DE VIGENCIA:	15/09/2021

Nº 0224

FECHA Y HORA DE INICIO: 03-05-2024 · 7:30 am
CLIENTE: Alcaldía Tauramena.
EQUIPO : Retroexcavadora.
SERIE: WKJS755VENKH32290

LUGAR: Vereda Piñalito
TÉLEFONO: 3212052963
MODELO: 27-02-23
HOROMETRO: 9718

TIPO DE TRABAJO DEL EQUIPO:
TEMPERATURA AMBIENTE: ORDEN DE TRABAJO:

TIPO DE SERVICIO: *DIAGNOSTICO* ☐ *MANTENIMIENTO* ☑ *REPARACIÓN* ☐ *GARANTÍA* ☐

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA Y/O SOLICITUD:

Mantenimiento preventivo.

CAUSA DE LA FALLA:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se realiza mantenimiento preventivo 250 H cambio de filtros motor y aceite motor

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS Y RECOMENDACIONES:

Velocimetro inactivo. Se requiere reparar.
ajuste de valde se presencia desajuste

EQUIPO DISPONIBLE: *SI* ☐ *NO* ☐ POR QUE?

TIEMPOS DE ESPERA

FECHA	MOTIVO	HORAS	FECHA	MOTIVO	HORAS

REPUESTOS UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.

OBSERVACIONES TÉCNICAS: Se requiere que mantengan niveles de fluidos a nivel

TÉCNICOS: Arley Gomez

ECIBÍ A CONFORMIDAD LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS TÉCNICOS SOBRE LA MÁQUINA, LOS CUALES APARECEN DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO

FIRMA Y C.C. TÉCNICO

Bernabe Vivas
FIRMA, C.C. Y SELLO DEL CLIENTE

FECHA Y HORA FINALIZACIÓN
