INFORME SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	**FDLBU -217-2022**				
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA	**"Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo, del contrato de obra que se derive de la licitación pública FDLBU -215-2022 cuyo objeto es contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable el mantenimiento de la malla vial local e intermedia de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá D.C.,**				
SEMANA No.	50	**DEL**	**domingo, 22 de octubre de 2023**	**AL**	**sábado, 28 de octubre de 2023**
TIEMPO (días) TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	346	**NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISOR**	**Johnny Antonio Chinchilla Rangel**		

CONTRATO DE OBRA	
Contratista	**CUMBRE INGENIERÍA S.A.S**
Nit	**900321674-6**
Contrato No.	**No. 211-2022 COP (71773)**
Representante Legal	**LEONARDO IVAN RAMÍREZ BERNAL**
Fecha de suscripción del contrato	viernes, 16 de septiembre de 2022
Valor Inicial	$4,500,000,000.00
Plazo Inicial	10 meses
Plazo Actualizado	14 meses
Fecha de Iniciación	viernes, 16 de septiembre de 2022
Fecha de Terminación*	sábado, 15 de julio de 2023
Valor Adición 1	$2,250,000,000.00
Plazo Prorroga 1	4 meses
Plazo Total de Obra	14 meses
Valor Total del Contrato	$6,750,000,000.00
Fecha Actualizada de Terminación	miércoles, 15 de noviembre de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Interventor	**CONSORCIO LUZIANA 2022 BARRIOS UNIDOS**
Nit	**901624816-1**
Contrato No.	**217 de 2022**
Representante Legal	**ELKIN JAVIER PINEDA**
Fecha de suscripción del contrato	viernes, 16 de septiembre de 2022
Valor Inicial	$ 449,981,138.50
Plazo Inicial	10 meses
Plazo Actualizado	10 meses
Fecha de Iniciación	viernes, 16 de septiembre de 2022
Fecha de Terminación	sábado, 15 de julio de 2023
Valor Adición 1	$213,506,736.50
Plazo Prorroga 1	4 meses
Plazo Total de Obra	14 meses
Valor Total del Contrato	$663,487,875.00
Fecha Actualizada de Terminación	miércoles, 15 de noviembre de 2023

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/09/2022-15/01/2024	$ 1,350,000,000.00	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/09/2022- 16/07/2023	$ 89,996,227.00
PAGO DE SALARIOS	16/09/2022-16/07/2026	$ 225,000,000.00	PAGO DE SALARIOS	16/09/2022- 16/07/2026	$ 22,499,056.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD	2 AÑOS, 9 MESES Y 30 DIAS	$ 1,350,000,000.00	ESTABILIDAD Y CALIDAD	16/09/2022- 16/07/2025	$ 89,996,227.60
PRESIOS LABORES Y OPERACINES	16/09/2022- 15/01/2024	$ 400,000,000.00	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (adición y prorroga 1)	23/12/2022- 16/03/2024	$ 132,697,575.20
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	16/09/2022- 15/01/2024	$ 40,000,000.00	PAGO DE SALARIOS (adición y prorroga 1)	23/12/2022- 16/01/2026	$ 33,174,393.80
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	16/09/2022- 15/01/2024	$ 40,000,000.00	ESTABILIDAD Y CALIDAD (adición y prorroga 1)	23/12/2022- 15/11/2026	$ 132,697,575.20
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (adición y prorroga 1)	16/09/2022- 15/01/2024	$ 2,025,000,000.00			
PAGO DE SALARIOS (adición y prorroga 1)	16/09/2022- 16/07/2024	$ 337,500,000.00			
ESTABILIDAD Y CALIDAD (adición y prorroga 1)	16/09/2023- 16/07/2024	$ 2,025,000,000.00			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1	CIV 12002745	24/10/2023	24/10/2023	100%	Se hace la instalación de la señalizacion vertical, contemplada en el PMT aprobado, asi como la protección de sumideros y de arboles presentes.
2	CIV 12002745	25/10/2023	26/10/2023	100%	Fresado del pavimento flexible existente, según las areas establecidas según recorrido de obra efectuado.Transporte de fresado resultante.
3	CIV 12002745	26/10/2023	27/10/2023	100%	Imprimación; extendida, compactación y sello de asfalto.

INFORME SEMANAL


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	**FDLBU -217-2022**
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA	**"Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo, del contrato de obra que se derive de la licitación pública FDLBU -215-2022 cuyo objeto es contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable el mantenimiento de la malla vial local e intermedia de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá D.C.,**

SEMANA No.	50	DEL	domingo, 22 de octubre de 2023	AL	sábado, 28 de octubre de 2023

PROGRAMADO			EJECUTADO		
AVANCE	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**AVANCE**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
VALOR ($)	$ 217,697,635.75	$ 6,314,604,728.51	**VALOR ($)**	$ 65,973,092.00	$ 6,079,534,096.25
%	**93.55%**		**%**	**90.07%**	

El presente informe viene ajustado y actualizado con la información de programado semanal y acumulado, al igual que el porcentaje, esto de acuerdo al flujo de caja y programación V3 presentado por el contratista, con la información que se debía incluir con las priorizaciones de la UMV y acueducto
A corte de la semana del 27 DE OCTUBRE, según la programación entregada por el contratista estarían al 95% del avance
Con respecto al flujo de caja que es el que se esta relacionando en el informe, llevan 93.55% en lo programado
En el avance real del contrato al 27 DE OCTUBRE llevan un avance del 90.07% con respecto al total del contrato

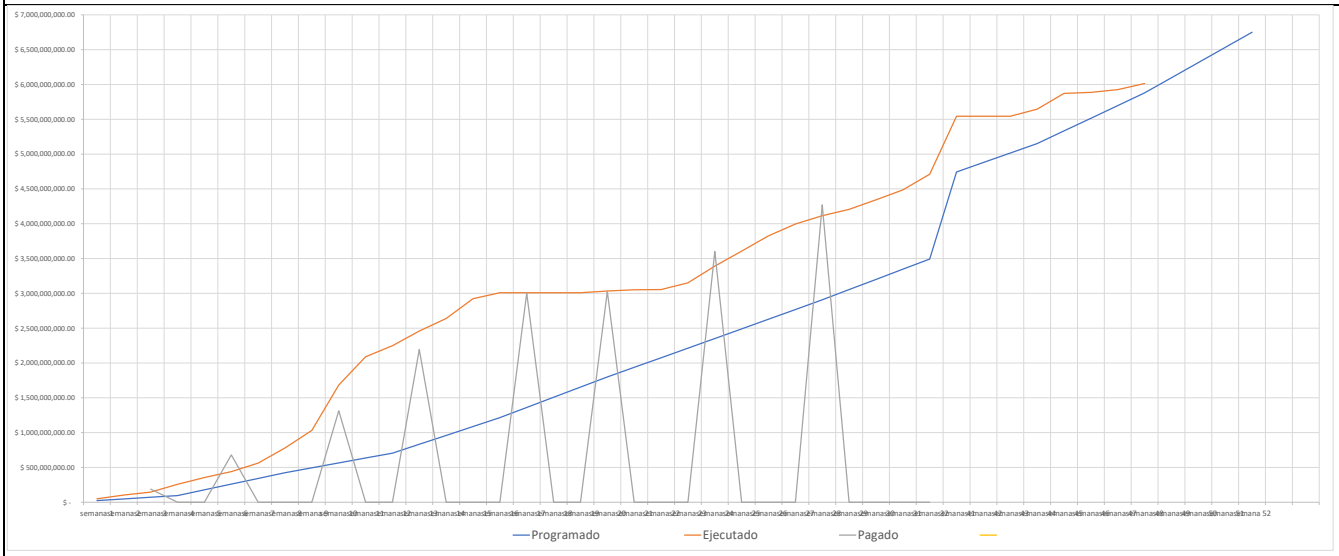

Seguimiento Ruta Critica

Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

Desde el presente informe va ajustado con la nueva programación enviada por el contratista, incluyendo la adición de los 4 meses que se aprobó en el mes de diciembre del 2022
Esta semana se radico ante la supervisión el Flujo de caja, Balance y programación de CUMBRE, esto se reviso y se avalo por parte de la interventoría y quedo soportado mediante el oficio LUZ22BU-2022-132 - Entrega_de_Balance_programación_Flujo de caja_Presupuesto por CIV radicado el día 30 de mayo del presente año.
De acuerdo a los soportes entregados por el contratista, el presente informe se encuentra actualizado con la programación y flujo de caja entregado y avalado.

Aspecto Financiero

Estamos a la espera de la supervisión en la respuesta para el ajuste de asfalto que se ha solicitado desde el mes de enero del presente año, lo cual ya tiene un análisis sustentado por parte de la interventoría
Estamos pendientes de reserva de los segmentos viales 12002897, 12002465 y 12000598 para su respectiva intervención la cual a la fecha aun no contamos con la reserva para iniciar actividades

A la fecha por parte de la supervisión no han generado el pago de las actas correspondientes del mes de julio y agosto, pero esta semana se reactivaron actividades de obra

INFORME SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	**FDLBU -217-2022**				
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA	**"Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo, del contrato de obra que se derive de la licitación pública FDLBU -215-2022 cuyo objeto es contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable el mantenimiento de la malla vial local e intermedia de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá D.C.,**				
SEMANA No.	**50**	**DEL**	**domingo, 22 de octubre de 2023**	**AL**	**sábado, 28 de octubre de 2023**

Aspecto Técnico

El día 14 de julio la supervisión da conocer EL PRIMER listado para intervención, la cual se realiza recorrido para verificación del estado en que se encuentra los segmentos asignados, lo cual se solicito la inclusión de segmentos viales que si requería intervención y el retiro de los que no, para así cumplir con el acuerdo a las condiciones dadas por el señor alcalde.
El día 04 de agosto se asigna un nuevo listado para intervención, se da a conocer en el comité #45, en la cual se estaría en proceso de validación del estado de los tramos y hay tres CIV que están pendientes por tramite de reserva ara que el contrato la pueda intervenir que son:
12002897
12002465
12000598
Como interventoría, estamos pendientes de que la supervisión realice el tramite para la reserva de los anteriores segmentos viales, para autorizar la intervención de estos, puesto que se iniciara esta semana segmentos cercanos a estos

CIV	PK_ID	Eje	Desde	Hasta	UPZ	Localidad
12001077	179952	CL 85A	KR 22A	AK 24	LOS ALCAZARES	Barrios Unidos
12001381	178473	KR 29B	CL 77	CL 78	LOS ALCAZARES	Barrios Unidos
12002745	178967	KR 16	CL 63B	CL 63C	LOS ALCAZARES	Barrios Unidos
12002469	179087	CL 63F	KR 28	KR 28	LOS ALCAZARES	Barrios Unidos
12002498	178907	KR 20	CL 66	CL 67	LOS ALCAZARES	Barrios Unidos
12002517	508825	KR 28	CL 63D	CL 63F	LOS ALCAZARES	Barrios Unidos
12000451	178639	KR 45A	CL 93	CL 94	LOS ANDES	Barrios Unidos
12000899	178432	KR 49A	CL 84	CL 85	LOS ANDES	Barrios Unidos

De acuerdo a este listado, se realizo programación de recorrido el día 10 de agosto la cual se pudo constatar el estado de las vías dadas y de acuerdo a las fichas de diagnostico se analiza su intervención, las áreas y tipo de actividad ha realizar.

SE ESTA PENDIENTE LA TOMA DE MEDIDA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA PARA SOCIALIZAR CANTIDADES

Esta semana se realizo recorrido por cada uno de los Chivas la cual estos ya cuentan con PMT listos, esto con el fin de socializar las áreas a intervenir para cada uno de los tramos y definir la metodología en la que se van ha realizar las actividades, esto se realizo en compañía de las áreas técnicas de la supervisión, contratista e interventoría.

Aspecto SST-Ambiental

Se le realiza la solicitud al contratista el mantenimiento de las mallas de protección a los sumideros durante la ejecución de obra.
Se le solicita al contratista verbalmente la disponibilidad de personal para los cargos de Boal y auxiliares de trafico, pues es evidente que en el momento de intervenir mas de un segmento vial, se estarían teniendo frentes de obra sin el personal solicitado por el PMT y los requeridos para la ejecución de obra y su respectivo mantenimiento
Se le solicita al profesional SST que realice capacitación al personal de obra para el tema de uso de los equipos móviles en horas laborales y cumpliendo las actividades que se estén llevando a cabo, puesto que el personal se le ha evidenciando el incumplimiento de este.
Se le solicita al contratista mas organización y orden en el momento de realizar el retiro de los cerramientos

Aspecto Social

Dando respuesta a los compromisos y aspectos establecidos en el apéndice social, se presenta a continuación reporte semanal respecto a las actividades realizadas con la comunidad:
1. Programa de Información
En la presente semana se realizó socializaciones de inicio de obra y PMT en el CIV: 12000451
2. Programa de divulgación
Para la presente semana no se realizaron actividades para este programa.
2.2 Instalación de PSI
Para la presente semana se realizó la instalación de PSI en el CIV´S: 12000451
3. Programa Atención al Ciudadano
Para la presente semana no se presentaron PQRS, por parte de la comunidad.
4. Programa de Sostenibilidad.
Para la presente semana no se realizaron actividades para este programa.
5. Programa de formación a trabajadores adscritos a la obra
Para la presente semana no se realizaron actividades para este programa
6. Programa para la generación de empleo
Para la presente semana se dio retiro de dos personas del personal de la obra. Por el momento contamos con el siguiente indicador de cumplimiento, el cual muestra que se cumple con el porcentaje de contratación exigida de MONC de la localidad de Barrios Unidos.

Cumplimiento Indicadores Generación MONC					
	Personal General Contratado	Personal Mano De Obra Calificada	Personal Mano De Obra No Calificada	Personal De La Localidad	Mujeres Contratadas
Cantidad	12	3	9	2	1
Porcentaje Cumplimiento	100%	25%	75%	22%	11%

7. Programa de Acompañamiento Social a Actividades Técnicas de Obra
Para la presente semana se realizó levantamiento de acta de vecindad en el CIV: 12000451.
8. Actividades de seguimiento
Para la presente semana se asistió a reunión con la comunidad del CIV 12002500 y a el comité de seguimiento virtual.

Aspecto PMT

El 05 de mayo fue radicado ante movilidad el primer paquete de los diseños de demarcación a la secretaria de movilidad con el oficio LUZ22BU-2022-112 ENVIO PLANOS DE DISEÑOS DE SEÑALIZACION EN EL MARCO DEL CONTRATO 211 DE 2022, la cual tiene como numero de radicación 20236120204164 2
Se radica 20 de julio de 2023 el primer paquete con las correcciones solicitadas, mediante oficio LUZ22BU-2022-193 - Radicación Subsanación Diseños de Señalización, con numero de radicación 202361203472542
Se radica el 09 de agosto el segundo paquete de diseños a Movilidad con oficio LUZ22BU-2022-203 - Radicación Diseños de Señalización con numero de radicado 20236120347419 2
El día Miércoles 20 de septiembre, se dio el aval por la secretaria de movilidad para la demarcación que se había venido presentando

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
12000625 Calle 74A Carrera 66 Carrera 65B Local Mtto periódico y/o Rutinario **12000611** Carrera 66 Calle 74 Calle 74A Local Mtto periódico y/o Rutinario **12000683** Carrera 66 Calle 72A Calle 73 Local Mtto periódico y/o Rutinario **12000785** Calle 72A Carrera 65 Carrera 65B Local Mtto periódico y/o Rutinario **12000937** Calle 72A Carrera 63 Carrera 64 Local Mtto periódico y/o Rutinario		11/11/2022	27/04/2023	N/A		27/04/2023

INFORME SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	**FDLBU -217-2022**
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA	**"Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo, del contrato de obra que se derive de la licitación pública FDLBU -215-2022 cuyo objeto es contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable el mantenimiento de la malla vial local e intermedia de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá D.C.,**

SEMANA No.	**50**	**DEL**	**domingo, 22 de octubre de 2023**		**AL**	**sábado, 28 de octubre de 2023**	
12000670 CL 75B KR 63 KR 64 Local Mtto periódico y/o Rutinario **12000682** CL 76 KR 62 KR 63 Local Mtto periódico y/o Rutinario **12000569** KR 63 CL 78 CL 78A Local Mtto periódico y/o Rutinario		22/12/2022	21/06/2023	N/A			21/06/2023
12000737 KR 61 CL 76 CL 77 Local Mtto periódico y/o Rutinario **12000822** CL 75B KR 60 KR 61 Local Mtto periódico y/o Rutinario **12000698** CL 77 KR 61 KR 62 Local Mtto periódico y/o Rutinario **12000549** CL 76 KR 65 KR 65A Local Mtto periódico y/o Rutinario	202261204001212	6/01/2023	22/06/2023	N/A	202261204001212		22/06/2023
12000649 CL 79B KR 56BIS KR 58 Local Mtto periódico y/o Rutinario **12001093** KR 57A CL 74A CL 75ABIS Local Mtto periódico y/o Rutinario **12001290** CL 72A KR 57 KR 57A Local Mtto periódico y/o Rutinario	202261204080492	20/01/2023	2/03/2023	N/A	202261204080492		2/03/2023
12002537 KR 25BIS CL 63DBIS CL 63F Local Mtto periódico y/o Rutinario **12002061** CL 70 KR 29 KR 29A Local Mtto periódico y/o Rutinario **12001054** KR 26 CL 85A SD Local Mtto periódico y/o Rutinario **12000770** KR 49C CL 86 CL 86A Local Mtto periódico y/o Rutinario **12000300** CL 93B KR 60B TV 60C Local Mtto periódico y/o Rutinario **12000381** CL 93 KR 60 KR 60A Local Mtto periódico y/o Rutinario	202361200434062	10/02/2023	6/04/2023	N/A	202361200434062		6/04/2023
12000691 CL 88AAK 30KR 49 Local Mtto periódico y/o Rutinario **12001087**KR 28CKR 29CL 85A Local Mtto periódico y/o Rutinario **12000748**KR 49DCL 86CL 86A Local Mtto periódico y/o Rutinario **12001152 - 12001049** KR 62AC 68 AC72 Local Mtto periódico y/o	202361200319652	3/02/2023	30/03/2023	N/A	202361200319652		30/03/2023
12000256 CL 94AKR 60KR 60C Local Mtto periódico y/o Rutinario **12000417**CL 92KR 58KR 60 Local Mtto periódico y/o Rutinario **12000407** CL 92KR 60KR 60A Local Mtto periódico y/o Rutinario	202361200531952	17/02/2023	13/04/2023	N/A	202361200531952		13/04/2023
12000390 cl 79a KR 66 Local Mtto periódico y/o Rutinario **12000612** CL 74 KR 66 Local Mtto periódico y/o Rutinario	202361200647412	24/02/2023	20/04/2023	N/A	202361200647412		20/04/2023
12001017 Cl74 KR 60 a Kr61 Local Mtto periódico y/o Rutinario **12001058** Kr 60 CL 73 a Cl 74 Local Mtto periódico y/o Rutinario	202361200889492	10/03/2023	8/06/2023	N/A	202361200889492		08/0/20023
12001087 KR 28C CL85A A KR 29 Local Mtto periódico y/o Rutinario	202361201253372	31/03/2023	29/06/2023	N/A	202361201253372		29/06/2023
12000230 Kr 60 CL 94B A CL 97 Local Mtto periódico y/o Rutinario	202361201482702	26/04/2023	6/07/2023	N/A	202361201482702		6/07/2023
12000935 KR 62 CL 73 A CL 74 Local Mtto periódico y/o Rutinario	202361201367862	21/04/2023	29/07/2023	N/A	202361201367862		29/07/2023
12001919 CL 66 DESDE KR 57 A KR 57 B Local Mtto periódico y/o Rutinario **12001853** CL 66 KR 57C A KR 58 Local Mtto periódico y/o Rutinario	202361201764502	5/05/2023	3/08/2023	N/A	202361201764502		3/08/2023
12001054 KR 26 CL 85A HASTA 50M AL NORTE Local Mtto periódico y/o Rutinario	202361201764592	5/05/2023	27/07/2023	N/A	202361201764592		27/07/2023
12000623 CL 87 ENTRE KRA 49C A 49A Local Mtto periódico y/o Rutinario	202361202087532	26/05/2023	17/08/2023	N/A	202361202087532		17/08/2023
12000769 - 12000716 CL 74 ENTRE KR 64 A KR 65B Local Mtto periódico y/o Rutinario	202361202210892	2/06/2023	31/08/2023	N/A	202361202210892		31/08/2023
12001848 KR 50 DG 71 BIS A CL 71 A Local Mtto periódico y/o Rutinario	202361202087462	2/06/2023	17/08/2023	N/A	202361202087462		17/08/2023
12002051 KR 26 ACL 72 A CL 73 Local Mtto periódico y/o Rutinario **12001984** KRA 27B AC 72 A CL 73 BIS Local Mtto periódico y/o Rutinario	202361202205102	02/06//2023	31/08/2023	N/A	202361202205102		31/08/2023
12000070 Cl 99 ENTRE KR 49 A KR 52 Local Mtto periódico y/o Rutinario **12000717** KR 49 ENTRE CL 86B A CL 86A Local Mtto periódico y/o Rutinario **12000091** CL 9A ENTRE KR 51 A KR 52 Local Mtto periódico y/o Rutinario	202361202457122	30/06/2023	10/08/2023	N/A	202361202457122		10/08/2023
12000280-12000250 KR 57 ENTRE CL 94C A LA 94A Local Mtto periódico y/o Rutinario	202361202591522	23/06/2023	14/09/2023	N/A	202361202591522		14/09/2023
12000725 Kr 49 ENTRE CL 86B A CL 86C Local Mtto periódico y/o Rutinario **12000880** Kr 62 ENTRE CL 74 A 74A Local Mtto periódico y/o Rutinario **12000673** Kr 58 entre cl 79 a cl 79A Local Mtto periódico y/o Rutinario **12000641** Cl 86c entre KR 49C A 49D Local Mtto periódico y/o Rutinario	202361202952042	14/07/2023	5/10/2023	N/A	202361202952042		5/10/2023
12002489 Cl 63f ENTRE Kr 26 A LA Av. NQS Local Mtto periódico y/o Rutinario **12002500** Kr 25 ENTRE CL 63F A Kr 64 Local Mtto periódico y/o Rutinario **12002165** Cl 71 entre Ak 24 A AK 25 Local Mtto periódico y/o Rutinario **12002119** CL 71 ENTRE KR 27B A KR 27A Local Mtto periódico y/o Rutinario **12001125** CL 85A ENTRE AUTO NORTE A KR 21 Local Mtto periódico y/o Rutinario **12001100** KR 21 ENTRE CL 86 A CL 85A Local Mtto periódico y/o Rutinario **15001548** KR 57C ENTRE CL 67C A AC68 Local Mtto periódico y/o Rutinario	202361203143292	28/07/2023	26/10/2023	N/A	202361203143292		26/10/2023

* Opcional dependiendo de los requerimientos del contrato

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
22/10/2023		-
23/10/2023		-
24/10/2023		-
25/10/2023		-
26/10/2023		-
27/10/2023		-
28/10/2023		-



INFORME SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	**FDLBU -217-2022**				
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA	**"Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo, del contrato de obra que se derive de la licitación pública FDLBU -215-2022 cuyo objeto es contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable el mantenimiento de la malla vial local e intermedia de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá D.C.,**				
SEMANA No.	**50**	**DEL**	**domingo, 22 de octubre de 2023**	**AL**	**sábado, 28 de octubre de 2023**

V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se Iniciaron actividades en los segmentos 12000451 , pero no se completaron en su totalidad
También se tiene programado las actividades nocturnas en los CIVs 12000451

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

En el siguiente cuadro se muestra el avance que tiene cada CIV intervenido hasta la fecha

ORDEN DE EJECUCIÓN	CIV	UBICACIÓN			% de Intervención a recuperar por CIV	LONGITUD TRAMO (ml)	Km-Carril del segmento vial (m2)	FECHAS DE EJECUCION			Avance de ejecución de obra con asfalto del área recuperada %	Avance de obra demarcación vial %
		EJE	INICIO	FIN				INICIO	FINAL DE ACTIVIDADES	FECHA DE RECIBO A SARTISFACCIÓN		
1	**12000611**	Carrera 66	Calle 74	Calle 74A	**100**	46.46	0.156	15/11/2022	13/12/2022	31/01/2023	**100**	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20236120204164 2
2	**12000683**	Carrera 66	Calle 72A	Calle 73	**100**	45.1	0.135	21/11/2022	25/12/2022	31/01/2023	**100**	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20236120204164 2
3	**12000785**	Calle 72A	Carrera 65	Carrera 65B	**100**	86.3	0.243	25/11/2022	13/12/2022	31/01/2023	**100**	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20236120204164 2
4	**12000937**	Calle 72A	Carrera 63	Carrera 64	**100**	111.5	0.326	13/12/2022	20/12/2022	15/05/2023	**100**	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20236120204164 2
5	**12001073**	KR 63	AC 68	AC 72	**100**	157.3	0.485	22/12/2022	4/01/2023	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION	**90**	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20236120204164 2
6	**12000670**	CL 75B	KR 63	KR 64	**100**	95	0.24	3/01/2023	12/01/2023	15/02/2023	**100**	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20236120204164 2
7	**12000682**	CL 76	KR 62	KR 63	**80**	74.5	0.192	6/01/2023	12/01/2023	28/02/2023	**100**	
8	**12000569**	KR 63	CL 78	CL 78A	**100**	44.1	0.106	12/01/2023	18/01/2023	28/02/2023	**100**	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20236120204164 2
9	**12000822**	CL 75B	KR 60	KR 61	**100**	86.62	0.196	14/01/2023	20/01/2023	28/02/2023	**100**	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20236120204164 2
10	**12000737**	KR 61	CL 76	CL 77	**100**	53.05	0.15	19/01/2023	23/01/2023	28/02/2023	**100**	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20236120204164 2
11	**12000698**	CL 77	KR 61	KR 62	**100**	81.87	0.201	19/01/2023	24/01/2023	28/02/2023	**100**	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20236120204164 2
12	**12000549**	CL 76	KR 65	KR 65A	**100**	48.14	0.102	23/01/2023	26/01/2023	28/02/2023	**100**	
13	**12001093**	KR 57A	CL 74A	CL 75ABIS	**100**	120	0.266	27/01/2023	3/02/2023	20/03/2023	**100**	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20236120204164 2
14	**12001290**	CL 72A	KR 57	KR 57A	**85**	63.45	0.208	25/01/2023	3/02/2023	20/03/2023	**100**	
15	**12000649**	CL 79B	KR 56BIS	KR 58	**50**	45	0.244	2/02/2023	6/02/2023	20/03/2023	**100**	
16	**12001091**	Kra 62	calle 68	calle 72	**100**	184,61	0.512	6/02/2023	18/02/2023	20/03/2023	**100**	Este CIV ya se encuentra demarcado por CONSORCIO SEÑAL VIAL 2021
17	**12002061**	CL 70	KR 29A	KR 29	**100**	69	0.14	16/02/2023	24/02/2023	20/03/2023	**100**	los diseños ya fueron radicados a SDM con radicado 20236120204164 2
18	**12002537**	KR 25BIS	CL 63DBIS	CL 63F	**60**	67.87	0.171	16/02/2023	24/02/2023	1/04/2023	**100**	
19	**12001058**	KR 60	CL 73	CL 74	**50**	52.32	0.139	15/05/2023	20/05/2023	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION	**98**	
20	**12000770**	KR 49C	CL 86	CL 86A	**100**	60.9	0.123	27/02/2023	18/04/2023	26/05/2023	**100**	
21	**12000381**	CL 93	KR 60	KR 60A	**68**	74.0	0.176	20/04/2023	24/04/2023	15/05/2023	**100**	
22	**12000417**	CL 92	KR 58	KR 60	**31**	87.7	0.181	21/04/2023	25/04/2023	15/05/2023	**100**	

	INFORME SEMANAL		

I. INFORMACIÓN GENERAL													
CONTRATO No.	**FDLBU -217-2022**												
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA	**"Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo, del contrato de obra que se derive de la licitación pública FDLBU -215-2022 cuyo objeto es contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable el mantenimiento de la malla vial local e intermedia de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá D.C.,**												
SEMANA No.	**50**			**DEL**	**domingo, 22 de octubre de 2023**				**AL**	**sábado, 28 de octubre de 2023**			

23	**12000691**	CL 88A	AK 30	KR 49	**30**	87.0	0.161	18/04/2023	19/04/2023	3/06/2023	**100**	
24	**12000269**	CL 94A	KR 60	KR 60B	**20**	149.8	0.354	25/04/2023	29/04/2023	3/06/2023	**100**	
25	**12000300**	CL 93B	KR 60B	TV 60C	**30**	93.3	0.178	24/04/2023	25/04/2023	3/06/2023	**100**	
26	**12000230**	KR 60	CL 94B	CL 97	**20**	186.5	0.454	27/04/2023	27/04/2023	3/06/2023	**100**	
27	**12000407**	CL 92	KR 60	KR 60A	**55**	99.3	0.199	28/04/2023	3/04/2023	3/06/2023	**100**	
28	**12000390**	CL 79	KR 66	CERRADA	**55**	175.0	0.426	5/05/2023	9/05/2023	3/06/2023	**100**	
29	**12000476**	KR 64	CL 79BIS	CL 79A	**40**	50.78	0.118	11/05/2023	15/05/2023	3/06/2023	**100**	
30	**12000488**	KR 64	CL 79	CL 79BIS	**55**	51.14	0.127	11/05/2023	13/05/2023	1/06/2023	**100**	
31	**12000508**	KR 64	CL 78A	CL 79	**20**	61.56	0.132	13/05/2023	13/05/2023	1/06/2023	**100**	
32	**12001017**	CL 74	KR 60	KR 61	**60**	88.00	0.237	15/05/2023	20/05/2023	22/06/2023	**100**	
33	**12001853**	CL 66	KR 57C	KR 58	**79**	62.46	0.161	23/05/2023	27/05/2023	27/06/2023	**100**	
34	**12001919**	CL 66	KR 57	KR 57B	**44**	82.77	0.223	23/05/2023	27/05/2023	27/06/2023	**100**	
35	**12000612**	CL 74	KR 66		**100**	22.68	0.062	29/05/2023	10/06/2023	10/07/2023	**100**	
36	**12000935**	KR 62	CL 73	CL 74	**85**	52.56	0.142	29/05/2023	1/06/2023	10/07/2023	**100**	
37	**12000769**	CL 74	KR 64	KR 65	**40**	87.06	0.238	3/06/2023	8/06/2023	10/07/2023	**100**	
38	**12000716**	CL 74	KR 65	KR 65B	**20**	86.67	0.236	9/06/2023	9/06/2023	10/07/2023	**100**	
39	**12001848**	KR 50	DG 71BIS	CL 71A	**32**	138.20	0.366	13/06/2023	17/06/2023	17/07/2023	**100**	
40	**12002051**	KR 26	AC 72	CL 73	**41**	87.81	0.207	20/06/2023	29/06/2023	31/07/2023	**100**	
41	**12001984**	KR 27B	AC 72	CL 73BIS	**34**	105.84	0.253	20/06/2023	23/06/2023	31/07/2023	**100**	
42	**12000623**	CL 87	KR 49A	KR 49C	**79**	115.44	0.239	26/06/2023	1/07/2023	31/07/2023	**100**	
43	**12000717**	KR 49C	CL 86A	CL 86B	**30**	46.56	0.096	30/07/2023	2/07/2023	6/08/2023	**98**	
44	**12000250**	KR 57	CL 94B	CL 94C	**30**	86.43	0.208	4/07/2023	7/07/2023	11/08/2023	**98**	
45	**12000641**	CL 86C	KR 49C	KR 49D	**40**	58.98	0.109	17/07/2023	19/07/2023	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION	**98**	
46	**12000673**	KR 58	CL 79	CL 79A	**71**	75.72	0.172	21/07/2023	26/07/2023	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION	**98**	
47	**12001548**	KR 57C	CL 67C	CL 68	**80**	88.20	0.202	28/07/2023	5/08/2023	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION	**98**	
48	**12002500**	KR 25	CL 63F	CL 64	**98**	82.38	0.169	4/08/2023	11/08/2023	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION	**98**	Se vienen realizando actividades de remates/ El dia 13 de octubre se realiza nivelación de las areas que presentaban apozamiento
49	**12003324**	CL 63F	KR 28B	AK 30	**98**	50.08	0.152	11/08/2023	16/08/2023	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION	**98**	
50	**12002469**	CL 63F	KR 28	KR 28	**98**	14.39	0.039	15/08/2023	19/08/2023	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION	**98**	
51	**12001125**	CL 85A	AK 20	KR 21	**80**	78.27	0.249	11/09/2023	19/09/2023	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION	**98**	
52	**12001100**	KR 21	CL 85A	CL 86	**60**	55.35	0.144	15/09/2023	20/09/2023	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION	**98**	
53	**112001077**	CL 85A	KR 22A	AK 24	**65**	99.40	0.235	20/09/2023	24/09/2023	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION	**90**	pendiente arreglo cargue
54	**12000451**	KR 45A	CL 93	CL 94	**50**	150.00	0.350	5/10/2023	12/10/2023	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION	**90**	
55	**12002745**	KR 16	CL 63B	CL 63C	**45**	74.64	0.188	25/10/2023	28/10/2023	AUN NO SE RECIBE A SATISFACCION		

INFORME SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	**FDLBU -217-2022**				
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA	**"Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo, del contrato de obra que se derive de la licitación pública FDLBU -215-2022 cuyo objeto es contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable el mantenimiento de la malla vial local e intermedia de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá D.C.,**				
SEMANA No.	**50**	**DEL**	**domingo, 22 de octubre de 2023**	**AL**	**sábado, 28 de octubre de 2023**

En la tabla anteriormente mencionada se dejan resultados los Civ que en este momento se están ejecutando y los que están por observación por parte de esta interventoría por acabados o que le hace falta una actividad para completar la finalización con su respectiva porcentaje de avance, tal es el caso para los CIV

De acuerdo a esta semana se realiza programación se realiza actividades de atención a las area afectadas por la intervención de las obras coo en los segmentos 12001077, 12002500 en la cual para este ultimo se quiso realizar los remates a los bordillos, pero la comunidad no permitio la actividad, aluciendo que ellos querian intervención completa al sendero peatonal, por lo cual por porte area social se le reitera al ciudado que el alcance del contrato no aplica a intervención de andenes ni zonas comunes. igual no dejaron trabajar. Para la proximas semana se tiene programado levantamiento topografico para este segmento para verificar alturas y analizar las acciones para los posibles apozamientos que presenta dicha carpeta.

12001073: Este CIV de acuerdo a la mesa de trabajo realizada con la interventoría encargada de la demarcación vial, da vía libre para las actividades de micro fresado que se encuentra pendiente para intervención por envejecimiento prematuro que presento la carpeta instalada sobre la boca calle de la calle 68. Se esta pendiente de la programación de esta actividad por parte del contratista.
12001853: Este CIV se encuentra pendiente para recibir, aun no tiene los 30 días de haberse instalado el asfalto, tiempo que le daremos para observación de algún cambio o variación que se presente en su textura o instalado
12000769: Este CIV se encuentra pendiente para recibir, aun no tiene los 30 días de haberse instalado el asfalto, tiempo que le daremos para observación de algún cambio o variación que se presente en su textura o instalado
12002051: Este CIV se encuentra pendiente para recibir, aun no tiene los 30 días de haberse instalado el asfalto, tiempo que le daremos para observación de algún cambio o variación que se presente en su textura o instalado
12002500: Este CIV se encuentra pendiente para recibir, aun no tiene los 30 días de haberse instalado el asfalto, tiempo que le daremos para observación de algún cambio o variación que se presente en su textura o instalado, adicionalmente se ha solcitado a la comunidad de que muevan los carros de los bordes de bordillo para permitri el sello correspondiente al sello instalado y adicionalmente se solicita al administrador del local de la direccion Carrera 25#63F-05, retirar valla que ubican sobre la carpeta, la cual nunca han atendido, se adjunta registro del antes y del despues.

Antes de la intervencion





Despues de la intervención

Del listado de acciones de movilidad y fisuras, se retira el CIV 12000935, puesto que este se le realizo una acción de movilidad pero se realizo intervención en la cual por parte de la supervisión por su mal estado de la carpeta, se dio el aval de intervención parcial garantizando el mejoramiento visual de la carpeta

Al día de hoy la solicitud para este PMT, se encuentra en el nuevo paquete de priorización que el contratista tiene programado radicar ante la entidad de la SDM, esto también por la priorización de la nueva programación que se solicitó en estos días.

Esta semana se realizo recorrido p cada uno de los CIV´s la cual estos ya cuentan con PMT listos, esto con el fin de socializar las áreas a intervenir para cada uno de los tramos y definir la metodología en la que se van ha realizar las actividades, esto se realizo en compañía de las áreas técnicas de la supervisión, contratista e interventoría.

Adicionalmente esta semana se registra el para el presente informe el avance de los sellos de junta que se realizaron durante el periodo, puesto que se realiza la medición respectiva por CIV instalado.

El 05 de mayo fue radicado ante movilidad los diseños de demarcación a la secretaria de movilidad con el oficio LUZ22BU-2022-112 ENVIO PLANOS DE DISEÑOS DE SEÑALIZACION EN EL MARCO DEL
CONTRATO 211 DE 2022, la cual tiene como numero de radicación 202361202041642
Se radica 20 de julio de 2023 el primer paquete con las correcciones solicitadas, mediante oficio LUZ22BU-2022-193 - Radicación Subsanación Diseños de Señalización, con numero de radicación 202361203472542
Se radica el 09 de agosto el segundo paquete de diseños a Movilidad con oficio LUZ22BU-2022-203 - Radicación Diseños de Señalización con numero de radicado 20236120347419 2
El dia Miercoles 20 de septiembre, se dio el aval por la secretaria de movilidad para la demarcación que se habia venido presentando
En el transcurso de la semana se realiza recorrido por los frentes de obra con el contratista e interventoría. La cual además de las observaciones anteriormente descritas se realiza los sellos de juntas solicitados en jornada nocturna, solicitud a las observaciones evidenciadas en los civ indicados.
Se debe de recibir por parte de interventoría el 100% de las actividades y la calidad de los mismos, de lo contrario esto afectara las actas futuras de contratista al no estar los tramos a satisfacción

Para este contrato se han realizado actividades de acciones de movilidad y sello de fisuras, la cual se relacionan en la siguiente tabla

ORDEN DE EJECUCIÓN	CIV	UBICACIÓN			KM/CARRIL	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA DE INTERVENCIÓN
		EJE	INICIO	FIN			
1	**12002500**	KR 25	CL 63F	CL 64	0.169	ACCION DE MOVILIDAD	24/02/2023
2	**12000579**	KR 65A		CL 76	0.199	ACCION DE MOVILIDAD	25/01/2023
3	**12000625**	CL 74A	KR 65B	KR 66	0.192	ACCION DE MOVILIDAD	25/11/2022
4	**12001139**	KR 57A	CL 74	CL 74A	0.083	ACCION DE MOVILIDAD	19/12/2022
5	**12000989**	KR 62	CL 72A	EL 73	0.136	ACCION DE MOVILIDAD	25/01/2023
6	**12000765**	KR 56	CL 79	CL 79B	0.300	SELLO DE FISURAS	
7	**12000654**	CL 78	KR 61	KR 62	0.204	SELLO DE FISURAS	
8	**12001169**	CL 67B	KR 65A	KR 65B	0.154	SELLO DE JUNTAS	
9	**12001209**	KR 65	CL 67B	CL 67D	0.244	SELLO DE JUNTAS	
10	**12000616**	CL 75B	KR 64	KR 65	0.223	SELLO DE FISURAS	
11	**12001098**	KR 60	CL 72A	CL 73	0.137	SELLO DE FISURAS	
12	**12001085**	KR 61	AC 72	CL 72A	0.133	SELLO DE FISURAS	
13	**12002534**	KR 19	CL 66	CL 66A	0.183	SELLO DE FISURAS	
14	**12002437**	CL 69	KR 15	KR 16	0.188	SELLO DE FISURAS	
15	**12002403**	CL 69	KR 17	KR 19	0.246	SELLO DE FISURAS	
16	**12001117**	CL 73	KR 58	KR 60	0.158	ACCION DE MOVILIDAD	18/05/2023
17	**12000033**	KR 60	CL 99	AC 100	0.171	SELLO DE JUNTAS	7/06/2023
18	**12000097**	KR 60	CL 97A	CL 98A	0.188	SELLO DE FISURAS	8/06/2023
19	**12000154**	CL 97	KR 57	KR 58	0.224	SELLO DE FISURAS	8/06/2023
20	**12000289**	CL 94	KR 59	KR 60	0.059	SELLO DE FISURAS	8/06/2023
21	**12000157**	CL 97	TV 55	KR 57	0.100	SELLO DE FISURAS	8/06/2023
22	**12000136**	KR 47A	CL 97	CL 98	0.084	SELLO DE FISURAS	9/06/2023
23	**12000125**	CL 98	KR 47A	KR 48	0.111	SELLO DE FISURAS	9/06/2023
24	**12003336**	KR 67	CL 95	CL 96BIS	0.306	SELLO DE FISURAS	9/06/2023
25	**12000137**	CL 97	KR 47A	KR 48	0.106	SELLO DE FISURAS	9/06/2023
26	**12000273**	KR 58	CL 94A	CL 94B	0.121	SELLO DE FISURAS	9/06/2023
27	**12000163**	TV 60C	KR 60BIS	KR 60	0.245	SELLO DE FISURAS	9/06/2023
28	**12000499**	CL 91	KR 49A	KR 49B	0.153	SELLO DE FISURAS	11/06/2023

INFORME SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	**FDLBU -217-2022**
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA	**"Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo, del contrato de obra que se derive de la licitación pública FDLBU -215-2022 cuyo objeto es contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable el mantenimiento de la malla vial local e intermedia de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá D.C.,**
SEMANA No.	**50** **DEL** **domingo, 22 de octubre de 2023** **AL** **sábado, 28 de octubre de 2023**

29	**12000498**	KR 49A	CL 91	CL 93	0.458	SELLO DE FISURAS	11/06/2023
30	**12002462**	CL 69	KR 14A	KR 15	0.195	SELLO DE FISURAS	24/06/2023
31	**12001345**	CL 79	KR 28A	KR 28B	0.206	SELLO DE FISURAS	12/07/2023
32	**12002120**	KR 52	CL 65	CL 65A	0.209	SELLO DE FISURAS	24/07/2023
33	**12002048**	KR 52	CL 66A	CL 67	0.183	SELLO DE FISURAS	22/07/2023
34	**12002726**	KR 26	CL 63A	CL 63B	0.228	SELLO DE FISURAS	19/07/2023
35	**12002784**	KR 19A	AC 63	CL 63A	0.266	SELLO DE FISURAS	14/07/2023
36	**12003194**	CL 73		KR22	0.083	SELLO DE FISURAS	19/07/2023
37	**12000593**	KR 49A	CL 88	CL 88A	0.100	SELLO DE FISURAS	1/07/2023
38	**12002320**	KR 28	CL 65	CL 66	0.297	SELLO DE FISURAS	21/07/2023
39	**12001561**	CL 77	KR 27B	KR 28	0.104	SELLO DE FISURAS	8/07/2023
40	**12002259**	CL 66	KR 28A	KR 28B	0.269	SELLO DE FISURAS	4/07/2023
41	**12002056**	CL 71	KR 28A	KR 28B	0.154	SELLO DE FISURAS	4/07/2023
42	**12002176**	KR 52	CL 64A	CL 65	0.453	SELLO DE FISURAS	26/07/2023
43	**12000748**	KR 49D	CL 86	CL 86A	0.135	SELLO DE FISURAS	1/07/2023
44	**12000655**	KR 49A	CL 86D	CL 87	0.108	SELLO DE FISURAS	1/07/2023
45	**12001724**	TV 56BBIS	KR 56B	DG 67BBIS	0.241	SELLO DE FISURAS	13/09/2023
46	**12001838**	CL 66B	KR 57	KR 57B	0.207	SELLO DE FISURAS	11/09/2023
47	**12001871**	CL 66	KR 57B	KR 57C	0.124	SELLO DE FISURAS	12/09/2023
48	**12002072**	KR 54	CL 65	CL 66A	0.437	SELLO DE FISURAS	7/09/2023
49	**12001430**	KR 57B	CL 70B	CL 70C	0.151	SELLO DE FISURAS	21/09/2023
50	**12000806**	KR 66	CL 67G	AC 68	0.155	SELLO DE FISURAS	20/09/2023
51	**12000837**	CL 79	KR 55A	KR 55B	0.205	SELLO DE FISURAS	15/09/2023
52	**12000945**	KR 55A	CL 78	DG 78BIS	0.128	SELLO DE FISURAS	16/09/2022
53	**12001135**	KR 66	CL 67ABIS	CL 67B	0.143	SELLO DE FISURAS	20/09/2023
54	**12003334**	CL65	Kr 57	Kr 56B	0.306	SELLO DE FISURAS	9/09/2023
55	**12002639**	KR 36A	CL 63A	CL 63B	0.208	SELLO DE FISURAS	25/09/2023
56	**12000809**	CL 85A	KR 49A	KR 50		SELLO DE FISURAS	21/06/2023
57	**12000921**	CL 85A	AK 30	KR 49A		SELLO DE FISURAS	17/06/2023
58	**12001597**	CL 76	KR 28	KR 28A		SELLO DE FISURAS	12/07/2023
59	**12002134**	CL 65	KR 51	KR 52		SELLO DE FISURAS	29/09/2023
60	**12002518**	CL 63D	KR 28	KR 28A		SELLO DE FISURAS	30/09/2023
61	**12002625**	KR 15	CL 66	CL 66A		SELLO DE FISURAS	30/06/2023
62	**12002666**	CL 63C	KR 19A	KR 20		SELLO DE FISURAS	30/06/2023
63	**12003343**	CL65	KR 57	KR 56B		SELLO DE FISURAS	9/09/2023

Para la fecha el contrato tiene un avance ejecutado en Km/ carril de : **22.088** Km-(m2)

La siguiente tabla, es la relación de grano caucho usado en los segmentos viales intervenidos hasta la fecha con su respectivo % usado

DIRECCIÓN (TRAMO) DE LA INTERVENCIÓN (CL - KR- DG- TV)	DESDE (CL - KR- DG- TV)	HASTA (CL - KR- DG- TV)	CIV	TIPO DE INTERVENCIÓN	LOCALIDAD	UPZ	% MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON GCR	OBSERVACIONES
Kra 62	calle 68	calle 72	12001091	MANTENIMIENTO	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	100	MCCH19-A
CL 70	KR 29	KR 29A	12002061	MANTENIMIENTO	BARRIOS UNIDOS	LOS ALCAZARES	100	MCCH19-A
KR 25BIS	CL 63DBIS	CL 63F	12002537	MANTENIMIENTO	BARRIOS UNIDOS	LOS ALCAZARES	100	MCCH19-A
KR 49C	CL 86	CL 86A	12000770	MANTENIMIENTO	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	100	MCCH19-A
CL 88A	AK 30	KR 49	12000691	MANTENIMIENTO	BARRIOS UNIDOS	RIONEGRO	100	MCCH19-A
CL 94A	KR 60	KR 60B	12000269	MANTENIMIENTO	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	100	MCCH19-A
CL 93B	KR 60B	TV 60C	12000300	MANTENIMIENTO	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	100	MCCH19-A
CL 93	KR 60	KR 60A	12000381	MANTENIMIENTO	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	100	MCCH19-A
KR 60	CL 94B	CL 97	12000230	MANTENIMIENTO	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	100	MCCH19-A
CL 92	KR 58	KR 60	12000417	MANTENIMIENTO	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	100	MCCH19-A
CL 92	KR 60	KR 60A	12000407	MANTENIMIENTO	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	100	MCCH19-A
KR 58	CL 79	CL 79A	12000673	MANTENIMIENTO	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	24	MCCH19-A
KR 57C	CL 67C	CL 68	12001548	MANTENIMIENTO	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	100	MCCH19-A
KR 25	CL 63F	CL 64	12002500	MANTENIMIENTO	BARRIOS UNIDOS	LOS ALCAZARES	100	MCCH19-A
CL 63F	KR 28B	AK 30	12003324	MANTENIMIENTO	BARRIOS UNIDOS	LOS ALCAZARES	100	MCCH19-A

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
El 05 de mayo fue radicado ante movilidad el primer paquete de los diseños de demarcación a la secretaria de movilidad con el oficio LUZ22BU-2022-112 ENVIO PLANOS DE DISEÑOS DE SEÑALIZACION EN EL MARCO DEL CONTRATO 211 DE 2022, la cual tiene como numero de radicación 202361202041642 Se radica 20 de julio de 2023 el primer paquete con las correcciones solicitadas, mediante oficio LUZ22BU-2022-193 - Radicación Subsanación Diseños de Señalización, con numero de radicación 202361203472542 Se radica el 09 de agosto el segundo paquete de diseños a Movilidad con oficio LUZ22BU-2022-203 - Radicación Diseños de Señalización con numero de radicado 202361203474192 El día Miércoles 20 de septiembre, se dio el aval por la secretaria de movilidad para la demarcación que se había venido presentando	Gilberto Martínez **Firma**
