Bogotá D.C, 14 de mayo de 2024

R&M-CT002-027-2023

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ
Atn. Ing. Katherine andrea velasquez bobadilla
Secretaria de Infraestructura.

Ciudad.

REFERENCIA: INTERVENTORIA N°002-2023 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL SAN BENITO SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA"

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA No.2 AL CONTRATO DE OBRA No.006-2023

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con el comunicado recibido el 14 de Mayo de 2024 por parte de la firma contratista HCG CONSTRUCCIONES, nos permitimos remitir la solicitud de prórroga No.2 al contrato de obra No. 006-2023 por un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de terminación del contrato.; teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El día 02 de agosto del 2023 se firma acta de inicio, el contratista entrego el cronograma de actividades con un plazo de ejecución de seis (6) meses.

2. Por medio de los oficios 020-2023 y 022-2023, en el cual el contratista de obra solicito a la empresa de energía del municipio el traslado de las líneas de media tensión, la cuales impidieron realizar actividades en el norte del salón comunal.

3. El día 02 de octubre del 2023 el contratista de obra solicita la inclusión de actividades no previstas, que no se tuvieron en cuenta al momento de la formulación del contrato.

4. Por medio del OTRO SI No.1-MODIFICATORIO 1, la alcaldía municipal de Sibate da aprobación a la inclusión de ítems no previstos y la adición No. 1 al contrato de obra por un valor de $ 159.432.254,27.

5. Que mediante comunicado enviado el día 07 de marzo del 2023 el contratista manifestó que…“ El pasado 3 de marzo del presente año, se produjo un evento delictivo de tipo hurto en el frente de obra ´´construcción de salón comunal vereda san Benito sector santa rosa del municipio de sibate Cundinamarca´´… El cual genero una serie de dificultades operativas y logísticas que impidió la continuación del contrato, lo cual genero un retraso den la provisión de los materiales y en la ejecución de las actividades programadas.

6. Por medio del acta de suspensión del 21 de marzo del presente año, se suspende el contrato de obra por un plazo de 45 días calendario, cuya acta de reinicio se suscribió el día 05 de mayo del 2024.

7. El contratista HCG CONSTRUCCIONES LTDA por medio del oficio radicado el día 10 de mayo del 2024, solicita una prorroga numero 2 al contrato de obra, argumentando la dificultan para el suministro de los materiales hurtados el 03 de marzo del 2024, por parte de los proveedores ya que sus características especiales, ya que la fabricación de la tubería para estructura de cubierta, tardó mucho tiempo debido a la complejidad de la misma; así mismo los pernos de anclaje necesarios para la estructura son importados y su remesa al país se demoró considerablemente.

8. Teniendo en cuenta las condiciones climáticas presentes en la zona, durante el mes de mayo del presente año, las cuales afectan de manera considerable el buen desarrollo de las actividades para la construcción del salón comunal, ya que una vez inician las lluvias primero es necesario retirar el personal para evitar riesgos, y segundo se debe esperar el tiempo pertinente para reiniciar las actividades de obra teniendo en cuenta que se están realizando actividades en altura y con equipos de soldadura entre otros equipos que se operan con energía electrica, las cuales no han permitido la ejecución del contrato de la mejor manera.

Por lo anterior esta interventoría se permite manifestar que una vez revisadas las justificaciones presentadas por el contratista de obra, se evidencia que la solicitud de la prórroga No.2 por treinta (30) días contados a partir de la fecha de terminación del contrato; es viable con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato de obra N° 006-2023. Así mismo al presente documento se envía plan de contingencia y cronograma actualizado, enviado por el contratista de obra y avalado por esta interventoría.


Queda por parte del municipio de Sibaté, la formulación del documento, conforme a lo propuesto, de conformidad con lo descrito a la ley 80, ley 1150 y sus decretos reglamentarios para fines jurídicos la aprobación de las mismas.

Adjunto al presente documento se encuentran los siguientes anexos:

- Anexo No 1. Solicitud de prórroga del contratista de obra.
- Anexo No 2. Plan de contingencia.
- Anexo No 3. Estado del clima para el mes de mayo.
- Anexo No 4. Cronograma de obra actualizado.
- Anexo No 5. Comprobante de la compra de materiales.

Agradezco la atención prestada.

Cordial saludo,



CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
Representante Legal
Aprobó C.E.G.G.
Elaboro: D.C.T.F
C.C.// Archivo

Anexo No 1. Solicitud de prórroga del contratista de obra.

HCG CONSTRUCCIONES LTDA.
DIRECCIÓN: Carrera 2DA Este. No. 19 – 88 Casa 1.
Chía, Cundinamarca.
CELULAR: 3105583641

Chía, 14 de mayo de 2024

Señores:
R&M CONSTUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S
Ing. CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ.
Carrera 38A N.º 25 – 58
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Solicitud de prórroga en el contrato de obra No. 006 de 2023 Cuyo Objeto es "Construcción salón comunal vereda San Benito sector Santa Rosa del municipio de Sibaté Cundinamarca".

Distinguidos señores:

Me dirijo a ustedes en calidad de representante legal de HCG Construcciones LTDA, con el propósito de solicitar una prórroga de treinta (30) días al plazo del contrato para la Construcción salón comunal vereda San Benito sector Santa Rosa del municipio de Sibaté Cundinamarca.

Infortunadamente, debido a ciertas circunstancias que han surgido durante el desarrollo del proyecto, consideramos prudente solicitar una extensión en el plazo establecido en el contrato. Las razones que nos llevan a esta solicitud son las siguientes:

- Indisponibilidad en el mercado, de elementos de estructura de cubierta para reemplazo de los elementos hurtados el 3 de marzo del presente año; la fabricación de la tubería para estructura de cubierta, tardó mucho tiempo debido a las características especiales de la misma. Los pernos de anclaje necesarios para la estructura son importados e igualmente su remesa al país se demoró considerablemente.

- Inicio de la temporada de lluvias: Con la llegada de la temporada de lluvias, nos enfrentamos a condiciones climáticas adversas que van a dificultar considerablemente la ejecución de los trabajos de instalación de los elementos de cubierta.

- Como una tercera causa que ha demorado la ejecución de las actividades se debe mencionar las condiciones climáticas en la zona. Las lluvias han retrasado ostensiblemente las labores de trabajo en campo que se dificultan especialmente por la necesidad de utilizar equipos de soldadura y otros equipos que se operan con energía eléctrica, estas condiciones adversas se vienen presentando desde hace más de tres semanas. esta situación es conocida por todos ustedes

Considerando estas circunstancias, solicitamos respetuosamente una prórroga en el contrato de la obra No. 006 de 2023 Cuyo Objeto es "Construcción salón comunal vereda San Benito sector Santa Rosa del municipio de Sibaté Cundinamarca" por un período adicional de 30 días. Este tiempo adicional nos permitirá cumplir con los objetivos establecidos de manera adecuada y garantizar la calidad de lo trabajos.

HCG CONSTRUCCIONES LTDA.
DIRECCIÓN: Carrera 2DA Este. No. 19 – 88 Casa 1.
Chía, Cundinamarca.
CELULAR: 3105583641

Para culminar las actividades pendientes de ejecución, anexo a este oficio se encuentra un plan de contingencia que muestra cómo va a ser la implementación de recursos de mano de obra y materiales requeridos para completar las obras.

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud y quedamos a disposición para ampliar cualquier información adicional que pueda ser necesaria.

Nos permitimos hacer un recuento cronológico de la gestión que se hizo para la adquisición de los materiales:

GESTION PARA CONSECUCION Y ACOPIO DE MATERIALES

TUBOS METALICOS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA		
6/04/2024	Se solicita Cotización a la empresa CYRGO	
10/04/2024	Responden de Cyrgo que no hay disponibilidad del material, que el despacho puede demorarse 30 días.	
17/04/2024	Un nuevo vendedor de CYRGO, nos contacta para verificar la refrencia de los tubos. De nuevo la respuesta es que no hay disponiblidad.	Ver chats.
10/04/2024	Se inicia conversación con la empresa MULTIHIERROS y también manifiestan que el pedido puede tardar (30) días para su entrega.	
18/04/2024	Se hace el pedido a la empresa MULTIHIERROS	
8/05/2024	La tubería llega a Sibaté	

TEJA TERMOACUSTICA		
17/04/2024	Se recibe cotización por parte del proveedor GOODTRADES SAS.; Tiempo de entrega (30) días	Se adjunta cotización
14/05/2024	La teja ya se encuentra disponible en bodegas del proveedor GOODTRADE SAS. Se transportará a la obra la presente semana.	

ANCLAJES TIPO HILTI		
10/04/2024	El proveedor HILTI, cotiza los tornillos para anclaje y estima un plazo de 3 o 4 semanas para su entrega, mientras se hace su importación.	
10/05/2024	El proveedor entrega los anclajes y se envían al taller para su procesamiento	

Atentamente,

HCG CONSTRUCCIONES LTDA.
NIT. 830.081.321 - 7
HUMBERTO CASTRO GARCIA
C.C. No. 19.363.757
Representante Legal

Adjunto:
Plan de contingencia
Reprogramación
Pantallazo (chat proveedor CYRGO)
Cotización Goodtrade (Tejas)
cc. Supervisor Secretaría de Infraestructura Sibaté

Anexo No 2. Plan de contingencia.

PLAN DE CONTINGENCIA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 006 de 2023

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL VEREDA SAN BENITO SECTOR SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA"

SIBATÉ, CUNDINAMARCA

MAYO 2024

1. GENERALIDADES

El presente Plan de contingencia pretende implementar actividades y políticas operativas, con el propósito de completar el Contrato de Obra Pública No. 006 de 2023, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL VEREDA SAN BENITO SECTOR SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA", en los plazos previstos. Esto se hace a partir de una evaluación de las necesidades y de los posibles eventos que pueden interferir en el normal desarrollo de los trabajos. Se señalanparámetros de planificación de recursos humanos y técnicos y se viabilizan actividades extraordinarias para terminar las obras dentro de los plazos establecidos.

Teniendo en cuenta los sucesos imprevistos que han afectado el desarrollo óptimo de la obra, se consignan procedimientos alternativos al orden normal, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de la misma.

La preparación de este plan de contingencia no significa que se reconozcan atrasos o demoras en el avance de la obra, sino que se siguen pautas para superar eventualidades que han surgido y que han incidido en el avance de los trabajos.

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES.

El incidente de hurto ocurrido el tres de marzo del presente año en obra incide negativamente en la ejecución de las actividades del proyecto, especialmente en el suministro e instalación del material especializado para la ejecución de la cubierta y su estructura. La fabricación de los elementos que la componen requiere un tiempo especial para su obtención y puesta en obra. Por esta razón, se hace necesaria la extensión del plazo de ejecución de estas actividades.
La culminación de la cubierta nos entregaría un espacio cerrado, con menos interrupciones y seguro, que permita dar acelerar el curso de la obra y poder culminar en los tiempos solicitados.

Se han adelantado las actividades críticas de la estructura metálica de cubierta que corresponden al armado de correas, corte de tensores y corte de elementos metálicos que soportan la teja. Estos trabajos se han adelantado en taller de ornamentación para no poner en riesgo de seguridad los elementos nuevamente

adquiridos. Una vez armado en su totalidad cada elemento, se transportan a obra para su respectivo armado.

Se debe informar que los espacios de trabajo en obra no son seguros pues los hurtos han ocurrido en repetidas ocasiones. Esta circunstancia podría afectar los horarios de trabajo y los tiempos de entrega del proyecto.

Se deben acelerar los trabajos de tal manera que se optimicen los rendimientos y se compensen las pérdidas de tiempo ocasionadas por los incidentes de seguridad ocurridos en sitio.

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO.

Determinante como factor de riesgo que puede afectar el avance de las obras señalamos el más importante:

- Seguridad en la obras para la ejecución de las actividades propuestas. Esta variable ha perjudicado temporal y financieramente el curso del proyecto.
    - Temporalmente por la indisponibilidad de materiales en el mercado y sus tiempos de fabricación, así como la insuficiencia de equipos especializados para darle continuidad a los trabajos.
    - Financieramente es inviable colocar materiales, equipos y herramientas en sitio sin contar con seguridad adicional que impida obtener más pérdidas a futuro.
- Temporalidad de lluvia y la dificultad para culminar la cubierta. La cubierta es una actividad crítica para la ejecución de las labores al interior del salón comunal. Esta variable determina los tiempos necesarios para la ejecución del proyecto.

4. OBJETIVOS OPERATIVOS.

Dentro de los objetivos del presente Plan de contingencia están los siguientes

- Optimizar las cuadrillas de trabajo para la ejecución de las

actividades faltantes.

- Implementar gestiones que permitan el transporte continuo y seguro de los elementos requeridos para la ejecución del proyecto.
- Facilitar el trabajo armónico de las cuadrillas al interior del salón comunal, una vez se haya culminado con la cubierta y su estructura.


5. CONCLUSIONES

1. Disponer de los materiales y elementos requeridos para el proyecto en un centro de acopio cercano a la obra y a su vez, realizar el transporte correspondiente de los mismos para evitar hurtos y demoras adicionales.
2. Darle celeridad al trabajo de cubierta que, una vez culminado, permite un trabajo intensivo en los trabajos al interior del salón comunal.
3. Segmentar cuadrillas de trabajo especializadas para que cuenten con el mismo espacio de trabajo una vez culminada la cubierta y su estructura.

El presente Plan de contingencia será revisado el funcionario encargado de la supervisión del proyecto.

HCG CONSTRUCCIONES LTDA.
NIT. 830.081.321 - 7
HUMBERTO CASTRO GARCIA
C.C. No. 19.363.757
Representante Legal

Anexo No 3. Estado del clima para el mes de mayo

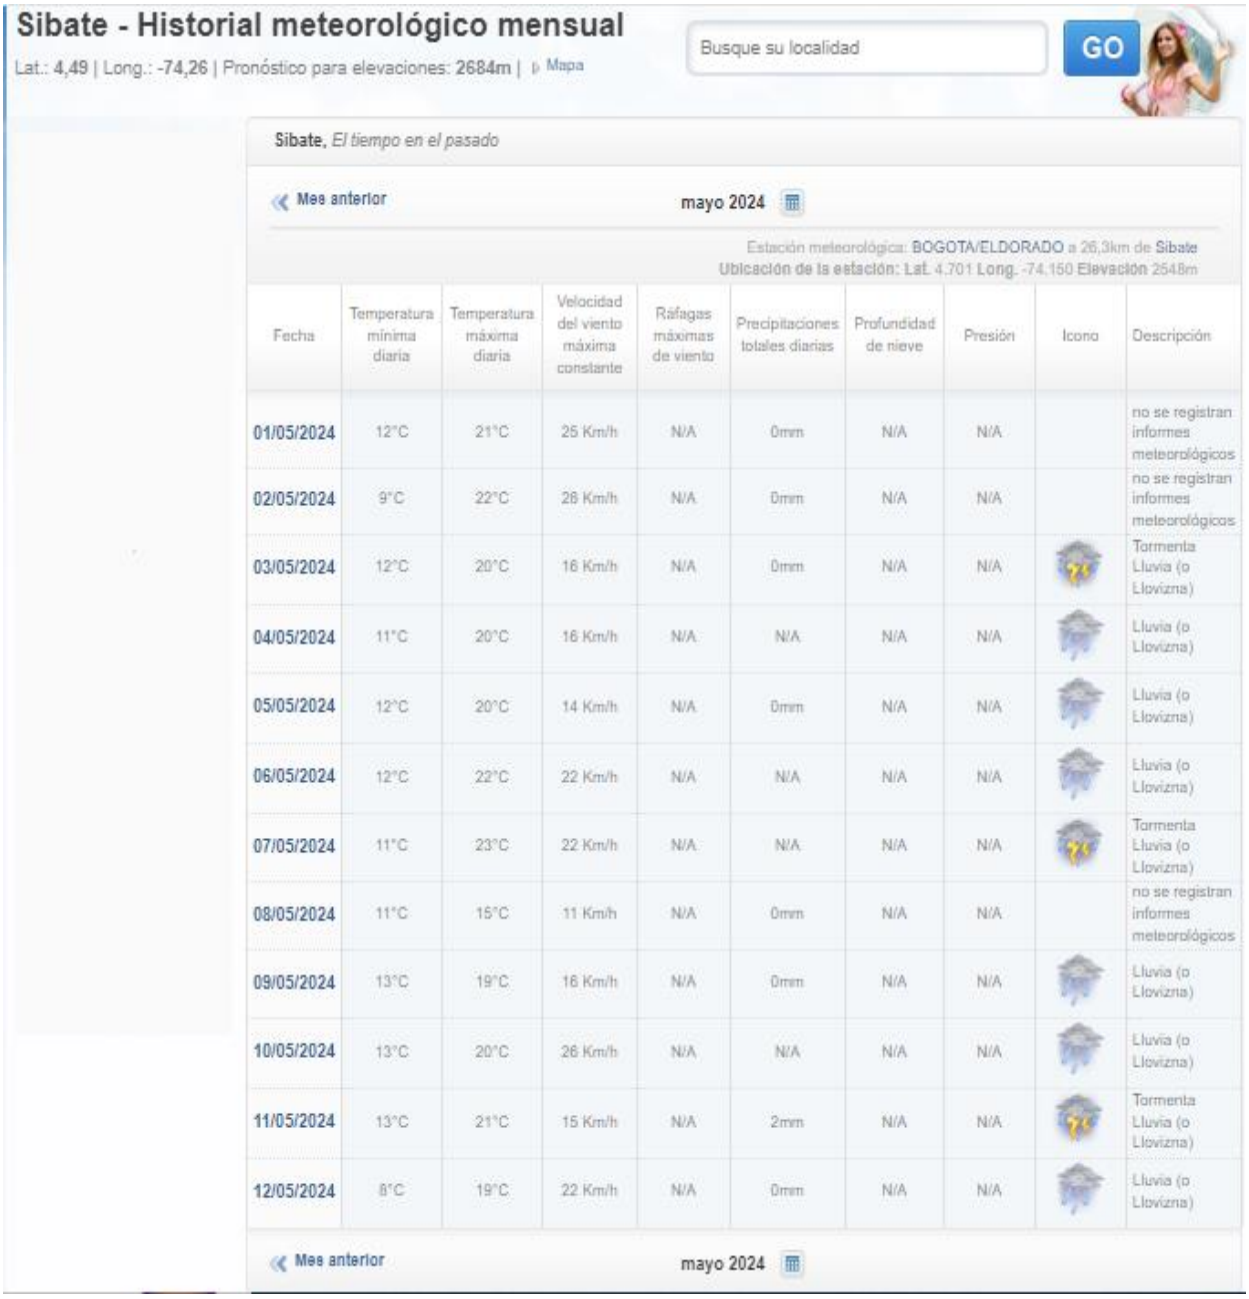

Sibate - Historial meteorológico mensual

Lat.: 4,49 | Long.: -74,26 | Pronóstico para elevaciones: 2684m | Mapa

Busque su localidad GO

Sibate, *El tiempo en el pasado*

« Mes anterior — mayo 2024

Estación meteorológica: BOGOTA/ELDORADO a 26,3km de Sibate
Ubicación de la estación: Lat. 4.701 Long. -74.150 Elevación 2548m

Fecha	Temperatura mínima diaria	Temperatura máxima diaria	Velocidad del viento máxima constante	Ráfagas máximas de viento	Precipitaciones totales diarias	Profundidad de nieve	Presión	Icono	Descripción
01/05/2024	12°C	21°C	25 Km/h	N/A	0mm	N/A	N/A		no se registran informes meteorológicos
02/05/2024	9°C	22°C	28 Km/h	N/A	0mm	N/A	N/A		no se registran informes meteorológicos
03/05/2024	12°C	20°C	16 Km/h	N/A	0mm	N/A	N/A		Tormenta Lluvia (o Llovizna)
04/05/2024	11°C	20°C	16 Km/h	N/A	N/A	N/A	N/A		Lluvia (o Llovizna)
05/05/2024	12°C	20°C	14 Km/h	N/A	0mm	N/A	N/A		Lluvia (o Llovizna)
06/05/2024	12°C	22°C	22 Km/h	N/A	N/A	N/A	N/A		Lluvia (o Llovizna)
07/05/2024	11°C	23°C	22 Km/h	N/A	N/A	N/A	N/A		Tormenta Lluvia (o Llovizna)
08/05/2024	11°C	15°C	11 Km/h	N/A	0mm	N/A	N/A		no se registran informes meteorológicos
09/05/2024	13°C	19°C	16 Km/h	N/A	0mm	N/A	N/A		Lluvia (o Llovizna)
10/05/2024	13°C	20°C	26 Km/h	N/A	N/A	N/A	N/A		Lluvia (o Llovizna)
11/05/2024	13°C	21°C	15 Km/h	N/A	2mm	N/A	N/A		Tormenta Lluvia (o Llovizna)
12/05/2024	8°C	19°C	22 Km/h	N/A	0mm	N/A	N/A		Lluvia (o Llovizna)

« Mes anterior — mayo 2024

Tomado de: https://freemeteo.com.co/eltiempo/sibate/historia/historial-mensual/?gid=3668087&station=22175&month=5&year=2024&language=spanishar&country=colombia

Anexo No 4. Cronograma de obra actualizado.

HCG CONSTRUCCIONES

HCG CONSTRUCCIONES LTDA.
DIRECCIÓN: Carrera 2DA Este. No. 19 – 88 Casa 1.
Chía, Cundinamarca.
CELULAR: 3105583641


PROGRAMA DE TRABAJO

CONTRATO No. 006 DE 2023

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL VEREDA SAN BENITO SECTOR SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ


PLAZO:		285					SEMANAS											
Fecha de Inicio:		2/08/2023					8/04/2024	15/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	6/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	27/05/2024	3/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	24/06/2024
ACTIVIDADES																		
ITEM	DESCRIPCION	V/R TOTAL	% de Incidencia	Fecha de inicio	Duracion (Días)	Fecha de Finalizacion	27	27	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	PRELIMINARES																	
1,2	LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO																	
1.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	$ 3.396.691,41	0,69%	11/08/2023	21	31/08/2023												
1,3	EXPLANACION Y NIVELACION DEL TERRENO																	
1.3.1	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20M	$ 530.097,96	0,11%	7/08/2023	4	10/08/2023												
2	MOVIMIENTO DE TIERRA																	
2,1	EXCAVACIONES																	
2,1,1	EXCAVACIONES VARIAS MANUALMENTE EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	$ 4.000.877,58	0,81%	27/05/2024	12	7/06/2024												
2,1,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONCGLOMERADO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	$ 4.719.465,93	0,96%	20/05/2024	21	9/06/2024												
2,2	RELLENOS																	
2,2,1	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	$ 2.094.480,00	0,42%	27/05/2024	14	9/06/2024												
3	ESTRUCTURAS																	
3,1	CONCRETOS																	
3,1,1	CONCRETO CIMENTACION																	
3,1,1,1	CONCRETO 13,8 MPa, (2000 psi), solado, concreto de limpieza	$ 860.815,35	0,17%	21/08/2023	4	24/08/2023												
3,1,1,2	CONCRETO ZAPATA 24,5 MPa,(3500 psi) No incluye acero de refuerzo	$ 2.994.830,40	0,61%	28/08/2023	7	3/09/2023												
3,1,1,3	CONCRETO VIGA CIMENTACION 24.5 MPa.(3500 PSI)	$ 4.913.640,90	1,00%	27/05/2024	9	4/06/2024												
3,1,1,4	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	$ -	0,00%															
3,1,2	CONCRETO ESTRUCTURA ELEVADA																	
3,1,2,1	CONCRETO COLUMNA 24.5 MPa, (3500 psi)	$ 11.798.352,98	2,39%	11/09/2023	14	24/09/2023												
3,1,2,2	CONCRETO VIGA AEREA 24,5MPa,(3500 PSI)	$ 11.747.936,97	2,38%	13/05/2024	10	22/05/2024												
3,1,2,3	CONCRETO ESCALERA 24,5MPa,(3500 PSI)	$ -	0,00%															
3,2	METÁLICAS																	

3,2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA LIGERA AUTOPORTANTE EN PERFILES CONFORMADOS EN FRIO SEGÚN ASTM A 500	$ 12.207.468,00	2,47%	13/05/2024	14	26/05/2024
3,2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA LIGERA PARA CORREAS EN PERFILES CONFORMADOS EN FRIO SEGÚN ASTM A 500	$ 46.147.920,00	9,35%	13/05/2024	28	9/06/2024
4	**ACERO DE REFUERZO**					
4,1	ACERO REFUERZO FIGURADO 420MPa, (42000 kg/cm2,G60)	$ 50.594.998,71	10,25%	4/09/2023	35	8/10/2023
4,2	MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 X 6 MM	$ 9.493.764,28	1,92%	27/05/2024	13	8/06/2024
5	**MAMPOSTERÍA**					
5,01	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	$ 15.110.630,60	3,06%	28/05/2024	8	4/06/2024
5,1	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	$ 2.949.323,88	0,60%	28/05/2024	8	4/06/2024
6	**PAÑETES**					
6,01	PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=1,5 CM	$ 1.841.738,85	0,37%	27/05/2024	14	9/06/2024
6,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MUROS 1:3, E=2.5 CM	$ 2.433.640,10	0,49%	27/05/2024	14	9/06/2024
7	**CUBIERTA**					
7,01	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	$ 17.835.346,00	3,61%	1/06/2024	14	14/06/2024
7,03	CANAL LAMINA GALV. C. 22 Ld= 0,9 m, Imprimación y anticorrosivo	$ 1.580.116,50	0,32%	28/05/2024	5	1/06/2024
7,04	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	$ 873.700,00	0,18%	31/05/2024	2	1/06/2024
8	**HIDROSANITARIO**					
8,1	**RED HIDRAULICA**					
8,1,1	ACOMETIDA GENERAL Ø3/4"	$ 342.530,00	0,07%	10/12/2023	3	12/12/2023
8,1,2	RED DE DISTRIBUCION Ø1/2" PVC RDE 9	$ 979.445,00	0,20%	28/08/2023	7	3/09/2023
8,1,3	RED DE DISTRIBUCION Ø3/4" PVC RDE 11	$ 292.593,50	0,06%	28/08/2023	7	3/09/2023
8,1,4	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	$ 1.544.400,00	0,31%	18/09/2023	7	24/09/2023
8,1,5	REGISTRO Ø1/2"	$ 439.008,00	0,09%	6/06/2024	8	13/06/2024
8,1,6	REGISTRO Ø3/4 "	$ 91.820,00	0,02%	6/06/2024	8	13/06/2024
8,2	**DESAGUES**					
8,2,1	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	$ 992.541,00	0,20%	18/09/2023	7	24/09/2023
8,2,2	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	$ 812.399,00	0,16%	25/09/2023	7	1/10/2023
8,2,3	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	$ 648.613,00	0,13%	25/09/2023	4	28/09/2023
8,2,4	TUBERÍA PVC SANITARIO Ø 2"	$ 735.563,00	0,15%	11/09/2023	4	14/09/2023

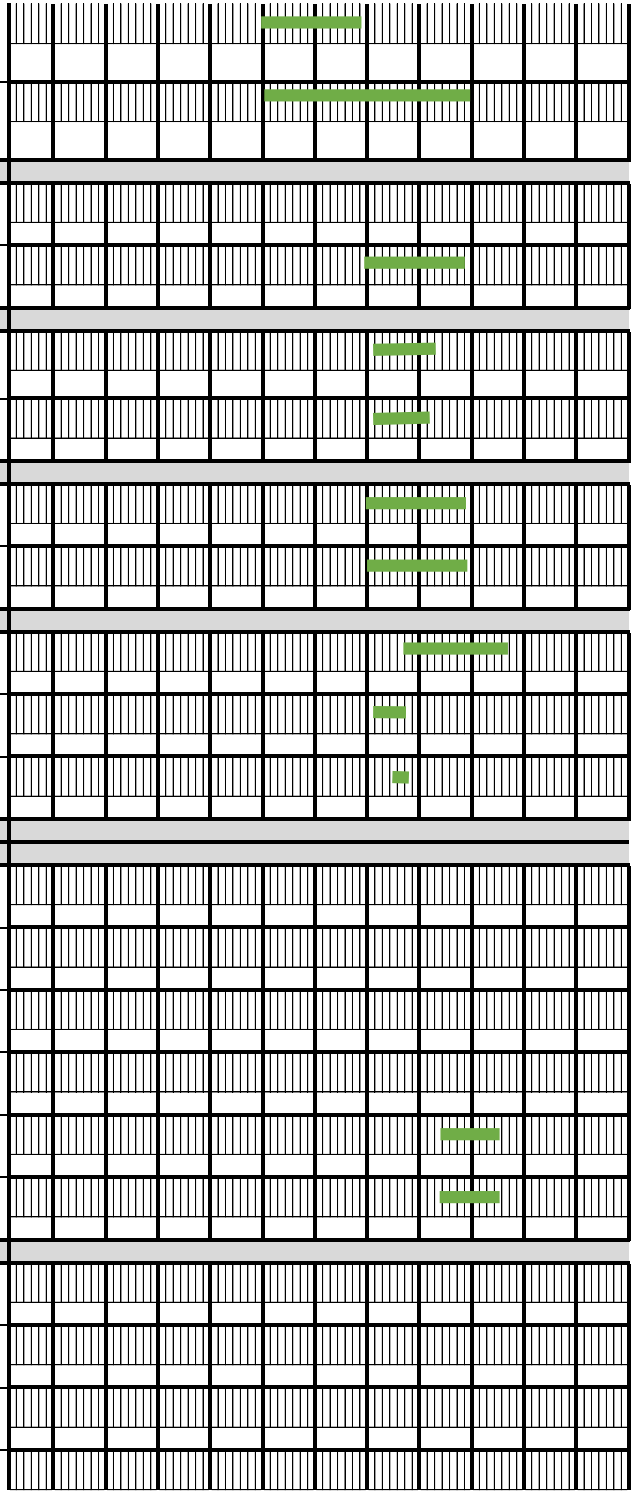

8,2,5	TUBERÍA PVC SANITARIO Ø 4"	$ 710.412,00	0,14%	13/09/2023	4	16/09/2023
8,2,6	RED SANITARIA PVC-S 6"	$ 852.112,00	0,17%	14/09/2023	4	17/09/2023
8,2,10	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	$ 608.234,00	0,12%	7/09/2023	4	10/09/2023
8,2,11	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	$ 385.327,00	0,08%	7/09/2023	4	10/09/2023
8,3	**APARAROS SANITARIOS**					
8,3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	$ 2.524.165,00	0,51%	6/06/2024	7	12/06/2024
8,3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	$ 177.160,00	0,04%	6/06/2024	7	12/06/2024
8,3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	$ 1.340.268,00	0,27%	6/06/2024	7	12/06/2024
8,3,7	LLAVE MANGUERA	$ 46.298,00	0,01%	6/06/2024	7	12/06/2024
8,3,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA REGISTRO 20 X 20 CM	$ 169.911,00	0,03%	6/06/2024	7	12/06/2024
9	**PISOS**					
9,01	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	$ 10.770.133,95	2,18%	3/06/2024	7	9/06/2024
9,02	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	$ -	0,00%			
9,03	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	$ -	0,00%			
9,04	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	$ -	0,00%			
9,05	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	$ 3.332.180,17	0,67%	27/05/2024	13	8/06/2024
9,06	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	$ 1.833.905,64	0,37%	27/05/2024	13	8/06/2024
9,07	RAMPA EN CONCRETO 21 MPa E=0,10 M	$ 1.940.601,04	0,39%	27/05/2024	13	8/06/2024
9,08	SARDINEL PREFABRICADO A-10	$ 6.040.538,25	1,22%	27/05/2024	13	8/06/2024
9,09	BORDILLO PREFABRICADO A-80	$ 1.378.977,60	0,28%	27/05/2024	13	8/06/2024
9,1	LOSETA PREFABRICADA A-40	$ 159.467,47	0,03%	27/05/2024	13	8/06/2024
9,11	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA TACTIL ALERTA GRIS 20X20X6	$ 401.964,00	0,08%	27/05/2024	13	8/06/2024
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
10,1	**SISTEMA DE BAJA TENSIÓN**					
10.1.1	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	$ 159.120,00	0,03%	21/08/2023	4	24/08/2023
10.1.4	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	$ 502.999,00	0,10%	13/05/2024	14	26/05/2024

10.1.5	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	$ 329.327,00	0,07%	2/11/2023	3	4/11/2023
10,2	**CONDUCTOR ELÉCTRICO**					
10.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHN 1F(10AWG)+1N(10AWG)+1T(10AWG)	$ 1.090.080,00	0,22%	23/10/2023	7	29/10/2023
10.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHN 2F(12AWG)+1N(12AWG)+1T(12AWG)	$ 6.452.400,00	1,31%	23/10/2023	7	29/10/2023
10,3	**SISTEMA DE ILUMINACION Y TOMAS**					
10.3.1	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	$ 2.781.080,00	0,56%	15/05/2024	14	28/05/2024
10.3.2	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	$ 1.546.888,00	0,31%	15/05/2024	14	28/05/2024
10.3.3	LÁMPARA LED HEMÉTICA 40W LUZ BLANCA 100-277V4200	$ 2.565.360,00	0,52%	15/05/2024	14	28/05/2024
11	**HORNAMENTACION**					
11,1	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	$ 1.908.500,00	0,39%	19/05/2024	14	1/06/2024
11,2	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	$ 3.649.397,07	0,74%	19/05/2024	14	1/06/2024
11,3	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	$ -	0,00%			
11,4	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	$ 15.812.975,16	3,20%	1/06/2024	7	7/06/2024
12	**PINTURA**					
12,1	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	$ 2.382.572,81	0,48%	26/05/2024	14	8/06/2024
12,2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	$ 878.105,98	0,18%	26/05/2024	14	8/06/2024
12,4	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	$ 935.606,30	0,19%	26/05/2024	14	8/06/2024
12,5	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	$ 922.113,36	0,19%	26/05/2024	14	8/06/2024
13	**VIDRIOS**					
13,1	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	$ -	0,00%			
NP-1	**NP PRELIMINARES**					
NP-1,01	RETIRO Y REINSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES	$ 4.200.000,00	0,85%	8/01/2024	14	21/01/2024
NP-1,02	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	$ 129.985,00	0,03%	8/01/2024	14	21/01/2024
NP-2	**NP EXCAVACIONES Y RELLENOS**					
NP-2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	$ 8.542.870,00	1,73%	13/05/2024	21	2/06/2024
NP-2-02	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVACION COMPACTADO	$ 4.119.738,70	0,83%	8/01/2024	14	21/01/2024
NP-3	**NP ESTRUCTURAS EN CONCRETO**					
NP-3,01	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	$ 2.221.223,50	0,45%	8/01/2024	14	21/01/2024
NP-3,04	PLACA CONTRAPISO E= 0.10 3500 PSI	$ 16.796.440,00	3,40%	8/01/2024	14	21/01/2024

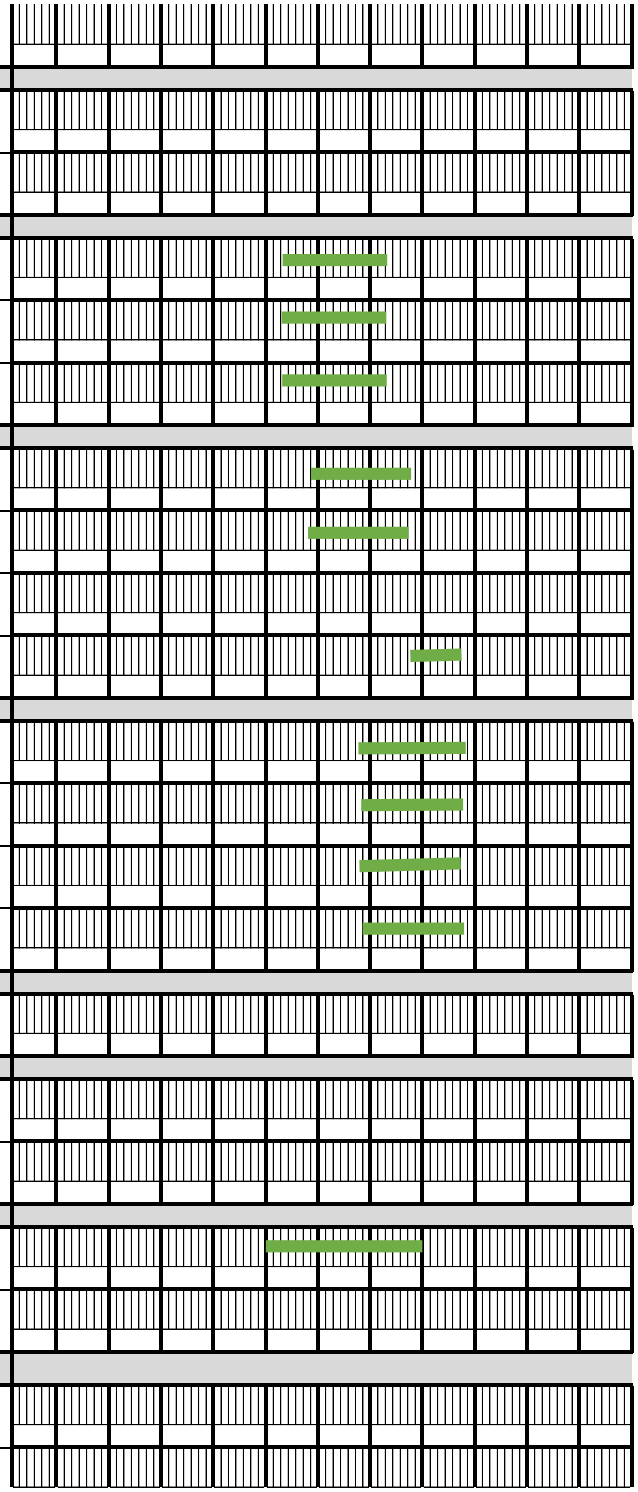

NP-3,07	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=O.1M	$ 7.563.697,21	1,53%	13/05/2024	13	25/05/2024
NP-3,08	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M	$ 1.788.514,00	0,36%	26/05/2024	14	8/06/2024
NP-4	**NP PISOS**					
NP-4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO CORONA O SIMILAR	$ 41.461.678,44	8,40%	24/05/2024	21	13/06/2024
NP-4,04	GUARAESCOBAS EN PORCELANATO CORONA O SIMILAR	$ 5.003.400,00	1,01%	11/06/2024	4	14/06/2024
NP-5	**NP MAMPOSTERÍA**					
NP-5,01	VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI	$ 1.476.000,00	0,30%	8/01/2024	14	21/01/2024
NP-5,02	COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI	$ 1.738.500,00	0,35%	8/01/2024	14	21/01/2024
NP-5,03	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	$ 4.452.242,30	0,90%	8/01/2024	14	21/01/2024
NP-5,04	ANCLAJE 3/8" L=30CM	$ 1.353.064,00	0,27%	8/01/2024	14	21/01/2024
NP-5,05	MESONES EN CONCRETO DE 2500 PSI, E=0,1 M, INCLUYE REFUERZO. ENCHAPADO CON PORCELANATO DISEÑO A ELECCIÓN	$ 2.255.383,20	0,46%	19/05/2024	12	30/05/2024
NP-5,06	ANCLAJE 1/2" L=50CM	$ 1.669.122,00	0,34%	8/01/2024	14	21/01/2024
NP-5,07	FILOS O DILATACIONES S/MURO	$ 56.586,00	0,01%	19/05/2024	12	30/05/2024
NP-6	**NP CUBIERTA**					
NP-6,01	ANCLAJE HILTI HIT Z 1/2"X0,15M	$ 9.703.100,00	1,97%	20/05/2024	14	2/06/2024
NP-7	**NP APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**					
NP-7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD DE 60 CM, CORONA	$ 467.680,00	0,09%	12/06/2024	3	14/06/2024
NP-7,02	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	$ 690.898,95	0,14%	13/06/2024	2	14/06/2024
NP-7,03	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	$ 1.798.020,00	0,36%	13/06/2024	2	14/06/2024
NP-7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	$ 948.916,00	0,19%	6/06/2024	2	7/06/2024
NP-8	**NP CARPINTERÍA METÁLICA**					
NP-8,01	BARANDA METÁLICA	$ 24.593.655,78	4,98%	27/05/2024	13	8/06/2024
NP-8,02	PUERTA PRINCIPAL DOBLE EN LAMINA. INCLUYE CERRADURA	$ 3.000.000,00	0,61%	27/05/2024	13	8/06/2024
NP-8,03	PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO	$ 1.800.000,00	0,36%	27/05/2024	13	8/06/2024
NP-8,04	VENTANERÍA CON MARCO EN ALUMINIO Y VIDRIO 3+3 LAMINADO	$ 23.913.000,00	4,84%	8/01/2024	14	21/01/2024
NP-8,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DOBLE YALE KENT	$ 1.151.927,00	0,23%	6/06/2024	3	8/06/2024
NP-9	**NP CARPINTERÍA MADERA**					
NP-9,01	PUERTAS EN MADERA H = 2,1, B = 0,85	$ 2.490.000,00	0,50%	25/05/2024	12	5/06/2024

NP-9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE POMO	$ 107.316,00	0,02%	4/06/2024	2	5/06/2024
NP-12	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					
NP-12,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE BAJITO 500L. INCLUYE CONEXIÓN A RED EXISTENTE.	$ 1.000.000,00	0,20%	5/06/2024	4	8/06/2024
NP-12-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1"	$ 379.344,00	0,08%	31/05/2024	2	1/06/2024
NP-12-03	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE VENTILACION 2"	$ 113.735,00	0,02%	9/06/2024	2	10/06/2024
NP-12-04	POZO SEPTICO	$ 7.618.784,00	1,54%	26/05/2024	17	11/06/2024
NP-13	**OBRAS EXTERIORES**					
NP13-01	MURO EN LADRILLO RECOCIDO E= 012 Cm	$ 304.465,92	0,06%	8/01/2024	14	21/01/2024
NP13-02	VIGA DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3500 PSI	$ 3.495.476,25	0,71%	8/01/2024	14	21/01/2024
NP-13-03	CAÑUELA DE CONCRETO 2000 psi 0,20x 0.12 m	$ 895.950,00	0,18%	2/06/2024	7	8/06/2024
NP-13-04	IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	$ 1.950.343,20	0,40%	2/06/2024	7	8/06/2024
NP-13-05	LAVADA FACHADA	$ 1.373.218,60	0,28%	31/05/2024	2	1/06/2024
NP-13-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS DE SOBREPONEREN ACERO INOXIDABLE 120 X 60CM (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA)	$ 436.762,00	0,09%	9/06/2024	3	11/06/2024
NP-13-07	DILATACIONES ESTRUCTURA MUROS	$ 1.177.540,00	0,24%	5/06/2024	4	8/06/2024
NP-14	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
NP-14-01	TABLERO 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	$ 667.479,00	0,14%	8/01/2024	14	21/01/2024
NP14-02	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4"	$ 2.656.160,00	0,54%	8/01/2024	14	21/01/2024
NP14-03	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	$ 3.355.399,00	0,68%	2/06/2024	6	7/06/2024
NP-14-04	SALIDA TOMA DOBLE GFCI PVC COMPLETA	$ 626.755,00	0,13%	8/01/2024	14	21/01/2024
NP-14-05	PANEL LED REDONDO 24 W LUZ BLANCA	$ 975.000,00	0,20%	9/06/2024	3	11/06/2024
NP14-06	ILUMINACIÓN EXTERIOR REFLECTOR LED HD CON FOTOCELDA 100 W LUZ FRÍA	$ 1.576.168,00	0,32%	12/06/2024	4	15/06/2024

100,00%

%	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 493.688.466,75

%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Miles de $	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Miles de $	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

HCG CONSTRUCCIONES LTDA.
NIT. 830081321 - 7
HUMBERTO CSATRO GARCIA
INGENIERO CIVIL
Representante Legal

Anexo No 5. Comprobante de la compra de materiales.

goodtrade
www.goodtrade.com.co

GOODTRADE SAS NIT 830.127.591-9

Cotizacion No
LG No. 3348

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 46631 6.90 X 1000

CLIENTE	H C G CONSTRUCCIONES LTDA	
NIT	830081321 7	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 2 E 19 88 CA 1	Chía	8850400

POR CONCEPTO DE
COTIZACIÓN
TIEMPO DE ENTREGA 30 DÌAS

FECHA DOCUMENTO	FECHA DE VIGENCIA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/04/2024	17/04/2024	LUIS EDUARDO GALINDO ALIAN	Contado

Item	Código	Descripción	Medid	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Total	Nota
1	CT-PA-05	TEJA UPVC PERFIL ALTO 2,0MM AZUL 11,80MT	Und.	24,00	19%	420.168	10.084.034	
2	ACT-PA-05	TORNILLO FIJACION CON CAPUCHON AZUL PERFIL ALTO	Und.	720,00	19%	1.008	726.050	
3	STR	SERVICIO DE TRANSPORTE	Und.	1,00	19%	588.235	588.235	

Ejecutivo de ventas
Luis Eduardo Galiindo
Celular 311 2285665
luis.galindo@goodtrade.com.co

DATOS DE PAGO
CTA CTE BANCOLOMBIA N.247-153899-71
CTA CTE BCO BTA 275-274546
CTA AHORROS DAVIVIENDA N.008500701183

SUBTOTAL	**11.398.319**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.165.681**
TOTAL	**13.564.000**

Total líneas o ítems: 3

CONDICIONES COMERCIALES

**Sujeto a disponibilidad de inventario, los precios pueden variar sin previo aviso.
**Sujeto a retenciones en caso de aplicar.
**Por favor abstenerse de realizar pagos a cuentas diferentes a las enunciadas en la cotizacion.

Stéfani Purificadores

Tile

BOCCHERINI PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

Tu mejor opción en tejas, medios purificadores de agua, griferías, calentadores y mucho más



www.goodtrade.com.co
Av Calle 80 N.92-67 Bogota, Cel oficina 302 4591990
aux.contable@goodtrade.com.co-info@goodtrade.com.co

Fecha y Hora de Generación: 17/04/2024 10:39:16

Cra 29 No 7 - 27
Tels 601 7037626 - 601 7044505
3173943740
multihierrossas@gmail.com
Bogota-Colombia

MULTIHIERROS SAS

NIT. 901.621.734 -0
DISTRIBUIDORES DE ACEROS

REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA 46632 TARIFA ICA 11.04 X 1000

Resolucion DIAN No 18764068657088 de 09 de abril de 2024 Autoriza FEM 6001 a la FEM 12000 Vigencia 12 meses

LAMINAS CR-HR-GALVANIZADAS-ALFAJOR PERFILES-CANALES-ANGULOS-VARILLAS TUBERIAS REDONDA CUADRADA RECTANGULAR ESTRUCTURAL VIGAS EN I H SERVICIO DE CORTADORA Y DOBLADORA HASTA 1/2" ENRROLLADORA DE LAMINAS Y PERFILES OXICORTES-FERRETERIA EN GENERAL

Factura Electrónica de Venta No **FEM** **6189**

				FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
CLIENTE	H C G CONSTRUCCIONES LTDA			18/04/2024	18/04/2024
DIRECCIÓN	CR 2 E 19 88 CA 1			**VENDEDOR**	YEYMY ANDREA TRIANA ESC
TELÉFONO	3105583641	**NIT**	830081321 7	**ORDEN DE COMPRA:**	
CIUDAD	Chía	**FORMA DE PAGO**	Contado	**REMISION:**	Remisión No 6943

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANT.	UND.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	PRL 0804	PERLIN 305 X 80 CAL 3MM X 6 MTS	Principal	28	Und.	360.000	10.080.000

TOTAL ITEMS 1 **Cond. De Pago:** 0 **dias** **TOTAL UND** **28**

SUBTOTAL	**10.080.000**
IVA	**1.915.200**
RETEFUENTE	**252.000**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL	**11.743.200**

Son: ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

DESPUES DE 3 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE FACTURA NI DEVOLUCIONES DE MERCANCIA NO HACEMOS DEVOLUCION DE DINERO

PAGOS: Si paga con cheque hágalo a nombre de MULTIHIERROS SAS y coloque sello restrictivo de pago al primer beneficiario o favor consignar en las siguientes cuentas CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N 69000004723 CUENTA DE AHORROS: BANCO CAJA SOCIAL 24116388524

Certifico que la informacion en esta solicitud es veridica y Autorizo de manera expresa e Irrevocable a MULTIHIERROS SAS NIT 901621734 o a quien represente sus derechos u ostenten en el futuro a cualquier titulo la calidad de acreedor a consultar, solicitar, suministrar, reportar, precisar, divulgar y mantener actualizada toda la informacion que se refiera a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial a cualquier base de datos y/o a las centrales de informacion financiera y/o de riesgo o a quien represente sus derechos

Las mercancias viajarán por cuenta y riesgo del comprador y como comprador Declaro haber recibido real y materialmente a satisfacción las mercancias descritas en esta factura.

A partir del vencimiento de esta factura se cobrará intereses de mora a la tasa máxima permitida

Fecha y Hora de Generación: 18/04/2024 14:28:17

Medios de Pago: Tarjeta Débito

Recibido Por_____ **Firma Responsable**_____

18/04/2024 14:28:17

CUFE: d20c994bc5c6e91a0a5c9384f4d7c17fe902a3ded98ea4354d6d51da68a207317c8a2b808b1238b838724c6693ad13e8--Expedición:18/04/2024 02:43 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Hilti Colombia S.A.S.
NIT. 900.456.739-6|CALLE 99 10-57|Tel Bog.: +57 15190759| TEL: 018000942142|E-mail: facturacion.co@hilti.com
RESPONSABLES DE IVA-Somos AUTORRETENEDORES según resolución 5567 del 19 de Julio 2012 Código CIIU 4659
"Grandes Contribuyentes ICA en BOGOTA (Res DDI-023769) Nov 2021"

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FHBO9300

Número de cliente: 10104934

Datos del Cliente
HCG CONSTRUCCIONES LTDA
CR 2E 19 88 CA1
000000 CHIA COLOMBIA

NIT: 830.081.321-7
Ciudad de Expedición: Bogotá D.C.
Fecha de Expedición: 18/04/2024 13:50:43
Fecha de Vencimiento: 18/04/2024
Orden de compra: COT232038

Radicación Factura
HCG CONSTRUCCIONES LTDA
10104934
CR 2E 19 88 CA1
25175 - CHIA

Dir. Entrega Mercancía
HCG CONSTRUCCIONES LTDA
CR 2E 19 88 CA1 25175 - CHIA
250001 CO

Línea	Codigo	Descripción	Cant	U/M	Valor unitario	%IVA	Valor IVA	Subtotal
10	418076	**Anclaje tornillo KH-EZ 1/2"x5"**	3.00	paquete	530,730.00 COP	19.00%	302,516.10 COP	1,592,190.00 COP

Total Nro Líneas: 1

(=) Valor Total Neto de Posición		1,592,190.00 COP
(+) IVA	19.00%	302,516.10
(=) Total		**1,894,706.10 COP**
RETEIVA		0.00 COP
RETEICA		0.00 COP
RETEFUENTE		0.00 COP
Total a Pagar		**1,894,706.10 COP**

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS M C/TE

Condiciones de pago: A pagar de inmediato sin deducción

Modalidad de pago:

OBSERVACIONES:

CONDICIONES:NO SE ACEPTARÁN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA PARA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: VENDIDOS EN PROMOCIÓN (DEMO PRECIO ESPECIAL) CADUCABLE O QUE REQUIERA CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAJE (CARTUCHO DX ANCLAJE QUÍMICO PRODUCTO CORTAFUEGO DISCOS CON VENCIMIENTO) IMPORTADOS BAJO PEDIDO FUERA DE UNIDAD DE EMPAQUE Y QUE PRESENTEN DAÑO EN EL PRODUCTO O EMBALAJE.SE ACEPTARÁN SOLICITUDES DE CAMBIO DE MERCANCÍA O DEVOLUCIÓN DURANTE LOS SIGUIENTES 30 DÍAS CALENDARIO (PLAZO MÁXIMO) A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO ESTA SOLICITUD DEBE SER REALIZADA POR EL CLIENTE AL CORREO SERVICIOCLIENTE.CO@HILTI.COM O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS TIENDAS. ES INDISPENSABLE QUE EL CLIENTE SUMINISTRE O EL NUMERO PEDIDO FACTURA U ORDEN DE COMPRA.ESTA SOLICITUD NO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DEL CAMBIO O DEVOLUCIÓN POR PARTE DE HILTI COLOMBIA S.A.S. LOS FLETES DE ENVÍO A LA BODEGA DE HILTI COLOMBIA S.A.S. CORRERÁN POR PARTE DEL CLIENTE. LA RECEPCION DE ESTA FACTURA IMPLICA NECESARIAMENTE LA ACEPTACION DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DE HILTI COLOMBIA SAS QUE PUEDEN SER CONSULTADOS EN NUESTRA PAGINA URL AL FINAL DEL TEXTO. LOS TERMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES O DIFERENTES PROPUESTOS O ENVIADOS POR EL CLIENTE NO SERAN OPONIBLES A HILTI Y SE ENTENDERAN OBJETADOS Y/O RECHAZADOS POR HILTI. URL: https://www.hilti.com.co/content/hilti/W2/CO/es/various/footer-links/condiciones-generales-de-venta.html

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008. CODIGO ICA BOGOTA 4659 TARIFA 11.04 X 1000

SOPORTE DE ENTREGA DE MERCANCÍA:

Autorización Numeración de Facturación No. 18764065231880 del 2024-02-08 Autoriza del No. FHBO8954 al FHBO50000 Válido hasta 2026-02-08

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 481025b19e7ea85777a2f167e47a4e2efb0e4115232914c545d8634f574e118df55a8a88097b8d349f5c07bf90cc62f5
Fecha Validación DIAN: 2024-04-18 16:23:18-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Tipo de operación: Estándar - 10
