GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
INGENIERO CIVIL
M.P. 1920216414 CAUCA.

Ricaurte, 22 de Marzo de 2024

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
Atn. Ing. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (C)
Ricaurte

Referencia: Contrato de obra No.437-2023.

Asunto: Acta Final

Cordial saludo,

Por medio de la presente remito a la Supervisión del Municipio el Acta Final del Contrato de Obra de la referencia que va desde el 12 de Marzo del 2024 hasta el 22 de marzo del 2024, para su análisis, revisión y aprobación.

Teniendo en cuenta lo anterior, adjunto la siguiente documentación:

Anexo:

- Informe Final
- Bitácora
- Planillas de Seguridad
- Acta Final
- Memorias de Cantidades

Atentamente,

Ing. GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
C.C. 13.008.155 de Ipiales
Contratista de obra

Cra 7 # 8 75 condominio barlovento Ricaurte Cel. 301 5342669
Email. germanalcabrera@gmail.com

GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
INGENIERO CIVIL
M.P. 1920216414 CAUCA.

INFORME FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 437-2023

OBJETO "OBRAS PARA LA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TOGORAMA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA"







PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE MARZO AL 22 DE MARZO DEL 2024

RICAURTE-CUNDINAMARCA

Cra 7 # 8 75 condominio barlovento Ricaurte Cel. 301 5342669
Email. germanalcabrera@gmail.com

GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
INGENIERO CIVIL
M.P. 1920216414 CAUCA

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETO 3
3. ALCANCE CONTRACTUAL 3
4. LOCALIZACIÓN 4
5. ALCANCE DEL PROYECTO 4
6. CONTRATO DE OBRA NO. 437-2023 7
7. POLIZAS DE GARANTIA DEL CONTRATO DE OBRA NO.430-2023 8
7.1 POLIZAS DE CUMPLIMIENTO 8
7.2 POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 9
8 ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 437-2023 10
8.1 avance DE OBRA 10
9 BALANCE FINANCIERO 11
10 ACTAS DEL CONTRATO 12
11 INFORME TÉCNICO 12
11.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS 12
12 REGISTRO FOTOGRAFICO 14
13 PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA 16
13.1 PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA 16
13.2 PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA 16
14 ESTADO DE TIEMPO 16
15 CONCLUSIONES 17
16 ANEXOS 17

Cra 7 # 8 75 condominio barlovento Ricaurte Cel. 301 5342669
Email. germanalcabrera@gmail.com

GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
INGENIERO CIVIL
M.P. 1920216414 CAUCA

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe es realizado por el INGENIERO CABRERA, en calidad de Contratista del Contrato de Obra No. 437-2023, cuyo objeto es "OBRAS PARA LA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TOGORAMA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA". Este informe busca ilustrar a la entidad contratante sobre el manejo del recurso económico dispuesto para el Proyecto a través de los avances de obra ejecutados y demás obligaciones estipuladas en el contrato.

2. OBJETO

Mantener informado al Municipio de Ricaurte, sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentando evidencias de su ejecución con registros escritos y fotográficos, previamente avalados por la supervisión del proyecto.

3. ALCANCE CONTRACTUAL

La construcción del parque biosaludable en la urbanización Togorama la cual es una obra de gran importancia para la comunidad por la falta de espacios de recreación y deporte.

El proyecto contempla las obras de cimentación en cumplimiento de la normativa vigente y la instalación de 18 máquinas que compone el parque biosaludable, creando un gimnasio al aire libre, mejorar la salud de las personas adultas, mediante la práctica del deporte al aire libre, utilizando elementos biosaludables o de gerontogimnasia que están diseñados para zonas concretas de la musculatura corporal.

Además de mejores condiciones cotidianas a la población, que necesitan de estas áreas para el aprovechamiento del tiempo libre, lo cual redunda en la calidad de la población en general, a través de las "OBRAS PARA LA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TOGORAMA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA".

Cra 7 # 8 75 condominio barlovento Ricaurte Cel. 301 5342669
Email. germanalcabrera@gmail.com

GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
INGENIERO CIVIL
M.P. 1920216414 CAUCA

4. LOCALIZACIÓN

Ricaurte es un Municipio Colombiano del Departamento de Cundinamarca ubicado en la Provincia del Alto Magdalena, Ricaurte se encuentra en las orillas del rio Magdalena, en la desembocadura de los ríos Bogotá y Sumapaz. El municipio de Ricaurte está conurbado con los municipios de Girardot (Cundinamarca) y Flandes (Tolima). Por lo anterior, el presente proyecto se encuentra ubicado en la urbanización Togorama, cerca de la vía principal Girardot- Melgar.

5. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto de acuerdo a lo contratado para la ejecución de las obras del Contrato de Obra No. 437-2023 "OBRAS PARA LA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TOGORAMA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA". Definida así en sus respectivos ítems, según condiciones Contractuales:

PRESUPUESTO OFICIAL						
ITEM	**ITEM ICCU**	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
A	**TOGORAMA**					
A.1	**CIMIENTOS**					
A.1,1	CONST. 16.8	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	30.00	$ 61,761.00	$ 1,852,830.00
A.1,2	CONST. 16.8	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) ESPESOR=20CM	M3	38.00	$ 125,684.00	$ 4,775,992.00
A.1,3	CONST. 13.14	PLACA BASE CONCRETO E=0.10 3000 PSI	M2	98.00	$ 72,224.00	$ 7,077,952.00
A.1,4	CONST. 4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 4,5MM (15X15)	KG	131.00	$ 11,708.00	$ 1,533,748.00
A.1,5	URB 5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN	ML	149.00	$ 24,666.00	$ 3,675,234.00

GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
INGENIERO CIVIL
M.P. 1920216414 CAUCA.

		CONCRETO DE 2500 PSI				
A.1,6	CONST. 4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	4807.00	$ 7,246.00	$ 34,831,522.00
A.1,7	CONST. 18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	38.00	$ 17,898.00	$ 680,124.00
SUB-TOTAL (A.1)						**$ 52,574,572.00**
A.2	**MAQUINAS BIOSALUDABLES**					
A.2,1	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA GIRO DE CADERA TWISTER O DE CINTURA (DOBLE)	UND	1.00	$ 5,256,009.00	$ 5,256,009.00
A.2,2	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA PRESA DE BRAZO PECHO (DOBLE)	UND	1.00	$ 6,934,075.00	$ 6,934,075.00
A.2,3	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA REMO (DOBLE)	UND	1.00	$ 6,347,505.00	$ 6,347,505.00
A.2,4	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA ELIPTICA O SKY (DOBLE)	UND	1.00	$ 6,148,507.00	$ 6,148,507.00
A.2,5	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA BICICLETA RECLINADA RECUMBENT (DOBLE)	UND	1.00	$ 6,039,741.00	$ 6,039,741.00
A.2,6	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA ESPALDA BRAZOS ALTOS (DOBLE)	UND	1.00	$ 6,444,341.00	$ 6,444,341.00
A.2,7	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA	UND	1.00	$ 5,316,979.00	$ 5,316,979.00

Cra 7 # 8 75 condominio barlovento Ricaurte Cel. 301 5342669
Email. germanalcabrera@gmail.com

GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
INGENIERO CIVIL
M.P. 1920216414 CAUCA.

		CAMINADORA AEREA (DOBLE)				
A.2,8	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA DOBLE TABLA DE ABDOMINALES (DOBLE)	UND	1.00	$ 5,719,486.00	$ 5,719,486.00
A.2,9	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA LATERAL DE CINTURA (DOBLE)	UND	1.00	$ 5,866,258.00	$ 5,866,258.00
A.2,10	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO O MAQUINA PIERNA PRENSA HORIZONTAL (DOBLE)	UND	1.00	$ 5,804,355.00	$ 5,804,355.00
A.2,11	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO O MAQUINA PONY (DOBLE)	UND	1.00	$ 5,301,299.00	$ 5,301,299.00
A.2,12	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO O MAQUINA BICICLETA ESTATICA (DOBLE)	UND	1.00	$ 6,271,394.00	$ 6,271,394.00
A.2,13	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO O MAQUINA PRENSA DE PIERNA DECLINADA (DOBLE)	UND	1.00	$ 6,747,464.00	$ 6,747,464.00
A.2,14	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO O MAQUINA ESCALADOR (DOBLE)	UND	1.00	$ 5,249,387.00	$ 5,249,387.00
A.2,15	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO O MAQUINA AROS DE COORDINACION GRANDE (DOBLE)	UND	1.00	$ 5,234,169.00	$ 5,234,169.00

Cra 7 # 8 75 condominio barlovento Ricaurte Cel. 301 5342669
Email. germanalcabrera@gmail.com

GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
INGENIERO CIVIL
M.P. 1920216414 CAUCA.

A.2,16	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO O MAQUINA AROS DE COORDINACION VOLANTES (DOBLE)	UND	1.00	$ 4,536,257.00	$ 4,536,257.00
A.2,17	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO O MAQUINA MULTIFUNCIONAL COORDINACIÓN PARA DISCAPACIDAD REDUCIDA (DOBLE)	UND	1.00	$ 4,763,368.00	$ 4,763,368.00
A.2,18	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO O MAQUINA PRENSA DE BRAZO PARA DISCAPACITADOS (DOBLE)	UND	1.00	$ 6,028,962.00	$ 6,028,962.00
					SUB-TOTAL (A.2)	**$ 104,009,556.00**
					SUBTOTAL (A)	**$ 156,584,128.00**
					TOTAL COSTOS DIRECTOS (A)	**$ 156,584,128.00**
					ADMINISTRACIÓN **24%**	**$ 37,580,190.72**
					IMPREVISTOS **1%**	**$ 1,565,841.28**
					UTILIDAD **5%**	**$ 7,829,206.40**
					VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS (B)	**$ 46,975,238.40**
					VALOR PARCIAL PRESUPUESTO C=(A+B)	**$ 203,559,366.40**
					AJUSTE AL PESO (D)	**$ 0.60**
					VALOR TOTAL PRESUPUESTO E=(C+D)	**$ 203,559,367.00**

6. CONTRATO DE OBRA NO. 437-2023

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y FECHA:	N° 437-2023 DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023
No. PROCESO EN SECOP II:	CO1.PCCNTR.5602664
SECRETARÍA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO CABRERA NATES C.C. N° 13.008.155 DE IPIALES- NARIÑO

GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
INGENIERO CIVIL
M.P. 1920216414 CAUCA.

OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TOGORAMA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS **($203.559.367,00)** M/CTE.
PLAZO:	DOS (02) MESES
FECHA DE ACTA DE LEGALIZACIÓN:	15 DE ENERO DE 2024
FECHA DE INICIO:	23 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE MARZO DE 2024

7. POLIZAS DE GARANTIA DEL CONTRATO DE OBRA NO.437-2023

7.1 POLIZAS DE CUMPLIMIENTO

- Póliza de Cumplimiento No. 25-44-101187590 Según Legalización del Contrato, Compañía Seguros del Estado S.A
  Fecha de Expedición: 28/12/2023
  Anexo 1

GARANTÍA No.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
25-44-101187590 Anexo 1	Cumplimiento del contrato	$ 20.355.936,70	01/12/2023	01/07/2024
25-44-101187590 Anexo 1	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 10.177.968,35	01/12/2023	01/06/2027
25-44-101187590 Anexo 1	Estabilidad y calidad de la obra	$ 40.711.873,40	Si ampara 5 años, 0 meses y 1 días *	

GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
INGENIERO CIVIL
M.P. 1920216414 CAUCA.

- Póliza de Cumplimiento No. 25-44-101187590 Según Acta de Inicio del Contrato, Compañía Seguros del Estado S.A

  Fecha de Expedición: 05/02/2024

  Anexo 3

GARANTÍA No.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
25-44-101187590 Anexo 3	Cumplimiento del contrato	$ 20.355.936,70	23/01/2024	23/08/2024
25-44-101187590 Anexo 3	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 10.177.968,35	23/01/2024	24/07/2027
25-44-101187590 Anexo 3	Estabilidad y calidad de la obra	$ 40.711.873,40	Si ampara 5 años, 0 meses y 1 días *	

7.2 POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

- Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 25-40-101049812 Según Legalización del Contrato. Compañía Seguros del Estado S.A

  Fecha de Expedición: 01/12/2023

  Anexo 0

GARANTÍA No.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
25-40-101049812 Anexo 0	Predios labores y operaciones	$ 232.000.000	01/12/2023	01/02/2024

- Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 25-40-101049812 Según Acta de Inicio del Contrato, Compañía Seguros del Estado S.A

  Fecha de Expedición: 05/02/2024

  Anexo 3

GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
INGENIERO CIVIL
M.P. 1920216414 CAUCA.


GARANTÍA No.	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
25-40-101049812 Anexo 3	Predios labores y operaciones	$ 260.000.000	23/01/2024	25/03/2024

8 ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 437-2023

8.1 AVANCE DE OBRA

El contrato de obra tiene como fecha de inicio el 23 de enero de 2024 y a la fecha del presente informe el cual corresponde del 12 de marzo al 22 de marzo del 2024 ha transcurrido once (11) días de ejecución de actividades. Por lo tanto, a la fecha se lleva el siguiente porcentaje de ejecución:


AVANCE DE OBRA (%)	
Plazo inicial del Contrato	2 Meses (60 Días)
Plazo Acumulado transcurrido	60 (Días)
Porcentaje Programado	100 %
Porcentaje Avance	100%

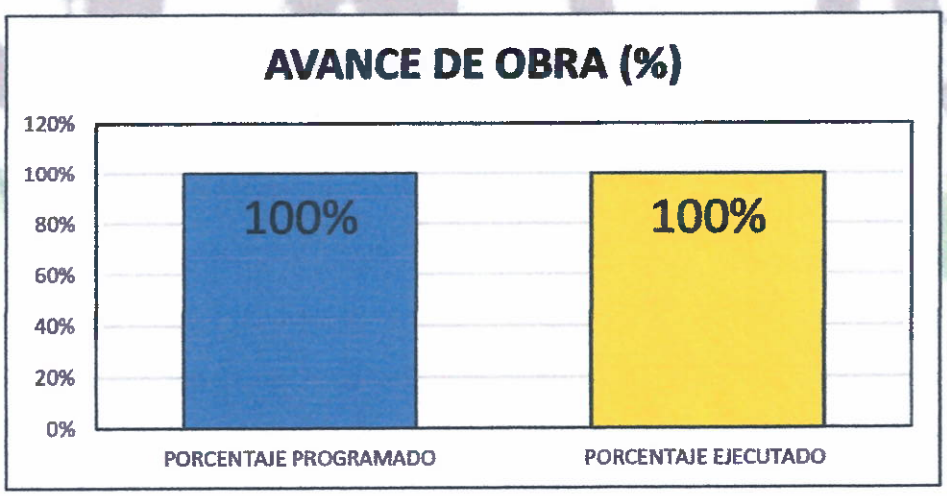

AVANCE DE OBRA (FINANCIERO)	
Valor Inicial del Contrato	$ 203.559.367,00
Valor del Contrato Según Modificatorio No. 01	$ 163.446.557,00
Menor valor contractual según modificatorio No. 01	$ -42.521.489,00
Mas valor no sumado en contrato inicial (item A.1,1)	$ 2.408.679,00
Saldo a favor del municipio	$ 40.112.810,00
Valor Programado al 22 de Marzo del 2024	$ 163.446.557,00
Valor Ejecutado (Informe No. 01)	$ 143.824.514,00

GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
INGENIERO CIVIL
M.P. 1920216414 CAUCA

Valor Ejecutado (Informe Final)	$ 19.622.043,00
Porcentaje Ejecutado	100 %

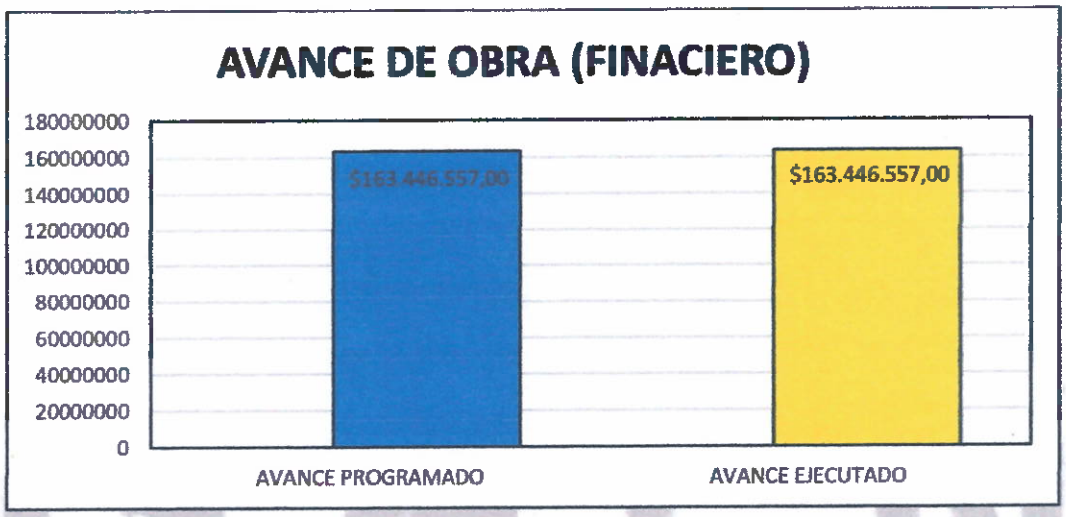

9 BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA		
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor Inicial del Contrato	$ 203.559.367,00
2	Valor del Contrato Según Modificatorio No.01	$ 163.446.557,00
3	Menor valor contractual según modificatorio No. 01	$ -42.521.489,00
4	Mas valor no sumado en contrato inicial (item A.1,1)	$ 2.408.679,00
5	Saldo a favor del municipio (3 - 4)	$ 40.112.810,00
6	Valor ejecutado según Informe 1.	$ 143.824.514,00
7	Valor ejecutado según Informe Final	$ 19.622.043,00
8	Valor total ejecutado (6+7)	$ 163.446.557,00

El saldo a favor del municipio se debe a lo expuesto a continuación:

- Se aclara que por error involuntario de digitación al momento de realizar el presupuesto oficial no se sumó el ítem A.1,1 en el contrato inicial.
- La cantidad del item A.1,7 corresponde al área del item A.1,3 más el área del bordillo item A.1,5
- El item A.1,6 fue objeto de revisión en el cálculo del acero presentando una reducción significativa de la cantidad.

Cra 7 # 8 75 condominio barlovento Ricaurte Cel. 301 5342669
Email. germanalcabrera@gmail.com

GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
INGENIERO CIVIL
M.P. 1920216414 CAUCA.

10 ACTAS DEL CONTRATO

Las actas suscritas hasta la fecha de este informe son las siguientes:

1. Acta de Inicio del 23 de enero del 2024.
2. Acta de Terminación del 22 de marzo del 2024

11 INFORME TÉCNICO

11.1 AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM		DESCRIPCION	UND	CANT	V/ TOTAL	AVANCE %
No.	ICCU	CIMIENTOS				
1.1	CONST. 16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.00	$ -	100%
1.2	16.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) ESPESOR=20 CM	M3	0.00	$ -	0%
1.3	CONST 13.14	PLACA BASE CONCRETO E=0.10 3000 PSI	M2	0.00	$ -	100%
1.4	CONST 4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 4,5MM (15X15)	KG	0.00	$ -	100%
1.5	URB 5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	0.00	$ -	100%
1.6	CONST 4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	$ -	100%
1.7	CONST 18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	102.16	$ 1,828,459.68	100%
No.	ICCU	MÁQUINAS BIOSALUDABLE				
2.1	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA GIRO DE CADERA TWISTER O DE CINTURA (DOBLE)	UND	0.00	$ -	100%
2.2	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA	UND	0.00	$ -	100%

GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
INGENIERO CIVIL
M.P. 1920216414 CAUCA.

		PRESA DE BRAZO PECHO (DOBLE)				
2.3	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA REMO (DOBLE)	UND	0.00	$ -	100%
2.4	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA ELIPTICA O SKY (DOBLE)	UND	0.00	$ -	100%
2.5	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA BICICLETA RECLINADA RECUMBENT (DOBLE)	UND	0.00	$ -	100%
2.6	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA ESPALDA BRAZOS ALTOS (DOBLE)	UND	0.00	$ -	100%
2.7	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA CAMINADORA AEREA (DOBLE)	UND	0.00	$ -	100%
2.8	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA DOBLE TABLA DE ABDOMINALES (DOBLE)	UND	0.00	$ -	100%
2.9	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA LATERAL DE CINTURA (DOBLE)	UND	0.00	$ -	100%
2.1	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA PIERNA PRENSA HORIZONTAL (DOBLE)	UND	0.00	$ -	100%
2.11	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA PONY (DOBLE)	UND	0.00	$ -	100%
2.12	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA BICICLETA ESTATICA (DOBLE)	UND	0.00	$ -	100%
2.13	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA PRENSA DE PIERNA DECLINADA (DOBLE)	UND	0.00	$ -	100%
2.14	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA ESCALADOR (DOBLE)	UND	0.00	$ -	100%

Cra 7 # 8 75 condominio barlovento Ricaurte Cel. 301 5342669
Email. germanalcabrera@gmail.com

GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
INGENIERO CIVIL
M.P. 1920216414 CAUCA.

2.15	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA AROS DE COORDINACION GRANDE (DOBLE)	UND	0.00	$ -	100%
2.16	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA AROS DE COORDINACION VOLANTES (DOBLE)	UND	0.00	$ -	100%
2.17	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA MULTIFUNCIONAL COORDINACIÓN PARA DISCAPACIDAD REDUCIDA (DOBLE)	UND	1.00	$ 4.763.368,00	100%
2.18	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA PRENSA DE BRAZO PARA DISCAPACITADOS (DOBLE)	UND	1.00	$ 6.028.962,00	100%
No.	**ICCU**	**ITEMS NO PREVISTOS**				
NP-1	16,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0	$ -	100%
NP-2	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA	M3	19.78	$ 2.466.467,00	100%

12 REGISTRO FOTOGRAFICO

- **PINTURA EPÓXICA**





Cra 7 # 8 75 condominio barlovento Ricaurte Cel. 301 5342669
Email. germanalcabrera@gmail.com

GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
INGENIERO CIVIL
M.P. 1920216414 CAUCA

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA**





- **SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA MULTIFUNCIONAL COORDINACIÓN PARA DISCAPACIDAD REDUCIDA (DOBLE)**



Cra 7 # 8 75 condominio barlovento Ricaurte Cel. 301 5342669
Email. germanalcabrera@gmail.com

GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
INGENIERO CIVIL
M.P. 1920216414 CAUCA.

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA PRENSA DE BRAZO PARA DISCAPACITADOS (DOBLE)**



13 PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA

13.1 PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA

No.	NOMBRE	CARGO
1	Juan Jose Charry Samper	Director de Obra
2	Ana Isabel Castro Vargas	Residente de Obra

13.2 PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA

No.	NOMBRE	CARGO
1	Christian Cárdenas	Maestro de Obra
2	Víctor González	Ayudante

14 ESTADO DE TIEMPO

En este periodo de la obra se ha caracterizado por días soleados en el desarrollo del contrato desde el 12 de marzo al 22 de marzo del 2024 donde permitieron el desarrollo de las actividades programadas.

Cra 7 # 8 75 condominio barlovento Ricaurte Cel. 301 5342669
Email. germanalcabrera@gmail.com

GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
INGENIERO CIVIL
M.P. 1920216414 CAUCA.

15 CONCLUSIONES

- A la fecha del presente informe se presenta un porcentaje programado del 100.00 % vs un porcentaje ejecutado del 100.00%, dando cumplimiento al objetivo del contrato.

- Durante el periodo se ejecutaron las siguientes actividades en el capítulo de cimentación de pintura epóxica y suministro e instalación de tierra. Por otra parte, las actividades desarrolladas en el capítulo de máquinas biosaludables se instalaron las siguiente: Modulo o modulo o maquina multifuncional coordinación para discapacidad reducida (doble) y modulo o maquina prensa de brazo para discapacitados (doble)

16 ANEXOS

- Copia de bitácora de Obra
- Soporte de pago de planillas de seguridad social

GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
C.C. 13.008.155 DE IPIALES
M.P. 1920216414 CAUCA
CONTRATISTA

Cra 7 # 8 75 condominio barlovento Ricaurte Cel. 301 5342669
Email. germanalcabrera@gmail.com

VALLA INFORMATIVA DE OBRA







Bitacora de obra

Contrato de obra N° 437-2023

Contratista: German A Cabrera

Supervisor: Ing Hector Daniel Morales Devia
Secretario de infraestructura y obras publicas.

8- Marzo- 2024
Dia soleado
Se realiza la instalacion de tres maquinas en la zona 3
- Prensa de brazo pecho
- Eliptica o sky
- Caminadora aerea

9 - Marzo-2024
Dia soleado
se realiza la instalacion de dos maquinas en la zona 3.
- Pony
- Prensa de pierna declinado.

11 - Marzo-2024
Dia soleado
Cantidad de trabajadores en obra = 1
se inicia la actividad de pintura epoxica en las placas de la zona 1

12 - Marzo - 2024
Dia soleado
Cantidad de trabajadores en obra = 1
se continua la actividad de pintura epoxica en las placas de la zona 2.

13- Marzo - 2024
Dia soleado
Cantidad de trabajadores en obra = 1
se continua con la actividad de pintura epoxica en las placas de la zona 3.

14- Marzo - 2024
Dia soleado
Cantidad de trabajadores en obra = 2
se realiza la instalacion de la maquina multifuncional coordinacion para discacidad reducida en la zona 2.

15- Marzo - 2024
Dia soleado
cantidad de trabajadores en obra = 2
se realiza la instalacion de maquina prensa de brazo para discapacitados en la zona 3.

16- Marzo - 2024
Dia soleado
Cantidad de trabajadores en obra = 1
se realiza ajustes a todas las maquinas biosaludables instaladas.

18- Marzo-2024

Dia Soleado

Cantidad de trabajadores en obra = 1

se realiza la actividad de pintura epoxica en la dos maquinas que se instalaron los dias 14 y 15 de Marzo

19- Marzo- 2024

Dia Soleado

cantidad de trabajadores en obra = 1

se realiza el descargue de tierra negra y se procede al estendido de la misma en la zona 3.

20- Marzo - 2024

Dia Soleado

cantidad de trabajadores en obra = 1

se continua con el estendido de tierra negra en la zona 1 y zona 2.

21- Marzo -2024

Dia Soleado

se realiza Aseo general en las tres zonas de la obra

22- Marzo- 2024

se realiza recorrido por la obra con funcionarios de la secretaria de infraestructura y obras publicas.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79371027		CHARRY SAMPER JUAN JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle7 No 10-53	VALLEDUPAR-CESAR	5881308	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	58995894	9465586694	I	2024/02/31	2024/02/14	BANCO AV VILLAS	0	$411,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$175,600			$1,160,000	$135,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,160,000**	**$175,600**			**$1,160,000**	**$135,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$80,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					**$1,160,000**	**$175,600**			**$1,160,000**	**$135,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$80,800**		**$0**	**$0**
1	CC 79371027	CHARRY JUAN	25-14	30	$1,160,000	$175,600	EPS005	30	$1,160,000	$135,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$175,600			$1,160,000	$135,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0

2024/01/18 03:40 PM

1/89

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departame
CC 79371027		CHARRY SAMPER JUAN JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle7 No 10-53	VALLEDUPAR-CESAR

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias
2024-02	2024-02	58995894	9465586694	I	2024/02/15	2024/02/14	BANCO AV VILLAS	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,600	$0	$0	$175,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$175,600	$0	$0	$175,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$0	$0	$80,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	8	1	$80,800	$0	$0	$80,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$135,000	$0	$0	$135,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$135,000	$0	$0	$135,000
TOTAL				1	$391,200	$0	$0	$391,200

2024/01/18 03:40 PM

obh

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1072963178		GONZALEZ PAVA VICTOR FABIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 5 2 05 B CENTRO	ANAPOIMA-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	27116527	9464409450	I	2024/04/17	2024/03/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$487,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$0	$0	$90,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$487,000	$0	$0	$487,000

2024/04/10 07:07 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1072963178		GONZALEZ PAVA VICTOR FABIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 5 2 05 B CENTRO	ANAPOIMA-CUNDINAMARCA	3555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	27116527	9464409450	I	2024/04/17	2024/03/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$487,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1072963178	GONZALEZ PAVA VICTOR FABIAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,300,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	No	$487,000
Total	Afiliados(1)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0		$487,000

2024/04/10 07:07 PM

Invesa La Compañía Amiga.	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-041
	PRODUCTO TERMINADO PINTURA EPOXICA-POLIAMIDA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 7
	I+D PINTURAS	FECHA: 17/ago/2017

1. NOMBRE

PRODUCTO TERMINADO PINTURA EPÓXICA-POLIAMIDA SAPOLÍN.

2. DESCRIPCIÓN

La PINTURA EPÓXICA SAPOLÍN es una pintura epóxi-poliamida de acabado final, formulada en dos componentes para ser mezclada con un agente curante Poliamídico, CATALIZADOR POLIAMÍDICO SAPOLÍN Ref. 000 en relación 4:1 en volumen, respectivamente.

3. CARACTERÍSTICAS

La PINTURA EPOXI-POLIAMIDA SAPOLÍN logra películas de buena flexibilidad y adherencia; con resistencia a disolventes aromáticos, derivados del petróleo y ácidos débiles, excelente resistencia al álcalis, sales y al agua; además con resistencia a temperaturas en inmersión de 70 °C y en seco de 120°C.

4. ESPECIFICACIONES

ACABADO	Liso, Brillante.	I-CC-M-P-015
COLORES	Blanco (Atóxico), Gris (Atóxico), Azul, Verde máquina, Negro, Amarillo, Rojo, Beige.	I-CC-M-P-025
% SÓLIDOS EN PESO	Mayor a 72% Varía según color	I-CC-M-P-007
VISCOSIDAD a 25°C	85 -90 KU	I-CC-M-P-002
DENSIDAD Kg/Gal	Mayor a 4.9 Varía según color	I-CC-M-P-009

PROPIEDADES

SECADO AL TACTO	4 - 5 horas	I-CC-M-P-026
SECADO PARA SEGUNDA MANO	6 - 15 horas	I-CC-M-P-026
SECADO TOTAL	72 horas	I-CC-M-P-026
RELACIÓN DE MEZCLA (POR VOLUMEN)	4 partes Epóxica/ 1 parte Poliamida.	N/A
TIEMPO DE INDUCCIÓN (REPOSO)	15 minutos entre la preparación de la mezcla y la aplicación	N/A
TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA	6 - 8 horas El tiempo de vida útil de la mezcla de los componentes A y B disminuye al aumentar la temperatura y aumenta al disminuir la misma.	N/A
ESPESOR RECOMENDADO	50 - 80 um de película seca (2 a 3 manos)	N/A

Invesa La Compañía Amiga.	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-041
	PRODUCTO TERMINADO PINTURA EPOXICA-POLIAMIDA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 7
	I+D PINTURAS	FECHA: 17/ago/2017

	Dependiendo del grado de agresividad del medio se recomienda aplicar un espesor de película mayor.	
ESTABILIDAD EN EL ALMACENAMIENTO (25°C)	24 meses bajo techo	I-CC-M-P-013

5. APLICACIONES Y USOS

La pintura EPOXI-POLIAMIDA SAPOLÍN está recomendada como pintura de acabado para la protección y decoración de superficies metálicas (se recomienda utilizar primer ANTICORROSIVO EPÓXICO SAPOLÍN) en estructuras de plantas de producción de químicos, alimentos y tratamientos de aguas (Para esta aplicación solo colores Blanco y Gris); tales como tuberías, tanques, maquinarias, equipos, puentes, etc.; para superficies de concreto, asbesto-cemento (Pisos, Columnas, Muros, etc.), maderas; en ambientes interiores o exteriores* de alta contaminación o agresividad industrial.

* En el producto aplicado expuesto al exterior se puede apreciar cierto grado de entizamiento (manifestado en una pérdida de brillo), sin afectar la funcionalidad del recubrimiento. Para un óptimo desempeño se recomienda aplicar un acabado para exteriores como ESMALTE POLIURETANO SAPOLIN y PINTURA ACRÍLICA SAPOLIN.
Para mayor información Consultar con servicio técnico SAPOLIN.

PRECAUCIÓN En plantas donde se realice manipulación de colorantes y saborizantes alimenticios debe tenerse cuidado en la recomendación de este producto para su aplicación, ya que puede presentarse ataque por manchado en cierto grado a la combinación de agentes colorantes (Tartrazina, Azorrubina, rojo 2G, etc.) cuando son mezclados con otros componentes tales como (saborizantes, edulcorantes, emulgentes, espesantes, etc.) dependiendo del proceso, por lo que se sugiere cuando se presenten estas necesidades o casos, indagar muy bien las condiciones y realizar la consulta al servicio técnico. Al igual en Hospitales y centros Quirúrgicos debe tenerse precaución cuando estos emplean desinfectantes de antigua generación a base de Yodo, los cuales por sus características pueden manchar la película de pintura como infinidad de diversas superficies, para mayor información consultar al servicio técnico Sapolín.

5.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies metálicas deben estar protegidas con ANTICORROSIVO EPÓXICO SAPOLIN con un espesor y perfil de rugosidad acorde a las condiciones ambientales que debe soportar (ver la ficha técnica de los ANTICORROSIVOS EPÓXICOS SAPOLIN).

La superficie a aplicar debe estar exenta de humedad, grasa, cera, mugre y óxidos sueltos, pintura deteriorada y escama de laminación, y todo material extraño que pueda afectar el comportamiento del producto.

En superficies pintadas anteriormente, es necesaria la limpieza manual o mecánica de la película. Para repintes sobre películas viejas no deterioradas, es necesario identificar el tipo de recubrimiento o chequear la compatibilidad de sistemas (Consultar con servicio técnico SAPOLIN). Para repintes

Invesa La Compañía Amiga.	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-041
	PRODUCTO TERMINADO PINTURA EPOXICA-POLIAMIDA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 7
	I+D PINTURAS	FECHA: 17/ago/2017

sobre epóxicas en buenas condiciones, se lijan en seco para eliminarles el brillo y se limpian bien antes de aplicar el producto.

Las superficies de madera se limpian, secan bien y sellan con una mano de PINTURA EPOXI-POLIAMIDA diluida con un 20% por volumen de AJUSTADOR EPÓXICO SAPOLIN.

El concreto y asbesto-cemento se deben neutralizar lavándolos con una solución acuosa de ácido muriático (clorhídrico) al 10% por volumen, dejando actuar el ácido por unos 15 minutos, tiempo luego del cual, la superficie se enjuaga con abundante agua y se seca completamente.

Para concretos muy lisos o que tengan acabados superficiales debe aplicarse chorro abrasivo o ácidos a mayor concentración para garantizar una correcta adherencia.

No se recomienda la PINTURA EPOXI-POLIAMIDA sobre sistemas a base de asfalto o alquitrán porque sangran, ni para recipientes u objetos en contacto directo con alimentos.

5.2 DILUCIÓN

Brocha o Rodillo Máximo un 1/16 de AJUSTADOR EPÓXICO por galón.
Pistola Máximo un 1/8 de AJUSTADOR EPÓXICO por galón.

*Sobre metales no debe aplicarse a rodillo.

5.3 APLICACIÓN

Tener presente que la mezcla anterior pierde sus características después de 6-8 horas (Tiempo de vida). Este tiempo disminuye si la temperatura ambiental aumenta y aumenta si la temperatura ambiental disminuye.

Mezclar 4 partes en volumen de PINTURA EPÓXICA SAPOLIN por una parte de CATALIZADOR POLIAMIDICO SAPOLIN Ref. 000 (*Utilizar regla guía de mezcla impresa en el envase*).

Agitar el contenido del envase, hasta lograr la completa uniformidad del contenido.

Dejar la mezcla en reposo (inducción) de 15-20 minutos, antes de aplicar.

Tener presente que la mezcla anterior pierde sus características después de 6-8 horas (Tiempo de vida).

Se aplican las manos para obtener el espesor seco recomendado, dejando secar de 6 a 15 horas entre manos. Para aplicaciones entre capa y capa o acabado después de pasadas 72 horas de aplicado la última capa, es recomendable lijado suave para mejor aceptación entre capas.

Los equipos y demás elementos de aplicación se deben lavar con AJUSTADOR EPÓXICO SAPOLÍN. Para utilizar la PINTURA EPÓXICA SAPOLÍN en condiciones muy agresivas, se recomienda un secado mínimo de 7 días.

5.4 RENDIMIENTO TEÓRICO/PRÁCTICO APROXIMADO

• Rendimiento Teórico (a 25 um de película seca): 75-85 m2/gal *

Invesa La Compañía Amiga.	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-041
	PRODUCTO TERMINADO PINTURA EPOXICA-POLIAMIDA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 7
	I+D PINTURAS	FECHA: 17/ago/2017

• Rendimiento Práctico (a 2 manos): 18-20 m2/gal *

* Este dato puede variar, dependiendo de las técnicas de aplicación, condiciones de trabajo y tipo de superficie a ser recubierta.
• Rendimiento Teórico (a 25 um de película seca): 75-85 m2/gal *
• Rendimiento Práctico (a 2 manos): 18-20 m2/gal *

* Este dato puede variar, dependiendo de las técnicas de aplicación, condiciones de trabajo y tipo de superficie a ser recubierta.

6. PRESENTACIÓN

La PINTURA EPÓXICA SAPOLÍN se ofrece al mercado en las presentaciones de 1 galón; en envases metálicos y de ¼ de galón para el componente Poliamídico, CATALIZADOR POLIAMÍDICO SAPOLÍN Ref. 000.

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

Las actividades, operaciones, usos, materiales y productos relacionados con este documento deben manejarse de forma integral, asegurando la calidad del trabajo y del resultado esperado; evitando reprocesos, fallas y pérdida de tiempo. Es indispensable cumplir todos los controles legales, de salud y seguridad exigidos. Así mismo, es obligatorio usar los elementos de protección personal, conocer la información sobre los riesgos asociados y contar con el debido entrenamiento.

Evite todo contacto con la piel y ojos, se debe evitar la inhalación prolongada de los vapores de esta pintura, usar equipo de protección apropiado (guantes, gafas de seguridad); Garantizar una buena ventilación en el lugar de aplicación del producto. En caso de contacto con la piel, se debe limpiar con estopa humedecida en agua. Si el contacto es con los ojos, se recomienda lavarlos con abundante agua corriente durante 15 minutos y buscar atención médica. En caso de ingestión beber abundante agua. Buscar atención médica inmediata. En caso de contacto del producto o del envase con fuentes de calor o expuesto al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco.

Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM®. Servicio las 24 horas. Teléfonos: Colombia 018000 91 60 12 ó desde celular (031) 288 60 12, Venezuela 08001005012, Perú 080 050 847, Ecuador 1800 59 3005.

7.1 ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse bajo techo, en un rango de temperatura de 4-32 °C, lejos de toda fuente de calor, en lugares limpios y secos. El recipiente debe estar cerrado herméticamente y en conservase en su envase original.

Para mayor información consultar la hoja de seguridad:

PINTURA EPOXI-POLIAMIDA SAPOLIN COMPONENTE 1

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

Invesa La Compañía Amiga.	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-041
	PRODUCTO TERMINADO PINTURA EPOXICA-POLIAMIDA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 7
	I+D PINTURAS	FECHA: 17/ago/2017

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.

8.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

En caso de derrames recoger el producto utilizando un material absorbente como tierra, arena u otro material inerte. Evite contaminar fuentes de agua y alcantarillados. No incinerar envases sellados. No utilizar los envases desocupados para almacenar alimentos o agua de consumo.

9. GARANTÍA

INVESA S.A. Ofrece plena garantía de las especificaciones de este producto. Las aplicaciones aquí consignadas son fruto de nuestra experiencia mas no se convierten en garantía, cada usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación.

Para mayor información comuníquese al: (4) 3342727, opción 1 (Línea de Servicio al Cliente), Visite nuestra página web: www.sapolin.com o escríbanos al correo: contactenos@invesa.com

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Cargo: Profesional Tecnológico II Industria **Fecha:** 16/Ago/2017	**Cargo:** Líder Tecnológico Industria **Fecha:** 17/Ago/2017	**Cargo:** Sistema De Gestión Integral **Fecha:** 17/Ago/2017

DETALLE EN CORTE TRANSVERSAL DE ANCLAJE MAQUINABIOSALUDABLE

Ricaurte

ALCALDIA MUNICIPAL
RICAURTE CUNDINAMARCA

PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA
No.031-2023

OBJETO: OBRAS PARA LA INSTALACION Y DOTACION DE PARQUES BIOSALUDABLES UBICADO EN LA URBANIZACION DE RICAURTE CUNDINAMARCA

AVALUO:

CONTRATISTA:

CONTENIDO:

PLANTA ARQUITECTONICA Y DETALLES OBRA CIVIL MAQUINAS BIOSALUDABLES

ESPECIFICACIONES:

PLANO RECIBO

PLANO RECIBO

PLANO RECIBO

VERSION:

ESCALA: MIN. -- CAAA.

ESCALA: 1:250

FECHA: Febrero/ 2024

PLANO No.


1—1

Powered by CamScanner

INFORME DE SST No.2

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No.2

24 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2024

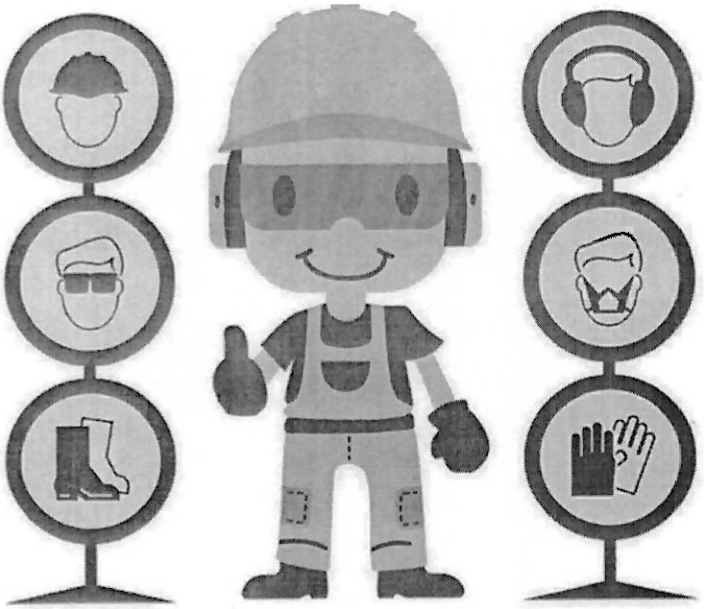

Responsable del SG - SST

PROYECTO

OBJETO "OBRAS PARA LA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TOGORAMA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA".

CONTRATO DE OBRA No.437 – 2023

RICAURTE CUNDINAMARCA

1. Objetivos

1.1. Objetivo General

Presentar los registros de la supervisión, seguimiento y control del cumplimiento a los compromisos establecidos en los aspectos en seguridad y salud en el trabajo, por el contratista en la obra durante su ejecutado "Obras Para La Instalación Y Dotación Del Parque Biosaludable Ubicado En La Urbanización Togorama Del Municipio De Ricaurte Cundinamarca," contrato No 437-2023.

1. Objetivos específicos

- Describir las actividades de SST que se desarrollaron durante la ejecución del contrato.
- Verificar y validar el seguimiento de la totalidad de las actividades SST dando cumplimiento a lo establecido en el contrato y normas que apliquen en seguridad y salud en el trabajo vigentes.
- Verificar los soportes de pagos de seguridad social.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

En la siguiente tabla, se incluye la información general del contrato de obra:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.	437-2023
OBJETO	"OBRAS PARA LA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TOGORAMA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA".
CONTRATANTE	ALCALDIA DE RICAURTE CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	GERMAN ALFREDO CABRERA NATES C.C. N° 13.008.155 DE IPIALES- NARIÑO.
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES

FECHA DE INICIO	23 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	24 DE MARZO DE 2024

3. CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1. ASPECTOS BASICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista diseñó y estructuró el sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para el contrato de obra 437-2023, con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo, y preservar un estado de salud, bienestar físico, mental y social de los trabajadores, la prevención de accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.

La aplicación de SG-SST del contratista de las "OBRAS PARA LA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TOGORAMA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA" contrato No 437-2023, realizo su implementación, a través de las medidas seguridad establecidas para le control de los factores de riesgos presentes en la ejecución del contrato de obra en el informe del presente informe.

3.2. Contrato del personal

En este periodo la interventoría no realizó ingreso de personal sin embargo se realiza el pago al sistema general de seguridad social de todo el personal, como se evidencia en la siguiente tabla y anexos entregados por los trabajadores.

Tabla: personal activo, del 24 de Febrero de 2023 al 22 de Marzo de 2024.

Personal Profesional De Obra

No.	NOMBRE	CARGO
1	Juan Jose Charry Samper	Director de Obra
2	Ana Isabel Castro Vargas	Residente de Obra

Personal Mano De Obra No Calificada

No.	NOMBRE	CARGO
1	Christian Cárdenas	Maestro de Obra
2	Víctor González	Ayudante

Se realizó el seguimiento por medio del pago de panilla al ingreso del personal de las "OBRAS PARA LA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TOGORAMA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA" contrato No 437-2023, se realiza el pago al sistema general de seguridad social del todo el personal activo, como se evidencia en la tabla 2

Tabla 2: personal que ingresan al contrato No 437- 2023 por el contratista
PERSONAL PROFESIONAL:

Nombre	Cedula	cargo
Juan Jose Charry Samper	79.371.027	Director de Obra
Ana Isabel Castro Vargas	51.714.582	Residente de obra

PERSONAL MANO DE OBRA:

No.	NOMBRE	Cedula	CARGO
1	Christian Cárdenas	1.104.698.008	Maestro de Obra
2	Víctor González	1.072.963.178	Ayudante

3.2.1. Política de seguridad y salud en el trabajo

El contratista cuenta con la política de seguridad y salud en el trabajo y prevención de alcohol, tabaco y droga, las cuales se encuentra publicados en la obra, socializada al personal contratado dando cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

El contratista, en la revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cumple con lo estipulado en su política de SST y de prevención del consumo del alcohol, drogas y tabaco el cual se observó de obra se encuentra publicada en la parte inicial de la obra

3.2.2. Marco legal en seguridad y salud en el trabajo

La interventoría cuenta con una matriz de requisitos legales relacionados con el aspectos de seguridad y salud en el trabajo, el cual se encuentra incluido dentro del SG-SST en cual no se ha presentado actualizaciones de acuerdo a la actividad del contrato, en el seguimiento realizado al SGSST del contratista "OBRAS PARA LA

INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TOGORAMA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA". contrato No 437-2023, se evidencio que también cuenta con la matriz de requisitos legales ajustado a la ejecución de las actividades establecidas para el actual contrato, sin presencia de actualización de la misma.

3.2.3. Diagnostico integral de condiciones de trabajo

El contratista, identifico y priorizaron los factores de riesgo en el formato de matriz de riesgos, y a través de él se identificaron las condiciones de riesgo presentes en las actividades que se desarrollaran en cada una de en las diferentes etapas del contrato, definiendo las medidas de intervención para cada riesgo, actualmente no se han presentado actualización dicha matriz ya que no se presentaron cambios en actividades o evidencia de nuevos riesgos de las tareas realizadas

3.2.4. Reglamento de Higiene y seguridad

El contratista estableció el reglamento de higiene y salud en el trabajo y realizo su publicación en el sitio de obra. se encuentra diseña y divulgada su reglamento de higiene y seguridad en el trabajo al personal, el contratista estableció estrategias como actividades a la prevención de accidentes y enfermedades laborales, uso elementos de protección personal, charlas, pausas activas.

3.2.5. Ausentismo laboral

El contratista durante la ejecución de la obra, tiene una tasa de ausentismo general de 0% debido que no se presentó perdida de días por accidentes o enfermedades laborales.

3.2.6. Procedimiento de trabajo seguro

El contratista realizo los procedimientos de seguridad en las actividades realizadas en el desarrollo del contrato ejecutado.

Se realizaron las placas para la instalación de las máquinas, realizando los trabajos de excavación, compactación de recebo, excavación para bordillos, fundición de bordillos y placas y la instalación de las maquinas biosaludables.



El contratista de obra, entrego dotación adecuada de acuerdo a la labor desempeñada por el personal de obra.

3.2.7. Protocolo de Bioseguridad

El contratista implementó de manera parcial el protocolo de bioseguridad desinfección y lavado de manos. La supervisión mediante recorrido de campo, evidencio que el personal del contratista cuenta con los elementos de protección personal.

Con el propósito de ayudar a mitigar el impacto del COVID19, el contratista realizo jornada de sensibilización y prevención para con sus empleados, durante la jornada, se instruyeron a los trabajadores frente a los riesgos de adquirir el virus.

También, se les recordó que, si por alguna razón presentan síntomas de alarma como fiebre, congestión nasal, cansancio, dolor de cabeza constante, dolor de garganta, deben informar y comunicarse con su EPS lo mas pronto posible.

3.2.8. Estadística SST.

Durante la ejecución de la obra no se presentaron accidentes ni enfermedades laborales.

Mes	F.A. Frecuencia de accidentalidad	S.A. Severidad de accidentalidad	P.A.M proporción de accidentes mortales	Incidencia enfermedades laborales	Prevalencia enfermedades laborales	Ausentismo por causa medica
24 de febrero al 22 de Marzo de 2024	0	0	0	0	0	0

El contratista GERMAN ALFREDO CABRERA, cuenta con el procedimiento para reportar e investigar accidentes en caso que se presenten algún evento en el desarrollo de la obra. Durante la ejecución de la obra del 24 de Febrero de 2024 al 22 de Marzo de 2024 no se presentaron registros de accidentes en el contratista.

3.2.9. Inducción y capacitación

El contratista realizo inducción SST a todas las personas que ingresaron sobre los aspectos que componen el sistema de seguridad y salud en el trabajo y el protocolo de bioseguridad. A continuación, se relacionan las charlas y capacitaciones realizadas por el contratista.

Contratista	Número de capacitaciones	Temas
GERMAN ALFREDO CABRERA	1	Manejo de cargas Pausas activas Manejo del covid-19 Lavado adecuado de las manos Reporte de accidentes de trabajo

3.2.10. Orden y aseo en obra

El contratista ha tomado medidas correctivas sobre las labores de orden y aseo en la obra, la brigada de orden, aseo y limpieza están desarrollando actividades de limpieza.

3.2.11. Conclusiones y recomendaciones

- Contratista realiza Inducción SG-SST a todo su personal.
- Contratista realizo charlas cortas a su personal de Protocolo de Bioseguridad y Seguridad industria.

Documento revisado y avalado por:

BIBIANA ANDREA ZULUAGA GIRALDO
TS. Esp Gerencia de Riesgos Laborales-SST

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.070.587.562

ZULUAGA GIRALDO
APELLIDOS

BIBIANA ANDREA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-OCT-1986
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
A- G.S. RH
F SEXO

28-ENE-2005 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1510900-39135661-F-1070587562-20050318 03732 05077P 02 157861410

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
SUBDIRECCION INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD

RESOLUCION No. 7168 de 15/06/2016

Por la cual se concede Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo

LA DIRECTORA DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

En uso de sus facultades legales conferidas en los artículos 23 de la Ley 1562 de 2012 y 1° de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social y en especial por las que le confiere Decreto 507 del 06 de Noviembre de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y

CONSIDERANDO:

Que el (la) señor(a) BIBIANA ANDREA ZULUAGA GIRALDO identificado (a) con C.C.1.070.587.562 de GIRARDOT, ha solicitado Licencia para prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo como persona natural;

Que el peticionario ha presentado la documentación necesaria, exigida por el literal A del Artículo Segundo de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Que revisada la solicitud presentada con su documentación anexa y verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Resolución No. 4502 de 2012 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social para el otorgamiento de la licencia de salud ocupacional, se considera procedente la expedición de licencia solicitada.

En mérito de lo expuesto, la Directora de Calidad de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de Salud

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a BIBIANA ANDREA ZULUAGA GIRALDO identificado (a) con C.C.1.070.587.562 de GIRARDOT, como TRABAJADORA SOCIAL ESPECIALISTA EN GERENCIA EN RIESGOS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

ARTICULO SEGUNDO: La licencia otorgada comprende la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo en las siguientes áreas o campos de acción:

1. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN.
2. INVESTIGACION EN AREA TECNICA.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

3. INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO DE ACUERDO CON SU COMPETENCIA.
4. DISEÑO, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Licencia se concede por término de diez (10) años, es de carácter personal e intransferible, tendrá validez en todo el territorio nacional y puede solicitarse su renovación, por un término igual, en cualquier Secretaría Seccional o Distrital del país.

ARTICULO CUARTO: Cuando el titular de la licencia modifique alguna de las condiciones acreditadas en el momento de su obtención, deberá informar tal hecho a la Dirección de Calidad de Servicios de Salud - Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud de esta Secretaría de Salud, a fin de que se proceda a modificar la resolución por la cual se otorgó la licencia. En caso contrario incurrirá en las sanciones previstas en las normas legales vigentes.

ARTICULO QUINTO: El titular de la licencia deberá dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la materia, en especial a la Ley 1562 de 2012, Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 y demás normas que la modifiquen o adicionen.

ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente esta Resolución a BIBIANA ANDREA ZULUAGA GIRALDO, informándole que de conformidad con el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) contra la misma proceden los recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales podrá interponer ante esta Secretaría, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este acto administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 15/06/2016

Original Firmado por:
Anabelle Arbelaez Vélez
Directora de Calidad de Servicios de Salud

ANABELLE ARBELAEZ VELEZ
Directora de Calidad de Servicios de Salud

Elaboró: Esperanza Mora R.
Revisó y Aprobó: Clara Helena Villanueva H.

Bogotá, D.C. 30-06-16
A la fecha notifiqué personalmente al señor (a) Bibiana A. Zuluaga
C.C. # 1.070.587.562 Edo
Firma:

509

UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Bibiana Andrea Zuluaga Giraldo

C.C. No. 1.070.587.562

Ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Institución, la cual, con las debidas autorizaciones le otorga el título de

Especialista en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en El Trabajo

en testimonio se firma y sella este diploma

Consejo de Fundadores

Rector UNIMINUTO

Rector General

Secretario General

gleresoreria Juridica otorgado por resolución 10315 del 2 de Agosto de 1990, Ministerio de Educación Nacional

República de Colombia

Folio 138 del Libro de Registro No. 005
Bogotá, 2 de Abril de 2016
No. 37212

UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Acta de Grado No. 008

ACTA INDIVIDUAL DE GRADO

La Suscrita Secretaria General de La Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.

Certifica:

Que en la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca; el día dos (2) de Abril de dos mil dieciséis (2016), la ***Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO,*** *Institución de Educación Superior, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, previo el juramento reglamentario, confirió el título de* ***Especialista en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en El Trabajo a Bibiana Andrea Zuluaga Giraldo*** *con cédula de ciudadanía No.* ***1070587562*** *quien aprobó la opción de grado correspondiente y cumplió con las normas legales, los requisitos académicos y las exigencias establecidas en los Estatutos y Reglamentos para el grado, y le otorgó el Diploma No 37212 que lo acredita como tal, registrado en el Folio 38 del Libro No. 006 de Registro de Títulos expedidos por la* ***Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO.***

La Corporación Universitaria Minuto de Dios- UNIMINUTO *está autorizada para conferir este título por la Ley 30 del 28 de Diciembre de 1992. El programa cuenta con Resolución de Registro Calificado según Código SNIES 103152 concedido por el Ministerio de Educación Nacional.*

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca; el día dos (2) de Abril de dos mil dieciséis (2016)

Marcelo Castillo Torres
Rector UVD

Linda Lucía Guarín Gutiérrez
Secretaria General

UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Bibiana Andrea Zuluaga Giraldo

C.C.Nº 1.070.587.562 de Girardot

Ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Institución, la cual, con las debidas autorizaciones le otorga el título de

Trabajadora Social

en testimonio se firma y sella este diploma

Consejo de Fundadores

Rector General

Rector
LUNINAMARCA - META.

Secretario General

Personería Jurídica otorgada por resolución 12345 del 1 de Agosto de 1990. Ministerio de Educación Nacional

República de Colombia

Folio 273 del Libro de Registro 2
Girardot, 30 de Mayo
No. 3923

UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Acta de Grado No. 142

ACTA INDIVIDUAL DE GRADO

La Suscrita Secretaria General de UNIMINUTO - Corporación Universitaria Minuto de Dios,

Certifica

Que en la ciudad de Girardot (Cundinamarca) el día treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008), **UNIMINUTO - Corporación Universitaria Minuto de Dios,** Institución de Educación Superior, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, previo el juramento reglamentario, confirió el título de **TRABAJADORA SOCIAL** a **BIBIANA ANDREA ZULUAGA GIRALDO** con cédula de ciudadanía No. **1070587562de GIRARDOT** quien aprobó el trabajo de grado y cumplió con las normas legales, los requisitos académicos y las exigencias establecidas en los Estatutos y Reglamentos para el grado, y le otorgó el Diploma No. **3923** que lo acredita como tal, registrado en el Folio **273** del Libro No. **002** de Registro de Títulos expedidos por **UNIMINUTO - Corporación Universitaria Minuto de Dios.**

UNIMINUTO - Corporación Universitaria Minuto de Dios está autorizada para conferir este título por la Ley 30 del 28 de Diciembre de 1992 y el programa cuenta con autorización de funcionamiento según Registro **28294361030253070l100** concedido por el Ministerio de Educación Nacional.

En constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, el día treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008)

Santiago Vélez Álvarez
Rector Cundinamarca – Meta

Ángela Echeverri Arcila
Secretaria General

OBJETO DEL CONTRATO: "OBRAS PARA LA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TOGORAMA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA"

PROGRAMACION FINAL DE OBRA

FECHA ACTA DE INICIO : 22/01/2024

							MES	ENERO		FEBRERO				MARZO			
							SEMANA	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	TOTAL
							FECHAS	23/01/2024 - 3/02/2024	29/01/2024 - 3/02/2024	5/02/2024 - 10/2/2024	12/02/2024 - 17/02/2024	19/02/2024 - 24/02/2024	26/02/2024 - 02/03/2024	4/03/2024 - 9/03/2024	11/03/2024 - 16/03/2024	18/03/2024 - 23/03/2024	
ITEM	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL											
No.	ICCU	CIMIENTOS															
1	CONST. 18.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	29,19	$ 61.761,00	$ 1.802.803,59		$ 600.934,53	$ 600.934,53	$ 600.934,53							$ 1.802.803,59
2	CONST. 18.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) ESPESOR=20CM	M3	38,00	$ 125.684,00	$ 4.775.992,00											$ -
3	CONST. 13.14	PLACA BASE CONCRETO E=0 10 3000 PSI	M2	90,27	$ 72.224,00	$ 6.519.660,48						$ 2.173.220,16	$ 2.173.220,16	$ 2.173.220,16			$ 6.519.660,48
4	CONST. 4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 4,5MM (15X15)	KG	120,06	$ 11.708,00	$ 1.405.662,48						$ 468.554,16	$ 468.554,16	$ 468.554,16			$ 1.405.662,48
5	URB 5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	153,26	$ 24.666,00	$ 3.780.311,16						$ 1.260.103,72	$ 1.260.103,72	$ 1.260.103,72			$ 3.780.311,16
6	CONST. 4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	274,71	$ 7.246,00	$ 1.990.548,66						$ 663.516,22	$ 663.516,22	$ 663.516,22			$ 1.990.548,66
7	CONST. 18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	102,53	$ 17.898,00	$ 1.835.081,94										$ 1.835.081,94	$ 1.835.081,94
	B	MÁQUINAS BIOSALUDABLE	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL											
1	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA GIRO DE CADERA TWISTER O DE CINTURA (DOBLE)	UND	1,00	$ 5.256.009,00	$ 5.256.009,00									$ 5.256.009,00		$ 5.256.009,00
2	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA PRESA DE BRAZO PECHO (DOBLE)	UND	1,00	$ 6.934.075,00	$ 6.934.075,00									$ 6.934.075,00		$ 6.934.075,00
3	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA REMO (DOBLE)	UND	1,00	$ 6.347.505,00	$ 6.347.505,00									$ 6.347.505,00		$ 6.347.505,00
4	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA ELIPTICA O SKY (DOBLE)	UND	1,00	$ 6.148.507,00	$ 6.148.507,00									$ 6.148.507,00		$ 6.148.507,00
5	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA BICICLETA RECLINADA RECUMBENT (DOBLE)	UND	1,00	$ 6.039.741,00	$ 6.039.741,00									$ 6.039.741,00		$ 6.039.741,00
6	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA ESPALDA BRAZOS ALTOS (DOBLE)	UND	1,00	$ 6.444.341,00	$ 6.444.341,00									$ 6.444.341,00		$ 6.444.341,00
7	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA CAMINADORA AEREA (DOBLE)	UND	1,00	$ 5.316.979,00	$ 5.316.979,00									$ 5.316.979,00		$ 5.316.979,00
8	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA DOBLE TABLA DE ABDOMINALES (DOBLE)	UND	1,00	$ 5.719.486,00	$ 5.719.486,00									$ 5.719.486,00		$ 5.719.486,00
9	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA LATERAL DE CINTURA (DOBLE)	UND	1,00	$ 5.866.258,00	$ 5.866.258,00									$ 5.866.258,00		$ 5.866.258,00
10	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA PIERNA PRENSA HORIZONTAL (DOBLE)	UND	1,00	$ 5.804.355,00	$ 5.804.355,00									$ 5.804.355,00		$ 5.804.355,00
11	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA PONY (DOBLE)	UND	1,00	$ 5.301.299,00	$ 5.301.299,00									$ 5.301.299,00		$ 5.301.299,00
12	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA BICICLETA ESTATICA (DOBLE)	UND	1,00	$ 6.271.394,00	$ 6.271.394,00									$ 6.271.394,00		$ 6.271.394,00
13	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA PRENSA DE PIERNA DECLINADA (DOBLE)	UND	1,00	$ 6.747.464,00	$ 6.747.464,00									$ 6.747.464,00		$ 6.747.464,00

						MES	ENERO		FEBRERO				MARZO			
14	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA ESCALADOR (DOBLE)	UND	1,00	$ 5.249.387,00	$ 5.249.387,00							$ 5.249.387,00		$ 5.249.387,00
15	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA AROS DE COORDINACION GRANDE (DOBLE)	UND	1,00	$ 5.234.169,00	$ 5.234.169,00							$ 5.234.169,00		$ 5.234.169,00
16	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA AROS DE COORDINACION VOLANTES (DOBLE)	UND	1,00	$ 4.536.257,00	$ 4.536.257,00							$ 4.536.257,00		$ 4.536.257,00
17	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA MULTIFUNCIONAL COORDINACIÓN PARA DISCAPACIDAD REDUCIDA (DOBLE)	UND	1,00	$ 4.763.368,00	$ 4.763.368,00								$ 4.763.368,00	$ 4.763.368,00
18	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA PRENSA DE BRAZO PARA DISCAPACITADOS (DOBLE)	UND	1,00	$ 6.028.962,00	$ 6.028.962,00								$ 6.028.962,00	$ 6.028.962,00
	C	NO PREVISTOS	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL									
NP-1	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	18,05	$ 106.282,00	$ 1.918.029,00				$ 1.918.029,00					$ 1.918.029,00
NP-2	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA	M3	19,78	$ 124.895,00	$ 2.466.467,00								$ 2.466.467,00	$ 2.466.467,00
					SUB TOTAL	$ 125.728.120,31	$ 600.934,53	$ 600.934,53	$ 600.934,53	$ 1.918.029,00	$ 4.565.394,26	$ 4.565.394,26	$ 4.565.394,26	$ 93.217.226,00	$ 19.093.878,94	$ 125.728.120,00

VALOR EJECUTADO	$ 125.728.120,31	$ 600.934,53	$ 600.934,53	$ 600.934,53	$ 1.918.029,00	$ 4.565.394,26	$ 4.565.394,26	$ 4.565.394,26	$ 93.217.226,00	$ 19.093.878,94	$ 125.728.120,00		
VALOR EJECUTADO CON A.I.U (30%)	$ 163.446.557,00	$ 781.214,89	$ 781.214,89	$ 781.214,89	$ 2.493.437,70	$ 5.935.012,54	$ 5.935.012,54	$ 5.935.012,54	$ 121.182.393,80	$ 19.622.042,62	$ 163.446.557,00		
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ -	$ 781.214,89	$ 1.562.429,78	$ 2.343.644,67	$ 4.837.082,37	$ 10.772.094,91	$ 16.707.107,44	$ 22.642.119,98	$ 143.824.513,78	$ 163.446.556,40			
AVANCE PORCENTUAL SEMANAL	0%	0,5%	0,5%	0,5%	1,5%	3,6%	3,6%	3,6%	74,1%	12,0%			
PORCENTAJE ACUMULADO	0%	0%	1%	1%	3%	7%	10%	14%	88%	100%			

Elaboró

ING. GERMAN ALFREDO CABRERA
Contratista de Obra

MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA NIT. 890,680,059-1 Ricaurte	CONTRATO DE OBRA: No.437-2023	FECHA DE INICIO:	23/01/2024	VALOR DEL CONTRATO:	$ 203.559.367,00
	CONTRATISTA DE OBRA: GERMAN ALFREDO CABRERA NATES	FECHA TERMINACION:	24/03/2024	VALOR DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIO N° 01	$ 163.446.557,00
				FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 22/03/2024	PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO: 100%
	SUPERVISOR ALCALDÍA: ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE RICAURTE (C)				

OBJETO DEL CONTRATO: "OBRAS PARA LA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TOGORAMA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA"

ACTA FINAL

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN DE MAYORES, MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No. 01							ACTA PARCIAL NO. 01		ACTA FINAL		ACUMULADO	
ITEM		DESCRIPCION	UND	CANT	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
A.1		CIMIENTOS										
A.1,1	CONST 16 4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	29,19	$ 61 761,00	$ 1 802 803,59	29,19	$ 1 802 803,59	0,00	$ -	29,19	$ 1 802 803,59
A.1,2	CONST. 16.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) ESPESOR=20CM	M3	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
A.1,3	CONST. 13.14	PLACA BASE CONCRETO E=0 10 3000 PSI	M2	90,27	$ 72.224,00	$ 6 519 660,48	90,27	$ 6 519 660,48	0,00	$ -	90,27	$ 6.519.660,48
A.1,4	CONST 4 23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 4,5MM (15X15)	KG	120,06	$ 11 708,00	$ 1 405 662,48	120,06	$ 1 405 662,48	0,00	$ -	120,06	$ 1.405.662,48
A.1,5	URB 5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	153,26	$ 24 686,00	$ 3 780 311,16	153,26	$ 3 780 311,16	0,00	$ -	153,26	$ 3 780 311,16
A.1,6	CONST. 4 22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	274,71	$ 7 246,00	$ 1 990 548,66	274,71	$ 1 990 548,66	0,00	$ -	274,71	$ 1 990 548,66
A.1,7	CONST. 18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	102,53	$ 17 898,00	$ 1 835 081,94	-	$ -	102,53	$ 1 835 081,94	102,53	$ 1 835 081,94
Subtotal						$ 17.334.068,31		$ 15.498.986,37		$ 1.835.081,94		$ 17.334.068,31
A.2		MÁQUINAS BIOSALUDABLE										
A. 2,1	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA GIRO DE CADERA TWISTER O DE CINTURA (DOBLE)	UND	1,00	$ 5.256.009,00	$ 5.256.009,00	1,00	$ 5.256.009,00	-	$ -	1,00	$ 5.256.009,00
A. 2,2	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA PRESA DE BRAZO PECHO (DOBLE)	UND	1,00	$ 6.934.075,00	$ 6.934.075,00	1,00	$ 6.934.075,00	-	$ -	1,00	$ 6.934.075,00
A. 2,3	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA REMO (DOBLE)	UND	1,00	$ 6.347.505,00	$ 6.347.505,00	1,00	$ 6.347.505,00	-	$ -	1,00	$ 6.347.505,00
A. 2,4	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA ELIPTICA O SKY (DOBLE)	UND	1,00	$ 6.148.507,00	$ 6.148.507,00	1,00	$ 6.148.507,00	-	$ -	1,00	$ 6.148.507,00
A. 2,5	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA BICICLETA RECLINADA RECUMBENT (DOBLE)	UND	1,00	$ 6.039.741,00	$ 6.039.741,00	1,00	$ 6.039.741,00	-	$ -	1,00	$ 6.039.741,00
A. 2,6	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA ESPALDA BRAZOS ALTOS (DOBLE)	UND	1,00	$ 6.444.341,00	$ 6.444.341,00	1,00	$ 6.444.341,00	-	$ -	1,00	$ 6.444.341,00
A. 2,7	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA CAMINADORA AEREA (DOBLE)	UND	1,00	$ 5.316.979,00	$ 5.316.979,00	1,00	$ 5.316.979,00	-	$ -	1,00	$ 5.316.979,00
A. 2,8	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA DOBLE TABLA DE ABDOMINALES (DOBLE)	UND	1,00	$ 5.719.486,00	$ 5.719.486,00	1,00	$ 5.719.486,00	-	$ -	1,00	$ 5.719.486,00
A. 2,9	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA LATERAL DE CINTURA (DOBLE)	UND	1,00	$ 5.866.258,00	$ 5.866.258,00	1,00	$ 5.866.258,00	-	$ -	1,00	$ 5.866.258,00
A. 2,10	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA PIERNA PRENSA HORIZONTAL (DOBLE)	UND	1,00	$ 5.804.355,00	$ 5.804.355,00	1,00	$ 5.804.355,00	-	$ -	1,00	$ 5.804.355,00
A. 2,11	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA PONY (DOBLE)	UND	1,00	$ 5.301.299,00	$ 5.301.299,00	1,00	$ 5.301.299,00	-	$ -	1,00	$ 5.301.299,00
A. 2,12	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA BICICLETA ESTATICA (DOBLE)	UND	1,00	$ 6.271.394,00	$ 6.271.394,00	1,00	$ 6.271.394,00	-	$ -	1,00	$ 6.271.394,00
A. 2,13	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA PRENSA DE PIERNA DECLINADA (DOBLE)	UND	1,00	$ 6.747.464,00	$ 6.747.464,00	1,00	$ 6.747.464,00	-	$ -	1,00	$ 6.747.464,00
A. 2,14	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA ESCALADOR (DOBLE)	UND	1,00	$ 5.249.387,00	$ 5.249.387,00	1,00	$ 5.249.387,00	-	$ -	1,00	$ 5.249.387,00
A. 2,15	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA AROS DE COORDINACION GRANDE (DOBLE)	UND	1,00	$ 5.234.169,00	$ 5.234.169,00	1,00	$ 5.234.169,00	-	$ -	1,00	$ 5.234.169,00
A. 2,16	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA AROS DE COORDINACION VOLANTES (DOBLE)	UND	1,00	$ 4.536.257,00	$ 4.536.257,00	1,00	$ 4.536.257,00	-	$ -	1,00	$ 4.536.257,00

MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA
NIT. 890,680,059-1

Ricaurte

CONTRATO DE OBRA: No.437-2023	FECHA DE INICIO:	23/01/2024	VALOR DEL CONTRATO:	$ 203.559.367,00
CONTRATISTA DE OBRA: GERMAN ALFREDO CABRERA NATES	FECHA TERMINACION:	24/03/2024	VALOR DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIO N° 01	$ 163.446.557,00
			FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 22/03/2024	PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO: 100%

SUPERVISOR ALCALDÍA: ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE RICAURTE (C)

OBJETO DEL CONTRATO: "OBRAS PARA LA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TOGORAMA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA"

ACTA FINAL

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN **DE MAYORES**, MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No. 01							ACTA PARCIAL NO. 01		ACTA FINAL		ACUMULADO	
ITEM		**DESCRIPCION**	**UND**	CANT	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
A. 2,17	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA MULTIFUNCIONAL COORDINACIÓN PARA DISCAPACIDAD REDUCIDA (DOBLE)	UND	1,00	$ 4 763 368,00	$ 4 763 368,00	-	$ -	1,00	$ 4 763 368,00	1,00	$ 4 763 368,00
A. 2,18	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA PRENSA DE BRAZO PARA DISCAPACITADOS (DOBLE)	UND	1,00	$ 6 028 962,00	$ 6 028 962,00	-	$ -	1,00	$ 6 028 962,00	1,00	$ 6 028 962,00
Subtotal						$ 104.009.556,00		$ 93.217.226,00		$ 10.792.330,00		$ 104.009.556,00
B		NO PREVISTOS										
NP-1	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	18,05	$ 106 262,00	$ 1 918 029,10	18,05	$ 1 918 029,10	0,00	$ -	18,05	$ 1 918 029,10
NP-2	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA	M3	19,78	$ 124 695,00	$ 2.466 467,10	-	$ -	19,78	$ 2 466 467,10	19,78	$ 2.466 467,10
Subtotal						$ 4.384.496,20		$ 1.918.029,10		$ 2.466.467,10		$ 4.384.496,20
TOTAL						$ 125.728.120,51		$ 110.634.241,47		$ 15.093.879,04		$ 125.728.120,51

TOTAL OBRAS COSTO DIRECTO	$ **125.728.120,51**	$ **110.634.241,47**	$ **15.093.879,04**	$ **125.728.120,51**
ADMINISTRACION 24%	$ **30.174.748,92**	$ **26.552.217,95**	$ **3.622.530,97**	$ **30.174.748,92**
IMPREVISTOS 1%	$ **1.257.281,21**	$ **1.106.342,41**	$ **150.938,79**	$ **1.257.281,21**
UTILIDAD 5%	$ **6.286.406,03**	$ **5.531.712,07**	$ **754.693,95**	$ **6.286.406,03**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 30%	$ **37.718.436,15**	$ **33.190.272,44**	$ **4.528.163,71**	$ **37.718.436,15**
TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS	$ 163.446.556,66	$ **143.824.513,91**	$ **19.622.042,75**	$ **163.446.556,66**
AJUSTE AL PESO	$ 0,34	$ **0,09**	$ **0,25**	$ 0,34
VALOR TOTAL	$ 163.446.557,00	$ 143.824.514,00	$ 19.622.043,00	$ 163.446.557,00

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 203.559.367,00		
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIO No. 01		$ 163.446.557,00	
VALOR ACTA PARCIAL NO. 01			$ **143.824.514,00**
VALOR ACTA FINAL			$ 19.622.043,00
MENOR VALOR CONTRACTUAL SEGÚN MODIFICATORIO No. 01	-$ 42.521.489,00		
MAS VALOR NO SUMADO EN CONTRATO INICIAL (ITEM A.1,1)	$ 2.408.679,00		
SUMAS IGUALES	$ 163.446.557,00	$ 163.446.557,00	$ 163.446.557,00

NOTA:
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista.
En constancia a lo anterior se firma a los veintidos (22) dias de marzo de 2024

ING. GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS (C)

REPUBLICA DE COLOMBIA										
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA										
MUNICIPIO DE RICAURTE										
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS										
OBJETO DEL CONTRATO: "OBRAS PARA LA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TOGORAMA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA"										
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										
URBANIZACIÓN TOGORAMA										
ITEM	A	CIMIENTOS						TOTAL		
7	PINTURA EPÓXICA		M2	PI	Radio		No.	102,53		
	MÁQUINAS (17 UND SENCILLA)		4,79	3,14	1,24		17	81,46		
	MÁQUINAS (1 UND DOBLE)		8,81		8,81		1	8,81		
	BORDILLO DE 8X15 CM MÁQUINAS (17 UND SENCILLA)		AREA M2	Longitud	Ancho	Alto	No.	11,24		
			0,66	8,26	0,08		17			
	BORDILLO DE 8X15 CM MÁQUINAS (1 UND DOBLE)		1,02	12,79	0,08		1	1,02		
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA		ANCHO	LARGO	ÁREA GENERAL	ÁREA PLACA	CANTIDAD PLACAS	ÁREA TOTAL PLACAS	ESPESOR	19,78
	MÁQUINAS (5 UND SENCILLA) TIERRA E: 0,10M		6,00	16,00	96,00	4,79	5	23,96	0,10	6,32
	MÁQUINAS (1 UND DOBLE) TIERRA E: 0,10M					8,81	1	8,81	0,10	
	MÁQUINAS (6 UND SENCILLA) TIERRA E: 0,10M		6,00	16,00	96,00	4,79	6	28,75	0,10	6,73
	MÁQUINAS (6 UND SENCILLA) TIERRA E: 0,10M		6,00	16,00	96,00	4,79	6	28,75	0,10	6,73
ITEM	2	MÁQUINAS BIOSALUDABLE						TOTAL		
2,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA MULTIFUNCIONAL COORDINACIÓN PARA DISCAPACIDAD REDUCIDA (DOBLE)		ANCHO	LARGO	ALTO	AREA	No.	1,00		
	MAQUINA MULTIFUNCIONAL COORDINACIÓN PARA DISCAPACIDAD REDUCIDA (DOBLE)						1	1,00		
2,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA PRENSA DE BRAZO PARA DISCAPACITADOS (DOBLE)		ANCHO	LARGO	ALTO	AREA	No.	1,00		
	MAQUINA PRENSA DE BRAZO PARA DISCAPACITADOS (DOBLE)						1	1,00		

Elaboró:

Ing. GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
Representante Legal

Revisó:

Ing. WILLIAM AVILA TAFUR
Contratista Profesional Asesor SIOP

MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA		Ricaurte
NIT. 890.680.059-1		

FECHA	DD	22	MM	3	AA	2024	ACTA	FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS PARA LA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TOGORAMA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA.		
CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO CABRERA NATES	CONTRATO No.	437-2023
SUPERVISOR:	ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (C)

CAPITULO	1,7	CONST. 19.26	PINTURA EPÓXICA	UND	M2	UBICACIÓN	URBANIZACIÓN TOGORAMA





Localización	Dimensiones			Cant	Medida Total
	Radio	Pi	Área		
MÁQUINAS (17 UND SENCILLA)	1,24	3,14	4,79	17	81,46
MÁQUINAS (1 UND DOBLE)			8,81	1	8,81
	Longitud	Ancho	Área	Cant	
BORDILLO DE 8X15 CM MÁQUINAS (17 UND SENCILLA)	8,26	0,08	0,66	17	11,24
BORDILLO DE 8X15 CM MÁQUINAS (1 UND DOBLE)	12,79	0,08	1,02	1,00	1,02
Subtotal Acta Final					102,53
Ajuste					
Total Acta Final					102,53

OBSERVACIONES:

ING. GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
CONTRATISTA
CONTRATO DE OBRA No.437-2023

ING. WILLIAM AVILA TAFUR
PROFESIONAL ASESOR DE APOYO SIOP

MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA		Ricaurte
NIT. 890.680.059-1		

FECHA	DD	22	MM	3	AA	2024	ACTA	FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS PARA LA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TOGORAMA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA.		
CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO CABRERA NATES	CONTRATO No.	437-2023
SUPERVISOR:	ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (C)

CAPITULO	NP-2	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA	UND	M3	UBICACIÓN					URBANIZACIÓN TOGORAMA





Localización	Dimensiones					Área Total Placas	Espesor	Medida Total
	Ancho	Largo	Área Comp.	Área Placa.	Cant. Placa			
MÁQUINAS (5 UND SENCILLA) TIERRA E: 0,10M	6,00	16,00	96,00	4,79	5,00	23,95817828	0,10	6,32
MÁQUINAS (1 UND DOBLE) TIERRA E: 0,10M				8,81	1,00	8,81		
MÁQUINAS (6 UND SENCILLA) TIERRA E: 0,10M	6,00	16,00	96,00	4,79	6,00	28,74981393	0,10	6,73
MÁQUINAS (6 UND SENCILLA) TIERRA E: 0,10M	6,00	16,00	96,00	4,79	6,00	28,74981393	0,10	6,73
Subtotal Acta Final								19,78
Ajuste								
Total Acta Final								19,78

OBSERVACIONES:

ING. GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
CONTRATISTA
CONTRATO DE OBRA No.437-2023

ING. WILLIAM AVILA TAFUR
PROFESIONAL ASESOR DE APOYO SIOP

MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA		Ricaurte
NIT. 890.680.059-1		

FECHA	DD	22	MM	3	AA	2024	ACTA	FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS PARA LA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TOGORAMA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA.		
CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO CABRERA NATES	CONTRATO No.	437-2023
SUPERVISOR:	ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (C)

CAPITULO	2,17	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA MULTIFUNCIONAL COORDINACIÓN PARA DISCAPACIDAD REDUCIDA (DOBLE)	UND	UND	UBICACIÓN	URBANIZACIÓN TOGORAMA



Localización	Dimensiones			Cant	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
MAQUNA MULTIFUNCIONAL COORDINACIÓN PARA DISCAPACIDAD REDUCIDA (DOBLE)				1	1

Subtotal Acta Final	1,00
Ajuste	
Total Acta Final	1,00

OBSERVACIONES:

ING. GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
CONTRATISTA
CONTRATO DE OBRA No.437-2023

ING. WILLIAM AVILA TAFUR
PROFESIONAL ASESOR DE APOYO SIOP

MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA		Ricaurte
NIT. 890.680.059-1		

FECHA	DD	22	MM	3	AA	2024	ACTA	FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS PARA LA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TOGORAMA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA.		
CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO CABRERA NATES	CONTRATO No.	437-2023
SUPERVISOR:	ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (C)

CAPITULO	2,18	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO O MAQUINA PRENSA DE BRAZO PARA DISCAPACITADOS (DOBLE)	UND	UND	UBICACIÓN	URBANIZACIÓN TOGORAMA



Localización	Dimensiones			Cant	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
MAQUNA PRENSA DE BRAZO PARA DISCAPACITADOS (DOBLE)				1	1

Subtotal Acta Final	1,00
Ajuste	
Total Acta Final	1,00

OBSERVACIONES:

ING. GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
CONTRATISTA
CONTRATO DE OBRA No.437-2023

ING. WILLIAM AVILA TAFUR
PROFESIONAL ASESOR DE APOYO SIOP

Ricaurte	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA ACTA DE TERMINACIÓN	FR-GEC-014	
		Fecha Aprob: 11/01/2024	
		Versión.02	Pág. 1 de 1

CONTRATO DE OBRA Nº. y FECHA:	N° 437-2023 DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023
Nº. PROCESO EN SECOP II:	CO1.PCCNTR.5602664
SECRETARÍA EJECUTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO CABRERA NATES C.C. N° 13.008.155 DE IPIALES- NARIÑO
OBJETO DEL CONTRATO:	"OBRAS PARA LA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TOGORAMA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA"
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE **($203.559.367,00)**
PLAZO:	DOS (02) MESES
FECHA DE ACTA DE LEGALIZACIÓN:	15 DE ENERO DE 2024
FECHA DE INICIO:	23 DE ENERO DE 2024
FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN:	24 DE MARZO DE 2024

En Ricaurte, Cundinamarca, a los veintidós (22) días del mes de Marzo de 2024 en la Alcaldía Municipal de Ricaurte, se reunieron el **ING. GERMAN ALFREDO CABRERA NATES** identificado con cédula de ciudadanía N°13.008.155 de Ipiles-Nariño en calidad de Contratista de Obra y el **ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA** Secretario de Infraestructura y Obras Públicas en su calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE TERMINACIÓN**, previa verificación y cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a fin de dar terminación a la ejecución del objeto y las obligaciones suscritas.

EL CONTRATISTA

ING. GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
C.C N° 13.008.155 de Ipiales- Nariño
Representante Legal

EL SUPERVISOR

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
C.C. No. 1.070.609.911 de Girardot
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas **(C)**

Proyectó: Ing. William Avila Tafur
Contratista Profesional Asesor SIOP

Ricaurte	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	

CONTRATO DE OBRA Nº. y FECHA:	N° 437-2023 DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023
Nº. PROCESO EN SECOP II:	CO1.PCCNTR.5602664
SECRETARÍA EJECUTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO CABRERA NATES C.C. N° 13.008.155 DE IPIALES- NARIÑO
OBJETO DEL CONTRATO:	"OBRAS PARA LA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TOGORAMA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA"
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE **($203.559.367,00)**
PLAZO:	DOS (02) MESES
FECHA DE ACTA DE LEGALIZACIÓN:	15 DE ENERO DE 2024
FECHA DE INICIO:	23 DE ENERO DE 2024
FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN:	24 DE MARZO DE 2024

En Ricaurte, Cundinamarca, a los veintidós (22) días del mes de Marzo de 2024 en la Alcaldía Municipal de Ricaurte, se reunieron el **ING. GERMAN ALFREDO CABRERA NATES** identificado con cédula de ciudadanía N°13.008.155 de Ipiles-Nariño en calidad de Contratista de Obra y el **ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA** Secretario de Infraestructura y Obras Públicas en su calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO A SATISFACCION**, por medio de la cual se recibe a satisfacción las obras ejecutadas según contrato de obra N° 437-2023 cuyo objeto es "Obras Para La Instalación Y Dotación Del Parque Biosaludable Ubicado En La Urbanización Togorama Del Municipio De Ricaurte Cundinamarca".

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a fin de dar terminación a la ejecución del objeto y las obligaciones suscritas.

EL CONTRATISTA

ING. GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
C.C N° 13.008.155 de Ipiales- Nariño
Representante Legal

EL SUPERVISOR

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
C.C. No. 1.070.609.911 de Girardot
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas **(C)**

Proyectó: Ing. William Avila Tafur
Contratista Profesional Asesor SIOP

522

Ricaurte, 5 de Abril de 2024

Ingeniero
GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
Representante Legal
Ricaurte Cundinamarca

Ref: Contrato de obra 437-2023.

Asunto: Acta Parcial N°01

Una vez revisado el acta parcial N°01 del contrato de la referencia, me permito solicitar la entrega de la siguiente información.

- Acreditar el pago a la administradora de riesgos laborales ARL de Ana Isabel Castro Vargas de los meses de enero y febrero.
- Factura o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos legales.

Lo anterior con el fin de proceder con la revisión del acta N° 01

Atentamente,

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA (C)
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas

Proyecto: Ing. William Avila T
Contratista Profesional asesor SIOP.

Ricaurte

Ricaurte, 5 de Abril de 2024

Ingeniero
GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
Representante Legal
Ricaurte Cundinamarca

Ref: Contrato de obra 437-2023.

Asunto: Acta final de obra.

Una vez revisado el acta final del contrato de la referencia, me permito solicitar la entrega de la siguiente información.

- Acreditar el pago de aportes al sistema de seguridad social y ARL de Ana Isabel Castro Vargas de los meses de marzo.
- Acreditar el pago de aportes al sistema de seguridad social y ARL de Christian Cárdenas Tabarez del mes de marzo.
- Pago Sena FIC.
- Plano récord en formato digital.
- Factura o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos legales.
- Actualización póliza de acuerdo con la fecha de terminación.

Lo anterior con el fin de proceder con la revisión del acta final de obra.

Atentamente,

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA (C)
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas

Proyecto: Ing. William Avila T
Contratista Profesional asesor SIOP.

GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
INGENIERO CIVIL
M.P. 1920216414 CAUCA.

Ricaurte, 22 de Abril de 2024

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
Atn. Ing. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (C)
Ricaurte

Referencia: Contrato de obra No.437-2023.

Asunto: Requerimientos Acta Parcial No. 01 y Acta final

Cordial saludo.

Por medio de la presente remito la documentación solicitada en su oficio del 5 de Abril del 2024 al informe del acta parcial N° 01, para su análisis, revisión y aprobación.

- Pago Aportes a la administradora de riesgos laborales ARL mes de Enero de la ingeniera Ana Isabel Castro Vargas.
- Pago Aportes a la administradora de riesgos laborales ARL mes de Febrero de la ingeniera Ana Isabel Castro Vargas.
- Factura electrónica acta parcial N° 01.

De igual manera se remite la documentación presentada al informe final de obra.

- Pago Aportes a seguridad social y ARL del mes de Marzo de la ingeniera Ana Isabel Castro Vargas.
- Pago Aportes a seguridad social y ARL del mes de Marzo del señor Christian Cárdenas Tabarez.
- Pago Sena FIC.
- Plano récord en formato digital.
- Factura electrónica Final.
- Actualización póliza N° 25-44-101187590 anexo 4

Atentamente,

Ing. GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
C.C. 13.008.155 de Ipiales
Contratista de obra

Cra 7 # 8 75 condominio barlovento Ricaurte Cel. 301 5342669
Email. germanalcabrera@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	51714582-0	ANA ISABEL CASTRO VARGAS		CR 67 N 106 60 INT 4 APTO 101	7495849	anaisabelcastro1@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I-- Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	08/04/2024	76175266	$427.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	187.500	0		0		0	0	0	0	187.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, I.MA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.500	187.500
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	427.500	427.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	51714582-0	ANA ISABEL CASTRO VARGAS		CR 67 N 106 60 INT 4 APTO 101	7495649	anaisabelcastro1@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	08/04/2024	76175286	$427.500	

LE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. Exterior	Desconocido	VSP	IRET	IRP	SLN	TDP	TDA	VST	SLN	IGE	LMA	PAD	AVP	VCT	HE	Correspondiente	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
51714582	CASTRO VARGAS ANA ISABEL	3	0			N																25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	157.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1104698008		CARDENAS TABAREZ CHRISTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 5 # 3 - 11 SUR VILLA ESTAMPA	ANAPOIMA-CUNDINAMARCA	3555595	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	537187135	9465410269	I	2024/04/03	2024/04/05	BANCOLOMBIA	2	$1,136,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,000	$900	$0	$512,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$512,000	$900	$0	$512,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$222,800	$400	$0	$223,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$222,800	$400	$0	$223,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$700	$0	$400,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$400,000	$700	$0	$400,700
TOTAL				1	$1,134,800	$2,000	$0	$1,136,800

2024/04/10 07:11 PM

425

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1104698008		CARDENAS TABAREZ CHRISTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 5 # 3 - 11 SUR VILLA ESTAMPA	ANAPOIMA-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	557187135	9465410269	I	2024/04/03	2024/04/05	BANCOLOMBIA	2	$1,136,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1104698008	CARDENAS TABAREZ CHRISTIAN																		230201	30	$3,200,000	$512,000	EPS017	30	$3,200,000	$400,000		0	$0	$0	14-11	30	$3,200,000	$222,800	0	$0	$0	No	$1,134,800
Total	Afiliados(1)																						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000	$222,800		$0	$0		$1,134,800

2024/04/10 07:11 PM

528

en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13008155		CABRERA NATES GERMAN ALFREDO	A - 200 O MAS COTIZANTES	GIRARDOT	cr 7 8 45 Bartovento casa 14	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3015342	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	40059927	9465700980	Y	2024/02/13	2024/04/17	BANCO DE OCCIDENTE	64	$95,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GIRARDOT (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
1	CC	51714582	CASTRO ANA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0

2024/04/17 09:35 AM

529

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13008155		CABRERA NATES GERMAN ALFREDO	A - 200 O MAS COTIZANTES	GIRARDOT	cr 7 B 45 Barlovento casa 14	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3015342	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	40059927	9465700980	Y	2024/02/13	2024/04/17	BANCO DE OCCIDENTE	64	$95,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$5,100	$0	$95,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$5,100	$0	$95,600
TOTAL				1	$90,500	$5,100	$0	$95,600

2024/04/17 09:35 AM

530

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13008155		CABRERA NATES GERMAN ALFREDO	A - 200 O MAS COTIZANTES	GIRARDOT	cr 7 8 45 Barlovento casa 14	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3015342	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	40057614	9465701048	Y	2024/03/13	2024/04/17	BANCO DE OCCIDENTE	34	$93,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GIRARDOT (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)						**$0**	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$90,500		**$0**	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
1	CC	51714582	CASTRO ANA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$90,500		**$0**	$0

2024/04/17 09:31 AM

531

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13008155		CABRERA NATES GERMAN ALFREDO	A - 200 O MAS COTIZANTES	GIRARDOT	cr 7 B 45 Barlovento casa 14	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3015342	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	40057614	9465701048	Y	2024/03/13	2024/04/17	BANCO DE OCCIDENTE	34	$93,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$2,700	$0	$93,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$2,700	$0	$93,200
TOTAL				1	$90,500	$2,700	$0	$93,200

2024/04/17 09:31 AM

532

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13008155		CABRERA NATES GERMAN ALFREDO	A - 200 O MAS COTIZANTES	GIRARDOT	cr 7 8 45 Barlovento casa 14	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3015342	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	40055253	9465701337	Y	2024/04/11	2024/04/17	BANCO DE OCCIDENTE	6	$91,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GIRARDOT (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
1	CC	51714582	CASTRO ANA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0

2024/04/17 09:36 AM

533

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13008155		CABRERA NATES GERMAN ALFREDO	A - 200 O MAS COTIZANTES	GIRARDOT	cr 7 8 45 Barlovento casa 14	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3015342	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	40055253	9465701337	Y	2024/04/11	2024/04/17	BANCO DE OCCIDENTE	6	$91,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$500	$0	$91,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$500	$0	$91,000
TOTAL				1	$90,500	$500	$0	$91,000

2024/04/17 09:36 AM

534

535

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	108315366	586985522	19/04/2024

Número de Identificación
13008155

Primer Nombre ó Razón Social
GERMAN ALFREDO

Primer Apellido (si es Persona natural)
CABRERA NATES

Tipo de documento
03

Dígito de Verificación (Si es persona

Naturaleza Jurídica
03

Departamento
CUNDINAMARCA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
CARRERA 7 NO 8-75

Ciudad de Domicilio
RICAURTE

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,313 4417709

Correo electrónico
germanalcabrera@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Cundinamarca

Regional Centros SIIF
36-02-00-025-000000

Número Licencia de Obra
437-2023

Número Contrato de Obra
437-2022

Nombre Obra
PARQUE BIOSALUDABLE URB TOGORA

Fecha Inicio Obra
23/01/2024

Fecha Terminación Obra
24/03/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra
RICAURTE

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
3

Costo Total de Obra a Todo Costo
163446556.00

Costo Total Mano de Obra
24500000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
4

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
408616.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
408616.00

ecollect
Seguro para ti

536

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	**BANCOLOMBIA**	**108315366**	**586985522**	**19/04/2024**

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **13008155**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.84.88.55**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 408,616.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 408,616.00	COP$ 408,616.00

ecollect
Seguro para ti

537



Powered by CamScanner
