
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**1 CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA MULTIPLE DEL BARRIO LENINGRADO III EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE RISARALDA**	**171,5 días**	**mar 7/11/23**	**mar 11/06/24**
2	1.1 INICIO		mar 7/11/23	
3	**1.2 PRELIMINARES**	**4 días**	**mié 8/11/23**	**lun 13/11/23**
4	1.2.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO	1 día	mié 8/11/23	mié 8/11/23
5	1.2.2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	1 día	jue 9/11/23	jue 9/11/23
6	1.2.3 CAMPAMENTO (TABLA + TEJA AC + PISO)	3 días	jue 9/11/23	lun 13/11/23
7	1.2.4 ALQUILER DE BAÑO PORTATIL (2 ASEOS SEMANALES)	1 día	jue 9/11/23	jue 9/11/23
8	1.2.5 RED PROVISIONAL DE AGUA	1 día	jue 9/11/23	jue 9/11/23
9	1.2.6 RED PROVISIONAL ELECTRICA	1 día	jue 9/11/23	jue 9/11/23
10	1.2.7 VALLA INFORMATIVA INSTALADA	1 día	jue 9/11/23	jue 9/11/23
11	**1.3 DEMOLICIONES EXCAVACIONES Y LLENOS**	**12,5 días**	**vie 10/11/23**	**sáb 25/11/23**
12	1.3.1 DEMOLICIÓN PLACA EN CONCRETO MECANIZADO	3,5 días	vie 10/11/23	mar 14/11/23
13	1.3.2 DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE	2 días	mar 14/11/23	mié 15/11/23
14	1.3.3 EXCAVACION CAISSON EN TIERRA	10,63 días	mar 14/11/23	sáb 25/11/23
15	1.3.4 EXCAVACION EN ZANJA PROFUNDIDAD DE 0.00 HASTA 2.00	4,5 días	lun 13/11/23	vie 17/11/23
16	1.3.5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	2 días	mié 15/11/23	vie 17/11/23
17	1.3.6 CORTE MECANICO PLACA DEPORTIVA EN CONCRETO RIGIDO H= 0.08 m. INCLUYE OPERARIO	1 día	vie 10/11/23	vie 10/11/23
18	1.3.7 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE APOYO PARA ESTRUCTURAS	2 días	mié 15/11/23	vie 17/11/23
19	**1.4 CIMENTACIONES**	**47 días**	**mié 15/11/23**	**sáb 13/01/24**
20	1.4.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO DE LIMPIEZA 10.3 Mpa	3,63 días	mié 15/11/23	sáb 18/11/23
21	1.4.2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 20.7 Mpa PARA ANILLOS CAISSON	5,63 días	lun 20/11/23	sáb 25/11/23
22	1.4.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 20.7 Mpa PARA CAISSON	3,63 días	mié 22/11/23	sáb 25/11/23
23	1.4.4 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 20.7 Mpa	2,13 días	lun 1/01/24	mié 3/01/24
24	1.4.5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DADO CIMENTACION CONCRETO 20.7 Mpa	2,13 días	vie 12/01/24	sáb 13/01/24
25	**1.5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**49 días**	**jue 16/11/23**	**mié 17/01/24**
26	1.5.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 Mpa	1,13 días	sáb 13/01/24	sáb 13/01/24
27	1.5.2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE REFUERZO 420 Mpa	38 días	jue 16/11/23	mié 3/01/24
28	1.5.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 20.7 Mpa	3 días	lun 15/01/24	mié 17/01/24
29	1.5.4 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA ELECTROSOLDADA 10cm X 10cm x 5mm	3 días	lun 15/01/24	mié 17/01/24
30	**1.6 ESTRUCTURA METALICA**	**121 días**	**vie 15/12/23**	**jue 16/05/24**
31	1.6.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN CERCHAS METALICAS Y CORREAS (Incluye soldadura, anticorrosivo y pintura)	58 días	vie 15/12/23	jue 16/05/24
32	**1.7 CUBIERTAS**	**7,5 días**	**mar 14/05/24**	**mié 22/05/24**
33	1.7.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA Tipo e=0.88 m. e=0.35 mm. o similar. Color verde, azul o rojo según diseño. (Incluye instalación, ganchos de fijación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	8,5 días	mié 15/05/24	mié 22/05/24
34	1.7.2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 (0.8MM) (SUMINISTRO E INSTALACION CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A ESTRUCTURA METALICA + SILICONA)	3 días	mar 14/05/24	jue 16/05/24
35	**1.8 RED DE ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS**	**114,13 días**	**lun 1/01/24**	**vie 24/05/24**
36	1.8.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	7,63 días	mié 15/05/24	vie 24/05/24
37	1.8.2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION TIPO I (0.60X0.60x0.10 M) EN CONCRETO 20.7MPa	3,5 días	lun 1/01/24	jue 4/01/24
38	1.8.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA FICAJA DE INSPECCION TIPO I (0.63X0.063-10M) CONCRETO 20.7MPa	4 días	lun 1/01/24	jue 4/01/24
39	1.8.4 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE Y CARUELA FICAJA DE INSPECCION TIPO I (0.63X0.8 M) CONCRETO 20.7MPa	4 días	lun 1/01/24	jue 4/01/24
40	1.8.5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA 160MM Tipo Novafort o similar. (Incluye accesorios y nivelación)	4 días	lun 1/01/24	jue 4/01/24
41	1.8.6 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA 110MM Tipo Novafort o similar. (Incluye accesorios y nivelación)	4 días	lun 1/01/24	jue 4/01/24
42	1.8.7 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION TIPO II (0.80X0.80 M) EN CONCRETO 20.7MPa	4 días	lun 1/01/24	jue 4/01/24
43	1.8.8 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA FICAJA DE INSPECCION TIPO II (1.02X1.02X0.10M) CONCRETO 20.7MPa	4 días	lun 1/01/24	jue 4/01/24
44	1.8.9 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE Y CARUELA FICAJA DE INSPECCION TIPO II (0.80X0.8 M) CONCRETO 20.7MPa	4 días	lun 1/01/24	jue 4/01/24
45	1.8.10 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA 200MM Tipo Novafort o similar. (Incluye accesorios y nivelación)	4 días	lun 1/01/24	jue 4/01/24
46	**1.9 INSTALACIONES ELECTRICAS**			
47	1.9.1 BAJANTE DUCTO IMC 2"	16,88 días	mar 21/05/24	mar 11/06/24
48	1.9.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA SECUNDARIA DE 7/0AWG2/0AWGCOR A TABLERO GENERAL 2 Nº 6 FASES +NEUTRO+ TIERRA EN CU AWG HF-FR-LS DUCTO 1" PVC	16,88 días	mar 21/05/24	mar 11/06/24
49	1.9.3 ALIMENTADOR DE CTOS RAMALES SUBTERRANEOS PARA TABLERO PARA PUNTOS DE TRABAJO DE TG A T 7) 1 Nº 12 AWG HF-FR-LS DUCTO 3/4" EMT +1 Nº 8 CF AWG T HF-FR-LS DUCTO 3/4" PVC	16,88 días	mar 21/05/24	mar 11/06/24
50	1.9.4 ALIMENTADOR DE CTOS RAMALES AEREOS PARA PARA ILUMINACION EN ESTRUCTURA A LA VISTA EN 2 Nº 12 +1 Nº 12 T AWG T HF-FR-LS DUCTO 3/4" EMT	16,88 días	mar 21/05/24	mar 11/06/24
51	1.9.5 ALIMENTADOR DE TABLERO TG A SALIDA A MARCADOR 2 F Nº 10 + 1 Nº 10 T AWG HF-FR-LS DUCTO 1" EMT CONDUIT	16,88 días	mar 21/05/24	mar 11/06/24
52	1.9.6 TABLERO BIFASICO DE DE 8 CTOS EMPOTRADO PARA TOTALIZADOR TAPA Y CLASE	16,88 días	mar 21/05/24	mar 11/06/24
53	1.9.7 PUESTO DE TRABAJO, 4 SALIDAS DE 120 V Y 4 SALIDAS DE 208 V	16,88 días	mar 21/05/24	mar 11/06/24
54	1.9.8 SALIDA ELECTRICA DE ILUMINACION EN CUBIERTA CAJA OCTOGONAL RAWELD	14,38 días	vie 24/05/24	mar 11/06/24
55	1.9.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 150 W TIPO LED HIGH BAY SILVANIA O SIMILAR	16,88 días	mar 21/05/24	mar 11/06/24
56	1.9.10 CERTIFICACION RETIE RETILAP	16,88 días	mar 21/05/24	mar 11/06/24
57	1.9.11 DESMONTE DE REDES EXISTENTES	16,88 días	mar 21/05/24	mar 11/06/24
58	1.9.12 MALLA A TIERRA DEL PROYECTO	16,88 días	mar 21/05/24	mar 11/06/24
59	**1.10 OBRAS VARIAS**	**44 días**	**lun 27/11/23**	**sáb 20/01/24**
60	1.10.1 CARGUE MANUAL DE MATERIAL SOBRANTE	5 días	lun 27/11/23	vie 1/12/23
61	1.10.2 REPARACION Y REFORZAMIENTO DE CERRAMIENTO AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DE CAISSONS	3 días	lun 15/01/24	jue 18/01/24
62	1.10.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CERRAMIENTO NUEVO CON REJA TIPO Y MURO BAJO	5 días	lun 15/01/24	sáb 20/01/24

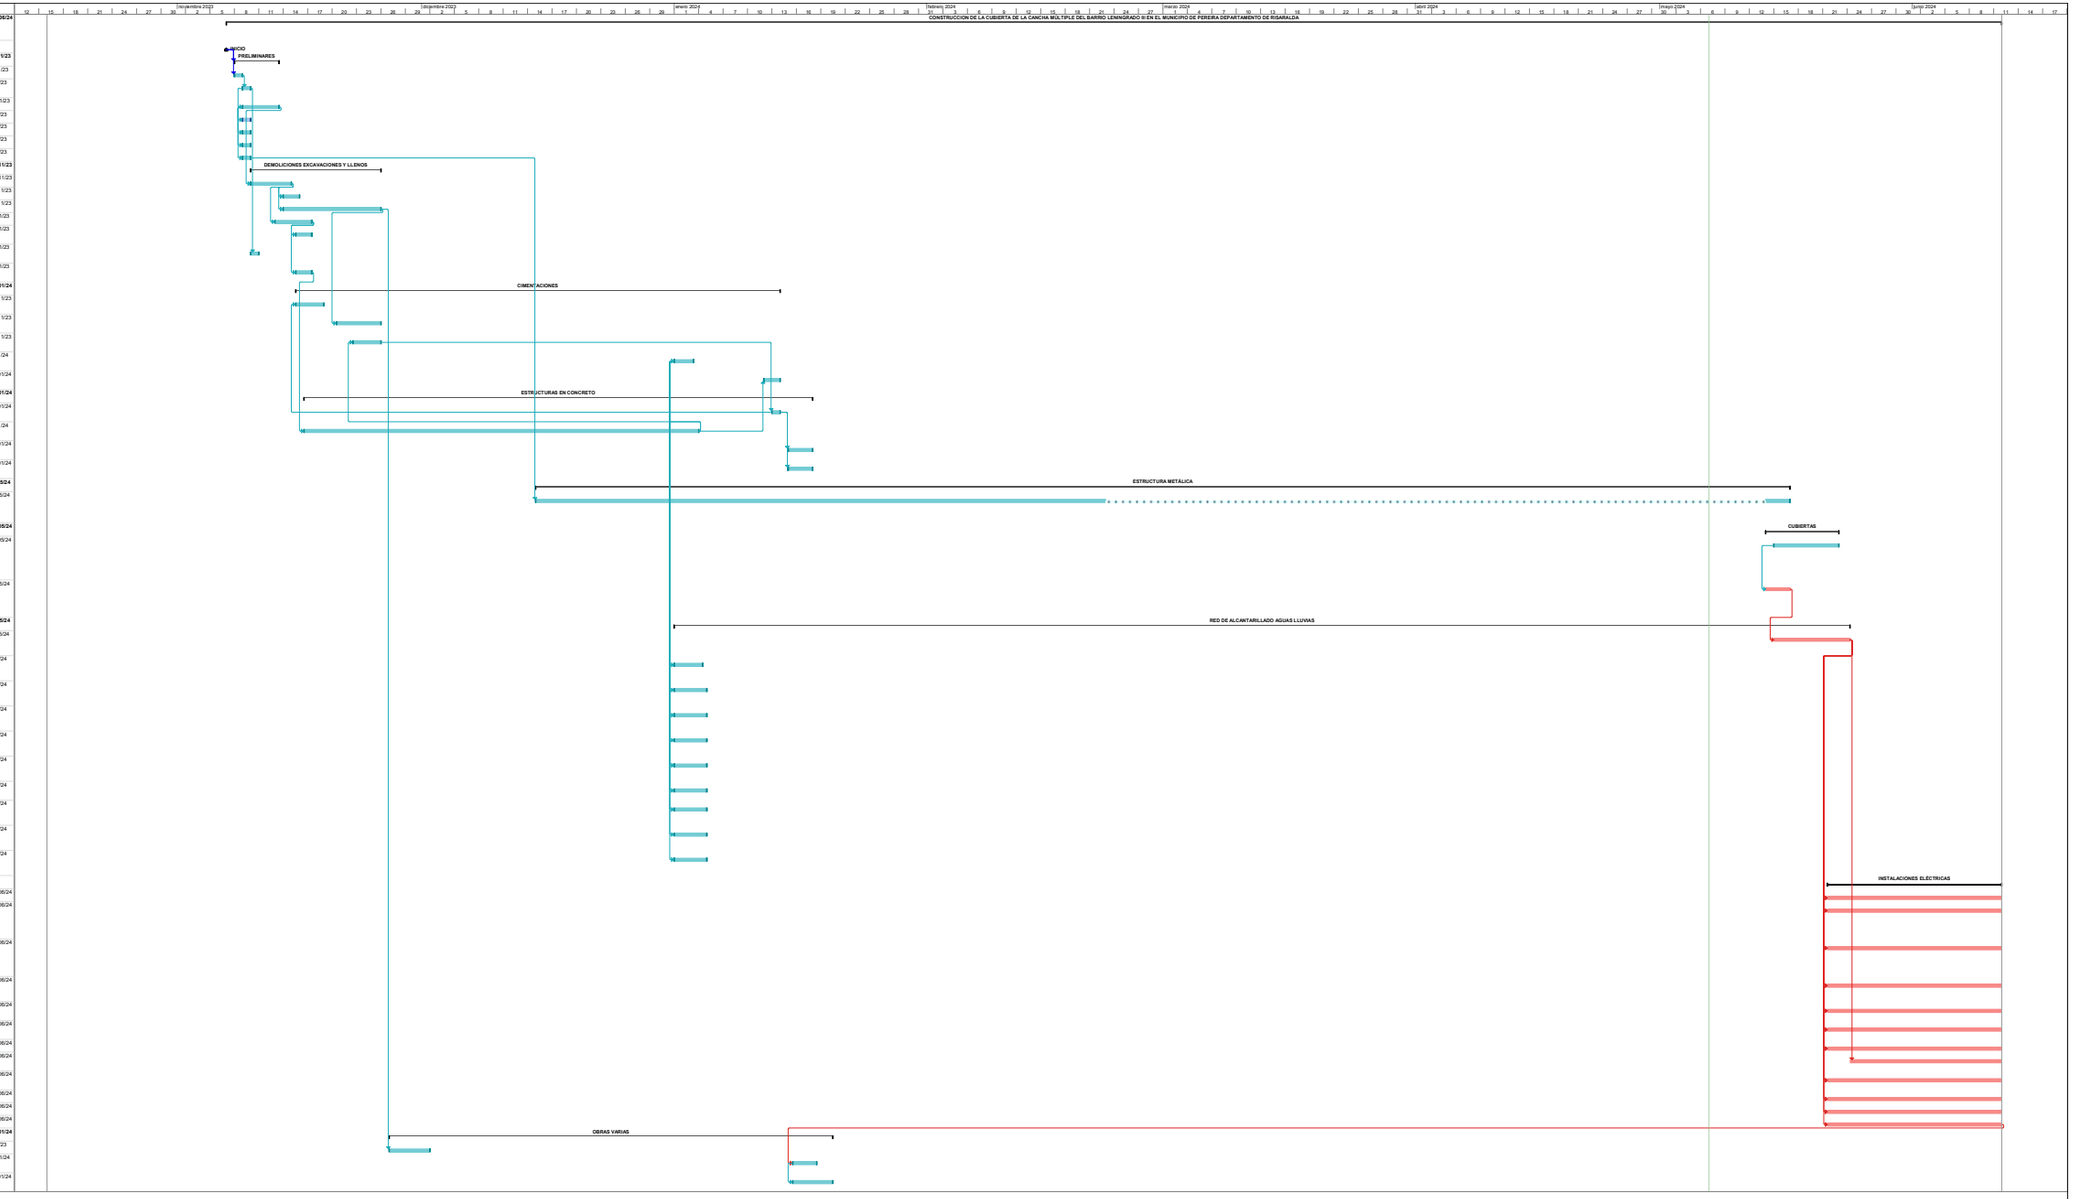

Proyecto: mopoji11
Fecha: mar 7/05/24

Tarea | División | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tareas externas | Hito externo | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Tarea manual | Sólo duración | Informe de resumen manual | Resumen manual | Sólo el comienzo | Sólo fin | Fecha límite | Tareas críticas | División crítica | Progreso | Progreso manual
