SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICA.

INFORME DE ACTIVIDAD PERIODICA –22 ABRIL al 21 MAYO 2024.

Por: ING. Reynaldo Oliva Babilonia.

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación delinforme:	**MAYO / 2024**	Numero de contrato:	**CD-12-2024-0671**
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	REYNALDO OLIVA BABILONIA C.C. 8.731.664		
Periodo del informe:	Informe comprendido del 22 de abril al 21 de mayo de 2024.	Informe número:	3
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/L ($ 57.000.000,oo)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Durante este periodo comprendido desde el 22 de abril al 21 de mayol del 2024 se realizó asesoría a la supervisión administrativa, técnica, a los proyectos que se relaciona en el siguiente informe.

Durante este periodo comprendido desde el 22 de abril al 21 de mayo del 2024 se realizó la supervisión administrativa, técnica, a los proyectos que se relaciona en el siguiente informe.

1-Realizar y gestionar oficios para empresas de servicio público, solicitando los diseños, planos y memorias de las vías de los programas: barrios a la obra 8 etapa, ampliaciones viales carreras: 49C, 50, calle 79 y 98. Canalización del arroyo en carrera 18 entre 39 a la calle 47 (la cordialidad).


S-2024-01951
Página 1 de 3

Triple A S.A. E.S.P.

Al contestar por favor cite este dato:
Radicado Externo No.: S-2024-01951
Rad. Interno No.: GP-2100-01951

MC-GD-FR-1. V.1

Barranquilla, 20 de mayo de 2024

Ingeniero
Rafael Lafont De Sales
Secretario Obras Publicas
Distrito de Barranquilla
rlafont@barranquilla.gov.co
Barranquilla

GNG-PO-57_ 9:43 a. m.
CCC
Cancelar

2-Visita de campos a la carrera 18 entre calle 39 a la 47 (vía cordialidad), para validación con la Triple A SA ESP, contratista Unión Temporal Gran Vía R90 e interventoría EDUBAR SA, para revisar los diseños de la tubería de alcantarillado y acueducto existente así:

2.1-Acometidas domiciliarias para alcantarillado existentes entre calles 40 a la 40B con la carrera 18, La empresa prestadora del servicio, la Triple A SA, representada por el ingeniero Mateo Restrepo de la interventoría determino no instalar la tubería para alcantarillado domiciliarias que va a favor de la red, pero si dejar un niple en cada pozo de cada esquina para futuras conexiones de la mencionada tubería. Se deja constancia que no harán los trabajos de remplazar la tubería porque el proyecto no tiene previsto trabajar en la zona de anden. Por lo tanto las acometidas domiciliarias encontra de la red son las que serán remplazadas por la manija que se instalará por encima del colector que va del lado impar de la carrera 18. El ingeniero Mateo quedo en pasar correo con este cambio al diseño. Ver foto No.01. El

avance de la instalación de la tubería de alcantarillado de diámetro 24 pulgadas ve entre la calle 40 a la 40B, foto No. 02. En La calle 47 (cordialidad) y carrera 18 cruce se instaló tubería de 48 y 57 pulgadas para despejar el cruce de vía y dar movilidad al sector. Foto No. 04. Se presentaron daños que fueron atendidos por la empresa prestadora de servicio, se deja la constancia que el contratista instalo la tubería existente a la espera de llegada de tubería a la entrega del presente informe. Foto No.04.

Con respecto a la tubería de agua potable se han presentado daños en las redes secundarias por estar muy superficiales, es decir debajo de la losa de pavimento y La triple A SA ESP atendido los daños. También se determinó la existencia de tubería de asbesto cemento con diámetro 10 pulgadas al ingeniero Horacio Caicedo encargado de la zona y redes de acueducto el día viernes 17 de mayo del 2024 para que informe los trabajos a realizar en esta tubería. Se espera respuesta la otra semana del 20 al 24 de mayo del 2024.

El canal de concreto no ha iniciado aun a la espera de instalaciones de tuberías existentes de saneamiento. El contratista esta en la actividad de figuración de hierro de boxcoulbert. Se espera la entrega del diseño por el Ing. Jorge Jar.



Foto No. 01.



Foto No.02

Cr 18 calle 40 a 40B, tubería para acometidas domiciliarias de alcantarillado y colector 24 pulgadas.



FOTO No. 03, Tuberia PVC novaloc con diametro de 57 pulgadas para la canalización pluvial cr 18 entre la calle 39 a la 47 (cordialidad).



FOTO No. 04. Calle 47 (cordialidad) carrera 18 y16, redes de alcantarillado y colector pluvial. Redes secundarias.

3- En barrios a la obra 8 etapa. Recorrido a la carrera 26 entre calle 9 a la 17, vía del módulo 1 barrio

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICA.

INFORME DE ACTIVIDAD PERIODICA –22 ABRIL al 21 MAYO 2024.

Por: ING. Reynaldo Oliva Babilonia.

Rebolo con: el contratista consorcio vías Barem, interventoria DS SAS, gerencia de proyecto EDUBAR y la SDOP. , ver foto No.05 y 06.



FOTO No.05: carrea 26 calle 15



FOTO No. 06 carrera 26 calle 9 PTAR.

4- visita de campo para revisar en los tres pares viales de la carrera 49C – 50 entre calle 76 a la 88 y la calle 79 entre carreras 43 a la 53, Con la empresa Triple A SA ESP, representada con la interventoría, Proyectos de Ingeniería SAS, EDUBAR como Gerencia Administrativa del Proyecto, cada contratista de cada par vial, el recorrido consistió validar con La empresa Triple A SA ESP y revisar las redes existentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado y el área comercial para reubicación de medidores de agua de las acometidas de los usuarios. Se estima que el contratistas iniciaran actividades en la primera semana de junio, Ver foto No.07- 08.





FOTO No. 07 recorrido para inspección de redes de los pares viales Carrera 49C-50 Y calle 79. Consorcio




Foto No, 08. Recorrido al par vial carrea 49C , contratista consorcio consorcio DP 2024, gerencia de proyecto EDUBAR, interventoría Proyectos de ingeniería SAS.

5-Coordinar, definir, programar, planear el inicio del módulo uno del programa barrios a la obra etapa 8, con la gerencia del proyecto de EDUBAR, la interventoría consorcio DS, contratista consorcio Charbel Edu. La interventoria informo que el contratista debe subsanar documentos administrativos tales como personal sst, ambiental y social. Se le hizo entrega dellistado de cinco (05) vías priorizadas por la SDOP, se explico la especificaciones de la empresa de servicio publico. Foto No. 09.

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICA.

INFORME DE ACTIVIDAD PERIODICA –22 ABRIL al 21 MAYO 2024.

Por: ING. Reynaldo Oliva Babilonia.

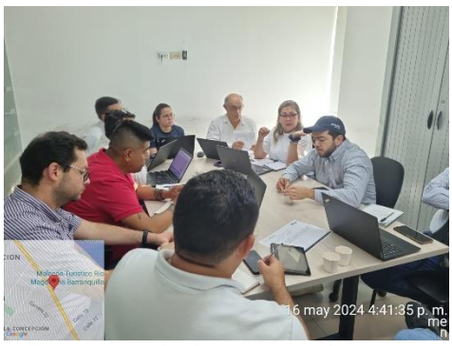

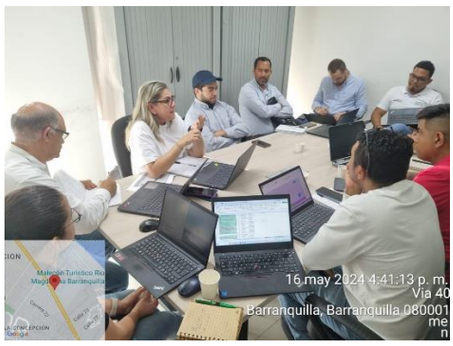


Foto No. 10. Coordinación e inicio del modulo uno del programa barrios a la obra 8 etapa.

6-Asesoria y coordinación técnica para la ejecución de las conexiones de las tuberías nuevas y las existentes con: el Contratista **Unión Temporal Gran Vía R90**, La Triple A SA ESP, la interventoría **EDUBAR SA** y la SDOB. Se coordino el arreglo de fuga de acueducto y alcanaraillado con la empresa Triple A. Fotos N0. 11.





Foto No. 11. Asesoría y coordinación técnica para arreglo de daños en los sistemas de acueducto y alcantarillado.

7-. Asesoría y coordinación técnica para la ejecución de las conexiones de las tuberías nuevas y las existentes con la calle 110 (circunvalar) con carreras 34 a 38. Reconstrucción del pavimento en zona de empalmes carrera 34 – 36B – 37.y zonas de andes de las mismas.Foto No. 12 -13





Foto No.12, circunvalar carrera 38. Foto No.13 carrera 38 con circunvalar andenes

8. Visita Técnica y recorrido al proyecto del intercambiador vial de la carrera 43 calle 110 (circunvalar). En donde la empresa de prestación de servicio público La Triple A SA ESP, instalará tubería de

conducción en polietileno de 315 mm (12”), en la zona de anden lado impar de la carrera 43. Se informa que al cierre del informe del mes la empresa no ha enviado ofico con los requerimientos solicitados por la SDOP. Ver Foto No. 14.









Foto No. 14, carrera 43 acceso desde la circunvalar al barrio Miramar, adecuación de zona intervenidas por la AAA.

9. Asesoría técnica al colegio Sonia Ahumada en el barrio 7 de agosto, en el sistema de acueducto interno por fuga de agua que vertía a la vía y la cancha de futbol, la cual será construido el parque en el programa de la secretaria de la ADI, se soluciono el tema a la institución. Foto No.15.(a-b-c-d)





(a) (b)

Foto No. 15. (a-b), Colegio Sonia Ahumada, barrio 7 de agosto, sur occidente de Barranquilla, asistencia técnica al sistema de acueducto del colegio y las redes existentes, reinstalación de redes internas y presencia de agua en la cancha.





(C). (d)


Foto No. 15. (c-d). Colegio Sonia Ahumada, barrio 7 de agosto, sur occidente de Barranquilla, rector David Romero , a quien se le brindo asistencia técnica para el sistema interno de acueducto del colegio y las redes existentes públicas para detener escape de agua permanente.

10. Elaboración y planificación de listados del las vías priorizadas en los modulos de barioos a la obra

con la ejecución según directrices ces de la SDOP.

SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS					
PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA					
CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCION DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, Y V EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.					
OBRA No	DIRECCION	LONGITUD EN METROS	BARRIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
MODULO 1					
1	CARRERA 16A ENTRE CALLES 5 Y DIAGONAL 5	450	LA LUZ	DISTRITO	DISTRITO
2	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 26 Y 28	160	REBOLO	DISTRITO	DISTRITO
3	CARRERA 26 ENTRE CALLES 9 Y 17	500	REBOLO	DISTRITO	TRIPLE A
4	CALLE 11 ENTRE CARRERAS 15 Y 17B	200	LA LUZ	TRIPLE A	DISTRITO
5	CALLE 15 ENTRE CARRERAS 25 Y 27	250	REBOLO		COLECTOR 52"
6	CALLE 15 ENTRE CARRERAS 28 Y 30	280	REBOLO	TRIPLE A	DISTRITO

11.Cordinacion con la Triple A SA ESP, para asistenciaa las redes de los sistemas de acueducto y alcanarillado del sector del al intercambiador de la carrera 43 calle 110. Sector alamaeda.

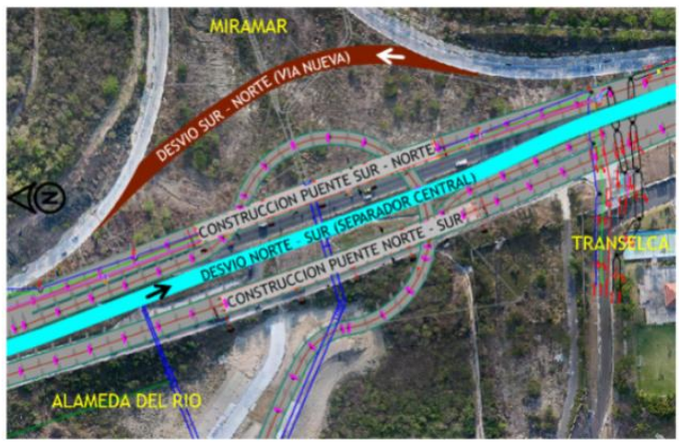

12. Coordinación, asistencia técnica, a la SDOP como enlace entre la gerencia administrativa del programa barrios a la obra 8 etapa que realiza EDUBAR SA con la empresa prestadora de servicio Triple A SA ESP. y los contratista que ejecutaran las vías.

MODULO	Nº DE CONTRATO	CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
1	SA-EDU-003-2024	CONSORCIO VIAS BAREM	EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
2	SA-EDU-007-2024	CONSORCIO SAN CHARBEL EDU	CARLOS KARLO COTES MADERA
3	SA-EDU-008-2024	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	JAVIER AUGUSTO MOLINA RODRIGUEZ
4	SA-EDU-009-2024	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24	IVAN ENRIQUE STEVENSON DEL VECCHIO
5	SA-EDU-010-2024	CONSORCIO EDUBAR 2024	ENETH TALINA AVENDAÑO
6	SA-EDU-023-2024	CONSORCIO VIAS QUILLA	SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ CAÑA
7	SA-EDU-004-2024	CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA	ALVARO HERNANDO CALDERON TORO
8	SA-EDU-011-2024	CONSORCIO DP 2024	ROBERTO CARLO DONADO ARCE
9	SA-EDU-005-2024	CONSORCIO DESARROLLO VIAL	OLEARIS ALONSO HERNANDEZ ORELLANO
INTERVENTORIA			
MODULO		CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
1	SA-EDU-021-2024	CONSORCIO DS	ALEJANDRO ALBA QUINTERO
2	SA-EDU-022-2024	PI S.A.S	WILSON GIOVANNI URREA URREA

Atentamente,

REYNALDO OLIVA BABILONIA
C.C. 8.731.664 de Barranquilla
