INFORME DE ACTIVIDADES Nº4 y FINAL

NUMERO CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.001-2024
CONTRATISTA	LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ALDEA
NIT o C.C.	900.829.118-4
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALEXANDER BEDOYA HERNANDEZ
CEDULA	71.268.272
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
PLAZO INICIO	2 (dos) meses
VALOR DEL CONTRATO	$200.000.000 APORTE ECONÓMICO MUNICIPIO $20.000.000 EN ESPECIE, APORTE MUNICIPIO. $7.200.000 EN ESPECIE, APORTE DE JAC LA ALDEA
ACTA DE INICIO	05 de febrero de 2024

El presente convenio solidario tiene como finalidad, hacer la recuperación y/o mejoramiento de los ramales viales mas afectados en el municipio de Santa Fe de Antioquia; al momento de la firma de acta de inicio del presente convenio se elaboro el acta de priorización para definir cuales son los segmentos viales mas afectas y como invertir los recursos

.

RESUMEN ACTA DE PRIORIZACIÓN.

Según informa el secretario de infraestructura los ramales de los corregimientos de Sabanas y el Pescado en la actualidad fueron atendidos con la ayuda de unas de las retroexcavadoras del municipio de Santa Fe de Antioquia y si bien su estado actual no es optimo, estos no están tan deteriorados como las vías de: Tonusco Arriba, Ogosco, las Azules y el ramal del Churimbo; también se manifiesta que la vía desde el km5 hacia el chaparral esta en condiciones regulares.

Entre las partes se llega a la determinación de iniciar con un bulldozer para atender el ramal de la vereda Ogosco el cual esta tan deteriorado que no es posible mejorarlo con una niveladora.

La niveladora que proporcionara el municipio de Caicedo, iniciara en el sector de la quiebrita (lintes entre Santa Fe de Antioquia y el municipio de Giraldo) de ahí se desplazara en dirección del centro poblado de Tonusco Arriba y continuará hasta llegar al km5 donde después de hacer el balance económico del convenio se analizara si es posible continuar en dirección de la vereda chaparral.

Cuando el bulldozer concluya en la vereda Ogosco, se desplazará al ramal del corregimiento de las Azules; donde atenderá las zonas que han perdido el ancho efectivo de la vía e impide hacer el normal transito de los vehículos, se procurara lograr una sección de vía que permita el buen transito de una volqueta y/o un bus escalera.

Resumen financiero del proyecto:

valor contractual	$200.000.000
acta parcial nº1	$60.014.538
acta parcial nº2	$60.019.951
acta parcial nº3	$35.247.502
acta parcial nº4	$104.718.009
adiciones	$60.000.000
acumulado	$260.000.000
saldo por ejecutar	$0

ACTA PARCIAL DE OBRA Nº4 y FINAL


CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.001-2024

FECHA : 20 de mayo de 2024


ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS acta de modificacion N°3		ACTA DE OBRA Nº3		ACTA DE OBRA Nº4		CANTIDADES ACUMULADAS		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Renivelación banca incluye escarificación y conformación	km	41.00	$1,295,664	53,122,206.85	43.35	$ 56,167,016	5	$ 6,478,318	23.8	$ 30,836,793	43.35	$ 56,167,016	0.00	$ -
2	Corte en material común con máquina tipo Bulldozer	m3	3,283.90	$17,537	57,589,296.86	4,121.50	$ 72,278,127	1294.0097	$ 22,692,854	672.4903049	$ 11,793,362	4,121.50	$ 72,278,127	0.00	$ -
3	Sub-base para conformación de vía, incluye transporte	m3	1,450.00	$43,587	63,201,539.76	0.00	$ -	0	$ -	0	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
OE.1	Aplicación de afirmado crudo no procesado, extraído de los derrumbes de la zona	m3		$29,000		3,366.96	$ 97,641,813	51	$ 1,479,000	1669.959068	$ 48,428,813	3,366.96	$ 97,641,813	0.00	$ -
	COSTO DIRECTO				$ 173,913,043		$ 226,086,956		$ 30,650,172		$ 91,058,968		$ 226,086,956		$ -
	COSTO INDIRECTO (AU = 15%)				$ 26,086,957		$ 33,913,043		$ 4,597,526		$ 13,658,845		$ 33,913,043		$ -
	COSTO TOTAL OBRA ORDINARIA				**$ 200,000,000**		**$ 260,000,000**		**$ 35,247,698**		**$ 104,717,813**		**$ 260,000,000**		**$ -**

De manera independiente se anexa el acta parcial de obra nº4 Y final con las firmas correspondientes

1) RENIVELACIÓN BANCA INCLUYE ESCARIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN

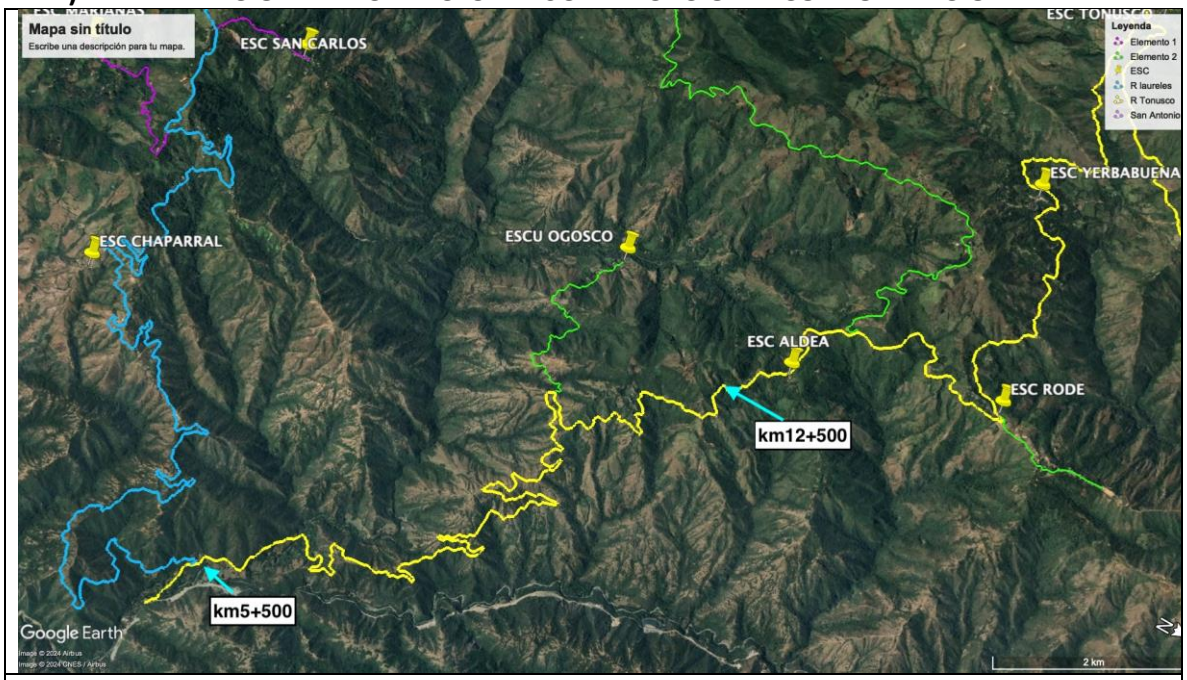


en la imagen anterior se ilustra el segmento de vía atendido en la presente acta entre el km12+000 al km5+500 (7km) del ramal hacia el corregimiento de Tonusco Arriba
NOTA: se descontó 1km, por las placa huellas que existen en la zona de Indro y el Morro

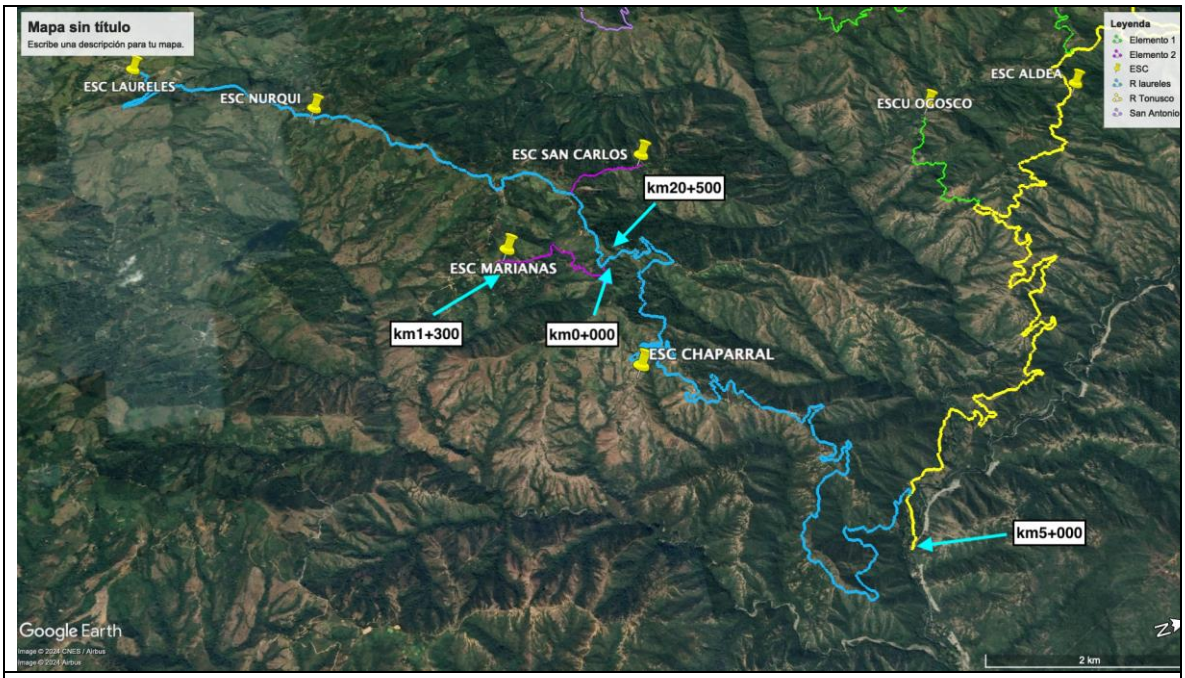

en la imagen anterior se ilustra el segmento de vía atendido en la presente acta entre el km5+000 al km20+500 (15.5km) del ramal hacia el corregimiento hacia Laureles y 1,3km atendidos en el ramal hacia la vereda marianas

2) CORTE EN MATERIAL COMÚN CON MÁQUINA TIPO BULLDOZER

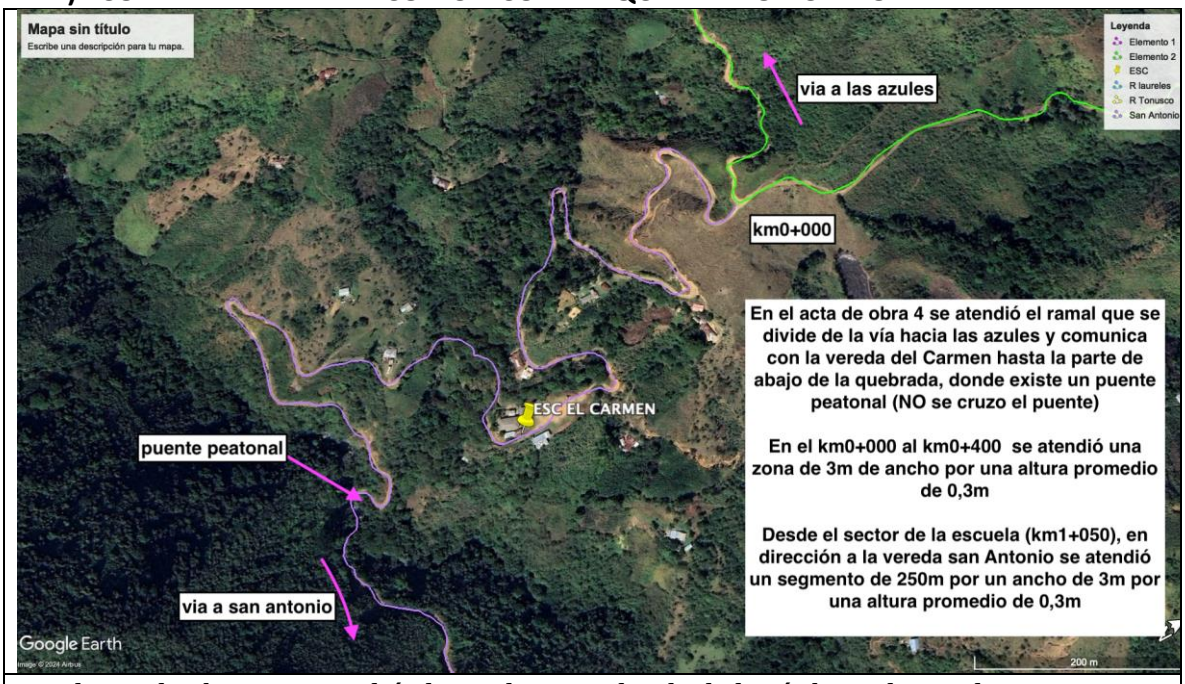

En el acta de obra 4 se atendió el ramal que se divide de la vía hacia las azules y comunica con la vereda del Carmen hasta la parte de abajo de la quebrada, donde existe un puente peatonal (NO se cruzo el puente)


En el km0+000 al km0+400 se atendió una zona de 3m de ancho por una altura promedio de 0,3m (400 x 3 x 0,3 = 360m^3)

Desde el sector de la escuela (km1+050), en dirección a la vereda san Antonio se atendió un segmento de 348m por un ancho de 3m por una altura promedio de 0,3m

(348 x 3 x 0,3 = 313,2m^3)

En la presente acta se ejecutaron 673,2m^3


NOTA: todos los viajes de la volqueta que apoya las actividades están recopilados día a día en la bitácora del proyecto la cual se entregara en la liquidación del presente convenio solidario

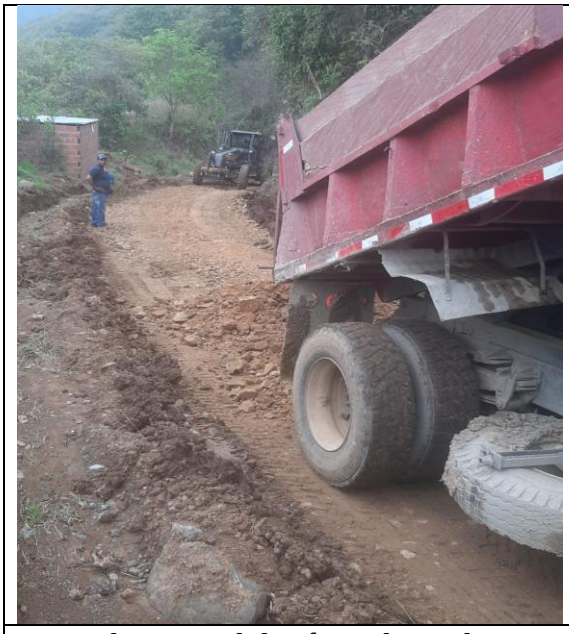




Riego de material de afirmado crudo no procesado, con volqueta contratada con el convenio; se hacer la salvedad porque en algunos días apoyo la volqueta del municipio; se deja claro que solo se están pagando los viajes trasportados por la volqueta contratada por el convenio



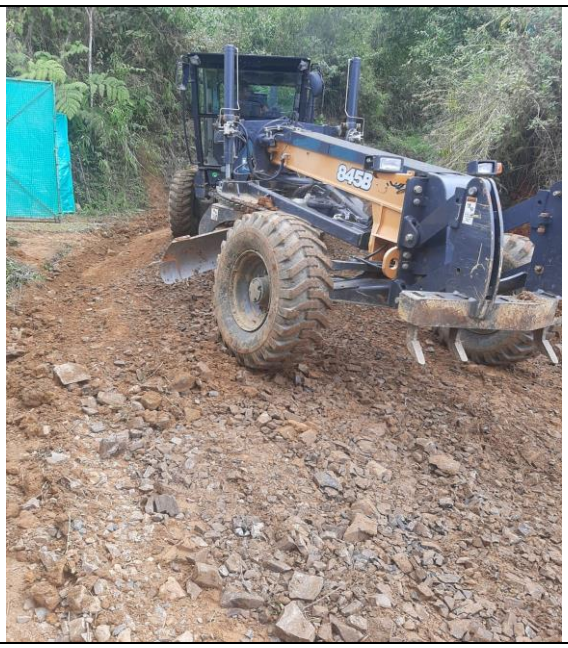

Actividades de conformación de la banca existente, se realiza el riego y la compactación del material

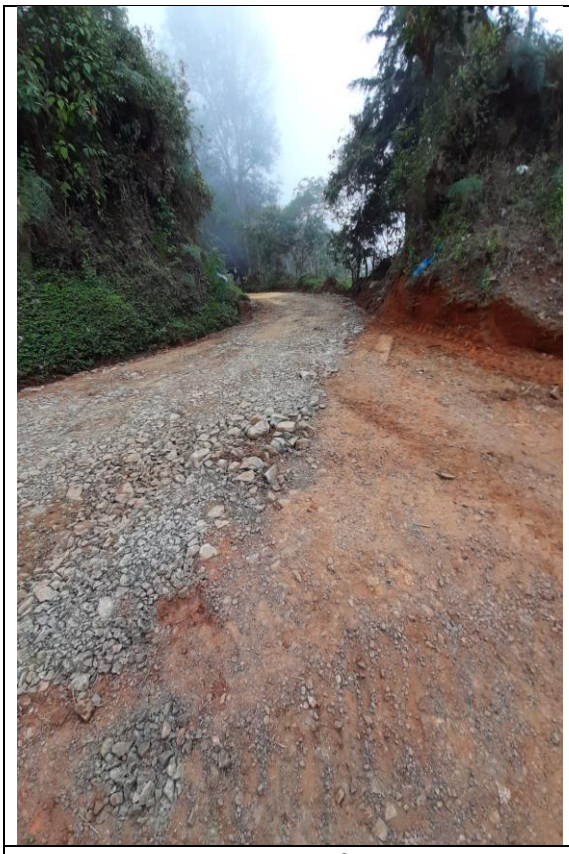




Cargada de material de afirmado crudo y banca conformada y compactada.





Cargue y trasporte de material de afirmado crido, la volqueta de volcó rojo es la contratada por el convenio; la de volcó azul es la del municipio que hizo presencia par apoyar los viajes de esta no se autorizaron para pagos

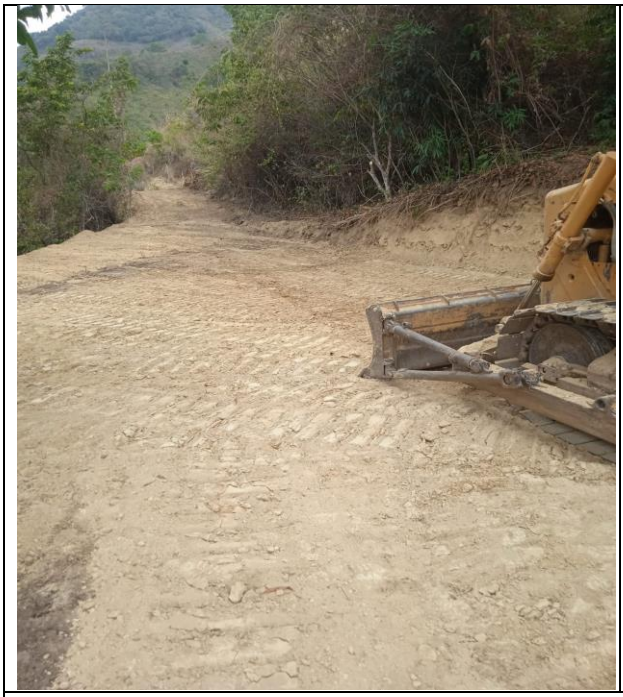



Bulldozer, desarrollando las actividades de recuperación de la vía entre el km0+000 del ramal hacia el Carmen. Se regaron derrumbes y se llenaron cárcavas

CUADROS DE MEMORIAS

acta de obra correspondiente			acta parcial de obra Nº1		obcervacion
DESCRIPCION ACTIVIDAD	**UND**	**CANTIDAD ACTUALIZADA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	
Renivelación banca incluye escarificación y conformación	km	41,00	$1.295.664	53.122.206,85	OBCERVACION
acta de obra correspondiente			**acta parcial de obra Nº1**		
km inicial	km 32+200				este segmento corresponde al ramal principal entre la quiebrita y las inmediaciones de la vereda Yerbabuenal
km final	km 24+500	longitud	7,7	km	
acta de obra correspondiente			**acta parcial de obra Nº2**		
km inicial	km 24+500				este segmento corresponde al ramal principal entre las inmediaciones de la vereda Yerbabuenal y poco antes de las partidas hacia las Azules
km final	km 20+000	longitud	4,5	km	
km inicial	km 0+000				Ramal del Churimbo desde las partidas en Tonusco hacia la zona denominada Partidas
km final	km 1+000	longitud	1	km	
km inicial	km 0+000				Ramal del Rodeo desde la escuela de la vereda el Rodeo hacia la cancha de futbol
km final	km 1+350	longitud	1,35	km	
acta de obra correspondiente			**acta parcial de obra Nº3**		
km inicial	km20+000				actividad sobre el ramal principal que existe entre el casco urbano de Santa Fe de Antioquia hacia el corregimiento de las Azules; la diferencia entre las dos abscisas
km final	km12+500	longitud	5	km	
acta de obra correspondiente			**acta parcial de obra Nº4**		
km inicial	km12+500				este corte de obra se desarrollo en el ramal principal que va del casco urbano al corregimiento de Tonusco Arriba
km final	km5+500	longitud	7	km	
km inicial	km5+000				este corte de obra se desarrollo en el ramal principal que va del casco urbano al corregimiento de Laureles NOTA: se descuanta 1km por las placahuellas en la zona de Indro y el Morro
km final	km20+500	longitud	15,5	km	
km inicial	km0+000				este corte de obra se desarrollo en el ramal hacia la vereda Marianas
km final	km1+300	longitud	1,3	km	
TOTAL ACTA 3			23,8		

TOTA ACUMULADO= 43,35km

DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
Corte en material común con máquina tipo Bulldozer	m3	3.000,00	$17.537	52.610.550,00	OBCERVACION	
acta de obra correspondiente			**acta parcial de obra Nº1**			
km inicial	km0+000	D.H	Ancho Promedio	espesor promedio	volumen	Se atendió todo el ramal desde la vía hacia la Aldea hasta la escuela de la vereda Ogosco en el km2+700
km final	km02+700	2700	4,5	0,089218107	1084	
acta de obra correspondiente			**acta parcial de obra Nº2**			
km inicial	km0+000	D.H	Ancho Promedio	espesor promedio	volumen	Estos 3 segmentos se atendieron en el ramal del corregimiento las Azules; haciendo ceros en las partidas, en las inmediaciones del la vereda la Aladea; se atendieron 3 segmentos donde la banca presentaba un estado de deterioro tan avanzado que muchos vehículos ya no podían transitar por esta zona.
km final	km0+450	450	4,5	0,2	405	
km inicial	km0+960	D.H	Ancho Promedio	espesor promedio	volumen	
km final	km1+500	540	4,5	0,2	486	
km inicial	km4+400	D.H	Ancho Promedio	espesor promedio	volumen	
km final	km4+450	50	4,5	0,8	180	
acta de obra correspondiente			**acta parcial de obra Nº3**			
km inicial	km5+800	D.H	Ancho Promedio	espesor promedio	volumen	Estos 3 segmentos se atendieron en el ramal del corregimiento las Azules; haciendo ceros en las partidas, en las inmediaciones del la vereda la Aladea; se atendieron 3 segmentos donde la banca presentaba un estado de deterioro tan avanzado que muchos vehículos ya no podían transitar por esta zona.
km final	km7+300	1330	2	0,1	266	
km inicial	km9+730	D.H	Ancho Promedio	espesor promedio	volumen	
km final	km11+230	1500	1,6	0,12	288	
km inicial	km11+900	D.H	Ancho Promedio	espesor promedio	volumen	
km final	km13+750	1850	2	0,2	740	
acta de obra correspondiente			**acta parcial de obra Nº4**			
km inicial	km0+000	D.H	Ancho Promedio	espesor promedio	volumen	En el km0+000 al km0+400 se atendió una zona de 3m de ancho por una altura promedio de 0,3m (400 x 3 x 0,3 = 360m3) Desde el sector de la escuela (km1+050), en dirección a la vereda san Antonio se atendió un segmento de 348m por un ancho de 3m por una altura promedio de 0,3m (348 x 3 x 0,3 = 313,2m3)
km final	km0+400	400	3	0,3	360	
km inicial	km1+120	D.H	Ancho Promedio	espesor promedio	volumen	
km final	km1+468	348	3	0,3	313,2	
TOTAL ACTA 4			673,2			

TOTA ACUMULADO= 4.121,5m^3

fecha	viajes	m3
5 de febrero	11	805
6 de febrero	13	
7 de febrero	13	
8 de febrero	10	
9 de febrero	15	
10 de febrero	10	
11 de febrero	5	
12 de febrero	13	
13 de febrero	12	
14 de febrero	13	

Resumen de los metros cúbicos aplicados en el acta parcial de obra Nº1

fecha	viajes	m3
15 de febrero	9	847
16 de febrero	10	
17 de febrero	5	
18 de febrero	0	
19 de febrero	5	
20 de febrero	0	
21 de febrero	4	
22 de febrero	10	
23 de febrero	4	
24 de febrero	0	
25 de febrero	0	
26 de febrero	6	
27 de febrero	10	
28 de febrero	11	
29 de febrero	11	
1 de marzo	10	
2 de marzo	4	
3 de marzo	0	
4 de marzo	4	
5 de marzo	6	
6 de marzo	7	
7 de marzo	5	

Resumen de los metros cúbicos aplicados en el acta parcial de obra Nº2

fecha	viajes	m3
8 de marzo	6	
9 de marzo	0	
10 de marzo	0	
11 de marzo	6	
12 de marzo	7	
13 de marzo	12	
14 de marzo	0	
15 de marzo	0	
16 de marzo	0	
17 de marzo	0	
18 de marzo	0	
19 de marzo	0	
20 de marzo	0	
21 de marzo	0	
22 de marzo	0	
23 de marzo	0	
24 de marzo	0	357
25 de marzo	0	
26 de marzo	0	
27 de marzo	0	
28 de marzo	0	
29 de marzo	0	
30 de marzo	0	
31 de marzo	0	
1 de abril	0	
2 de abril	0	
3 de abril	0	
4 de abril	0	
5 de abril	0	
6 de abril	0	
7 de abril	0	
8 de abril	7	
9 de abril	13	

Resumen de los metros cúbicos aplicados en el acta parcial de obra Nº3

fecha	viajes	m3
8 de marzo	6	
9 de marzo	0	
10 de marzo	0	
11 de marzo	6	
12 de marzo	7	
13 de marzo	12	
14 de marzo	0	
15 de marzo	0	
16 de marzo	0	
17 de marzo	0	
18 de marzo	0	
19 de marzo	0	
20 de marzo	0	
21 de marzo	0	
22 de marzo	0	
23 de marzo	0	
24 de marzo	0	357
25 de marzo	0	
26 de marzo	0	
27 de marzo	0	
28 de marzo	0	
29 de marzo	0	
30 de marzo	0	
31 de marzo	0	
1 de abril	0	
2 de abril	0	
3 de abril	0	
4 de abril	0	
5 de abril	0	
6 de abril	0	
7 de abril	0	
8 de abril	7	
9 de abril	13	

Resumen de los metros cúbicos aplicados en el acta parcial de obra Nº4

TOTAL: 3374m3

Atentamente

JUAN SEBASTIÁN HINCAPIÉ HERNÁNDEZ	**JORGE ALEXANDER BEDOYA HERNÁNDEZ**
INGENIERO CIVIL APOYO JAC VEREDA LA ALDEA	PRESIDENTE JAC VEREDA LA ALDEA

ACTA PARCIAL DE OBRA Nº4 y FINAL

CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.001-2024

FECHA : 20 de mayo de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICONES CONTRACTUALES				CONDICONES ACTAUALIZADAS acta de modificacion N°3		ACTA DE OBRA Nº3		ACTA DE OBRA Nº4		CANTIDADES ACUMULADAS		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Renivelación banca incluye escarificación y conformación	km	41.00	$1,295,664	53,122,206.85	43.35	$ 56,167,016	5	$ 6,478,318	23.8	$ 30,836,793	43.35	$ 56,167,016	0.00	$ -
2	Corte en material común con máquina tipo Bulldozer	m3	3,283.90	$17,537	57,589,296.86	4,121.50	$ 72,278,127	1294.0097	$ 22,692,854	672.4903049	$ 11,793,362	4,121.50	$ 72,278,127	0.00	$ -
3	Sub-base para conformación de vía, incluye transporte	m3	1,450.00	$43,587	63,201,539.76	0.00	$ -	0	$ -	0	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
OE.1	Aplicación de afirmado crudo no procesado, extraído de los derrumbes de la zona	m3		$29,000		3,366.96	$ 97,641,813	51	$ 1,479,000	1669.959068	$ 48,428,813	3,366.96	$ 97,641,813	0.00	$ -

	COSTO DIRECTO	$	173,913,043		$	226,086,956		$	30,650,172		$	91,058,968		$	226,086,956		$	-
	COSTO INDIRECTO (AU = 15%)	$	26,086,957		$	33,913,043		$	4,597,526		$	13,658,845		$	33,913,043		$	-
	COSTO TOTAL OBRA ORDINARIA	**$**	**200,000,000**		**$**	**260,000,000**		**$**	**35,247,698**		**$**	**104,717,813**		**$**	**260,000,000**		**$**	**-**

JUAN SEBASTIÁN HINCAPIÉ HERNÁNDEZ

INGENIERO CIVIL APOYO JAC VEREDA LA ALDEA

JORGE ALEXANDER BEDOYA HERNÁNDEZ

PRESIDENTE JAC VEREDA LA ALDEA

LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO

Secretario de Infraestructura

COMITÉ DE OBRA Nº3

NUMERO CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.001-2024
CONTRATISTA	LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ALDEA
NIT o C.C.	900.829.118-4
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALEXANDER BEDOYA HERNANDEZ
CEDULA	71.268.272
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
PLAZO INICIO	2 (dos) meses
VALOR DEL CONVENIO	$260.000.000 APORTE ECONÓMICO MUNICIPIO
ACTA DE INICIO	05 de febrero de 2024

El día 16 de abril de 2024 se reunieron en la secretaria de infraestructura del municipio de Santa Fe de Antioquia las siguientes personas: Jorge Alexander Bedoya Hernández como presidente de la junta de acción comunal de la vereda la Aldea y contratista del presente convenio solidario; León Esnaider Quiroz Osorio, como secretario de infraestructura del municipio de Santa Fe de Antioquia y supervisor del convenio solidario y Juan Sebastián Hincapié Hernández, como apoyo técnico contratado por la junta de acción comunal de la vereda la Aldea.

El día de hoy, restan 34 días para concluir el plazo contractual del presente convenio solidario (concluye el 20 de mayo). Al día de hoy ya la niveladora atendió el todo el ramal de Tonuco Arriba hasta el kilometro cinco; también atendió los ramales de las veredas del Churimbo y la vereda del Rodeo.

El bulldozer atendió todo el ramal de la vereda Ogosco y todo el ramal hacia el corregimiento de las Azules.

al día de hoy no se pueden trabajar muchas horas al día, a raíz de las fuertes lluvias que están cayendo por toda la región del occidente antioqueño; se da la directriz de no laborar mientras este lloviendo, después que cesen las precipitaciones se debe esperar que el terreno drene y seque lo suficiente para que no se generen lodos y en lugar de mejorar la banca esta empeore esto tanto para la niveladora como para el bulldozer; el convenio continua aportando las volquetas y adicionalmente apoyara la volqueta del municipio de Santa Fe de Antioquia, dejando claro que los acarreos realizados por esta volqueta no se computaran en los pagos a autorizar.


Se determina que el bulldozer realizara las mejores necesarias en el ramal hacia la vereda el Carmen, este ramal tiene km0+000 en las inmediaciones del centro poblado del corregimiento de las azules; se deja claro que las actividades llagaran hasta el puente peatonal donde no es prudente que este equipo transite.

Las partes, concluyen que el plazo del convenio y el presupuesto esta concluyente; se deben hacer las verificaciones y los chequeos de las cantidades ejecutadas pues no hay posibilidad de una nueva adición de recursos ni de prorrogar el convenio solidario.





JUAN SEBASTIÁN HINCAPIÉ HERNÁNDEZ	**JORGE ALEXANDER BEDOYA HERNÁNDEZ**
INGENIERO CIVIL APOYO JAC VEREDA LA ALDEA	PRESIDENTE JAC VEREDA LA ALDEA



LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Secretario de infraestructura

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 900829118	4	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ALDEA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUNTA COMUNAL	c.y.afiliaciones@hotmail.com	SANTAFE DE ANTIOQUIA-ANTIOQUIA	3192454376

Clave: 9465933003

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/05/07	0	$0	$1,467,200
2024/05/08	1	$1,600	$1,468,800
2024/05/09	2	$2,700	$1,469,900
2024/05/10	3	$3,800	$1,471,000
2024/05/14	7	$8,800	$1,476,000
2024/05/15	8	$9,900	$1,477,100
2024/05/16	9	$11,000	$1,478,200
2024/05/17	10	$12,400	$1,479,600
2024/05/20	13	$16,000	$1,483,200
2024/05/21	14	$17,000	$1,484,200

Periodo Pensión: 2024-04 **Periodo Salud: 2024-05**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	2	$416,000
PORVENIR		2	$416,000
ARL	1	3	$212,700
ARL SURA		3	$212,700
CCF	1	3	$156,000
COMFAMA		3	$156,000
EPS	3	3	$487,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		1	$162,500
SALUD TOTAL		1	$162,500
SAVIA SALUD		1	$162,500
ICBF	1	3	$117,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		3	$117,000
SENA	1	3	$78,000
SENA		3	$78,000
SUBTOTAL			$1,467,200
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$1,467,200

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900829118	4	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ALDEA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUNTA COMUNAL	VEREDA LA ALDEA	SANTAFE DE ANTIOQUIA-ANTIOQUIA	8531152	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05		9465933003	E	2024/05/07			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JUNTA COMUNAL (3 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$3,900,000	$487,500			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$212,700		$3,900,000	$195,000		$1,467,200
Centro de Trabajo: INGENIEROS (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$31,700		$1,300,000	$65,000		$519,200
Ciudad: SANTAFE DE ANTIOQUIA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$31,700		$1,300,000	$65,000		$519,200
1	CC	15406513	HINCAPIE JUAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$1,300,000	$65,000	No	$519,200
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$2,600,000	$325,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$2,600,000	$130,000		$948,000
Ciudad: SANTAFE DE ANTIOQUIA Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$2,600,000	$325,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$2,600,000	$130,000		$948,000
2	CC	71268272	BEDOYA JORGE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$162,500	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
3	CC	70096075	PINEDA JOSE																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$370,000
Total	**Afiliados(3)**																						$2,600,000	$416,000			$3,900,000	$487,500			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$212,700		$3,900,000	$195,000		$1,467,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900829118	4	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ALDEA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUNTA COMUNAL	VEREDA LA ALDEA	SANTAFE DE ANTIOQUIA-ANTIOQUIA	8531152	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05		9465933003	E	2024/05/07			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$212,700	$0	$0	$212,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$212,700	$0	$0	$212,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$156,000	$0	$0	$156,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	3	$156,000	$0	$0	$156,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$487,500	$0	$0	$487,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$162,500	$0	$0	$162,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$117,000	$0	$0	$117,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$117,000	$0	$0	$117,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$78,000	$0	$0	$78,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$78,000	$0	$0	$78,000
TOTAL				**3**	**$1,467,200**	**$0**	**$0**	**$1,467,200**

Multipagas

OFC: 4030 - RM - Santafe de Antioquia

FCH: 08/05/2024 10:22:08 AM

CAI: LAALVAREZ - LAURA ALVAREZ

TRANSACCION	REFERENCIA	IMPORTE
Av Villas PLANILLA ASISTIDA OP. BANCARIO	9465933003	1,468,800.00

CANTIDAD: 1 TOTAL: 1,468,800.00

MEDIOS DE PAGO

	VALOR
Efectivo Recibido	1,468,800.00

63bb6a691d4b4e86b0531f1a8f84b62e4

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ALDEA
NIT 900.829.118-4
VDA LA ALDEA
Tel: (604) 3192454376
Santafé De Antioquia - Colombia
alexbedoya2810@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. ALD 8

Señores	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA		
NIT	890.907.569-1	**Teléfono**	(604) 4447177 - Ext. 000
Dirección	CR 9 9 22	**Ciudad**	Santafé De Antioquia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/05/2024, 23:31
Expedición	21/05/2024, 23:31
Vencimiento	21/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Renivelación banca incluye escarificación y conformación	24.30	31,484,635.20
2	Corte en material común con máquina tipo Bulldozer	672.50	11,793,632.50
3	Aplicación de afirmado crudo no procesado, extraído de los derrumbes de la zona	1,647.62	47,780,980.00
4	COSTO INDIRECTO (AU 15%)	1.00	13,658,565.30

Total items: 4

Valor en Letras:
Ciento cuatro millones setecientos diecisiete mil ochocientos trece pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 104,717,813.00

Total Bruto	104,717,813.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**104,717,813.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764065639547 aprobado en 20240214 prefijo ALD desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: c9ee841ac3e3ba06c3656f786e419f30ffec74df138642eb491c87718ffc386fc68ab0c9fb7b200c34bf000fbdd93bd0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ALDEA

Santa Fe de Antioquia, 22 de mayo de 2024

Señores
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Asunto: Certificado Aportes

Mediante la presente de certifica que LA **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ALDEA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA**, se encuentra a paz y salvo en los últimos seis meses por concepto de pago de los aportes parafiscales y a la seguridad social (caja de compensación familiar, salud, pensiones y riesgos profesionales) de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y lo establecido en la ley 1607 de 2012 y decreto 862 de 2013.

Dado en Santa fe de Antioquia, a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2024.

JORGE ALEXANDER BEDOYA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 71.268.272
