INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	220-C.M.A.2019 (de fecha 4 de septiembre de 2019)
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	$ 62.589.240
Fecha Acta de inicio interventoría	10/09/2019
Pagos realizados a la interventoría	**NO TIENE**
Estado del contrato de Interventoría	**Está suspendido desde el** 06/07/2022

7. INFORME GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CODIGO BPIN	**2018000030163**
VALOR DEL PROYECTO	**$2.138.819.094**
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO DE SUCRE – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -AIL	Gobernación del Cauca (Fonde de compensación regional) $ **883.296.651** Gobernación de Cauca- **Propios** **$576.764.944** Municipio de Sucre Cuca, FONPET SGR para la implementación del Acuerdo Final para la paz **$ 883.120.009** **Municipio de sucre Cauca- Propios $ 96.581.199**
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	**Decreto 14 del 6 de junio de 2019** **Decreto 3753 de fecha 27 de febrero de 2019**
ESTADO DEL PROYECTO	**EN EJECUCIÓN**
AJUSTES APROBADOS	**NO TIENE REPORTADOS EN EL GESPROY**
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYRCTO	

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SUCRE NIT: 817.003.440-5		Código: 120-5 Versión: 01 Fecha: 11/01/2019 Página 10 de 1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	224-2019 (de fecha 11/09/2019)
FECHA DE ACTA DE INICIO	29/10/2019
FECHA DE SUSPENCIÓN	El Contrato 224 – 2019, está suspendido desde el 6 de febrero de 2022
PAGOS REALIZADOS	**$2.136.799.088,96**
Saldo pendiente de pago al contrato de obra pública	**Saldo por pagar total $302.963.714,04, discriminados así:** De Propios $ 204.516.451 De FONPET SGR para la implementación del Acuerdo Final para la paz $ 96.769.962,84 De Fonde de compensación regional $ 1.677.300,20
CONTRATO DE COMPRAVENTA	**N° 94570 DE FECHA 11 DE agosto de 2022**
VALOR CONTRATO	**$ 148.324.413,16**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA	18/08/2022
SALDO PENDIENTE DE EJECUTAR	0.00
PORCENTAJE DE EJCUCIÓN	100%
OBSERVACIONES	La entidad designada para contratar la Interventoría es la Gobernación del Cauca

8. INFORME GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VIA SUCRE – EL PARAISO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LOS SECTORES: LA CEJA, QUITETO, CRUCERO BELLO, LA GRANJA, EL CARMELO, EL PARAISO, MUNICIPIO SUCRE, CAUCA
CODIGO BPIN	**20181301010785**
VALOR DEL PROYECTO	**$5.059.210.820**
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO DE SUCRE	- Asignación para la Paz (Municipios)- 2017- $ 4.959.210.820 - PROPIOS: $100.000.000
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	Acuerdo N° 11 del 21/12/2018
POBLACIÓN BENEFICIARIA	**4.850**
ESTADO DEL PROEYCTO A LA FECHA	**EN EJECUCIÓN**
AJUSTES APROBADOS	**NO TIENE REPORTADOS EN EL GESPROY**
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYRCTO	
CONTRATO DE OBRA	LP-072-2023 - 901664669-CONSORCIO CONSTRUOBRAS
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$4.633.534.751 de fecha 6 de enero de 2023
FECHA ACTA DE INICIO	16/03/2023
PAGOS REALIZADOS	$2,426,583,044.4
Saldo pendiente por pagar	$2.632.627.775,57 de las siguientes fuentes: **Propios – Municipio de Sucre $ 100.000.000** Asignación para la Paz (Municipios) $ 2.532.627.775,57
OBSERVACIONES	La Interventoría la realiza INVÍAS, por intermedio del: NIT -901327195-CONSORCIO INTEROBRAS
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	$325,676,069

9. INFORME GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO	**Implementación de medidas de rehabilitación ecológica en zona rural del municipio de sucre departamento del Cauca**
CODIGO BPIN	**2023197850032**
VALOR DEL PROYECTO	**$545.327.876**
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO DE SUCRE	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE- SGR - Asignación para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible $ **545.327.876**
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	190 (26 de diciembre de 2023)
POBLACIÓN BENEFICIARIA	**450 (105 familias)**
ESTADO DEL PROEYCTO A LA FECHA	**SIN CONTRATAR**
ENTIDAD DESIGNADO COMO EJECUTORA	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO SAS identificada con el NIT 901488582-8
AJUSTES APROBADOS	**NO TIENE**
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYRCTO	
CONTRATO DE OBRA	**NO TIENE**
OBSERVACIONES	**Teniendo en cuenta, que el Decreto 190 se asignó como entidad ejecutora, se debe establecer comunicación con el fondo** SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO SAS, que permita al municipio en calidad de aportante de los recursos del SGR de ASIGNACIONES PARA LA INVERSIÓN LOCAL DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, permita colocar condiciones para la ejecución, teniendo en cuenta que todavía no se ha iniciado su proceso de contratación. **También hay que establecer, que el proyecto no contempla costos de interventoría, lo que dificulta hacer seguimiento al proyecto.** **Es un proyecto para la construcción de 105 estufas móviles, y la implantación de arboles nativos**
INTERVENTORÍA	**NO TIENE CONTRATO**

10. INFORME GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO	Mejoramiento de vía terciaria mediante tratamiento superficial doble en la vía que comunica al corregimiento de Cascadas con la cabecera municipal municipio de Sucre - Cauca
CODIGO BPIN	**2023197850033**
VALOR DEL PROYECTO	**$ 1.099.998.690**
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO DE SUCRE	SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría $**1.099.998.690**
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	**189 (de fecha 22/12/2023)**
POBLACIÓN BENEFICIARIA	**2.000 PERSONAS**
ESTADO DEL PROEYCTO A LA FECHA	**SIN CONTRATAR, LO QUE SE REPORTA EN EL GESPROY**
ENTIDAD DESIGNADO COMO EJECUTORA	MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE EMBALSES RIO NEGRO NARE - MASER
AJUSTES APROBADOS	**NO TIENE**
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYRCTO	
CONTRATO DE OBRA	**NO TIENE**
OBSERVACIONES	**Teniendo en cuenta, que el Decreto 189 (de fecha 22 de diciembre de 2023) se asignó como entidad ejecutora, el fondo** MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE EMBALSES RIO NEGRO NARE - MASER, que permita al municipio en calidad de aportante de los recursos del SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, permita colocar condiciones para la ejecución, teniendo en cuenta que todavía no se ha iniciado su proceso de contratación.
INTERVENTORIA	**NO TIENE CONTRATO**

11. INFORME GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN VILLA OLIMPICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE, CAUCA
CODIGO BPIN	**2013003190011**
VALOR DEL PROYECTO	**$1.527.612.960**
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO DE SUCRE	**Gobernación del Cauca- SGR -DIRECTAS $700.000.000** **Gobernación del Cauca- PROPIOS $** 299.612.960 **MUNICIPIO SUCRE -** Fondo de Compensación Regional $ 328.000.000 MUNICIPIO DE SUCRE – PROPIOS $ 200.000.000
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	**DECRETO N° 006 (25/06/2013)**
POBLACIÓN BENEFICIARIA	**4.653**
ESTADO DEL PROEYCTO A LA FECHA	**EN EJECUCIÓN**
AJUSTES APROBADOS	**2 AJUSTES (EL PRIMERO (14/05/2014), modificaciones de actos administrativos y el SEGUNDO (17/06/2018), consistente en incrementar el valor del proyecto y adicionar tiempo de ejecución**
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYRCTO	
CONTRATOS DE OBRA	1. F1-F14-102-2014 (26/06/2014) $ 960.625.278 – liquidado el 8 de noviembre de 2020 2. 210 (27/11/2020) $ 468.761.558 -Suspendido – NIT: 901490601-CONSORCIO CONSTRUPACIFICO 2021
PAGOS A LA FECHA	Contrato: F1-F14-102-2014 (26/06/2014) $ 952.330.621 Contrato N° 210 (27/11/2020) $ 176.424.276
OBSERVACIONES	**Las obras del contrato N° 210 – Están suspendidas- en proceso de declarar el incumplimiento, por la no ejecución de las obras establecidas en el contrato**
INTERVENTORIA	**La Interventoría, la realiza la Gobernación del Cauca**

Departamento Nacional de Planeación - **DNP**

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD RECIPROCO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION Y EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA

Yo DEYBY ANTONIO ARMERO CERON, identificado con C.C. No. 1.089.483.588, expedida en LA UNION NARIÑO, obrando en mi calidad de SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SUCRE CAUCA, me comprometo a mantener la integridad, reserva y confidencialidad de la información de los Sistemas de Información suministrados por el DNP, que conozca con ocasión del desarrollo de las tareas de administración, configuración de usuarios y entidades en los Sistemas de Información del DNP.

Con la firma del presente documento, me comprometo a abstenerme de revelar la información confidencial de la que tenga conocimiento, siendo consciente de las penas, multas y sanciones derivadas del incumplimiento, al igual de las demás acciones que puedan llegar a derivarse de éste y del Acuerdo de Confidencialidad Reciproco suscrito entre el **DNP** y **EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA**

Por lo tanto, me hago responsable de seguir las políticas de seguridad y procedimientos para el uso de acceso a la información, evitando cualquier práctica o uso inapropiado que pudiera poner en peligro la información, integridad y reputación de los Sistemas de Información del DNP, estipuladas en las políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del DNP, así como lo establecido en el Acuerdo de Confidencialidad Reciproco suscrito entre el **DNP** y **EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA**

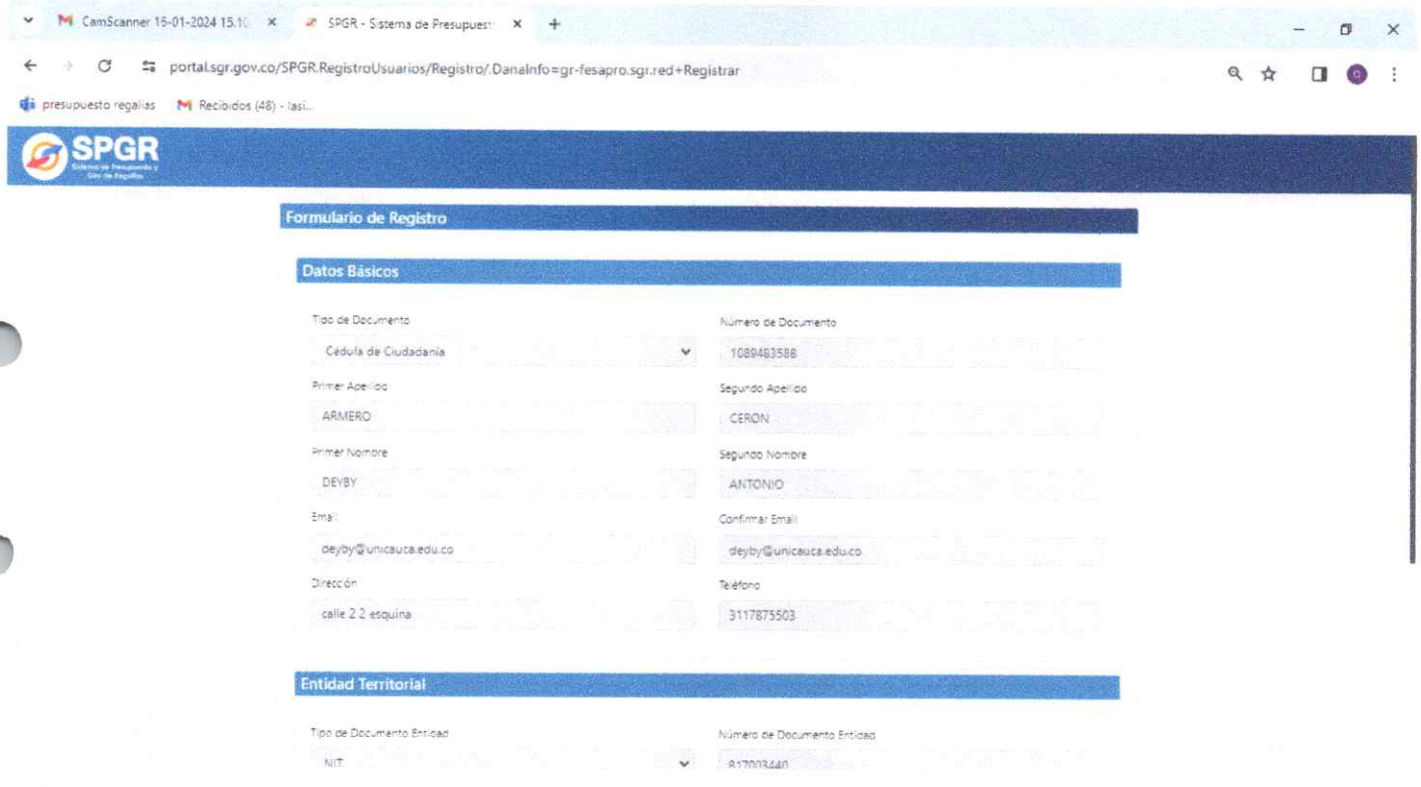
En señal de expresa conformidad y aceptación de los términos recogidos en el presente compromiso se firma en la ciudad de Sucre Cauca, a los xxx (xxx), días de mes de enero del año dos mil veinticuatro - 2024.

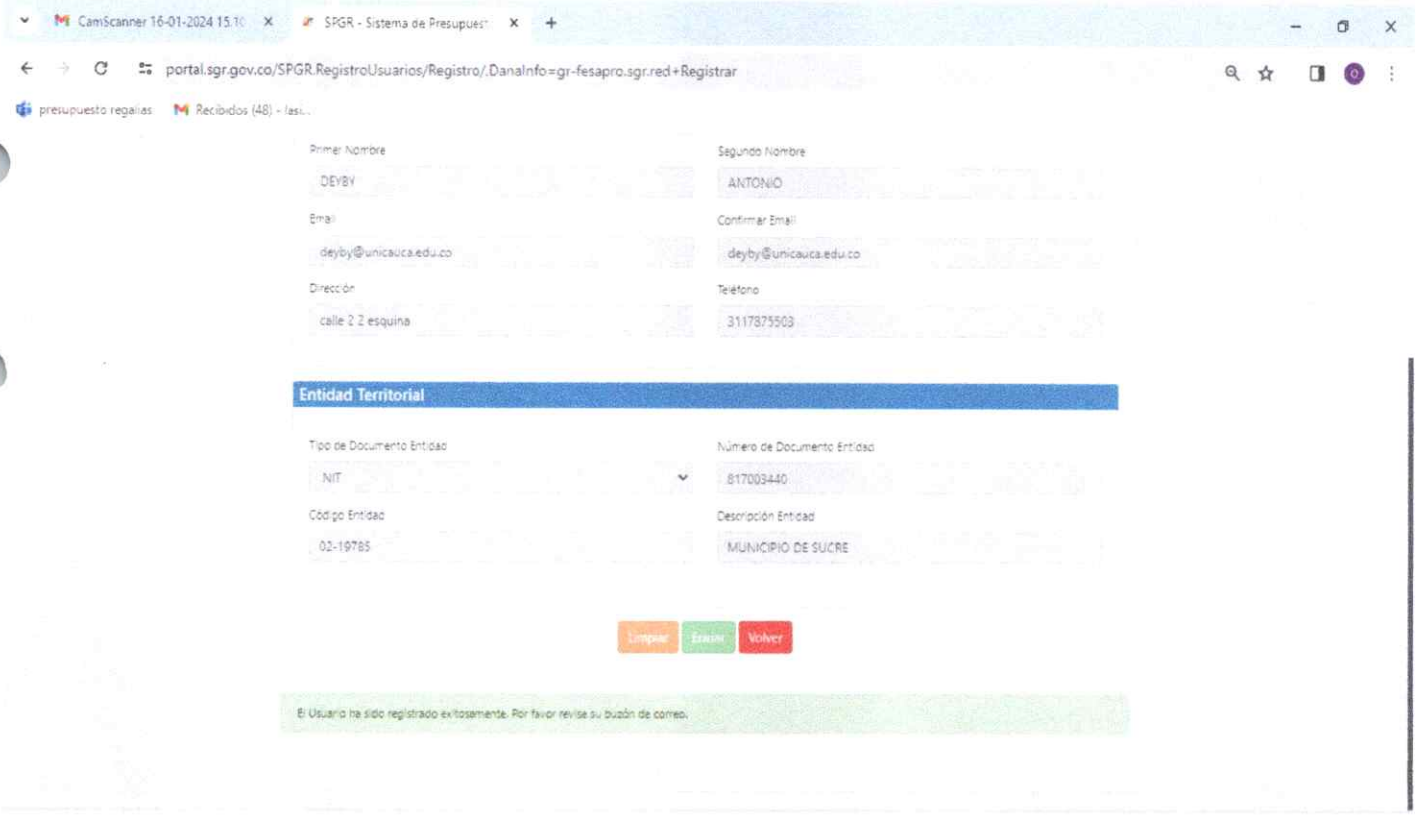
Nombre: DEYBY ANTONIO ARMERO CERON
C.C No. 1.089.483.588

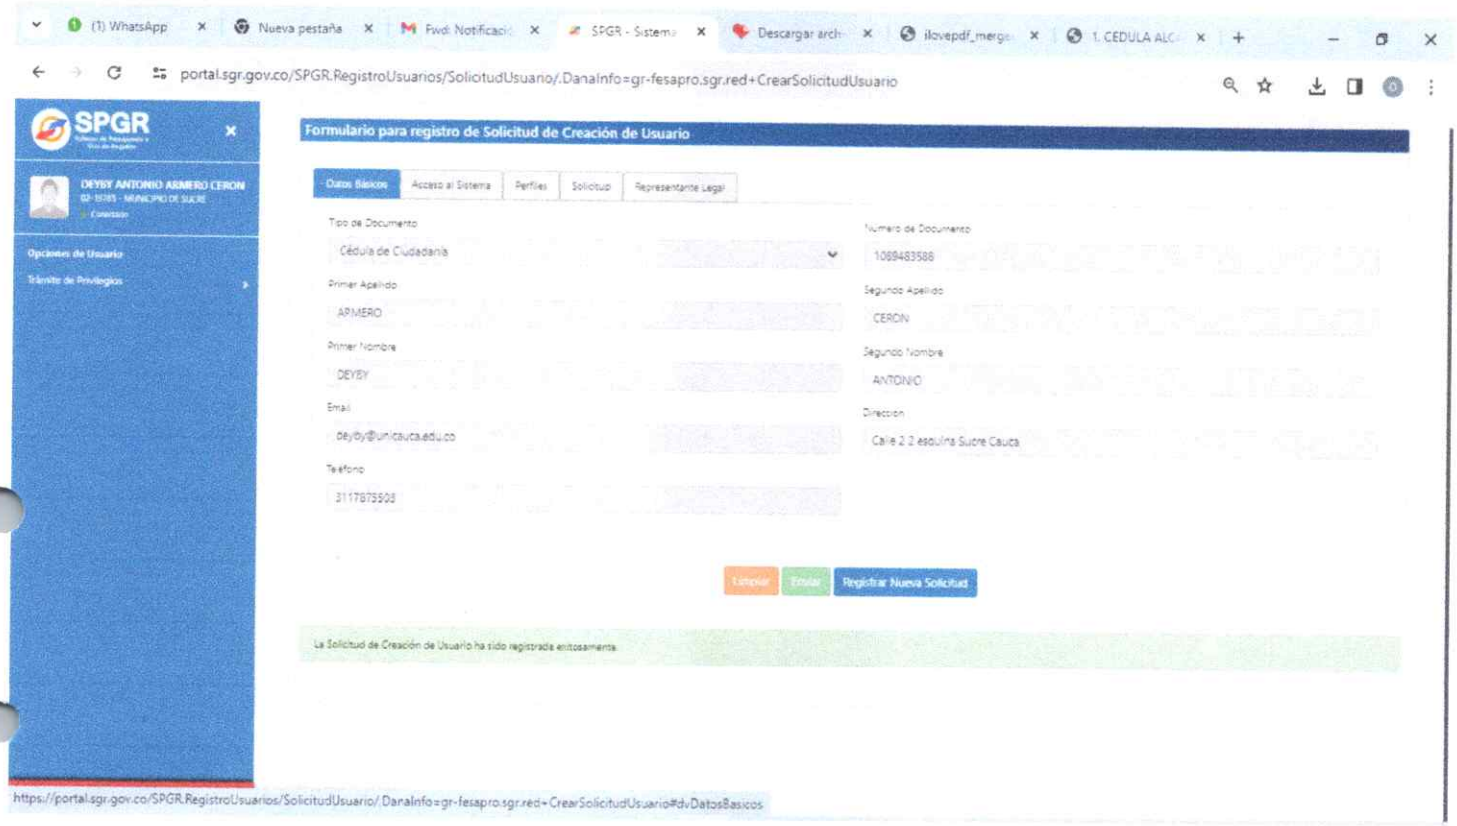
Firma: _____

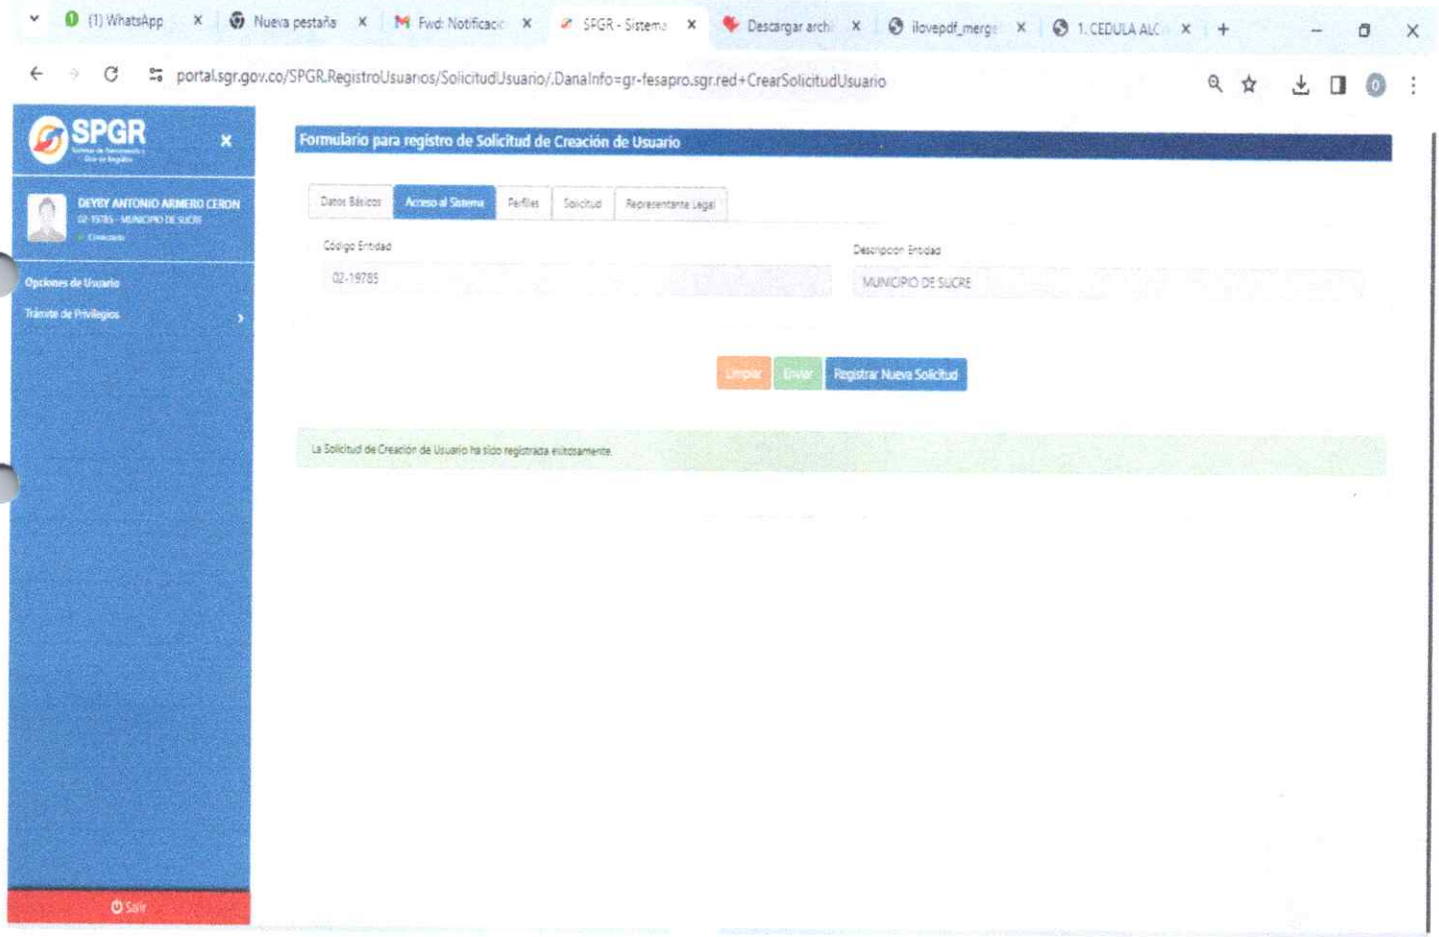
SOPORTE ACTIVIDAD 2.2: Apoyo en el manejo de las plataformas digitales del sistema general de regalías de como el GESPROY, SIRECI, de la contraloría general de la república y el SUIFP-SGR; SPGR - SGR

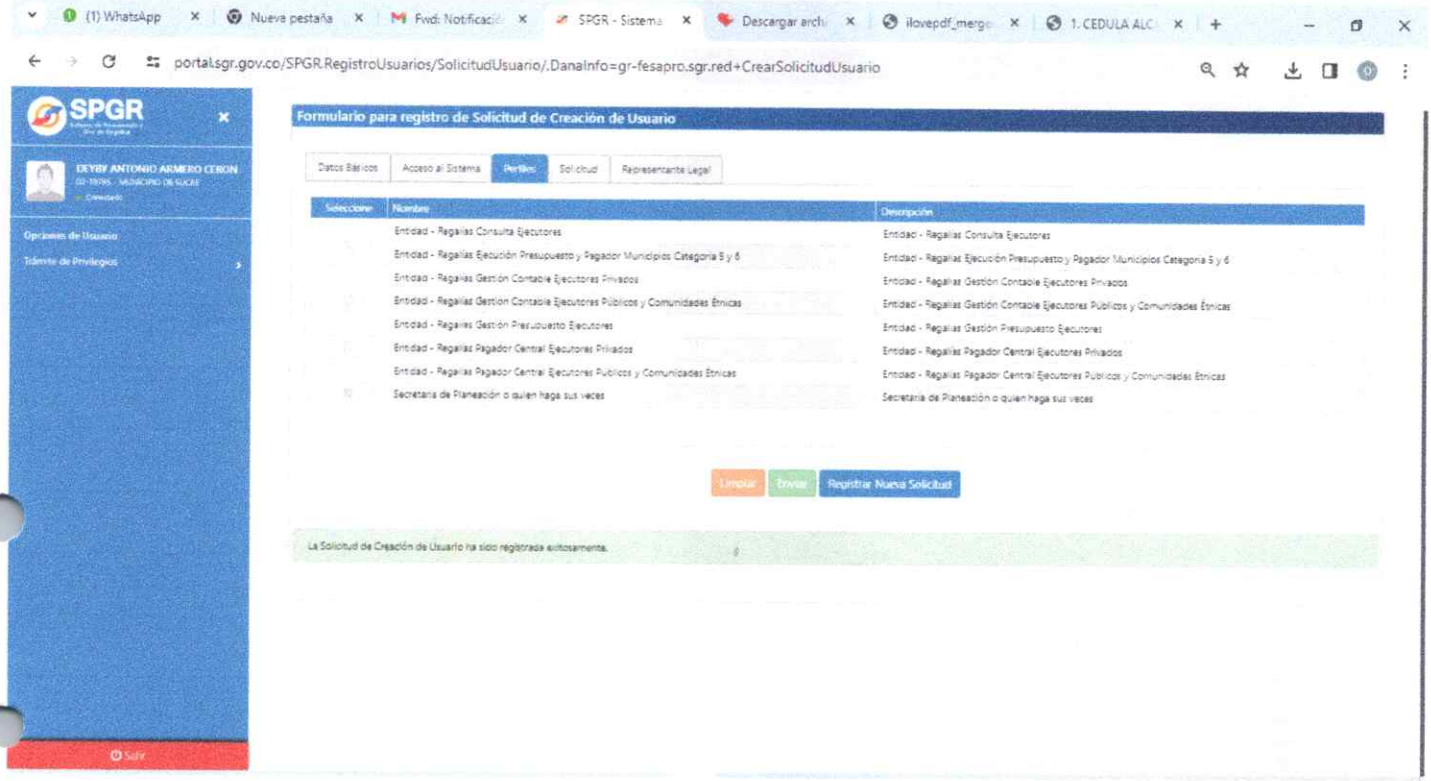
Se adjunto captura de imágenes, donde se indican la solicitud, ante el Sistema de Pago y Giro de Regalías - SPGR, los usuarios y contraseñas, con los roles del Usuario Registrador, de la Secretaria Técnica; Gestión contable, Gestión Pagador Central, Gestión Presupuesto

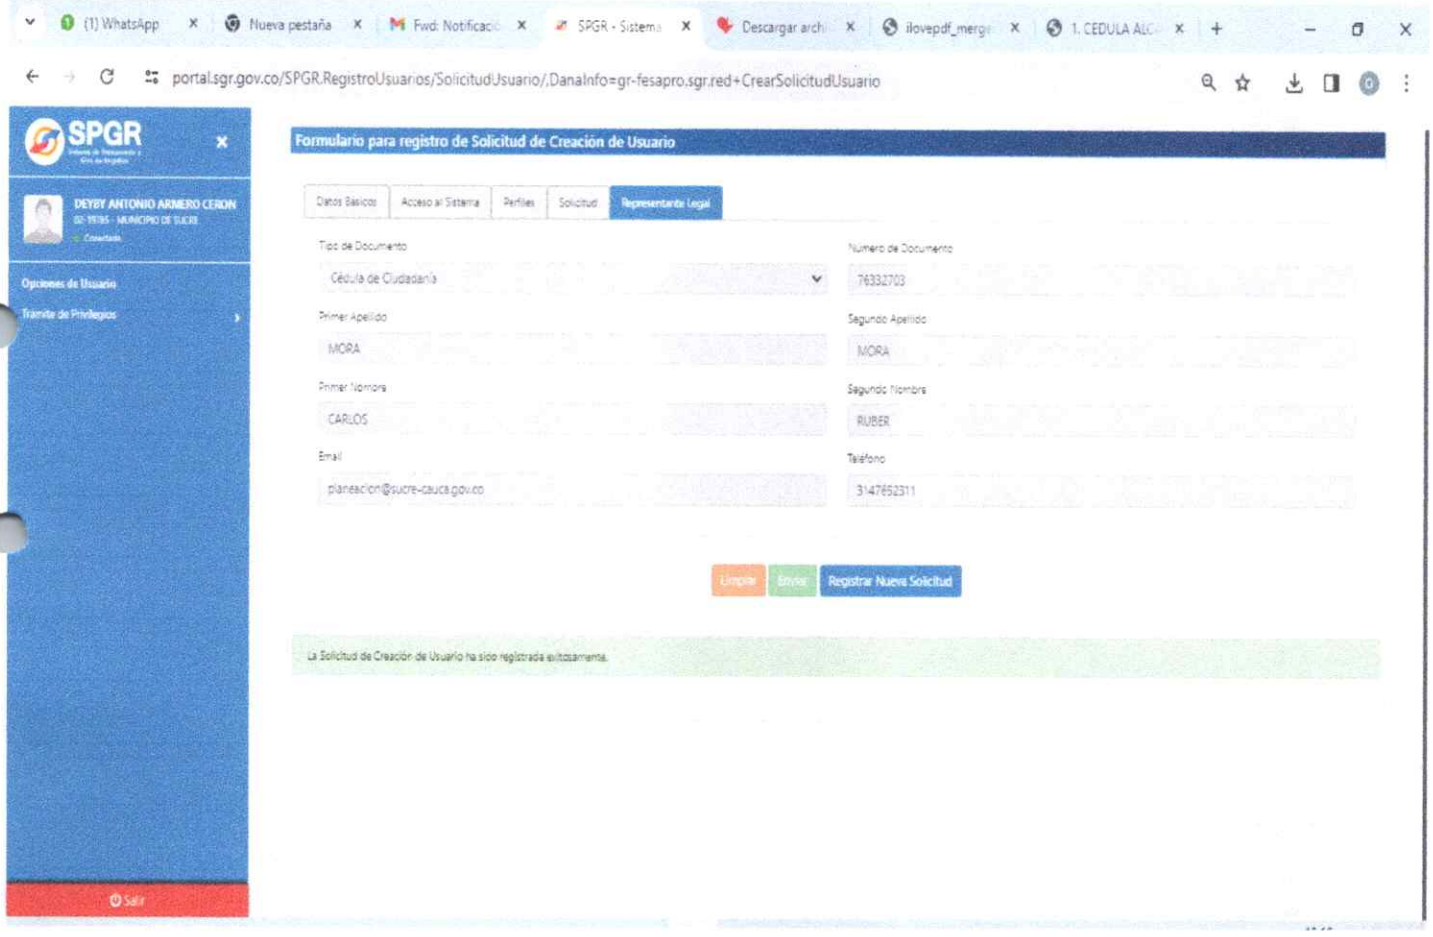


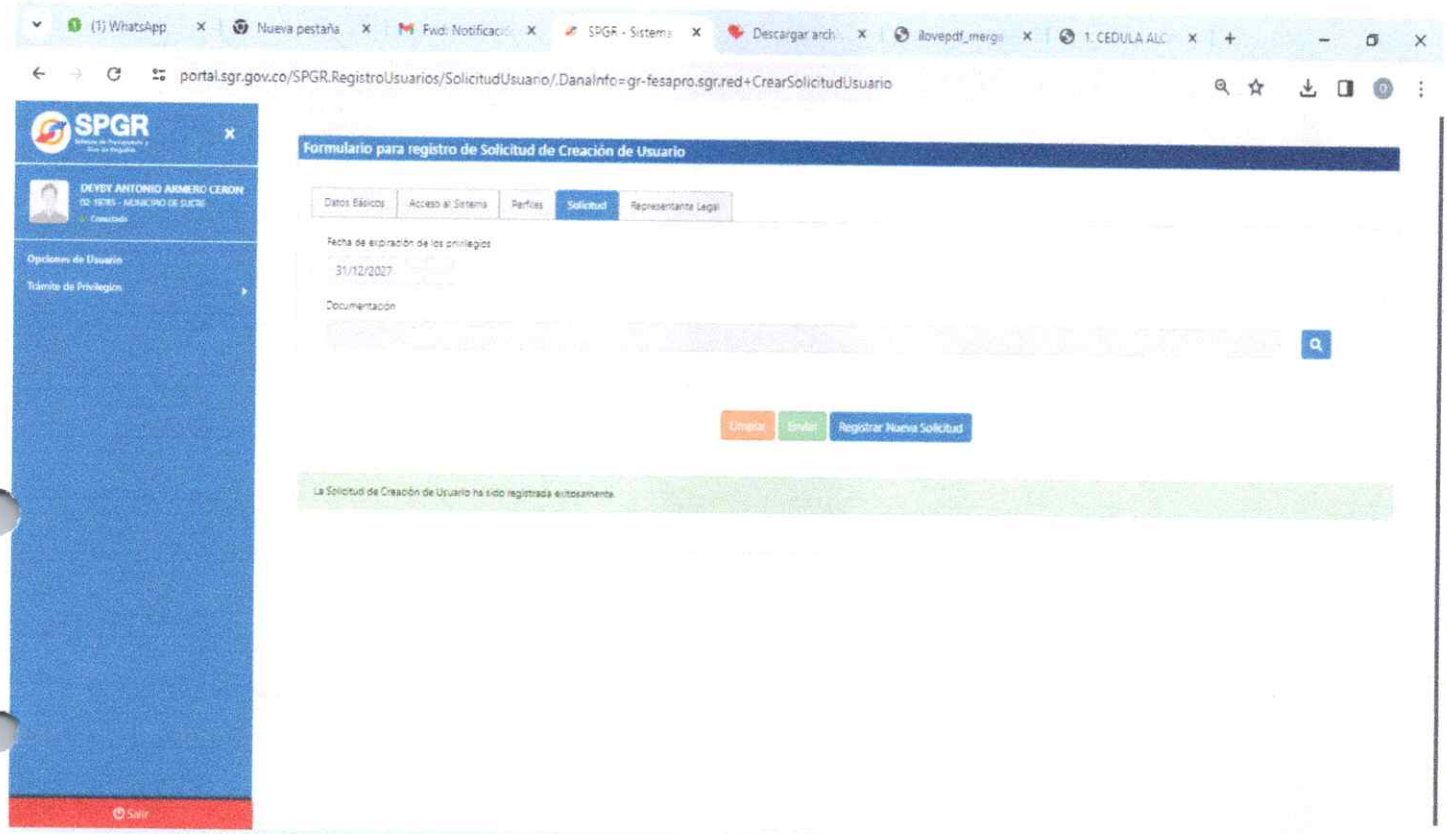


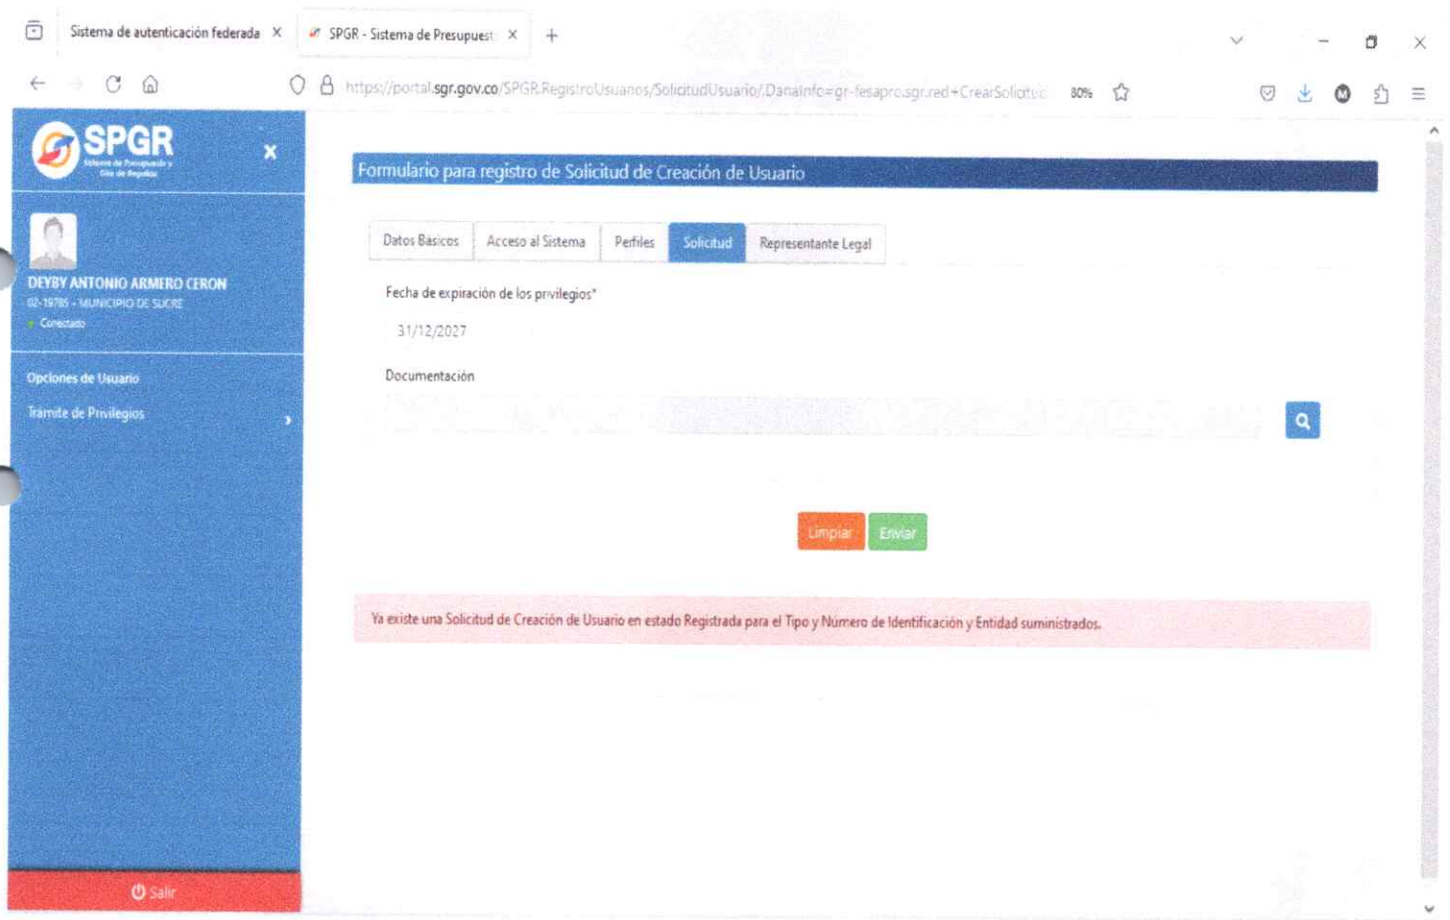

(1) WhatsApp
Nueva pestaña
Fwd: Notificaci
SPGR - Sistema
Descargar arch
ilovepdf_merge
1. CEDULA ALC
portal.sgr.gov.co/SPGR.RegistroUsuarios/SolicitudUsuario/.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+CrearSolicitudUsuario
SPGR
DEYBY ANTONIO ARMERO CERON
02-19785 - MUNICIPIO DE SUCRE
Conectado
Opciones de Usuario
Trámite de Privilegios
Formulario para registro de Solicitud de Creación de Usuario
Datos Básicos
Acceso al Sistema
Perfiles
Solicitud
Representante Legal
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Numero de Documento
1069483588
Primer Apellido
ARMERO
Segundo Apellido
CERON
Primer Nombre
DEYBY
Segundo Nombre
ANTONIO
Email
deyby@unicauca.edu.co
Direccion
Calle 2 2 esquina Sucre Cauca
Teléfono
3117875503
Limpiar
Enviar
Registrar Nueva Solicitud
La Solicitud de Creación de Usuario ha sido registrada exitosamente.
https://portal.sgr.gov.co/SPGR.RegistroUsuarios/SolicitudUsuario/.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+CrearSolicitudUsuario#dvDatosBasicos


(1) WhatsApp
Nueva pestaña
Fwd: Notificaci
SPGR - Sistema
Descargar arch
ilovepdf_merge
1. CEDULA ALC
portal.sgr.gov.co/SPGR.RegistroUsuarios/SolicitudUsuario/.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+CrearSolicitudUsuario
SPGR
DEYBY ANTONIO ARMERO CERON
02-19785 - MUNICIPIO DE SUCRE
Conectado
Opciones de Usuario
Trámite de Privilegios
Salir
Formulario para registro de Solicitud de Creación de Usuario
Datos Básicos
Acceso al Sistema
Perfiles
Solicitud
Representante Legal
Código Entidad
02-19785
Descripcion Entidad
MUNICIPIO DE SUCRE
Limpiar
Enviar
Registrar Nueva Solicitud
La Solicitud de Creación de Usuario ha sido registrada exitosamente.

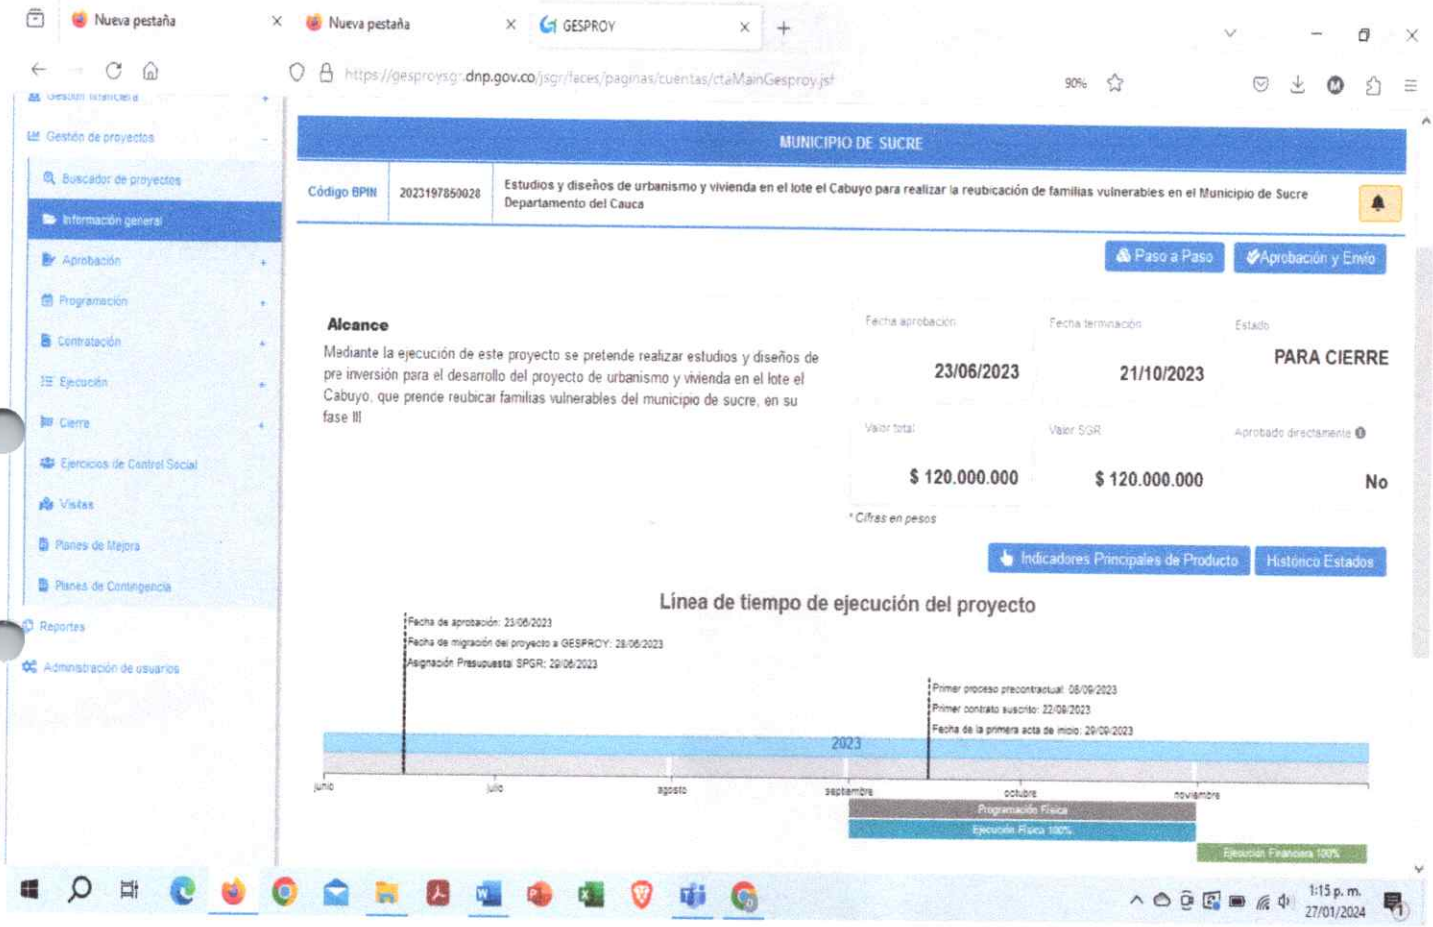

(1) WhatsApp
Nueva pestaña
Fwd: Notificaci
SPGR - Sistema
Descargar archi
ilovepdf_merge
1. CEDULA ALC
portal.sgr.gov.co/SPGR.RegistroUsuarios/SolicitudUsuario/.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+CrearSolicitudUsuario
SPGR
DEYBY ANTONIO ARMERO CERON
Opciones de Usuario
Trámite de Privilegios
Salir
Formulario para registro de Solicitud de Creación de Usuario
Datos Básicos
Acceso al Sistema
Perfiles
Solicitud
Representante Legal
Seleccione
Nombre
Descripción
Entidad - Regalías Consulta Ejecutores
Entidad - Regalías Ejecución Presupuesto y Pagador Municipios Categoria 5 y 6
Entidad - Regalías Gestión Contable Ejecutores Privados
Entidad - Regalías Gestión Contable Ejecutores Públicos y Comunidades Étnicas
Entidad - Regalías Gestión Presupuesto Ejecutores
Entidad - Regalías Pagador Central Ejecutores Privados
Entidad - Regalías Pagador Central Ejecutores Publicos y Comunidades Étnicas
Secretaria de Planeación o quien haga sus veces
Limpiar
Enviar
Registrar Nueva Solicitud
La Solicitud de Creación de Usuario ha sido registrada exitosamente.

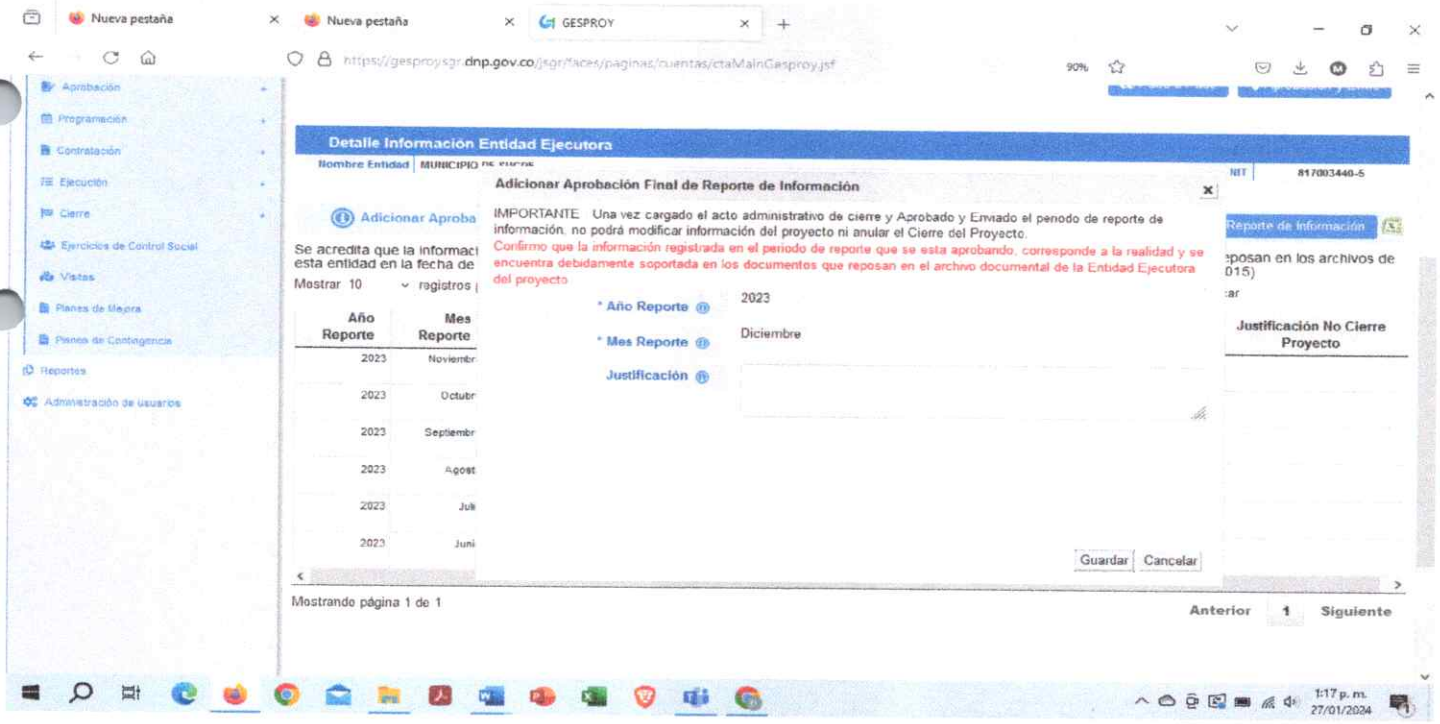

(1) WhatsApp
Nueva pestaña
Fwd: Notificaci
SPGR - Sistema
Descargar archi
ilovepdf_merge
1. CEDULA ALC
portal.sgr.gov.co/SPGR.RegistroUsuarios/SolicitudUsuario/.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+CrearSolicitudUsuario
SPGR
DEYBY ANTONIO ARMERO CERON
Opciones de Usuario
Trámite de Privilegios
Salir
Formulario para registro de Solicitud de Creación de Usuario
Datos Básicos
Acceso al Sistema
Perfiles
Solicitud
Representante Legal
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Numero de Documento
76332703
Primer Apellido
MORA
Segundo Apellido
MORA
Primer Nombre
CARLOS
Segundo Nombre
RUBER
Email
planeacion@sucre-cauca.gov.co
Teléfono
3147652311
Limpiar
Enviar
Registrar Nueva Solicitud
La Solicitud de Creación de Usuario ha sido registrada exitosamente.

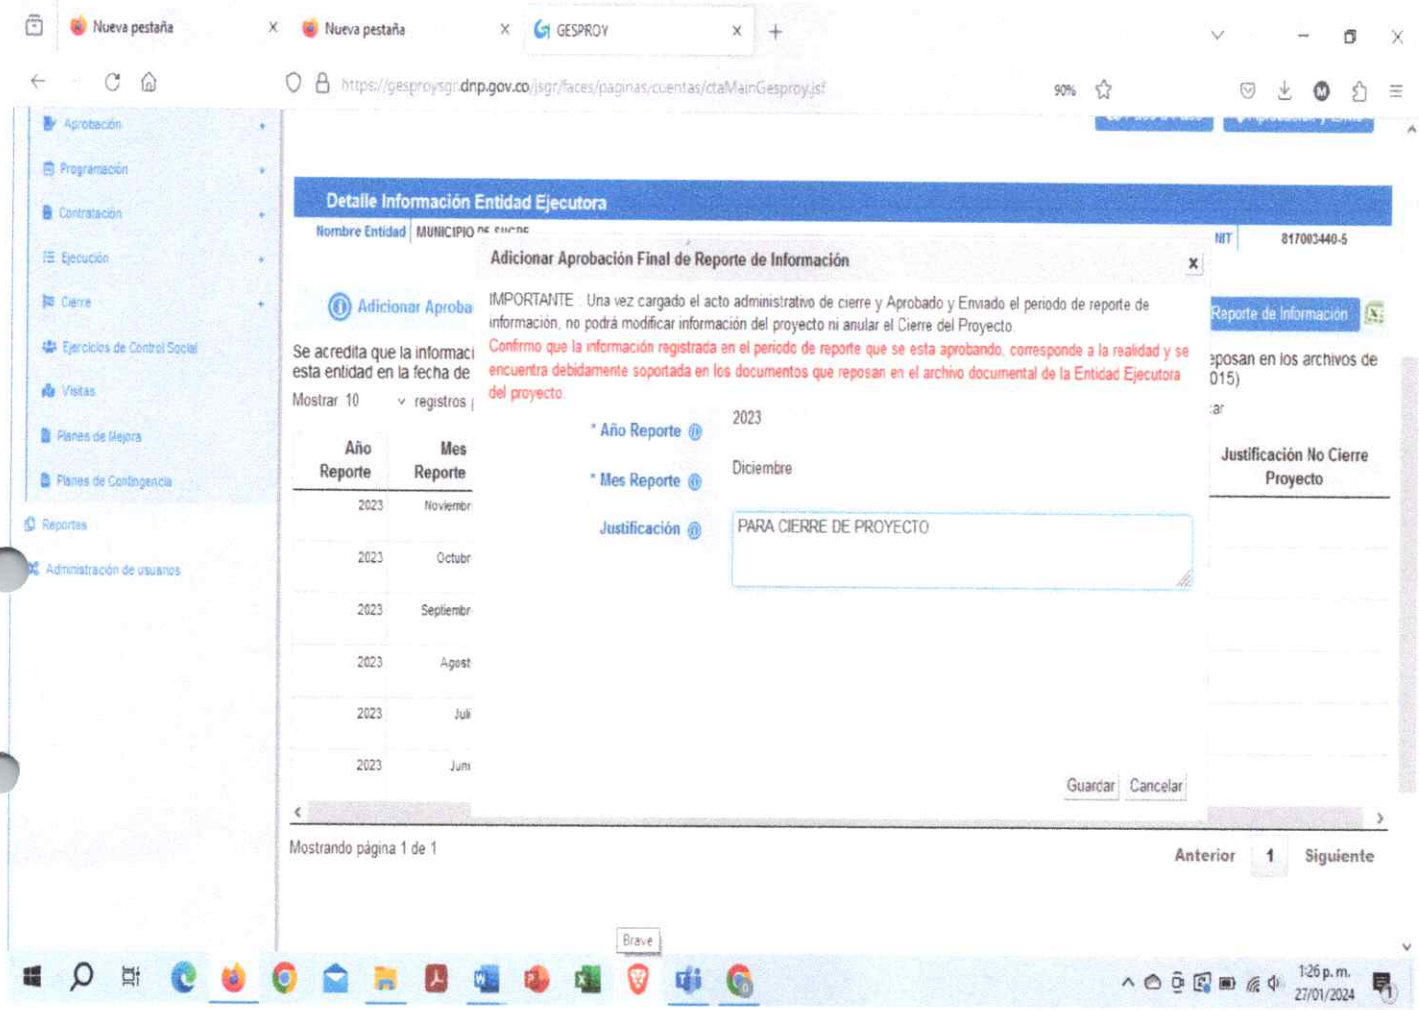

portal.sgr.gov.co/SPGR.RegistroUsuarios/SolicitudUsuario/.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+CrearSolicitudUsuario
SPGR
DEYBY ANTONIO ARMERO CERON
Opciones de Usuario
Trámite de Privilegios
Salir
Formulario para registro de Solicitud de Creación de Usuario
Datos Básicos
Acceso al Sistema
Perfiles
Solicitud
Representante Legal
Fecha de expiración de los privilegios
31/12/2027
Documentación
Limpiar
Enviar
Registrar Nueva Solicitud
La Solicitud de Creación de Usuario ha sido registrada exitosamente.

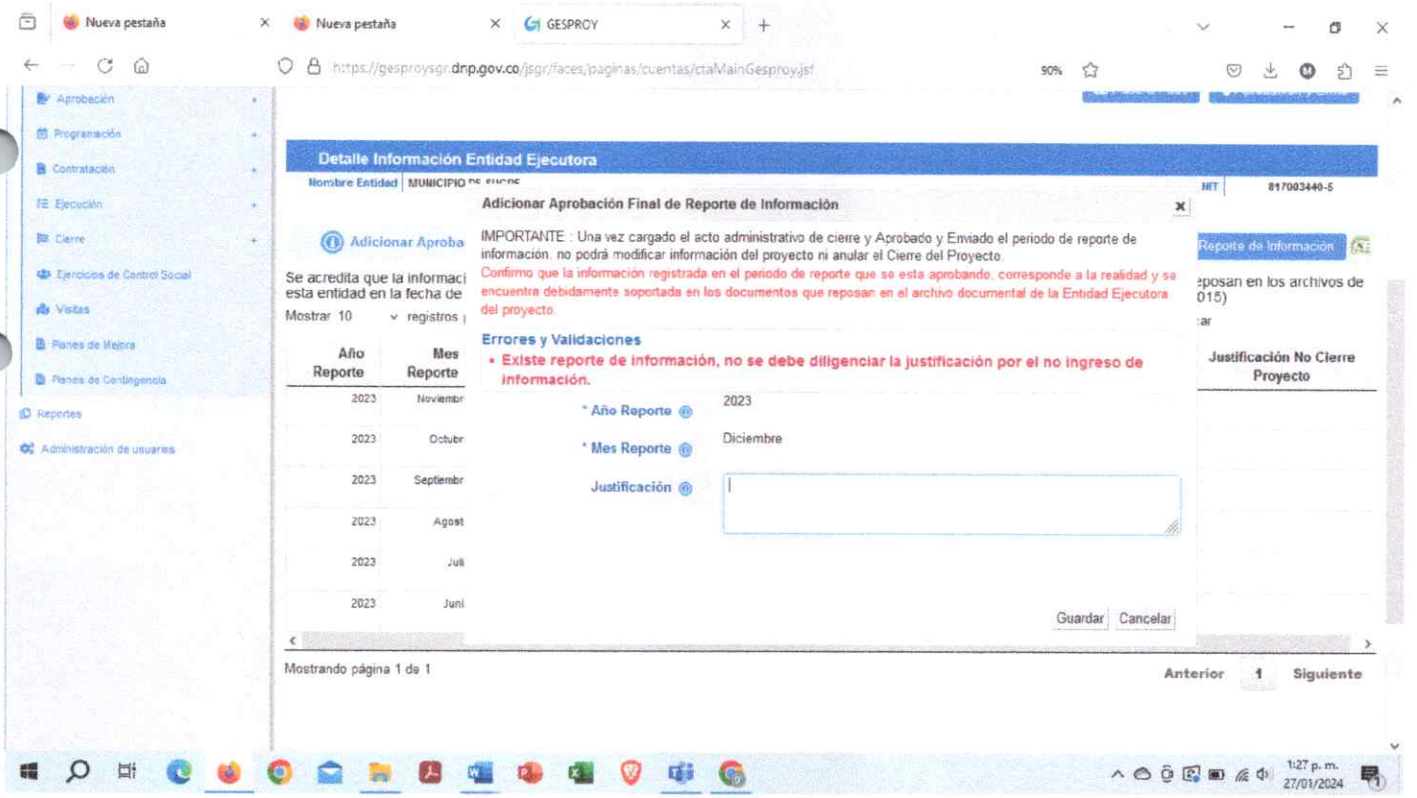

Sistema de autenticación federada
SPGR - Sistema de Presupuest
https://portal.sgr.gov.co/SPGR.RegistroUsuarios/SolicitudUsuario/.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+CrearSolicitud
80%
SPGR
DEYBY ANTONIO ARMERO CERON
02-19785 - MUNICIPIO DE SUCRE
Conectado
Opciones de Usuario
Trámite de Privilegios
Salir
Formulario para registro de Solicitud de Creación de Usuario
Datos Básicos
Acceso al Sistema
Perfiles
Solicitud
Representante Legal
Fecha de expiración de los privilegios*
31/12/2027
Documentación
Limpiar
Enviar
Ya existe una Solicitud de Creación de Usuario en estado Registrada para el Tipo y Número de Identificación y Entidad suministrados.

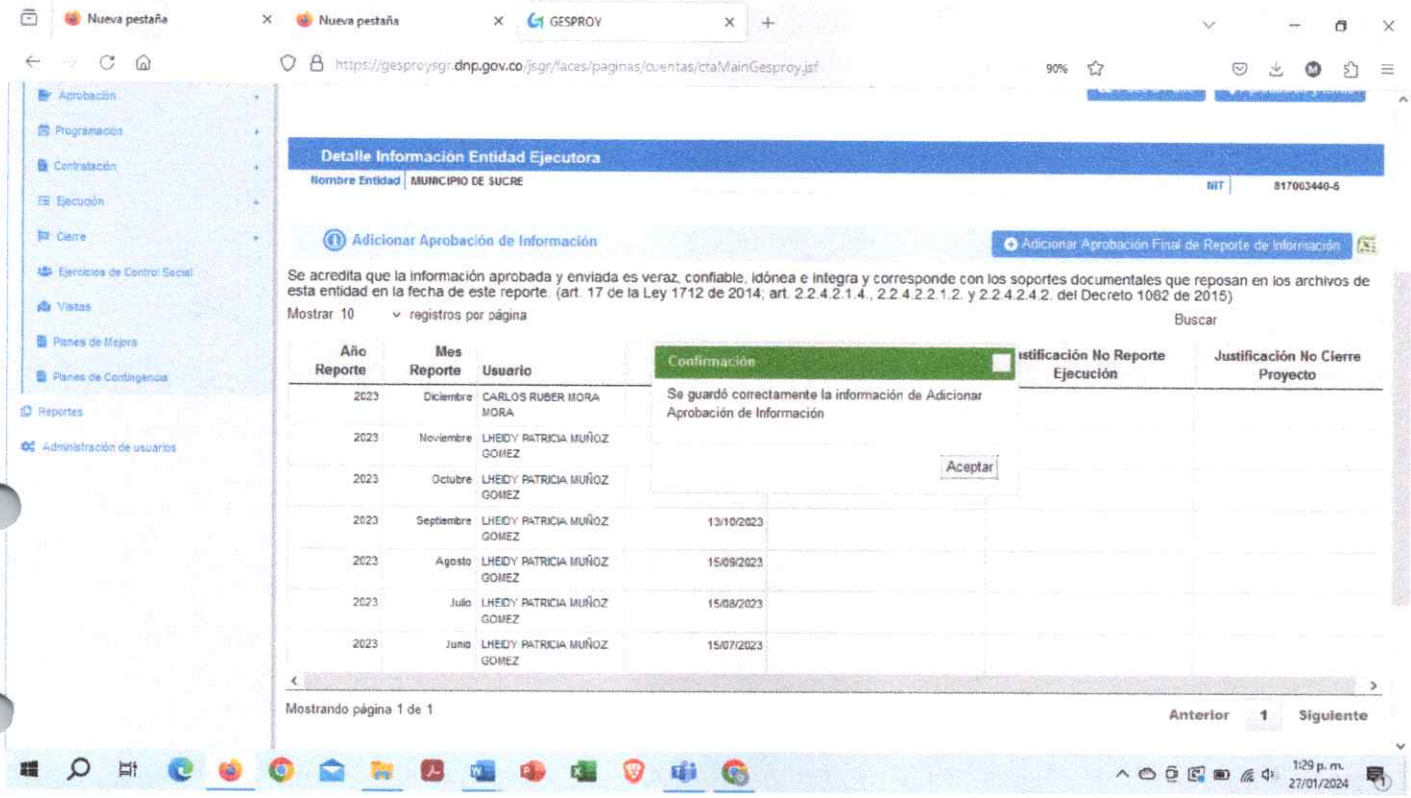
SOPORTE ACTIVIDAD: 2.3 Captura de imágenes de la Plataforma del GESPROY-SGR, realizando un trámite de CIERRE, del proyecto con PIN:2023197850028, el cual quedo en estado PARA CIERRE, estado final de un proyecto cuando ha sido ejecutado en 100% y cumplido con todas las obligaciones del SGR

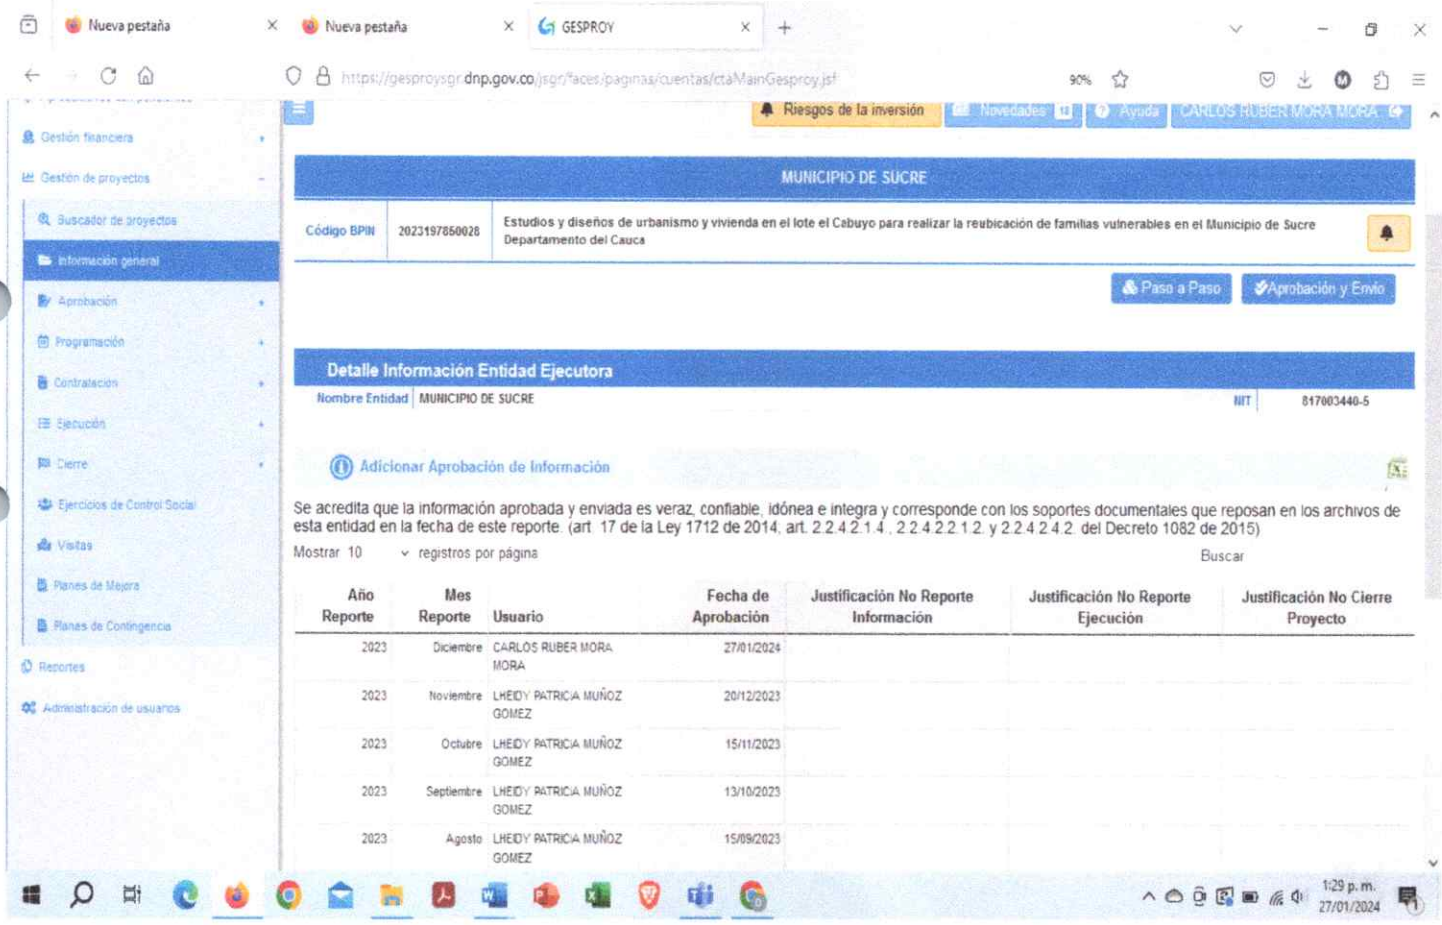


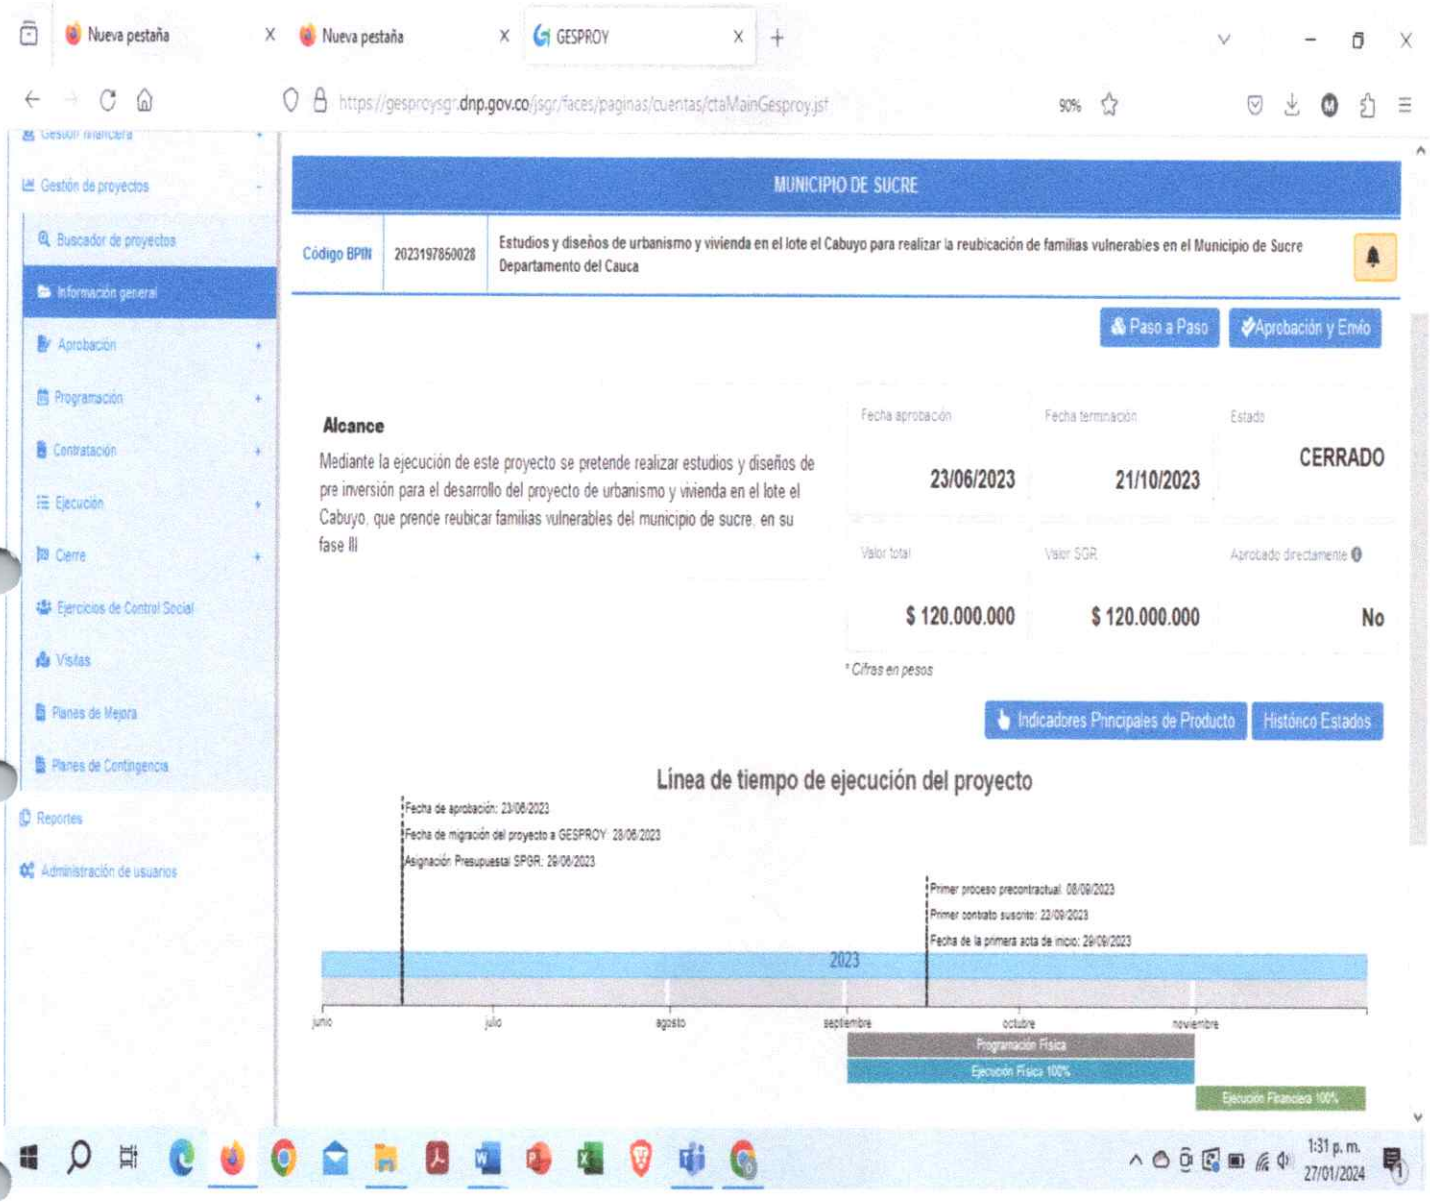



Nueva pestaña
Nueva pestaña
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
90%
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
MUNICIPIO DE SUCRE
NIT
817003440-5
Adicionar Aprobación Final de Reporte de Información
Adicionar Aproba
IMPORTANTE : Una vez cargado el acto administrativo de cierre y Aprobado y Enviado el periodo de reporte de información, no podrá modificar información del proyecto ni anular el Cierre del Proyecto.
Confirmo que la información registrada en el periodo de reporte que se esta aprobando, corresponde a la realidad y se encuentra debidamente soportada en los documentos que reposan en el archivo documental de la Entidad Ejecutora del proyecto.
Reporte de Información
Se acredita que la informaci
esta entidad en la fecha de
eposan en los archivos de
015)
Mostrar 10 registros
Año Reporte
Mes Reporte
Justificación No Cierre Proyecto
2023 Noviembr
2023 Octubr
2023 Septiembr
2023 Agost
2023 Juli
2023 Juni
* Año Reporte
2023
* Mes Reporte
Diciembre
Justificación
PARA CIERRE DE PROYECTO
Guardar
Cancelar
Mostrando página 1 de 1
Anterior
1
Siguiente
Brave
1:26 p. m.
27/01/2024


Nueva pestaña
Nueva pestaña
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
90%
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
MUNICIPIO DE SUCRE
NIT
817003440-5
Adicionar Aprobación Final de Reporte de Información
Adicionar Aproba
IMPORTANTE : Una vez cargado el acto administrativo de cierre y Aprobado y Enviado el periodo de reporte de información, no podrá modificar información del proyecto ni anular el Cierre del Proyecto.
Confirmo que la información registrada en el periodo de reporte que se esta aprobando, corresponde a la realidad y se encuentra debidamente soportada en los documentos que reposan en el archivo documental de la Entidad Ejecutora del proyecto.
Reporte de Información
Se acredita que la informaci
esta entidad en la fecha de
eposan en los archivos de
015)
Mostrar 10 registros
Errores y Validaciones
• Existe reporte de información, no se debe diligenciar la justificación por el no ingreso de información.
Año Reporte
Mes Reporte
Justificación No Cierre Proyecto
2023 Noviembr
2023 Octubr
2023 Septiembr
2023 Agost
2023 Juli
2023 Juni
* Año Reporte
2023
* Mes Reporte
Diciembre
Justificación
Guardar
Cancelar
Mostrando página 1 de 1
Anterior
1
Siguiente
1:27 p. m.
27/01/2024


Nueva pestaña
Nueva pestaña
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
90%
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad MUNICIPIO DE SUCRE
NIT 817003440-5
Adicionar Aprobación de Información
Adicionar Aprobación Final de Reporte de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Confirmación
Se guardó correctamente la información de Adicionar Aprobación de Información
Aceptar
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2023 Diciembre CARLOS RUBER MORA MORA
2023 Noviembre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ
2023 Octubre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ
2023 Septiembre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 13/10/2023
2023 Agosto LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/09/2023
2023 Julio LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/08/2023
2023 Junio LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/07/2023
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente
1:29 p. m. 27/01/2024


Nueva pestaña
Nueva pestaña
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
90%
Riesgos de la inversión
Novedades
Ayuda
CARLOS RUBER MORA MORA
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN 2023197850028
Estudios y diseños de urbanismo y vivienda en el lote el Cabuyo para realizar la reubicación de familias vulnerables en el Municipio de Sucre Departamento del Cauca
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad MUNICIPIO DE SUCRE
NIT 817003440-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2023 Diciembre CARLOS RUBER MORA MORA 27/01/2024
2023 Noviembre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 20/12/2023
2023 Octubre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/11/2023
2023 Septiembre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 13/10/2023
2023 Agosto LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/09/2023
1:29 p. m. 27/01/2024


Nueva pestaña
Nueva pestaña
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
90%
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2023197850028
Estudios y diseños de urbanismo y vivienda en el lote el Cabuyo para realizar la reubicación de familias vulnerables en el Municipio de Sucre Departamento del Cauca
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Alcance
Mediante la ejecución de este proyecto se pretende realizar estudios y diseños de pre inversión para el desarrollo del proyecto de urbanismo y vivienda en el lote el Cabuyo, que prende reubicar familias vulnerables del municipio de sucre, en su fase III
Fecha aprobación
23/06/2023
Fecha terminación
21/10/2023
Estado
CERRADO
Valor total
$ 120.000.000
Valor SGR
$ 120.000.000
Aprobado directamente
No
*Cifras en pesos
Indicadores Principales de Producto
Histórico Estados
Línea de tiempo de ejecución del proyecto
Fecha de aprobación: 23/06/2023
Fecha de migración del proyecto a GESPROY: 28/06/2023
Asignación Presupuestal SPGR: 29/06/2023
Primer proceso precontractual: 08/09/2023
Primer contrato suscrito: 22/09/2023
Fecha de la primera acta de inicio: 29/09/2023
2023
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
Programación Física
Ejecución Física 100%
Ejecución Financiera 100%
1:31 p. m.
27/01/2024
