20 Enero 2024

Se deja compactado para imprimar la Cr 18ª Pasan las densidades y se deja listo para la instalación de asfalto. Se asfalta toda la vía de ABS 0.0 a la ABS 75 con temperatura adecuada y su instalación de una manera correcta.

Ing Residente

21 Enero 2024

Se realiza Instalación de tubería nueva

12" fueron 11,5m

[redacted]

24 Enero 2024
Personal en Obra: 3 Ingenieros, 1 maestro, 2 Ayudantes, 1 Siso, 1 topo
Maquinaria: Vibro Dynapac F6on, Motoniveladora
Actividades: Cereo con motoniveladora de ABS 120 a la ABS 0.0 Calle 10 se humecta el material B-600 para garantizar una buena compactación

Ing Residente

"Se le solicita al contratista de hacer el respectivo trabajo de la humectación con un carro tanque de agua, para que el riego sea de forma uniforme y el material granular quede con su respectiva humedad."

25 Enero 2024
Personal en Obra: 1 Diractor, 2 Ingenieros, 1 SISO, 3 Ayudantes 1 topo
Maquinaria: Vibro Motoniveladora

Se Realizan Excavaciones en empalme de Cra 15 con calle 13 y en vn PZ de la vn en Calle 13 ya que EPZ intervino y esa Zona no contaba con asfalto se hace unos cortes para garantizar la buena instalación del Asfalto. Se limpia la via Cra 15 con Soplete y cepillos se aplica la emulsión asfáltica, se continua con la instalación de Asfalto de ABS 0.0 a la ABS 17. Por otro lado se toman densidades en Calle 10 de Abs 250 a la ABS FO

Ing Residente

26 Enero 2024

Personal en Obra: 1 Director, 2 Ingenieros 1 Oficial, 3 ayudantes, 1 Siso, 1 topo

Maquinaria: Vibro Dynapac Ftan, Motoniveladora Mini cargador, Pajorita Sany, Cortadora, Canguro

Actividades: Cerco de bocacalle en cr 15 con calle 10

humatación de B-600 para garantizar la compactación, Se empieza a asfaltar la cra 15 de ABS 170 a ABS 213,5 y Cruces de toda Calle con calle 10 se inicia con instalación despues de imprimar de Asfalto de ABS 263 a ABS 229 con esperes 0,12cm se instalan dos capas
Se realiza Parcheo en entrada de Tiroquirá se evidencia que la base estaba en mal estado se reemplaza ese material por nuevo material, se hace la compactación de la base se aplica la emulsión Asfaltica y por consiguiente se instala el asfalto el parche queda en buenas Condiciones

Ing Residente

27 de Enero 2024
Personal: 2 Ingenieros, 1 maestro, 4 ayudantes, 1 Siso 1 topo
Maquinaria: Vibro Dynapac Ffon, Motoniveladora
Min: Cargador, Cantabara Asfalto, Canguro

Actividades: Se continua con Carpeta de Cra
y bza calle en calle 10 y se compacta
ABS 229 a la 70 para la carpeta Trebla
del asfalto se imprima de ABS 229
ABS 70 se inicia con la Instalacion de asf
ya con el consentimiento de Interventoria
puesto que la densidades cumplieron se
asfalta de la primera capa 229 a ABS
0,06 m y la segunda capa de ABS 23
ABS 135

Ing. Residente

23 Enero 2024
Personal en Obra: 1 Ingeniero, 1 Maestro,
2 Ayudantes, 1 topo
Maquinaria: Polidora F''
Actividades: Inspeccionar pozos de aguas
negras, colocar hilos y reinvidar dichos
pozos se fundan los cargues y tapas
para el dia siguiente continuar asfaltando

Ing Residente

29 Enero 2024

Personal en obra: 2 Ingenieros, 1 Oficial, 2 ayudantes, 15150, 1 topo

Actividades: Se cerca de ABS 10 a ABS 0.0 se remplaza material sobre saturado, se cambia por material seco, suelo cemento y se compacta nuevamente de ABS 69 a ABS 0.0 en calle 10 y en boca calle con Cra 15 se limpia la vía con soplete y cepillo para luego imprimar. Se instalan tapas de pozos de aguas negras se dejan instalados también los sumideros de ABS 10, se hace el riego de imprimación de ABS 69 a ABS 0.0 en calle 10 y boca calle de Cra 15 con calle 10, se empieza con la instalación de asfalto de los dos capas para un espesor de 0.12 m Calle 10 ABS 69 ABS 10 y Boca-calle en cra 15 con calle 10

-Se hace hace recorrido con Interventoria Para bacheo en calle 1.

Ing. Residente

30 Enero 2024
Personal en obra: 2 Ingenieros, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Siso 1 topo
Actividades: Se hace recorrido con Interventoría para mirar los baches que toca reparar y rehabilitación de malla vial. Se hacen reparaciones en Vias Cr 15 y Calle 10

Ing. Residente

31 ENero 2024
Personal en Obra: 2 Ingenieros, 1 Director, 3 Ayudantes, 1 Siso, Instalados del asfalto 1 top

Maquinaria: Paporita Sany, Cortadora de asfalto, compresor y rolo martillo
Actividades: Se Inicia con el bacheo en calle 1 y CRA 10 Se descalifica el Pavimento con Fallas anteriormente marcado por Interventoria, si el material granular esta fatigado o saturado se cambia por material nuevo. se compacta y se hace el riego de Emulsión asfaltica y por ultimo Instalación de Asfalto
Baches Intervenidas
· Calle 1 # 10-86
Cll 1 # 10-82
Cll 1 # 10-50
Cll 1 # 10-30 (1)
Cll 1 # 10-30 (2)
Cll 1 # 10-02
CRA 10 # 6-54
CRA 10 # 6-54 (2)

1 Febrero 2024.
Personal en Obra: 1 Director, 2 Ingenieros, 3 Ayudantes, 1 Siso, Instaladoras del asfalto 1 topo
Maquinaria: Paporita Sony, Cortadora Asfalto

Actividades: Se hacen cortes de baches a
Intervenir con autorización de Interventor
se descalifico el pavimento existente, en mater
granular se cambia si esta en mal estado
o saturado por material nuevo se compact
se hace riego de imprimación y instalación
de asfalto.

Baches Intervenidos

Calle 8 Frente al Ferrocarril
Calle 8 Colegio liceo
Calle 8 # 12-47
Calle 8 # 12-77
Calle 8 # 12-89
Calle 8 # 13-07
Calle 8 # 15-05
Calle 8 # 15-07
Calle 8 # 15-13
Calle 8 # 15-31
Calle 8 # 15-35

Ing. Residente

2 Febrero 2024
Personal en Obra: 1 Director 2 Ingenieros, 3 ayudantes 1 siso, Instaladores del Asfalto 1 topografo
Maquinaria: Pajarita Sony, cortadora de Asfalto compresor y martillo, Vibro
Actividades: Se hacen Cortes de baches para Intervenir con autorizacion de Interventoria se descalifica el pavimento antiguo el material granular si esta en mal estado se Cambia por nuevo material Se compacta, se hace riego de imprimación y se instala asfalto
Baches Intervenidos
Calle 8 # 16-01
Calle 8 # 16-09
Calle 8 # 6-37

Ing. Residente.

EN EL MES DE febrero
SE ESPERA NUEVAS VIAS PARA INTERVENIR.

3 Febrero 2024
Personal en Obra: 1 Diractor, 2 Ingenieros, 3 ayudantes, 1 Siso, Instaladores del Asfalto 1 topo
Maquinaria: Pajarita Sony, Cortadora de Asfalto
Actividades: Se hacen cortes de baches para Intervenir con autorización de Interventoria

Scanned with OKEN Scanner

Se descalifica pavimento existente el m
granular se cambio si el existente s
encuentra en mal estado se compacta
y luego se riega la imprimación y se
el asfalto
Bachas Intervenidos
Calle 8 # 16-63
Calle 8 # 16-67
Calle 8 # 16-79 C1)
Calle 8 # 16-79 C2)
Calle 8 # 16-85
Calle 8 # 17-05
CRA 10 # 51
CRA 10 con C11 11 Bacha Calle

5 Febrero 2024
Personal en Obra: 1 Director, 2 Ingenieros,
3 Ayudantes, 1 Siso, Instalatores de Asfalto
Maquinaria: Pajarita Sany, Carrotanque de
Asfalto, Compresor y rato martillo, vibro
Actividades: Se descalifica pavimento e
te con irregularidades, Se revisa si el

material granular se encuentra en buen estado o de lo contrario se cambia y se instala material nuevo y se garantiza una buena compactación, se hace el riego de Imprimación y se Instala asfalto
Bacheo Intervenidos
CRA 10 # 11-34
CRA 10 # 11-16
CRA 10 # 11-00(1)

6 Febrero 2024
Personal en Obra: 1 Director, 2 Ingenieros, 3 Ayudantes, 1 Siso, Instaladores de asfalto, 1 topo
Maquinaria: Pajarita Sony, Carrotobra de asfalto, compresor roto martillo, Vibro Compactador
Actividades: Se decalifica pavimento existente con bacheo ya autorizados por Interventoria y Carrotados previamente, se revisa si el material Granular esta en buen estado no se cambia pero si se encuentra en mal estado se cambia el material se remplaza por nuevo material y se garantiza una buena compactación,

Scanned with OKEN Scanner

Riego de imprimación y se instala asfalto
Baches Intervenidos
Calle 8 # 18-10
Calle 8 # 18-01 (2)
Calle 8 # 16-80
Calle 8 # 16-67
Calle 8 # 16-34
Calle 8 # 16-00
Calle 8# 12-76
Calle 8# 12-66

7 Febrero 2024
Personal en Obra: 1 Director, 2 Ingrice
3 ayudantes, 1 Siso, Instaladores de asfalto, 1
Maquinaria: Pajarita Sany, cortadora de
asfalto, compresor roto martillo, Canguro, U
Actividades: Se descalifica el pavimento ant
para remplazar, se hacen cortes y la co

Scanned with OKEN Scanner

la autorización de interventoria, se verifica si el material esta en buen estado si no se cambia por nuevo material se garantiza la compactación se riega la imprimación y se instala el asfalto

Baches Intervenidos


Calle 8 # 18-10
Calle 10 # 3-40
Calle 10 # 3-16
Calle 10 # 2-38
Calle 10 # 2-00
Calle 8 # 12-76

En Recorrido de hoy con la Interventoria en representación del Ing. Camilo Flores y el Ing Juan Manuel Cortes se determina y se nos autorizo Pintar 11 Reductores de Velocidad en Sobo color amarillo en un area de 274,31 m²

Ing Residente

3 Febrero 2024

Scanned with OKEN Scanner

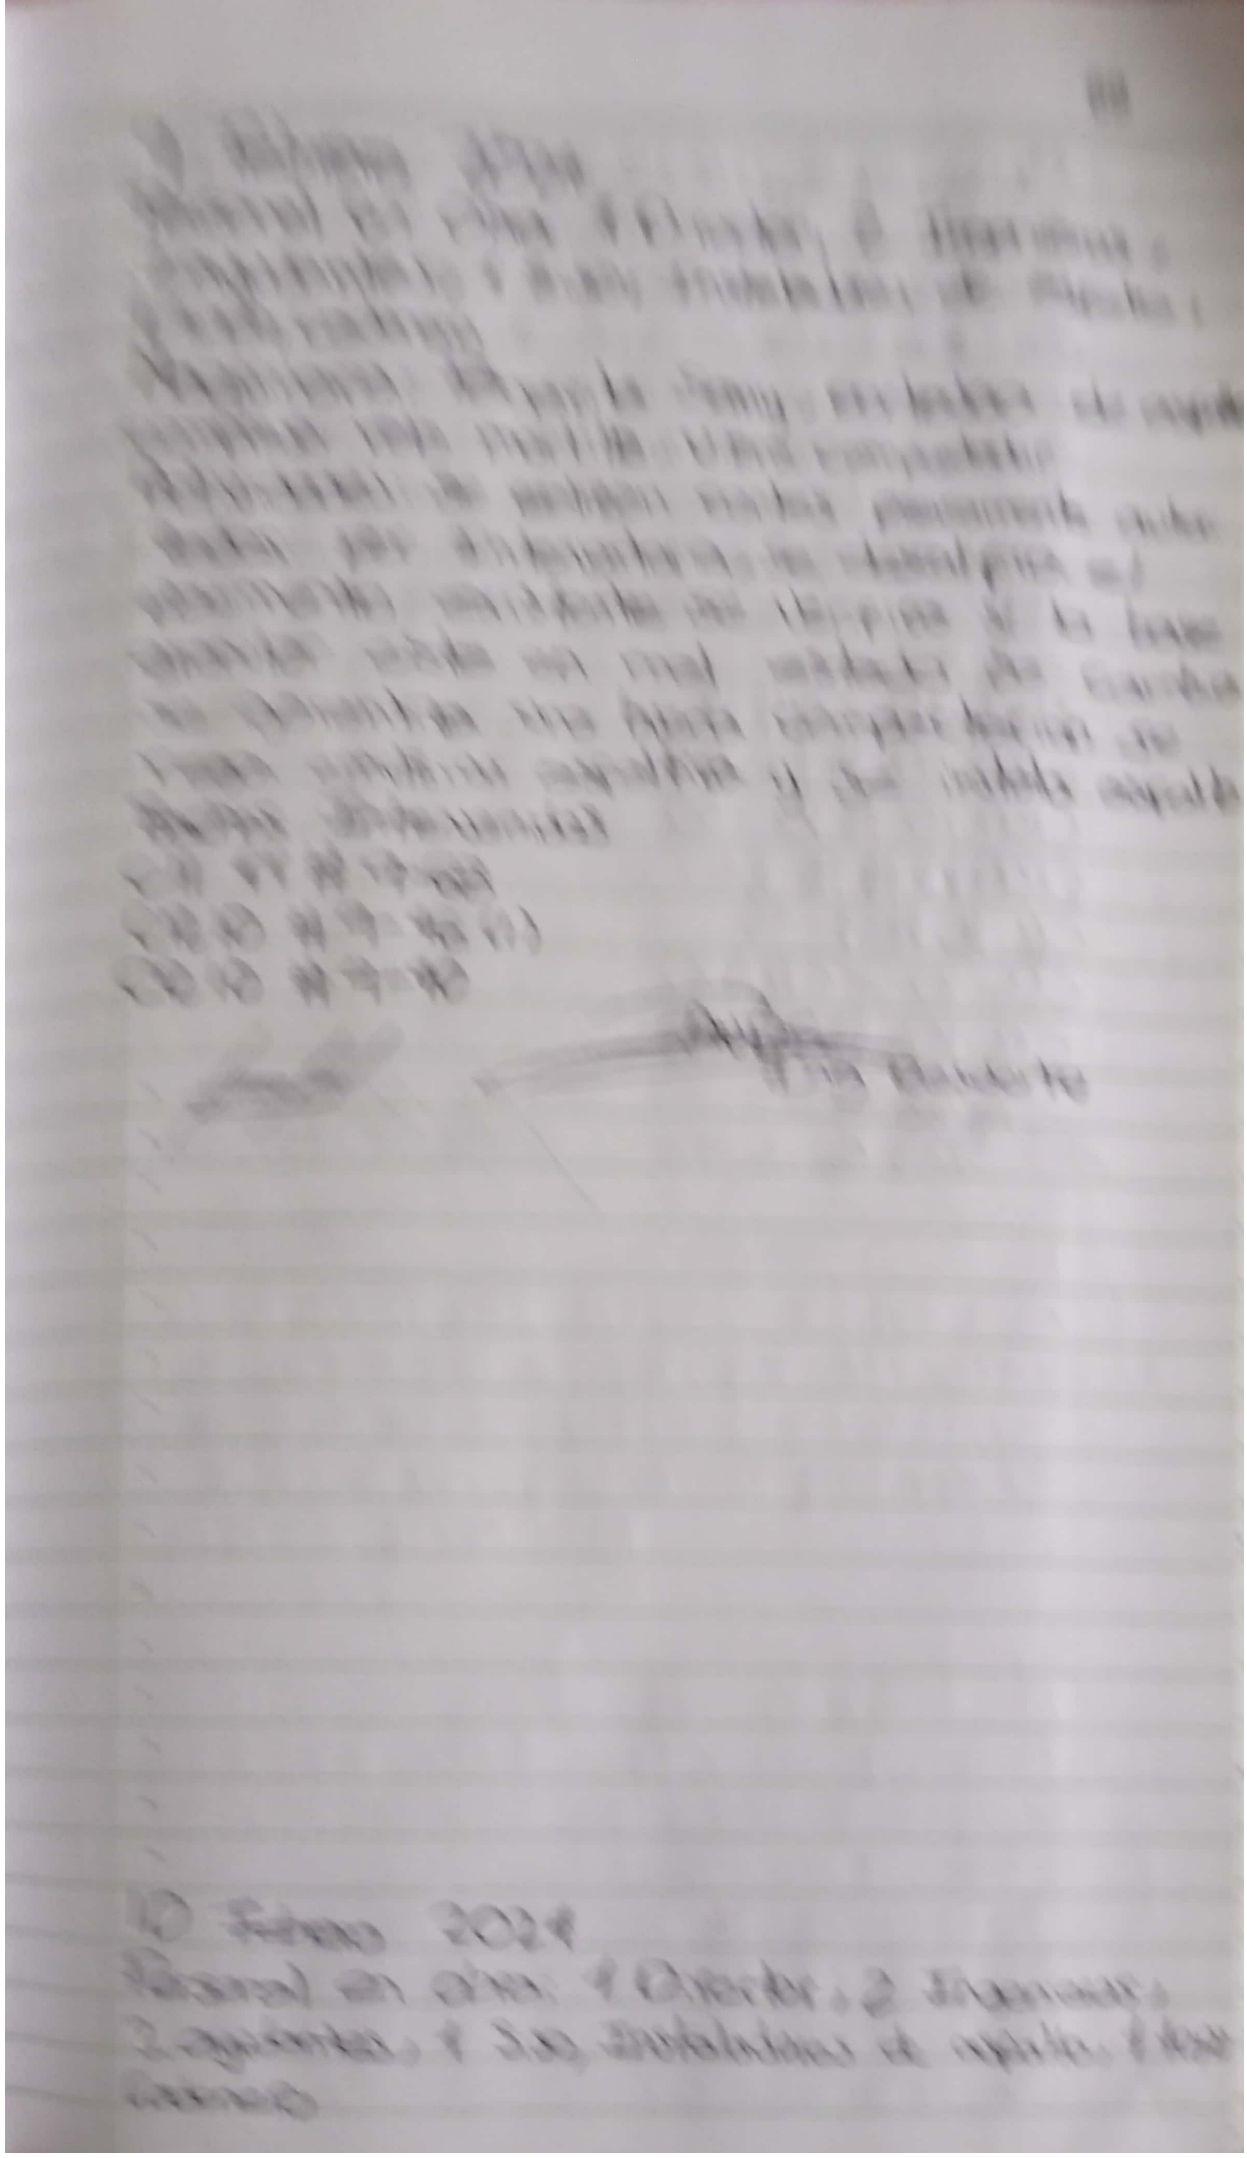

Maquinaria: Pajarita Sony, Cortadora asfal
Compresor rompemartillo
Actividades: Se realizan cortes previamen
con autorización de Interventoria. Se desca
ca el pavimento existente, se revisa si e
material granular esta en buen estado
se cambia en caso de lo contrario se
humecta y garantizo la compactación, se
aplica riego de imprimacion, se instala
asfalto.
CRA 10 / C1114
CRA 10 # 13-06
CRA 10 # 10-40
CRA10 # 9-56
CLC 10 # 9-46
CLC 10 / CRA10
CR 10 # 9-48

Ing. Residente

12 Febrero 2024

Personal en Obra: 1 Director, 2 Ingenieros 2 ayudantes, 1 SISO, Instaladoras de asfalto, 1 tapo 1 cadrero

Maquinaria: Pajarita Sony, Cortadora de Asfalto compresor roto martillo

Actividades: Se realizan cortes previamente con autorización de Interventoria Se escalifica el pavimento existente, se revisa el material granular si esta en buen estado si no se cambia se garantiza la buena compactación se riega la imprimación y se instala el asfalto.

Baches Intervenidos

CRA 10 CLL 17

CLL 17 # 9-96 (1)

CLL 17 # 9-96 (2)

CLL 17 # 9-45 (1)

CLL 17 # 9-45 (2)

Ing. Residente

SE INICIA SOCIALIZACION EN LA CALLE 17 ENTRE CRAS 7 Y 22

TS Xuly Quiroga

13 Febrero 2024
Personal Obra: 1 Director, 2 Ingenieros, 2 ayudantes, 1 Siso, Instaladores de asfalto 1 topo, 1 Cadenero
Maquinaria: Parjarita Sony, Cortadora Asfalto, Vibro, Compresor rato martillo
Actividades se realizan cortes ya aut Todos por Interventoria se descalifi Pavimento existente, se aplica mater grauber ya que se encontrabo en mal estado se cepa y se imprima por se instala el asfalto, llegan rasillos sumidero Se instalan.
Bache Intervenido
CL 14 #9-30

Ing. Residente

"Se le solicita al contratista de no dejar capas con una sola capa de mezcla densa en caliente para bacheo, ya el transito vehicular puede fracturar la carpeta y se pueden presentar retrasos en la ejecución del contrato de obra"

SE COUTINUA CON LA SOCIALIZACIÓN CII 17 ENTRE CRA 7 y 22, SE TOMA firma, SE ENTREGA COMUNICADO, SE TOMA FOTOGRAFIA SI ASÍ LO PERMITE LA PERSONA INFORMADA.
TS XULY COCCA

14 Febrero 2024
Personal en Oba: 1 Director, 2 Ingenieros 2 ayudantes, 1 Siso, Instaladores de asfalt 1 topo, 1 Cadenero
Maquinaria: Parjarita Sony, Cortadora de Asfalto, Vibro, Compresor rato martillo
Actividades: Se hacen Cortes con Alcance de Interventoria se descalifica Pavimento

existente Se compacta/se aplica el riego de imprimación y Se instala el asfalto
Baches Intervenidos
CLL 17 #9-71
CRA10 #17-05
CLL 17 #9-45 - CLL 17 #9-30

Ing. Residente

SE HACE SOCIALIZACIÓN CRA 9 ENTRE CLLS 8 y 17
SE TOMAN FIRMAS, FOTO Y SE ENTREGA COMUNICADO TS XUEY GUERRA.

15 Febrero 2024
Personal en Obra: 1 Director, 2 Ingenieros 2 Ayudantes, 1 Siso, Instaladores de asfalto
Maquinaria: Pajarita Sony, Cortadora de asfalto, Vibro, Compresor rotomartillo
Actividades: Se realizan Cortes con la Autorización de Interventoría, Se desalifica Se compacta y Se riega la imprimación Se Instala asfalto
Baches Intervenidos
Calle 17 # 16-32
Calle 17 # 16-32 [2]
Calle 17 # 7-17

Scanned with OKEN Scanner

Calle 17 # 7-19
Calle 17 # 7-21
Calle 17 # 7-41
Calle 17 con CRA 10 # 16-103
Calle 17 # 7-73

Ing. Residente

SE CONTINUA CON LA SOCIALIZACIÓN DE LA CALLE 17 ENTRE CRAS 7 Y 22 CRA 9 ENTRE CALLES 8 Y 17.
SE TOMO FIRMA, CON ENTREGA DEL COMUNICADO Y FOTO RESPECTIVA, CUANDO ES PERMITIDO.


TS Yury Cuervo.

16 Febrero 2024
Personal En Obra: 1 director, 2 Ingenieros, 2 Agadontes, 1 Siso, Instalaboras de Asfalto
Maquinaria: Pajarita Sany, Cortadora de Asf
Vibro, Compresor roto martillo
Actividades: Se realizan Cortes se descalifo Pavimento existente, se verifica que el material esta en mal estado se cambio se riega Imprimación y se instala el asfalto
Baches Intervenidos
C11 17 con CRA 9
C11 17 # 10-14
C11 17 # 10-20
C11 17 # 10-28
C11 17 # 10-42


⇒ CII IF # 10-42

Se hace presencia de un Fallo por socavación y falta de estructura material fatigado y mal compactado, se hace mejoramiento ya que no se podia dejar asi es material se retira y se cambio por nuevo material como suelo cemento se compacta en capas de 0,15 m con canguro

CII IF # 10-42

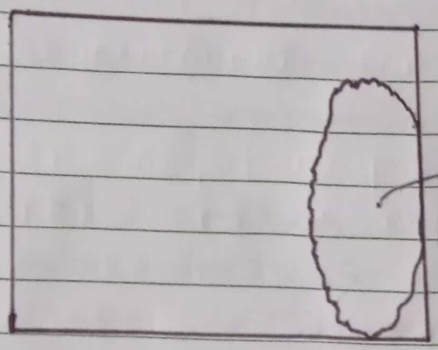

⇒ Fallo
Por Sobre Saturación, material Fatigado, socavación

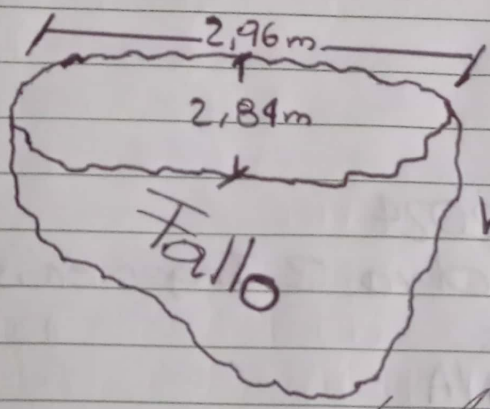

Ing. Residente

"Esta interventoria le solicita al contratista de no intervenir un fallo sin que la interventoria de la aprobación para intervenir la zona afectada en las actividades de Bacheo, por otro lado se le solicita al contratista de tomar las medidas en conjunto con la interventoria antes de intervenir los tramos estipulados".

SE CONTINUA CON SOCIALIZACIÓN
EN LA CALLE 17 ENTRE CRAS 7 Y 22
SE ENTREGO COMUNICADO, SE TOMA LA FIRMA
SE TOMA FOTOGRAFIA
TS Xuly Cáceres.

19 Febrero 2024
Personal en Obra: 2 Ingenieros, 1 Siso,
2 Ayudantes.
Maquinaria: N/A
Actividades: Fundición de Cuñas para Sumidero
en CR 15, Avance en temas administrativos

Ing Residente

SE CONTINUA CON SOCIALIZACION
CALLE 17 CRA 7 A 22
SE ENTREGO COMUNICADO
SE TOMA LA FIRMA Y FOTOGRAFIA
TS Xuly Cáceres

20 Febrero 2024
Personal en Obra: 1 Director, 2 Ingenieros, 1 SISO, 2 Ayudantes, Instaladores de asfalto
Maquinaria: Pajarito Sany, cortadora de asfalto, Compresor retomartillo, Vibro compactador
Actividades: Se realizan cortes con autorización de interventoría se descalifica se compacta, riego de imprimación y se instala asfalto
Puntos Intervenidos
CRA 9 Con Calle 3
CRA 9 #8-18
CRA 9 #8-09
CRA 9 #8-28
CRA 9 #8-36
CRA 9 # 8-34 (1)
CRA 9 # 8-34 (2)

Ing. Residente

SE CONTINUA SOCIALIZACIÓN CALLE 17 CRA 7 a 22
SE ENTREGA COMUNICADO, SE TOMA LA FIRMA
FOTOGRAFÍA SI ES PERMITIDO
TS XURY GUERRERO

21 Febrero 2024
Personal en Obra: 2 Ingericas, 1 Siso,
2 Ayudantes Instalaciones de Asfalto.
Maquinaria: Pajarita, Cortadora de asfalto
, compresor rotomartillo, Vibro
Actividades: se realizan cortes con
autorización de Interventoria Se desca
lifica se compacta, se riega imprimante
se instala asfalto
Baches Intervenidos
CRA9 #8-52 (1)
CRA9 #8-34 (2)
CRA9 #8-52 (2)
CRA9 #8-60

Ing. Residente

SE CONTINUA CON SOCIALIZACION EN LA CALLE 17
ENTRE CRAS 7 y 22
SE ENTREGA COMUNICADO, SE TOMA LA FIRMA Y
FOTOGRAFIA SI ES PERMITIDO

TS Xuxy

22 Febrero 2024
Personal en Obra: 2 Ingenieros, 1 Siso, 2 ayudantes
Maquinaria: N/A
Actividades: Se realiza reparos en anderas de vecindad de la CR15, se avanza con temas administrativos en Acta N#2

Ing. Residente

"Se le solicita al contratista de continuar con las actividades de corte, suministro e instalación de bacheo para evitar retrasos en la ejecución del contrato de obra, por otro lado es indispensable seguir con la respectiva demarcación de los tramos que fueran entregados por la supervisión del contrato."

SE FINALIZA SOCIALIZACION EN LA CALLE 17 CON CRA 7 A 22
SE ENTREGA COMUNICADO, SE TOMA LA FIRMA Y FOTOGRAFIA SI ES PERMITIDO

TS Yuly Cocinado

23 Febrero 2024
Personal en Obra: 2 Ingenieros, 1 Siso, 2 ayudantes instaladores de asfalto
Maquinaria: Pajarita, cortadora de asfalto, Compactadora retomartillo, Libro

Scanned with OKEN Scanner

Actividades: Se realizan cortes ad
os por interventoria, se descalifica
Pavimento existente, se compacta, se
hace riego de imprimación, se instala
Bacheo Intervenidos
CR9 # 8-69
CR9 # 8-76
CR9 # 8-80
CR9 # 8-82

Ing. Residente

24 Febrero 2024
Personal en obra: 2 Ingenieros, 1 Siso, 1 a
nte, Instaladores Asfalto
Maquinaria: Bogarita, cortadora de asfalto
Vibro, compresor rato martillo
Actividades: se realizan cortes con auto
de Interventoria, se descalifica, se compact
material granular se hace riego de impri
ción, se instala asfalto
Bacheo Intervenidos
CRA9 # 8-84
CRA9 # 8-102
CRA9 # 8-108
CRA9 # 9-05
CRA9 # 9-02

Ing. Residente

Scanned with OKEN Scanner

26 Febrero 2024
Personal en obra: 2 Ingenieros, 1 Siso, 1 ayudante
Instalaciones de asfalto
Maquinaria: Pajarita, Cortadora Asfalto, compresor retromartillo
Actividades: Se realizan cortes con autorización de Interventoria se descalifica, se compacta, se riega Imprimación, se instala asfalto.
Bachas Intervenidos
CR9 # 9-74
CR9 # 9-04
CR9 # 9-56

Ing. Residente

27 Febrero 2024
Personal en Obra: 1 Ingeniero, 1 Aydante
Maquinaria: N/A
Actividades: Se arreglan anclajes de la CR 15 sacando pilas y remates, se avanza en temas administrativos

"La interventoría solicita de continuar con las actividades de bacheo, estipuladas y entregadas por la supervisión del contrato es por esto que se debe continuar con las actividades de corte, suministro e instalación de mezcla densa en caliente con bacheo, con el fin de darle celeridad a la ejecución del contrato de obra."

28 Febrero 2024
Personal en Obra: 1 Ingeniero, 1 Director, 1 RH
Maquinaria: N/A
Actividades: Se avanza en temas administ
y acta de corte

"Las actividades administrativas no tienen ninguna relación con las actividades de ejecución en los tramos a intervenir para las reparaciones de la carpeta asfáltica que se encuentren afectados y la supervisión solicita que sean reparados por el contratista del consorcio gkg."

29 Febrero 2024

Personal en Obra: 1 Ingeniero, 1 Director, 1 RH

Maquinaria: N/A

Actividades: Se continua Avanzando en temas administrativos Acta de Obra, bitacorá.

"Nuevamente la interventoria reitera que las actividades administrativas, son funciones y deberes administrativos y no se relacionan con las actividades de ejecución de bacheo en el contrato de obra, es por esto que se le solicita al contratista de continuar con las actividades de corte, suministro e instalación en las zonas afectas y revisadas en los tramos estipulados."
