INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR

(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)

Código: GC-FT-65	
Versión: 3	
Página: 1 de 1	
Vigente Desde: 23/11/2021	

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23	
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS	
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9	
Periodo del Informe:	20	3	2024	al	19	4	2024	**Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746	
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT: Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO									

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 692.999.995	**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$ 693.211.736	Número CDP	3092 -2023	Fecha CDP		Fuente de Recursos	FONDIGER
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	14		Valor RP	$ 692.999.995	Número RP	9140 -2023	Fecha RP	13/02/2023		
		Valor Total		$ 692.999.995						
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción**					
		Valor Total		$ 692.999.995						

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio		**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$ 109.147.497	Número CDP	3808-2024	Fecha CDP		Fuente de Recursos	FONDIGER
Cantidad de meses de prórroga 1	4,5		Valor RP	$ 109.147.497	Número RP	10728-2024	Fecha RP	22/04/2024		
		Subtotal		$ 109.147.497						
		Valor Total (Inicial +		$ 802.147.492						
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	18,5	**Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique**			**Descripción**					
		Valor Total		$ 802.147.492						

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	3	2024	al	19	4	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:		**Valor disminución :**	

Descripción del motivo de la disminución

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	1	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 802.147.492	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses Inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	18,5

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo **(Si Aplica)**	NO APLICA	**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**	NO APLICA	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

(Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y el estado que reporte la entidad que adelante la contratación derivada en caso que no sea directamente el IDIGER O IDIGER - FONDIGER)

NO APLICA CONTRATACIÓN DERIVADA

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	3	2024	al	19	4	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
1. 20 de feb al 19 de marzo 2023	4 de agosto 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 1 - 2023ER17545_Pago 1
2. 20 de marzo al 19 de abril 2023	4 de agosto 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 2 - 2023ER17544_Pago 2
3. 20 de abril al 19 de mayo 2023	20 de septiembre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 3 - 2023ER21358_ Pago 3
4. 20 de mayo al 19 de junio 2023	20 de septiembre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 4 - 2023ER21357_Pago 4
5. 20 de junio al 19 de julio 2023	20 de octubre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 5 - 2023ER24133_ Pago 5
6. 20 de julio al 19 de agosto 2023	20 de octubre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 6 - 2023ER24132_ Pago 6
7. 20 de agosto al 19 de septiembre	13 de diciembre 2023	24.254.998	Corresponde al mensual 7 - 2023ER28146 _ Pago 7
8. 20 de septiembre al 19 del octubre	13 de diciembre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 8 - 2023ER28148 _ Pago 8
9. 20 de octubre al 19 de noviembre	13 de diciembre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 9 - 2023ER28149 _ Pago 9
10. 20 de Noviembre al 19 de Diciembre	20 de febero 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 10 - 2024ER3749 _ Pago 10
11. 20 de Diciembre 2023 al 19 de Enero 2024	04 de Marzo 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 11 - 2024ER4612 _ Pago 11
12. 20 de Enero 2024 al 19 de Febrero 2024	11 de abril 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 12 - 2024ER7249 _ Pago 12
13. 20 de Febrero 2024 al 19 de Marzo 2024	11 de abril 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 113- 2024ER7248 _ Pago 13

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	3	2024	al	19	4	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio Garcia Garcia Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
Mensual 1	24.254.999	OP 23295 (11-08-2023)	Corresponde al mensual 1 - 2023ER17545_Pago 1
Mensual 2	24.254.999	OP 23298 (11-08-2023)	Corresponde al mensual 2 - 2023ER17544_Pago 2
Mensual 3	24.254.999	OP 23672 (22-09-2023)	Corresponde al mensual 3 - 2023ER21358_ Pago 3
Mensual 4	24.254.999	OP 23671 (22-09-2023)	Corresponde al mensual 4 - 2023ER21357_Pago 4
Mensual 5	24.254.999	OP-23971 (27-10-2023)	Corresponde al mensual 5 - 2023ER24133_ Pago 5
Mensual 6	24.254.999	OP-23968 (25-10-2023)	Corresponde al mensual 6 - 2023ER24132_ Pago 6
Mensual 7	24.254.998	OP-24558 (18-12-2023)	Corresponde al mensual 7 - 2023ER28146 _ Pago 7
Mensual 8	24.254.999	OP-24560 (18-12-2023)	Corresponde al mensual 8 - 2023ER28148 _ Pago 8
Mensual 9	24.254.999	OP-24561 (18-12-2023)	Corresponde al mensual 9 - 2023ER28149 _ Pago 9
Mensual 10	24.254.999	OP-25131 (26-02-2024)	Corresponde al mensual 10 - 2024ER3749 _ Pago 10
Mensual 11	24.254.999	OP-25205 (08-03-2024)	Corresponde al mensual 11 - 2024ER4612 _ Pago 11
Mensual 12	24.254.999	OP-25493 (15-04-2024)	Corresponde al mensual 12 - 2024ER7249 _ Pago 12
Mensual 13	24.254.999	OP-25494 (15-04-2024	Corresponde al mensual 113- 2024ER7248 _ Pago 13
	-		
TOTALES	315.314.986		

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	3	2024	al	19	4	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

8. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	SEGUROS MUNDIAL	21-44-101406042	20/02/2023	20/04/2025	9/03/2023	138.599.999
Pago de salarios			20/02/2023	20/04/2027	9/03/2023	34.650.000
Calidad del servicio			20/02/2023	20/042027	9/03/2023	138.599.999
Responsabilidad civil extra contractual	SEGUROS MUNDIAL	21-40-101205844	20/02/2023	20/04/2024	9/03/2023	232.000.000

MODIFICACIÓN 1

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	SEGUROS MUNDIAL	21-44-101406042	20/02/2023	3/09/2025	Pendinte OJ	160.429.498
Pago de salarios			20/02/2023	3/09/2027	Pendinte OJ	40.107.375
Calidad del servicio			20/02/2023	3/09/2027	Pendinte OJ	160.429.498
Responsabilidad civil extra contractual	SEGUROS MUNDIAL	21-40-101205844	20/02/2023	3/09/2027	Pendinte OJ	Pendiente

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	3	2024	al	19	4	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio García García Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si		No	X

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento técnico del contrato, así como análisis respecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso etc.).

	INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	3	2024	al	19	4	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio Garcia Garcia Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

Resumen del desarrollo del contrato

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 20 de Enero de 2024 al 19 de febrero de 2024, los contratos de consultoría FONDIGER 010 DE 2023 e interventoría FONDIGER 013 de 2023 se encuentran en el décimo cuarto mes de desarrollo del proyecto, que corresponde al 100% del tiempo de ejecución del contrato de conformidad con los tiempos contractuales establecidos en el contrato, sin embargo, posterior a la aprobación de la prórroga el tiempo contractual se encuentra en un 77%, con fecha de terminación el 19 de agosto de 2024. En el periodo se desarrollaron mesas de trabajo, reuniones de seguimiento, y se emitieron y recibieron conceptos mediante oficios como soportes de las actividades del contrato de consultoría e interventoría.

Dentro de los alcances y la aprobación del cronograma del plan de contingencia y por medio de la estructura de valor ganado. Los avances durante el mes del presente informe para consultoría se relacionan a continuación: Avance programado consultoría : 68% Avance Real Consultoría 43%.

La interventoría informa "*Dada la aprobación de la prórroga, el cronograma del proyecto se ajusta y entra en rigor una nueva etapa para el desarrollo del contrato. Una vez realizado el cambio del cronograma, se identifica una diferencia entre la programación y las actividades ejecutadas (ver gráfica siguiente), por lo anterior, el consultor debe ajustar el cronograma en función de la condición actual del proyecto y las actividades entregadas y ejecutadas*"

Resumen administrativo: Se realizaron todas las gestiones de seguimiento que han permitido el desarrollo del contrato.
Resumen jurídico: Se cumplieron los requisitos precontractuales y de inicio.
Resumen financiero:

Técnicos	43%	Técnico	43%
Financieros consultoría	15%	Financieros interventoría	39%

Se anexa el informe de supervisión correspondiente

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	3	2024	al	19	4	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Pilar del Rocio Garcia Garcia Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático Desde el 20 de febrero de 2023.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								
Objeto Contractual:									
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.									

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La supervisión verifico el cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales conforme a los documentos (planillas, pagos, certificaciones) allegados por el contratista para el pao del producto 1, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002: "(....) verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. (...) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal(...)"

Fecha emisión de Informe	29	4	2024

Firma

Pilar del Rocio Garcia Garcia
Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Técnico: en caso que haya sido designado): Sin personal Asignado

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

IDIGER

SEGUIMIENTO A CONTRATOS Y CONVENIOS

Informe de Supervisión Contrato de interventoría FONDIGER 13-2023

Fecha de elaboración del informe	27 de Abril de 2024
Periodo de seguimiento	20 de Marzo de 2024 al 19 de Abril de 2024
Fecha de inicio	20 de febrero de 2023
Fecha de terminación	19 de abril de 2024
Valor del Contrato	$ 692.999.995
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE
Nombre de contratista	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Nombre del Supervisor	PILAR DEL ROCÍO GARCÍA GARCÍA
PLAZO DE EJECUCIÓN	14 meses

Avance


(INCLUIR EL PORCENTAJE DE AVANCE TÉNCICO Y FINANCIERO)

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 20 de Enero de 2024 al 19 de febrero de 2024, los contratos de consultoría FONDIGER 010 DE 2023 e interventoría FONDIGER 013 de 2023 se encuentran en el décimo cuarto mes de desarrollo del proyecto, que corresponde al 100% del tiempo de ejecución del contrato de conformidad con los tiempos contractuales establecidos en el contrato, sin embargo, posterior a la aprobación de la prórroga el tiempo contractual se encuentra en un 77%, con fecha de terminación el 19 de agosto de 2024. En el periodo se desarrollaron mesas de trabajo, reuniones de seguimiento, y se emitieron y recibieron conceptos mediante oficios como soportes de las actividades del contrato de consultoría e interventoría.

Dentro de los alcances y la aprobación del cronograma del plan de contingencia y por medio de la estructura de valor ganado. Los avances durante el mes del presente informe para consultoría se relacionan a continuación: Avance programado consultoría : 68% Avance Real Consultoría 43%.

La interventoría informa "*Dada la aprobación de la prórroga, el cronograma del proyecto se ajusta y entra en rigor una nueva etapa para el desarrollo del contrato. Una vez realizado el cambio del cronograma, se identifica una diferencia entre la programación y las actividades ejecutadas (ver gráfica siguiente), por lo anterior, el consultor debe ajustar el cronograma en función de la condición actual del proyecto y las actividades entregadas y ejecutadas* "

Figura 5-1 Avance real vs programado.

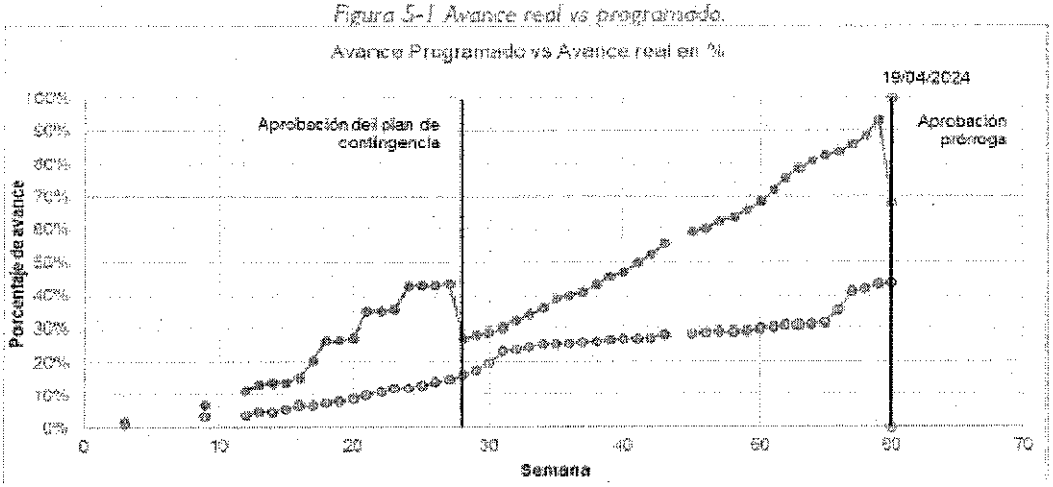

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente SAS

Técnicos	43%	**Técnico**	43%
Financieros consultoría	15%	**Financieros Interventoría**	39%

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

(RELACIONAR CORREOS, RESPUESTAS OFICIALES, REUNIONES Y TRÁMITES REALIZADOS EN EL PERÍODO DE SEGUIMIENTO)

Fecha	Actividad	Soporte
20/03/2024	Aprobación cambio Ingeniera Ambiental	Comunicación 2024EE5059
20/03/2024	Aprobación Informe mensual de interventoría No 12 - remitido a través de la comunicación 2024ER5449	Acta y correo electrónico
22/03/2024	Remisión del informe semanal del 11 de marzo al 17 de marzo de 2024	Comunicación 2024ER6097
21/03/2024	Solicitud de Prorroga radicada a la interventoría por parte de la consultorías, se copia la entidad	Comunicación 2024ER6029
26/03/2024	Interventoría realiza llamado de atención a consultoría por el cumplimiento de productos	Comunicación interventoría y correo electrónico
26/03/2024	Comité de seguimiento - Estado actual del proyecto	Acta
27/03/2024	Remisión del informe mensual 13 de Interventoría - Contrato FONDIGER 010-2023 a través de la comunicación 2024ER6317	Comunicación 2024ER6317 y correo electrónico

2/04/2024	Comité de seguimiento - Estado actual del proyecto	Acta
4/04/2024	Respuesta informe mensual 13 de parte de la supervisión 2024ER6317	Comunicación 2024EE6001 y Acta
4/04/2024	Remisión del informe semanal del 18 de marzo al 24 de marzo de 2024	Comunicación 2024ER6789
5/04/2025	Remisión del informe semanal del 25 de marzo al 31 de marzo de 2024	Comunicación 2024ER6938
9/04/2024	Comité de seguimiento - Estado actual del proyecto	Acta
11/04/2025	Atención Observación de Interventoría comunicado No. CO-0484-IDIGER-309. Solicitud de Prorroga Cto FONDIGER-010-2023 (Comunicación 2024ER7123) se copia a la supervisión de manera informativa	Comunicación 2024ER7123
11/04/2025	Solicitud de prorroga para los contratos FONDIGER 010 Y FONDIGER 013 (Comunicaciones 7280-7296-7661)	(Comunicaciones 2024ER7280-2024ER7296-2024ER7661)
15/04/2025	Solicitud por parte de la entidad de documentos requeridos para la solicitud de Prorroga	Correo Electrónico
15/04/2025	Solicitud registros de precipitación de la Estación hidrometeorológica Radar del IDIGER - Respuesta por parte de la entidad	Correo Electrónico y Comunicación 2024ER7310
15/04/2024	REUNION PREVIA CONTINUACION AUDIENCIA INCUMPLIMIENTO CONTRATO FONDIGER 010-2023 RIO TUNJUELO	Correo Electrónico
17/04/2024	Comité de seguimiento - Estado actual del proyecto	Acta
17/04/2024	Observaciones generadas a la Solicitud de Prorroga Contratos FONDIGER 10-2023 - Consultoría Río Tunjuelo	Correo Electrónico
18/04/2024	Remisión del informe semanal del 01 de abril al 07 de abril de 2024	Comunicación 2024ER7751
19/04/2024	Se realiza modificación al contrato FONDIGER 10-2023 en lo correspondiente a	Plataforma secop
19/04/2024	Mesa de trabajo con el fin de aclarar entre las partes el uso de la información de radar que posee el IDIGER	Acta

SEGUIMIENTO TECNICO:

(RELACIONAR INFORMES Y/O APORTES TÉCNICOS REALIZADOS N EL PERÍODO DE SEGUIMIENTO)

Producto	Fecha	Actividad	Soporte
Informes Mensual	14/03/2024	Informe Mensual 12 de interventoría en V2	Comunicación 2024ER5449
Informes Mensual	27/03/2024	Informe Mensual 13 de interventoría en V1	Comunicación 2024ER6317

PROFESIONAL RESPONSABLE

PILAR DEL ROCIO GARCIA GARCIA - SUPERVISORA DEL CONTRATO
