INFORME FINAL DE ACTIVIDADES PARA EL CONVENIO SOLIDARIO No. CO1.PCCNTR.5322448 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CHIQUINQUIRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE DICIEMBRE Y EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CHIQUINQUIRA

JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CHIQUINQUIRA

INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO SOLIDARIO

No. CO1.PCCNTR.5322448 DE 2023

CONVENIO SOLIDARIO No.	CO1.PCCNTR.5322448
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CHIQUINQUIRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CHIQUINQUIRA
VALOR	$ 31.922.204,69
PLAZO	UN (1) MES
FECHA DE INICIO	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2023

JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CHIQUINQUIRA

ALCANCE DEL CONVENIO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1,00	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	m3	41,39	$ 1.750,00	$ 72.432,50
2,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR	m3	41,39	$95.360,00	$ 3.946.950,40
3,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO MR 38	m3	45,99	$438.366,67	$20.160.483,15
5,00	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO	KG	470,88	$ 5.049,50	$ 2.377.708,56
				COSTO TOTAL DIRECTO	**$26.557.574,61**
				ADMINISTRACCION 20,0%	$5.311.514,92
				IMPREVISTOS 1,0%	$53.115,15
				UTILIDAD 0,0%	
				COSTO TOTAL INDIRECTO (A.I.U.)	**$5.364.630,07**
				COSTO TOTAL OBRA	**$31.922.204,69**

FORMA DE PAGO:

Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el MUNICIPIO con cargo al correspondiente certificado disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal. El valor aporte del Municipio será cancelado de la siguiente Manera: A) PAGO ANTICIPADO: El Municipio reconocerá un pago anticipado correspondiente al 50% del valor total de convenio suma equivalente a **QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DOS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($15.961.102,34)** el cual se desembolsará una vez perfeccionada el convenio, cumpliendo los requisitos de ejecución del mismo y la correspondiente suscripción del acta inicio. B) UN SEGUNDO PAGO : POR VALOR DE **DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($12.768.881,87)** equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del convenio, el cual se desembolsara una vez ejecutada el cincuenta (50%) por ciento de la obra, C) UN PAGO FINAL: por valor de **TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($3.192.220)** equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del convenio, el cual se desembolsará una vez se suscriba el acta de recibo final, informe del supervisor y liquidación del respectivo convenio; pagos que se efectuaran a la cuenta bancaria de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CHIQUINQUIRA.

JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CHIQUINQUIRA

RELACION DE ACTAS:

ACTAS	FECHA
ACTA DE INICIO	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA PARCIAL 1	12 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA PARCIAL 2	20 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 19 de diciembre y el 28 de diciembre de 2023.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE EJECUTADO
1,00	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	m3	41,39	100%
2,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR	m3	41,39	100%
3,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO MR 38	m3	45,99	100%
5,00	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO	KG	470,88	100%

JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CHIQUINQUIRA


1. **EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO**




2. **SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR**





3. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO MR 38

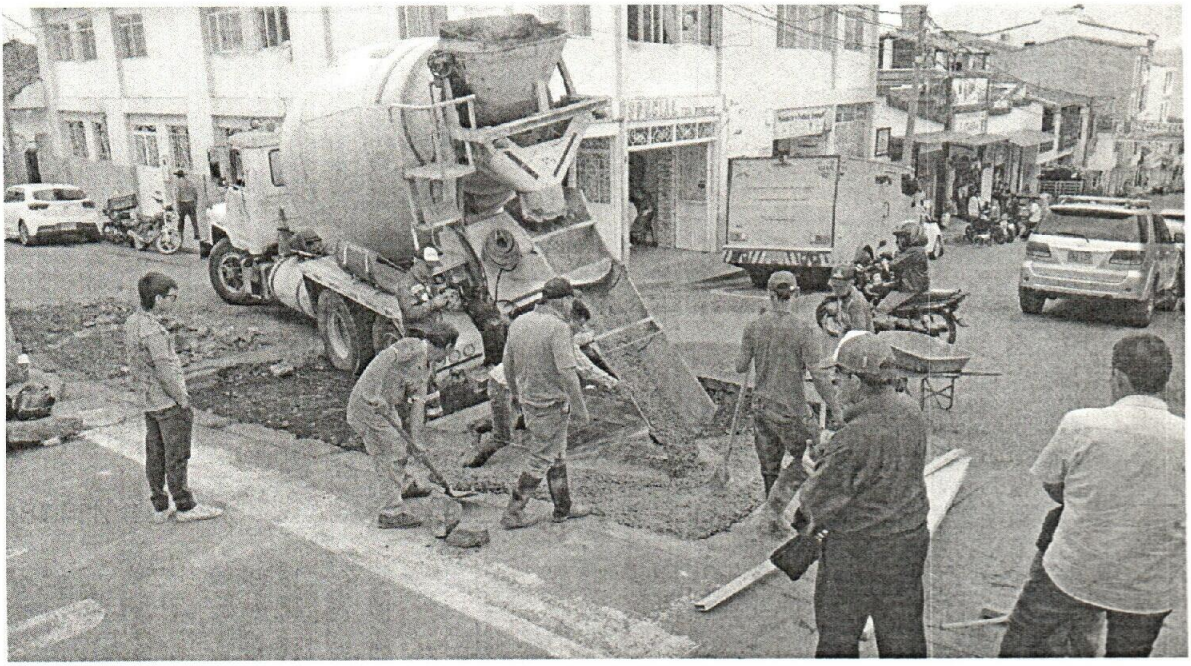

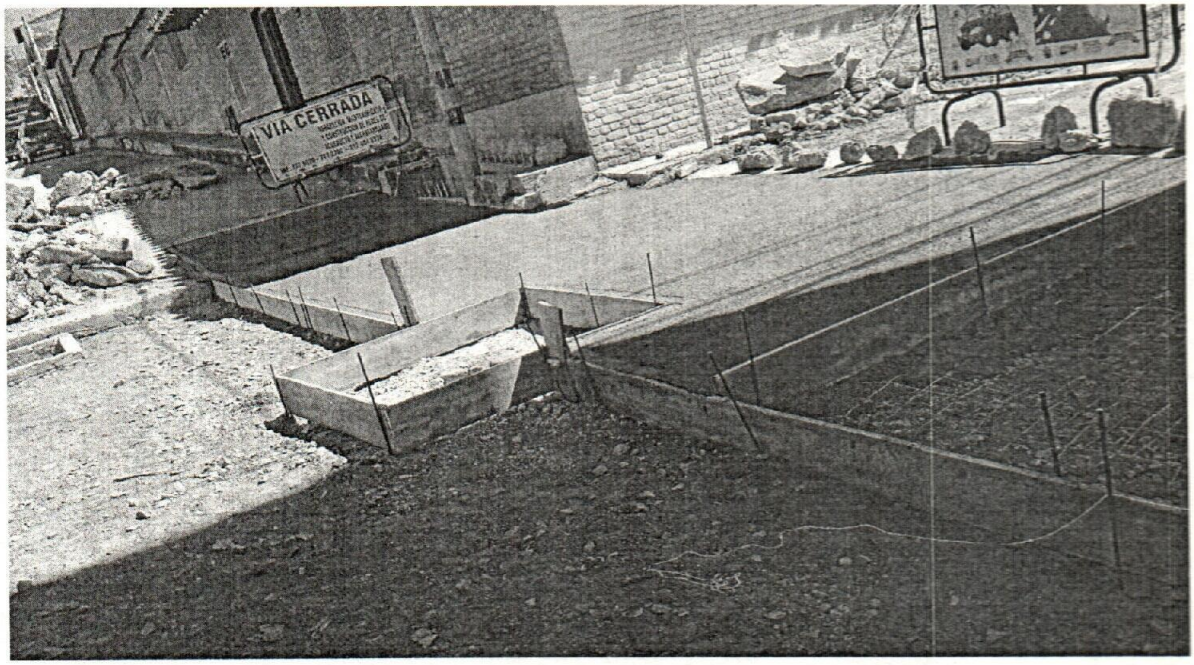


5. SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO

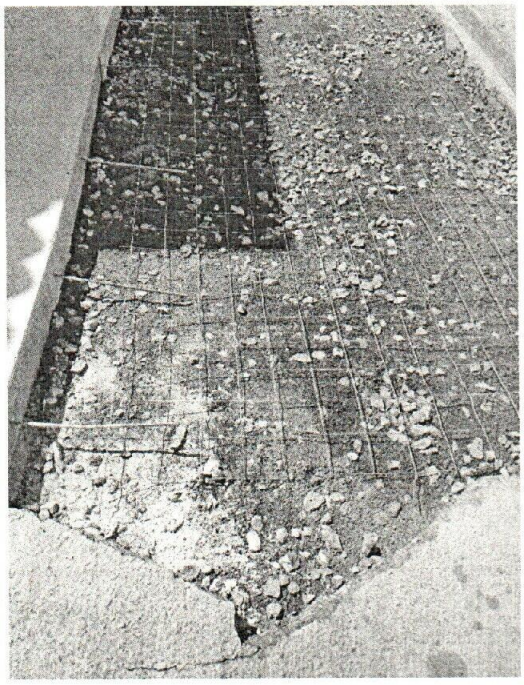


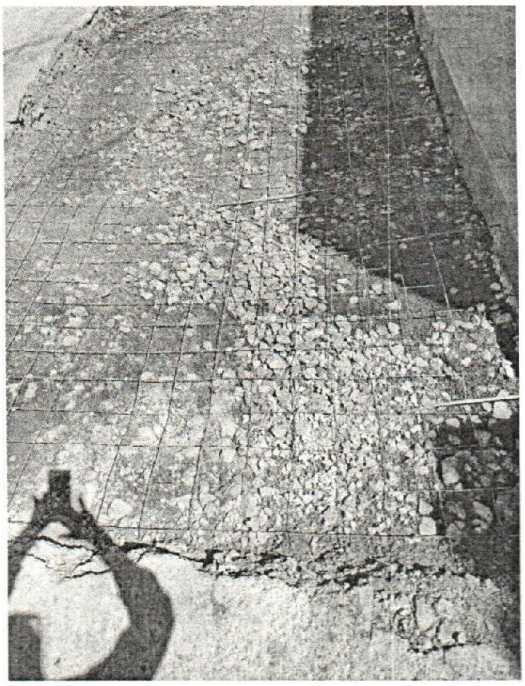


REGISTRÓ FOTOGRAFICO POR SECTORES INTERVENIDOS


Carrera 13 # 10 - 47 frente al despacho de la iglesia Chiquinquirá

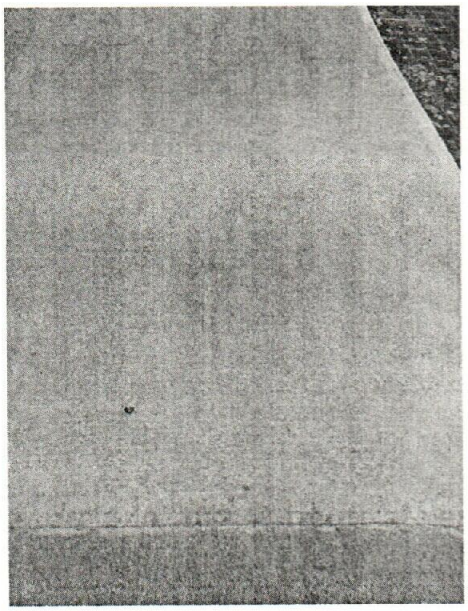

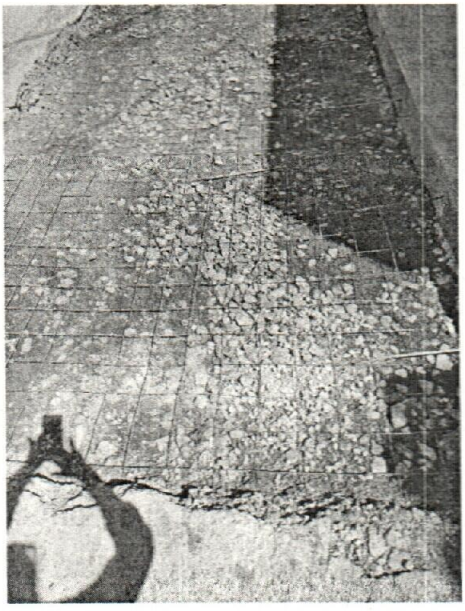



Carrera 13 # 10 - 47 frente al despacho de la iglesia Chiquinquirá


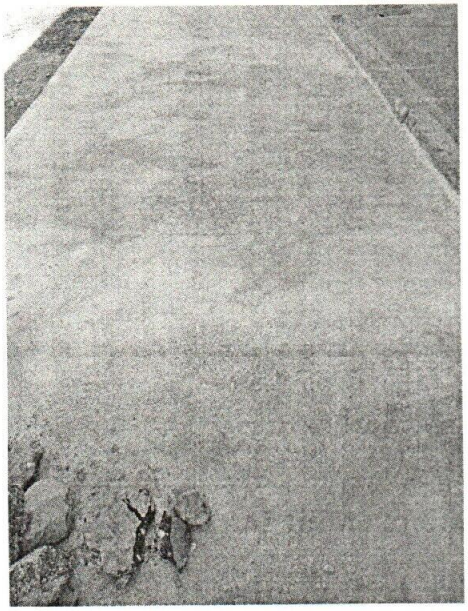


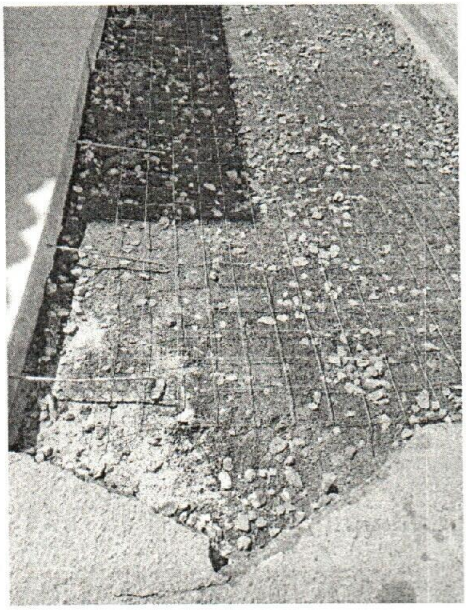



Calle 10 con carrera 14 esquina de la iglesia y la panadería especial

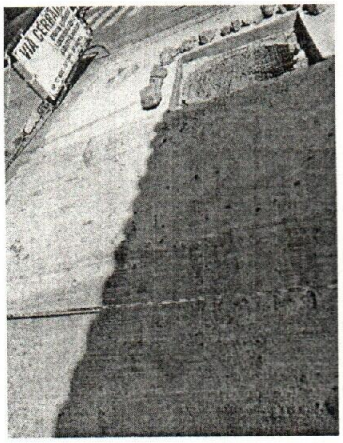


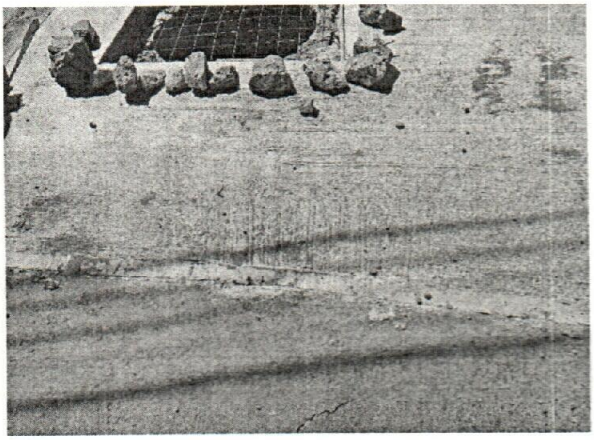


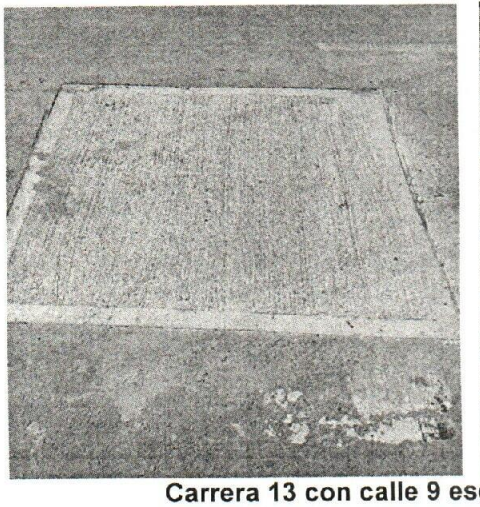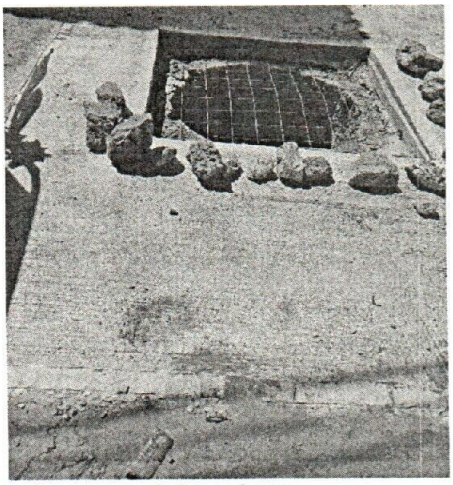
Carrera 13 con calle 9 esquina casa del anciano




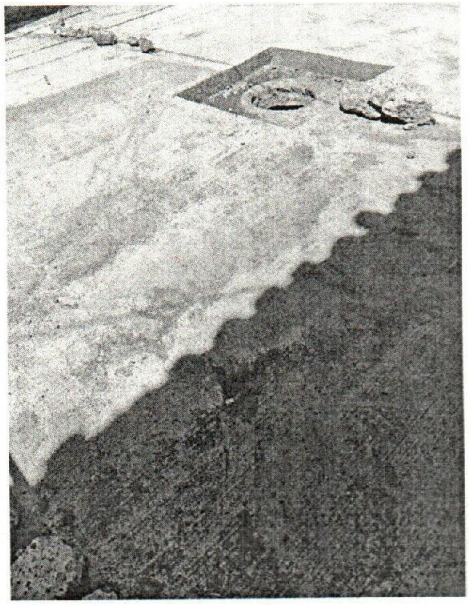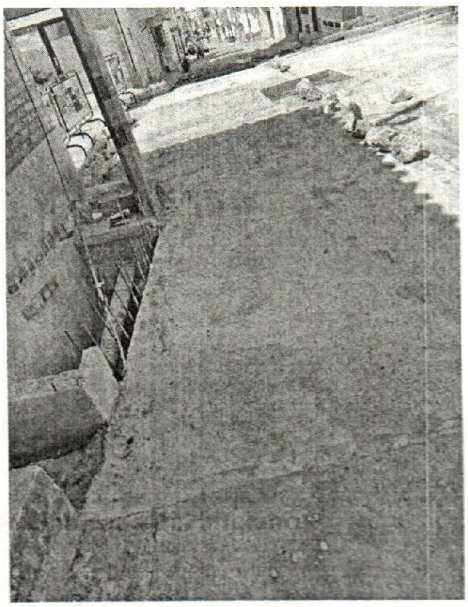

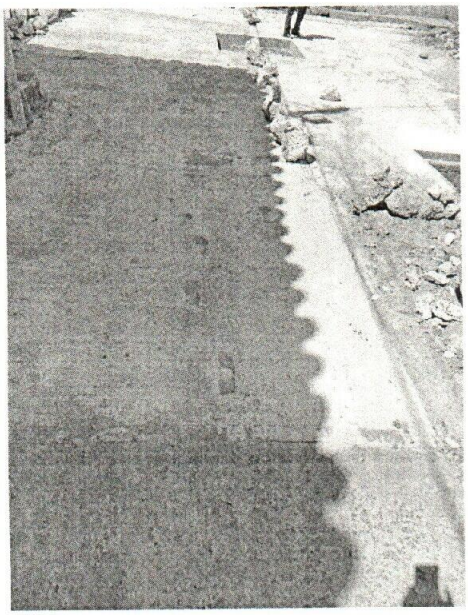
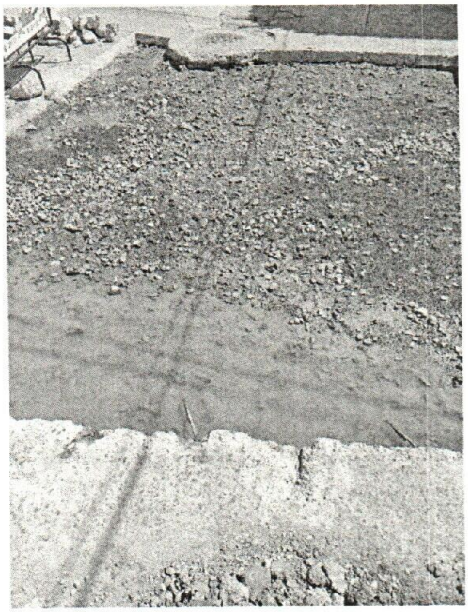


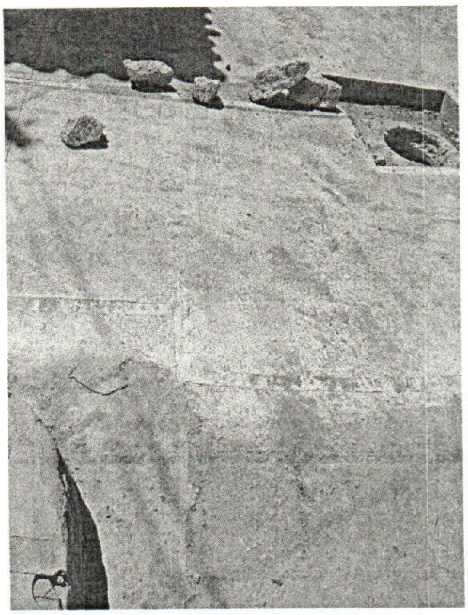Calle 9 con carrera 12 esquina

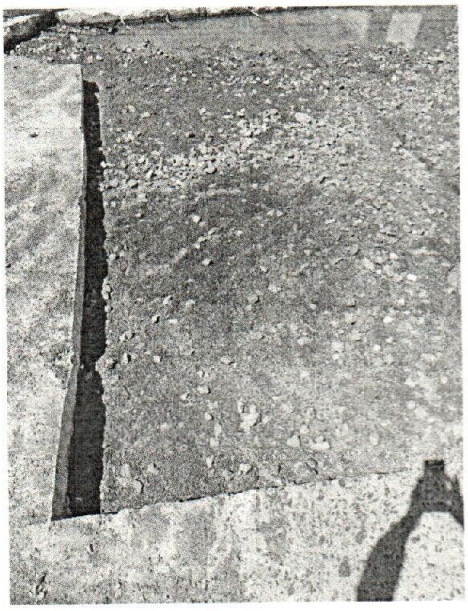

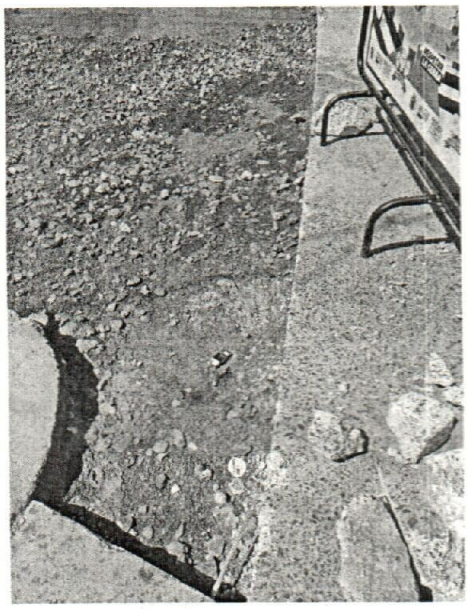








OBRA FINALIZADA


CARRERA 13 # 10-47 FRENTE AL DESPACHO

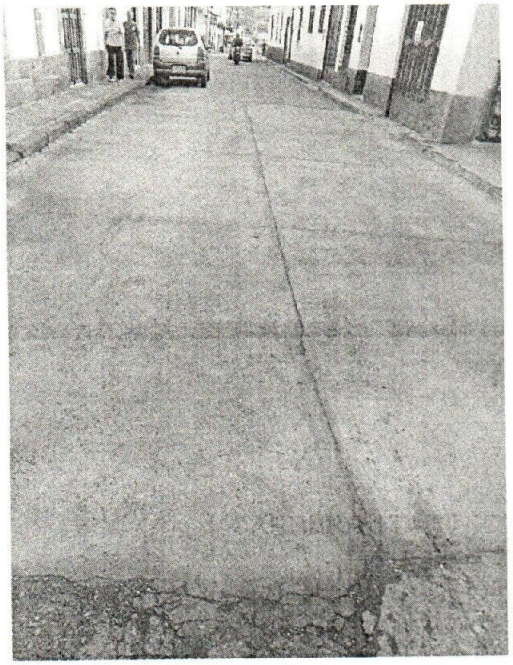

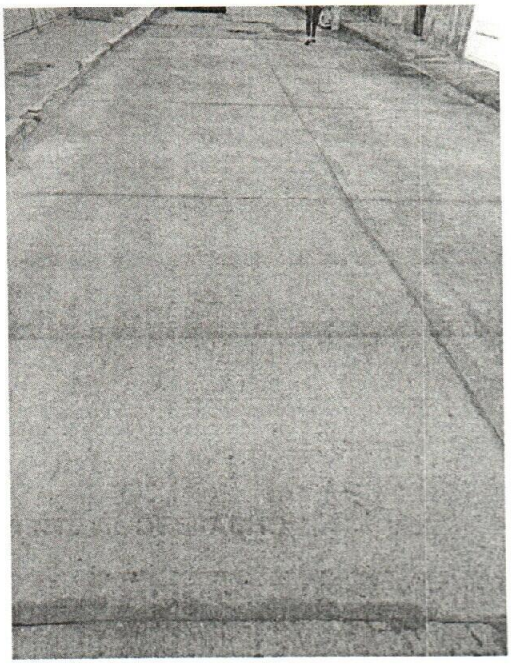


CALLE 10 CON CARRERA 14, ESQUINA PANADERIA ESPECIAL

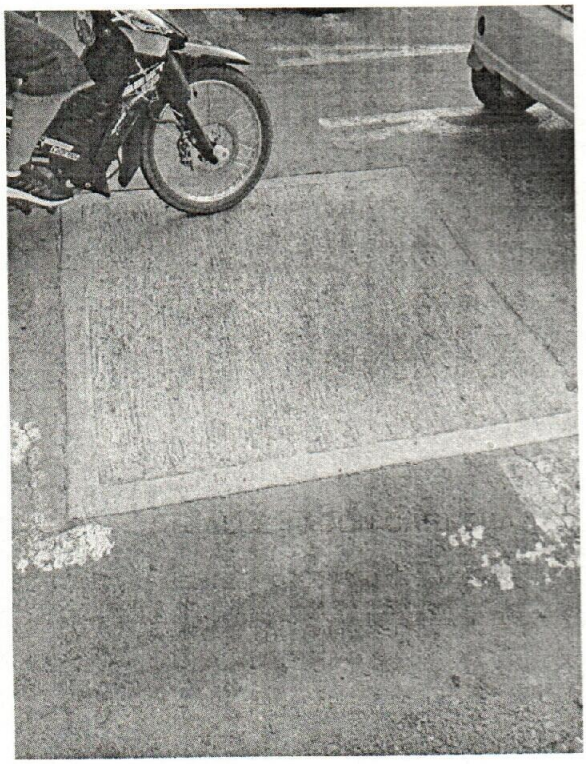


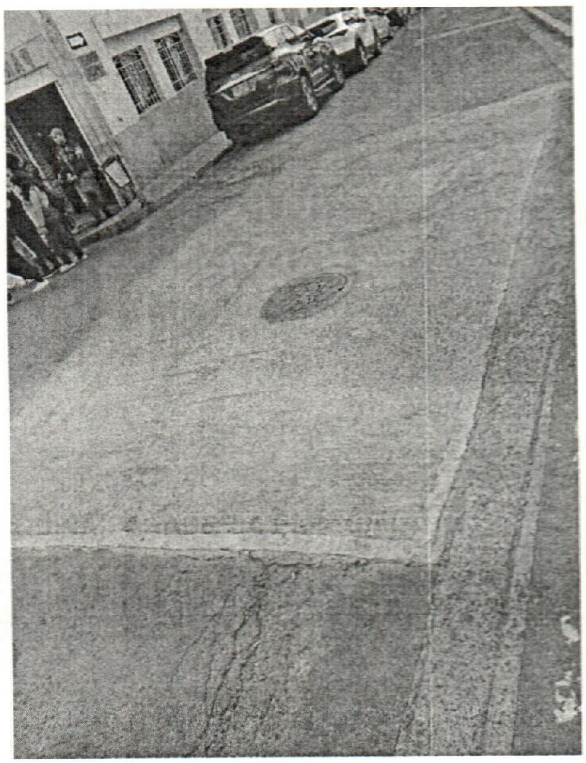


JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CHIQUINQUIRA

CARRERA 13 CON CALLE 9 ESQUINA DEL ANCIANATO

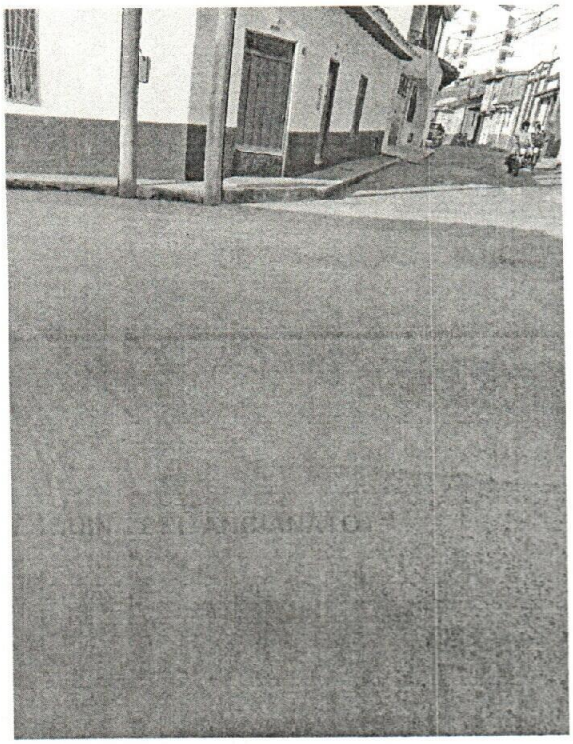


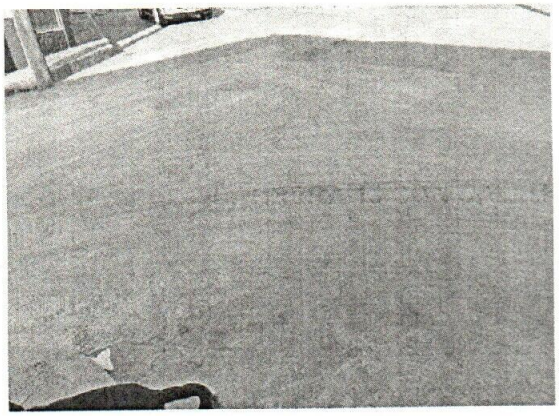

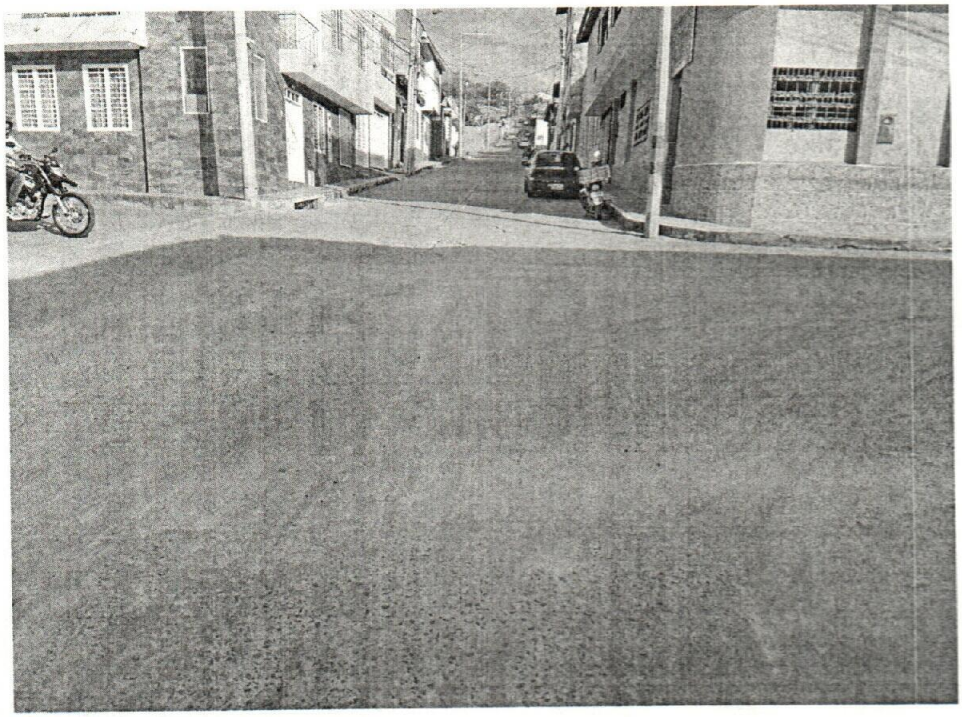


JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CHIQUINQUIRA

CALLE 9 CON CARRERA 12, ESQUINA

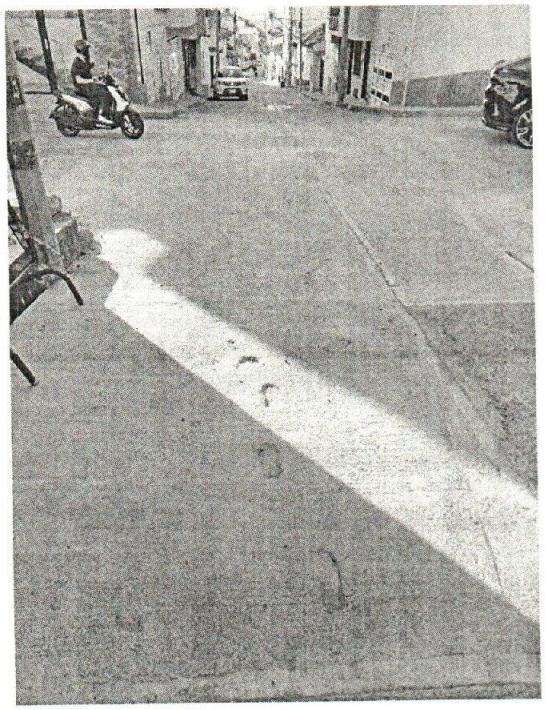





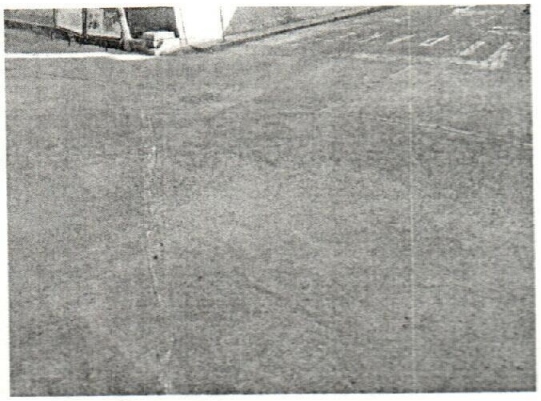

Georgina Zambrano

GEORGINA ZAMBRANO POVEDA

Presidente Junta de acción comunal Barrio Chiquinquirá

JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CHIQUINQUIRA
