INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ITEM	DESCRIPCION	M3
14.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	
TENIS					
CIMENTACION EJE A DEL 1 AL 7	3.80	4.30	2.330	7.00	266.51
CIMENTACION EJE B DEL 1 AL 6	3.70	3.70	2.330	6.00	191.39
CIMENTACION EJE C DEL 1 AL 3	3.80	4.30	2.330	3.00	114.22
DESCUENTO PAGO PARCIAL 1					-49.120
CIMENTACION EJE B DEL 1 AL 6	3.70	3.70	2.130	1.00	29.160
CIMENTACION EJE C DEL 1 AL 3	3.80	4.30	2.130	4.00	139.217
			VOLUMEN		
CAJEO CANCHA TENNIS 1 Y 2 (CUBIERTA)			846.380	1.00	846.380
VIENEN:				SUBTOTAL	1,537.76
PASAN:				TOTAL	1,537.76

OBSERVACIONES: se descuenta 49.120 M3, los cuales corresponden al calculo con una profundidad de 2,13 ms.		
Lo que esta escrito en Azul, corresponde al pago realizado en la parcial N°1.	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	1,537.76
VER PLANO No. 01/03 EXCAVACIONES	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	1,537.76
La cantidad cobrada es inferior a las que arrojan las carteras de volumnes, para el cajeo de la cancha	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	572.11
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	965.65
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

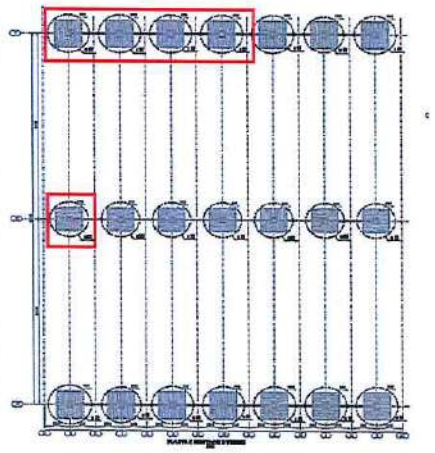

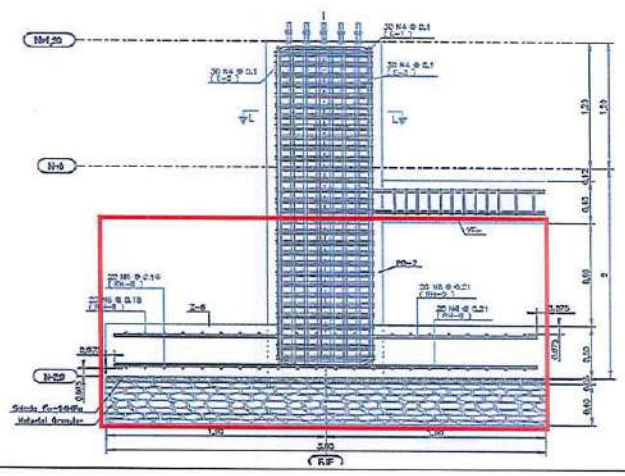

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M3
14.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA









Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072080-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNY ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
14,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA









Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200279650747

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

Calculo de Volúmenes

Proyecto: PARQUE SIKUANI

Alignment: perfi 1 - Cajeo Cancha cubierta de Tenis
Sample Line Group: seccion 1
Start Sta: 0+005,222
End Sta: 0+047,949

Station	Cut Area (Sq,m,)	Cut Volume (Cu,m,)	Reusable Volume (Cu,m,)	Fill Area (Sq,m,)	Fill Volume (Cu,m,)	Cum, Cut Vol, (Cu,m,)	Cum, Reusable Vol, (Cu,m,)	Cum, Fill Vol, (Cu,m,)	Cum, Net Vol, (Cu,m,)
0+005,222	20.37	0	0	0.07	0	0	0	0	0
0+010,000	18.79	93.55	93.55	0.47	1.3	93.55	93.55	1.3	92.24
0+020,000	20.5	196.45	196.45	0.84	6.56	290	290	7.87	282.13
0+030,000	24.67	225.85	225.85	0.01	4.26	515.85	515.85	12.13	503.72
0+040,000	26.32	254.95	254.95	0.33	1.7	770.8	770.8	13.83	756.97
0+044,546	27	121.2	121.2	0.46	1.79	892	892	15.62	876.38
0+047,949	7.97	59.51	59.51	2.7	5.37	951.51	951.51	20.99	930.52

lignment: perfil2 - - Cajeo Cancha de Baloncesto
Sample Line Group: seccion 2
Start Sta: 0+004,535
End Sta: 0+093,553

Station	Cut Area (Sq,m,)	Cut Volume (Cu,m,)	Reusable Volume (Cu,m,)	Fill Area (Sq,m,)	Fill Volume (Cu,m,)	Cum, Cut Vol, (Cu,m,)	Cum, Reusable Vol, (Cu,m,)	Cum, Fill Vol, (Cu,m,)	Cum, Net Vol, (Cu,m,)
0+004,535	4.84	0	0	2.88	0	0	0	0	0
0+010,000	16.4	58.03	58.03	0.01	7.9	58.03	58.03	7.9	50.14
0+020,000	12.08	142.37	142.37	0	0.06	200.4	200.4	7.96	192.44
0+030,000	9.58	108.29	108.29	0	0.02	308.69	308.69	7.98	300.71
0+040,000	8.49	90.34	90.34	0.17	0.88	399.03	399.03	8.86	390.17
0+050,000	5.79	71.38	71.38	0.86	5.15	470.41	470.41	14.01	456.4
0+060,000	7.24	65.14	65.14	0.08	4.67	535.56	535.56	18.68	516.88
0+070,000	10.16	86.98	86.98	0	0.4	622.53	622.53	19.07	603.46
0+080,000	9.84	100.01	100.01	0	0.02	722.54	722.54	19.09	703.45
0+090,000	14.23	120.36	120.36	0	0.01	842.9	842.9	19.1	823.8
0+093,553	10.37	43.69	43.69	0.01	0.02	886.6	886.6	19.12	867.48

Ing. Raúl Alberto Velasco Avila
M.P: 25335137306 CND / 01-10484 CPNT
Topógrafo Obra

FANNY BARRERA GONZÁLEZ
L.P. No. 01-10580
Topógrafo Interventoría

Calculo de Volúmenes

PARQUE SIKUANI,dwg
Alignment: perfi 3 - Cajeo Cancha sin cubierta de Tenis
Sample Line Group: secciones 3
Start Sta: 0+000,856
End Sta: 0+040,000

Station	Cut Area (Sq,m,)	Cut Volume (Cu,m,)	Reusable Volume (Cu,m,)	Fill Area (Sq,m,)	Fill Volume (Cu,m,)	Cum, Cut Vol, (Cu,m,)	Cum, Reusable Vol, (Cu,m,)	Cum, Fill Vol, (Cu,m,)	Cum, Net Vol, (Cu,m,)
0+000,856	1.79	0	0	0.14	0	0	0	0	0
0+010,000	6.93	39.87	39.87	0	0.66	39.87	39.87	0.66	39.21
0+020,000	9.08	80.06	80.06	0.05	0.24	119.93	119.93	0.89	119.03
0+030,000	8.65	88.67	88.67	0.02	0.34	208.59	208.59	1.23	207.36
0+040,000	10.31	94.81	94.81	0.29	1.56	303.4	303.4	2.79	300.61

Alignment: perfiL4 - Cajeo Cancha sin cubierta de Tenis
Sample Line Group: seccion4
Start Sta: 0+000,876
End Sta: 0+040,000

Station	Cut Area (Sq,m,)	Cut Volume (Cu,m,)	Reusable Volume (Cu,m,)	Fill Area (Sq,m,)	Fill Volume (Cu,m,)	Cum, Cut Vol, (Cu,m,)	Cum, Reusable Vol, (Cu,m,)	Cum, Fill Vol, (Cu,m,)	Cum, Net Vol, (Cu,m,)
0+000,876	2.6	0	0	0.38	0	0	0	0	0
0+010,000	4.2	31.01	31.01	0.44	3.73	31.01	31.01	3.73	27.28
0+020,000	7.03	56.14	56.14	0.23	3.37	87.14	87.14	7.1	80.04
0+030,000	12.28	96.53	96.53	0	1.16	183.67	183.67	8.26	175.41
0+038,775	14.7	118.36	118.36	0.03	0.13	302.03	302.03	8.39	293.64
0+040,000	9.95	15.1	15.1	0.06	0.06	317.13	317.13	8.45	308.69

TOTAL VOLUMEN DE CORTE 2459 M3

Ing. Raúl Alberto Velasco Avila
M.P: 25335137306 CND / 01-10484 CPNT
Topógrafo Obra

FANNY BARRERA GONZALEZ
L.P. No. 01-10580
Topógrafo Interventoría

TOPOGRAFIA	Proyecto: PARQUE SIKUANI	Calculó: RV	CALCULO DE VOLUMENES	
	Entidad: CONSORCIO INTERDEPORTIVO	Revisó:		
	Contiene: Excavación mecánica Tennis	Fecha:	Hoja:	De:

COTAS		AREA m^2	VOL PARC. m^3	VOL ACUM. m^3	OBSERVACIONES
Eje A-1	2.13 Mt	16.34	34.80	34.80	
Eje A-2	2.13 Mt	16.34	34.80	69.61	
Eje A-3	2.13 Mt	16.34	34.80	104.41	
Eje A-4	2.13 Mt	16.34	34.80	139.22	
Eje A-5	2.13 Mt	16.34	34.80	174.02	
Eje A-6	2.13 Mt	16.34	34.80	208.83	
Eje A-7	2.13 Mt	16.34	34.80	243.63	
Eje B-1	2.13 Mt	13.69	29.16	272.79	
Eje B-2	2.13 Mt	13.69	29.16	301.95	
Eje B-3	2.13 Mt	13.69	29.16	331.11	
Eje B-4	2.13 Mt	13.69	29.16	360.27	
Eje B-5	2.13 Mt	13.69	29.16	389.43	
Eje B-6	2.13 Mt	13.69	29.16	418.59	
Eje B-7	2.13 Mt	13.69	29.16	447.75	
Eje C-1	2.13 Mt	16.34	34.80	482.55	
Eje C-2	2.13 Mt	16.34	34.80	517.36	
Eje C-3	2.13 Mt	16.34	34.80	552.16	
Eje C-4	2.13 Mt	16.34	34.80	586.96	
Eje C-5	2.13 Mt	16.34	34.80	621.77	
Eje C-6	2.13 Mt	16.34	34.80	656.57	
Eje C-7	2.13 Mt	16.34	34.80	691.38	
				691.38	VOLUMEN DE EXCAVACION MECANICA
					CIMENTACIÓN CANCHA DE TENIS

Ing. Raúl Alberto Velasco Ávila
M.P: 25335137306 CND / 01-10484 CPNT
Topógrafo Obra

FANNY BARRERA GONZALEZ
L.P. No. 01-10580
Topógrafo Interventoría

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
14,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	
TENIS					
CIMENTACION EJE A DEL 1 AL 7	3,80	4,30	0,20	7,00	22,876
CIMENTACION EJE B DEL 1 AL 6	3,70	3,70	0,20	7,00	19,166
CIMENTACION EJE C DEL 1 AL 3	3,80	4,30	0,20	7,00	22,876
VIENEN:				SUBTOTAL	64,92
PASAN:				TOTAL	64,92

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 02/03 EXCAVACIONES	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	1.281,26
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	64,92
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	64,92
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	1.216,34

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

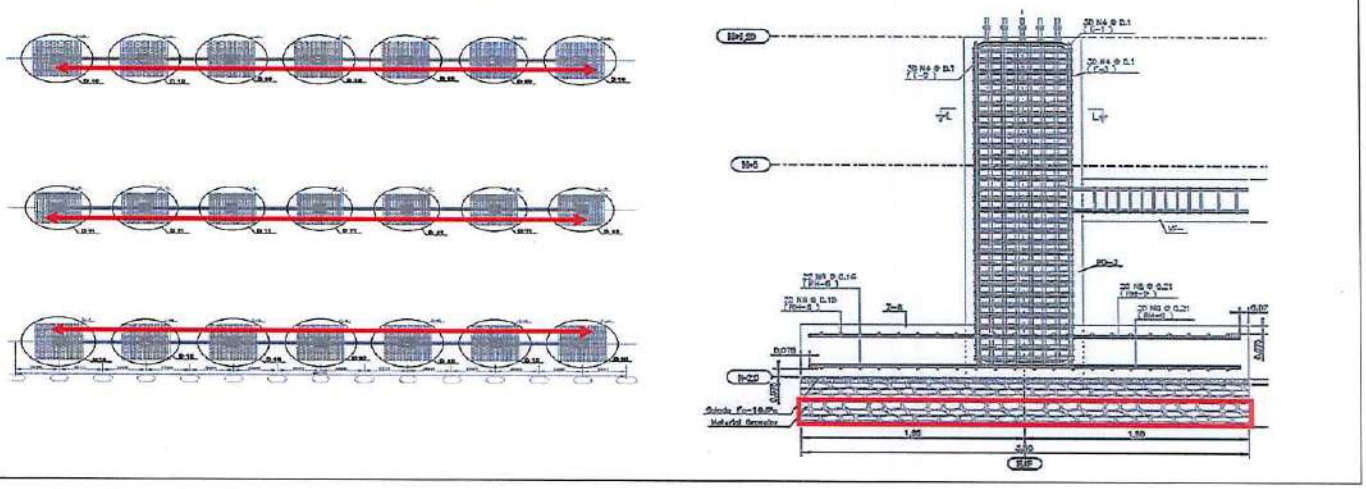

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072006-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M3
14,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA






Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: A2507200079650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-190337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUBERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

TOPOGRAFIA	Proyecto: PARQUE SIKUANI	Calculó: RV	CALCULO DE VOLUMENES	
	Entidad: CONSORCIO INTERDEPORTIVO	Revisó:		
	Contiene: Excavación manual Tennis	Fecha:	Hoja:	De:

COTAS	AREA m^2	VOL PARC. m^3	VOL ACUM. m^3	OBSERVACIONES
Eje A-1 0.20 Mt	16.34	3.27	3.27	
Eje A-2 0.20 Mt	16.34	3.27	6.54	
Eje A-3 0.20 Mt	16.34	3.27	9.80	
Eje A-4 0.20 Mt	16.34	3.27	13.07	
Eje A-5 0.20 Mt	16.34	3.27	16.34	
Eje A-6 0.20 Mt	16.34	3.27	19.61	
Eje A-7 0.20 Mt	16.34	3.27	22.88	
Eje B-1 0.20 Mt	13.69	2.74	25.61	
Eje B-2 0.20 Mt	13.69	2.74	28.35	
Eje B-3 0.20 Mt	13.69	2.74	31.09	
Eje B-4 0.20 Mt	13.69	2.74	33.83	
Eje B-5 0.20 Mt	13.69	2.74	36.57	
Eje B-6 0.20 Mt	13.69	2.74	39.30	
Eje B-7 0.20 Mt	13.69	2.74	42.04	
Eje C-1 0.20 Mt	16.34	3.27	45.31	
Eje C-2 0.20 Mt	16.34	3.27	48.58	
Eje C-3 0.20 Mt	16.34	3.27	51.85	
Eje C-4 0.20 Mt	16.34	3.27	55.11	
Eje C-5 0.20 Mt	16.34	3.27	58.38	
Eje C-6 0.20 Mt	16.34	3.27	61.65	
Eje C-7 0.20 Mt	16.34	3.27	64.92	
			64.92	VOLUMEN DE EXCAVACION MANUAL
				CIMENTACION CANCHA DE TENIS
			64.92	TOTAL EXCAVACION

Ing. Raúl Alberto Velasco Ávila
M.P: 25335137306 CND / 01-10484 CPNT
Topógrafo Obra

FANNY BARRERA GONZALEZ
L.P. No. 01-10580
Topógrafo Intervenoría

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
14,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	
PEDESTALES					
EJE A DEL 1 AL 7	3,80	4,30	0,30	7,00	34,314
EJE B DEL 1 AL 7	3,70	3,70	0,30	6,00	24,642
EJE C DEL 1 AL 7	3,80	4,30	0,30	3,00	14,706
EJE A DEL 1 AL 7	3,80	4,30	1,63	7,00	186,439
EJE B DEL 1 AL 7	3,70	3,70	1,63	6,00	133,888
EJE C DEL 1 AL 7	3,80	4,30	1,63	3,00	79,903
EJE B DEL 1 AL 7	3,70	3,70	1,93	1,00	26,422
EJE C DEL 1 AL 7	3,80	4,30	1,93	4,00	126,145
VIENEN:				SUBTOTAL	626,46
PASAN:	626,46			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 03/03 RELLENOS	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

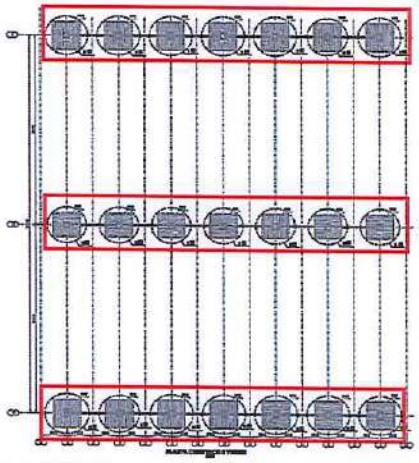

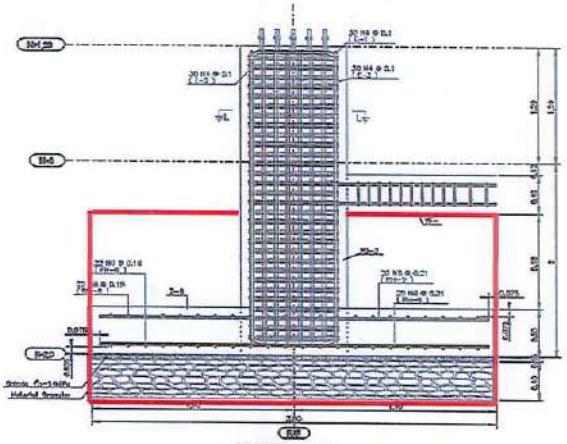

SECCION K-K

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M3
14,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	
DESCUENTOS					
SOLADO	3,80	4,30	0,05	-14,00	-11,438
	3,70	3,70	0,05	-7,00	-4,792
CONCRETO ZAPATAS	3,80	4,3	0,50	-14,00	-114,380
	3,70	3,70	0,50	-7,00	-47,915
CONCRETO PEDESTAL	1,00	1,20	0,98	-21,00	-24,696
			SUBTOTAL		423,239
VIENEN:	626,46			SUBTOTAL	423,24
PASAN:				TOTAL	423,24

OBSERVACIONES:
VER PLANO No. 03/03 RELLENOS

CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	1.437,54
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	423,24
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	73,66
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	349,58
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	1.014,30

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

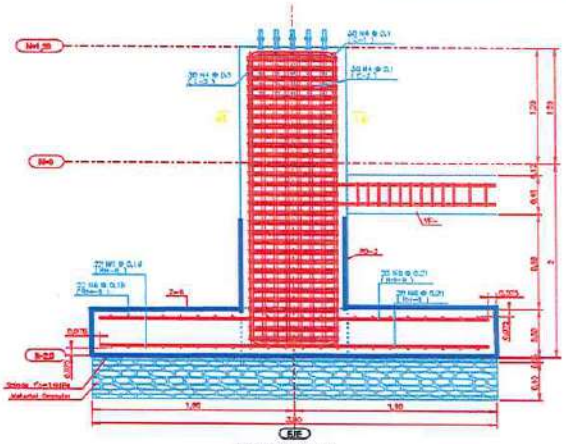

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHÓRQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	P

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	EXCAVACIONES Y RELLENOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M3
14,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-080337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

TOPOGRAFIA	Proyecto: PARQUE SIKUANI	Calculó: RV	CALCULO DE VOLUMENES	
	Entidad: CONSORCIO INTERDEPORTIVO	Revisó:		
	Contiene: Rellenos Tennis	Fecha:	Hoja:	De:

COTAS		AREA m^2	VOL PARC. m^3	VOL ACUM. m^3	OBSERVACIONES
Eje A-1	0.30 Mt	16.34	4.90	4.90	
Eje A-2	0.30 Mt	16.34	4.90	9.80	
Eje A-3	0.30 Mt	16.34	4.90	14.71	
Eje A-4	0.30 Mt	16.34	4.90	19.61	
Eje A-5	0.30 Mt	16.34	4.90	24.51	
Eje A-6	0.30 Mt	16.34	4.90	29.41	
Eje A-7	0.30 Mt	16.34	4.90	34.31	
Eje B-1	0.30 Mt	13.69	4.11	38.42	
Eje B-2	0.30 Mt	13.69	4.11	42.53	
Eje B-3	0.30 Mt	13.69	4.11	46.64	
Eje B-4	0.30 Mt	13.69	4.11	50.74	
Eje B-5	0.30 Mt	13.69	4.11	54.85	
Eje B-6	0.30 Mt	13.69	4.11	58.96	
Eje B-7	0.30 Mt	13.69	4.11	63.06	
Eje C-1	0.30 Mt	16.34	4.90	67.97	
Eje C-2	0.30 Mt	16.34	4.90	72.87	
Eje C-3	0.30 Mt	16.34	4.90	77.77	
Eje C-4	0.30 Mt	16.34	4.90	82.67	
Eje C-5	0.30 Mt	16.34	4.90	87.57	
Eje C-6	0.30 Mt	16.34	4.90	92.48	
Eje C-7	0.30 Mt	16.34	4.90	97.38	
				97.38	VOLUMEN DE RELLENO MEJORAMIENTO
					CIMENTACIÓN CANCHA DE TENIS
Eje A-1	1.63 Mt	16.34	26.63	26.63	
Eje A-2	1.63 Mt	16.34	26.63	53.27	
Eje A-3	1.63 Mt	16.34	26.63	79.90	
Eje A-4	1.63 Mt	16.34	26.63	106.54	
Eje A-5	1.63 Mt	16.34	26.63	133.17	
Eje A-6	1.63 Mt	16.34	26.63	159.81	
Eje A-7	1.63 Mt	16.34	26.63	186.44	
Eje B-1	1.63 Mt	13.69	22.31	208.75	
Eje B-2	1.63 Mt	13.69	22.31	231.07	
Eje B-3	1.63 Mt	13.69	22.31	253.38	
Eje B-4	1.63 Mt	13.69	22.31	275.70	
Eje B-5	1.63 Mt	13.69	22.31	298.01	
Eje B-6	1.63 Mt	13.69	22.31	320.33	
Eje B-7	1.63 Mt	13.69	22.31	342.64	
Eje C-1	1.63 Mt	16.34	26.63	369.28	
Eje C-2	1.63 Mt	16.34	26.63	395.91	
Eje C-3	1.63 Mt	16.34	26.63	422.54	
Eje C-4	1.63 Mt	16.34	26.63	449.18	
Eje C-5	1.63 Mt	16.34	26.63	475.81	
Eje C-6	1.63 Mt	16.34	26.63	502.45	
Eje C-7	1.63 Mt	16.34	26.63	529.08	
				529.08	VOLUMEN DE RELLENO CIMENTACION
					CANCHA DE TENIS
Eje A-1	-0.05 Mt	16.34	-0.82	-0.82	
Eje A-2	-0.05 Mt	16.34	-0.82	-1.63	
Eje A-3	-0.05 Mt	16.34	-0.82	-2.45	
Eje A-4	-0.05 Mt	16.34	-0.82	-3.27	
Eje A-5	-0.05 Mt	16.34	-0.82	-4.09	
Eje A-6	-0.05 Mt	16.34	-0.82	-4.90	
Eje A-7	-0.05 Mt	16.34	-0.82	-5.72	
Eje B-1	-0.05 Mt	13.69	-0.68	-6.40	
Eje B-2	-0.05 Mt	13.69	-0.68	-7.09	
Eje B-3	-0.05 Mt	13.69	-0.68	-7.77	

TOPOGRAFIA	Proyecto: PARQUE SIKUANI	Calculó: RV	CALCULO DE VOLUMENES	
	Entidad: CONSORCIO INTERDEPORTIVO	Revisó:		
	Contiene: Rellenos Tennis	Fecha:	Hoja:	De:

COTAS		AREA m^2	VOL PARC. m^3	VOL ACUM. m^3	OBSERVACIONES
Eje B-4	-0.05 Mt	13.69	-0.68	-8.46	
Eje B-5	-0.05 Mt	13.69	-0.68	-9.14	
Eje B-6	-0.05 Mt	13.69	-0.68	-9.83	
Eje B-7	-0.05 Mt	13.69	-0.68	-10.51	
Eje C-1	-0.05 Mt	16.34	-0.82	-11.33	
Eje C-2	-0.05 Mt	16.34	-0.82	-12.14	
Eje C-3	-0.05 Mt	16.34	-0.82	-12.96	
Eje C-4	-0.05 Mt	16.34	-0.82	-13.78	
Eje C-5	-0.05 Mt	16.34	-0.82	-14.60	
Eje C-6	-0.05 Mt	16.34	-0.82	-15.41	
Eje C-7	-0.05 Mt	16.34	-0.82	-16.23	
				-16.23	DESCUENTO CONCRETO SOLADO
					CIMENTACIÓN CANCHA DE TENIS
Eje A-1	-0.50 Mt	16.34	-8.17	-8.17	
Eje A-2	-0.50 Mt	16.34	-8.17	-16.34	
Eje A-3	-0.50 Mt	16.34	-8.17	-24.51	
Eje A-4	-0.50 Mt	16.34	-8.17	-32.68	
Eje A-5	-0.50 Mt	16.34	-8.17	-40.85	
Eje A-6	-0.50 Mt	16.34	-8.17	-49.02	
Eje A-7	-0.50 Mt	16.34	-8.17	-57.19	
Eje B-1	-0.50 Mt	13.69	-6.85	-64.04	
Eje B-2	-0.50 Mt	13.69	-6.85	-70.88	
Eje B-3	-0.50 Mt	13.69	-6.85	-77.73	
Eje B-4	-0.50 Mt	13.69	-6.85	-84.57	
Eje B-5	-0.50 Mt	13.69	-6.85	-91.42	
Eje B-6	-0.50 Mt	13.69	-6.85	-98.26	
Eje B-7	-0.50 Mt	13.69	-6.85	-105.11	
Eje C-1	-0.50 Mt	16.34	-8.17	-113.28	
Eje C-2	-0.50 Mt	16.34	-8.17	-121.45	
Eje C-3	-0.50 Mt	16.34	-8.17	-129.62	
Eje C-4	-0.50 Mt	16.34	-8.17	-137.79	
Eje C-5	-0.50 Mt	16.34	-8.17	-145.96	
Eje C-6	-0.50 Mt	16.34	-8.17	-154.13	
Eje C-7	-0.50 Mt	16.34	-8.17	-162.30	
				-162.30	DESCUENTO CONCRETO ZAPATAS
					CIMENTACIÓN CANCHA DE TENIS
Eje A-1	-0.98 Mt	1.20	-1.18	-1.18	
Eje A-2	-0.98 Mt	1.20	-1.18	-2.35	
Eje A-3	-0.98 Mt	1.20	-1.18	-3.53	
Eje A-4	-0.98 Mt	1.20	-1.18	-4.70	
Eje A-5	-0.98 Mt	1.20	-1.18	-5.88	
Eje A-6	-0.98 Mt	1.20	-1.18	-7.06	
Eje A-7	-0.98 Mt	1.20	-1.18	-8.23	
Eje B-1	-0.98 Mt	1.20	-1.18	-9.41	
Eje B-2	-0.98 Mt	1.20	-1.18	-10.58	
Eje B-3	-0.98 Mt	1.20	-1.18	-11.76	
Eje B-4	-0.98 Mt	1.20	-1.18	-12.94	
Eje B-5	-0.98 Mt	1.20	-1.18	-14.11	
Eje B-6	-0.98 Mt	1.20	-1.18	-15.29	
Eje B-7	-0.98 Mt	1.20	-1.18	-16.46	
Eje C-1	-0.98 Mt	1.20	-1.18	-17.64	
Eje C-2	-0.98 Mt	1.20	-1.18	-18.82	
Eje C-3	-0.98 Mt	1.20	-1.18	-19.99	
Eje C-4	-0.98 Mt	1.20	-1.18	-21.17	
Eje C-5	-0.98 Mt	1.20	-1.18	-22.34	
Eje C-6	-0.98 Mt	1.20	-1.18	-23.52	

TOPOGRAFIA	Proyecto: PARQUE SIKUANI	Calculó: RV	CALCULO DE VOLUMENES	
	Entidad: CONSORCIO INTERDEPORTIVO	Revisó:		
	Contiene: Rellenos Tennis	Fecha:	Hoja:	De:

COTAS	AREA m^2	VOL PARC. m^3	VOL ACUM. m^3	OBSERVACIONES
Eje C-7 -0.98 Mt	1.20	-1.18	-24.70	
			-24.70	DESCUENTO CONCRETO PEDESTALES
				CIMENTACIÓN CANCHA DE TENIS
			423.24	TOTAL RELLENO

Ing. Raúl Alberto Velasco Ávila
M.P: 25335137306 CND / 01-10484 CPNT
Topógrafo Obra

FANNY BARRERA GONZALEZ
L.P. No. 01-10580
Topógrafo Intervenoría

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		


ACTA	PARCIAL No. 2
CAPITULO:	CIMENTACION
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN / UNIDAD
15,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) / M3


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	LARGO	ESPESOR	CANTIDAD	
TENIS					
SOLADO ZAPATAS					
CIMENTACION EJE A DEL 1 AL 7	3,80	4,30	0,05	7,00	5,72
CIMENTACION EJE B DEL 1 AL 6	3,70	3,70	0,05	6,00	4,11
CIMENTACION EJE C DEL 1 AL 3	3,80	4,30	0,05	1,00	0,82
CIMENTACION EJE B-7	3,70	3,70	0,05	1,00	0,685
CIMENTACION EJE C DEL 1 AL 6	3,80	4,30	0,05	6,00	4,902
SOLADO VIGAS					
CIMENTACION EJE A DEL 1 AL 7	0,40	6,00	0,05	6,00	0,72
CIMENTACION EJE B DEL 1 AL 6	0,40	6,00	0,05	6,00	0,72
CIMENTACION EJE C DEL 1 AL 3	0,40	6,00	0,05	6,00	0,72
VIENEN:				SUBTOTAL	18,40
PASAN:				TOTAL	18,40

OBSERVACIONES:
VER PLANO No. 01/08 CIMENTACION

CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	19,23
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	18,40
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	10,64
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	7,76
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0,83

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

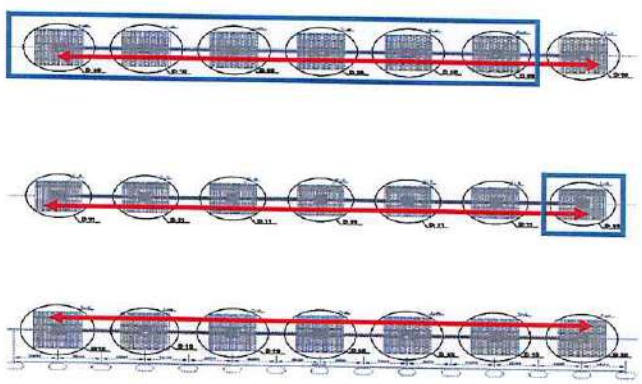

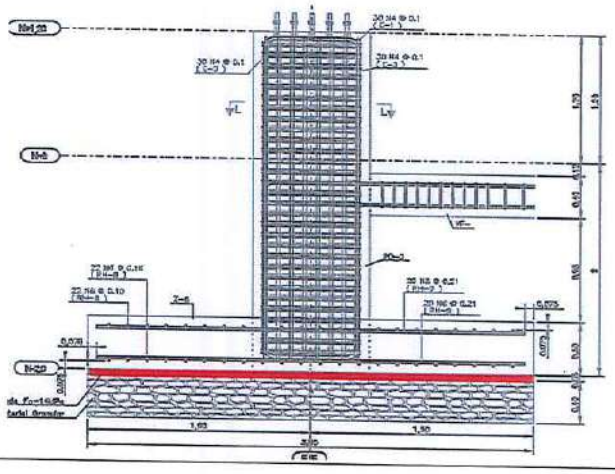

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200079650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153998 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-[illegible]337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
15.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA









Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2502000-79650747

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MERROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOBORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	KG
15,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	DIAMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD	
ZAPATA					
Z6 - RH8	3/4"	2,235	4,15	308	2856,78
Z6 - RH9	3/4"	2,235	3,65	280	2284,17
Z5 - RH11	3/4"	2,235	3,55	133	1055,26
Z5 - RH11	3/4"	2,235	3,55	133	1055,26
PEDESTALES					
PD-2 - RV1	1"	3,973	3,89	714,00	11034,849
PD2 - E1	1/2"	0,994	4,04	630,00	2529,929
PD2 - E2	1/2"	0,994	1,09	2520,00	2730,319
PD2 - E3	1/2"	0,994	1,29	1890,00	2.423,47
VIENEN:				SUBTOTAL	25.970,04
PASAN:	25970,04			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 02/08 ACERO REFUERZO - 03/08 ACERO REFUERZO	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507 2008-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ITEM	DESCRIPCION	KG
15,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	DIAMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD	
VIGA CIMENTACION					
INFERIOR	3/4"	2,235	6	9	114,66
	3/4"	2,235	9	9	181,04
	3/4"	2,235	12	9	241,38
	3/4"	2,235	9	9	181,04
	3/4"	2,235	12	9	241,380
SUPERIOR	3/4"	2,235	12	9	241,380
	3/4"	2,235	9	9	181,035
	3/4"	2,235	12	9	241,380
	3/4"	2,235	9	9	181,04
	3/4"	2,235	6	9	114,66
ESTRIBOS - E11	3/8"	0,560	1,21	810	548,86
VIENEN:	25970,04			SUBTOTAL	2.467,86
PASAN:	2467,86			TOTAL	28.437,90

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 04/08 ACERO REFUERZO - 05/08 ACERO REFUERZO	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	33.944,57
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	28.437,90
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	28.437,90
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	5.506,67

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200078650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090387 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
15,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200479650447

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
15,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA









Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-76650149

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		


ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	
N° ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD
NP15.8	PEDESTALES EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	LARGO	ALTURA	CANTIDAD	
PEDESTALES					
EJE A DEL 1 AL 7 - D10	1,00	1,20	2,70	7	22,68
EJE B DEL 1 AL 7 - D11	1,00	1,20	2,70	7	22,68
EJE C DEL 1 AL 7 - D10	1,00	1,20	2,70	7	22,68
VIENEN:					
PASAN:				SUBTOTAL	68,04
				TOTAL	68,04

OBSERVACIONES:
VER PLANO No. 06/08 CIMENTACION

CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	68,04
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	68,04
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	68,04
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

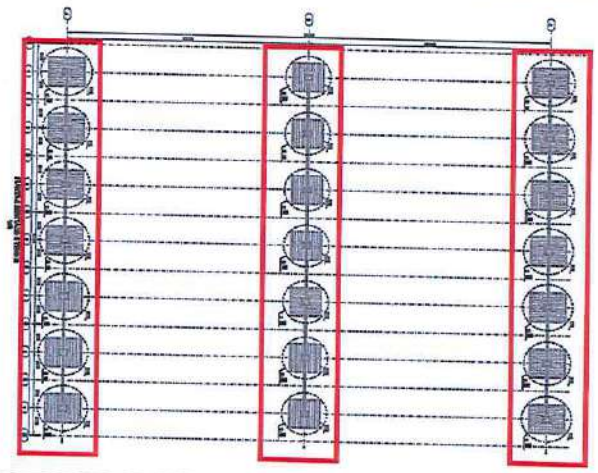

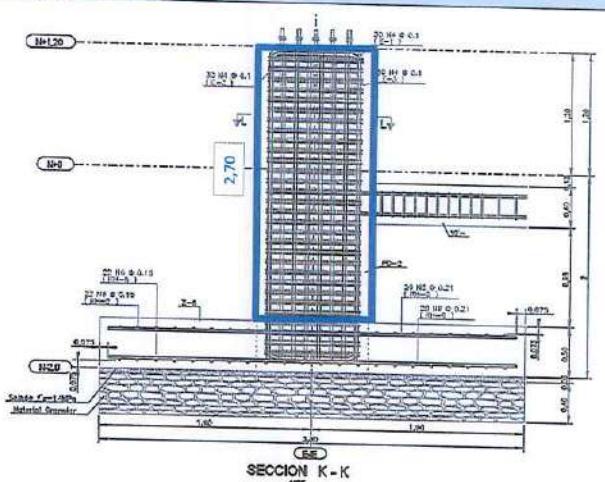

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	
N° ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD
NP15.8	PEDESTALES EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA









Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-096337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		


ACTA	PARCIAL No. 2
CAPITULO:	CIMENTACION
N° ITEM	DESCRIPCION / UNIDAD
NP15.9	ZAPATA EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN / M3


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	LARGO	ALTURA	CANTIDAD	
ZAPATAS					
EJE A DEL 1 AL 7 - Z6	3,80	4,30	0,50	7	57,19
EJE B DEL 1 AL 7 - Z5	3,70	3,70	0,50	7	47,92
EJE C DEL 1 AL 7 - Z6	3,80	4,30	0,50	7	57,19
VIENEN:				SUBTOTAL	162,30
PASAN:				TOTAL	162,30

OBSERVACIONES:
VER PLANO No. 07/08 CIMENTACION

CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	162,30
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	162,30
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	162,30
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

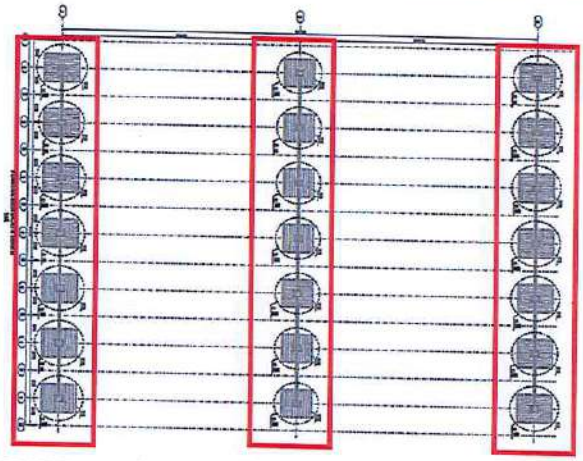

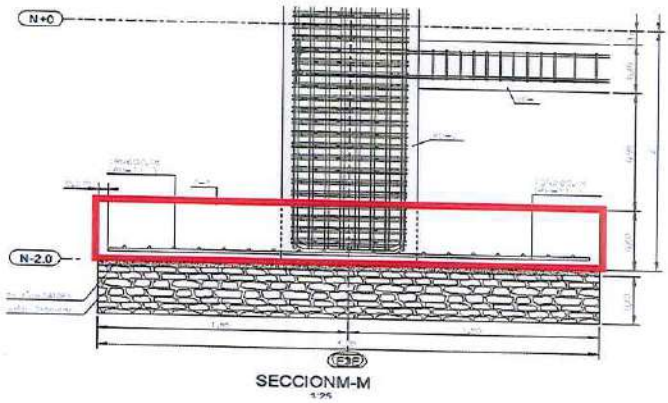

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000279656147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M3
NP15.9	ZAPATA EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-2060-79660147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090637 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M3
NP15.10	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	LARGO	ALTURA	CANTIDAD	
VIGA CIMENTACION					
EJE A DEL 1 AL 7	0,40	6,00	0,40	6	5,76
EJE B DEL 1 AL 7	0,40	6,00	0,40	6	5,76
EJE C DEL 1 AL 7	0,40	6,00	0,40	6	5,76
VIENEN:				SUBTOTAL	17,28
PASAN:				TOTAL	17,28

OBSERVACIONES:
VER PLANO No. 08/08 CIMENTACION

CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	17,28
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	17,28
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	17,28
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

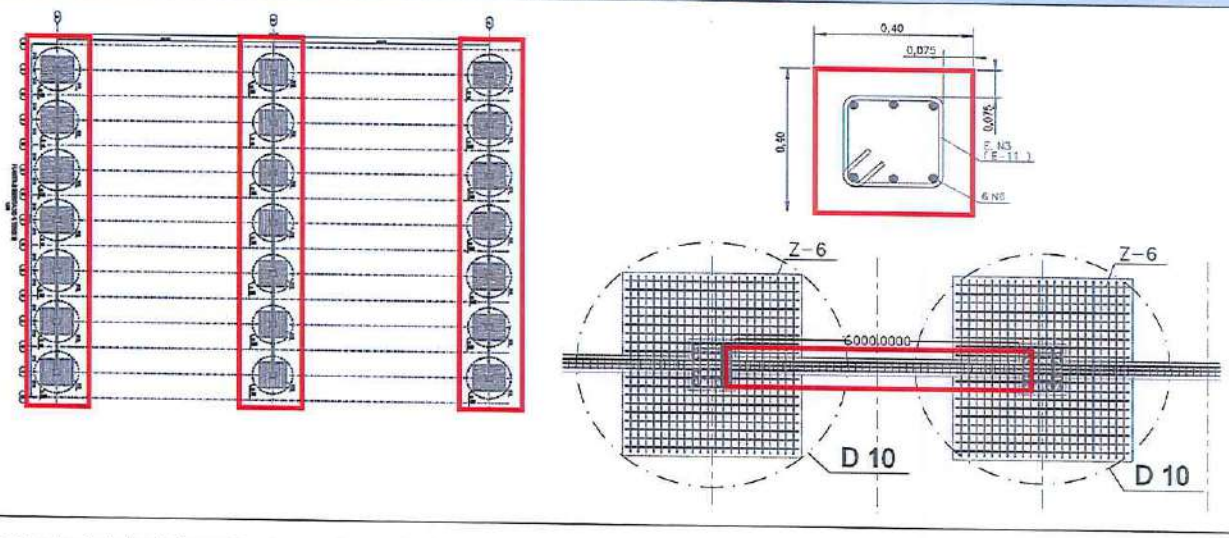

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2520 2000-186501 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090287 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
NP15.10	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA









Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2500200279650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A56202005-86070273

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
AN-1 PERNOS ANCLAJE VD 1 1/8" ASTM F1554 Gr105	01 y 07	3.690	732MM	336	1239.84
AN-3 ARANDELA PLT12-ASTM A572 Gr50	01 y 07	0.540	76MM	1008	544.32
TUERCA A563 DH 2Hx1/8	01 y 07	0.240	29MM	1008	241.92
VIENEN:				SUBTOTAL	2,026.08
PASAN:	2026.08			TOTAL	

OBSERVACIONES: SE INSTALA 3 ARANDELAS POR TORNILLO Y 3 TUERCAS POR TORNILLO		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

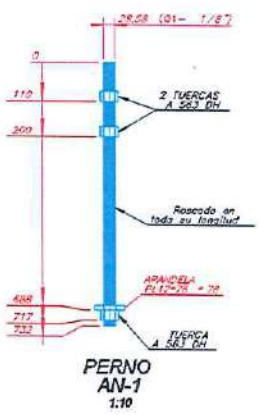

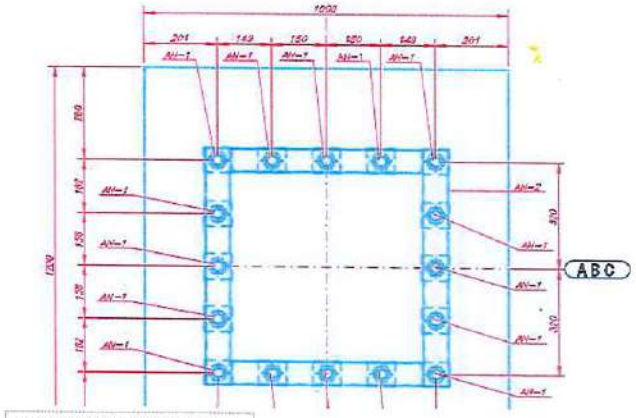

16 TORNILLOS X PEDESTAL

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 30 de abril de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

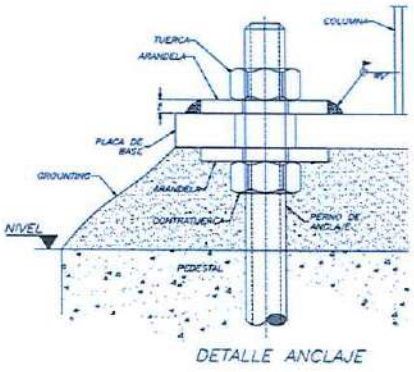

DETALLE ANCLAJE



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 30 de abril de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

TOTAL PEDESTALES:
EJE C: 7 UND
EJE B: 7 UND
EJE A. 7 UND

TOTAL: 21 PEDESTALES

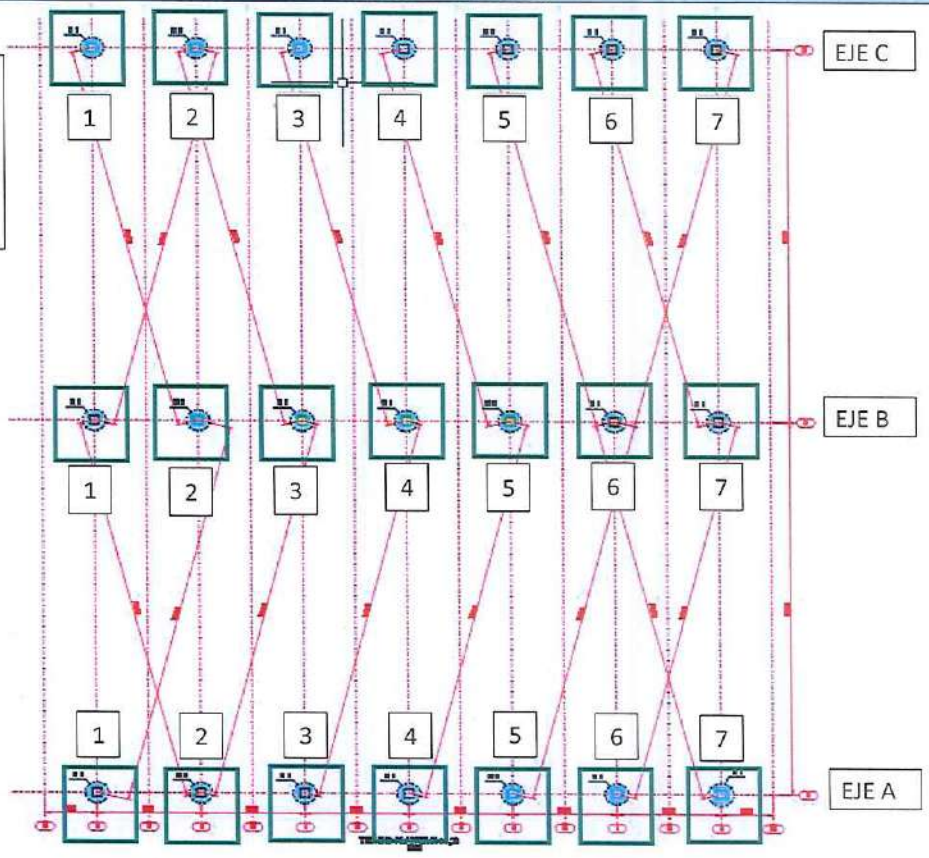

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-78650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-050337 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
TORNILLO A307 1/2"X1" (1)	06	0.055		2448	134.64
ARANDELAS (1)	06	0.0173		4232	73.21
TORNILLO A307 1/2"X1 1/4" (2)	05	0.059		480	28.32
TORNILLO A307 1/4"X1" (3)	06	0.011		1064	11.70
ARANDELAS 1/4" (3)	06	0.0029		2128	6.17
TORNILLO A325 1 1/2" X 4 1/2" (4)	03 y 04	2.109		512	1079.81
TORNILLO A325 1 1/4" X 4 1/2" (5)	05	1.352		144	194.69
TORNILLO A325 1"X2 1/4" (6)	05	0.562		312	175.34
TORNILLO A325 5/8"X2" (7)	03 y 04	0.17		128	21.76
TORNILLO A325 7/8"X4"1/4 (8)	05	0.562		264	148.37
TUERCA 2H (1-1/8) (9)		0.2449		336	82.29
VIENEN:	2026.08			SUBTOTAL	1,956.30
PASAN:	3982.38			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
Pesos de tornillería ver plano 5	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

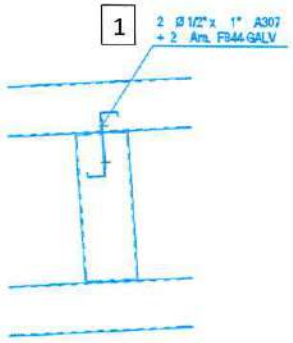

DETALLE TIPICO
CONEXION CORREA
1:25

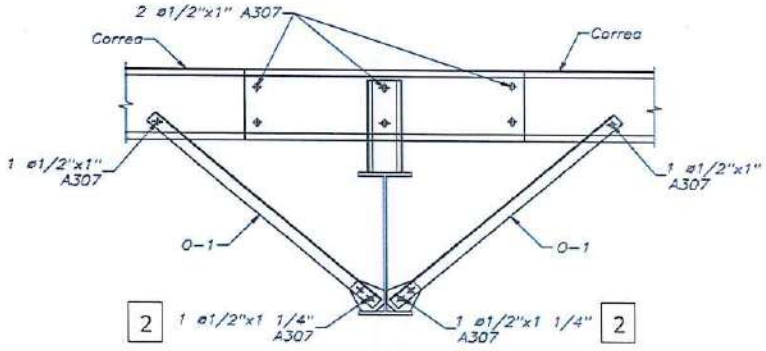

DETALLE TORNAPUNTA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

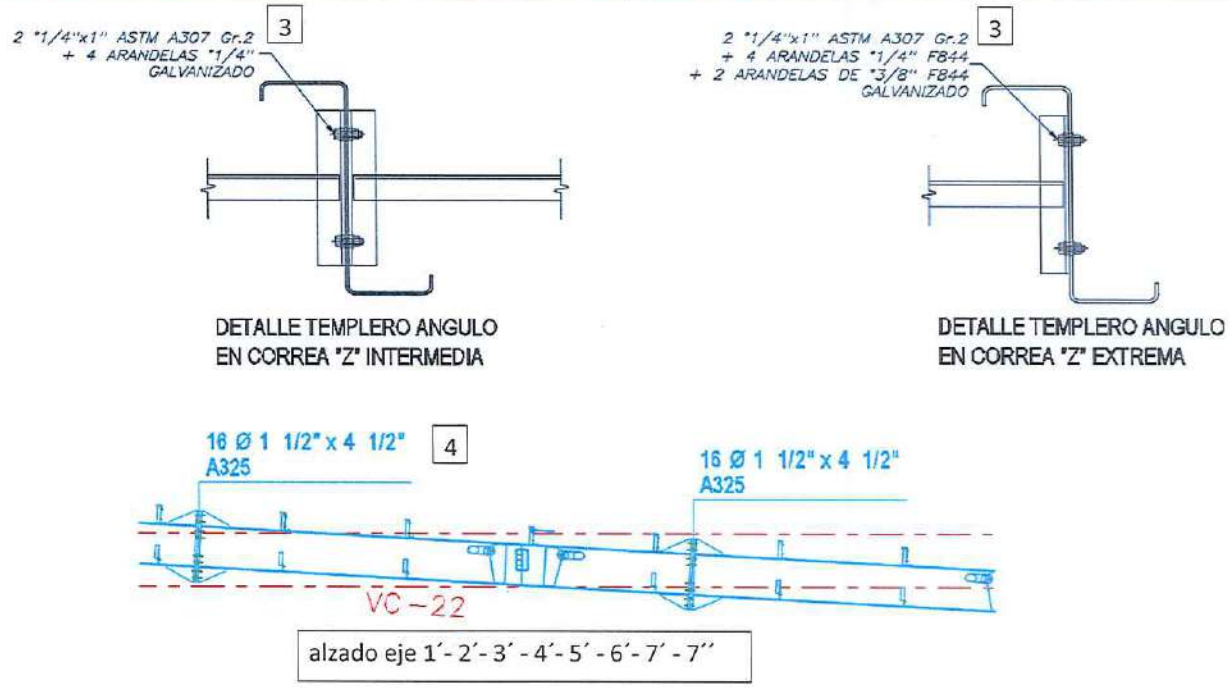

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090887 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

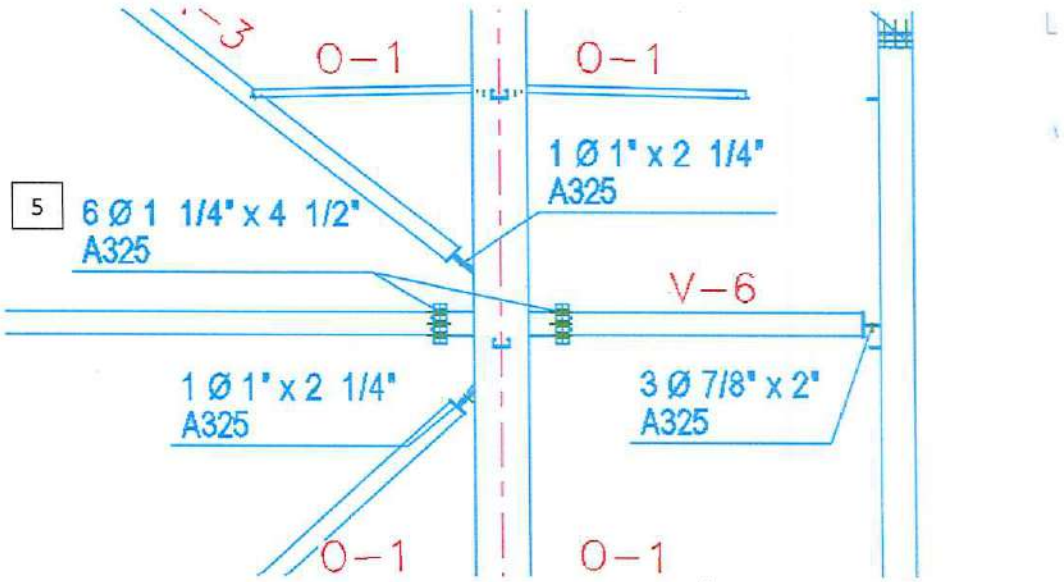

DISTRIBUCION V - R - VC - O
EJE 1´ DEL A AL C Y EJE 7´´ DEL

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

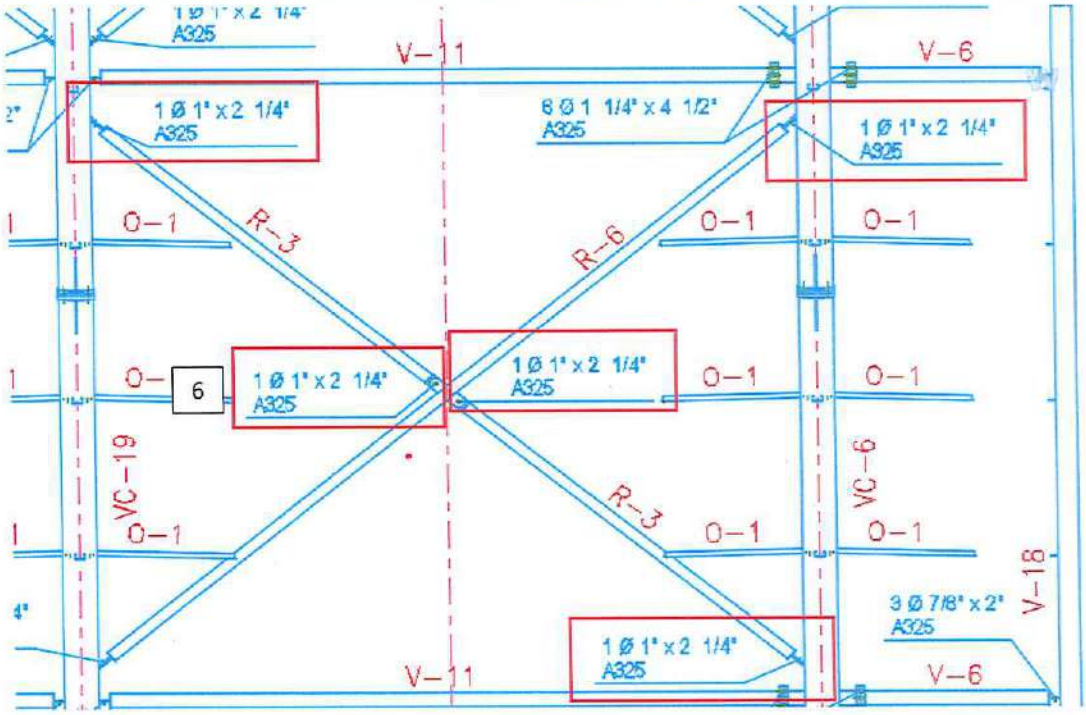

DISTRIBUCION V - R - VC - O
EJE 1´ AL 7´´ ENTRE LOS EJES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072020-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202090337 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

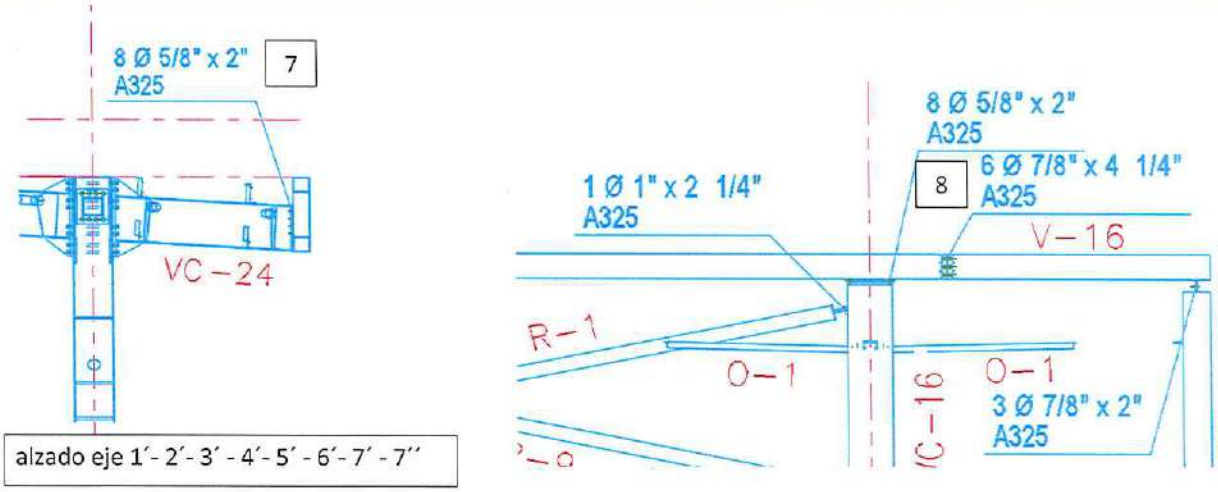

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153998 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

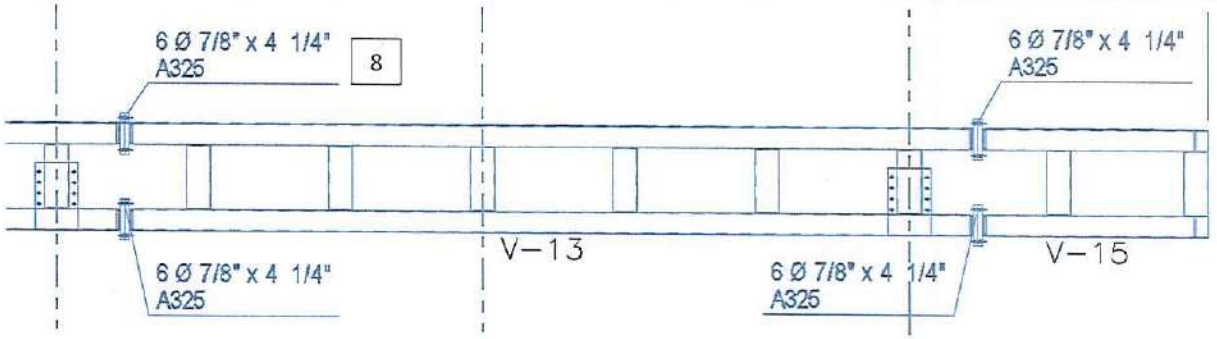

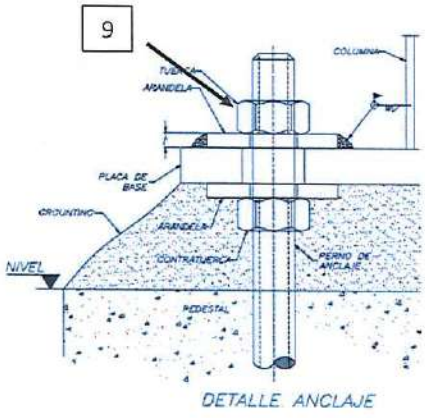

DETALLE ANCLAJE

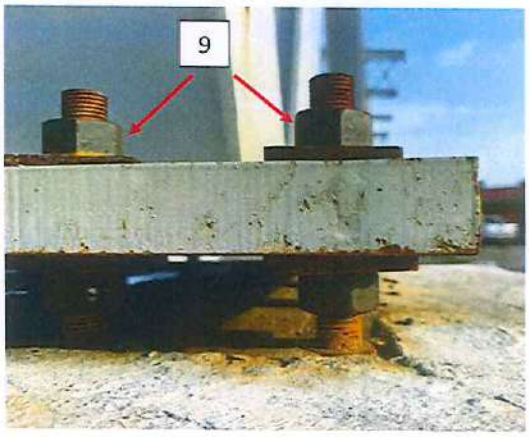

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153998 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090327 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153998 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



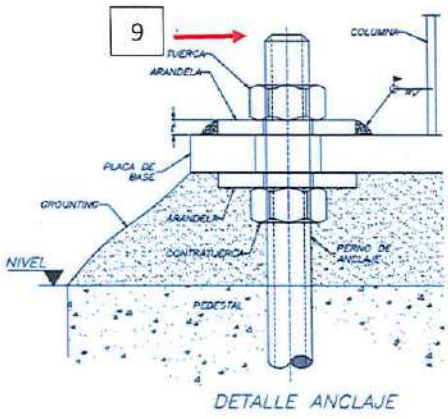

DETALLE ANCLAJE

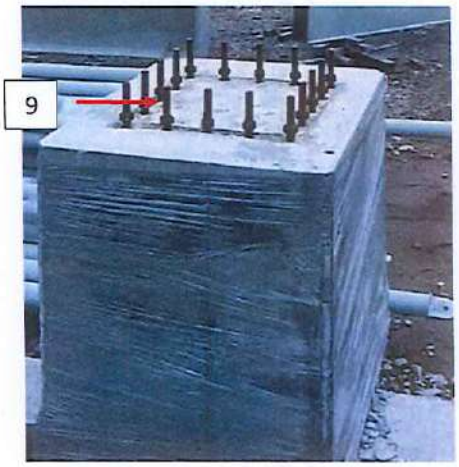

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

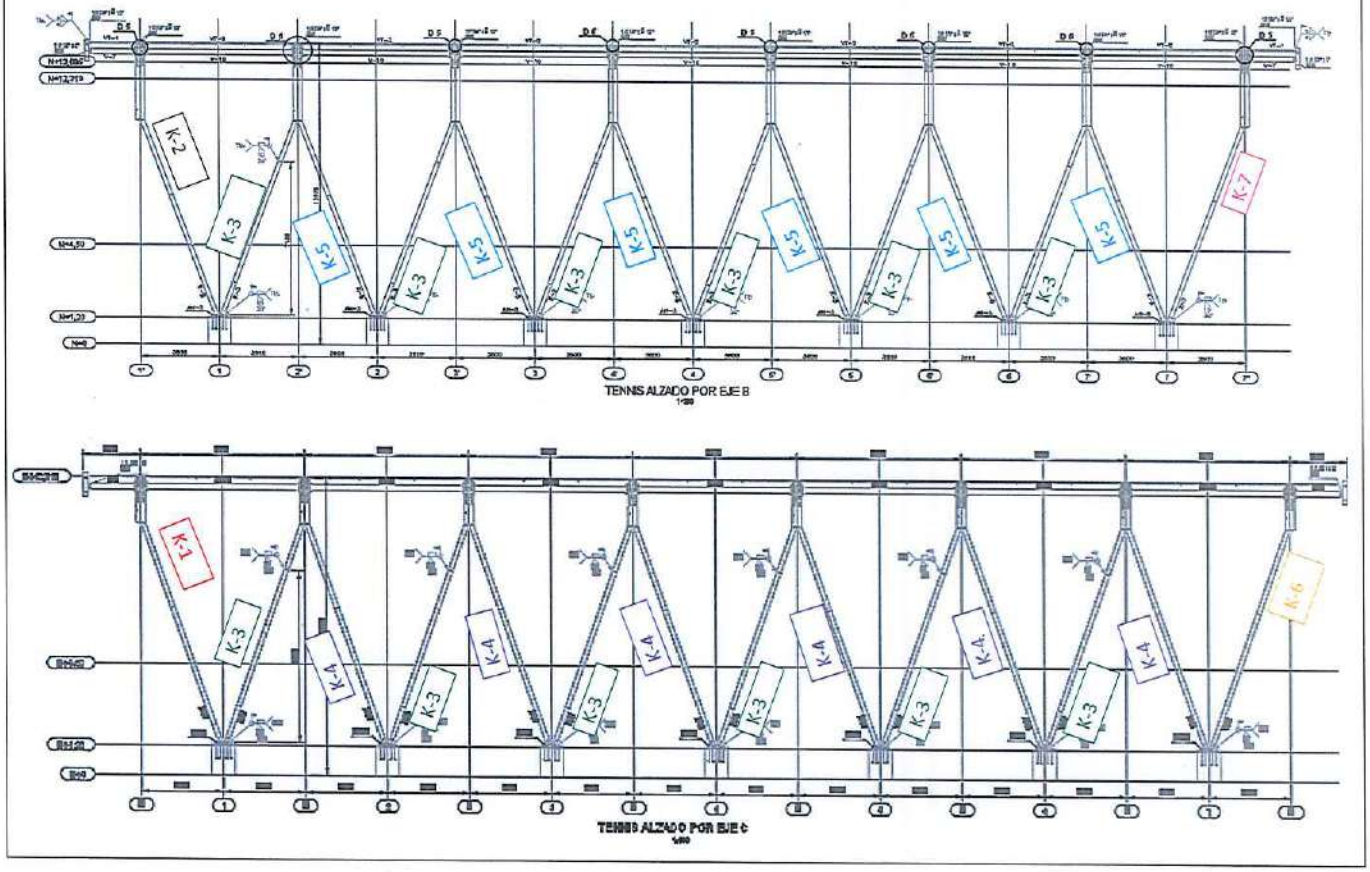

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-190337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO
N° ÍTEM	DESCRIPCION
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA
	UNIDAD: KG

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
K-1 COLUMNA PLT12-ASTM A572 Gr50	02 y 09	1858.18	6000MM	2	3716.36
K-2 COLUMNA PLT12-ASTM A572 Gr50	02 y 10	2129.52	6000MM	1	2129.52
K-3 COLUMNA PLT12-ASTM A572 Gr50	02 y 11	940.30	1658MM	18	16925.40
K-4 COLUMNA PLT12-ASTM A572 Gr50	02 y 12	2100.13	6000MM	12	25201.56
K-5 COLUMNA PLT12-ASTM A572 Gr50	02 y 13	2371.48	6000MM	6	14228.88
K-6 COLUMNA PLT12-ASTM A572 Gr50	02 y 14	1633.08	6000MM	2	3266.16
K-7 COLUMNA PLT12-ASTM A572 Gr50	02 y 15	1904.42	6000MM	1	1904.42
VIENEN:	3992.38			SUBTOTAL	67,372.30
PASAN:	71354.68			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No.	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

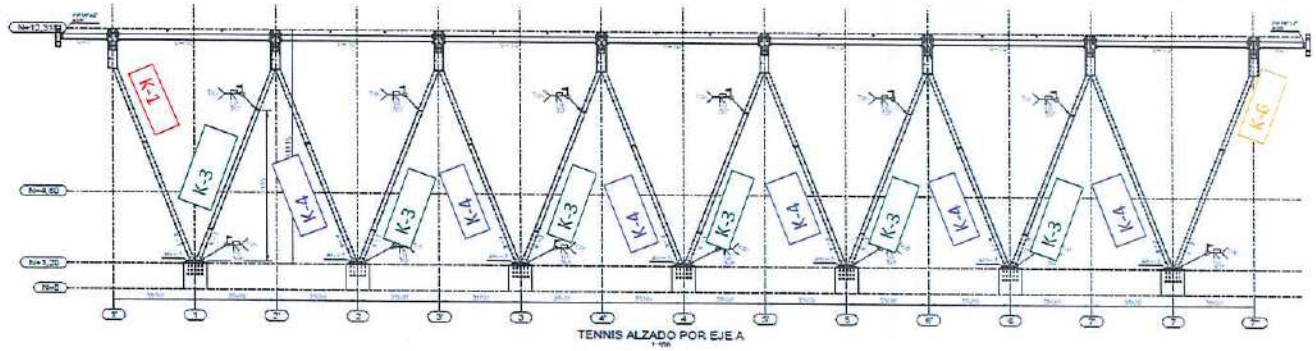

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BORORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N°.ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





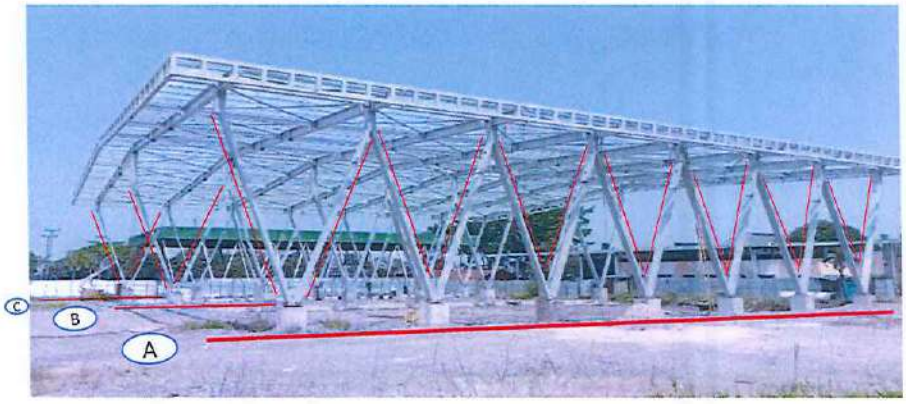

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VC-16 EJE C-7´´ W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 16	487.03	2143MM	1	487.03
VC-2 EJE 7´´/C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 17	2254.32	11870MM	1	2254.32
VC-3 EJE 7´´/C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 18	1401.16	6500MM	1	1401.16
VC-4 EJE 7´´/ C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 19	1812.87	9044MM	1	1812.87
VC-5 EJE 7´´/ B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 20	1812.87	9121MM	1	1812.87
VC-6 EJE 7´´/ B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 21	1401.16	6584MM	1	1401.16
VC-7 EJE 7´´/ B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 22	2254.32	11949MM	1	2254.32
VC-9 EJE 7´´/ B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 23	487.03	2204MM	1	487.03
VIENEN:	71354.68			SUBTOTAL	11,910.76
PASAN:	83265.44			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No.	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

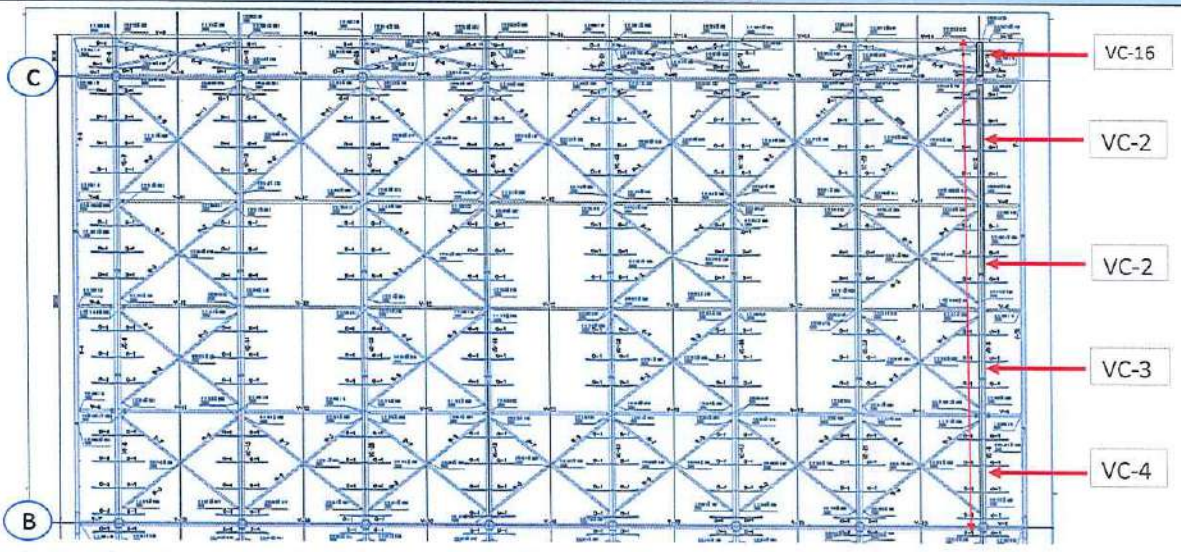

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-78650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BORORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

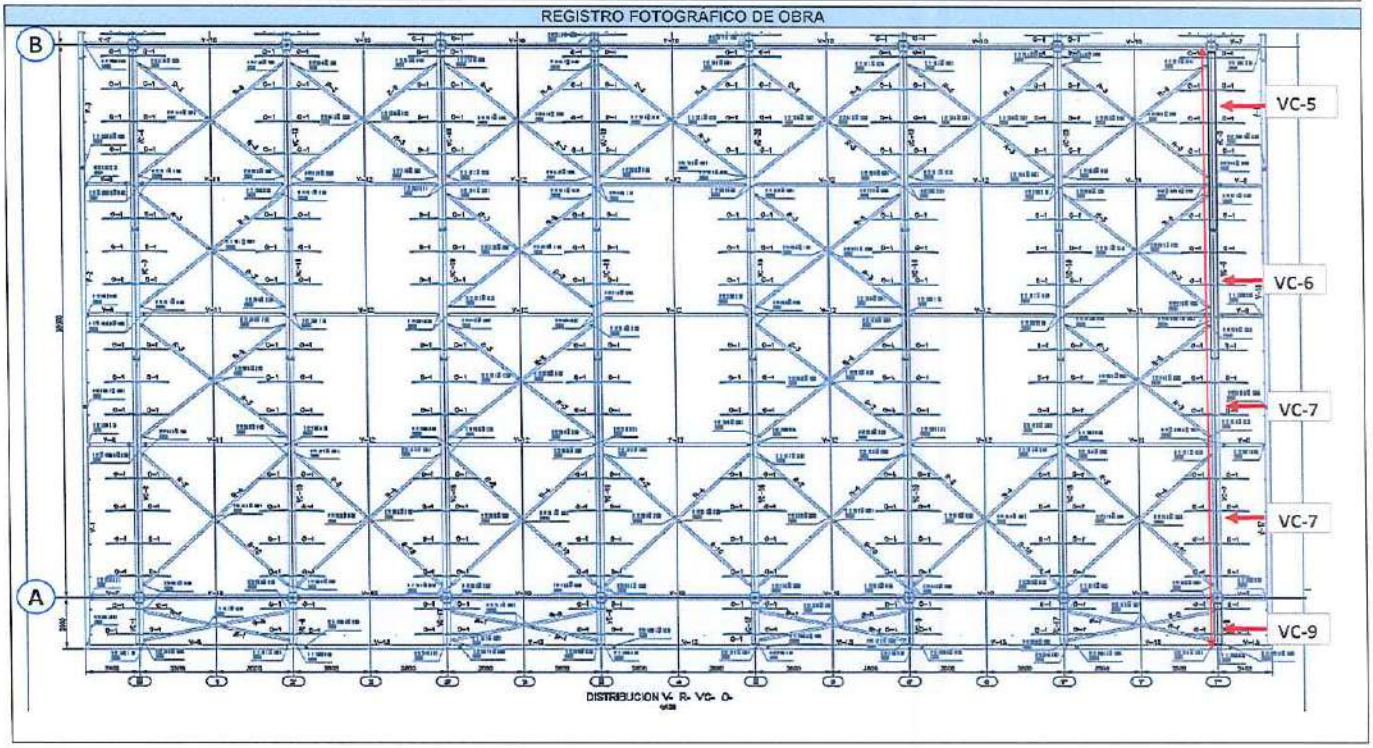

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MATROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VC-24 EJE 7´C W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 24	487.35	2204MM	1	487.35
VC-23 EJE 7´/C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 25	2184.27	11949MM	1	2184.27
VC-22 EJE 7´/C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 26	1293.27	6564MM	1	1293.27
VC-21 EJE 7´/C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 27	1742.82	9121MM	1	1742.82
VC-20 EJE 7´/B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 28	1742.82	9121MM	1	1742.82
VC-19 EJE 7´/B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 29	1293.27	6564MM	1	1293.27
VC-18 EJE 7´/B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 30	2184.27	11949MM	1	2184.27
VC-17 EJE 7´/A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 31	487.34	2204MM	1	487.34
VIENEN:	83265.44			SUBTOTAL	11,415.41
PASAN:	94680.85			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No.	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

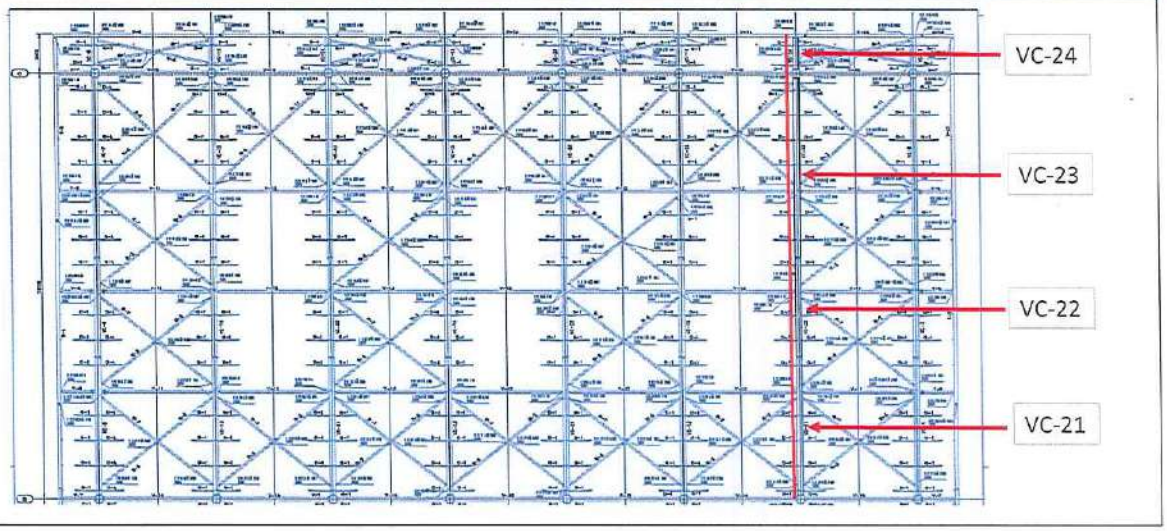

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090397 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **LENIN LUPERCIO BORORQUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ITEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

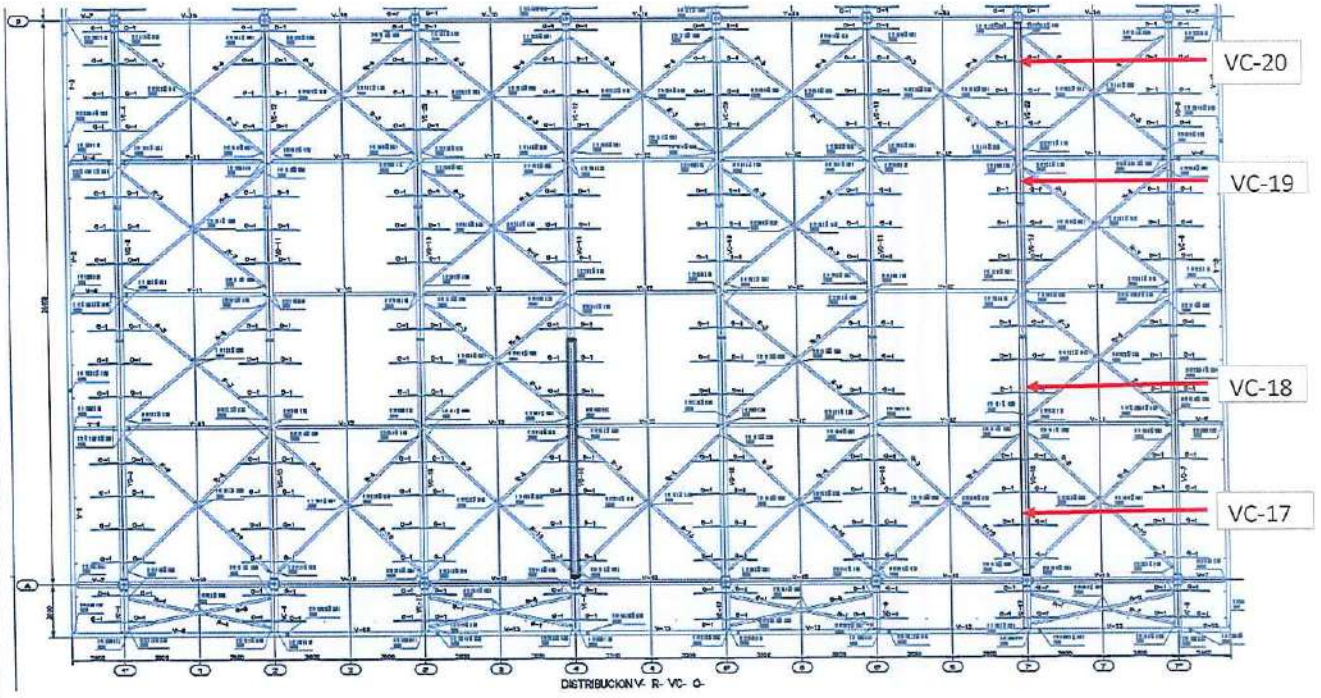

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-990337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA. GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VC-16 EJE C-6´ W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 16	487.03	2143MM	1	487.03
VC-15 EJE 6´/C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 32	2184.27	11949MM	1	2184.27
VC-14 EJE 6´/C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 33	1293.27	6564MM	1	1293.27
VC-13 EJE 6´/C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 34	1742.82	9121MM	1	1742.82
VC-12 EJE 6´/B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 35	1742.82	9121MM	1	1742.82
VC-11 EJE 6´/B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 36	1293.27	6564MM	1	1293.27
VC-10 EJE 6´/B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 37	2184.27	11949MM	1	2184.27
VC-9 EJE 6´/A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 23	487.03	2204MM	1	487.03
VIENEN:	94680.85			SUBTOTAL	11,414.78
PASAN:	106095.63			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No.	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

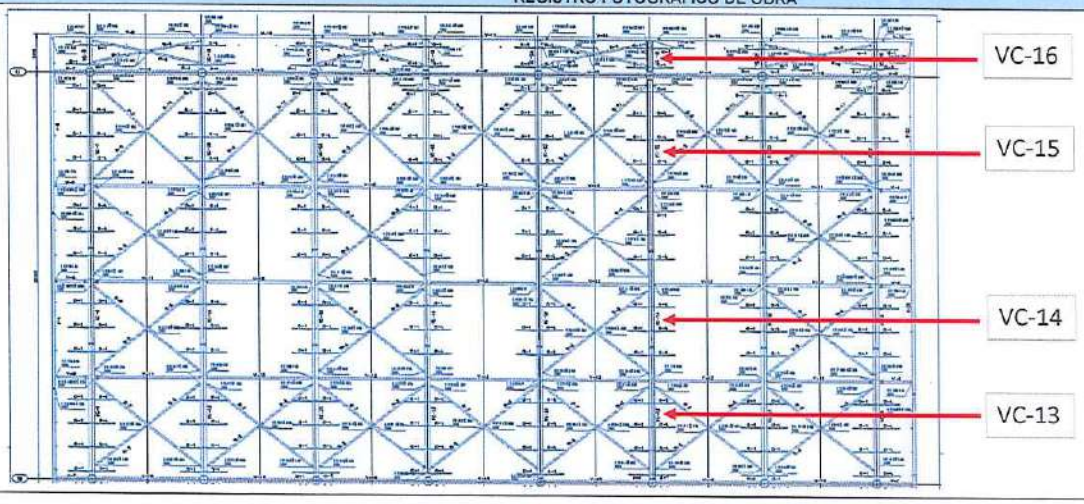

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-[illegible]337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

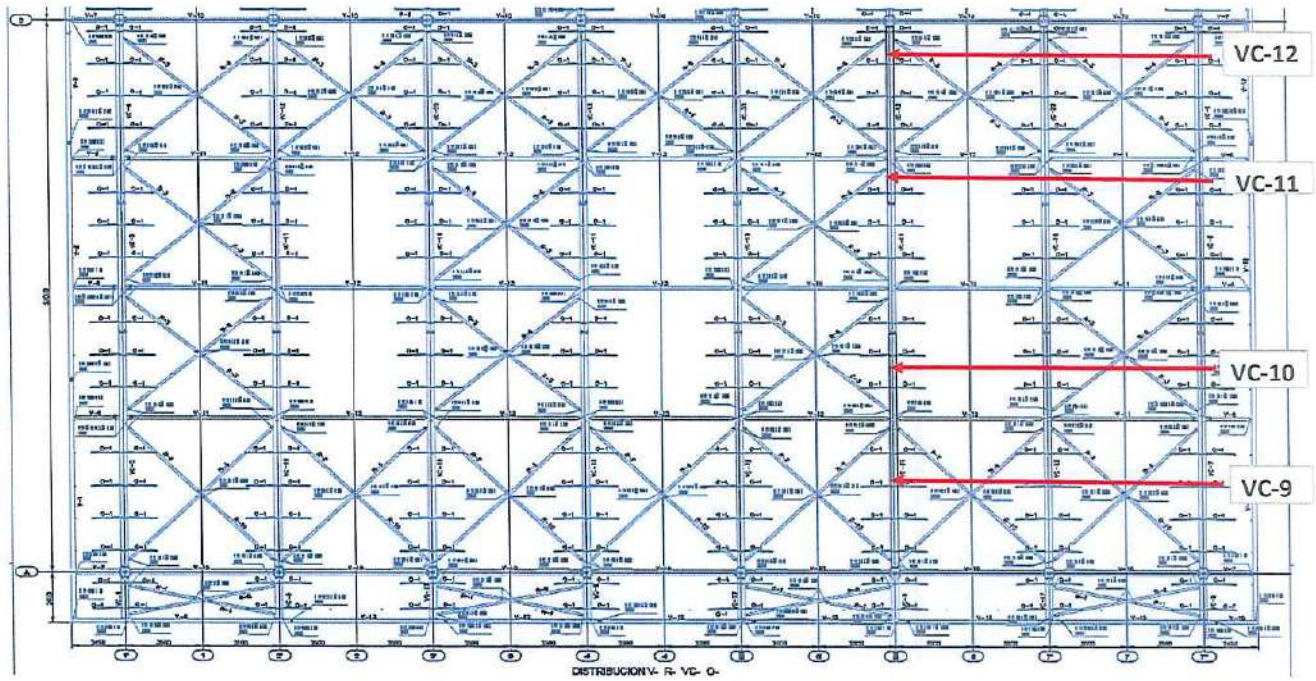

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090237 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-73650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VC-24 EJE 5´C W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 24	487.35	2204MM	1	487.35
VC-23 EJE 5´/C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 25	2184.27	11949MM	1	2184.27
VC-22 EJE 5´/C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 26	1293.27	6564MM	1	1293.27
VC-21 EJE 5´/C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 27	1742.82	9121MM	1	1742.82
VC-20 EJE 5´/B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 28	1742.82	9121MM	1	1742.82
VC-19 EJE 5´/B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 29	1293.27	6564MM	1	1293.27
VC-18 EJE 5´/B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 30	2184.27	11949MM	1	2184.27
VC-17 EJE 5´/A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 31	487.34	2204MM	1	487.34
VIENEN:	106095.63			SUBTOTAL	11,415.41
PASAN:	117511.04			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No.	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

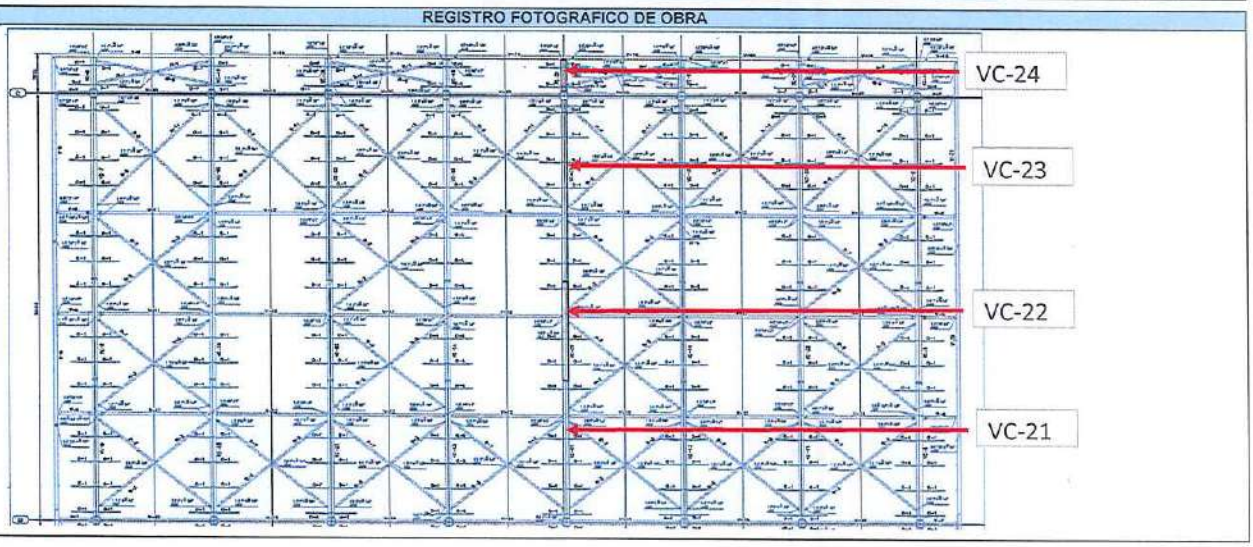

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200079650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LOPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-[illegible]337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

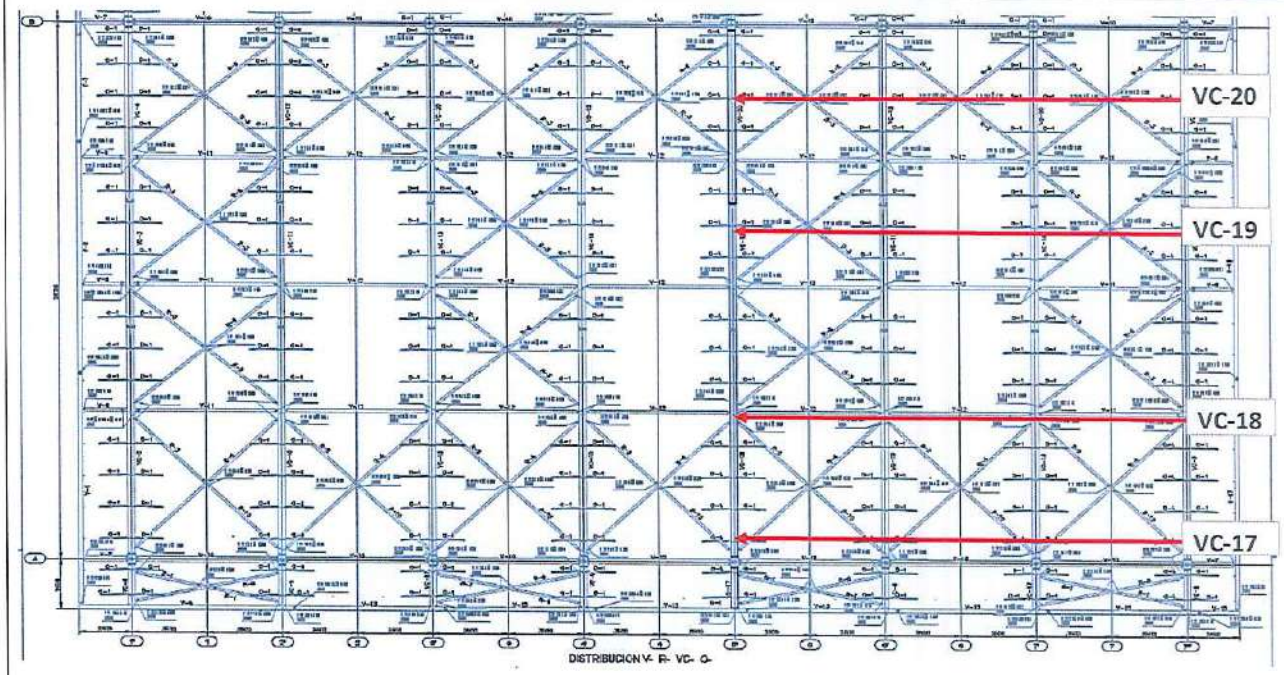

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072008-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-090327 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VC-16 EJE C-4' W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 16	487.03	2143MM	1	487.03
VC-15 EJE 4'/C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 32	2184.27	11949MM	1	2184.27
VC-14 EJE 4'/C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 33	1293.27	6564MM	1	1293.27
VC-13 EJE 4'/C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 34	1742.82	9121MM	1	1742.82
VC-12 EJE 4'/B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 35	1742.82	9121MM	1	1742.82
VC-11 EJE 4'/B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 36	1293.27	6564MM	1	1293.27
VC-10 EJE 4'/B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 37	2184.27	11949MM	1	2184.27
VC-9 EJE 4'/A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 23	487.03	2204MM	1	487.03
VIENEN:	117511.04			SUBTOTAL	11,414.78
PASAN:	128925.82			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No.	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

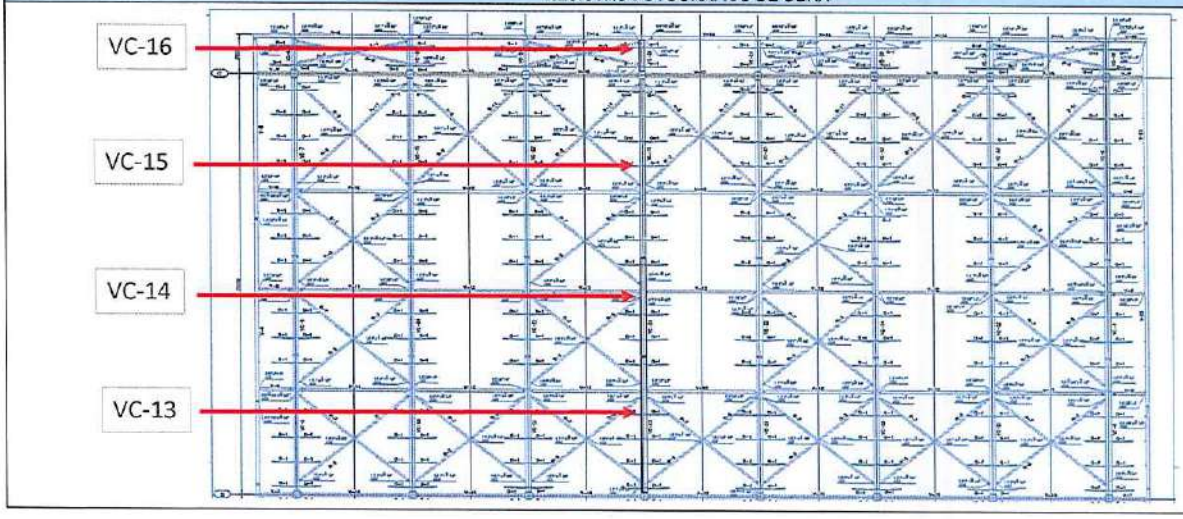

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-190337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BORORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ITEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

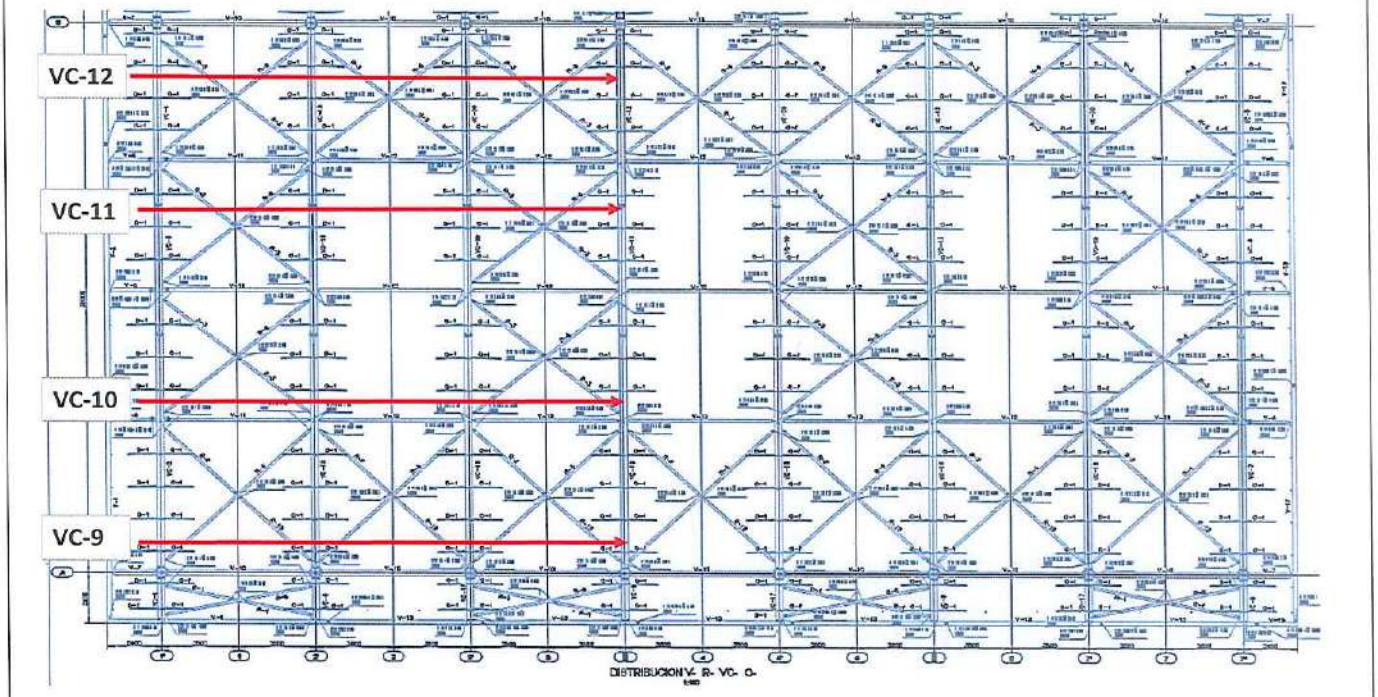

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-080337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BORORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°:	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENÍN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO — UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION — KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VC-24 EJE 3'C W24X104 ASTM A572 Gr50	05 - 24	487.35	2204MM	1	487.35
VC-23 EJE 3'C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 - 25	2184.27	11949MM	1	2184.27
VC-22 EJE 3'C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 - 26	1293.27	6564MM	1	1293.27
VC-21 EJE 3'C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 - 27	1742.82	9121MM	1	1742.82
VC-20 EJE 3'B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 - 28	1742.82	9121MM	1	1742.82
VC-19 EJE 3'B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 - 29	1293.27	6564MM	1	1293.27
VC-18 EJE 3'B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 - 30	2184.27	11949MM	1	2184.27
VC-17 EJE 3'A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 - 31	487.34	2204MM	1	487.34
VIENEN:	128925.82			SUBTOTAL	11,415.41
PASAN:	140341.23			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No.	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

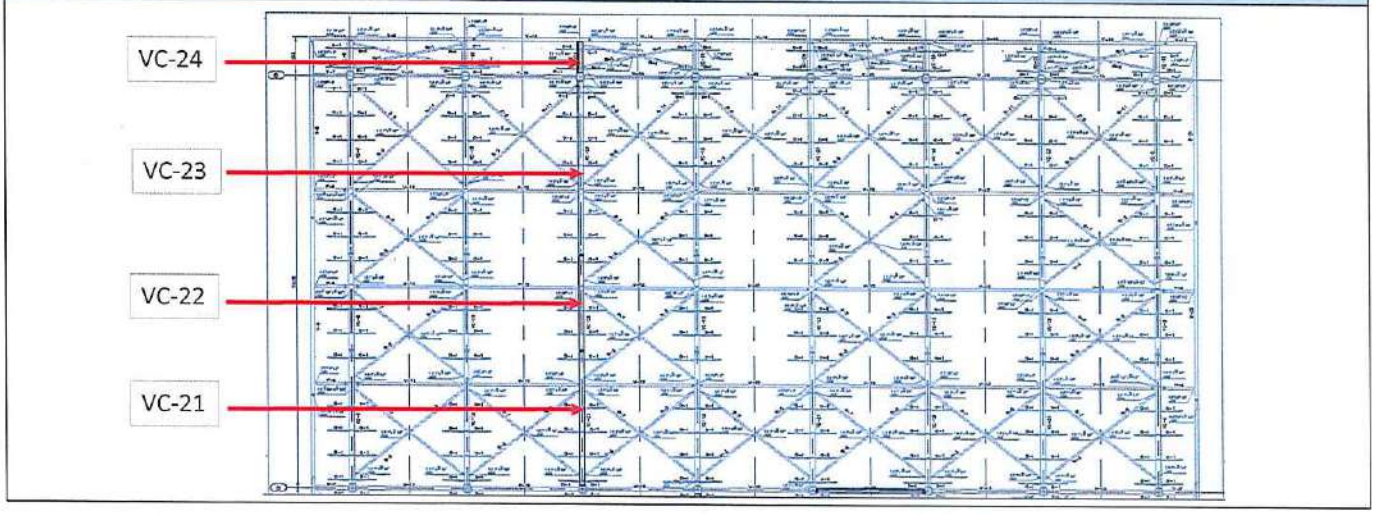

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79550147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN EUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

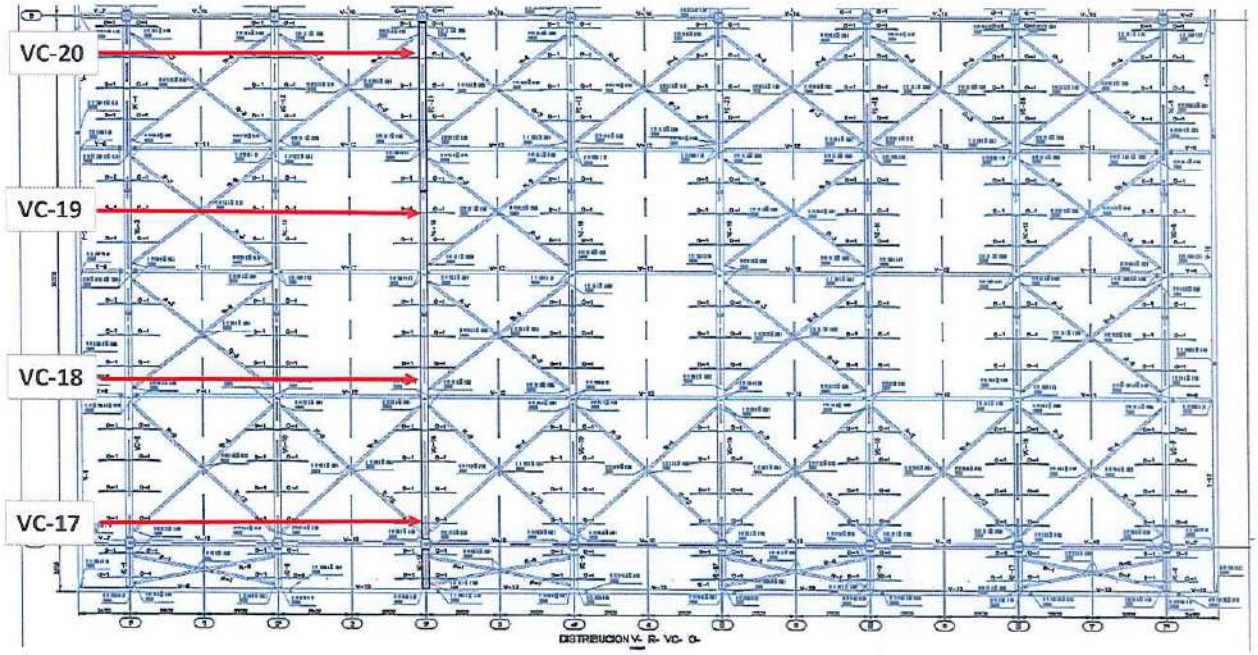

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ITEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-[illegible]0337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VC-16 EJE C-2´ W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 16	487.03	2143MM	1	487.03
VC-15 EJE 2´/C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 32	2184.27	11949MM	1	2184.27
VC-14 EJE 2´/C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 33	1293.27	6564MM	1	1293.27
VC-13 EJE 2´/C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 34	1742.82	9121MM	1	1742.82
VC-12 EJE 2´/B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 35	1742.82	9121MM	1	1742.82
VC-11 EJE 2´/B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 36	1293.27	6564MM	1	1293.27
VC-10 EJE 2´/B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 37	2184.27	11949MM	1	2184.27
VC-9 EJE 2´/A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 y 23	487.03	2204MM	1	487.03
VIENEN:	140341.23			SUBTOTAL	11,414.78
PASAN:	151756.01			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No.	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

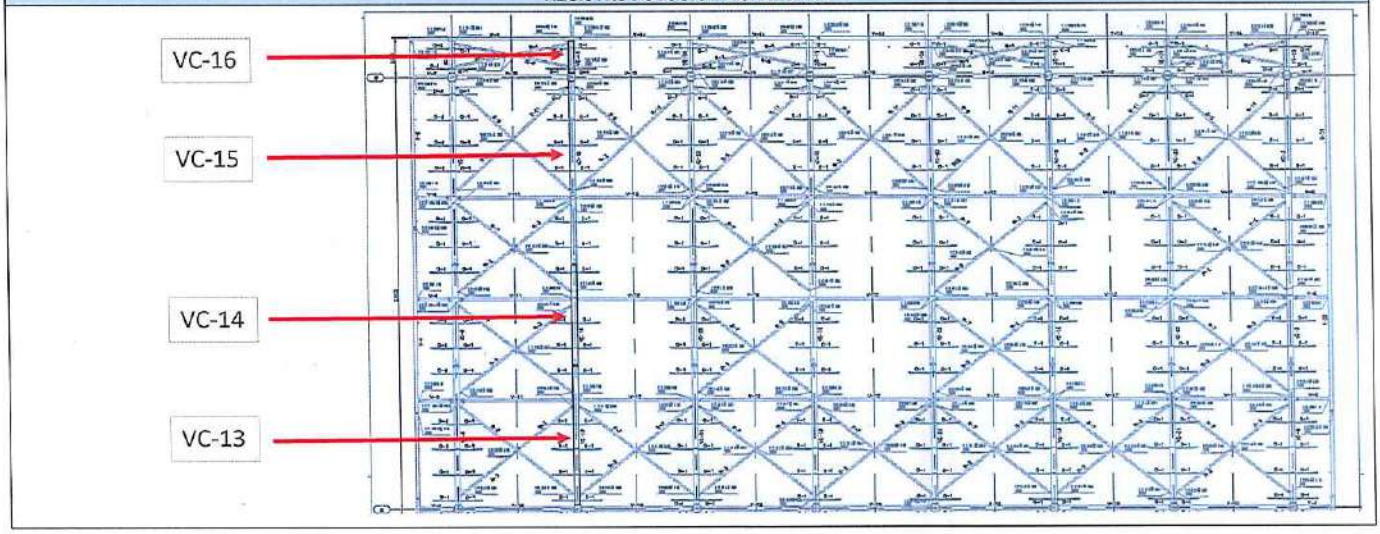

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79850147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOBORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200079550147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

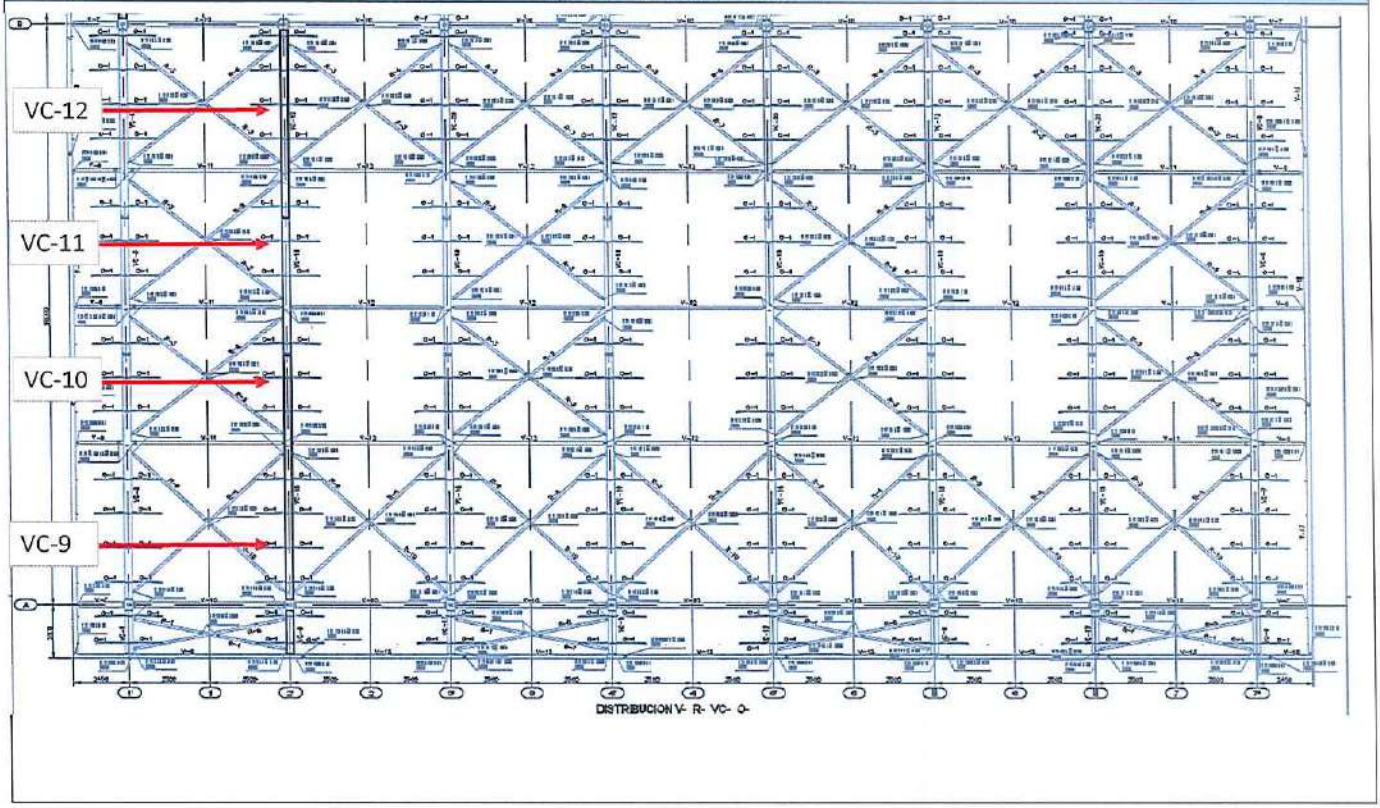

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79660147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090887 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-88070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VC-8 EJE C-1' W24X104 ASTM A572 Gr50	05 - 38	487,35	2204MM	1	487,35
VC-7 EJE 1'/C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 - 22	2254,32	11949MM	1	2254,32
VC-6 EJE 1'/C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 - 21	1401,16	6564MM	1	1401,16
VC-5 EJE 1'/C Y B W24X104 ASTM A572 Gr50	05 - 20	1812,87	9121MM	1	1812,87
VC-4 EJE 1'/B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 - 19	1812,87	9044MM	1	1812,87
VC-3 EJE 1'/B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 - 18	1401,16	6500MM	1	1401,16
VC-2 EJE 1'/B Y A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 - 17	2254,32	11870MM	1	2254,32
VC-1 EJE 1'/A W24X104 ASTM A572 Gr50	05 - 39	487,34	2204MM	1	487,34
VIENEN:	151756,01			SUBTOTAL	11.911,39
PASAN:	163667,40			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No.	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

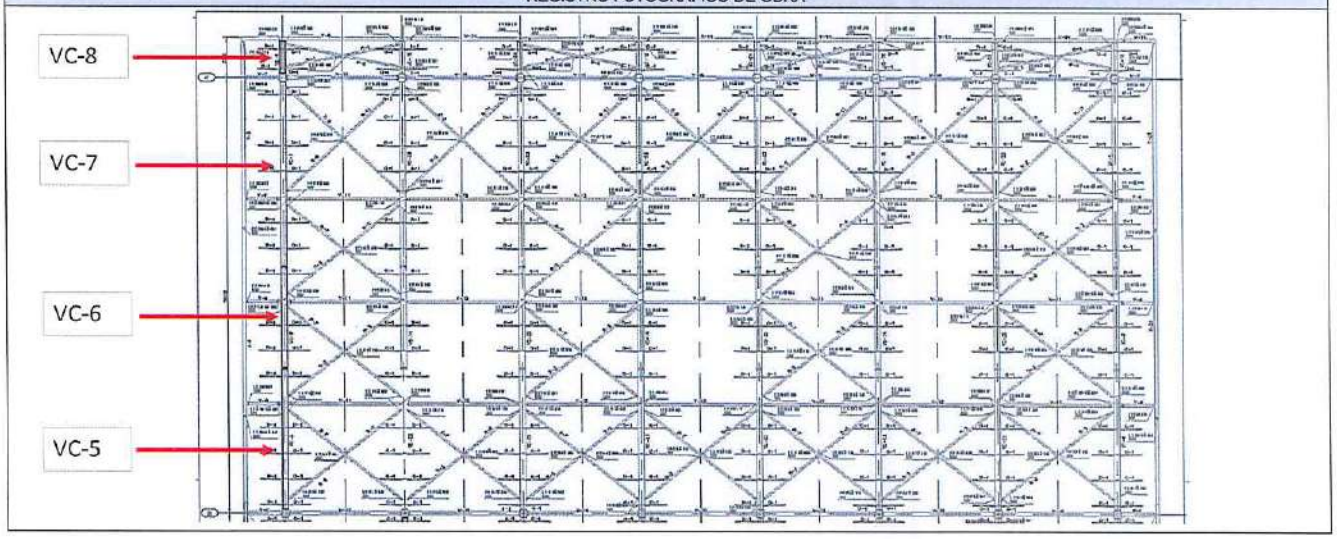

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090537 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-66070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

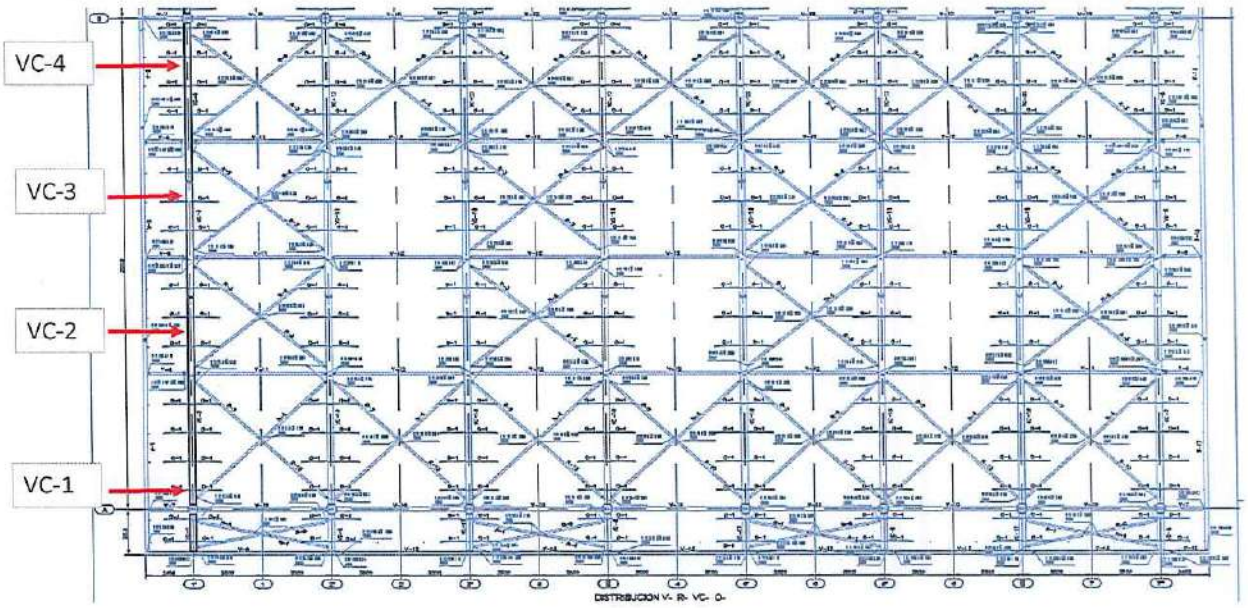

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090387 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
V-7 EJE C PTE250X250X9 ASTM A500	05 y 40	188.12	2048MM	2	376.24
V-10 EJE C PTE250X250X9 ASTM A500	05 y 41	540.50	6617MM	7	3783.50
V-6 EJE C-B PTE300X150X8 ASTM A500	05 y 42	139.74	1877MM	2	279.48
V-11 EJE C-B PTE300X150X8 ASTM A500	05 y 43	383.74	6465MM	2	767.48
V-12 EJE C-B PTE300X150X8 ASTM A500	05 y 44	356.51	6656MM	5	1782.55
V-6 EJE C-B PTE300X150X8 ASTM A500	05 y 42	139.74	1877MM	2	279.48
V-11 EJE C-B PTE300X150X8 ASTM A500	05 y 43	383.74	6465MM	2	767.48
V-12 EJE C-B PTE300X150X8 ASTM A500	05 y 44	356.51	6656MM	5	1782.55
V-6 EJE C-B PTE300X150X8 ASTM A500	05 y 42	139.74	1877MM	2	279.48
V-11 EJE C-B PTE300X150X8 ASTM A500	05 y 43	383.74	6465MM	2	767.48
V-12 EJE C-B PTE300X150X8 ASTM A500	05 y 44	356.51	6656MM	5	1782.55
VIENEN:	163867.40			SUBTOTAL	12,648.27
PASAN:	175315.67			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No.	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

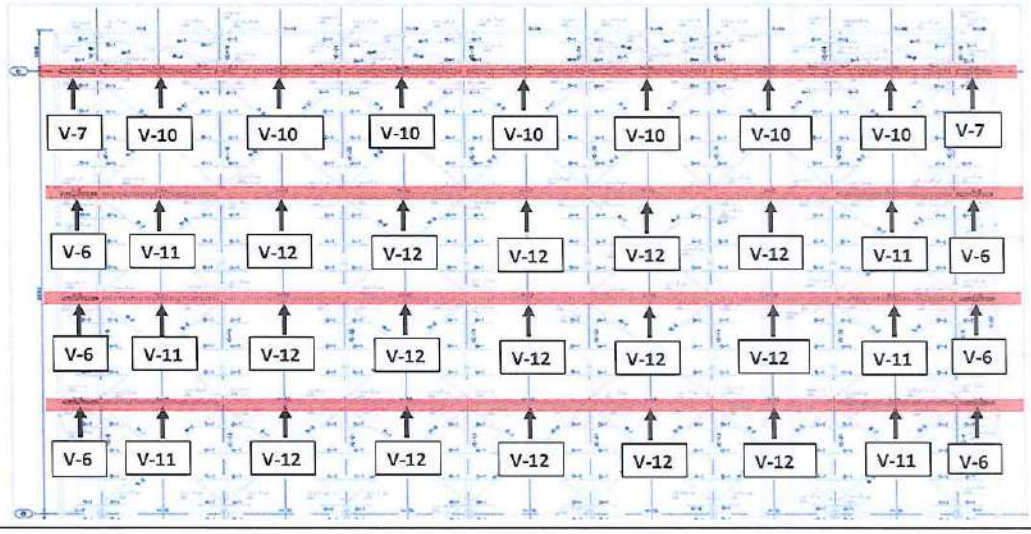

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-88070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
V-7 EJE B PTE250X250X9 ASTM A500	05 y 40	188.12	2048MM	2	376.24
V-10 EJE B PTE250X250X9 ASTM A500	05 y 41	540.50	6617MM	7	3783.50
V-6 EJE B-A PTE300X150X8 ASTM A500	05 y 42	139.74	1877MM	2	279.48
V-11 EJE B-A PTE300X150X8 ASTM A500	05 y 43	383.74	6465MM	2	767.48
V-12 EJE B-A PTE300X150X8 ASTM A500	05 y 44	356.51	6656MM	5	1782.55
V-6 EJE B-A PTE300X150X8 ASTM A500	05 y 42	139.74	1877MM	2	279.48
V-11 EJE B-A PTE300X150X8 ASTM A500	05 y 43	383.74	6465MM	2	767.48
V-12 EJE B-A PTE300X150X8 ASTM A500	05 y 44	356.51	6656MM	5	1782.55
V-6 EJE B-A PTE300X150X8 ASTM A500	05 y 42	139.74	1877MM	2	279.48
V-11 EJE B-A PTE300X150X8 ASTM A500	05 y 43	383.74	6465MM	2	767.48
V-12 EJE B-A PTE300X150X8 ASTM A500	05 y 44	356.51	6656MM	5	1782.55
V-7 EJE A PTE250X250X9 ASTM A500	05 y 40	188.12	2048MM	2	376.24
V-10 EJE A PTE250X250X9 ASTM A500	05 y 41	540.50	6617MM	7	3783.50
VIENEN:	176315.67			SUBTOTAL	16,808.01
PASAN:	193123.68			TOTAL	

OBSERVACIONES: VER PLANO No.		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

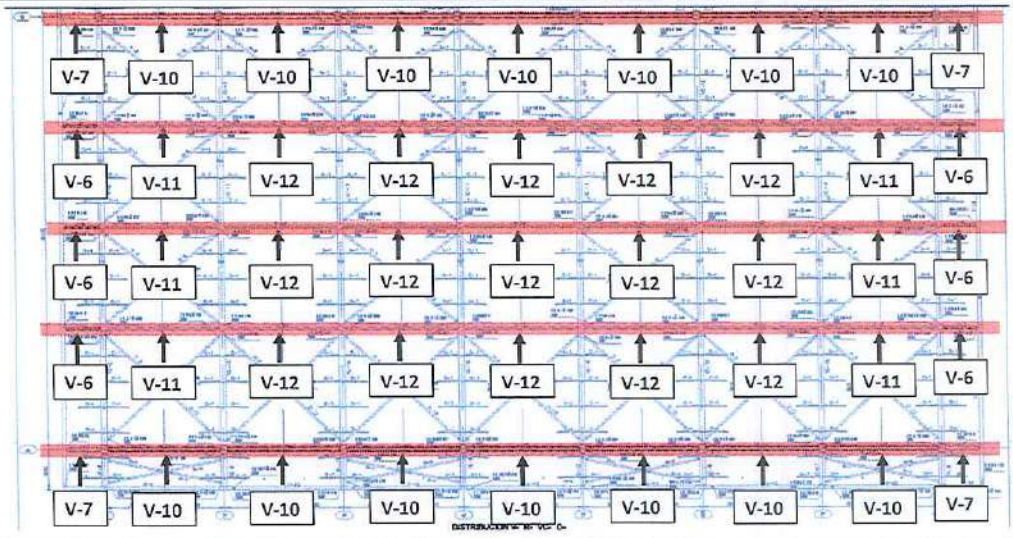

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-7965014?

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
V-16 (PERIMETRO) PTE200X200X5 ASTM A500	05 y 45	201.59	1890MM	1	201.59
V-14 (PERIMETRO) PTE200X200X5 ASTM A500	05 y 46	647.42	7000MM	6	3884.52
V-9 (PERIMETRO) PTE200X200X5 ASTM A500	05 y 47	867.17	10010MM	1	867.17
V-5 (PERIMETRO) PTE200X200X5 ASTM A500	05 y 48	953.06	12138MM	1	953.06
V-4 (PERIMETRO) PTE200X200X5 ASTM A500	05 y 49	958.94	12096MM	1	958.94
V-3 (PERIMETRO) PTE200X200X5 ASTM A500	05 y 50	1021.00	12483MM	1	1021.00
V-2 (PERIMETRO) PTE200X200X5 ASTM A500	05 y 51	958.94	12096MM	1	958.94
V-1 (PERIMETRO) PTE200X200X5 ASTM A500	05 y 52	953.06	12138MM	1	953.06
VIENEN:	193123.68			SUBTOTAL	9,798.28
PASAN:	202921.96			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No.	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	

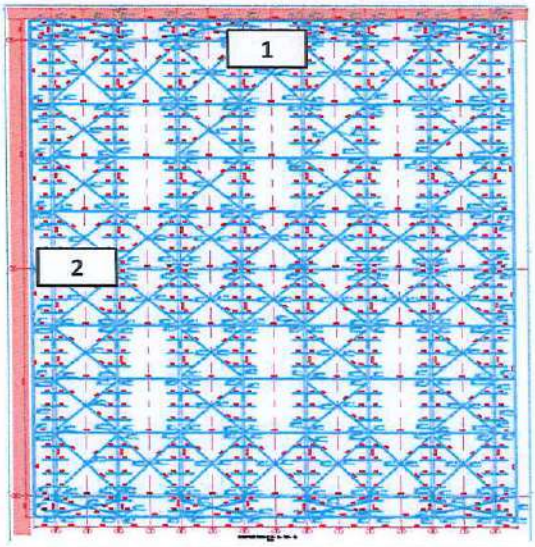

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79656147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

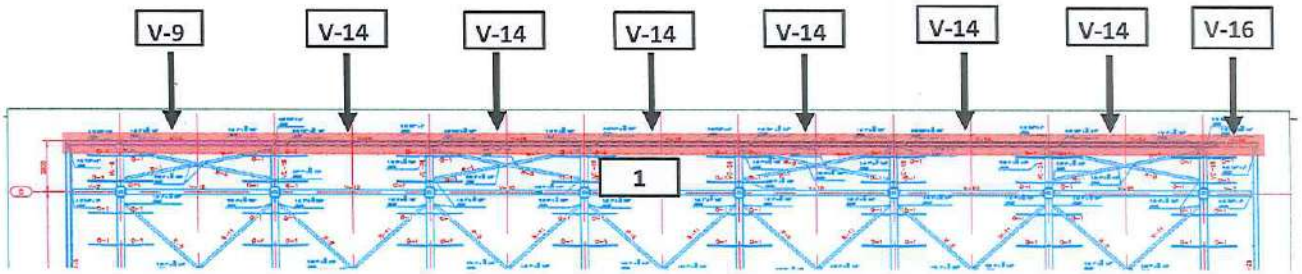

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-090387 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072020-7965014?

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO
N° ÍTEM	DESCRIPCION
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANOS	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
V-8 (PERIMETRO) PTE200X200X5 ASTM A500	05 y 53	866.57	10010MM	1	866.57
V-13 (PERIMETRO) PTE200X200X5 ASTM A500	05 y 54	647.42	7000MM	6	3884.52
V-15 (PERIMETRO) PTE200X200X5 ASTM A500	05 y 55	201.59	1890MM	1	201.59
V-17 (PERIMETRO) PTE200X200X5 ASTM A500	05 y 56	953.06	12138MM	1	953.06
V-18 (PERIMETRO) PTE200X200X5 ASTM A500	05 y 57	958.94	12096MM	1	958.94
V-19 (PERIMETRO) PTE200X200X5 ASTM A500	05 y 58	1021.00	12483MM	1	1021.00
V-20 (PERIMETRO) PTE200X200X5 ASTM A500	05 y 59	958.94	12096MM	1	958.94
V-21 (PERIMETRO) PTE200X200X5 ASTM A500	05 y 60	953.06	12138MM	1	953.06
VIENEN:	202921.96			SUBTOTAL	9,797.68
PASAN:	212719.64			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No.	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

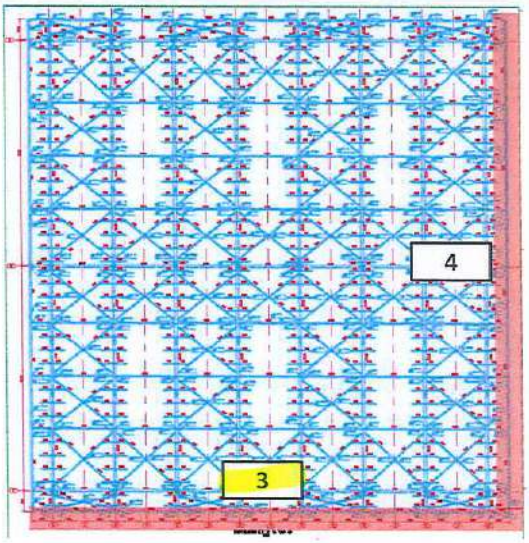

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-190337 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ITEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

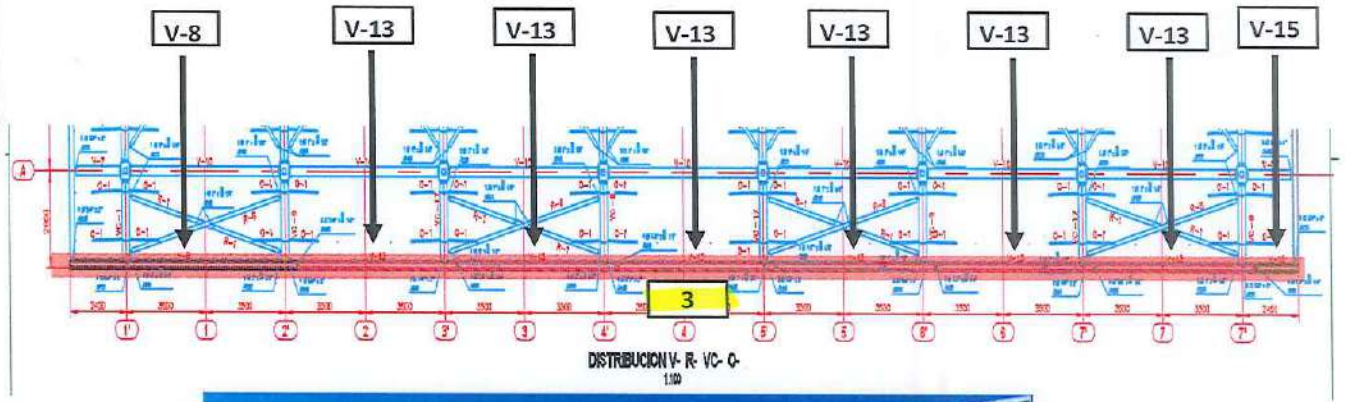



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200079650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-290337 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUBERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

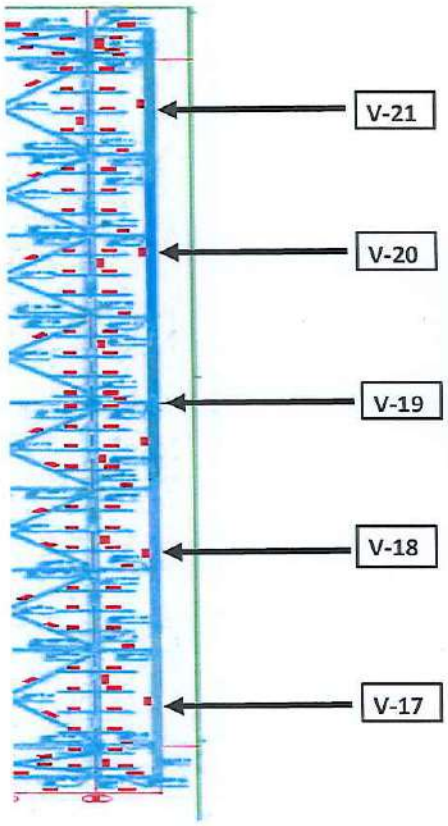



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-990337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090997 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
R1 (RIOSTRA) PTE D114.3X2.5 ASTM A500	05 y 61	25.28	3171MM	8	202.24
R9 (RIOSTRA) PTE D114.3X2.5 ASTM A500	05 y 62	60.25	6914MM	4	241.00
R11 (RIOSTRA) PTE D114.3X2.5 ASTM A500	05 y 63	35.61	4670MM	7	249.27
R2 (RIOSTRA) PTE D114.3X2.5 ASTM A500	05 y 64	35.61	4670MM	7	249.27
R5 (RIOSTRA) PTE D114.3X2.5 ASTM A500	05 y 65	73.57	9508MM	7	514.99
R3 (RIOSTRA) PTE D114.3X2.5 ASTM A500	05 y 66	33.17	4316MM	8	265.36
R7 (RIOSTRA) PTE D114.3X2.5 ASTM A500	05 y 67	68.67	8800MM	4	274.68
R3 (RIOSTRA) PTE D114.3X2.5 ASTM A500	05 y 66	33.17	4316MM	8	265.36
R7 (RIOSTRA) PTE D114.3X2.5 ASTM A500	05 y 67	68.67	8800MM	4	274.68
R3 (RIOSTRA) PTE D114.3X2.5 ASTM A500	05 y 66	33.17	4316MM	14	464.38
R7 (RIOSTRA) PTE D114.3X2.5 ASTM A500	05 y 67	68.67	8800MM	7	480.69
VIENEN:	212719.64			SUBTOTAL	3,481.92
PASAN:	216201.56			TOTAL	

OBSERVACIONES: ejes B-C VER PLANO No.		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

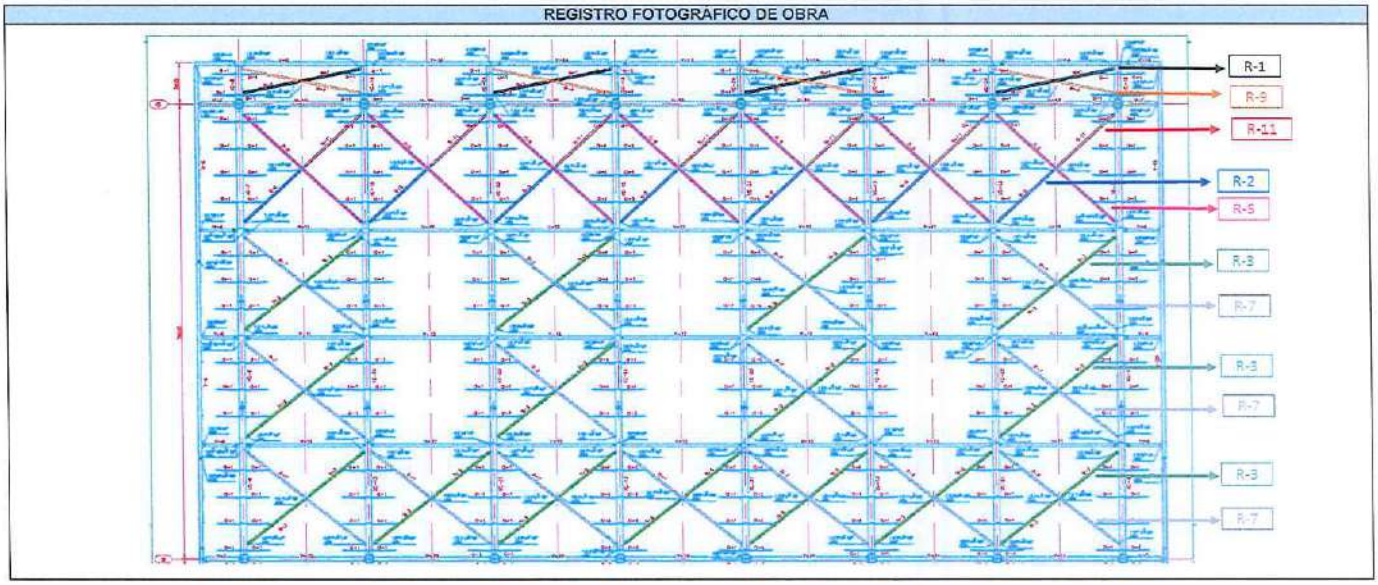

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	8/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072002-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090387 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
R6 (RIOSTRA) PTE D114.3X2.5 ASTM A500	05 y 68	68.67	8800MM	7	480.69
R3 (RIOSTRA) PTE D114.3X2.5 ASTM A500	05 y 66	33.17	4316MM	14	464.38
R6 (RIOSTRA) PTE D114.3X2.5 ASTM A500	05 y 68	68.67	8800MM	4	274.68
R3 (RIOSTRA) PTE D114.3X2.5 ASTM A500	05 y 66	33.17	4316MM	8	265.36
R6 (RIOSTRA) PTE D114.3X2.5 ASTM A500	05 y 68	68.67	8800MM	4	274.68
R3 (RIOSTRA) PTE D114.3X2.5 ASTM A500	05 y 66	33.17	4316MM	8	265.36
R4 (RIOSTRA) PTE D114.3X2.5 ASTM A500	05 y 69	73.57	9508MM	7	514.99
R2 (RIOSTRA) PTE D114.3X2.5 ASTM A500	05 y 64	35.61	4670MM	7	249.27
R10 (RIOSTRA) PTE D114.3X2.5 ASTM A500	05 y 70	35.61	4670MM	7	249.27
R8 (RIOSTRA) PTE D114.3X2.5 ASTM A500	05 y 71	60.25	6914MM	4	241.00
R1 (RIOSTRA) PTE D114.3X2.5 ASTM A500	05 y 61	25.28	3171MM	8	202.24
VIENEN:	216201.56			SUBTOTAL	3,481.92
PASAN:	219683.48			TOTAL	

OBSERVACIONES: Ejes A-B VER PLANO No.		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

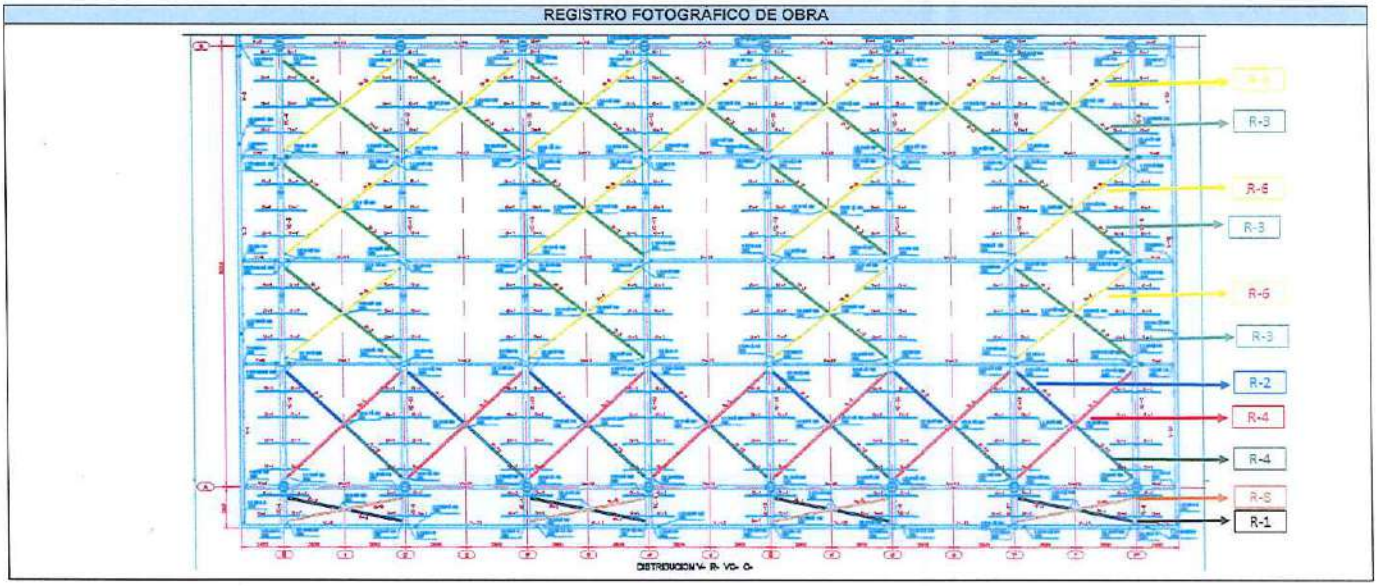

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-050337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO — UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION — KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
C-1 (TORNAPUNTA) L2X1/8 ASTM A572 Gr 50	05 y 72	3.74	1528MM	512	1914.88
VIENEN:	219683.48			SUBTOTAL	1,914.88
PASAN:	221598.36			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No.	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

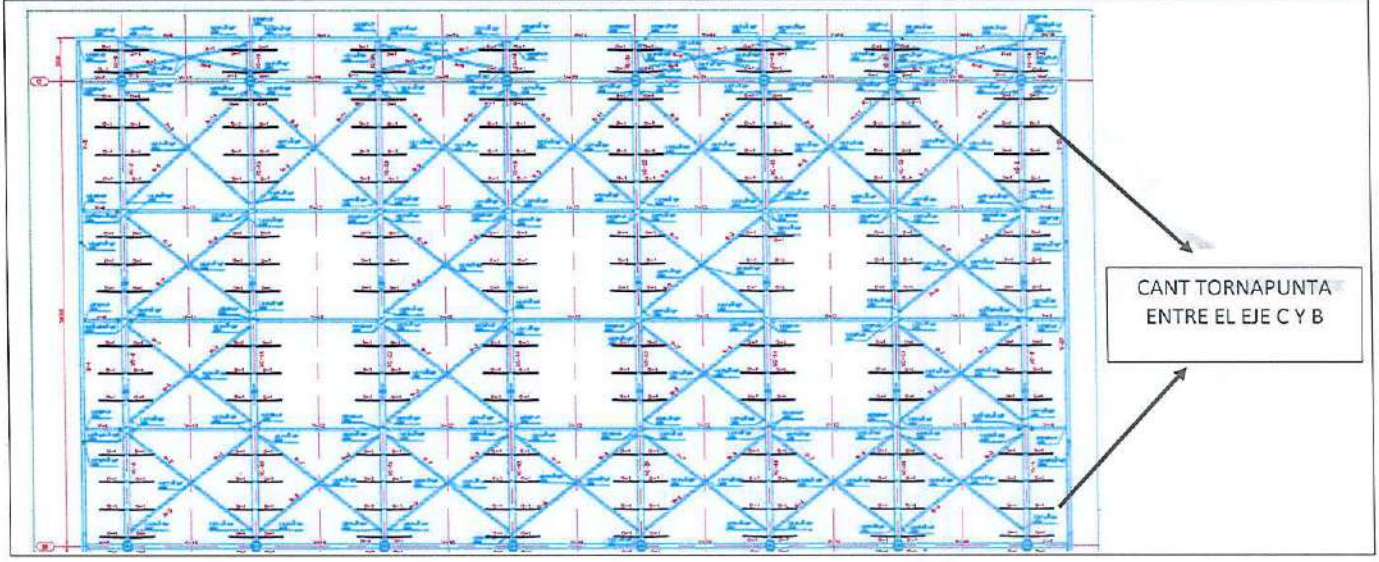

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

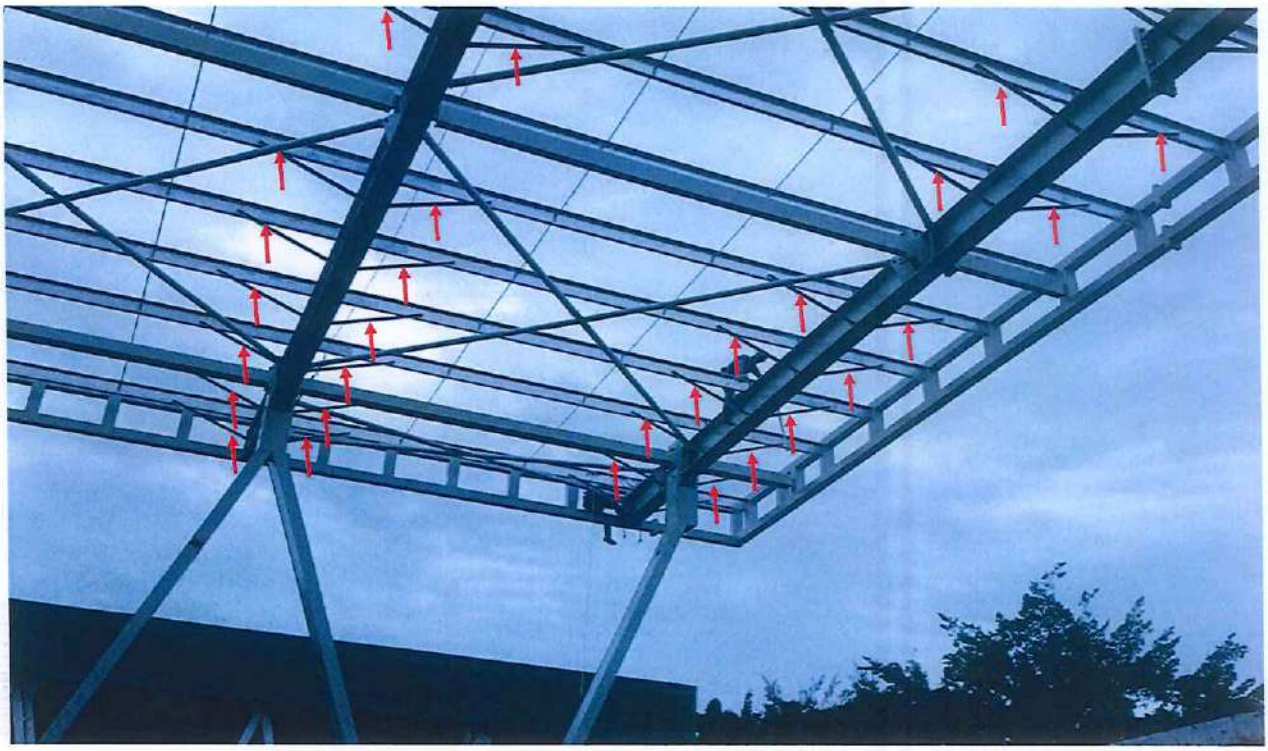

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

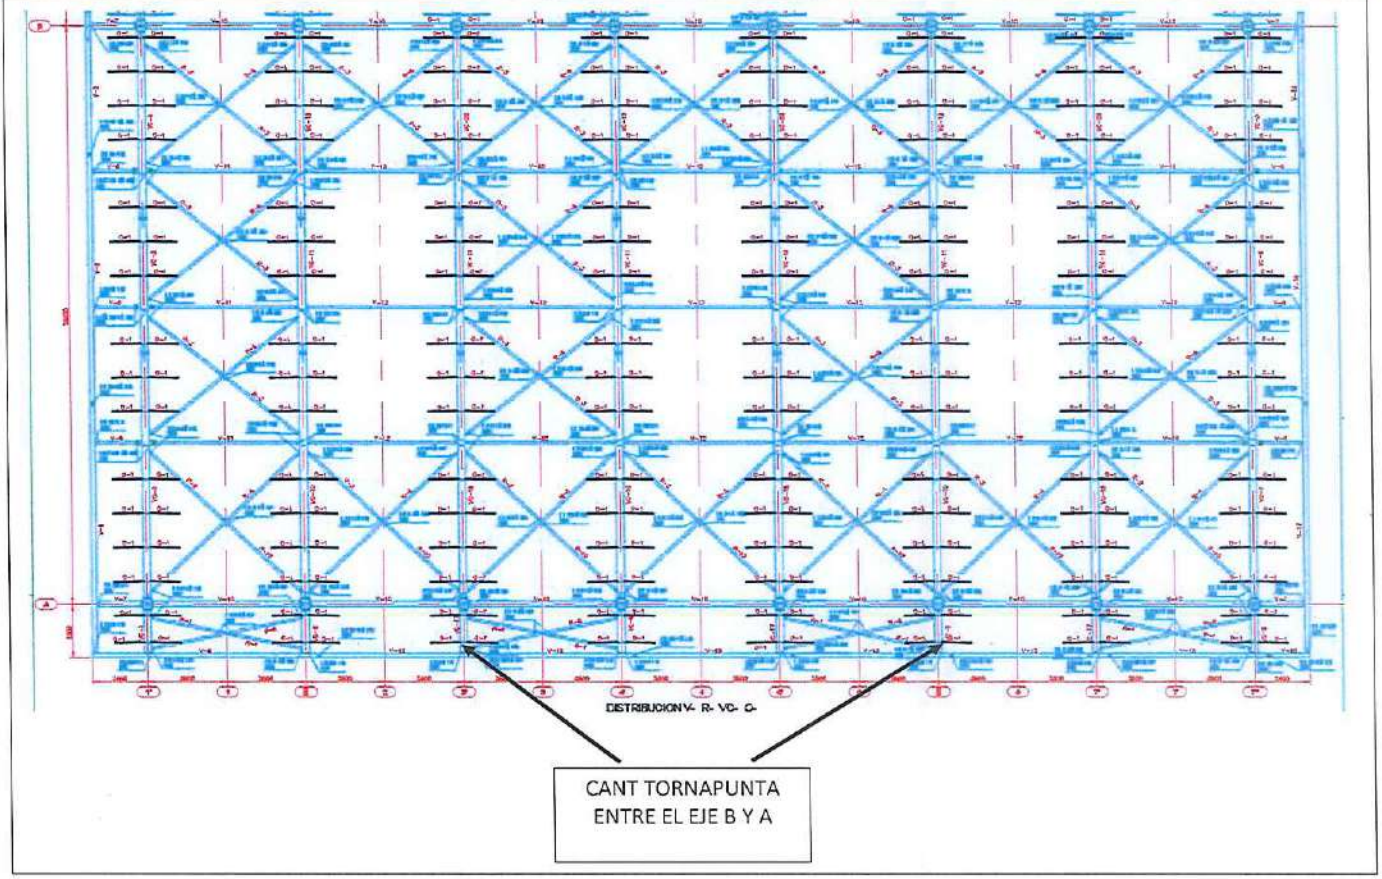

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-099837 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ITEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma

Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma

Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
P-01 PAG-Z254X67X2 ASTM A653 (EJE 7'' ENTRE EJE B Y C)	06	17.70	2750MM	19	336.30
P-08 PAG-Z254X67X2 ASTM A653 (EJE 7 ENTRE EJE B Y C)	06	68.40	8600MM	19	1299.60
P-06 PAG-Z254X67X2 ASTM A653 (EJE 6 ENTRE EJE B Y C)	06	68.40	8600MM	19	1299.60
P-06 PAG-Z254X67X2 ASTM A653 (EJE 5 ENTRE EJE B Y C)	06	68.40	8600MM	19	1299.60
P-06 PAG-Z254X67X2 ASTM A653 (EJE 4 ENTRE EJE B Y C)	06	68.40	8600MM	19	1299.60
P-06 PAG-Z254X67X2 ASTM A653 (EJE 3 ENTRE EJE B Y C)	06	68.40	8600MM	19	1299.60
P-06 PAG-Z254X67X2 ASTM A653 (EJE 2 ENTRE EJE B Y C)	06	68.40	8600MM	19	1299.60
P-04 PAG-Z254X67X2 ASTM A653 (EJE 1 ENTRE EJE B Y C)	06	68.40	8600MM	19	1299.60
P-02 PAG-Z254X67X2 ASTM A653 (EJE 1'' ENTRE EJE B Y C)	06	17.70	2750MM	19	336.30
VIENEN:	221598.36			SUBTOTAL	9,769.80
PASAN:	231368.16			TOTAL	

OBSERVACIONES: Correas		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENNIN LLIPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENNÍN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
P-02 PAG-Z254X67X2 ASTM A653 (EJE 7'' ENTRE EJE B Y A)	06	17.70	2750MM	19	336.30
P-07 PAG-Z254X67X2 ASTM A653 (EJE 7 ENTRE EJE B Y A)	06	68.40	8600MM	19	1299.60
P-05 PAG-Z254X67X2 ASTM A653 (EJE 6 ENTRE EJE B Y A)	06	68.40	8600MM	19	1299.60
P-05 PAG-Z254X67X2 ASTM A653 (EJE 5 ENTRE EJE B Y A)	06	68.40	8600MM	19	1299.60
P-05 PAG-Z254X67X2 ASTM A653 (EJE 4 ENTRE EJE B Y A)	06	68.40	8600MM	19	1299.60
P-05 PAG-Z254X67X2 ASTM A653 (EJE 3 ENTRE EJE B Y A)	06	68.40	8600MM	19	1299.60
P-05 PAG-Z254X67X2 ASTM A653 (EJE 2 ENTRE EJE B Y A)	06	68.40	8600MM	19	1299.60
P-03 PAG-Z254X67X2 ASTM A653 (EJE 1 ENTRE EJE B Y A)	06	68.4	8600MM	19	1299.60
P-01 PAG-Z254X67X2 ASTM A653 (EJE 1'' ENTRE EJE B Y A)	06	17.7	2750MM	19	336.30
VIENEN:	231368.16			SUBTOTAL	9,769.80
PASAN:	241137.96			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No.	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

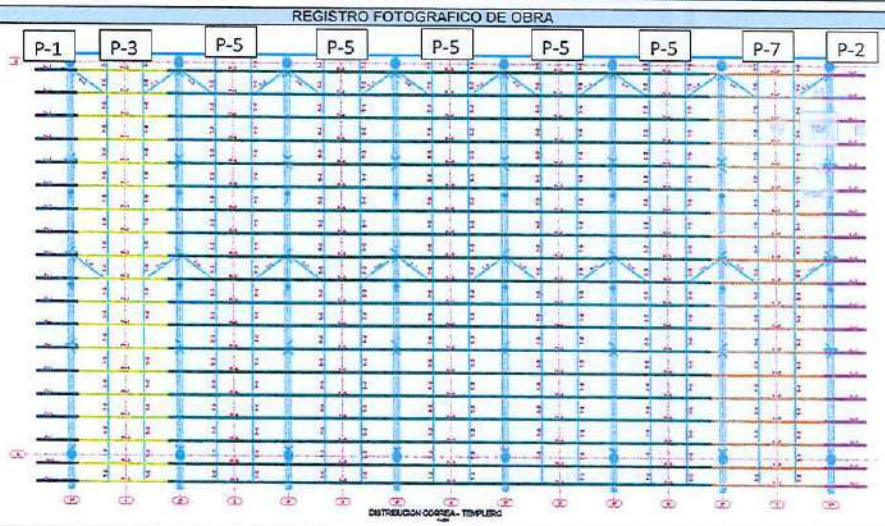

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200-79850147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
T-1 (TEMPLERO) VD3/8 NTC 161 Gr 34	06 y 73	1,62	2740MM	56	90,72
VIENEN:	241137,96			SUBTOTAL	90,72
PASAN:	241228,68			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

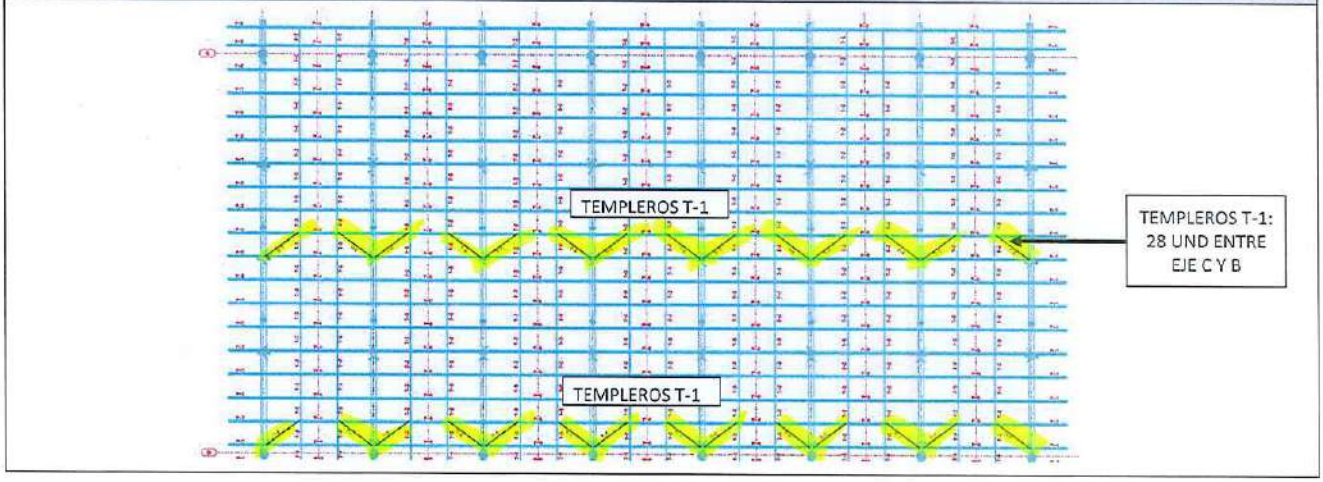

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: **ALVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **LENNIN EUPERCIO BOHORQUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

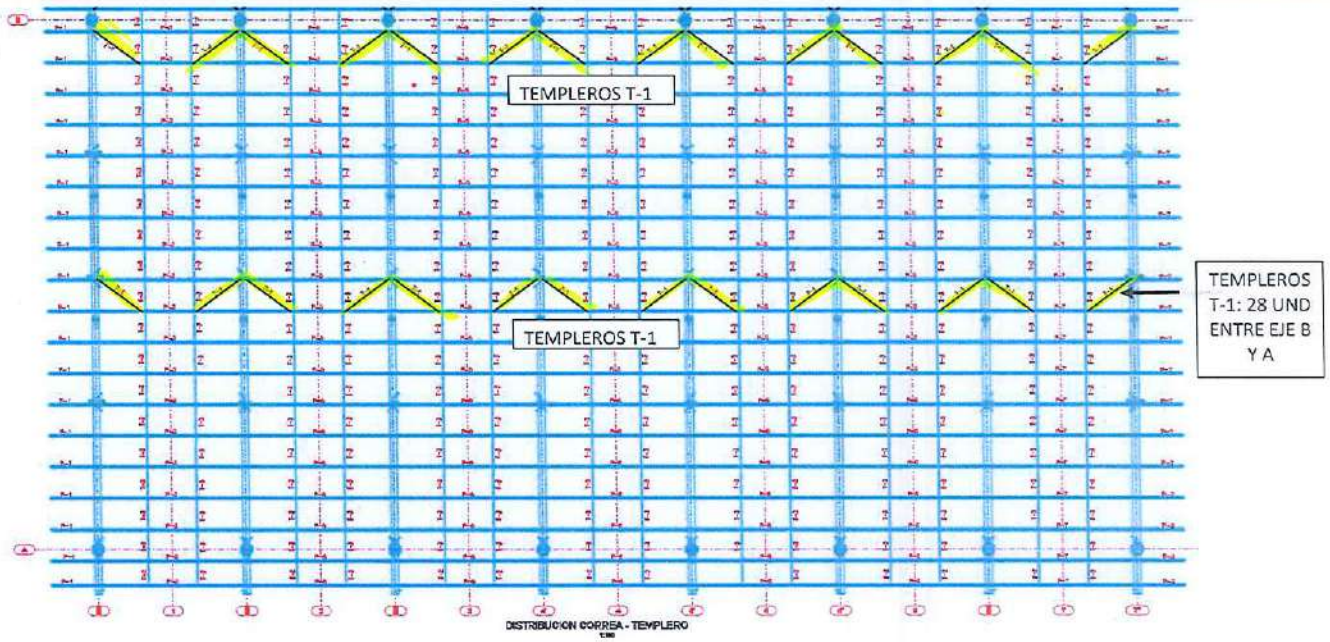

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

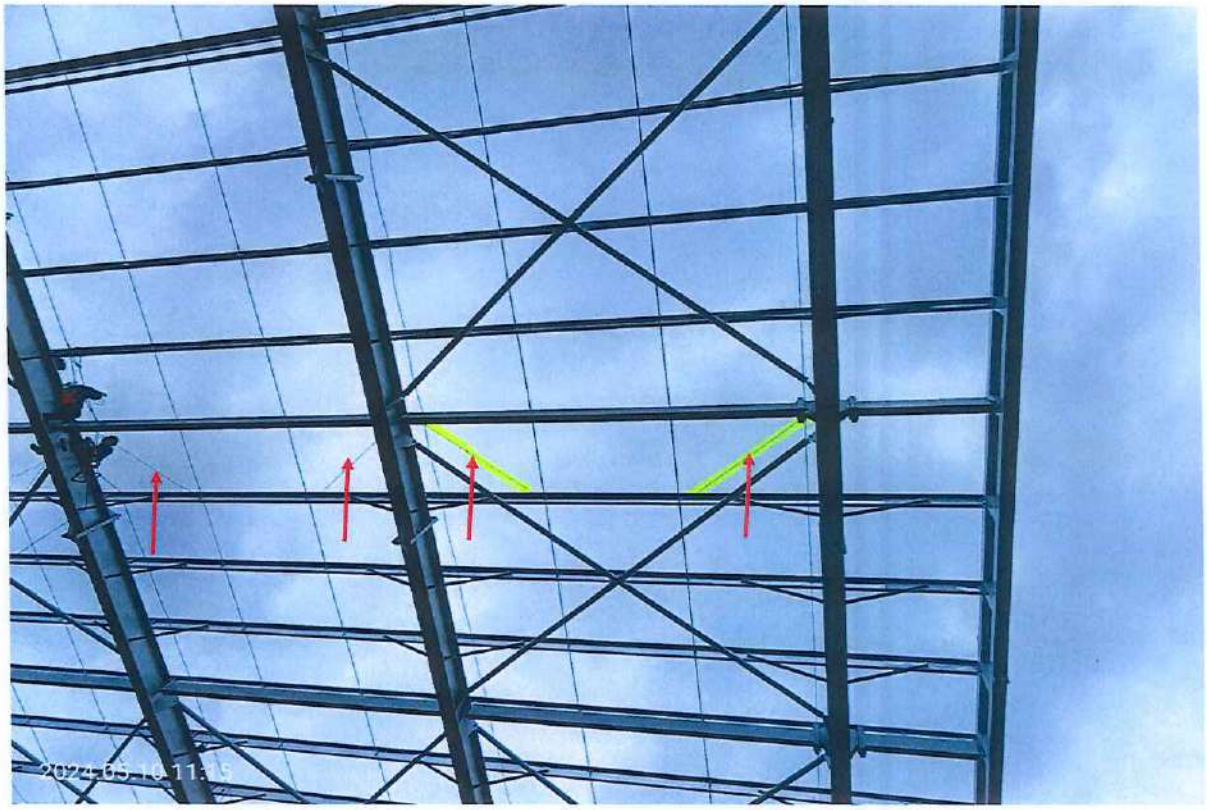

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
T-2 (TEMPLERO) L25X2.5 ASTM A36 Gr 36	06 y 74	1.58	1296MM	28	44.24
VIENEN:	241228.68			SUBTOTAL	44.24
PASAN:	241272.92			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

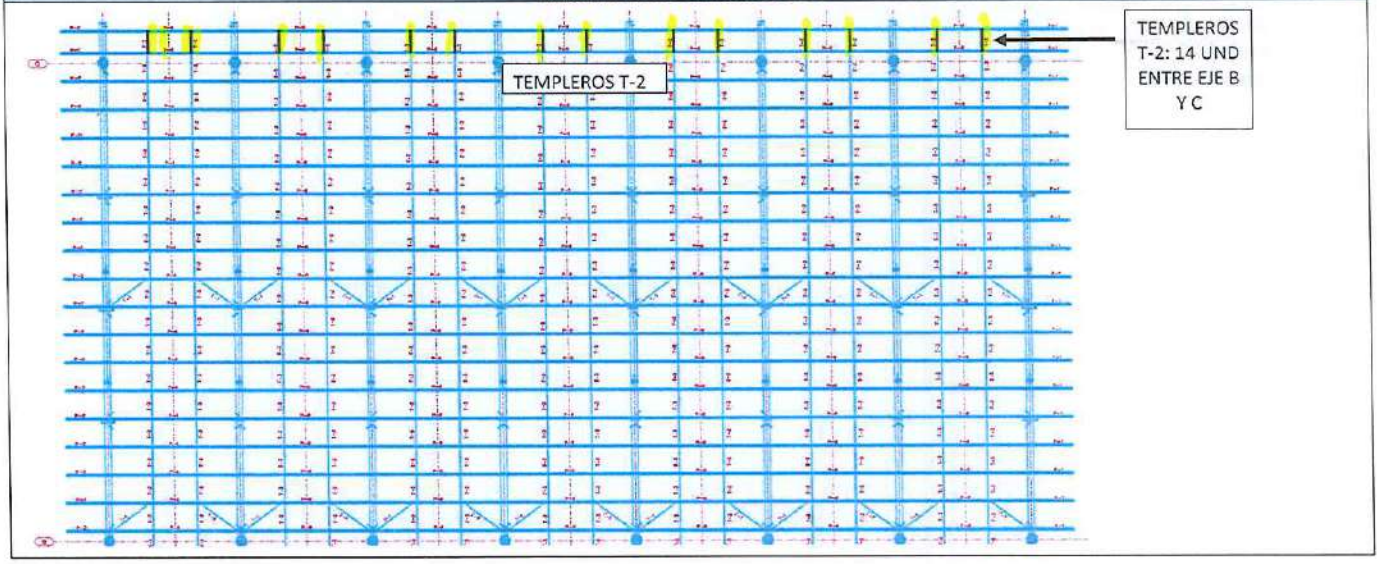

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-093337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090937 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN EUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200079650147

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **LENNIN EUPERCIO BOHORQUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
T-3 (TEMPLERO) L25X2.5 ASTM A36 Gr 36	06 y 74	1.91	1647MM	476	909.16
VIENEN:	241272.92			SUBTOTAL	909.16
PASAN:	242182.08			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No.	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

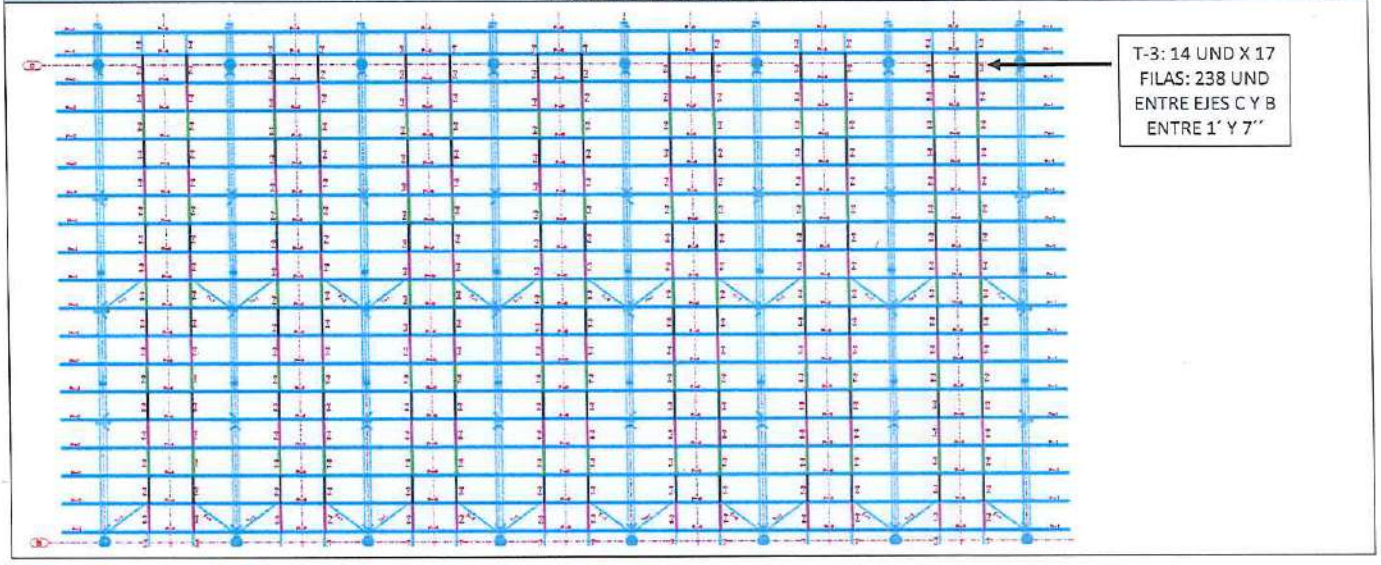

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-092637 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

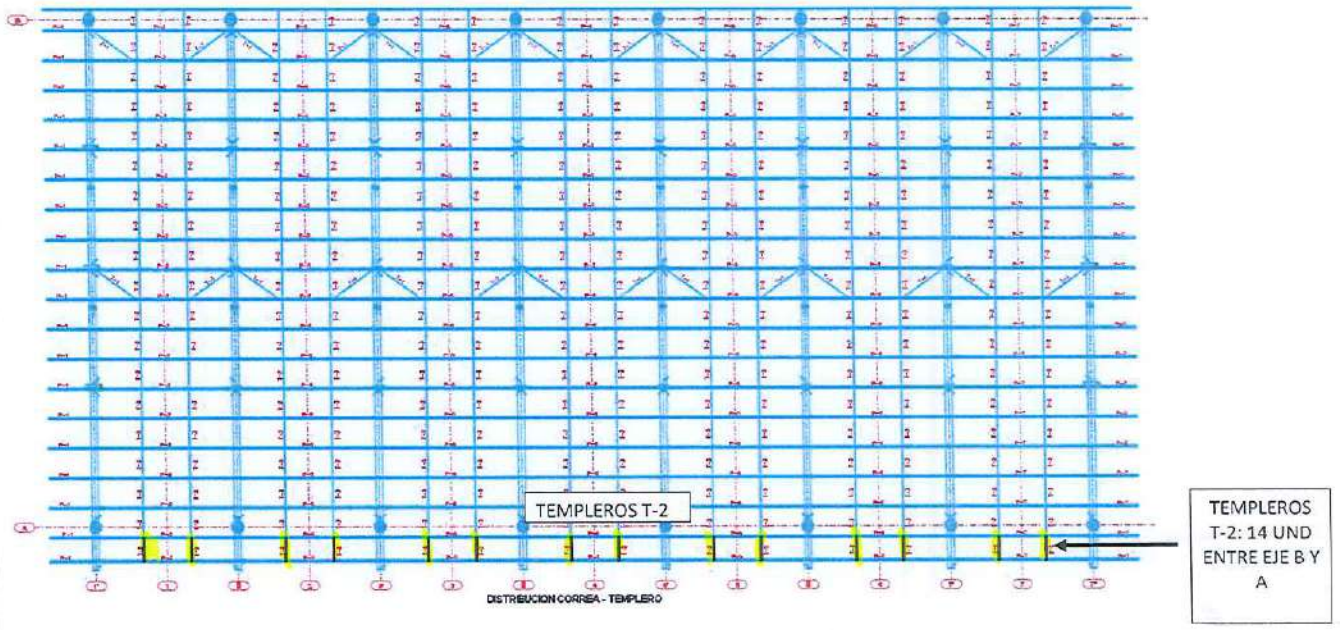

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-72650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-[illegible]337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

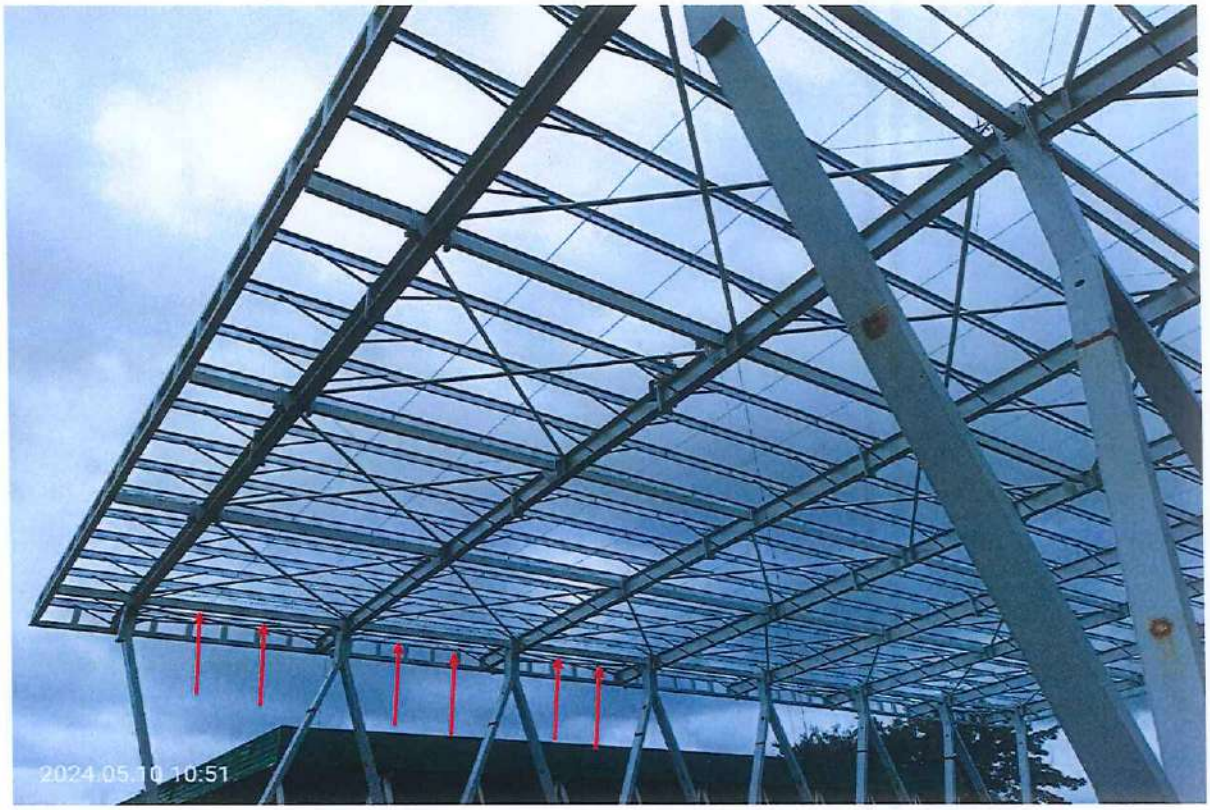

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072020-79650147

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090237 CND

Firma
Nombre: **LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

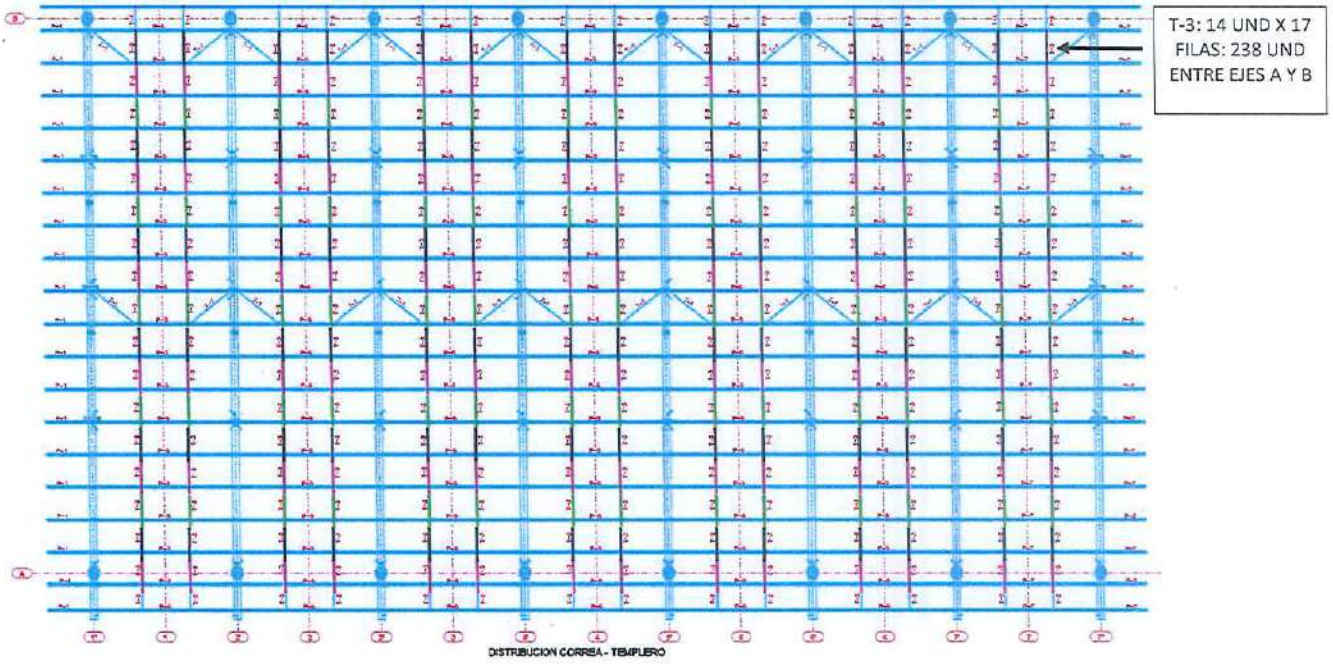

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-080337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	5/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
T-4 (TEMPLERO) L25X2.5 ASTM A36 Gr 36	06 - 75	1.47	1200MM	14	20.58
EJE B ENTRE 1´ Y 7´´					
VIENEN:	242182.08			SUBTOTAL	20.58
PASAN:	242202.66			TOTAL	

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No.	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

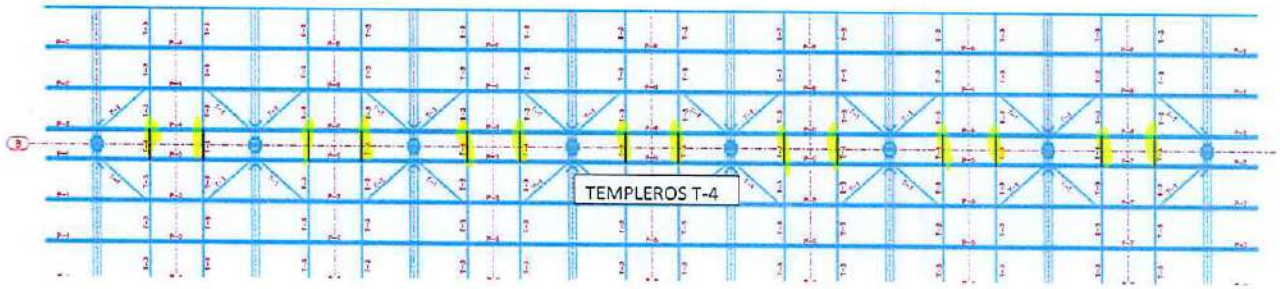

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

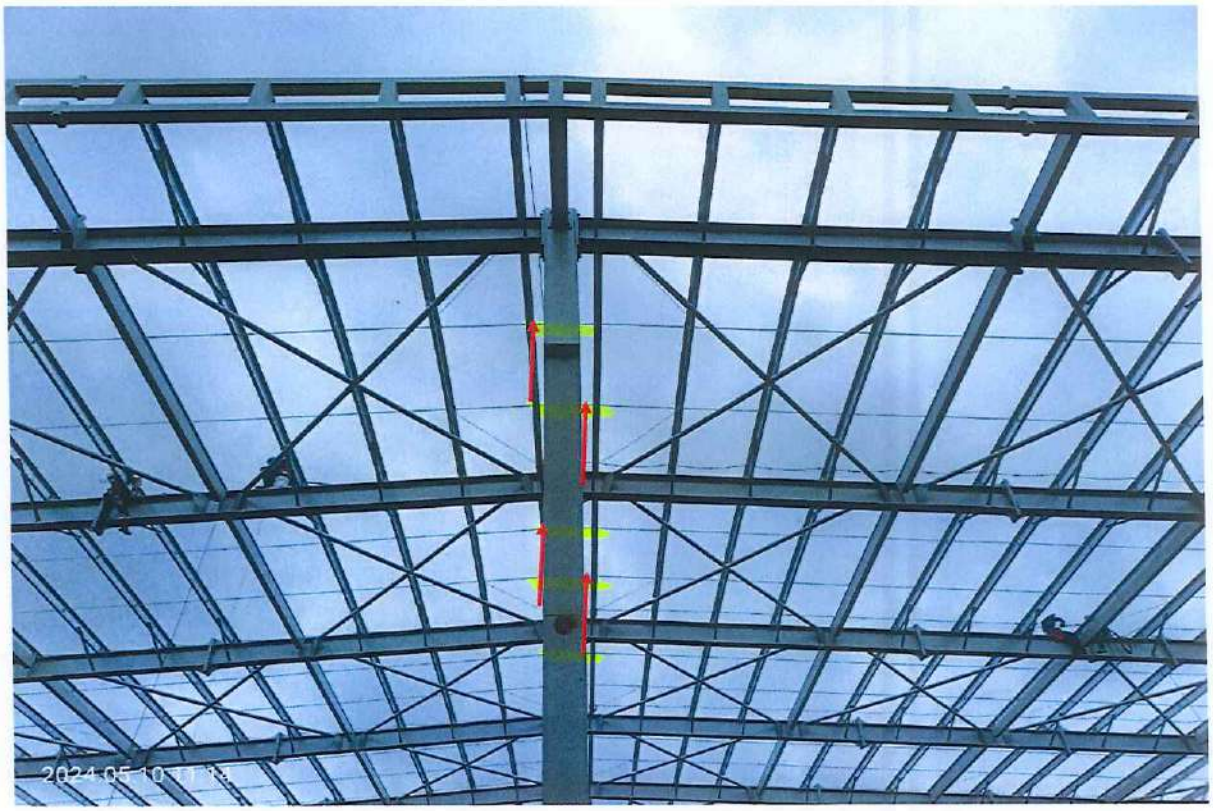

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VT-1 (VIGUETA) PTE70X70X2 ASTM A500 Gr C	02 y 76	9.68	2059MM	2	19.36
VT-2 (VIGUETA) PTE70X70X2 ASTM A500 Gr C	02 y 77	28.82	6617MM	7	201.74
VIENEN:	242202.66			SUBTOTAL	221.10
PASAN:				SUBTOTAL	242,423.76
			TOTAL	90%	218,181.38

OBSERVACIONES:
LA ACTIVIDAD SE COBRA HASTA EL 90%, TENIENDO EN CUENTA EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE.

CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	242,425.48
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	218,181.38
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	218,181.38
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	24,244.10

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

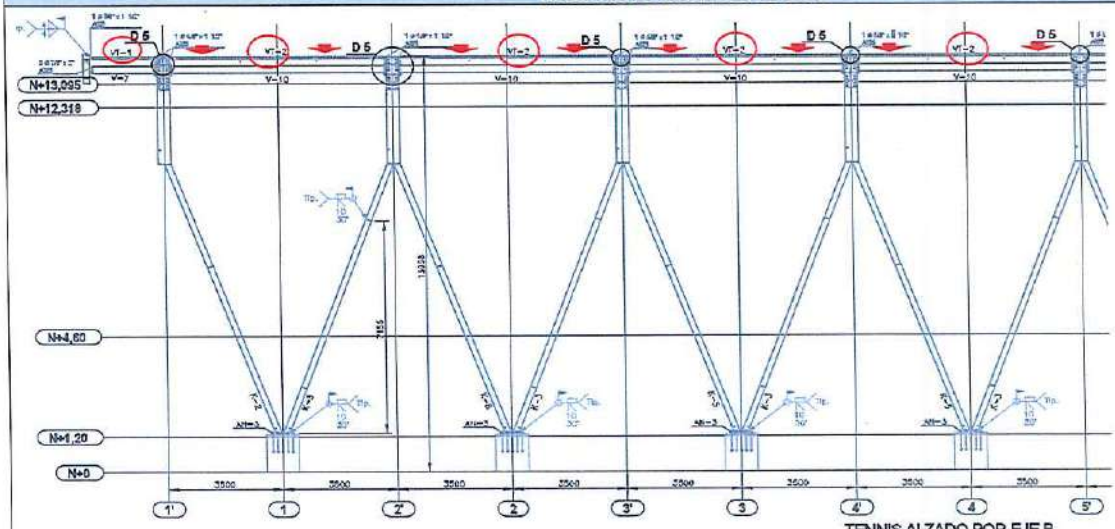

TENNIS ALZADO POR EJE B

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BORORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

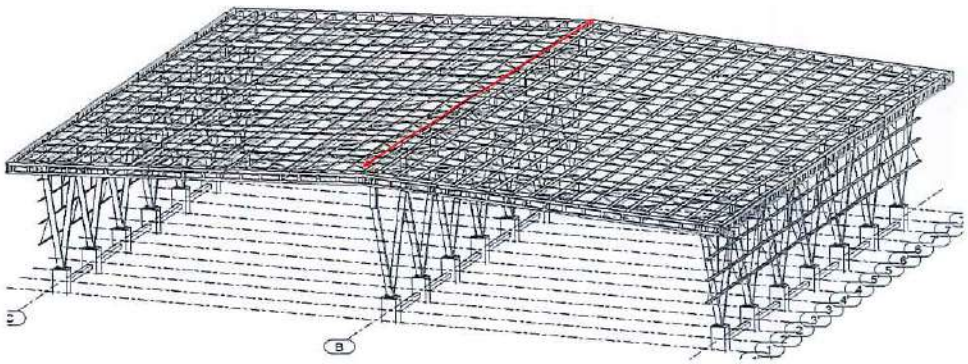

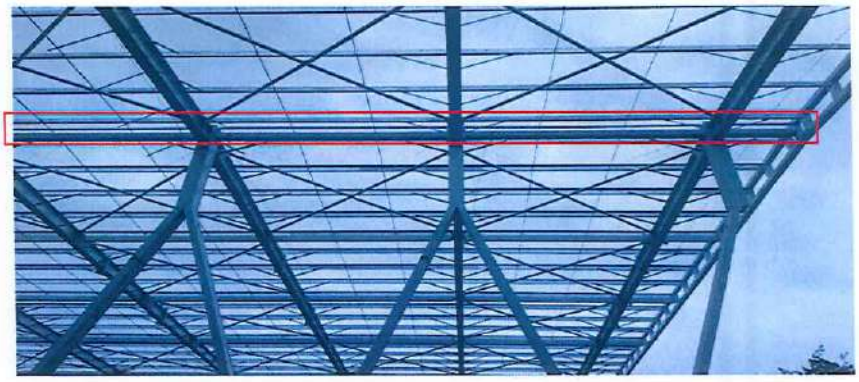

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79550147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-[illegible]0337 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

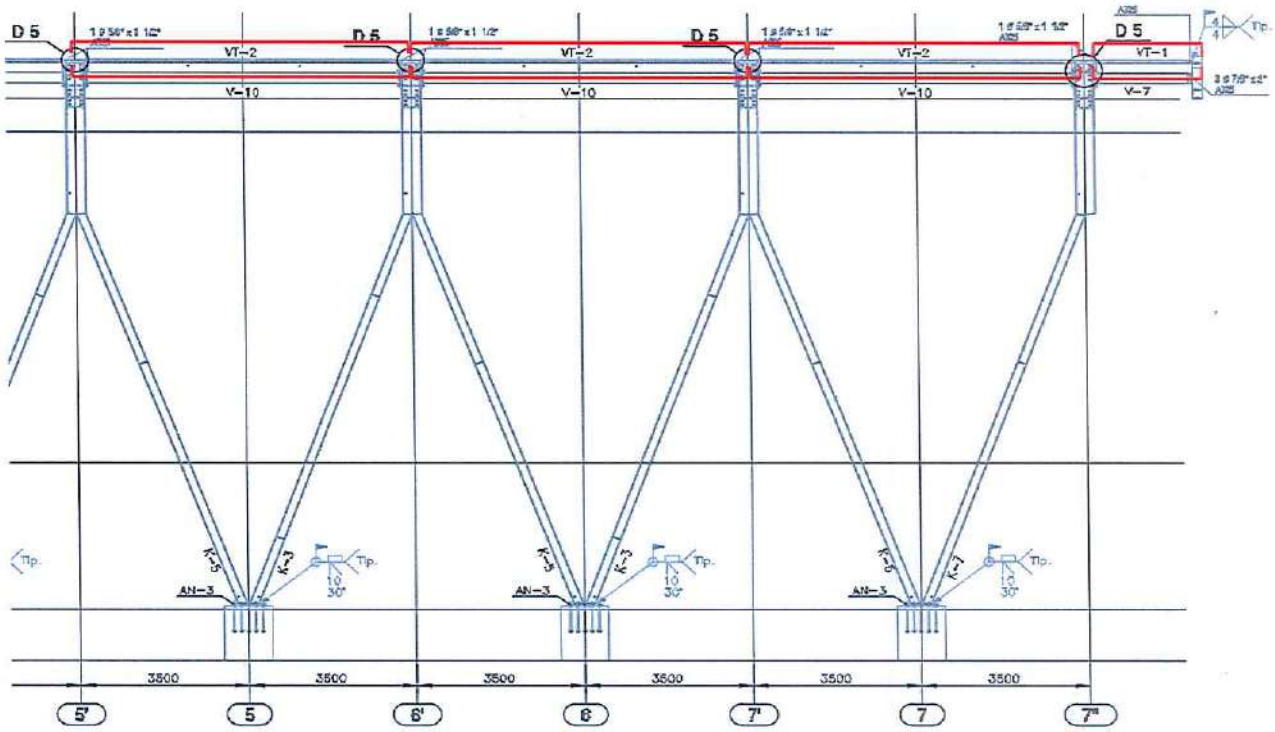

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma:
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma:
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma:
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200479650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENNIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
19.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	LARGO	VOLUMEN	CANTIDAD	
CAJEO CANCHA TENNIS 3 (DESCUBIERTA)			300.61	1.00	300.61
CAJEO CANCHA TENNIS 4 (DESCUBIERTA)			308.69	1.00	308.69
VIENEN:				SUBTOTAL	609.30
PASAN:				TOTAL	609.30

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 01/01 EXCAVACIONES	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	842.45
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	609.30
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0.00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	609.30
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	233.15

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

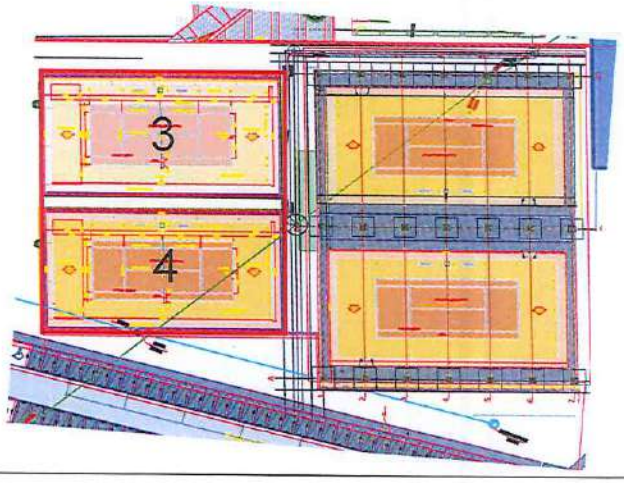

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma:
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25012000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M3
19,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA









Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200079650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

Calculo de Volúmenes

Proyecto: PARQUE SIKUANI

Alignment: perfi 1 - Cajeo Cancha cubierta de Tenis
Sample Line Group: seccion 1
Start Sta: 0+005,222
End Sta: 0+047,949

Station	Cut Area (Sq,m,)	Cut Volume (Cu,m,)	Reusable Volume (Cu,m,)	Fill Area (Sq,m,)	Fill Volume (Cu,m,)	Cum, Cut Vol, (Cu,m,)	Cum, Reusable Vol, (Cu,m,)	Cum, Fill Vol, (Cu,m,)	Cum, Net Vol, (Cu,m,)
0+005,222	20.37	0	0	0.07	0	0	0	0	0
0+010,000	18.79	93.55	93.55	0.47	1.3	93.55	93.55	1.3	92.24
0+020,000	20.5	196.45	196.45	0.84	6.56	290	290	7.87	282.13
0+030,000	24.67	225.85	225.85	0.01	4.26	515.85	515.85	12.13	503.72
0+040,000	26.32	254.95	254.95	0.33	1.7	770.8	770.8	13.83	756.97
0+044,546	27	121.2	121.2	0.46	1.79	892	892	15.62	876.38
0+047,949	7.97	59.51	59.51	2.7	5.37	951.51	951.51	20.99	930.52

lignment: perfil2 - - Cajeo Cancha de Baloncesto
Sample Line Group: seccion 2
Start Sta: 0+004,535
End Sta: 0+093,553

Station	Cut Area (Sq,m,)	Cut Volume (Cu,m,)	Reusable Volume (Cu,m,)	Fill Area (Sq,m,)	Fill Volume (Cu,m,)	Cum, Cut Vol, (Cu,m,)	Cum, Reusable Vol, (Cu,m,)	Cum, Fill Vol, (Cu,m,)	Cum, Net Vol, (Cu,m,)
0+004,535	4.84	0	0	2.88	0	0	0	0	0
0+010,000	16.4	58.03	58.03	0.01	7.9	58.03	58.03	7.9	50.14
0+020,000	12.08	142.37	142.37	0	0.06	200.4	200.4	7.96	192.44
0+030,000	9.58	108.29	108.29	0	0.02	308.69	308.69	7.98	300.71
0+040,000	8.49	90.34	90.34	0.17	0.88	399.03	399.03	8.86	390.17
0+050,000	5.79	71.38	71.38	0.86	5.15	470.41	470.41	14.01	456.4
0+060,000	7.24	65.14	65.14	0.08	4.67	535.56	535.56	18.68	516.88
0+070,000	10.16	86.98	86.98	0	0.4	622.53	622.53	19.07	603.46
0+080,000	9.84	100.01	100.01	0	0.02	722.54	722.54	19.09	703.45
0+090,000	14.23	120.36	120.36	0	0.01	842.9	842.9	19.1	823.8
0+093,553	10.37	43.69	43.69	0.01	0.02	886.6	886.6	19.12	867.48

Ing. Raúl Alberto Velasco Avila
M.P: 25335137306 CND / 01-10484 CPNT
Topógrafo Obra

FANNY BARRERA GONZALEZ
L.P. No. 01-10580
Topógrafo Interventoría

Calculo de Volúmenes

PARQUE SIKUANI,dwg

Alignment: perfi 3 - Cajeo Cancha sin cubierta de Tenis
Sample Line Group: secciones 3
Start Sta: 0+000,856
End Sta: 0+040,000

Station	Cut Area (Sq,m,)	Cut Volume (Cu,m,)	Reusable Volume (Cu,m,)	Fill Area (Sq,m,)	Fill Volume (Cu,m,)	Cum, Cut Vol, (Cu,m,)	Cum, Reusable Vol, (Cu,m,)	Cum, Fill Vol, (Cu,m,)	Cum, Net Vol, (Cu,m,)
0+000,856	1.79	0	0	0.14	0	0	0	0	0
0+010,000	6.93	39.87	39.87	0	0.66	39.87	39.87	0.66	39.21
0+020,000	9.08	80.06	80.06	0.05	0.24	119.93	119.93	0.89	119.03
0+030,000	8.65	88.67	88.67	0.02	0.34	208.59	208.59	1.23	207.36
0+040,000	10.31	94.81	94.81	0.29	1.56	303.4	303.4	2.79	300.61

Alignment: perfiL4 - Cajeo Cancha sin cubierta de Tenis
Sample Line Group: seccion4
Start Sta: 0+000,876
End Sta: 0+040,000

Station	Cut Area (Sq,m,)	Cut Volume (Cu,m,)	Reusable Volume (Cu,m,)	Fill Area (Sq,m,)	Fill Volume (Cu,m,)	Cum, Cut Vol, (Cu,m,)	Cum, Reusable Vol, (Cu,m,)	Cum, Fill Vol, (Cu,m,)	Cum, Net Vol, (Cu,m,)
0+000,876	2.6	0	0	0.38	0	0	0	0	0
0+010,000	4.2	31.01	31.01	0.44	3.73	31.01	31.01	3.73	27.28
0+020,000	7.03	56.14	56.14	0.23	3.37	87.14	87.14	7.1	80.04
0+030,000	12.28	96.53	96.53	0	1.16	183.67	183.67	8.26	175.41
0+038,775	14.7	118.36	118.36	0.03	0.13	302.03	302.03	8.39	293.64
0+040,000	9.95	15.1	15.1	0.06	0.06	317.13	317.13	8.45	308.69

TOTAL VOLUMEN DE CORTE 2459 M3

Ing. Raúl Alberto Velasco Avila
M.P: 25335137306 CND / 01-10484 CPNT
Topógrafo Obra

FANNY BARRERA GONZÁLEZ
L.P. No. 01-10580
Topógrafo Interventoría

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	ML
26,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
TUBERÍA DE 36" TRAMO 1			31,56	1,0	31,56
TRAMO 2			38,76	1,0	38,76
VIENEN:		SUBTOTAL			70,32
PASAN:		TOTAL			70,32

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 01/04 LOCALIZACION Y EXCAVACION	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	1.311,56
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	70,32
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	70,32
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	1.241,24

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

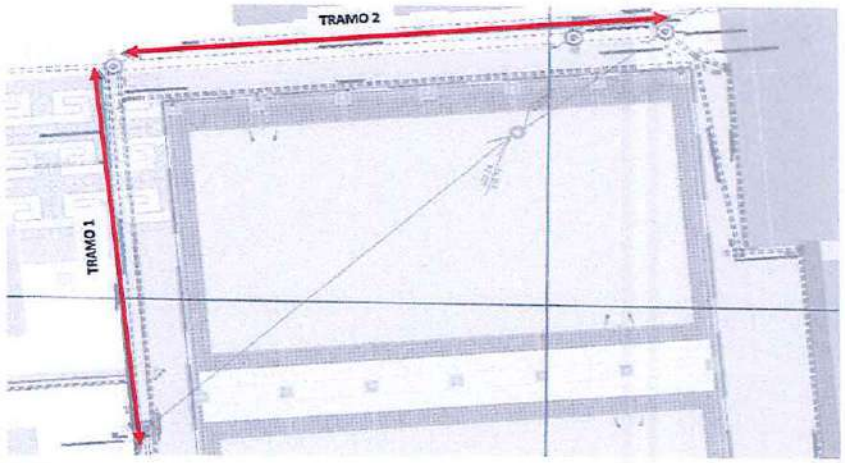

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-[illegible]337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ML
26,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	RED AGUAS LLUVIAS - RELLENO Y BASES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
26,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
TUBERÍA DE 36"	1,30	1,30	70,32	1,0	118,84
MENOS VOLUMEN TUBERIA		0,6567	70,32	-1,0	-46,18
VIENEN:				SUBTOTAL	72,66
PASAN:				TOTAL	72,66

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 02/04 RELLENO	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	652,00
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	72,66
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	72,66
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	579,34

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

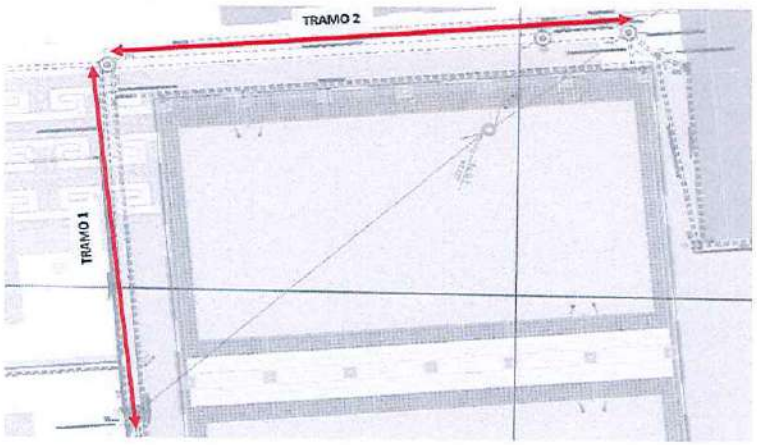

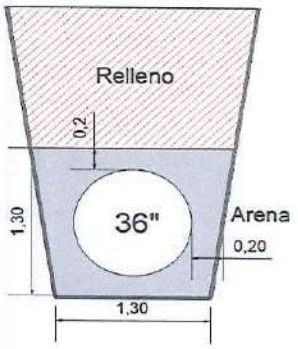

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-[illegible]237 CND

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: **LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	RED AGUAS LLUVIAS - RELLENO Y BASES	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	M3
26,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2501200879650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

TOPOGRAFIA	Proyecto: PARQUE SIKUANI	Calculó: RV	CALCULO DE VOLUMENES	
	Entidad: CONSORCIO INTERDEPORTIVO	Revisó:		
	Contiene: CAMA ARENA TUBERÍA 36"	Fecha:	Hoja:	De:

ABSCISAS	AREA m^2	VOL PARC. m^3	VOL ACUM. m^3	OBSERVACIONES
K00+000.00	1.69			
K00+005.00		16.9000	16.9000	
K00+010.00	1.69			DATOS TOMADOS
K00+015.00		16.9000	33.8000	POR MEDIO DE NIVEL
K00+020.00	1.69			CON ABCSISADO CADA 5 M
K00+025.00		16.9000	50.7000	
K00+030.00	1.69			
K00+035.00		16.9000	67.6000	
K00+040.00	1.69			
K00+045.00		16.9000	84.5000	
K00+050.00	1.69			
K00+055.00		16.9000	101.4000	
K00+060.00	1.69			
K00+065.00		16.9000	118.3000	Cama de arena tubería de 36"
K00+070.00	1.69			
K00+070.32		0.5500	118.8500	Cama de arena tubería de 36"
K00+000.00	-0.6567			
K00+005.00		-6.5669	-6.5669	
K00+010.00	-0.6567			
K00+015.00		-6.5669	-13.1339	
K00+020.00	-0.6567			
K00+025.00		-6.5669	-19.7008	
K00+030.00	-0.6567			
K00+035.00		-6.5669	-26.2677	
K00+040.00	-0.6567			
K00+045.00		-6.5669	-32.8346	
K00+050.00	-0.6567			
K00+055.00		-6.5669	-39.4016	
K00+060.00	-0.6567			
K00+065.00		-6.5669	-45.9685	
K00+070.00	-0.6567			
K00+070.32		-0.2215	-46.1900	Menos volumen tubería
			72.66	Total relleno (cama de arena)

Ing. Raúl Alberto Velasco Avila
M.P: 25335137306 CND / 01-10484 CPNT
Topógrafo Obra

FANNY BARRERA GONZALEZ
L.P. No. 01-10580
Topógrafo Intervenoría

TOPOGRAFIA	Proyecto: PARQUE SIKUANI	Calculó: RV	CALCULO DE VOLUMENES	
	Entidad: CONSORCIO INTERDEPORTIVO	Revisó:		
	Contiene: CAMA ARENA TUBERÍA 36"	Fecha:	Hoja:	De:

ABSCISAS	AREA m^2	VOL PARC. m^3	VOL ACUM. m^3	OBSERVACIONES
K00+000.00	2.25			
K00+005.00		22.5000	22.5000	
K00+010.00	2.25			DATOS TOMADOS
K00+015.00		22.5000	45.0000	POR MEDIO DE NIVEL
K00+020.00	2.25			CON ABCSISADO CADA 5 M
K00+025.00		22.5000	67.5000	
K00+030.00	2.25			
K00+035.00		21.3750	88.8750	
K00+040.00	2.03			
K00+045.00		19.1250	108.0000	
K00+050.00	1.80			
K00+055.00		18.0000	126.0000	
K00+060.00	1.80			
K00+065.00		18.0000	144.0000	Cama de arena tubería de 36"
K00+070.00	1.80			
K00+070.32		0.0200	144.0200	Cama de arena tubería de 36"

Ing. Raúl Alberto Velasco Avila
M.P: 25335137306 CND / 01-10484 CPNT
Topógrafo Obra

FANNY BARRERA GONZALEZ
L.P. No. 01-10580
Topógrafo Intervenoría

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
26,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
TUBERÍA DE 36"	1,30	1,20	38,76	1,0	60,47
	1,30	1,50	31,56	1,0	61,54
VIENEN:				SUBTOTAL	122,01
PASAN:				TOTAL	122,01

OBSERVACIONES:
VER PLANO No. 02/04 RELLENO

CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	634,43
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	122,01
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	122,01
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	512,42

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

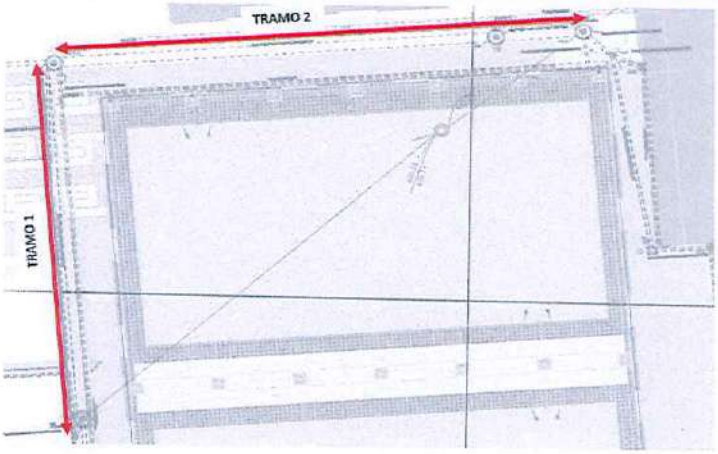

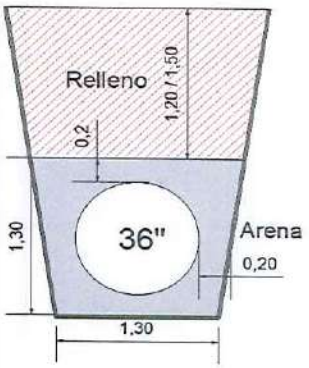

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: **ÁLVARO GABRIEL AREVALO**
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: **GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS**
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-153896 CND

Firma
Nombre: **ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: **LENIN LUPERCIO BONORQUEZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M3
26,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200O-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ML
NP26.18	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
POZO 1			2,50	1,0	2,50
POZO 2			2,50	1,0	2,50
POZO 3			2,50	1,0	2,50
VIENEN:				SUBTOTAL	7,50
PASAN:				TOTAL	7,50

OBSERVACIONES:
VER PLANO No. 03/04 POZO INSPECCION RED ALL

CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	7,50
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	7,50
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	7,50
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507[illegible]

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ML
NP26.18	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



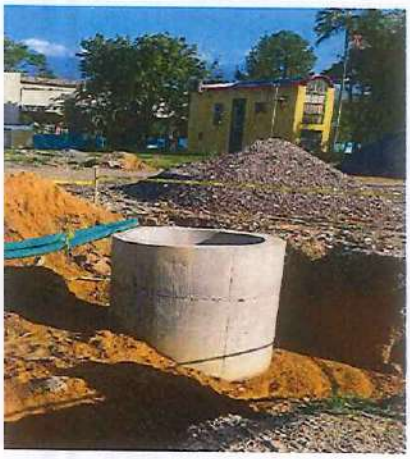





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: A25072000-79530147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-090137 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	UND
NP26.19	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=2.10 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
POZO 1				1,0	1,00
POZO 2				1,0	1,00
POZO 3				1,0	1,00
VIENEN:				SUBTOTAL	3,00
PASAN:				TOTAL	3,00

OBSERVACIONES:
VER PLANO No. 03/04 POZO INSPECCION RED ALL

CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACION No. 1)	3,00
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	3,00
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	3,00
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

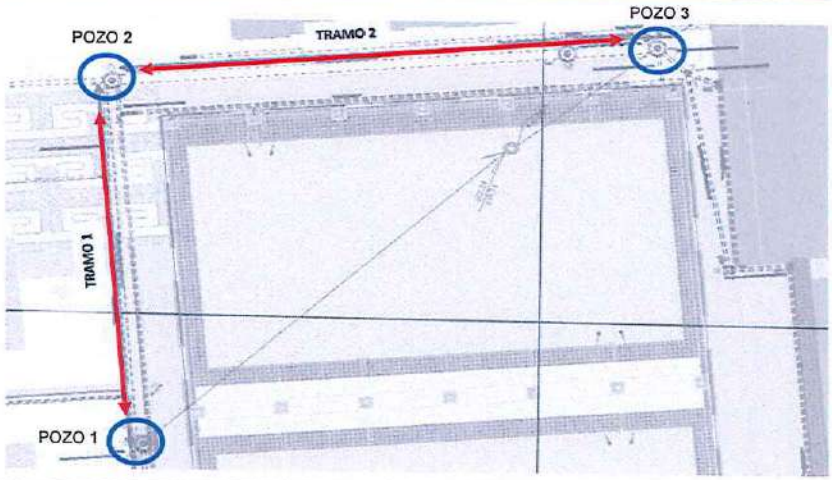

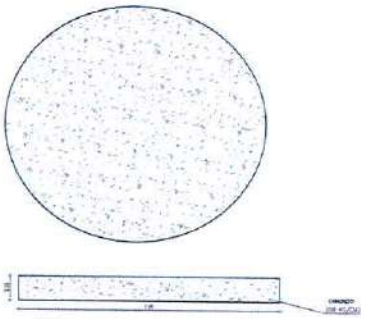

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507 2000-73650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	UND
NP25.19	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=2.10 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A50072000-79656147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	UND
NP26.20	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.20 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
POZO 1				1,0	1,00
POZO 2				1,0	1,00
POZO 3				1,0	1,00
VIENEN:			SUBTOTAL		3,00
PASAN:			TOTAL		3,00

OBSERVACIONES:
VER PLANO No. 04/04 LOSA SUPERIOR POZO

CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACION No. 1)	3,00
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	3,00
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	3,00
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

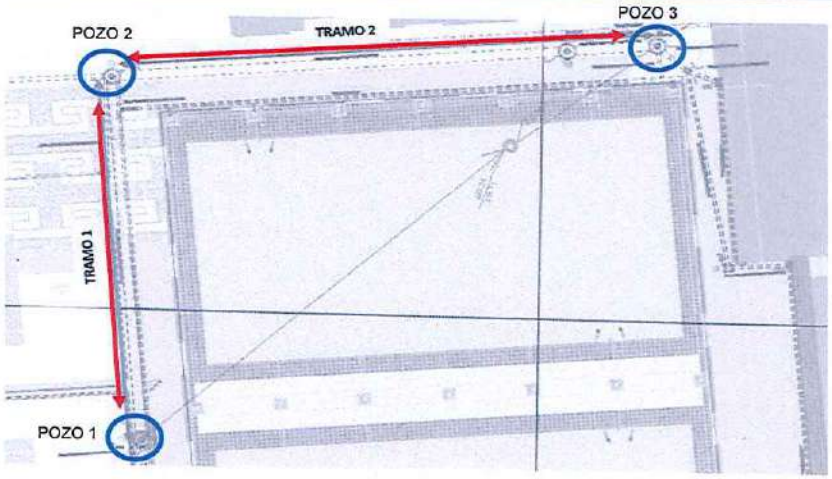

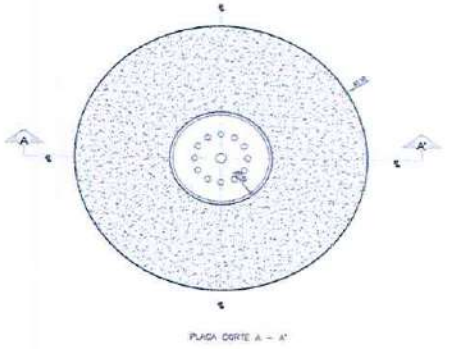

LOSA SUPERIOR POZO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200[illegible]

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	P

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	UND
NP26.20	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.20 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650747

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
ACTA	PARCIAL No. 2		
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS		UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		ML
NP26.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 900MM Ø36" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE		

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
TRAMO 1			28,42	1,00	28,42
TRAMO 2			37,40	1,00	37,40
VIENEN:				SUBTOTAL	65,82
PASAN:				TOTAL	65,82

OBSERVACIONES:		
VER PLANO No. 01/04 LOCALIZACION	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	76,99
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	65,82
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	0,00
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	65,82
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	11,17

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

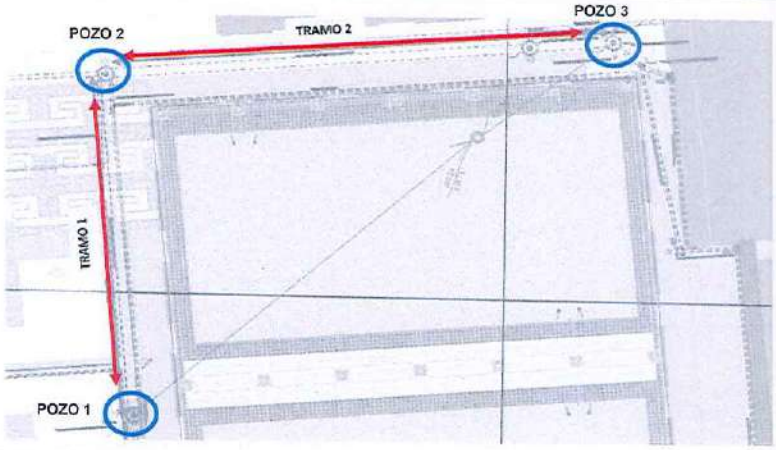

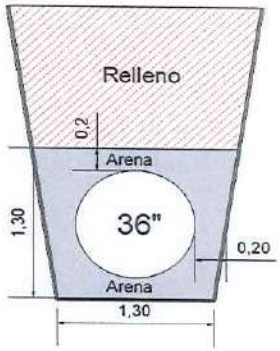

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090397 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ML
NP26.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 900MM Ø36" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 2 de mayo de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072020-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META



INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No 2

PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE A 11 DE OCTUBRE 2023 Y 20 DE MARZO A 30 DE ABRIL DE 2024

INTRODUCCION

Este informe de Interventoría detalla las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato de obra No 963 de 2022 y que tiene por objeto "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÒN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META" 1 de octubre a 11 de octubre 2023 y 20 de marzo a 30 de abril de 2024. El presente informe se enfoca que las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría durante este periodo de tiempo.

El Instituto De Deporte y Recreación del Meta – IDERMETA realizó la selección de oferentes mediante el concurso de méritos abiertos CM-002 de 2022, cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÒN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META" la cual fue adjudicada a CONSORCIO INTERDEPORTIVO registrada con el número de NIT: 901.669.685-5 representada legalmente por el señor HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES identificado con la cedula de ciudadanía 1.119.892.860 de Cumaral.

El contrato de interventoría N° 001 de 2023 adjudicado hace referencia al seguimiento y control del contrato de obra pública No. 963 de 2022 cuyo objeto es la "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÒN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META" el cual fue adjudicado al CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS registrada con el número de NIT:901.666.597-1 firma representada legalmente por el señor JUAN CARLOS LOZANO LEON.

El contrato de obra fue suscrito el 29 de diciembre de 2022 y el contrato de interventoría fue suscrito el 17 de enero de 2023. El acta de inicio del contrato de interventoría fue suscrita el 27 de febrero de 2023 y el acta de inicio de obra fue suscrita el 1 de marzo de 2023, este último se denominada "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÒN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META", y está identificado bajo el número 2022005500032 y 2022005500071 respectivamente; este proyecto se articula con el plan de desarrollo departamental 2020 a 2023 "Hagamos grande al Meta", por esta razón el deporte, la recreación, la actividad y la educación física es concebida como uno de los principales elementos dinamizadores de la política social en el departamento.

DESCRIPCION DE PROYECTO

El proyecto 2022005500071 cuyo objeto es ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANY DEL MUNCIPIO DE VILLAVICENCIO, META dentro del desarrollo departamental 2020 a 2023 "Hagamos grande al Meta" enmarca las políticas y los objetivos que se tiene en materia de deporte y recreación para este cuatrienio, el planteamiento contiene los siguientes lineamientos:

DIMENSIÓN 3. Hagamos Grande Al Meta en lo Social
SECTOR 43. Deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre
PROGRAMA 4301. Haciendo Grande al Meta fomento a la recreación, la actividad física y el deporte al Servicio de la gente
COMPONENTE CONSTITUTIVO DEL PROGRAMA: Infraestructura en parques recreativos y/o espacios lúdicos META PRODUCTO: Adecuar los espacios recreativos del parque Sikuany y cancha la Esperanza.

El espacio del Parque Sikuany, donde históricamente se han construido edificaciones para la práctica masiva del deporte, se convierte en el sitio adecuado para plantear la adecuación e intervención de los espacios deportivos que actualmente no cumplen integralmente con los requerimientos que demandan las prácticas deportivas que allí tienen lugar, en términos de normas y reglamentos establecidos para cada una de las disciplinas, además de complementar y consolidar este lugar como el Complejo Deportivo de Tenis más importante en el departamento.

El parque Sikuany fue inaugurado en el 2002. Ese año fue escenario de seis partidos de la Copa Davis de Tenis y en los que Colombia enfrentó a Cuba y Uruguay, escenario escogido históricamente por el equipo colombiano de tenis por sus canchas en polvo de ladrillo.

También ha sido centro de encuentro de torneos de tenis a nivel nacional de ligas departamentales y regionales, para lo cual se exigen los más altos estándares de calidad y que los escenarios se encuentren con toda la reglamentación exigida por la ITF (Federación Internacional de Tenis, organismo rector mundial del tenis).

El Departamento debe aprovechar el sector turismo del deporte para esto debe garantizar escenarios idóneos, con el fin de convertir el parque Sikuany en un escenario icónico para la práctica del tenis en el departamento y ser catalogado por la federación Colombiana de tenis como un escenario de talla mundial para albergar grandes torneos e incentivar el crecimiento del turismo de acuerdo al "plan del desarrollo integral de la presente ordenanza, los documentos que contienen el Plan de Desarrollo Económico y Social "HAGAMOS GRANDE AL META" vigencia 2020-2023" se busca tener un escenario avalado por la ITF.

La ejecución física del proyecto será de 12 meses. En síntesis, la intervención en el parque Sikuany consiste en la construcción de 3 canchas sintéticas de futbol 5, 3 canchas cubiertas de baloncesto, 4 canchas de tenis (2 cubiertas y 2 abiertas).

El proyecto 2022005500032 cuyo objeto es EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA presenta problemáticas avanzadas en cuanto a espacios para la comunidad, teniendo en cuenta que este sector está dividido en 8 etapas y para éstas solo hay un escenario deportivo, donde no cuenta con una cancha de futbol 11 en buenas condiciones, así mismo, las instalaciones y servicios de la cancha no son las adecuadas para su uso cotidiano por parte de la comunidad. En el territorio los espacios públicos para las prácticas deportivas son insuficientes e inadecuados para la población que está en capacidad física para practicar algún deporte. Los espacios existentes están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades. Los escenarios deportivos que están en buenas condiciones no son de uso público. El predio cuenta con un área bastante extensa

de zonas verdes, sin embargo, el mismo presenta una morfología bastante pronunciada entre el nivel de la Carrera 39 y el lote, crea una corriente de agua al llover que afecta directamente los andenes que lo conforman y la calzada.

En el proyecto de la cancha de la Esperanza, se va a construir áreas de urbanismo perimetrales, zonas de parqueadero, se va a reconstruir completamente toda la cancha de futbol, y se construirá una edificación doble propósito consistente en un sector de gradas en el nivel superior y bajo estas funcionará un área administrativa y de servicios comerciales.

INFORME: PAGO PARCIAL N°2.

CONTRATO N°	001-2023	PROYECTO N°	2022005500071

Fecha de Presentación: 10/05/2024

Periodo informado	Desde	1 / Octubre / 2023	Hasta	11 / Octubre / 2023
		20 / Marzo / 2024	Hasta	30 / Abril / 2024

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE INTERVENTORIA	
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON ONCE CENTAVOS (2.894.087.592,11).
ADICIONAL N°1 (PROYECTO SIKUANY)	SETECIENTOS CUARENTAY CUATRO MILLONES DOCE MIL TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($ 744.012.372,54)
VALOR ACTUALIZADO (PROYECTO SIKUANY)	DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (2.124.544.590,62).
VALOR ACTUALIZADO (CONTRATO)	TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (3.638.099.964,64).
OBJETO PROYECTO:	• INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. • **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.**

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE INTERVENTORIA	
VALOR DEL PROYECTO:	• MIL QUINIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON TRES CENTAVOS (1.513.555.374,03). • **MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS, CON OCHO CENTAVOS (1.380.532.218,08).**
VALOR ADICIONAL:	N.A.
VALOR ACTUALIZADO:	DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON ONCE CENTAVOS (2.894.087.592,11).
CORREO ELECTRÓNICO:	consorciointerdeportivo1@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	27/02/2023
SUSPENSIÓN:	12 de Octubre de 2023
TIEMPO:	Dos (02) Meses
AMPLIACION N°1 SUSPENSIÓN N°1:	11 de Diciembre de 2023
TIEMPO:	Dos (02) Meses
AMPLIACION N°2 SUSPENSIÓN N°1:	9 de Febrero de 2024
TIEMPO:	Dos (02) Meses
REINICIO:	20 de Marzo de 2024
PRORROGA N°1	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	17/02/2025

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	27/02/2023
PRORROGA:	N.A.
SUSPENSIÓN:	12 de Octubre de 2023
TIEMPO:	Dos (02) Meses
AMPLIACION N°1 SUSPENSIÓN N°1:	11 de Diciembre de 2023
TIEMPO:	Dos (02) Meses

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
AMPLIACION N°2 SUSPENSIÓN N°1:	9 de Febrero de 2024
TIEMPO:	Dos (02) Meses
REINICIO:	20 de Marzo de 2024
PRORROGA N°1	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	17/02/2025

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR	MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	062-2023/220-2023/282-2023.
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	FABIAN A. SAAVEDRA RIOS - MILDRED Y. ROA - WILMER ALEXIS TRIANA RINCON

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE OBRA	
NUMERO DEL CONTRATO:	963 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL INICIAL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VENTINUEVE PESOS ($45.806.464.729).
OBJETO PROYECTO:	• **ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.** • MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR DEL PROYECTO:	• **SIKUANI; VEINTICINCO MIL MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($25.483.462.149.00)**

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE OBRA	
	• ESPERANZA; VEINTE MIL TRECIENTOS VEINTITRES MILLONES DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE. ($ 20.323.002.580.00)
ADICIONAL N°1 (PROYECTO SIKUANY)	• DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS MCTE ($ 12.741.684.131,00)
VALOR ACTUALIZADO (PROYECTO SIKUANY)	• TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS OCHENTA PESOS (38.225.146.280,00).
VALOR ACTUALIZADO (CONTRATO)	CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS (58.548.148.860,00).
CORREO ELECTRÓNICO:	consorciointerdeportivo1@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	01/03/2023
PRORROGA:	N.A.
SUSPENSIÓN:	12 de Octubre de 2023
TIEMPO:	Dos (02) Meses
AMPLIACION N°1 SUSPENSIÓN N°1:	11 de Diciembre de 2023
TIEMPO:	Dos (02) Meses
AMPLIACION N°2 SUSPENSIÓN N°1:	9 de Febrero de 2024
TIEMPO:	Dos (02) Meses
REINICIO:	20 de Marzo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	20/08/2024
PRORROGA N°1	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	6/02/2025

UBICACIÓN

Los proyectos objeto del presente informe, se encuentran ubicados en la República de Colombia, casco urbano del municipio de Villavicencio en el departamento del Meta.

La cancha de futbol, se encuentra ubicada en la comuna 7, del barrio La Esperanza, ubicado por la carrera 39 calle 11 con carrera 42 calle12B, limita al norte con el caño Buque, y al occidente con viviendas del barrio la esperanza.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META			
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	VEREDA:	N/A
CORREGIMIENTO:	N/A	BARRIO:	LA ESPERANZA
COMUNA:	Comuna 7, Carrera 39, calle 11, carrera 42, calle12B.		
COORDENADAS:	Latitud 4°8'12" N – Longitud 73°37'15 W		



Figura 1, 2. Plano de área de intervención cancha La Esperanza.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META			
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	VEREDA:	N/A
CORREGIMIENTO:	N/A	BARRIO:	CATATUMBO
COMUNA:	Comuna 5, Carrera 19 No. 21-22		
COORDENADAS:	Latitud 4°07'41.51 N – Longitud 73°37'54.74 W		

El parque Sikuany se encuentra ubicado en la comuna 5, carrera 19 No. 21 – 122, limita con el barrio Catatumbo, Bello Horizonte, Cantarrana.



Figura 2, 3. Plano de área de intervención parque Sikuany

A. INFORME TÉCNICO


1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA



Grafica Avance Físico Acumulado.

OBSERVACIONES CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA:

Como se puede observar durante el periodo de tiempo comprendido entre 20 de marzo a 30 abril, se tiene un avance ejecutado acumulado de 29.88% frente a un programado del 29.90%, situación que no es representativa ni afecta considerablemente las actividades programadas, ante esta situación se puede indicar que se están cumpliendo las actividades de obra programadas, lo cual mantiene como estable la ejecución del proyecto y a la fecha se mantiene la proyección de culminar en el segundo mes del año 2025.

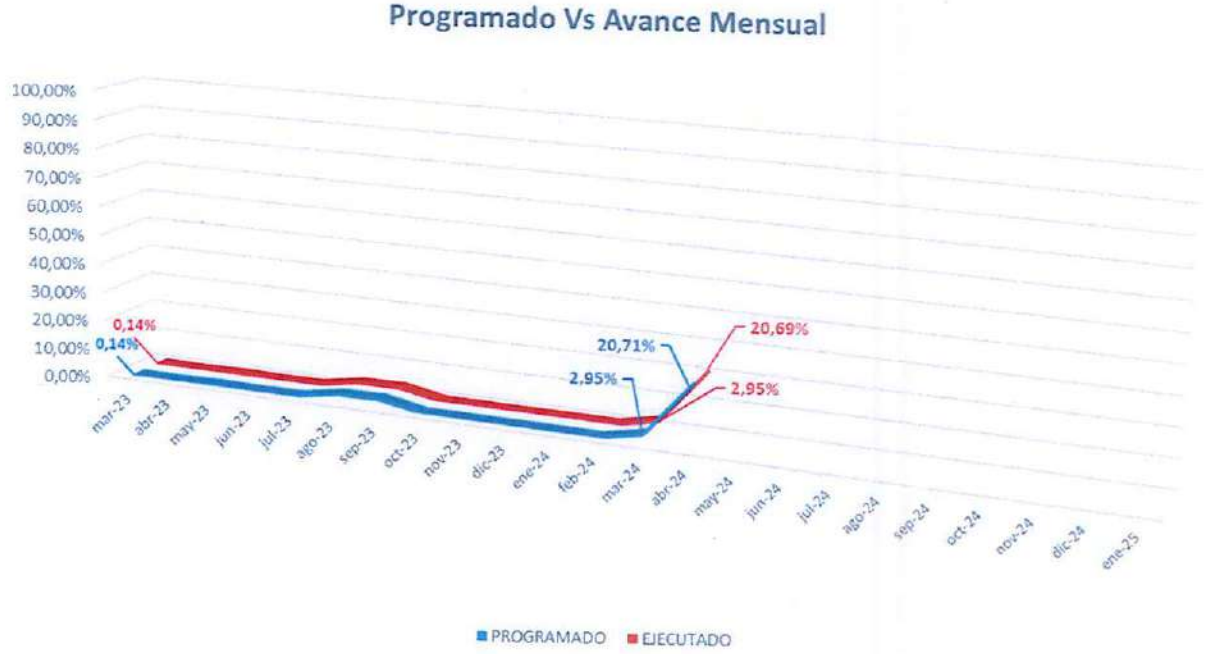

Grafica Avance Físico Mensual.

En cuanto al avance mensual del proyecto, se observa que se mantiene la diferencia de 0.02%, lo cual no afecta el normal desarrollo del proyecto en su conjunto general, para mantener esta constante se tiene acordado con el constructor, entregar planes de trabajo semanales para de esta manera poder mantener un control periódico sobre el avance del proyecto y así poder tomar decisiones que eviten atrasos considerables e injustificados que puedan afectar el cumplimiento de la fecha de entrega.

2. GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

REFERENCIA - RADICADO	FECHA OFICIO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
CE-CVO-016-2024	20/03/2024	ESTADO DE TRAMITE DE REVISION Y APROBACION DE DISEÑOS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE LA ESPERANZA, POR PARTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO EAAV ESP	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-017-2024	22/03/2024	ESTADO DEL TRAMITE ANTE LA ELECTRIFICADORA DEL META S.A E.S.P (EMSA) DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE LA ESPERANZA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-018-2024	22/03/2024	DOCUMENTACION PARA SOLICITUD DE APROBACION DE DISEÑOS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO DE ADECUACION DEL PARQUE SIKUANI, POR PARTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO EAAV ESP	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-019-2024	22/03/2024	DOCUMENTACION PARA SOLICITUD DE APROBACION DE DISEÑOS DE RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DEL PROYECTO CANCHA DE LA ESPERANZA, POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE VILLAVICENCIO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
NO PRESENTA CONSECUTIVO	22/03/2024	ENVIO PLAN DE CONTINGENCIA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-020-2024	26/03/2024	REMISION POLIZAS REINICIO DE LA AMPLIACION N°2 DE LA SUSPENSIÓN N°1	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-021-2024	2/04/2024	SOLICITUD CERTIFICACION ACLARACION FORMA DE PAGO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

REFERENCIA - RADICADO	FECHA OFICIO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
CE-CVO-022-2024	4/04/2024	ENVIO DE POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONTRATO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-023-2024	4/04/2024	REMISION PLAN DE INVERSION Y AUTORIZACION PAGO ANTICIPO OBRA ADICIONAL N°1	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
PL-120-215	5/04/2024	OFICIO CNT 207-2024 DEL 01/04/2024	IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
PL-120-216	5/04/2024	OFICIO CNT 206-2024 DEL 26/03/2024	IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
PL-120-220	8/04/2024	OFICIO CNT 215-2024 DEL 04/04/2024	IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-025-2024	8/04/2024	REMISION CONCEPTO DE CARGAS ELECTRICAS	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
PL-120-223	9/04/2024	MODIFICACION CONTRATO DE INTERVENTORIA	IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-024-2024	9/04/2024	REMISION DOCUMENTACION PAGO ANTICIPO OBRA ADICIONAL N°1	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-026-2024	22/03/2024	PRESUPUESTO AMBIENTAL	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-027-2024	10/04/2024	SOLICITUD AMPLIACION N°3 SUSPENSION N°1 DEL CONTRATO DE OBRA N° 963 DE 2022-PROYECTO 2022005500032	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-028-2024	9/04/2024	ENVIO PROGRAMACION DE OBRA Y FLUJO DE CAJA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-029-2024	9/04/2024	RESPUESTA AL OFICIO No. 20241200005882 DEL 26/02/2024 Y AL OFICIO No. PL-120-146 DEL 29/02/2024. DISEÑOS DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE LA ESPERANZA, PARA REVISION No. 2	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

REFERENCIA - RADICADO	FECHA OFICIO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
CE-CVO-030-2024	11/04/2024	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DEL CONTRATO 963 DE 2022	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-031-2024	11/04/2024	PROPUESTA IMPLANTACION PARQUEADEROS	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-032-2024	11/04/2024	REITERACIÓN OFICIO CE-CVO-047M-2023 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023 (SOLICITUD DE APROBACION PARA DEMOLICION DEL EDIFICIO DENOMINADO SPA Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN EL PARQUE SIKUANY)	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-033-2024	11/04/2024	REMISION ORDEN DE GIRO N°13	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-034-2024	11/04/2024	REMISION ORDEN DE GIRO N°14	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-035-2024	23/04/2024	RESPUESTA AL OFICIO CNT 212-2024	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-036-2024	18/04/2024	REMISION ORDEN DE GIRO N°15	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-037-2024	18/04/2024	REMISION ORDEN DE GIRO N°16	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-038-2024	18/04/2024	REMISION ORDEN DE GIRO N°17	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-039-2024	19/04/2024	REMISION ORDEN DE GIRO N°18	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
PL-120-236	19/04/2024	AUDIENCIA DE CONTROL SOCIAL DE SEGUIMIENTO (VISITA)	IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-040-2024	23/04/2024	RESPUESTA AL OFICIO CNT 213-2024	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

REFERENCIA - RADICADO	FECHA OFICIO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
CE-CVO-041-2024	23/04/2024	RESPUESTA OFICIO CNT 228-2024	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-042-2024	23/04/2024	REMISION ORDEN DE GIRO N°19	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-043-2024	23/04/2024	REMISION ORDEN DE GIRO N°20	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-045-2024	24/04/2024	REMISION FACTURAS LEGALIZACION ORDEN DE GIRO N°1	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-046-2024	24/04/2024	REMISION FACTURAS LEGALIZACION ORDEN DE GIRO N°7	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-047-2024	24/04/2024	REMISION FACTURAS LEGALIZACION ORDEN DE GIRO N°11	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-048-2024	24/04/2024	REMISION FACTURAS LEGALIZACION ORDEN DE GIRO N°3	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
PL-120-243	24/04/2024	OFICIO No. CNT 235-2024 DEL 16 DE ABRIL DE 2024	IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
PL-120-244	24/04/2024	OFICIO No. CNT 210-2024 DEL 02 DE ABRIL DE 2024	IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
PL-120-245	24/04/2024	OFICIO No. CNT 208-2024 DEL 01 DE ABRIL DE 2024	IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
DG-100-186	26/04/2024	OFICIO No. CNT 235-2024 DEL 16 DE ABRIL DE 2024	IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CE-CVO-050-2024	26/04/2024	REMISION FACTURAS LEGALIZACION ORDEN DE GIRO N°8	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
PL-120-253	30/04/2024	OFICIO No. CNT 247-2024 DEL 26 DE ABRIL DE 2024	IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

REFERENCIA - RADICADO	FECHA OFICIO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
PL-120-255	30/04/2024	OFICIO No. CNT 227-2024 DEL 10 DE ABRIL DE 2024, CNT 229-2024 DEL 11 DE ABRIL DE 2024, CNT 232-2024 DEL 15 DE ABRIL DE 2024, CNT 233-2024 DEL 15 DE ABRIL DE 2024, CNT 234-2024 DEL 16 DE ABRIL DE 2024, CNT 237-2024 DEL 17 DE ABRIL DE 2024, CNT 238-2024 DEL 19 DE ABRIL DE 2024 y CNT 239-2024 DEL 23 DE ABRIL DE 2024.	IDERMETA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

CORRESPONDENCIA ENVIADA

REFERENCIA - RADICADO	FECHA OFICIO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
CNT 203-2024	2/04/2024	RESPUESTA OFICIO PL-120-047. TRAMITE ANTE LA ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P DEL PROYECTO 2022005500032	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 204-2024	26/03/2024	TRAMITES ANTE LA ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P DEL PROYECTO N° 2022005500071	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CNT 205-2024	2/04/2024	RESPUESTA OFICIO PL-120-047. ESTADO DE TRAMITE ANTE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO EAAV ESP DEL PROYECTO N° 2022005500032	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 206-2024	2/04/2024	APROBACION DE POLIZAS ACTUALIZADAS (REINICIO N°1)- CONTRATO DE OBRA N° 963 DE 2022	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 207-2024	2/04/2024	REMISIÓN DE GARANTIAS DEL REINICIO N°1	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 208-2024	2/04/2024	NOTIFICACION DE CAMBIO DE PERSONAL PROYECTO 2022005500071	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA

REFERENCIA - RADICADO	FECHA OFICIO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
CNT 209-2024	2/04/2024	REMISION DE SOLICITUD OFICIO CE-CVO-021-2024	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 210-2024	3/04/2024	PROPUESTA CAMBIO DE PERSONAL CLAVE PROYECTO 2022005500071	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 212-2024	4/04/2024	ACTUALIZACIÓN PMT FRENTE DE TRABAJO LA ESPERANZA Y PARQUE SIKUANY	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CNT 213-2024	4/04/2024	SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO SST – FRENTE DE OBRA SIKUANY	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CNT 214-2024	4/04/2024	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL – FRENTE DE OBRA SIKUANY	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CNT 215-2024	5/04/2024	APROBACIÓN DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS (MODIFICACIÓN NO. 3 ADICIÓN N° 1 PRORROGA N°1) – CONTRATO DE OBRA N° 963 DE 2022.	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 216-2024	5/04/2024	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL DISEÑO DE RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 218-2024	6/04/2024	REVISION ESTRUCTURA VIGA CIMENTACION, FRENTE SIKUANY	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CNT 219-2024	9/04/2024	APROBACIÓN PLAN DE INVERSIÓN PAGO ANTICIPO OBRA ADICIONAL N°1.	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CNT 220-2024	10/04/2024	RESPUESTA PLAN DE CONTINGENCIA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CNT 221-2024	9/04/2024	RESPUESTA AL OFICIO No. 20241200005882. DISEÑOS DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL PROYECTO	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA

REFERENCIA - RADICADO	FECHA OFICIO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
		DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE LA ESPERANZA.		
CNT 222-2024	9/04/2024	RESPUESTA OFICIO PL-120-047. DISEÑO ELECTRICO PROYECTO 2022005500071	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 223-2024	9/04/2024	PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS CONTRATO N° 963 DE 2022.	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 224-2024	11/04/2024	REMISIÓN DE SOLICITUD AMPLIACIÓN N°3 A LA SUSPENSIÓN N°1 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBICA N° 963 DE 2022 – PROYECTO 2022005500032	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 225-2024	11/04/2024	SOLICITUD AMPLIACIÓN N°3 DE LA SUSPENSIÓN N°1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 001 DE 2023.	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 226-2024	10/04/2024	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN GIRO DEL ANTICIPO ADICION N°1 CONTRATO 963 DE 2022	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 227-2024	10/04/2024	INFORME N° 1 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS CONTRATO N° 963 DE 2022.	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 228-2024	10/04/2024	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO SST– FRENTE DE OBRA SIKUANY	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CNT 229-2024	11/04/2024	INFORME N° 2 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS CONTRATO N° 963 DE 2022.	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 230-2024	16/04/2024	ENSAYOS DE CALIDAD DE SOLDADURA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CNT 231-2024	16/04/2024	ACABADO DE ESTRUCTURAS CONCRETO REFORZADO EJE I COLISEOS DE BALONCESTO	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

REFERENCIA - RADICADO	FECHA OFICIO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
CNT 232-2024	15/04/2024	INFORME N° 3 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS CONTRATO N° 963 DE 2022.	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 233-2024	15/04/2024	INFORME N° 4 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS CONTRATO N° 963 DE 2022.	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 234-2024	16/04/2024	INFORME N° 5 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS CONTRATO N° 963 DE 2022.	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 235-2024	16/04/2024	SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO ACERCA DE LA DEMOLICION SPA SIKUANY	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 236-2024	16/04/2024	SOLICITUD DISEÑO RED CONTRA INCENDIOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CNT 237-2024	18/04/2024	INFORME N° 6 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS CONTRATO N° 963 DE 2022.	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 238-2024	19/04/2024	INFORME N° 7 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS CONTRATO N° 963 DE 2022.	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 239-2024	25/04/2024	INFORME N° 8 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS CONTRATO N° 963 DE 2022.	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 240-2024	24/04/2024	SOLICITUD CUMPLIMIENTO LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CNT 241-2024	24/04/2024	APROBACIÓN ORDEN DE GIRO N°13	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

REFERENCIA - RADICADO	FECHA OFICIO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
CNT 242-2024	24/04/2024	APROBACIÓN ORDEN DE GIRO N°14	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CNT 243-2024	24/04/2024	APROBACIÓN ORDEN DE GIRO N°15	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CNT 244-2024	24/04/2024	APROBACIÓN ORDEN DE GIRO N°16	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CNT 245-2024	26/04/2024	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO SST– FRENTE DE OBRA SIKUANY	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CNT 246-2024	26/04/2024	RESPUESTA OFICIO PL-120-245	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 247-2024	26/04/2024	RESPUESTA OFICIO PL-120-244	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 248-2024	27/04/2024	APROBACIÓN ORDEN DE GIRO N°17	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CNT 249-2024	29/04/2024	REMISION OFICIO DG-100-186. APROBACIÓN DEMOLICIÓN DEL SPA SIKUANY	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CNT 250-2024	02/05/2024	GESTIÓN DEL ANTICIPO ORDEN DE GIRO N°1	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	IDERMETA
CNT 251-2024	29/04/2024	SOLICITUD DISEÑO RED CONTRA INCENDIOS	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CNT 252-2024	29/04/2024	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO SST– FRENTE DE OBRA SIKUANY	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CNT 253-2024	30/04/2024	SOLICITUD GARANTIAS AMPLIACION N°3 DE LA SUSPENSION N°1	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

ACTAS DE COMITE

FECHA	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN PARTICIPA
20/03/2024	Comité técnico interventoría y obra	Seguimiento al contrato de obra N° 963 de 2022	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
08/04/2024	Comité técnico interventoría y obra	Seguimiento al contrato de obra N° 963 de 2022	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
09/04/2024	Comité técnico interventoría y obra	Revisión estructural Parque sikuany	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
16/04/2024	Comité técnico interventoría y obra	Seguimiento al contrato de obra N° 963 de 2022	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
30/04/2024	Comité técnico interventoría y obra	Seguimiento al contrato de obra N° 963 de 2022	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

3. GESTIÓN TÉCNICA DE LA INTERVENTORÍA

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
Ingeniero electricista	Durante este periodo el especialista realizó el informe de seguimiento de la ejecución de actividades relacionadas con el traslado de una red eléctrica de media tensión.
Ingeniero especialista hidrosanitario	El especialista hidrosanitario realizo seguimiento al traslado de una red de aguas lluvias y la construcción de cámaras de inspección. La información queda consignada en el informe anexo.
Arquitecto o ingeniero civil especialista (director)	El director coordinó las actividades de índole técnica y administrativa que se desarrollaron en el sitio de obra, también realizo el seguimiento y aporte para la aprobación de las actividades en cada frente. Realizo seguimiento a los informes presentados por los asesores de interventoría. Verificó la ejecución del contrato de acuerdo a los requerimientos contractuales, presento informes, realizó la revisión e interpretación de planos y estudios técnicos, seguimiento de la programación de obra, y generó observaciones y soluciones a los procesos constructivos en tiempo real.

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
Ingeniero civil (residente)	Durante el periodo el profesional llevo a cabo el control de calidad de las actividades ejecutadas, llevó control de cantidades, elaboro informes y actas, organizó comités técnicos, hizo seguimiento de obra y diligenciamiento de bitácora.
Ingeniero especialista en estructuras	El especialista realizó seguimiento a las actividades de obra, reviso los ensayos de laboratorio, realizo acompañamiento a comités técnico, emitió conceptos referentes a las problemáticas identificadas en el periodo de tiempo.
Topógrafo	En este periodo de tiempo se revisaron las actividades de excavaciones realizadas, así como la nivelación y alineamiento de los elementos que se están construyendo. También se realizaron las verificaciones de carteras entregadas por el contratista.
Ingeniero ambiental o ingeniero civil especialista en ambiental	Durante este mes el profesional realizo seguimiento a las fichas del plan de Manejo Ambiental, el plan de manejo Integral de Residuos Sólidos, el PMT, la gestión de los RCD para el proyecto del parque Sikuany. La información queda consignada en el informe anexo.
Ingeniero siso o ing. Especialista en siso	En este periodo de tiempo el especialista hace seguimiento al sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo y al cumplimiento del Art. 2.2.4.6.24-5 del Decreto 1072 de 2015, la verificación de afiliaciones, entrega de elementos de protección personal, inspección de maquinaria, entre otras y como resultado se anexa el informe del especialista.

1. ESTADO DEL TIEMPO Afectación por lluvias

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	MARZO DE 2024																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco																				24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	288
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	288

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Página 1

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	ABRIL																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Seco	24,0	24,0	24,0	20,0	24,0	24,0	24,0	19,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	22,0	19,0	20,0	24,0	24,0	18,0	22,0	22,0	24,0	22,0	24,0	24,0	24,0	24,0	688
Lluvias moderadas				4,0				5,0															2,0	2,0							13
Lluvias intensas																	2,0	5,0	4,0			6,0				2,0					0
Total	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	720

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Página 1

OBSERVACIONES
De acuerdo a la tabla de seguimiento, durante este periodo de tiempo se presentaron afectaciones por lluvias de manera esporádica, las cuales no tuvieron incidencia relevante, pero que igual afectan algunas actividades ya que, se debe tener presente que en obra se debe disponer de la logística tanto en equipos como de personal para mitigar esta afectación para el manejo de bombas y la evacuación de las aguas que afectan el proyecto, debido a esto se puede indicar que esta situación influye en la ejecución de obra, la cual se ajusta a la programación estipulada para este periodo de tiempo.

B. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE OBRA

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DÍAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
SUSPENSIÓN N°1 (12/10/2023)	Dos (02) Meses	N.A.	N.A.
AMPLIACION N°1 SUSPENSIÓN N°1 (11/12/2023)	Dos (02) Meses	N.A.	N.A.
AMPLIACION N°2 SUSPENSIÓN N°1 (9/02/2024)	Dos (02) Meses	N.A.	N.A.
REINICIO 01:	20/03/2024		
PRORROGA N°1 (22/03/2024)	SEIS (06) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N°1	6/02/2025		

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
MODIFICACION N°3	$ 12.741.684.131,00	ACTIVIDADES NUEVAS, NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA SEGÚN DISEÑOS.	N.A.

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
MODIFICACION N°3	$ 12.741.684.131,00	ACTIVIDADES NUEVAS, NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA SEGÚN DISEÑOS.	N.A.
MODIFICACION N°2	N.A.	ACLARACION FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO.	N.A.
MODIFICACION N°1	N.A.	MODIFICA EL CONTENIDO DE LA CLAUSULA 7ma.	N.A.

2. GARANTÍAS: (INTERVENTORIA)

PREVIO AL ACTA DE INICIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101051064
ANEXO N°	0
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	30-40-101018379
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	24 DE MARZO 2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	17/01/2023	17/05/2024	$ 289.408.759,30
CALIDAD DEL SERVICIO	17/01/2023	17/05/2024	$ 289.408.759,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17/01/2023	17/05/2024	$ 868.226.277,90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/01/2023	17/01/2027	$ 144.704.379,65
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	17/01/2023	17/01/2024	$ 464.000.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	17/01/2023	17/01/2024	$ 464.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.	17/01/2023	17/01/2024	$ 464.000.000,00

ACLARACIÓN

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101051064
ANEXO N°	1
OBSERVACIÓN	Ajusta los datos de contacto y ubicación de la entidad contratante.
PÓLIZA RCE DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	30-40-101018379
ANEXO N°	1
OBSERVACIÓN	Corrige el objeto de la póliza y aclara el asegurado / beneficiario de la misma
FECHA DE APROBACIÓN POR EL CONTRATANTE	24 de marzo 2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	17/01/2023	17/05/2024	$ 289.408.759,30
CALIDAD DEL SERVICIO	17/01/2023	17/05/2024	$ 289.408.759,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17/01/2023	17/05/2024	$ 868.226.277,90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/01/2023	17/01/2027	$ 144.704.379,65
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	17/01/2023	17/01/2024	$ 464.000.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	17/01/2023	17/01/2024	$ 464.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.	17/01/2023	17/01/2024	$ 464.000.000,00

ACLARACIÓN

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101051064
ANEXO N°	2
OBSERVACIÓN	Ajusta inicio de vigencia del amparo de calidad del servicio
FECHA DE APROBACIÓN POR EL CONTRATANTE	24 de marzo 2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	17/01/2023	17/05/2024	$ 289.408.759,30
CALIDAD DEL SERVICIO	26/02/2024	17/05/2024	$ 289.408.759,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17/01/2023	17/05/2024	$ 868.226.277,90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/01/2023	17/01/2027	$ 144.704.379,65

ACLARACIÓN

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101051064
ANEXO N°	3
OBSERVACIÓN	Ajusta inicio de vigencia del amparo de calidad del servicio
FECHA DE APROBACIÓN POR EL CONTRATANTE	24 de marzo 2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	17/01/2023	17/05/2024	$ 289.408.759,30
CALIDAD DEL SERVICIO	26/02/2024	26/02/2029	$ 289.408.759,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17/01/2023	17/05/2024	$ 868.226.277,90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/01/2023	17/01/2027	$ 144.704.379,65

ACTA DE INICIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101051064
ANEXO N°	4
PÓLIZA RCE DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	30-40-101018379
ANEXO N°	2

OBSERVACIÓN AMBAS PÓLIZAS	De conformidad con el acta de inicio de fecha 27/02/2023 trasladan las vigencias de los amparos
FECHA DE APROBACIÓN POR EL CONTRATANTE	24 de marzo 2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101051064
ANEXO N°	5
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	30-40-101018379
ANEXO N°	3
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	24 DE MARZO 2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	27/02/2023	27/06/2024	$ 289.408.759,30
CALIDAD DEL SERVICIO	07/04/2024	08/04/2029	$ 289.408.759,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	27/02/2023	27/06/2024	$ 868.226.277,90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/02/2023	27/02/2027	$ 144.704.379,65
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	27/02/2023	27/02/2024	$ 464.000.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	27/02/2023	27/02/2024	$ 464.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	27/02/2023	27/02/2024	$ 464.000.000,00

ACLARACIÓN

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101051064
ANEXO N°	6
OBSERVACIÓN	Aclara vigencia del amparo de calidad del servicio
FECHA DE APROBACIÓN POR EL CONTRATANTE	24 de marzo 2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	27/02/2023	27/06/2024	$ 289.408.759,30
CALIDAD DEL SERVICIO	07/04/2024	08/04/2029	$ 289.408.759,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	27/02/2023	27/06/2024	$ 868.226.277,90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/02/2023	27/02/2027	$ 144.704.379,65

SUSPENSIÓN N°1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101051064
ANEXO N°	7
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	30-40-101018379
ANEXO N°	4
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	21 DE NOVIEMBRE 2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	27/02/2023	27/06/2024	$ 289.408.759,30
CALIDAD DEL SERVICIO	07/04/2024	08/04/2029	$ 289.408.759,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	27/02/2023	27/06/2024	$ 868.226.277,90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/02/2023	27/02/2027	$ 144.704.379,65
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	27/02/2023	27/02/2024	$ 464.000.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	27/02/2023	27/02/2024	$ 464.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	27/02/2023	27/02/2024	$ 464.000.000,00

AMPLIACION N°1 DE LA SUSPENSIÓN N°1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101051064
ANEXO N°	8
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	30-40-101018379
ANEXO N°	5
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	19 DE DICIEMBRE 2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	27/02/2023	27/06/2024	$ 289.408.759,30
CALIDAD DEL SERVICIO	07/04/2024	08/04/2029	$ 289.408.759,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	27/02/2023	27/06/2024	$ 868.226.277,90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/02/2023	27/02/2027	$ 144.704.379,65
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	27/02/2023	27/02/2024	$ 464.000.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	27/02/2023	27/02/2024	$ 464.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	27/02/2023	27/02/2024	$ 464.000.000,00

AMPLIACION N° 2 DE LA SUSPENSIÓN N°1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101051064
ANEXO N°	9
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	30-40-101018379
ANEXO N°	6
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	26 DE FEBRERO DE 2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	27/02/2023	27/06/2024	$ 289.408.759,30
CALIDAD DEL SERVICIO	07/04/2024	08/04/2029	$ 289.408.759,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	27/02/2023	27/06/2024	$ 868.226.277,90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/02/2023	27/02/2027	$ 144.704.379,65
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	27/02/2023	27/02/2024	$ 464.000.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	27/02/2023	27/02/2024	$ 464.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	27/02/2023	27/02/2024	$ 464.000.000,00

ACLARACIÓN

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N°	30-40-101018379
ANEXO N°	7
OBSERVACIÓN	Incremento del valor asegurado de la póliza conforme a SMMLV vigencia 2024.
FECHA DE APROBACIÓN POR EL CONTRATANTE	11 DE MARZO DE 2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	27/02/2023	27/02/2024	$ 520.000.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	27/02/2023	27/02/2024	$ 520.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.	27/02/2023	27/02/2024	$ 520.000.000,00

REINICIO N°1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101051064
ANEXO N°	10
ACLARACIÓN	Se ajustan las vigencias de los amparos: Buen manejo y correcta inversión del anticipo, y pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales

ANEXO N°	11
ACLARACIÓN	Se ajustan la vigencia del amparo Cumplimiento del contrato
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	30-40-101018379
ANEXO N°	8
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	05 DE ABRIL DE 2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	27/02/2023	03/12/2024	$ 289.408.759,30
CALIDAD DEL SERVICIO	07/04/2024	08/04/2029	$ 289.408.759,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	27/02/2023	03/12/2024	$ 868.226.277,90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/02/2023	03/08/2027	$ 144.704.379,65
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	27/02/2023	03/08/2024	$ 520.000.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	27/02/2023	03/08/2024	$ 520.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	27/02/2023	03/08/2024	$ 520.000.000,00

AMPLIACION N°3 DE LA SUSPENSIÓN N°1 PROYECTO 2022005500032

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101051064
ANEXO N°	12
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	30-40-101018379
ANEXO N°	9
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	----
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	27/02/2023	03/12/2024	$ 289.408.759,30
CALIDAD DEL SERVICIO	07/04/2024	08/04/2029	$ 289.408.759,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	27/02/2023	03/12/2024	$ 868.226.277,90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/02/2023	03/08/2027	$ 144.704.379,65
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	27/02/2023	03/08/2024	$ 520.000.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	27/02/2023	03/08/2024	$ 520.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	27/02/2023	03/08/2024	$ 520.000.000,00

MODIFICACION N°2 ADICION N°1 Y PRORROGA N°1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101051064
ANEXO N°	13, 14
ACLARACIÓN	De conformidad con el acta de modificación No. 02 de fecha 12/04/2024 se amplia el plazo de ejecución del contrato en seis (6) meses y quince (15) días, por lo anterior se ajustan las vigencias de los amparos, por otro lado, se adicionan ($744.012.372,54) al valor del proyecto No. 2022005500071, por lo anterior se ajustan los valores asegurados de los amparos.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	30-40-101018379
ANEXO N°	10
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	---
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	27/02/2023	18/06/2025	$ 363.809.996,60
CALIDAD DEL SERVICIO	07/04/2024	08/04/2029	$ 363.809.996,60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	27/02/2023	18/06/2025	$ 868.226.277,90

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/02/2023	17/02/2028	$ 181.904.998,30
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	27/02/2023	18/02/2025	$ 520.000.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	27/02/2023	18/02/2025	$ 520.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	27/02/2023	18/02/2025	$ 520.000.000,00

- **GARANTÍAS: (OBRA)**

POLIZAS PREVIAS A ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	SGPL-71578097-1
ANEXO N°	0, 1 ,2, 3
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	LBCO-71580652-1
ANEXO N°	0, 1, 2
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	24 de febrero de 2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/12/2022	23/04/2024	$ 9.161.292.945,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	23/12/2022	23/04/2024	$ 13.741.939.418,70
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	23/12/2022	23/12/2026	$ 2.290.323.236,45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	23/12/2022	23/12/2028	$ 13.741.939.418,70
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23/12/2022	23/1/2023	$ 2.290.323.236,45

POLIZAS POSTERIORES A ACTA DE INCIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	SGPL-71578097-1
ANEXO N°	4
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	LBCO-71580652-1
ANEXO N°	3
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	15 DE MARZO DE 2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/03/2023	30/06/2024	$ 9.161.292.945,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	01/03/2023	30/06/2024	$ 13.741.939.418,70
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	01/03/2023	1/03/2027	$ 2.290.323.236,45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	29/02/2024	01/03/2029	$ 13.741.939.418,70
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	01/03/2023	29/02/2024	$ 2.290.323.236,45

SUSPENSIÓN N°1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	SGPL-71578097-1
ANEXO N°	5
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	LBCO-71580652-1
ANEXO N°	4
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	21 DE NOVIEMBRE DE 2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/03/2023	30/06/2024	$ 9.161.292.945,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	01/03/2023	30/06/2024	$ 13.741.939.418,70
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	01/03/2023	1/03/2027	$ 2.290.323.236,45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	29/02/2024	01/03/2029	$ 13.741.939.418,70
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	01/03/2023	29/02/2024	$ 2.290.323.236,45

AMPLIACION N°1 DE LA SUSPENSIÓN N°1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	SGPL-71578097-1
ANEXO N°	6
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	LBCO-71580652-1
ANEXO N°	5
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	28 DE FEBRERO DE 2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/03/2023	30/06/2024	$ 9.161.292.945,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	01/03/2023	30/06/2024	$ 13.741.939.418,70
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	01/03/2023	1/03/2027	$ 2.290.323.236,45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	29/02/2024	01/03/2029	$ 13.741.939.418,70
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23/12/2022	29/02/2024	$ 2.290.323.236,45

AMPLIACION N°2 DE LA SUSPENSIÓN N°1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	SGPL-71578097-1
ANEXO N°	7
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	LBCO-71580652-1
ANEXO N°	6
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	28 DE FEBRERO DE 2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/03/2023	30/06/2024	$ 9.161.292.945,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	01/03/2023	30/06/2024	$ 13.741.939.418,70
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	01/03/2023	1/03/2027	$ 2.290.323.236,45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	29/02/2024	01/03/2029	$ 13.741.939.418,70
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23/12/2022	29/02/2024	$ 2.290.323.236,45

REINICIO N°1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	SGPL-71578097-1
ANEXO N°	8
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	LBCO-71580652-1
ANEXO N°	7
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	05 DE ABRIL DE 2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/03/2023	07/12/2024	$ 9.161.292.945,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	01/03/2023	07/12/2024	$ 13.741.939.418,70
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	01/03/2023	07/08/2027	$ 2.290.323.236,45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	07/08/2024	07/08/2029	$ 13.741.939.418,70
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23/12/2022	07/08/2024	$ 2.290.323.236,45

ACTA MODIFICATORIA N°3 ADICION N°1 Y PRORROGA N°1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	SGPL-71578097-1
ANEXO N°	9
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	LBCO-71580652-1
ANEXO N°	8
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	08 DE ABRIL DE 2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/03/2023	06/06/2025	$ 11.709.629.772,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	01/03/2023	06/06/2025	$ 17.564.444.658,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	01/03/2023	06/02/2028	$ 2.927.407.443,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	06/02/2025	06/02/2030	$ 17.564.444.658,00
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23/12/2022	06/02/2025	$ 2.927.407.443,00

C. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

N° ACTA	N° EGRESO	FECHA	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR NETO	PROYECTO
1	06643	29/12/2023	$248.538.737	$74.561.621,10	$173.977.115,90	BPIN 2022005500071
TOTALES			$248.538.737	$74.561.621,10	$173.977.115,90	BPIN 2022005500071

Se giro a manera de anticipo el 30% del valor del contrato equivalente a $ 13´054.842.418,70 el 25 de mayo de 2023.

Se gira a manera de anticipo del adicional el 30% del valor del adicional, correspondiente a $3.822.505.239,30 el 19 de abril del 2024.

ORDENES DE GIRO

Orden No	DESCRIPCIÓN	MONTO	BPIN 2022005500032 ESPERANZA	BPIN 2022005500071 SIKUANY
1	Mano de obra	$ 391.645.040,00	$ 173.761.438,63	$ 217.883.601,37
2	Materiales y subcontratos de obra	$ 347.184.967,00	$ 37.025.857,50	$ 310.159.109,50
3	Transporte	$ 261.096.848,00	$ 115.841.114,00	$ 145.255.734,00
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 36.000.000,00	$ 36.000.000,00	$ 0,00
5	Materiales y subcontratos de obra	$ 1.836.438.564,00	$ 309.958.163,76	$1.526.480.400,24
6	Materiales y subcontratos de obra	$ 373.943.639,00	$ 120.068.382,26	$ 253.875.256,74
7	Materiales y subcontratos de obra	$ 476.911.575,00	$101.491.035,00	$ 375.420.540,00
8	Materiales y subcontratos de obra	$ 4.577.154.181,00	$2.091.885.156,94	$ 2.485.269.024,06
9	Materiales y subcontratos de obra	$ 1.536.858.737,00	$ 917.263.735,00	$ 619.595.002,00
10	Materiales y subcontratos de obra	$ 1.073.981.271,00	$ 183.428.545,11	$ 890.552.725,89
11	Materiales y subcontratos de obra	$ 81.169.900,00	$ 81.169.900,00	$ 0,00

Orden No	DESCRIPCIÓN	MONTO	BPIN 2022005500032 ESPERANZA	BPIN 2022005500071 SIKUANY
12	Materiales y subcontratos de obra	$ 1.669.844.743,00	$1.486.934.861,46	$ 182.909.881,55
13	Materiales y subcontratos de obra	$ 81.593.504,00	$0	$ 81.593.504,00
14	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 18.535.393	$0	$ 18.535.393
15	Materiales y subcontratos de obra	$ 65.402.519,00	$0	$ 65.402.519,00
16	Materiales y subcontratos de obra	$ 1.295.566.119,00	$0	$ 1.295.566.119,00
17	Materiales y subcontratos de obra	$ 350.985.646,00	$0	$ 350.985.646,00
18	Mano de obra	$ 315.086.346,74	$0	$ 315.086.346,74
19	Materiales y subcontratos de obra	$ 679.981.949,00	$0,00	$ 679.981.949,00
20	Transporte	$ 225.999.849,00	$0,00	$ 225.999.849,00

3. DESARROLLO TECNICO

En este informe se presentan las actividades de obra ejecutadas y que hacen parte de los ítems contractuales que será objeto de pago, estas actividades fueron sujeto de seguimiento financiero, técnico, control de calidad y fueron cuantificadas para ser presentadas a la entidad.

ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.

PRELIMINARES

NP1,2	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI.	ML

Se realiza esta actividad en el límite entre las canchas de tenis existentes y la nueva cancha de tenis cubierta que se construye, este se realiza para evitar el ingreso de personal ajeno a la obra.

NP1,4	DISPOCISION FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN SITIO AUTORIZADO.	M3

Se refiere a todo el material resultante únicamente de los procesos de excavación (cajeos, zapatas, vigas etc.) el cual fue transportado hasta el ZODME Guatiquia, para de esta manera dar el tratamiento ambiental y sanitario idóneo y cumpliendo con la normativa, a este tipo de sobrantes.

NP1,5	TRANSPORTE DISPOCISION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	M3

Esta actividad se llevo a cabo para los resultantes de las actividades de demoliciones y excavaciones, fue utilizado volquetas de 7 M3, las cuales transportaban dicho material desde el parque Sikuany hasta el sitio denominado ZODME GUATIQUIA.

DESMONTE Y DEMOLICIONES

2,1	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3


Esta actividad contemplo las placas en concreto de las bahías y andenes en concreto, sobre todo en la zona donde se construyen las canchas de tenis, la cual es la que tiene más áreas de urbanismo que se vieron afectadas con la construcción del nuevo proyecto.

2,2	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2

Esta actividad se refiere al desmonte que se realizó a las estructuras metálicas de soporte de las cubiertas de los juegos y de la cafetería que se localizaba en la zona de construcción de la cancha de Basketball.

2,3	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2


Esta actividad se refiere al desmonte que se ejecutó a las cubiertas de la cafetería (caidizo lateral en L) que se encontraba en la zona donde se construye la cancha de Basketball y de donde se construye la cancha de tenis.

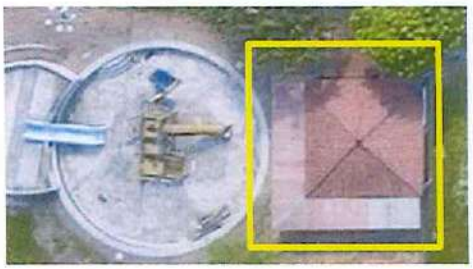




2,4	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	M3

Esta actividad se refiere a la demolición que se realizó a la placa de las canchas de futbol 5 y de microfutbol, existente cerca al actual parqueadero, su demolición se debió a que interferían en la construcción del parqueadero y la cancha de tenis, en esta parcial se incluyen un porcentaje de una de las canchas y dos multipropósitos.

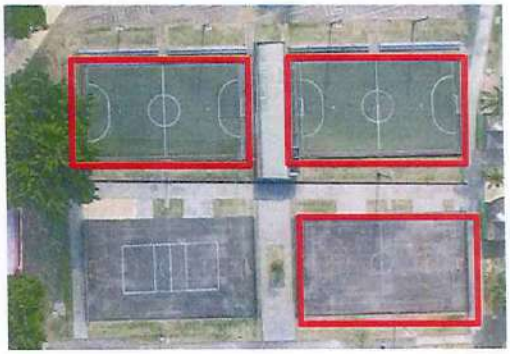


NP2,5	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2

actividad se refiere al desmonte de las mallas atajabalones de las canchas con superficie en asfalto y unas de seguridad en las canchas sintéticas para proteger la cafetería de las sintéticas.

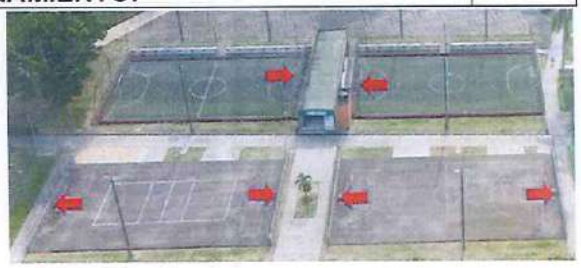

NP2,6	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND

Esta actividad se desarrolló en las edificaciones tales como cafetería de la zona de las piscinas existentes y de las canchas sintéticas, cuarto eléctrico en parqueadero existente y unidad sanitaria intervenida en la zona donde se construye la cancha de tenis cubierta, se retiraron estos elementos y fueron entregado al idermeta.

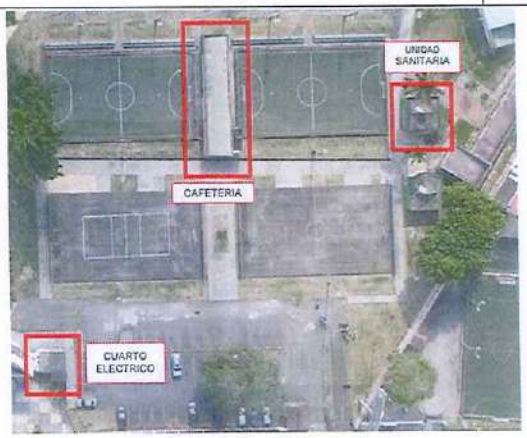

NP2,7	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND

Esta actividad se desarrolló en las cafeterías de la zona de las piscinas existentes y de las canchas sintéticas, ya que dichas edificaciones se vieron afectadas con la construcción de las canchas de basket y tenis, se retiraron todas las ventanas de cada edificación y fueron entregados al Idermeta.





NP2,8	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2

Esta actividad se desarrolló en la cafetería de la zona de las piscinas existentes, ya que esta se veía afectadas con la construcción de las canchas de basket, se desmonto este cielo raso y se retiró al Zodme, ya que este se identifico como material de escombro.



NP2,9	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2

Esta actividad se desarrolló en la cafetería de la zona de las canchas existentes, una vez intervenida dicha edificación se evidencio la existencia de este material el cual se desmonto y se retiró al Zodme, ya que este se identificó como material de escombro.



NP2,10	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UND

Esta actividad se desarrolló en las cafeterías de la zona de las canchas y piscinas existentes, y la unidad sanitaria intervenida, al momento de intervenir estas edificaciones se evidencio la existencia de dichos aparatos sanitarios, los cuales fueron retirados, inventariados y entregados al Idermeta.





NP2,11	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UND


Esta actividad se desarrolló en las cafeterías de la zona de las canchas y piscinas existentes, y la unidad sanitaria intervenida, al momento de intervenir estas edificaciones se evidencio la existencia de dichos aparatos sanitarios, los cuales fueron retirados, inventariados y entregados al Idermeta.





NP2,13	DESMONTE DE POSTE EN CONCRETO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND

Esta actividad se desarrolló en la zona donde funcionaban las canchas sintéticas y multifuncionales. Se retiraron esto elementos debido a que interferían con la construcción de las canchas de tenis, se retiraron y entregaron al Idermeta.

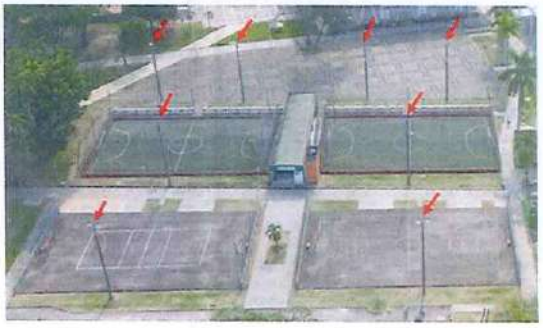

NP2,14	DESMONTE DE MASTIL METALICO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS.	UND

Esta actividad se desarrolló en la zona donde funcionaban las canchas sintéticas y multifuncionales y un poste en la zona de las antiguas piscinas. Se retiraron estos elementos debido a que interferían con la construcción de las canchas de tenis, se retiraron y entregaron al Idermeta.





NP2,15	DESMONTE DE LUMINARIA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND

Esta actividad se desarrolló en la zona donde funcionaban las canchas sintéticas y multifuncionales y un poste en la zona de las antiguas piscinas. Corresponden a la misma cantidad de los mástiles metálicos. Se retiraron estos elementos debido a que interferían con la construcción de las canchas de tenis, se retiraron y entregaron al Idermeta.





NP2,16	DESMONTE DE ARCOS CANCHAS DE FUTBOL, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND

Esta actividad se desarrolló en la zona donde funcionaban las canchas sintéticas y multifuncionales, consistió en el desmonte de los arcos de futbol de estos espacios. Se retiraron estos elementos debido a que interferían con la construcción de las canchas de tenis, se retiraron y entregaron al Idermeta.



NP2,17	DEMOLICION MECANICA CONCRETO REFORZADO EN ALTURAS, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

Esta actividad se desarrolló en una estructura que funcionaba como escaleras para el uso de un tobogán existente, esto en la zona de piscinas, su demolición se realizó de manera mecánica, una vez culminada se realizó el retiro al zodme.



NP2,18	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

Esta actividad se desarrolló sobre todo en el área donde se construirán las canchas de tenis, allí se encontraron elementos enterrados de gran magnitud, tales como ciclópeos, cajas de inspección en concreto y pozos de inspección, los cuales debido a esta condición requerían de una mayor experticia al momento de intervenirlo.

NP2,19	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO PISCINA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3

Esta actividad se desarrolló ya que las piscinas y sus respectivos cuartos de máquinas, intervenían en la construcción de las canchas de basket, consistió en la demolición de estas estructuras cuyas secciones de los muros y pisos de concreto reforzado, se encontraba entre 12 y 30 cms de espesor y en algunos casos con una doble parrilla.

Una vez demolida la totalidad de los elementos identificados, el material sobrante o producto de esta actividad se dispuso en el zodme.

NP2,20	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2

Esta actividad se desarrolló en la zona de piscinas y correspondió a la cafetería que funcionaba allí, la cual estaba construida en este tipo de material.

NP2,21	DEMOLICION ANDEN EN ADOQUIN CON MORTERO DE PEGA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE.	M3

Esta actividad se desarrolló en la zona de donde se construirán las canchas de tenis, y era un área de piso el cual tenía un adoquín "ecológico" el cual estaba instalado sobre un mortero para garantizar su estabilidad, motivo por el cual requirió de una intervención distinta a las otras demoliciones.



NP2,22	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3

Esta actividad se desarrolló en la zona donde se construirá basket y tenis, se refiere a todas las estructuras tales como columnas y vigas, las cuales conformaban las edificaciones, también se intervinieron las gradas de las canchas de futbol las cuales son estructuras de concreto reforzado.

NP2,23	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2

Esta actividad se desarrolló en la zona donde se construirá la cancha de tenis, se refiere a todos los muros de la cafetería existente que funcionaba en la zona de las antiguas canchas sintéticas.


CANCHA DE BASKETBALL


EXCAVACIONES Y RELLENOS

3,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3

vale la pena señalar que esta actividad cuenta con un reajuste, el cual se realiza ya que se toma la profundidad realizada con la maquina la cual es de 20 cms menos de lo contemplado en dicha memoria, y esta diferencia se incluye en la excavación manual, ya que fue de esta manera que se realizó dicha excavación.


Esta actividad se refiere a las excavaciones realizadas para la construcción de las zapatas según diseño y como se muestra en las imágenes anexas, esta actividad se realizo con retroexcavadora y de acuerdo a los niveles entregados por la topografía y los cuales se describen en la memoria. Vale la pena señalar que se realizaron dos tipos de excavaciones, unas se realizaron para las zapatas grandes, luego se realizaron excavaciones incluyendo las zapatas pequeñas, debido a su cercanía.

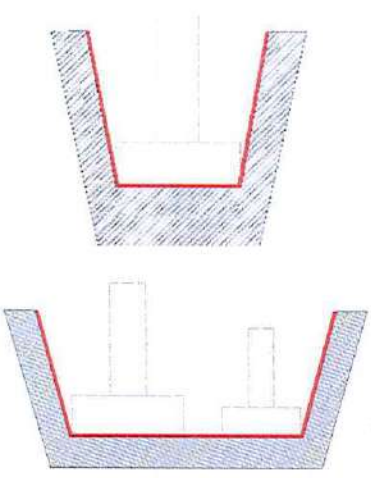


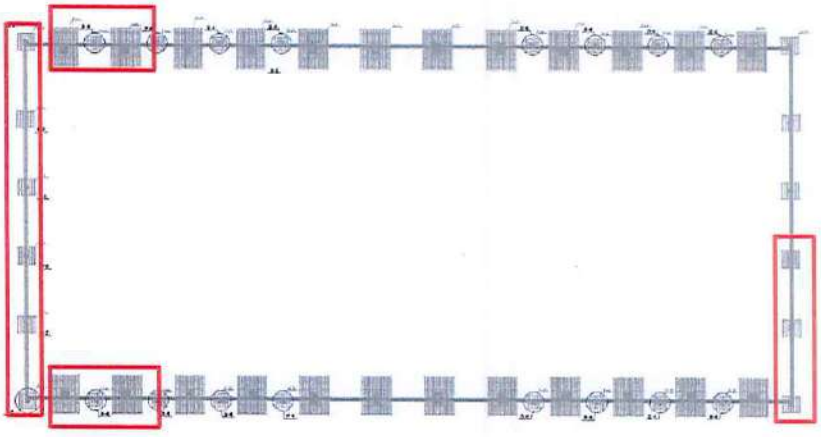

3,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3


Esta actividad se realiza para perfilar las excavaciones realizadas con la retroexcavadora para la aplicación del relleno con material de rio previo a la construcción de solados y zapatas, ya que de esta manera se logra la sección real de dicho relleno, pues tal detalle no se consigue con la máquina; las secciones se describen en la memoria, pero tienen una profundidad de 20 cms.

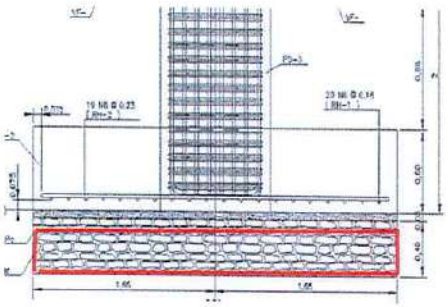


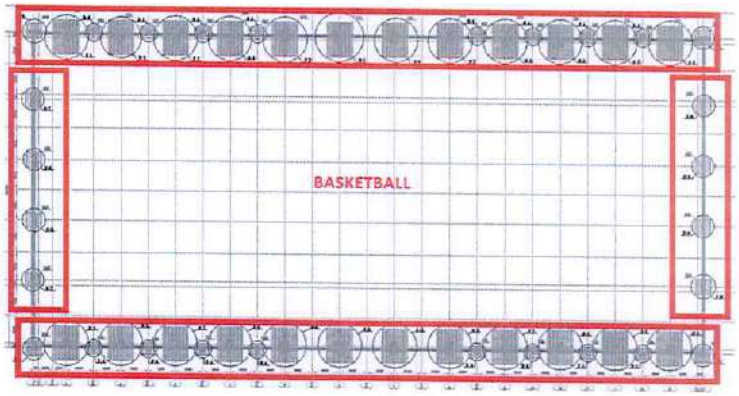

3,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3

Esta actividad se refiere al relleno instalado como mejoramiento del suelo portantes para las zapatas, este tiene una sección de 40 cms para zapatas grandes y de 30 cms para las zapatas pequeñas, para este relleno compactado en capas de 20 cms, se le requirió al constructor que se tomaran densidades y que el resultado de estas fueron como mínimo el 90% del Proctor modificado, tambien se refiere al relleno aplicado a las estructuras de concreto una vez construidas, para de esta manera logra la cota rasante.

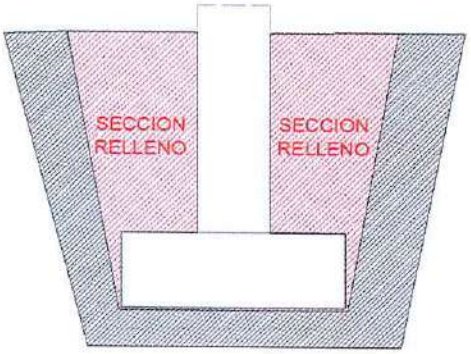


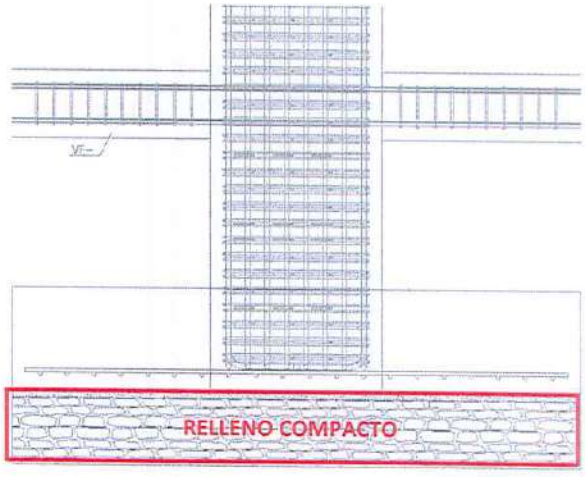

CIMENTACIÓN

4,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3

Esta actividad se refiere a la construcción in situ de los solados faltantes para las zapatas presentadas en la imagen; este elemento se construye con la finalidad de tener una superficie limpia y homogénea para disponer de las canastas y parrillas de las estructuras en concreto reforzado a construir.

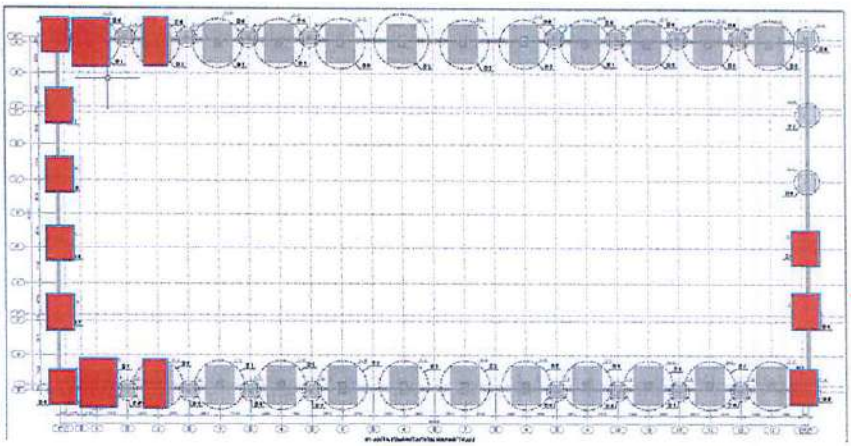

4.6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	Kg

Esta actividad se realizó para la elaboración de las canastas tanto de zapata como de columnas y vigas de este escenario, se esta cobrando la totalidad de los elementos diseñados.

N.P. 4.8	PEDESTALES EN CONCRETO 24,1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.	M3

Esta actividad se realizó para la elaboración de los distintos tipos de pedestales que conforman el sistema de soporte de la estructura metálica del escenario, se construyeron pedestales con las siguientes secciones; 1.0x1.20, 1.0x1.55, 0.55x0.60 y 0.40x0.60, todos con concreto premezclado, se esta cobrando la totalidad de los elementos diseñados, vale resaltar que estos elementos cuentan con ensayos de laboratorio.

N.P. 4.9	ZAPATA EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.	M3

Esta actividad se realizó para la elaboración de los distintos tipos de zapatas que conforman el sistema estructural del escenario, se construyeron zapatas con las siguientes secciones; 3.30x4.50, 1.60x1.60, 2.0x2.0, todos con concreto premezclado y con las secciones según diseño, en total se construyeron 52 zapatas; vale resaltar que estos elementos cuentan con ensayos de laboratorio.

N.P. 4.10	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.	M3

Esta actividad se realizó para la construcción de las vigas de cimentación localizada sobre los cuatro ejes del proyecto, dicho elemento cuenta con una sección de 0.40 x0.40 ms, estas vigas se construyeron con concreto premezclado y se les realizo ensayos de laboratorio.

N.P. 6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA.	Kg

Esta actividad como se muestra en la memoria, contempla el suministro de los pernos y tuercas, las cuales están embebidas en los pedestales de concreto, sin importar las secciones.






CUBIERTA DE TENNIS


EXCAVACIONES Y RELLENOS

14,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3

vale la pena señalar que esta actividad cuenta con un reajuste, el cual se realiza ya que se toma la profundidad realizada con la maquina la cual es de 20 cms menos de lo contemplado en dicha memoria, y esta diferencia se incluye en la excavación manual, ya que fue de esta manera que se realizó dicha excavación.


Esta actividad se refiere a las excavaciones realizadas para la construcción de las zapatas según diseño y como se muestra en las imágenes anexas, esta actividad se realizó con retroexcavadora y de acuerdo a los niveles entregados por la topografía y los cuales se describen en la memoria. Vale la pena señalar que en los ejes perimetrales existe un tipo de zapata diferente a las ubicadas en el eje central.

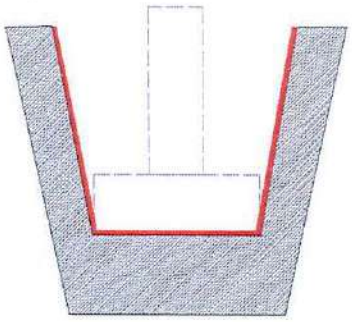

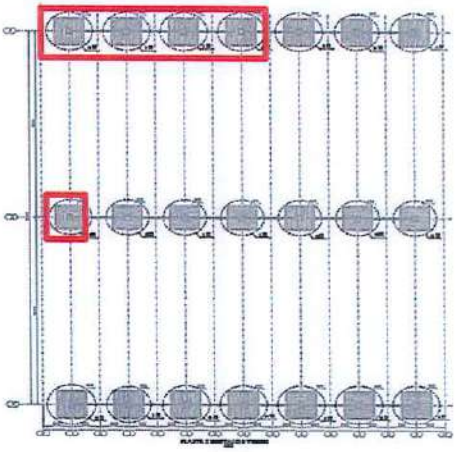


14,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3


Esta actividad se realiza para perfilar las excavaciones realizadas con la retroexcavadora para la aplicación del relleno con material de rio previo a la construcción de solados y zapatas, ya que de esta manera se logra la sección real de dicho relleno, pues tal detalle no se consigue con la máquina; las secciones se describen en la memoria, pero tienen una profundidad de 20 cms.

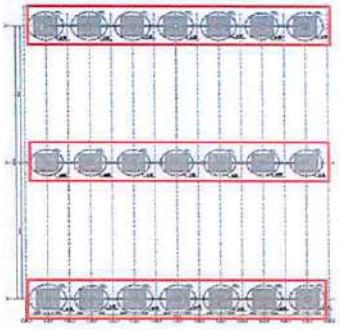

14,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3

Esta actividad se refiere al relleno aplicado una vez construidas las estructuras de cimentación como zapatas y pedestales, este es un relleno para nivelar el terreno a cota rasante para la construcción de las vigas.

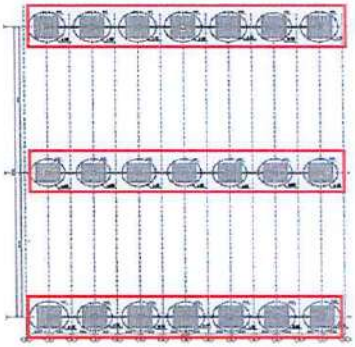


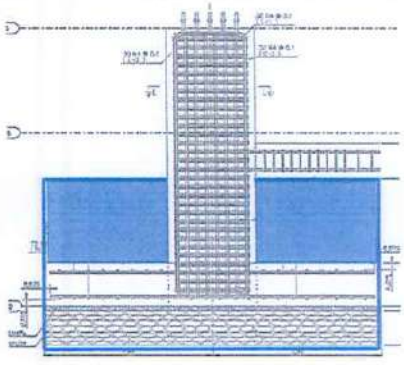


CIMENTACIÓN

15,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3


Esta actividad se refiere a la construcción in situ de los solados para las zapatas del eje C y una del eje B y vigas de cimentación de los tres ejes, este elemento tiene un espesor de 5 cm esto con la finalidad de tener una superficie limpia y homogénea para disponer de las canastas y parrillas de las estructuras en concreto reforzado a construir.

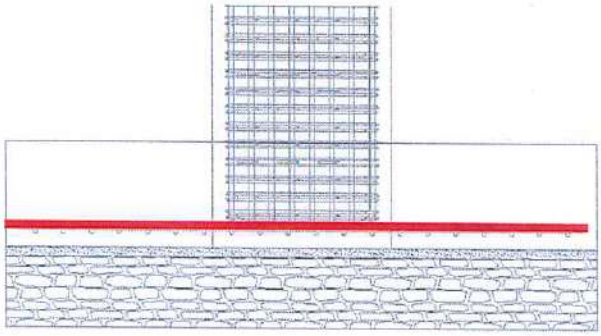


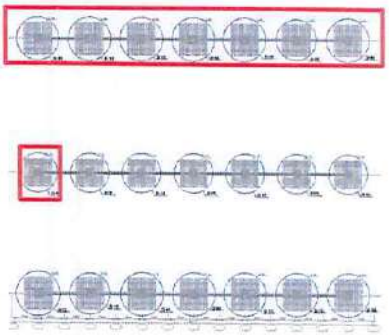


15.6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	Kg

Esta actividad se realizó para la elaboración de las canastas tanto de zapata como de columnas y vigas de este escenario de acuerdo a las secciones diseñadas, se está cobrando la totalidad de los elementos diseñados.

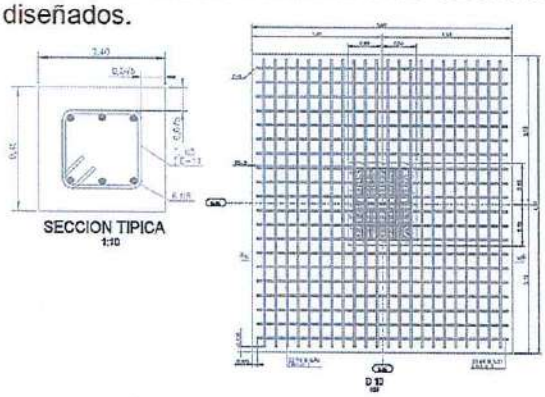


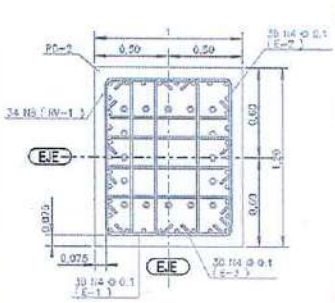


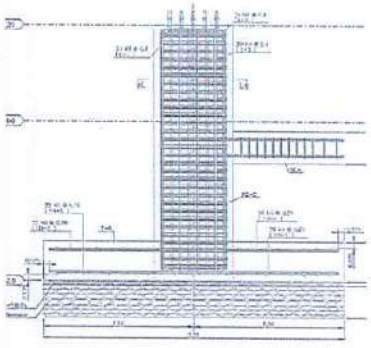


N.P 15.8	PEDESTALES EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

Esta actividad se realizó para la construcción de la totalidad de los pedestales diseñados los cuales suman 21 und, estos tienen una sección homogénea de 1.0 x 1.20. Se construyeron con concreto premezclado, vale resaltar que a estos elementos se les realizaron ensayos para garantizar la resistencia de diseño.

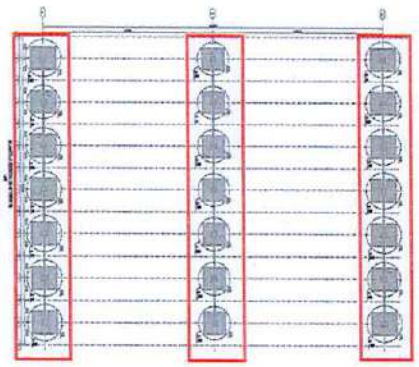


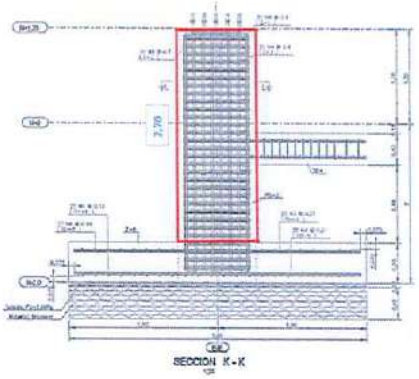


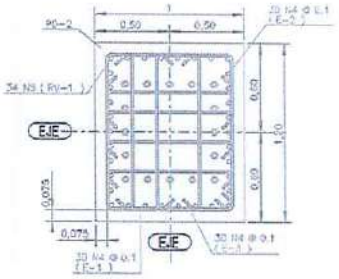

N.P 15.9	ZAPATA EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3


Esta actividad se realizó para la construcción de la totalidad de las zapatas diseñadas y localizadas en los 3 ejes del escenario, estas tienen dos tipos de sección de 3.70 x 3.70 y 3.8 x 4.30 y suman 21 und, se construyeron con concreto premezclado, vale resaltar que a estos elementos se les realizaron ensayos para garantizar la resistencia de diseño.

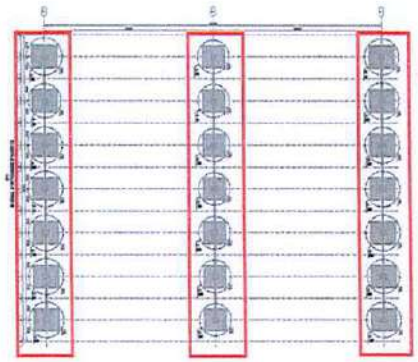

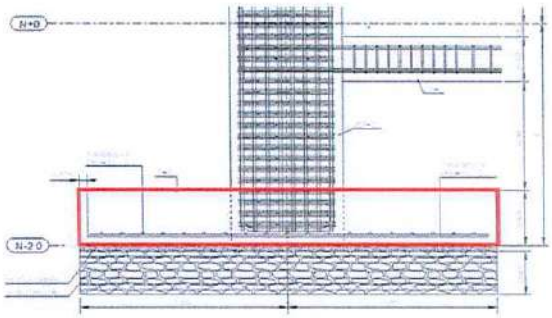


N.P 15.10	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

Esta actividad se realizó para la construcción de la totalidad de las vigas diseñadas y localizadas en los 3 ejes del escenario, estas tienen una sección de 0.40x0.40 ms, se construyeron con concreto premezclado, vale resaltar que a estos elementos se les realizaron ensayos para garantizar la resistencia de diseño.

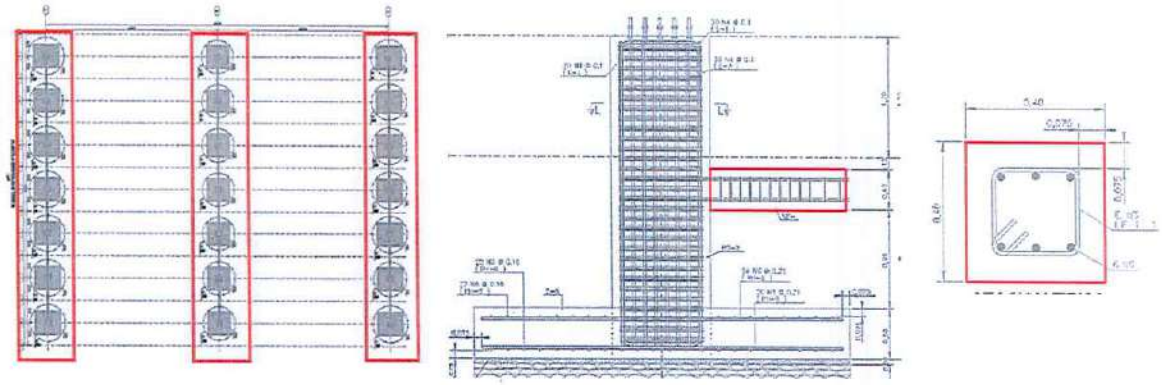


N.P 17.23	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA.	Kg

Esta actividad se refiere a la fabricación, ensamble e izaje de la estructura metálica de soporte de la cubierta, aquí se incluyen pernos, columnas, vigas, viguetas, cerchas, correas, riostras, tornapunta, templero, dicha estructura ya está instalada en su totalidad y se han tomado ensayos de ultrasonido para verificación de las soldaduras tanto realizadas en taller como en campo.

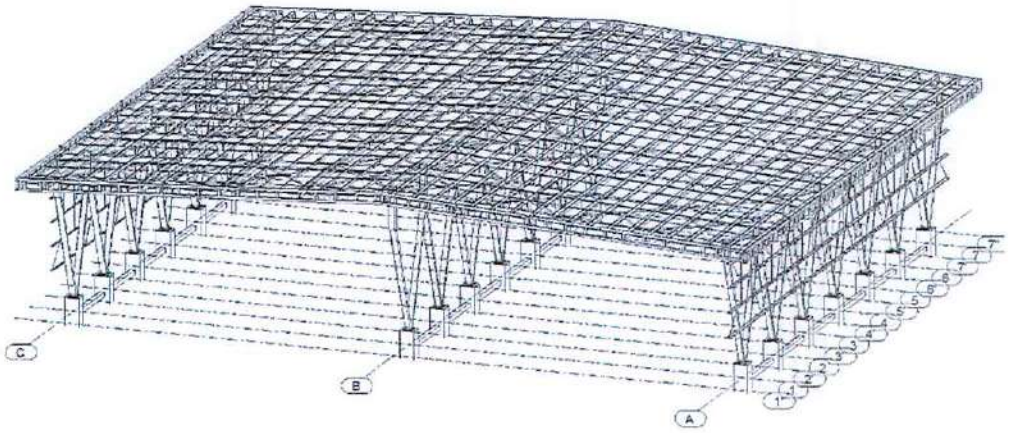


N.P 19.10	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE.	M3


Esta actividad se refiere a la intervención de las canchas de tenis, mediante el cajeo con retroexcavadora, de estos espacios para conformar de esta manera la estructura de soporte en material granular para estas canchas, las secciones de esta actividad se encuentran en la memoria de cálculo.

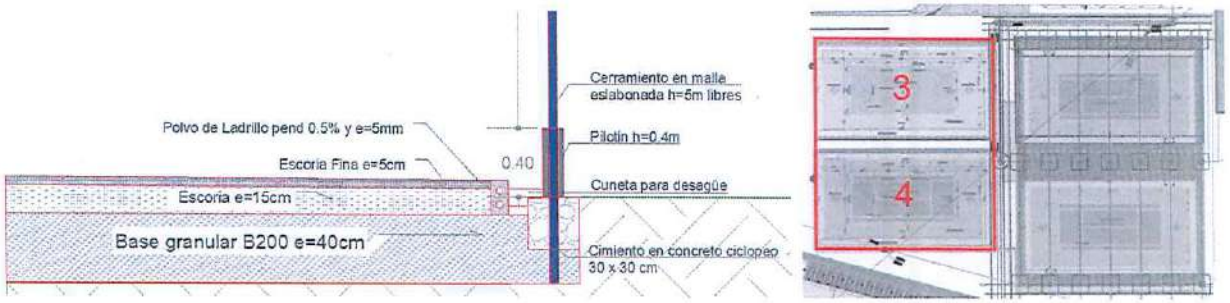

N.P 20.10	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE.	M3


Esta actividad se refiere a la intervención realizada para las canchas de futbol sintéticas, mediante el cajeo con retroexcavadora, de estos espacios para conformar de esta manera la estructura de soporte en material granular y acabado final para estas canchas, las secciones de esta actividad se encuentran en la memoria de cálculo.

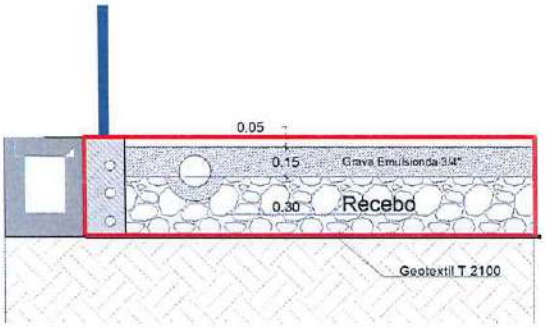

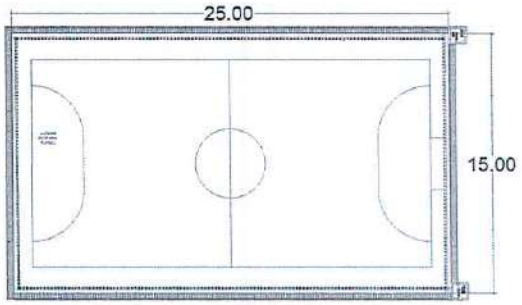


N.P 26.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.	ML


Esta actividad se ejecutó para la construcción del nuevo trazado de la red pluvial en el sector de las canchas de tenis, ya que la red existente se afectaba por la cimentación de la cubierta de las canchas de tenis a construir.

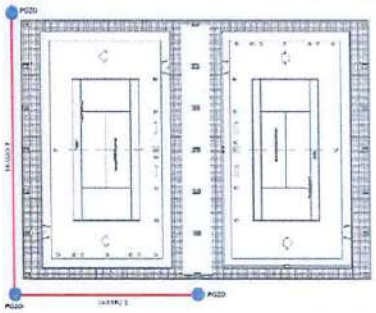

N.P 26.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3


Esta actividad se ejecutó para la construcción del nuevo trazado de la red pluvial en el sector de las canchas de tenis, es la arena que se coloca previo y después de instalada la tubería de 36".

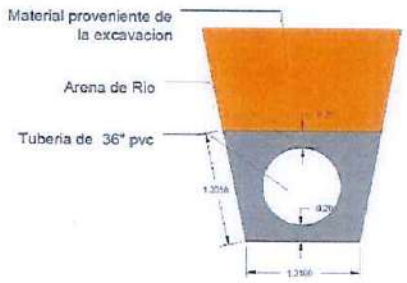


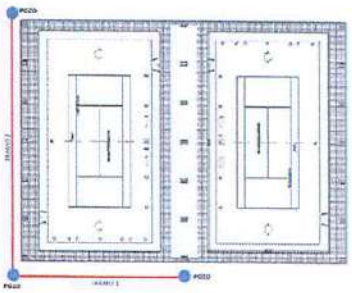

N.P 26.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3


Esta actividad se ejecutó para la construcción del nuevo trazado de la red pluvial en el sector de las canchas de tenis, fue el relleno aplicado una vez instalada la tubería de 36" y la camada de arena según sección de diseño, este material se aplicó en capas de 30 cms y se compactaba mecánicamente.

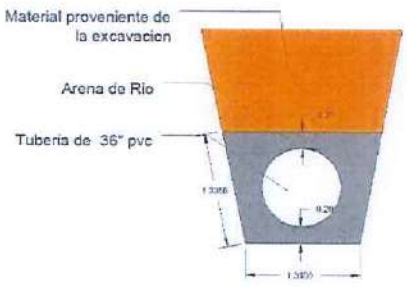


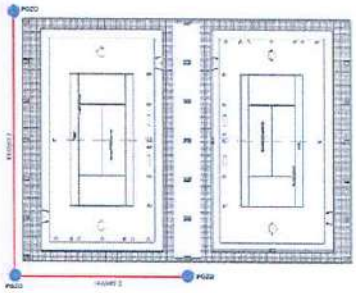

N.P 26.18	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.	ML


Esta actividad se ejecutó para la construcción del nuevo trazado de la red pluvial en el sector de las canchas de tenis, el cual contemplo tres pozos con las secciones indicadas en el diseño, se construyó en concreto premezclado y en tres etapas.

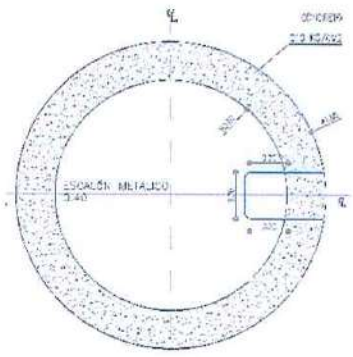


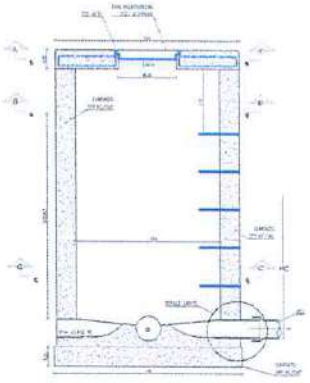

N.P 26.19	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=2.10 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS.	UND


Esta actividad se ejecutó para los 3 pozos construidos, ya que es el primer elemento que se funde para luego iniciar con la construcción de los distintos aros de pozos.



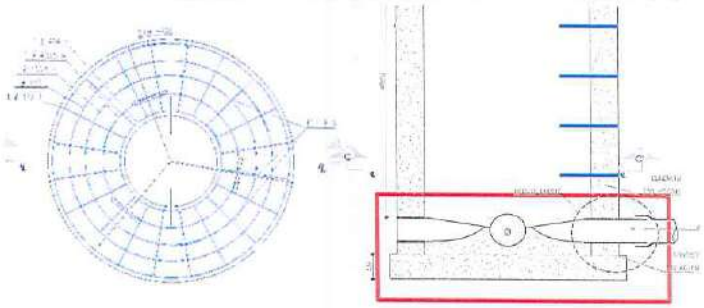


N.P 26.20	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.20 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	UND

Esta actividad se ejecutó para los 3 pozos construidos, este es el último elemento que se instala sobre el pozo y se construye de manera independiente para instalar una vez terminado el cilindro (pozo), lleva una tapa metálica para garantizar la inspección. Se construye de acuerdo a las especificaciones del ítem.

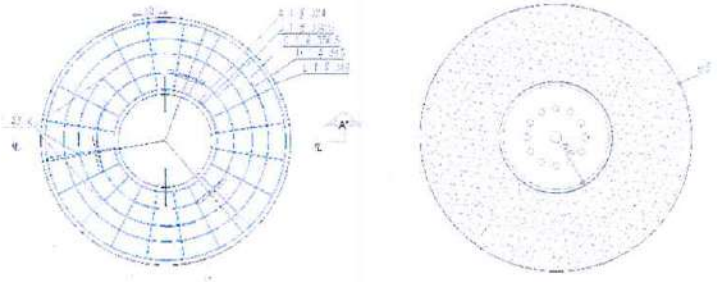

N.P 26.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 900MM Ø36" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE.	ML

Esta actividad se ejecutó como parte del nuevo trazado de la red Pluvial del sector de tenis y se instala entre los tres pozos de inspección.

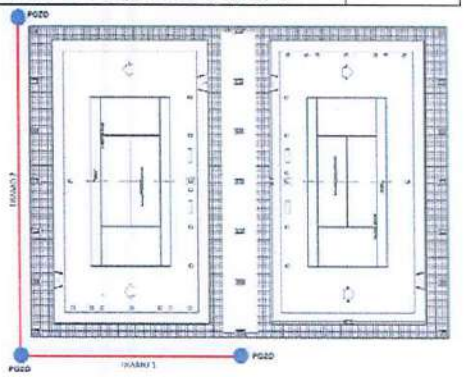

D. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

COMENTARIO

- El presente informe presenta las cantidades de obra ejecutadas y que se encuentran contempladas dentro de las actividades contractuales vigentes a la fecha.

- Las cantidades de excavaciones y rellenos se tomaron conforme a las carteras topográficas entregadas por el constructor y validadas por la topografía de la interventoría, estas se basan en las mediciones realizadas por las cuadrillas de topografía tanto de obra como de interventoría. En los documentos anexos en la presente acta parcial se agregan las respectivas memorias y planos topográficos avalados y firmados por esta interventoría.

- Vale la pena señalar que a la estructura metálica del escenario de tenis se le realizaron ensayos de ultra sonido a las soldaduras realizadas en taller y también se realizó el mismo ensayo a las soldaduras realizadas en el sitio de obra, para de esta manera garantizar la calidad de dichos elementos y así garantizar la estabilidad de dicha estructura.

RECOMENDACIÓN

- De acuerdo a lo planteado en este informe se solicita a la entidad revisar y gestionar el respectivo trámite de legalización de la presente acta de pago parcial N°2 como parte del cumplimiento de la cláusula 7, Forma de Pago.

CONCLUSION

De acuerdo a lo anterior, la presente acta da como resultado un valor de $ 10.228.807.695,00 en el frente de obra del parque Sikuany, lo que equivale a un 26.76% respecto del valor de este proyecto y lo que equivale al 17.47%, respecto el valor total del contrato.

E. ANEXOS

- Copia del registro presupuestal
- Copia del RUT
- Factura
- Certificado de cuenta bancaria
- Certificado del contador acreditando el cumplimiento de seguridad social y parafiscales
- Acta de pago parcial Parque Sikuany
- Informe de acta parcia N°1 Obra
- Memorias de cantidades y registro fotográfico

ING. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
Representante Legal
Consorcio Interdeportivo.
M. P CND 25202-369626 CND

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

PARQUE SIKUANY (ESCENARIO TENIS)

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
NP1.2	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	EJECUTADO	%
		289.10 ML	100 %





OBSERVACIONES: se muestran el cerramiento construido para separar los escenarios que funcionan actualmente de las obras que se desarrollan dentro del presente contrato.

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.4	DISPOCISION FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN SITIO AUTORIZADO.	EJECUTADO	%
		4.012,87M3	33.39 %









OBSERVACIONES: se muestran el espacio autorizado (ZODME) donde se está disponiendo el material proveniente de excavación y otros sobrantes.

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	EJECUTADO	%
		837.40 VJ	49.26 %
1.5	  		
	OBSERVACIONES: se muestran las volquetas cargadas con material el cual será llevado al Zodme para su disposición idónea.		

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.1	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	EJECUTADO	%
		281.83 M3	56.89 %







OBSERVACIONES: se muestran el trabajo realizado con la maquinaria, se demolieron todas las placas y andenes del proyecto que deberían ser intervenidos.

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	EJECUTADO	%
		217.53 M2	22.61 %
2.2	 		
	OBSERVACIONES: se muestran la estructura existente y desmontada de las edificaciones existentes, cafeterías.		

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.3	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	EJECUTADO	%
		207.15 M2	62.88 %





OBSERVACIONES: se muestran las cubiertas que se desmontaron, las cuales pertenecían a edificaciones existentes, unidad sanitaria parte inferior y parte de la cafetería sector piscinas.

ÍTEM	ACTIVIDAD
2.3	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO



