Resumen Actividades de Obra y Verificacón SST

DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

OBRA:	PARQUES VECINALES	**FECHA:**		CONTRATO DE OBRA No:	111259-001-2023 (PAF-ATSDA-O-021-2023)
UBICACIÓN:	TUNJUELITO	**DESDE**	14/03/2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	
RESPONSABLE:	ADRIANA AREVALO	**HASTA**	13/04/2024		

1.) DEL TIEMPO

SOLEADO [X] LLUVIOSO [X] NUBLADO [ ]

2.) DE LA MANO DE OBRA (Cantidad)

Personal en Obra : 9


3.) JORNADA LABORAL


NORMAL [X] EXTRA [ ]

4.) ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS durante el periodo

PARQUE EL CLARET	PARQUE LAGUNETA
Soldadura de rejas	Levante de Adoquin de Concreto
Pulido de Rejas de contención	Excavaciones ducteria electrica y cajas
Lijado de Rejas de contención	
Pintura de Rejas de contención	

5.) GESTIÓN SST REQUERIDA





6.) SOLICITACIONES DE VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN AL INSPECTOR O EL SUPERVISOR

Trabajos en caliente, Excavaciones. Aplicación de Asfalto.

7.) % APROXIMADO DE AVANCE POR FRENTE

Nro	FRENTE	%	
1	PARQUE EL CLARET		
2	PARQUE SAN BENITO		
3	PARQUE LAGUNETA		
	PROGRAMADO: 57,20%		ATRASO
	EJECUTADO: 38,57 %		18,63

8.) EQUIPO Y MAQUINARIA

Cant.	Descripción	H.V.	Preoperacion	cant.	Fecha Insp.
1	VOLQUETA SRN473	X	X	1	8/04/2024
2	FINISHER	X	X	1	8/04/2024
3	VIBROCOMP.	X	X	1	8/04/2024
4	PULIDORA	X	X	1	13/03 AL 10/04/2024
5	MINICARGADOR	X	X	1	8/04/2024

9.) INGRESO DE MATERIAL DURANTE EL PERIODO

Perfileria Metalica
Malla
Asfalto
Emulsión Asfaltica

10.) FOTOGRAFÍAS AVANCE DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES PARQUE EL CLARET

RIEGO DE EMULSION ASFALTICA EN CANCHA DE BASKET



EXTENDIDO Y NIVELACIÓN CARPETA ASFALTICA





INSTALACION CARPETA ASFALTICA



SEÑALIZACION DE EMERGENCIA





SEÑALIZACION DE EMERGENCIA





SOSTENIMIENTO CERRAMIENTOS




ACTIVIDADES PARQUE LAGUNETA

RELLENO COMPACT.MEÁLICA MATERIAL IN SITU



AJUSTE DE PROFUNDIDAD CANALIZACION ELECTRICA

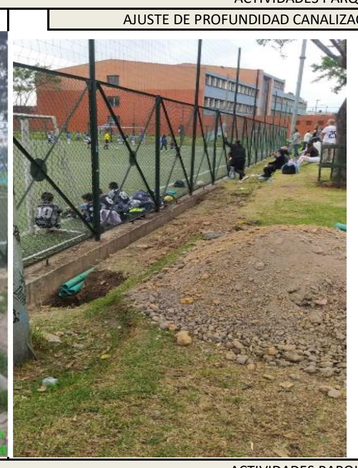



AJUSTES DE ADOQUIN Y EXCAVACIONES



ACTIVIDADES PARQUE SAN BENITO

RIEGO DE EMULSION ASFALTICA



ADOQUIN / MURO






MURO



PUNTO DE ENCUENTRO Y ACOPIO TEMP.



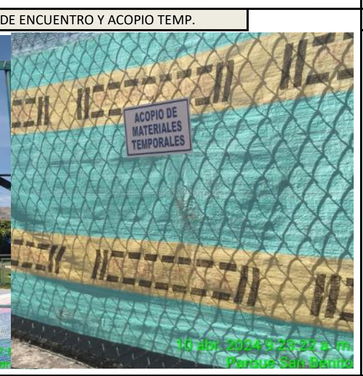

CERRAMIENTO Y SEÑAL DE RUTA DE EVACUACION



PROHIBIDO EL PASSO



11.) MANO DE OBRA

Mano de Obra Administrativa	
Rep. Legal	1
Director de Obra	1
Residente ingeniero Técnico	1
Profesional Social	1
Profesional SST	1
Profesional AMBIENTAL	1
Total	**6**
Especialistas	
Electrico	1
Pavimento	1
Mano de Obra Operativa	
Auxiliares Construcción	4
Oficiales Construcción	4
contratiastas pavimento	8
Total	**18**
TOTALES	24



PROFESIONAL	PORCETAJE DE DEDICACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS
Director de obra	30%	• Asistencia a comites de obra • Seguimiento a PGIO
Residente de obra	100%	• Coordinacion de activiades de cada componente • Asistencia a comites de obra • Solicitudes escritas a intreventoria
		• Coordinar actividades de obra • Ajuste de presupeustos
Especilista en pavimentos	10%	• Coordinar toma de muestras de pavimentos de canchas • Diseño de pavimentos de acuerdo a ensayos de laboratorio.
Especialista electrico	20%	• Visita a parque laguneta para verificar observaciones de ENEL • Revision de Punto de conexión de acuerdo a prpuesta ENEL • Seguimiento a tramite ante ENEL
Profesional siso	40%	• Recoleccion de documentos de profesionales y personal en obra para remitir a interventoria • Elaboracion de informe mensual • Respuesta de observaciones de intreventoria
Profesional ambiental	30%	• Respuesta de observaciones a PIPMA de parte de intreventoria • Elaboracion de informe mensual
Profesional en transito y transporte	30%	• Tramite de plan de manejo de trafico
Profesional social	15%	• Actas de Vecindad en parques • Coordinar socializaciones en parques de Claret y San benito

ELAborado: _____
Ing. Seguridad Industrial

Director de Obra_____
Ing. Adriana Arevalo
