27-03-24 Clima : Soleado.
personal administrativo : Directa, residente, SST, 2 profesionales de apoyo, inspecta, ambiental II
personal administrativo Interventoria : Director, residente, SST
personal de obra: 1 maestro, 10 oficiales, 11 ayudantes, 12 electricos 3 topografos, 12 electricos, 4 operarios
Equipos y herramientas : volquetas, mini, pajarita, cortadora, bronjadora, vibradores, taladro, taladro demoledor, rotomartillo pulidora, serra, Canguro, trompos, bombas sumergibles, plantas electricas. y herramienta menor.

Se realiza relleno con material Mejorado y Recebo en el sendero del tramo LL32-LL30 el cual es compactado. Se realiza instalacion de tuberia existente del lado del agua, la cual es entregada a la interventoria, verificado la instalacion; Se realiza relleno con material proveniente de excavacion.
Se realiza limpieza y ajustes a cerramiento del tramo LL28- LL34.

Auxiliar: Leonardo Otero.

28-03-24 Jueves santo 'Semana Santa' dia festivo.

29-03-24 Viernes Santo 'Semana Santa' dia festivo

30-03-24 Sabado Santo 'Semana Santa' dia festivo.

31-03-24 Domingo Santo 'Semana Santa'

01-04-24 Clima : lluvias moderadas
personal administrativo : Directa, residente, SST, 2 profesionales de apoyo, inspecta
personal administrativo Interventoria : Director, residente, SST y 2 apoyo
personal de obra: maestro, oficiales, ayudantes, electricos, topografos, 4 operarios
equipos y herramientas : volquetas, mini, retroexcavadora, cortadora bronjadora, vibradores, taladro, taladro demoledor, rotomartillo, pulidora, serra, Canguros, vanos, trompos, taladro demoledor, rotomartillo, bombas sumergibles, plantas electricas y herramienta menor

Powered by CamScanner

Se realiza excavación para instalación de pedestales de los postes de iluminación en el tramo LL11 - LL10.
Se realiza llenales en los pozos LL11 - LL10 - LL09 donde se realiza cunetas, pañete impermeabilizado y llenale de colillas de tubería.

Se realiza relleno en el sud con material de grauilla con el fin de dar la conformación de la estructura del sud; se realiza excavación para la instalación de sardinel del tramo LL28-LL29.

Se realiza demolición de sardinel afectado en el tramo de la trocha siguiendo las observaciones de la interventoría. Posteriormente, se procede a realizar el sardinel el cual es fundido in situ
Se continua con la excavación en el tramo LL34-LL32; se instala tubería de 18" la cual es entregada a interventoría verificando pendientes e instalación.
Se continua con el relleno del sud con material de grauilla; se continua con la instalación de sardinel.
Se suspenden actividades de excavación debido a las condiciones climáticas.

02-04-24 Clima: lluviosa
personal administrativo: Directa, residente, SST, 2 profesionales de apoyo inspecto
personal administrativo Interventoría: Directa, residente, SST
personal de obra: maestro, oficiales, ayudantes, eléctricos, topógrafos y operarios.
Equipos y herramientas: volquetas, mini, retroexcavadora, cortadora tronzadora, vibradores, taladro, taladro demoledor, retomartillo, pulidora sierra, canguro, trompos, bombas sumergibles, plantas eléctricas, y herramientas menores.
Se continua con la demolición de sardinel en el tramo de la trocha, se realiza fundida in situ del sardinel.
se atienden observaciones de adoquín en el tramo LL10-LL11

Se continua con excavación en el tramo LL34-LL32; se instala tubería de 18" la cual es entregada a interventoría verificando actividad de instalación y pendientes.
El rendimiento en la instalación de la tubería se ve considerablemente afectado por las condiciones del terreno, el cual es caracterizado por un nivel freático

elevado por las profundidades en las cuales se esta llevando a cabo la instalacion de la tuberia. Ademas el espacio reducido para el acopio de materiales y la complejidad en el manejo del sistema de entibado, asi como el acceso complicado para la carga y descarga del material excavado, contribuye a ese bajo rendimiento por lo cual se va instalando 6m de tuberia al dia

En Cientifica modulo II se realiza la actividad de traslado e ingreso del equipo de perforacion, para esta actividad fue necesario realizar el desmonte de la ventaneria del pasillo, se realiza la instalación de los mini Split en el area de siembra y lavado, se continua con la instalación del cielo raso, enduperboard, se finaliza con pintura en punto de acceso

03-09-24 Clinc: Uberizna

personal administrativo: Director, residente, SST, 2 profesionales de apoyo, inspector

personal administrativo Interventoria: Oficial, residente, SST

personal de obra: maestro, oficiales, ayudantes, electricos, topografos, 4 operarios

Equipos y herramientas: vehiculos, mini, retroexcavadora, cortadora, trayador vibradores, taladro, taladro demoledor, rotomartillo, pulidora, serrucho, canguros, ranas, trompos, taladro demoledor, bombas sumergibles, plantas, electricas y herramienta menor.

Se continua con la excavación en el tramo U32-U34 el rendimiento de la instalación de la tuberia se ve afectado por el nivel freatico elevado por las profundidades significativas y el tiempo que se debe esperar mientras se realiza bombeo del agua por nivel freatico para poder realizar la nivelación de terreno. La limitada area para el acopio de materiales para relleno y la complejidad del manejo de entibado contribuyen al bajo rendimiento por estos requerimientos se instala 6m de tuberia de 18" lo cual es entregado a la interventoria verificando pendientes e instalación.

Se continua con fundida de sardinel in situ en el tramo U108-U110 ; se realiza correccion de pozos de adecuacion segun lo solicitado por interventoria ademas se realiza relleno de material proveniente de excavacion con el objetivo de conformar el sardinel.

se iniciacion continua con conexión de tablero del rack, se continua

con acometida de puntos o salidas de tomacorientes, y se realiza instalación de tableros electricos, se continua con distribución de tuberia electrica por cielo raso y se continua con cableado, se realiza instalación de cajas de inspección, se realiza media caña en cuarto de ducha, se realizan acometidas para instalación de desague, se realiza corte para instalacion de loza para puntos de gas

01-04-24 Clima : lloviena

personal administrativo : Directa, residente, SST, 2 profesionales de apoyo, inspector

personal administrativo Interventoría : Directa, residente, SST

personal de obra : maestro, oficiales, ayudantes, electricos, topografo 4 operarios

Equipos y herramientas : volquetas, mini, retroexcavadora, cortadora, bronzadora, vibradores, taladros, taladro demoledor, retomartillo, pulidora, serra, canguros, ranas, krompos, taladros bombas sumergibles, plantas

- Se realiza nivelación de terreno para la instalacion de granoquin
- Se realiza reparación de tuberia electrica afectada en la excavación en el POZO U129.
- Se realiza compactación de terreno tramo U130 - U129 para la instalación de adoquin.
- Con el objetivo de reducir el tiempo de bombeo debido a nivel freatico, se ha decidido suspender la excavación en el tramo U32-U34 y comenzar la excavación en el tramo U14-U34 para la instalación de la tuberia aguas abajo. Ademas, donde el recorrido con el director de interventoria Ing Freddi hernandez y contratista; se ha definido desplazar el pozo U34 5m ya que se ha observado que el alineamiento definido afectaria un muro en piedra que delimita el jardin de helechos, area protegida por el jardin botanico. Los tramos se definen de la siguiente manera: U14 - U34 con una longitud de 22,00 m y U32- U34 una longitud de 7726.m.

05-04-24 Clima : Soleado.

personal administrativo : Directa, residente, SST, 2 profesionales de apoyo, inspector

personal administrativo Interventoría : Directa, residente, SST

personal de obra : maestro, oficiales, ayudantes, electricos, topogra, 4 operarios

Equipos y herramientas : volquetas, mini, retroexcavadora, cortadora

Transportadora vibradores, taladro, taladro demoledor, retomanteillo, pulidora, sierra, canguros, ranas, tiempos, taladros, bombas sumergibles, plantas y herramientas menores.

*dada la complejidad de la actividades de la instalación del equipo se continua con el levantamiento de este con andamios, se realiza la instalación de vasijas y demás elementos, instalación de media caña pvc se continua con instalación de luminarias, expertiz eléctrica, acometidas y conexiones a cableado; instalación de puerta acceso en el area de ingreso de centrifica.

Se realiza conformación del suelo donde se instala geotextil y grava para nivelación de piso e instalación de granoquin

Se realiza excavacion para instalacion de filtro en el sendero del lago

Se realiza excavación Tramo LL14 - LL34 para la instalación de tubería de 18" la cual es entregada a la interventoria verificando pendientes e instalación. Se inicia relleno con material de recebo el cual es compactado de forma mecanica. y relleno con material proveniente de excavación compactado.

se continua con las actividades electricas en el modulo de centrifica, de la misma forma se realizá el cambio de los patas de los mesones en acero inoxidable

06-04-2024 Clima: Soleado.

personal administrativo: Director, residente, SST, 2 profesionales de apoyo, inspector.

personal administrativo Interventoria: Director, residente, SST

personal de obra: Maestro, oficiales, ayudantes, electricos, topografos, y operarios

Equipos y herramientas: volquetas, mini, retroexcavadora, Cotadora, transportadora, vibradores, taladro, taladro demoledor, bombas sumergibles plantas electricas, y herramienta menor.

Se realiza Nivelación y compactación para instalación de adoquin en el sendero de los ejes del S32-LLP22 ; S34-LLP21.

Se realiza instalación de geotextil para filtro, se instala gravilla y tubería de filtro el cual es entregado a interventoría verificando pendientes e instalación. Se realiza relleno con material proveniente de excavación. Se solicita al contratista retirar los residuos contaminantes del recebo en el momento de cargue efectuado!

Se realiza excavación en el tramo 1119 - 1132, se instala tubería de 18" la cual es entregada a interventoría verificando pendientes e instalación. Se procede a realizar relleno con recebo el cual es compactado, se continua relleno con material proveniente de excavación el cual es compactado.

Se continua con la instalación de ductos en el modulo de oftalmica

08-04-2024 Clima: Soleado.

personal administrativo: Director, residente, SST, 2 profesionales de apoyo, inspector


personal administrativo interventoria: Director, residente, SST

personal de obra: maestro, oficiales, ayudantes, electricos, topografo y operarios

Equipos y herramientas: retroexcavadora, cortadora, troqueadora, vibradores, taladro, taladro demoledor, bombas sumergibles, planta, electricos, y herramienta menor.

- Se realiza Nivelación de terreno en el tramo 1128 - 1129 para la instalación del gramoquin. Se continua con la instalación de jardinel.

Se establece en recorrido con interventoría, Apoyo a la supervisión y contratista la necesidad de instalar un sumidero sencillo en el tramo LL09-LL10 por la presencia de puntos bajos en el eje, ya que podría presentar problemas de drenaje y acumulación de agua.

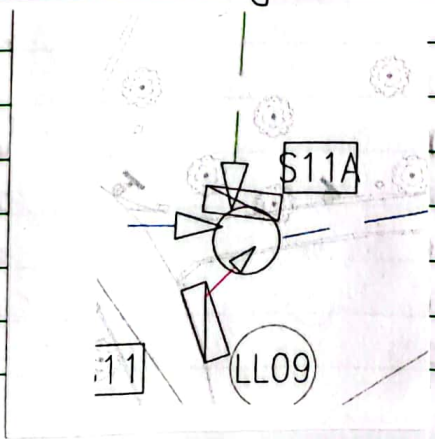

Se realiza reparación a tubo de agua potable interceptado en el tramo U34. el cual es reparado.

Se realiza relleno con material proveniente de excavación en el sendero de la rocha según lo solicitado por interventoría.

Se realiza retiro de adoquín en el sendero del lago

Se realiza excavación en el tramo U14 - U32, se realiza instalación de tubería de 18" la cual es entregada interventoría verificando pendientes e instalación. Se procede a tapar con recebo compactado. ¡Ejecutado!

09-04-2024 Clima: soleado

Personal administrativo: Director, residente, SST, 2 profesionales de apoyo, inspector

personal administrativo interventoría: Director, residente, SST

personal de obra: maestro, oficial, ayudantes eléctricos, topógrafos, 4 operarios.

Equipos y herramientas: volquetas, mini, retroexcavadora, cortadora, bonyadora, vibradores, taladro, taladro demoledor, bombas sumergibles, plantas eléctricas y herramienta menor.

Se realiza instalación de gramoquin en el tramo U28-U29

Se realiza limpieza de adoquín retirado en el tramo del sendero del lago.

Se realiza excavación en el tramo U14 - U32; se instala tubería de 18" la cual es entregada a interventoría verificando pendientes e instalación de la tubería. Se realiza relleno con recebo compactado se continua relleno con material proveniente de excavación el cual es compactado.

Se realizan pruebas de las lamparas de emergencia instaladas, se continua con actividades de cierre de hermeticidad en la ventaneria del modulo de cientifica, se continua con actividades de instalaciones electricas ¡Ejecutado!

10-01-2024 Clima: Soleado.

personal administrativo: Directa, residente, SST, 2 profesionales de apoyo, inspector

personal administrativo interventoria: Director, residente, SST

personal de obra: maestro, oficial, ayudante, electricos, topografos y operarios.

Equipos y herramientas: soldadora, mini, retroexcavadora, cortadora, troqueadora, vibradora, taladro, taladros demoledor, bombas sumergibles planta electrica y herramienta menor.

Se continua con instalaciones electricas, se llevan a cabo resanes generales de muros.

Se realiza excavacion para pozo U32, se nivela piso y se realiza instalacion de placa de pozo. se realiza construccion de pozo en mamposteria. Se continua con excavacion en el tramo U32-U34. se instala tuberia de 18" la cual es entregada a interventoria verificando pendientes e instalacion. Se procede a tapar con material recebo el cual es compactado. efectivo!

Se realiza excavacion para instalacion de sumidero SO1A el cual conecta a caja X3 - caja X4.

Se continua con la instalacion de sardinel tramo U28-U29 y se continua con la limpieza e instalacion de gramoquin.

Se realiza recorrido con la entidad ing Nelson Moreno como apoyo a la supervision, interventoria, especialista hidraulico de la interventoria, contratista y especialista hidraulico del contratista con el fin de realizar inspeccion para entrega de la red de aguas lluvias ya instaladas en la cual se generan observaciones de limpieza, remate de cosuelos y perfilado de tuberia en algunos cajas y pozos.

Se define ante Apoyo supervision interventoria y contratista realizar cunata de caida a los sumideros S15 y S16 que conectan al pozo U132 con el fin de disipar la energia cuando el flujo del agua de los sumideros llegue al pozo evitando erosion en el fondo del pozo y en los paredes circundantes.

11-04-2014 Clima: soleado.
personal administrativo: Director, residente, SST, 2 profesionales de apoyo, inspecta
personal administrativo Interventoría: Director, residente, SST
personal de obra: maestro, oficiales, ayudantes, topografo, electricos y 4 operarios
Equipos y herramientas: volqueta, mini, retro, canguros, rana cortadora, trompudora, vibradores, taladros, taladro demoledor, bombas sumergibles, plantas electricas y herramienta menor.
Se inicia con la actividad de aplicación de la barrera antihumedad en el piso para la instalacion del unilo
Se continua con la excavación en el tramo 1132-1134 donde se instala tubería de 18" la cual es entregada a la interventoría verificando pendientes e instalación. Se procede a tapar con material de recebo el cual es compactado. Excelente!

Se continua con la instalación del sumidero SOIA sencillo, se instala tubería de 6" la cual es entregada a la interventoría verificando pendientes e instalación.

Se continua con la limpieza del cerramiento en el sendero del lago.

Se continua con la instalación de guardaganado, se realiza confinamiento con gravilla.
Se continua con la instalación de los ductos del equipo de precisión
Se continua con instalaciones electricas Excelente

12-04-2014 Clima: soleado.
personal administrativo: Director, residente, SST, 2 profesionales de apoyo, inspecta
personal administrativo Interventoría: Director, residente, SST
personal de obra: maestro, oficiales, ayudantes, topografos electricos y 4 operarios
Equipos y herramientas: volquetes, mini, retroexcavadora, cortadora

tronzadora, rebadores, taladro, taladro electrolado, rotomartillo, pulidora, sierra, canguros, ranas, trompos, taladros, bombas sumergibles, plantas y herramienta menor.
Se continua con la aplicación de la barrera antihumedad en modulo cientifica, se termina el selle de las ventanas en aluminio, se continua con instalaciones de cableado electrico

Se continua con la instalación de granoquin, se confina con gravilla

Se libera sendero del tramo U32 - U29 retirando cerramiento y realizando limpieza en zona verde.

Se realizan remates de adoquin en el sendero U32-U29.

Se continua con excavacion en el tramo U32 - U34 instalando tubería de red la cual es entregada a interventoria verificando pendientes e instalacion, se procede a instalar relleno el cual es compactado

Se realiza instalación de adoquin en el sendero de cientifica, se fence sardinel.

13-04-2017 Clima: Soleado.
personal administrativo: Director, residente, SST, 2 profesionales de apoyo, inspecta
personal administrativo Interventoria: Director residente, SST
personal de obra: maestro, oficiales, ayudantes, topografos, electricos, 4 operarios
Equipos y herramientas: inalquetes, meni, rebo, canguros, ranas, cortadora, tronzadora, rebadores, taladros, bombas sumergibles y herramienta
Se realiza relleno en el tramo U32 - U34 para nivelacion de terreno.

Se realiza conexión de canoa de caida para los sumideros S18 y S15 al pozo U32.
Se continua con la actividad de preparacion de piso para instalacion de unilo

Se realiza despeje de sendero U29-U28 finalizado la instalación de guaduquin y confinamiento de grama.

Se realiza nivelación de terreno en el sendero del lago para la instalación del adoquín; se continua con limpieza de adoquín.

Se realiza jornada de aseo según lo solicitado por la interventoría.
Se llevan a cabo resanes generales de muros arreglos de mediacaña, y preparación de piso para instalación de vinilo.
Se continua con instalaciones electricas.

14-04-24 Clima: Soleado.
personal administrativo: Director, residente, SST, 2 profesionales de apoyo, inspector
Personal administrativo Interventoria: Director, residente, SST
personal de obra: maestro, oficiales, ayudantes, topografo, electricos y 4 operarios.
Equipos y herramientas: volquetas, mini, retroexcavadora, canguros, conos, brompos, pulidoras, taladros, y herramentas menores.
Se continua con la instalación de adoquin en el sendero del lago, se continua con la limpieza del adoquín.
Se lleva a cabo el inicio de la actividad de instalación de PEO en vinilo teniendo encuenta las mediacaña existentes.
Se continua con las instalaciones electricas

15-04-24 Clima: Soleado.
personal administrativo: Director, residente, SST, 2 profesionales de apoyo inspector
personal administrativo Interventoria: Director, residente, SST
personal de obra: maestro, oficiales, ayudantes, topografo electricos y operarios
Equipos y herramentas: volquetas, mini, retroexcavadora, canguros, conos, brompos, pulidora, taladros, bombas sumergibles y herramenta

Se realiza excavación para instalación de sumidero S15 y S16; se realiza excavación para la instalación de tubería 6" la cual es conectada al pozo LL32; es certificada con interventoría pendientes e instalación.

Se realiza relleno en recebo en el tramo 1114 - LL32 el cual es compactado para nivelar terreno y posteriormente instalar adoquín.

Se realiza limpieza de adoquín e instalación es el lavado del lago
Se realiza conexión del sumidero S01 - LL01 instalando tubería 6" la cual es entregada a la interventoría verificando pendientes e instalación.
Se realiza placa en concreto a la tubería con el fin de dar protección a la tubería ya que se tendía tráfico pesado y la tubería quedo con recubrimiento de 0.30m.

Se realiza limpieza de adoquín en el tramo LL14 - LL32.
Se termino de instalar el piso en vinilo se inicia con los remates del mismo, se continua con instalaciones electricas

16-04-24 Clima: Soleado.
Personal administrativo: Director de obra, Residente de obra, Residente SST, 2 profesionales de apoyo, inspector de obra.
Personal de Interventoría. Director, Residente de ~~obra~~ interventoría. SST, 1 apoyo dirección, 1 apoyo técnico
Personal de obra: Maestro de Obra, oficiales ayudantes, topografo; electricistas y 4 operativos.
Equipos y herramientas: Volquetas, mini, retro excavadora, Canguros, trompos, pulidoras, taladros y herramienta menor.
Se lleva a cabo la actividad de pintura de muros en epoxica para el modulo de cretificia cubriendo todas las areas y la medicana en pvc instalada para dar mayor continuidad a la pintura de los muros.
Se continua con actividades de instalaciones

electricas, se continua con el armado del rack.

Continuacion de la instalación del adoquin para el tramo largo de la cascada el cual se realizo en jornada extendida terminando a la 4:00 a.m del dia 17 de abril se realizo instalación de adoquin en el tramo del lago.
- se inicia a despejar las areas intervenidas realizando jornadas de aseo general.

17-04-24 Clima: Soleado
Personal administrativo: Director de Obra, Residente de Obra Residente SST 2 profesionales de apoyo inspector
Personal administrativo interventoria: Director, Residente de interventoria y SST. 2 profesionales apoyo
Personal de Obra. maestro, operales ayudantes, topografo electricos 4 Operarios.
Equipos y herramientas: volquetas, mini, retro excavadoras, canguros, trompos, pulidoras, taladros y herramienta menor, Equipo de topografia.

Se continua con actividades de pintura epoxica sobre muros, se inician actividades de aseo general de obra.
Se continua con actividades de instalaciones electricas, se continua con los trabajos en el rack. se inician remates en general de obra.
Se continua con la instalación de adoquin en los senderos del tramo largo y de el lago.
se continua con remates de sardineles y de gramoquin.

18-04-24 Clima. Soleado en la mañana lluvias en la tarde y lluvia torrencial en la noche.
Personal administrativo. Director de obra, Residente de obra, Residente SST, 2 profesionales de apoyo. inspector.
Personal administrativo interventoria: Residente de interventoria. Residente SST y 2 profesionales apoyo.
Personal de Obra. Maestro, Oficiales ayudantes, topografos, electricos, 4 Operarios.
Equipos y herramientas. Volquetas, mini, retro excavadoras, canguros, equipo de topografia y herramrenta menor.

Se continua con las actividades de remate de pintura epoxica en modulo de crentifica, se continua con actividades electricas de armado del Rack y ponchada de tablero. Se continua con actividades de aseo general.

-Se continua con instalación de adoquin y remates de senderos.
Se lleva a cabo aseo general de obra, sobre los senderos intervenidos.

19-04-24 Clima: Soleado mañana. lluvias fuertes en la tarde hasta las 4:30 p.m.
Se iniciaron actividades de conformación de terreno en el area de Educativa. la cual se detuvo por las lluvias, se planteo la continuación de la tarea al día siguiente.
-Se continua con la instalación de adoquin en sendero
-Se realizó remate y terminación de muros en modulo crentifica.
-Se llevaron a cabo actividades de retiro

de material sobrante. y se inicia despejando la zona de acopio de material para entrega de la misma

Nota: Fecha de observación 20 de Abril de 2024

Se solicita incrementar el personal de manera prioritaria e inmediata con el fin de terminar cientifica y los remates de obra civil. Tambien se debe ajustar y corregir la trampa de grasas de cientifica, remates de alcantarillado y cruces hundidos de adoquin, terminar de conformar el área de campamento y el del lado usado como acopio, todo esto antes del 30 de abril de 2024. Se deben reparar los goteras en edificativa, cuartos eléctricos y todos los pendientes y remates de acuerdo a todos los comunicados. Se deja claridad que adicional al personal reportado por el contratista, Interventoría cuenta con un profesional de apoyo técnico y un profesional de apoyo a la dirección de obra, esto de manera diaria y en campo. Con respecto a las fusiones de fibra óptica que están ejecutando en las 4 edificaciones para corregir la intermitencia presentada en la señal, se requiere que las fusiones queden al 100% ejecutadas y sin ningún tipo de interferencia

20-04-24 Clima. lluvias esporadicas dia nublado
Personal Administrativo. Director de obra. Residente de obra. Residente SST 2 profesionales de apoyo Inspector de Obra.
Personal administrativo interventoria: 1 director Interventoria, 1 profesional apoyo dirección, 1 residente interv, 1 sst, 1 profesional apoyo técnico. 1 pros. ambiental, 1 apoyo ambiental sst.
Personal de Obra. Maestro, Oficiales, Ayudantes topografia, electricos 4 Operarios
Equipos y herramientas rolgretas mini, retroexcavadora, canguros, trompos, pulidoras, taladros, herramienta menor, equipo de topografia.

Se continua con las actividades de terminación de instalación de acometida electrica en el modulo de crentifica.
-se continua con la instalacion y armado de rack.
-Se continua con actividades de remate de pintura.
-Se realizaron actividades de conformacion de las zonas exteriores retirando el material contaminado para ser dispuesto en petiro de escombro.
en el mismo sentido se lleva a cabo la rastrillada de la zona con el fin de que el suelo quedara suelto y preparado para los trabajos propios del Jardin Botánico.

21-04-24 Se continua con actividades de reconformación de zonas exteriores segun lo acordado con los representantes ambientales del Jardin Botanico

22-04-24 Clima. lluvia continua durante el dia.
Personal administrativo: Director de Obra, Residente de obra, Residente SST, 2 profesionales de Apoyo e inspector de Obra.
Personal administrativo interventoria: 1 director, 1 prof. apoyo dirección, 1 residente, 1 sst, 1 profesional apoyo téc. nico., 1 prof. ambiental, 1 apoyo ambiental
Personal de obra. Maestro de obra, Oficiales, Ayudantes, topografia, electricos 4 operarios.
Equipos y herramientas: volquetas, mini, retroexcavadora canguros, trompos, polidoras, taladros, herramienta menor, equipo de topografia.
-Se continua con actividades de remates en el modulo de crentifica. electricas, pintura: impermeabilizacion.
-Se realizan actividades de aseo de

senderos peatonales afectadas durante la ejecución de obra
- Se conecto la acometida dejando así terminada la actividad.
- Se continua con actividades de retiro de material en la zona de compostaje.
- Se continua con actividades de limpieza y aseo general.

23-04-24 Clima Cielo nublado lluvias en la tarde.
Personal administrativa
Director de Obra.
Residente de Obra
Residente SST.
2 profesionales de Apoyo.
1 Inspector.
Maestros
Ayudantes
Eléctricos.
Personal de topografía.

Personal Administrativo Interventoría, 1 directo
1 apoyo dirección, 1 residente, 1 sst, 1 profesional apoyo técnico
1 profesional ambiental, 1 apoyo ambiental
Actividades Ejecutadas
- Se continua con actividades de atención de observaciones realizadas por la interventoría en terminación y garantías de las diferentes edificaciones.
- Se continua con actividades de remate en modulo cientifica
- Se continua con actividad de conformación de senderos.

24-04-24 Clima. Despejado en la mañana, lluvias en la tarde.

Personal Administrativo.
- Director de Obra.
- Residente de obra.
- Residente SST
- 2 Profesionales de Apoyo.
- Inspector de obra.

Maestros.
Ayudantes.
Electricos.
Personal de topografía.

Personal Administrativo Interventoría: 1 directa, 1 apoyo dirección, 1 residente, 1 sst, 1 apoyo ambiental 1 profesional apoyo técnico.

Actividades Ejecutadas.
- Se continua atendiendo observaciones realizadas por interventoría.
- Se continua con actividades de remate de obra civil y electricas en modulo crentiproa.
- Se continua con actividades de arreglo de senderos afectados en la ejecución de la obra
- Se continua con actividades de limpieza y retiro de material en el campamento.
- Se continua con aseo general.

25-04-24 Clima. Despejado en la mañana lluvias esporadicas

Personal administrativo.
Director de obra.
Residente de obra
Residente SST
2 profesionales de apoyo

Inspector de Obra
Maestro de obra
Ayudantes de Obra
topografia
Operarios
Personal administrativo interventoria

- Se lleva a cabo comite de obra en las Instalaciones de Jardin Botanico Se solicita suspención del contrato teniendo en cuenta las demoras que se presentan en tramite electrico ante ENEL

Actividades de Obra
- se continua con actividades de remate de obra civil, remates electricos conexion de fibra optica
- se continua con actividades en zanjeos
- se continua con retiro y aseo general

26-04-24 Se tramita suspención de obra a partir de la fecha y hasta el dia 10 de mayo de 2024, toda vez que se hace necesaria la aprobación de los diseños correspondiente a la instalación del transformador (los diseños) por parte de la empresa ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., si esta aprobación es dada previo a la fecha establecida para reinicio se dara 3 dias habiles contados a partir de tener los planos aprobados.
