INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICUU - 815 de 2023

CONTRATO DE OBRA ICCU - 708 de 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".

INFORME MENSUAL No. 8

Período: 01 al 22 de marzo del 2024



COPEBA S.A.S.
Nit:830.011.122-9

Bogotá D.C.
12 de abril de 2024

Contrato de Obra No.	708 de 2023	**Contratista:**	CONSORCIO PASCA CNJ
Contrato de Interventoría No.	815 de 2023	**Interventoría:**	COPEBA S.A.S.

Objeto Contrato de Obra:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".

INFORME MENSUAL No.	8	**MES O PERIODO:**	MARZO DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Índice Informe Mensual de Interventoría		
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		7
1	Introducción		7
2	Descripción del proyecto		11
2.1	Localización	MS-GP-FR-010 ACTA_DE_LOCALIZACION	11
2.2	Conectividad, área de influencia y beneficios		12
2.3	Estado inicial de la vía		12
2.4	Características técnicas del proyecto		17

3	Información Contrato de Obra		29
3.1	Información general contrato de obra		29
3.2	Actividades ejecutadas en el mes		30
3.3	Seguimiento ítems no previstos		40
4	Reportes ejecución mensual contrato de obra		44
4.1	Informe semanal	MS-GP-FR-034 INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	44
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra		61
4.3	Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAD SOCIAL	63
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra		66
4.5	Estado General del Tiempo		68
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio		70
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MS-GC-FR-06_ACTA_APROBACION_DE_POLIZAS	77
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra		101
4.8.1	Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia)		106
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		113

4.9.1	Seguimiento a la inversión del Anticipo		113
4.9.2	Seguimiento Programa de Inversión		128
4.9.3	Seguimiento Programa de Obra		134
4.10	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría		137
5	Información contrato de interventoría		142
5.1	Información general del contrato de interventoría		142
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		142
5.3	Informes especialistas y profesionales		144
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		430
5.5	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría.		432
6	Reportes ejecución mensual contrato de interventoría		433
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría		433
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAD SOCIAL	435
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría		437
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MS-GC-FR-06_ACTA_APROBACION_DE_POLIZAS	439

6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría		456
6.6	Otros Documentos seguimiento mensual		477
6.6.1	Seguimiento a la inversión del Anticipo		477
6.6.2	Actas de Comité de Obra	ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION	477
6.6.3	Actas de Reunión	ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION	484
7	Conclusiones y recomendaciones		484
8	Anexos		489
8.1	Correspondencia		489
8.2	Registro fotográfico del avance de las obras.		488
8.3	Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.		495
8.4	Bitácora del mes correspondiente		499
8.5	Certificación componente ambiental y social		544
8.6	Acta de costos de interventoría	MS-GP-FR-033 FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	547

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 

Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ

DIRECTOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tarjeta Profesional:2520266675 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Expediente Contractual ICCU.

Copias: Interventor, Subgerencia de Infraestructura / Supervisor

Resumen Mensual Estado General del Proyecto

1. Introducción

El Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 2 del artículo primero de la Ordenanza 005 de 2008 expedida por la Honorable Asamblea de Cundinamarca, en virtud de la modernización del Departamento y del Plan Departamental de Desarrollo "Cundinamarca, Corazón de Colombia 2008-2012", se creó el Instituto de Infraestructura y Concesiones del Departamento de Cundinamarca "ICCU", mediante Decreto Ordenanza No 00261 de 2008.

Que mediante la resolución No. 0068 del 01 de abril de 2015, se modificó la estructura orgánica del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca y que en su Misión según Articulo 4, menciona que el instituto de infraestructura y concesiones de Cundinamarca tendrá como misión ejecutar proyectos de infraestructura física y acciones de mantenimiento y mejoramiento, para que los habitantes de Cundinamarca se movilicen.

Teniendo en cuenta el artículo 5 del Decreto Ordenanza 0068 del 2015, que hace mención a los objetivos del ICCU, "…tiene por objeto atender la estructuración, contratación, ejecución y administración de los negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen directamente o con participación del capital privado, previstos dentro del Plan Departamental de Desarrollo y los planes y programas sectoriales, así como realizar las operaciones necesarias para la distribución, asignación y cobro de las contribuciones de valorización"; y entre sus funciones contenidas el Artículo 6 en su numeral 6.5 "Ejecutar obras de desarrollo tales como apertura, ampliación, rectificación y pavimentación de vías públicas, construcción de puentes, plazas cívicas, plazoletas, aparcaderos, parques y zonas verdes con sus instalaciones, servicios y obras complementarias"; numeral 6.13 "Elaborar los estudios y adelantar las acciones necesarias para recopilar la información de carácter predial, ambiental y social requerida para una efectiva gestión de los proyectos a su cargo".

Que el "ICCU" en una de sus funciones contempladas en el Articulo 6 en su Numeral 6.20 del Decreto Ordenanza 0068 de 2015, "Estructurar los contratos convenios relacionados con los proyectos a su cargo y realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo los procesos de contratación".

Mediante la Ordenanza No. 011 del 03 de junio de 2020 se adoptó el Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 2024 "Cundinamarca, ¡Región que Progresa!", que fue modificado por la Ordenanza No. 059 del 24 de junio de 2021, hace parte de la Línea Estratégica: "Más Competitividad", cuyo objetivo es Consolidar modelos de aglomeración y especialización productiva que permitan avanzar de forma sólida y sostenible hacia el

mejoramiento de la productividad, la competitividad y la internacionalización de la economía, mediante el refuerzo de las capacidades endógenas del departamento y el reconocimiento de la heterogeneidad del territorio, para contribuir efectivamente a la reducción de las brechas competitivas; Sector Transporte, Programa: Red vial regional, que incluyen intervenciones a la Red Secundaria y Terciaria del Departamento, con el fin de disminuir los costos logísticos que garanticen conectividad, transitabilidad y seguridad vial a través de la intervención de la infraestructura para financiar actividades que permitan seguir contribuyendo con el mejoramiento de las vías del Departamento

Con el propósito de fomentar el progreso económico y social del Departamento de Cundinamarca, mejorar la interconectividad entre los municipios y facilitar su crecimiento social y económico, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca considera pertinente realizar obras necesarias para satisfacer las necesidades de la comunidad cundinamarquesa con la generación de obras sobre los diferentes corredores viales departamentales, para garantizar la transitabilidad de los usuarios en el Departamento Cundinamarca.

Es por esto que el Departamento de Cundinamarca a través del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU, adelanto el respectivo proceso de contratación para adelantar el siguiente proyecto: " MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500"; así mismo, dando aplicación al artículo 32 de la ley 80 de 1993 realizo la contratación de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental.

Así, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de Colombia, particularmente en los Artículos 2 y 365, es deber del Estado, y en el caso particular del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU -, garantizar a todos los administrados del territorio Departamental, la prestación eficiente de los servicios públicos a través de la adquisición de bienes y servicios, ya sea a través de la actuación directa de las propias entidades o acudiendo a la colaboración de los particulares a fin de lograr los fines del Estado de manera legal, armónica, eficiente y eficaz.

Por tanto, dado que el ICCU, no cuenta con los recursos necesarios en infraestructura técnica, ni recursos humanos de planta para realizar el objeto propuesto en este proceso de contratación, se requiere dar inicio al Proceso de Licitación Pública, siguiendo los parámetros legales establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, demás normatividad que los modifique, adicione o complemente, con el fin de seleccionar a un particular para que por su cuenta y riesgo, ejecute el presente proyecto, bajo estándares de eficiencia y eficacia

Es así como mediante Resolución No. 256 del 13 de abril de 2023 la Entidad abrió el proceso de Contratación número ICCU- LP- 020 de 2023 y surtido todo el procedimiento legal mediante Resolución No. 366 del 17 de mayo de 2023 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista CONSORCIO PASCA CNJ.

Surtido el proceso para la adjudicación de obra se procedió paralelamente con la convocatoria para la contratación de la Interventoría y es así que, mediante la Resolución No. 315 del 25 de abril de 2023, la Entidad abrió el Procedimiento de Contratación ICCU-CM-028 DE 2023 el cual surtido todo el proceso selectivo y a través de la Resolución No. 404 del 31 de mayo de 2023, la Entidad adjudicó el contrato al oferente COPEBA S.A.S.

El Instituto Nacional de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU busca adelantar las obras prioritarias que tengan mayor impacto en el mejoramiento del servicio, de tal forma que se garantice una operación segura, contribuyendo así a la generación de empleo y a la dinámica de comercialización de los productos a través del transporte adecuado de los mismos y en definitiva mejorar la calidad de vida de la población.

A partir de lo registrado en la Resolución de Adjudicación se procedió con la firma del Contrato de Obra N° 708 de 2023, por un valor total de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 17.862.489.434,00), equivalentes a 15.398,70 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2023, suma que incluye el IVA un plazo contractual hasta el 31 de diciembre de 2023, una vez cumplidos los requisitos previos a la ejecución del contrato, así como las actividades de perfeccionamiento y legalización del mismo, el ICCU dio Orden de Inicio a partir del 01 de agosto del 2023.

A partir de lo registrado en la Resolución de Adjudicación se procedió con la firma del Contrato de Interventoría N°815 de 2023, por un valor total de MIL TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($1.032.790.821), equivalentes a 890 SMMLV para el año de suscripción del contrato año 2023, incluido IVA m/cte. y un plazo contractual hasta el 31 de diciembre de2023. que inicia el 28 de junio de 2021 y termina el 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, una vez cumplidos los requisitos previos a la ejecución del contrato, así como las actividades de perfeccionamiento y legalización del mismo, el ICCU dio Orden de Inicio a partir del 01 de agosto del 2023.

El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU en el marco del mencionado plan 500 define 205 Km de los corredores viales de su competencia, para los cuales se establece la necesidad de generar estudios y diseños a Fase III con ingeniería de detalle, haciendo uso de herramientas, ensayos, análisis y producción de documentos que permitan a la entidad continuar con el cumplimiento de su misión y los proyectos y metas enmarcadas en el Plan Departamental de Desarrollo.

En el marco de ejecución del Contrato Interadministrativo ICCU-087 DE 2021 (21-007 FONDECUN) suscrito entre el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECUN y el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU, se contempla la elaboración de los estudios y diseños a detalle de vías y puentes en el departamento de Cundinamarca.

El 11 de noviembre de 2021 se suscribió el contrato de consultoría 1509 de 2021 entre FONDECUN y CONSORCIO ESTUDIOS V&P, con el objeto de elaborar estudios y diseños de vías y puentes en el departamento de Cundinamarca, en el marco del contrato interadministrativo ICCU 087-2021 (FONDECUN 21-007) suscrito entre ICCU y FONDECUN. Mediante este contrato de consultoría se elaboraron los respectivos estudios y diseños con los cuales se determinó el alcance del contrato de obra ICCU-708 del 2023. Los Estudios y Diseños los suministra el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU y el Contratista deberá revisar todos los tramos a ejecutar, producto del contrato de Consultoría; además deberá hacer una comparación de alternativas con criterios técnicos y económicos por cada tramo, escogiendo la que técnicamente cumpla las condiciones y represente un menor valor en cuanto inversión para el Instituto. Frente a las variaciones que se presenten de cantidades, las obras deberán ejecutarse con los precios establecidos en el presupuesto oficial. Estos estudios y Diseños fueron entregados en medio magnético.

El contratista mediante oficio CNJ-ICCU-708-O-0183 de fecha 30 de noviembre del 2023, presento a la Interventoría la solicitud de prórroga del contrato de obra justificada en las afectaciones a la ejecución por el clima en octubre y noviembre del 2023, a la indefinición de obras de Geotecnia en algunos sectores del corredor vial peaje San Miguel – Fusagasuga, afectación por los ajustes, levantamiento de actas de vecindad y redes de servicios públicos no identificadas en los diseños iniciales de los diseños del espacio público y por último la afectación en la ejecución de obra en la temporada de fin de año debido a la restricción con proveedores en la entrega de insumos, aumento de volumen vehicular y solicitud de la comunidad del espacio público de no ejecutar actividades debido al aumento en el comercio.

La Interventoría revisada y analizada la solicitud de prórroga del contratista, emitió concepto favorable mediante oficio ADM-ICCU-815-2023-081 del 04 de diciembre del 2023; y el 05 de diciembre del 2023 mediante oficio ADM-ICCU-815-2023-084, solicito al ICCU la prórroga para el contrato de Interventoría, autorizándose la Prorroga hasta el 29 de febrero del 2024 de los contratos de Obra e Interventoría el día 11 de diciembre del 2023.

El contratista mediante oficio CNJ-ICCU-708-O-0279 del 12 de febrero del 2024, solicita la prorroga del contrato hasta el 30 de marzo del 2024; la Interventoría revisados los

argumentos presentados por el contratista avala la solicitud e imputabilidad de los atrasos al contratista, mediante oficio ADM-ICCU-815-2023-113 del 13 de febrero del 2024, el cual fue remitido al ICCU mediante oficio ADM-ICCU-815-2023-113 del 13 de febrero del 2024; la Interventoría, igualmente y con base en la continuidad de la supervisión de obra, solicita la prórroga hasta el 30 de marzo del 2024, con la salvedad y fundamentado en lo pactado contractualmente, que los costos de Interventoría para el periodo de prorroga serán asumidos por el contratista.

El ICCU mediante oficio del 14 de febrero del 2024 y con la expedición del documento de prorroga 2, autoriza la prórroga de los contratos tanto de obra ICCU-708 del 2023 y de Interventoría ICCU-815 del 2023.

El presente Informe Mensual de Interventoría N°07 se elabora atendiendo lo establecido en el MANUAL DE INTERVENTORÍA del ICCU y en él se describen las principales actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo del 2024.

2. Descripción del proyecto

2.1. Localización

El proyecto se localiza en el departamento de Cundinamarca, al sur de la ciudad de Bogotá entre los municipios de Chusacá, Sibaté, Fusagasugá y Pasca, el corredor se encuentra mayoritariamente ubicado dentro de la Provincia de Sumapaz. El tramo en el estudio, se encuentra ubicado sobre la sabana sur occidental, tiene una longitud de 23.668 kilómetros.

La provincia de Sumapaz representa el 8% del área total de Cundinamarca, siendo la sexta provincia en extensión territorial. Está conformada por 10 municipios, entre los cuales se encuentran Fusagasugá, Silvania y Pasca, que son de interés para el corredor en estudio. Al norte limita con las provincias de Tequendama y Soacha, y al sur con el Departamento de Tolima. Se caracteriza por las explotaciones de materiales para la construcción, así como por la gran oferta turística disponible en ella.

A continuación, se presenta la localización de los tramos que comprende el proyecto, según el alcance específico por vía y la sectorización del proyecto.

Figura 1: Localización general vía Sibaté - Peaje San Miguel - Fusagasugá - Pasca



Fuente: Anexo Técnico proceso ICCU-LP-020 DE 2023

2.2. Conectividad, área de influencia y beneficios

El corredor a intervenir es una vía de carácter secundario que conecta el municipio de Sibaté, municipio de Fusagasugá y al municipio de Pasca en el departamento de Cundinamarca, con una longitud de 4,6 km aproximadamente, el corredor se encuentra mayoritariamente ubicado dentro de la Provincia de Sumapaz, además de abarcar parte de la provincia de Soacha, ambas al sur de Bogotá.

Con la intervención del corredor vial se busca fomentar el crecimiento económico, sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos, convirtiéndose en un corredor vital para la generación de empleos, el desarrollo productivo del campo y la actividad turística y gastronómica de la región.

2.3. Estado inicial de la vía

En recorridos iniciales realizados por la interventoría, el contratista y el supervisor del contrato, se pudo evidenciar que el tramo vial presenta deterioro significativo en los siguientes puntos:

CONTRATO ICCU_708			
ITEM	ABSCISADO		LONGITUD
	INICIO	FIN	
1	K1+340	K2+100	760
2	K7+320	K7+520	200
3	K7+900	K8+200	300
4	K9+950	K10+240	290
5	K10+410	K10+660	250
6	K10+660	K10+910	250
7	K7+450	K8+250	800
8	SC 008		
9	ANDENES AGUABONITA		300
10	ANDENES AGUADITA		600
11	SEÑALIZACIÓN		
12	OBRAS DE DRENAJE		

Estos tramos fueron los priorizados para su intervención, de acuerdo al recorrido inicial de obra, debido al mayor deterioro que se registra en estos tramos viales, tal como se muestra en el registro fotográfico a continuación.

Figura 2: Tramo priorizado PR10+505



Fuente propia

Figura 3: Tramos priorizados para intervenir



Fuente propia

Figura 4: Tramo 2 Priorizado para intervenir



Fuente propia

Intervenciones por Rehabilitación y Espacio Público:

CONTRATO ICCU_708			
ITEM	ABSCISADO		LONGITUD
	INICIO	FIN	
1	K1+340	K2+100	760
2	K7+276,5	K7+520	200
3	K7+896	K8+305	409
4	K9+774	K10+240	466
5	K10+260	K10+660	400
6	K10+660	K10+910	250
7	K7+500	K8+483	883
8	SC 008		
9	ANDENES AGUABONITA		300
10	ANDENES AGUADITA		600
11	PAVIMENTO ARTICULADO PASCA		166
	SEÑALIZACIÓN		
	OBRAS DE DRENAJE		

Nota 1: El tramo No. 4 presenta intervención en pavimento articulado para recuperación de banca entre el K 10+085 al K10+150, debido a falla geológica evidenciada en dicho sector.

Nota 2: El tramo No. 7 está sectorizado en tres partes: Sector 1: K7+500 al K8+090; Sector 2: K8+140 al K8+190, Sector 3: K8+240 al K8+483.

Nota 3: El tramo Fusagasugá - Pasca presenta intervención en pavimento articulado para recuperación de banca entre el K 8+135 al K8+301, debido a falla geológica evidenciada en dicho sector.

Total Intervenciones por Rehabilitación: 4.268 ml

Intervenciones de Mantenimientos mediante parcheos, por atención de emergencias viales:

ITEM	ABSCISADO		LONGITUD EN ML
	INICIO	FIN	
1	K15+336	K15+398	62.2
2	K15+706.3	K15+750,5	44.5
3	K15+938.3	K15+938,3	44.4
4	K16+100	K16+132,9	32.9
5	K16+192.3	K16+219.6	27.3
6	K1+400	K16+462.2	62.28
7	K17+200	K17+248.6	48.62
8	K17+300	K17+352.5	52.5
9	K17+400	K17+475.5	75.5
10	K17+600	K17+625.7	25.77
11	K17+700	K17+749.1	49.17
12	K17+884	K17+928.8	44.26
13	K18+075	K18+104,5	29.349
14	K18+134.5	K18+159.6	24.048
15	K19+884.7	K19+927.8	43.045
16	K14+924.8	K14+979.6	54.774
17	K14+892	K14+915.5	23.161
TOTAL, INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA VIAL EN ML			**743.77 ml**

Intervenciones de Mantenimientos mediante parcheo, por atención de emergencias viales en el tramo Fusagasugá - Pasca:

ITEM	ABSCISADO		LONGITUD EN ML
	INICIO	FIN	
1	K9+625,20	K9+717,20	92,29

2	K9+566,80	K9+624,57	57,77
3	K9+314,10	K9+348,11	34,01
4	K9+198,20	K9+236,19	37,99
5	K9+077,15	K9+116,56	39,41
6	K9+036,00	K9+049,53	13,53
7	K8+924,14	K8+960,40	36,26
8	K8+902,20	K8+973,24	71,04
9	K8+791,30	K8+841,23	49,93
10	K8+377,70	K8+403,61	25,91
11	K8+295,50	K8+324,42	28,92
TOTAL, INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA VIAL EN ML			**432,23**

Total, longitud intervenida en el contrato: 5.444,00 ml

2.4. Características técnicas del proyecto

Para el mejoramiento e intervención de los corredores viales, se consideraron algunas alternativas planteadas en los estudios y diseños, las cuales se relacionan a continuación:

VÍA CHUSACA – SIBATE – PEAJE SAN MIGUEL – FUSAGASUGA (K1+340-K2+100).

- Alternativa 1: La estructura de pavimento consiste en el fresado de la mezcla asfáltica existente en un espesor promedio de 18 cm de espesor, los cuales fueron verificados con los apiques y con los núcleos que realizaron en este tramo. (Ver anexo 2_Resultado de laboratorio), donde se evaluara la estructura de material granular conformada por carpetas asfálticas envejecidas y materiales granulares no tratados, a fin de establecer si

la plataforma no presenta sitios con material acolchado, donde se evaluaran las deformaciones ante el paso de los equipos de construcción; una vez confirmada la estabilidad de la plataforma se propone implementar una capa intermedia de mezcla asfáltica modificada con grano caucho MDC-25, sobre la cual se fija una estructura capa de mezcla asfáltica MDC- 19.

- Alternativa 2: La estructura de pavimento consiste en el fresado de la mezcla asfáltica existente en un espesor promedio de 18 cm de espesor, los cuales fueron verificados con los apiques y con los núcleos que realizaron en este tramo. (Ver anexo 2_Resultado de laboratorio); una vez confirmada la inestabilidad de la plataforma se propone retirar 20 cm de las carpetas asfálticas envejecidas y reemplazar por una capa de apoyo de material reciclado con base granular y tratado con emulsión y cemento 1%, seguidamente se conforma una capa base e intermedia de mezcla asfáltica MDC-25, sobre la cual se fija una estructura capa de mezcla asfáltica modificada con grano caucho MDC-19.

VÍA PEAJE SAN MIGUEL - FUSAGASUA (K7+320 - K10+910)

-**Alternativa única:** La estructura de pavimento consiste en reciclar 20 cm del material existente (Carpeta asfáltica y porción de material granular existente) para luego conformar una capa de 25 cm de RAP con base granular estabilizada con emulsión, sobre la cual se apoyarán 7 cm de mezcla asfáltica tipo MDC-25, y 7 cm de mezcla asfáltica tipo MDC-19.

VÍA FUSAGASUA (K7+320 - K10+910) - PASCA

-Alternativa 1: Retiro del material asfaltico el cual es poco existente, ya que el tramo predomina en afirmado; para luego excavar la estructura de pavimento que consiste en 60 cm de material de mejoramiento con CBR>10%, 30 cm de subbase granular y 20 cm

de base granular, sobre la cual se fijaran 6 cm de mezcla asfáltica tipo MDC-25, y 6 cm de mezcla asfáltica tipo MDC-19.

-Alternativa 2: Retiro del material asfaltico el cual es poco existente, ya que el tramo predomina en afirmado; para luego excavar la estructura de pavimento que consiste en 60 cm de material de mejoramiento con CBR>10%, 30 cm de subbase granular y 20 cm de base granular estabilizada con emulsión sobre la cual se fijaran 5 cm de mezcla asfáltica tipo MDC-25, y 5 cm de mezcla asfáltica tipo MDC-19.

El diseño de las alternativas en pavimento flexible se realizó bajo la metodología AASHTO 1993 para un período de diseño de 10 años.

Teniendo las alternativas de diseño para cada sector se presentan a continuación las secciones transversales en forma esquemática para los espesores de las diferentes alternativas calculadas:

ESTRUCTURA DE REHABILITACIÓN CALZADA EXISTENTE

Chusaca – Sibaté

Alternativa 1: Pavimento Flexible Estructura (Reforzada)



Alternativa 2: Pavimento Flexible Estructura con Base Estabilizada con Emulsión (Reciclada)



Sibaté - Peaje San Miguel (K1+340-K2+100)

Alternativa 1: Pavimento Flexible Estructura (Reforzada)



Alternativa 2: Pavimento Flexible Estructura con Base Estabilizada con Emulsión (Reciclada)



Estructuras Geotécnicas

Se relaciona a continuación el diseño estructural para las obras de mitigación y estabilización del corredor vial, con base en los análisis y estudio geotécnicos e hidráulicos, específicamente para los sitios críticos 01, 05, 06 y 08, además de las obras hidráulicas menores, del tramo Chusaca – Sibaté – San Miguel – Fusagasugá - Pasca, pertenecientes al grupo 7. El diseño estructural de las obras de estabilización y mitigación para el corredor vial, se ajustan a las normas colombianas de diseño sismo resistente vigentes, se analizaron las estructuras para las condiciones de esfuerzo más desfavorables, en función a su configuración estructural y a los parámetros geotécnicos e hidráulicos del sector.

DISEÑO ESTRUCTURAL OBRA SC N°01

El muro está comprendido por un vástago de 3.00 m de altura y 0.30 m de espesor promedio, apoyado sobre una viga cabezal de 1.80 m de ancho por 1.00 m de altura. La altura del muro, medido desde la corona del muro hasta el desplante de la viga cabezal, es de 4.00m.


Dicho cabezal se encuentra apoyado sobre una fila de caisson, orientados longitudinalmente al muro. Los caisson poseen una sección transversal efectiva de 1.20 m de diámetro y 9.0 m de longitud, con base en las recomendaciones dadas por el especialista en geotecnia.

Figura 5:Grupo 7. Resumen de las dimensiones de la obra SC01

Resumen dimensiones de muro sobre caisson							
Muro	Muro			Viga cabezal		Pilotes (m)	
	H vástago (m)	Espesor (m)	L Modulo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Diámetro (m)	Largo (m)
SC01	3.00	0.30	10.80	1.80	1.00	1.20	9.0

Fuente: Consorcio Estudios V&P, 2022.

Esquema general.

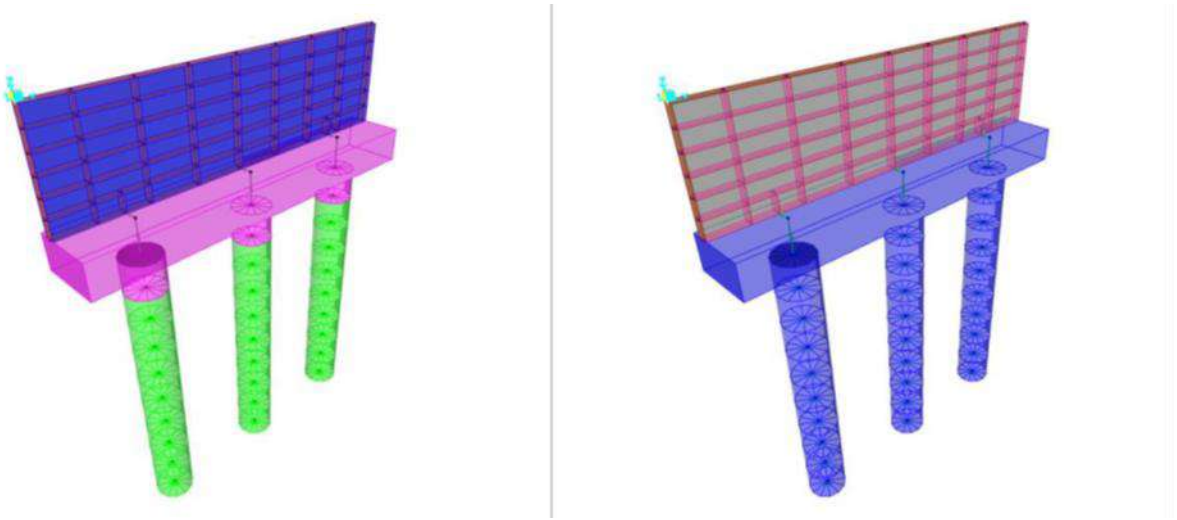

DISEÑO ESTRUCTURAL OBRA DE CONTENCIÓN – SC N°05

La obra de contención está comprendida por una viga cabezal de 1.80 m de ancho y 1.00 m de altura promedio.

Dicho cabezal se encuentra apoyado sobre una fila de caisson, orientados longitudinalmente. Los caisson poseen una sección transversal efectiva de 1.20 m de diámetro y 13.0 m de longitud, con base en las recomendaciones dadas por el especialista en geotecnia.

A continuación, se presenta el listado de las dimensiones de la obra de contención proyectada para diseño, se incluye la altura y ancho de la viga cabezal y la longitud de cada módulo a analizar.

Figura 6: Figura 4: Grupo 7. Resumen de las dimensiones de la obra SC05.

Resumen dimensiones de cabezal sobre caisson							
Muro	Muro			Viga cabezal		Pilotes (m)	
	H vástago (m)	Espesor (m)	L Modulo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Diámetro (m)	Largo (m)
SC05	N.A	N.A	9.00	1.80	1.00	1.20	13.0

Fuente: Consorcio Estudios V&P, 2022

Figura 7: Esquema general SC N° 05



DISEÑO ESTRUCTURAL OBRA SC N°06

El muro está comprendido por un vástago de 3.00 m de altura y 0.30 m de espesor promedio, apoyado sobre una viga cabezal de 1.80 m de ancho por 1.00 m de altura. La altura del muro, medido desde la corona del muro hasta el desplante de la viga cabezal, es de 4.00m.

Dicho cabezal se encuentra apoyado sobre una fila de caisson, orientados longitudinalmente al muro. Los caisson poseen una sección transversal efectiva de 1.20

m de diámetro y 6.0 m de longitud, con base en las recomendaciones dadas por el especialista en geotecnia.


A continuación, se presenta el listado de las dimensiones del muro de contención proyectado para diseño, se incluye la altura y espesor promedio del muro, la altura y ancho de la viga cabezal y la longitud de cada módulo a analizar.

Figura 8: Grupo 7. Resumen de las dimensiones de la obra SC06

Resumen dimensiones de muro sobre caisson							
Muro	Muro			Viga cabezal		Pilotes (m)	
	H vástago (m)	Espesor (m)	L Modulo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Diámetro (m)	Largo (m)
SC06	3.00	0.30	10.80	1.80	1.00	1.20	6.0

Fuente: Consorcio Estudios V&P, 2022.

Esquema general

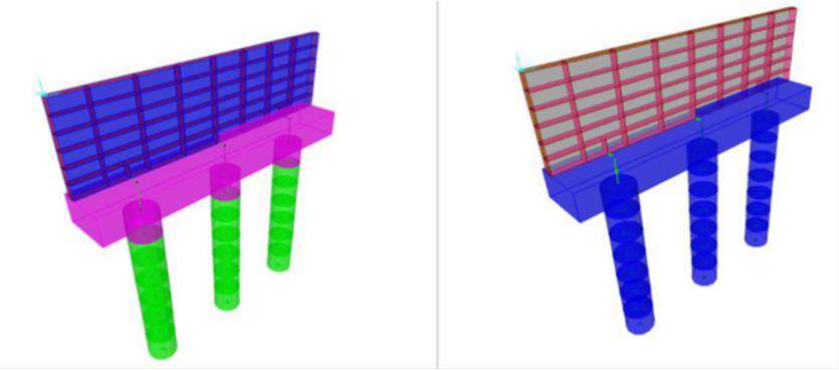

DISEÑO ESTRUCTURAL OBRA DE CONTENCIÓN – SC N°08

La obra de contención está comprendida por una viga cabezal de 1.80 m de ancho y 1.00 m de altura promedio.

Dicho cabezal se encuentra apoyado sobre una fila de caisson, orientados longitudinalmente. Los caisson poseen una sección transversal efectiva de 1.20 m de diámetro y 8.0 m de longitud, con base en las recomendaciones dadas por el especialista en geotecnia.

A continuación, se presenta el listado de las dimensiones de la obra de contención proyectada para diseño, se incluye la altura y ancho de la viga cabezal y la longitud de cada módulo a analizar

Figura 9: Grupo 7. Resumen de las dimensiones de la obra SC08

Resumen dimensiones de cabezal sobre caisson							
Muro	Muro			Viga cabezal		Pilotes (m)	
	H vástago (m)	Espesor (m)	L Modulo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Diámetro (m)	Largo (m)
SC08	N.A	N.A	9.00	1.80	1.00	1.20	8.0

Fuente: Consorcio Estudios V&P, 2022.

Esquema general.



ESPACIO PUBLICO

En este aspecto se buscó realizar el modulación y diseño de espacio público funcional del paso urbano teniendo en cuenta, la condiciones actuales de accesibilidad peatonal,

vehicular, y recomendaciones de las áreas de pavimentos, geotecnia, hidráulica, forestal y ambiental, para garantizar la estabilidad de los andenes proyectado e viales incluidos en el Grupo 7 del contrato 1509 de 2021 suscrito con el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECUN en el marco del contrato interadministrativo N. 087-2021 (FONDECÚN 21-007) suscrito entre el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y FONDECUN.

Se pretende con los estudios y diseños:

- ✓ Definir un Espacio público a partir del alcance definido en los estudios, previos, manteniendo en lo posible el trazado existente de acuerdo a las normas y criterios establecidos en manuales y NTC vigentes para el diseño de espacio público.
- ✓ Proponer un diseño de espacio público que garantice la circulación y facilite el desplazamiento peatonal el tramo de la Aguadita y Agua Bonita.
- ✓ Diseñar los andenes de los pasos urbanos de Aguadita y Agua bonita en los sectores del K5+90 – K12+790.
- ✓ Generar los planos y carteras que permitan replantear el proyecto a partir de referencias topográficas materializadas a lo largo del trazado.

Figura 10: localización sectores espacio público aguadita



Fuente: Google Earth

Figura 11: Localización sectores espacio público agua bonita



Fuente: Google Earth

Figura 12: Ejemplos franja de circulación.


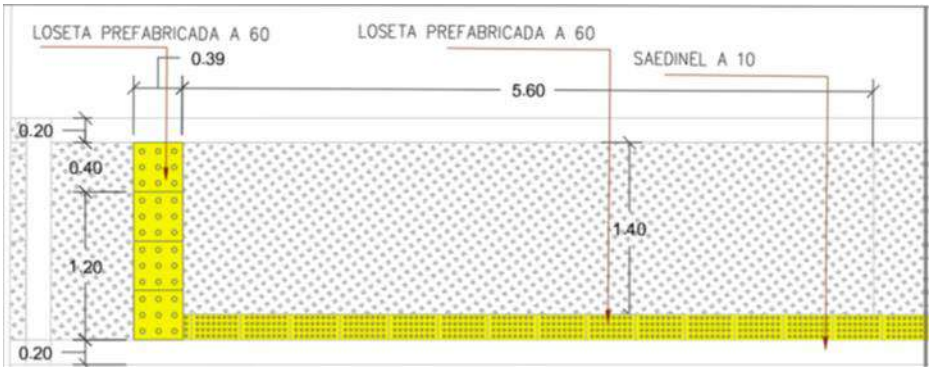


Figura 13: Ejemplo Rampas acceso vehicular.

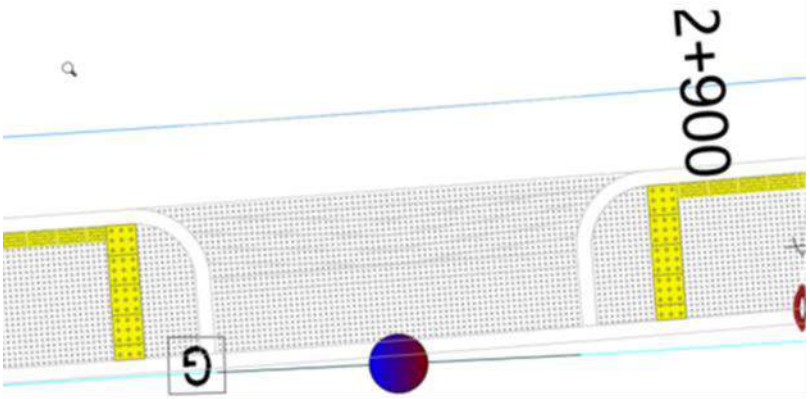

3. Información Contrato de Obra

3.1. Información general contrato de obra

Número del proceso:	ICCU-LP-020 DE 2023
Contrato de Obra Nº:	ICCU 708 DE 2023
Objeto:	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.
Contratista:	**CONSORCIO PASCA CNJ** **NIT: 901.715.912-1** Integrado por: - CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT. 800.140.959-1 (80%) - NAICA INGENIERÍA SAS NIT: 901.635.303-0 (10%) - JMS INGENIERIA SAS NIT 900.527.061-7 (10%)
Valor inicial del Contrato:	DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 17.862.489.434,00)
Valor adiciones:	$ 0.00
Valor acumulado del contrato:	DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 17.862.489.434,00)
Plazo de ejecución inicial:	SEIS (06) MESES QUINCE (15) DIAS
Fecha de iniciación:	01 de agosto de 2023
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2023.
Plazo de ejecución inicial:	CINCO (05) MESES.
Plazo de ejecución actual:	NUEVE (09) MESES OCHO (08) DIAS
Fecha de terminación actual:	08 de mayo del 2024

3.2. Actividades ejecutadas en el mes

Durante el periodo y dada la obligación contractual de continuar la ejecución de las obras programadas, el contratista avanzo en la ejecución de actividades de los tramos PR 07+2376 AL PR 07+520 (Frente de obra No 03); PR 09+986 PR 09+774 al PR 10+240 (Frente de obra No 04), PR 10+260 al PR 10+660 (Frente de obra No 05), entre el PR 07+500 al PR 08+487 (Frente de obra No 07), PR 08+135 al PR 08+300 (Frente de Obra Pasca – Paso Malo), e inicio los trabajos correspondientes a la demarcación vial.

En este periodo se continuo con la intervención del espacio público en el sector de Aguadita (Municipio de Fusagasugá), correspondiente a la construcción de la berma cuneta con un espesor de 20cm de concreto de 3000 PSI, constada de doble parrilla de acero para garantizar una resistencia al paso del flujo vehicular, geotextil, geocelda con material de sitio 17cm y material estabilizado 15cm. La estructura del andén peatonal conformada por bordillo prefabricado, geotextil, geocelda con material de sitio 17cm, material estabilizado 15cm, concreto estampado con un espesor de 10cm de 3000 PSI y loseta A20. La intervención en este periodo se desarrolló con dos frentes de obra en el sector derecho del PR 12+990 al PR 13+100; En el sector izquierdo del PR 12+880 al PR13+170.

En este periodo se continuo con la intervención del espacio público en el sector de Agua Bonita (Municipio de Silvania), correspondiente a la construcción de la berma cuneta con un espesor de 20cm de concreto de 3000 PSI, con doble parrilla de acero para garantizar una resistencia al paso del flujo vehicular, geotextil, geocelda con material de sitio 17cm y material estabilizado 15cm. La estructura del andén peatonal conformada por bordillo prefabricado (en un solo costado), geotextil, geocelda con material de sitio 17cm, material estabilizado 15cm, concreto estampado con un espesor de 10cm de 3000 PSI. La

intervención en este periodo se desarrolló con el frente de obra por el sector derecho del PR 06+010 al PR 06+110 y del PR 06+250 al PR 06+310.

A continuación, se presenta el detalle de las actividades ejecutadas en cada frente de obra:

FRENTE DE OBRA No 03

REHABILITACION SECTOR PR 07+896 AL PR 08+300 VIA PEAJE SAN MIGUEL-FUSA

ITEM 2.9: Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km): Esta actividad implico la excavación mecánica para la construcción del gavión entre el PR 08+038 al PR 08+075 costado izquierdo.

ITEM NP 014: Gavión: Esta actividad se ejecutó con el llenado de mallas de 2x1x1 mts entre el del PR 08+038 al PR 08+075 costado izquierdo de la vía.

FRENTE DE OBRA No 04

REHABILITACION SECTOR PR 09+774 AL PR 10+240 VIA PEAJE SAN MIGUEL-FUSA

ITEM 2.9: Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km): Esta actividad implico la excavación mecánica para la construcción del descole de la alcantarilla en tubería de 36" en el PR 09+890.

ITEM 3.2: Subbase Granular: Esta actividad corresponde al mejoramiento de la subrasante entre el PR 10+085 al PR 10+150.

ITEM.4.16: Cuneta de concreto, 3000 PSI fundida en el lugar: En esta actividad se realizó la construcción de la losa y el bordillo de la cuneta entre el PR 10+080 al PR 10+140 costado izquierdo.

ITEM 4.52: Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI: Suministro, figurado y armado de acero implementado en la fundición de las estructuras del encole y descole de alcantarillas en el PR 09+890 costado izquierdo.

ITEM 4.6: Concretos f´c =3000 PSI (Bases): Esta actividad comprende las estructuras horizontales en concreto de 3000 PSI del encole y descole en el PR 09+890.

ITEM 4.7: Concretos f´c =3000 PSI (Elevaciones): Esta actividad comprende las estructuras verticales en concreto de 3000 PSI del encole y descole en el PR 09+890

ITEM 5.2: Adoquín de arcilla 20X10X8CM: Corresponde a esta actividad la reinstalación del adoquín entre el PR 10+080 al PR 10+150.

ITEM NP 004: Refuerzo malla electrosoldada: En esta actividad se realizó la instalación del refuerzo para la losa de la cuneta entre el PR 10+080 al PR 10+140 costado izquierdo.

FRENTE DE OBRA No 05

REHABILITACION SECTOR PR 10+410 AL PR 10+660 VIA PEAJE SAN MIGUEL-FUSA

ITEM 2.9: Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km): Esta actividad implico la excavación mecánica para la construcción del filtro entre el PR 10+517 al PR 10+551 costado izquierdo.

ITEM 3.11- Tubería drenaje PVC 110 : Esta actividad comprende la instalación de tubería para filtros del PR 10+520 al PR 10+560, por el costado izquierdo de la vía y por el respaldo del gavión entre el PR 10+520 al PR 10+552.

ITEM.4.16: Cuneta de concreto, 3000 PSI fundida en el lugar: En esta actividad se realizó la construcción de la losa y el bordillo de la cuneta entre el PR 10+520 al PR 10+570 costado izquierdo.

ITEM 4.23 Material granular filtrante: Esta actividad comprende la instalación de material granular filtrante para el filtro frontal y paralelo a la vía entre el PR 10+520 al PR 10+552,

por el costado izquierdo de la vía y para el filtro de espalda del gavión entre el PR 10+520 al PR 10+552.

ITEM 4.42. Suministro e instalación de geotextil NT 2500 (estabilización, filtro y separación) : Esta actividad comprende la instalación de Geotextil para el filtro frontal y paralelo a la vía entre el PR 10+518 al PR 10+573, por el costado izquierdo de la vía y para el filtro de espalda del gavión entre el PR 10+517 al PR 10+551.

ITEM NP 004: Refuerzo malla electrosoldada: En esta actividad se realizó la instalación del refuerzo para la losa de la cuneta entre el PR 10+520 al PR 10+570 costado izquierdo.

FRENTE DE OBRA No 07

REHABILITACION SECTOR PR 07+500 AL PR 08+487 – SECTOR SAN MIGUEL

ITEM.1.1: Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km): La actividad comprendió la demolición de las cunetas del PR 08+062 al PR 08+112.

ITEM 2.9: Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km): Esta actividad implico la excavación mecánica para la construcción de las cunetas reforzadas entre el PR 07+500 al PR 07+761 costado izquierdo, PR 07+788 al PR 07+825 costado derecho, del PR 07+938 al PR 08+057 costado izquierdo, del PR 08+063 al PR 08+123 costado derecho y del PR 07+938 al PR 08+062 costado derecho.

ITEM 4.23: Relleno para Estructuras: Esta actividad corresponde al mejoramiento de suelo de fundación de las cunetas entre el PR 07+500 al PR 07+765 costado izquierdo, del PR 08+065 al PR 08+115 costado derecho y del PR 08+250 al PR 08+323 costado izquierdo.

ITEM 4.52: Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI: Suministro, figurado y armado de acero implementado en la fundición de cunetas, de doble parrilla de acero de ½" cada 15cm. sector izquierdo entre el PR 07+7500 al PR 07+661 costado izquierdo / PR 08+093 al PR 08+110 costado derecho / PR 08+191 al PR 08+240 costado

izquierdo / PR 08+065 al PR 08+123 costado izquierdo y del PR 08+327 al PR 08+330 costado izquierdo.

ITEM.013: Cuneta de concreto, 3000 PSI acelerado a 3 días fundida en el lugar: En esta actividad se realizó la construcción de la losa de la cuneta entre el PR 07+7500 al PR 07+661 costado izquierdo / PR 08+093 al PR 08+110 costado derecho / PR 08+191 al PR 08+240 costado izquierdo / PR 08+065 al PR 08+123 costado izquierdo y del PR 08+327 al PR 08+330 costado izquierdo.

FRENTE DE OBRA PASCA

SECTOR PASO MALO PR 08+130 AL PR 08+300.

ITEM.1.1: Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km): La actividad comprendió la demolición del box culvert existente en el PR 08+195 en una sección de 2x2 mts.

ITEM 2.9: Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km): Esta actividad implico la excavación mecánica para la conformación de la estructura del pavimento articulado entre el PR 08+135 al PR 08+301.

ITEM.3.1: Fresado concreto asfáltico (e=5-15 cm): En esta actividad comprendió el fresado en un espesor de 0.12 mts de la carpeta existente de los sectores con afectación sobre la carpeta y de acuerdo al abcisado de la vía, para el cual el PR 0+000 se encuentra en la salida de Fusagasugá hacia Pasca en los siguientes sectores: PR 08+295 al PR 08+324 y del PR 08+377 al PR 08+404. El fresado del tramo se reutilizo en el articulado de paso malo de acuerdo al diseño y se entregó a la alcaldía de Fusagasugá por instrucción del ICCU.

ITEM 3.2: Subbase Granular: Esta actividad corresponde al mejoramiento de la subrasante entre el PR 08+135 al PR 08+301.

ITEM 3.6: Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 : Esta actividad se realizó como preliminar para la instalación de la segunda capa de MDC para bacheo, PR 08+295 al PR 08+324 y del PR 08+377 al PR 08+404.

ITEM.3.11: Mezcla densa en caliente para bacheo (incluye cemento asfáltico): Se realizo la instalación de la MDC en dos capas debido al espesor y teniendo en cuenta la especificación para la actividad, la cual incluyo la MDC en los PR 08+295 al PR 08+324 y del PR 08+377 al PR 08+404, en un espesor de 0.12 mts.

ITEM 3.11- Tubería drenaje PVC 110 : Esta actividad comprende la instalación de tubería para filtros del PR 08+139 al PR 08+190/ del PR 08+197 al PR 08+240 y del PR 08+246 al PR 08+300 por el costado izquierdo de la vía.

ITEM.4.16: Cuneta de concreto, 3000 PSI fundida en el lugar: En esta actividad se realizó la construcción de la losa y el bordillo de la cuneta entre el PR 08+134 al PR 08+190 y del PR 08+197 al PR 08+241 y del PR 08+246 al PR 08+301, costado izquierdo.

ITEM 4.23 Material granular filtrante: Esta actividad comprende la instalación de material granular filtrante para el filtro paralelo a la vía entre el PR 08+139 al PR 08+190/ del PR 08+197 al PR 08+240 y del PR 08+246 al PR 08+300 por el costado izquierdo de la vía.

ITEM 4.42. Suministro e instalación de geotextil NT 2500 (estabilización, filtro y separación) : Esta actividad comprende la instalación de Geotextil para el filtro PR 08+139 al PR 08+190/ del PR 08+197 al PR 08+240 y del PR 08+246 al PR 08+300 por el costado izquierdo de la vía.

ITEM 4.52: Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI: Suministro, figurado y armado de acero implementado en la fundición de la reparación del box culvert de doble parrilla de acero de ½" y conectores de ¾" y el acero para la doble parrilla de las bermas cunetas entre el PR 07+500 al PR 07+761 costado izquierdo, del PR 08+093 al PR 08+110 costado derecho, del PR 08+191 al PR 08+240 costado izquierdo y del PR 08+065 al PR 08+123 costado izquierdo.

ITEM 4.6: Concretos f´c =4000 PSI (Bases): Esta actividad comprende las estructuras horizontales en concreto de 4000 PSI del box culvert reparado en el PR 08+195.

ITEM 4.7: Concretos f´c =4000 PSI (Elevaciones): Esta actividad comprende las estructuras verticales en concreto de 4000 PSI del box culvert reparado en el PR 08+195.

ITEM 5.15: Sardinel prefabricado A10: En esta actividad se realizó la instalación de una sola línea de sardinel con función de confinamiento para la estructura del pavimento articulado, en el sector izquierdo del PR 08+139 al PR 08+300. En el sector derecho PR 08+139 al PR 08+300.

ITEM NP 004: Refuerzo malla electrosoldada: En esta actividad se realizó la instalación del refuerzo para la losa y el bordillo de la cuneta entre el PR 08+134 al PR 08+190 y del PR 08+197 al PR 08+241 y del PR 08+246 al PR 08+301, costado izquierdo costado izquierdo.

FRENTE DE OBRA ESPACIO PUBLICO

ESPACIO PUBLICO AGUADITA PR 12+820 AL PR 13+175.

ITEM.1.1: Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km): La actividad comprendió la demolición de estructura existente de concreto del PR 13+200 al PR 13+230.

ITEM 4.42. Suministro e instalación de geotextil NT 2400 (estabilización, filtro y separación): Esta actividad comprende la instalación de Geotextil para la instalación de geocelda en el sector izquierdo del PR 12+930 al PR 13+060.

ITEM 5.4: Andén concreto 3000 psi en sitio e=0.1m: Fundición de anden en concreto de 300PSI para generar superficie de transpirabilidad en el peatón en el sector izquierdo del PR 12+820 al PR 12+840. En el sector derecho PR 12+925 al PR 12+970 y PR 13+050 al PR 13+175.

ITEM 4.52: Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI: Suministro, figurado y armado de acero implementado en la doble parrilla de acero de ½" del PR 12+930 al PR 13+060.

ITEM. NP 002: Andén concreto 3000 psi e=0.15m: Esta actividad comprende la fundida de anden peatonal entre el PR 12+930 al PR 13+060 costado izquierdo, PR 132+080 costado izquierdo, PR 13+105 al PR 13+170 costado derecho y en el PR 12+940 costado derecho.

ITEM. NP 003: Estampado para concreto (acabado y curado, suministro y mano de obra. incluye juego de moldes, endurecedor de cuarzo, desmoldante en polvo, sellador acrílico transparente semilustre): En esta actividad se ejecuta el acabado en estampado sobre el concreto fundido en el andén sector izquierdo del PR 12+820 al PR 12+840. En el sector derecho PR 12+925 al PR 12+970 y PR 13+050 al PR 13+175.

ITEM. NP 004: Refuerzo malla electrosoldada: Malla implementada para la fundición del andén en concreto, generándole así mismo mayor resistencia entre el PR 12+930 al PR 13+060 costado izquierdo, PR 13+105 al PR 13+170 costado derecho, del PR 13+180 al PR 13+230 costado derecho y en el PR 12+940 costado derecho.

ITEM. NP 005: Geocelda HDP perforada, altura 15cm (suministro e instalación.): Esta actividad comprende la instalación de la geocelda a la profundidad de la excavación en la conformación de la berma cuneta y el andén en el sector del PR 12+930 al PR 13+025 costado izquierdo y del PR 13+180 al PR 13+230 costado derecho.

NP 006: Loseta de concreto a20 tipo panot TR. liviano 20x20x6cm color ocre y/o terracota o similar (suministro e instalación. incluye base 4cm arena nivelación y arena de sello) : Loseta utilizada para servir a la función de guía en las personas con discapacidad, sirviéndoles así mismo de guía en el recorrido del espacio público y dando señales de alerta en los cambios de nivel el sector izquierdo del PR 12+930 al PR 13+025 costado izquierdo y del PR 13+180 al PR 13+230 costado derecho.

ITEM. NP 009: Relleno con material del sitio mejorado con 3% de cemento compactado mecánicamente: En esta actividad se presenta el estabilizado del material de sitio

implementando 3% de cemento. Capa instalada sobre el material de lleno de la geocelda, con una altura de 15cm del PR 12+930 al PR 13+025 costado izquierdo y del PR 13+180 al PR 13+230 costado derecho.

FRENTE DE OBRA ESPACIO PUBLICO

ESPACIO PUBLICO AGUABONITA PR 06+010 AL PR 06+280.

ITEM.1.1: Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km): La actividad comprendió la demolición de la estructura de anden y cuneta existente entre el PR 06+092 al PR 06+195.

ITEM.2.9: Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km): En esta actividad se realizó la excavación para la conformación de anden y berma cuneta a una profundidad de 0.52m. En el sector derecho del PR 06+110 al PR 06+245.

ITEM 4.42. Suministro e instalación de getextil NT 2400 (estabilización, filtro y separación): Esta actividad comprende la instalación de Geotextil para la instalación de geocelda en el sector izquierdo del PR 12+820 al PR 12+840. En el sector derecho del PR 06+010 al PR 06+040/ PR 06+040 al PR 06+060/ PR 06+060 al PR 06+070/ PR 06+092 al PR 06+125/PR 06+125 al PR 06+135.

ITEM 4.52: Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI: Suministro, figurado y armado de acero implementado en la doble parrilla de acero de ½" del PR 06+010 al PR 06+040/ PR 06+040 al PR 06+060/ PR 06+060 al PR 06+070/ PR 06+092 al PR 06+125/PR 06+125 al PR 06+135.

ITEM 5.4: Andén concreto 3000 psi en sitio e=0.1m: Fundición de anden en concreto de 300 PSI para generar superficie de transpirabilidad en el peatón En el sector derecho del PR 06+110 al PR 06+245.

NP 003: Estampado para concreto (acabado y curado, suministro y mano de obra. incluye juego de moldes, endurecedor de cuarzo, desmoldante en polvo, sellador acrílico transparente semilustre): En esta actividad se ejecuta el acabado en estampado sobre el concreto fundido en el andén sector derecho del PR 06+110 al PR 06+245.

NP 005: Geocelda HDP perforada, altura 15cm (suministro e instalación.): Esta actividad comprende la instalación de la geocelda a la profundidad de la excavación en la conformación de la berma cuneta y el andén En el sector derecho del PR 06+110 al PR 06+245.

NP 009: Relleno con material del sitio mejorado con 3% de cemento compactado mecánicamente: En esta actividad se presenta el estabilizado del material de sitio implementando 3% de cemento. Capa instalada sobre el material de lleno de la geocelda, con una altura de 15cm, en el sector derecho del PR 06+110 al PR 06+245.

FRENTE DE OBRA SEÑALIZACION

DEMARACION HORIZONTAL

Se inicio con la demarcación horizontal con líneas laterales blancas y de eje amarilla en los tramos intervenidos para mantenimiento vial así:

K 1+340	K2+100	TRAMO 1
K 7+276	K7+520	TRAMO 2
K7+896	K8+305	TRAMO 3
K 9+774	K10+240	TRAMO 4
K10+260	K10+660	TRAMO 5
K10+660	K10+910	TRAMO 6
K 07+600	K 08+487	TRAMO 7
K 12+790	K 13+390	AGUADITA
K15+336	K15+398	BACHEO VIA AGUADITA - FUSAGASUGA
K15+706.3	K15+750,5	BACHEO VIA AGUADITA - FUSAGASUGA
K15+938.3	K15+982.4	BACHEO VIA AGUADITA - FUSAGASUGA
K16+100	K16+132.9	BACHEO VIA AGUADITA - FUSAGASUGA
K16+192.3	K16+219.6	BACHEO VIA AGUADITA - FUSAGASUGA
K16+400	K16+462,2	BACHEO VIA AGUADITA - FUSAGASUGA
K17+200	K17+248,6	BACHEO VIA AGUADITA - FUSAGASUGA
K17+300	K17+352,5	BACHEO VIA AGUADITA - FUSAGASUGA

K17+400	K17+475,5	BACHEO VIA AGUADITA - FUSAGASUGA
K17+600	K17+625,7	BACHEO VIA AGUADITA - FUSAGASUGA
K17+700	K17+749,1	BACHEO VIA AGUADITA - FUSAGASUGA
K17+884,00	K17+928,80	BACHEO VIA AGUADITA - FUSAGASUGA
K18+075,00	K18+104,50	BACHEO VIA AGUADITA - FUSAGASUGA
K18+134,50	K18+159,60	BACHEO VIA AGUADITA - FUSAGASUGA
K19+884,70	K19+927,80	BACHEO VIA AGUADITA - FUSAGASUGA
K14+924,80	K14+979,60	BACHEO VIA AGUADITA - FUSAGASUGA
K14+892,00	K14+892,00	BACHEO VIA AGUADITA - FUSAGASUGA
K9+625,20	K9+717,20	BACHEO PASCA - FUSAGASUGA
K9+566,80	K9+624,57	BACHEO PASCA - FUSAGASUGA
K9+314,10	K9+348,11	BACHEO PASCA - FUSAGASUGA
K9+198,20	K9+236,19	BACHEO PASCA - FUSAGASUGA
K9+077,15	K9+116,56	BACHEO PASCA - FUSAGASUGA
K9+036,00	K9+049,53	BACHEO PASCA - FUSAGASUGA
K8+924,14	K8+960,40	BACHEO PASCA - FUSAGASUGA
K8+902,20	K8+973,24	BACHEO PASCA - FUSAGASUGA
K8+791,30	K8+841,23	BACHEO PASCA - FUSAGASUGA
K8+377,70	K8+403,61	BACHEO PASCA - FUSAGASUGA
K8+295,50	K8+324,42	BACHEO PASCA - FUSAGASUGA
K8+295,50	K8+973,24	BACHEO PASCA - FUSAGASUGA

3.3. Seguimiento ítems no previstos

Debido a la evaluación de los diseños por parte de la Interventoría y del contratista y a los conceptos de sus Especialistas de pavimentos, y estructuras, se encontró algunas discrepancias para la ejecución de actividades en la Rehabilitación y mantenimiento vial, las estructuras para los sitios críticos y el espacio público; por tal razón surgieron actividades no contractuales que implicaron la presentación de ítems no previstos, los cuales el contratista de obra presentó para la revisión y análisis por parte de la interventoría.

NP-01.- Colocación de material de fresado para actividad de tapahuecos, incluye adición de emulsión asfáltica para mejorar adherencia. No incluye transporte.

NP-02.- Andén concreto 3000 psi e=0.15m.

NP_003.- Estampado para concreto (acabado y curado, suministro y mano de obra. incluye juego de moldes, endurecedor de cuarzo, desmoldante en polvo, sellador acrílico transparente semilustre).

NP_004.- Refuerzo malla electrosoldada.

NP_005.-Geocelda HDPE perforada, altura 15 cm (suministro e instalación).

NP_006.-Loseta de concreto a20 tipo PANOT tr. liviano 20x20x6cm color ocre y/o terracota o similar (suministro e instalación. incluye base 4cm arena nivelación y arena de sello).

NP_007.-Pilote en concreto de 4000 psi, diámetro 1.2 m. diámetro 1,2 m construcción manual (incluye excavación en cualquier tipo de material, refuerzo y anillos).

Mediante modificatorio No. 1 al contrato de obra, de fecha 29 de septiembre de 2023, de acuerdo a los nombres, valores y cantidades que se relacionan a continuación:

N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	NP001	BASE ESTABILIZADA CON 1.5% DE CEMENTO Y CON 4.5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	6171,75	553.094,52	3.413.561.103,81
2	NP002	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI E=0.15M	M2	1887,01	107.177,02	190.922.048,51
3	NP003	ESTAMPADO PARA CONCRETO (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE).	M2	1887,01	48.199,49	90.952.919,62
4	NP004	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	17999,00	11.785,10	212.120.014,90
5	NP005	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	2119,39	66.278,80	140.470.493,37
6	NP006	LOSETA DE CONCRETO A20 TIPO PANOT TR. LIVIANO 20X20X6CM COLOR OCRE Y/O TERRACOTA O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM	M2	235,79	121.237,08	28.586.733,57

		ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)				
7	NP007	PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO 1.2M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS EN CONCRETO MEZCLADO EN OBRA)	ML	168,00	6.513.559,69	1.094.278.027,92

El contratista presentó para revisión y aprobación de la interventoría los NP_008 y NP_009, los cuales se relacionan a continuación:

NP_008.-Relleno con material del sitio compactado mecánicamente.

NP_009.-Relleno con material del sitio mejorado con 3% de cemento compactado Mecánicamente.

La interventoría mediante comunicación CONT-ICCU-708-2023-049 de fecha 03 de octubre de 2023, revisó y aprobó la información entregada por el contratista de los NPs 008 y 009. En esta misma comunicación se solicitó al contratista la presentación a la interventoría de los NPs firmados, acompañados por el acta de mayores y menores cantidades. El contratista mediante comunicación CNJ-ICCU708-O-0134 de fecha 25 de octubre de 2023, remitió debidamente diligenciados y firmados los NPs 008 y 009 junto con el acta de mayores y menores cantidades del contrato. Mediante comunicación ADM-ICCU-815-2023-058 radicado ICCU 2023011812 de fecha 27 de octubre de 2023, la interventoría realizó la entrega a la entidad contratante los NPs 008 y 009, junto con el acta de con el acta de menores y mayores cantidades, debidamente revisadas, aprobadas y firmadas por el contratista y la interventoría, para continuar el trámite de aprobación por parte de la entidad contratante.

Así mismo, el contratista presentó para revisión y aprobación de la interventoría mediante comunicación CNJ-ICCU708-O-0135 de fecha 25 de octubre de 2023 el **NP_010MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)**, y mediane

comunicación CNJ-ICCU708-O-0132 de fecha 23 de octubre de 2023, realizó la entrega de los NP_011 y NP012, los cuales se relacionan a continuación:

NP_011.- Mezcla densa en caliente MDC-19 con cemento asfaltico modificado tipo III.

NP_012.- Suministro e instalación de geomalla de refuerzo BX-50.

Mediante comunicación CONT-ICCU-708-2023-083 de fecha 24/11/2023, la Interventoría aprobó una vez atendidas las observaciones por parte del contratista el NP 012 Suministro e instalación de geomalla de refuerzo BX-50; Actualmente.

Mediante modificatorio No. 3 al contrato de obra, la entidad aprobó la inclusión de los NPs 10, 11 y 12, de acuerdo a los nombres, valores y cantidades que se relacionan a continuación:

N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	NP010	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1154.78	$1,050,224.60	1,212,778,363.59
2	NP011	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD-19 CON CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO TIPO III	M3	934.32	$1,379,953.35	1,289,318,013.97
3	NP012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO R-50	M2	5614.00	$12,384.23	69,525,067.22

El contratista mediante oficio CNJ-ICCU708-O-0292 de fecha 19 de febrero del 2024, presento para revisión y aprobación el APU NP 013 – CUNETA DE CONCRETO 3000 PSI ACLERADA A TRES DIAS Y FUNDIDAD EN EL LUGAR, fue revisada y aprobada previo observaciones realizadas por la Interventoría, la cual mediante oficio CONT-ICCU-708-2023-136 de febrero 19 del 2024, aprobó el APU.

El contratista mediante oficio CNJ-ICCU708-O-0244 de fecha 10 de diciembre del 2023, presento concepto de especialista en geotecnia y el APU NP 014 -GAVION, el cual fue revisado y previo a observaciones la Interventoría mediante Oficio CONT-ICCU-708-2023-137 del 19 de febrero del 2024, aprobó el APU. Se relacionan a continuación los APUs aprobados:

NP_013.-Cuneta de concreto, 3000 PSI acelerada a Tres días fundida en el lugar.
NP_014.-Gavion.

Mediante modificatorio No. 4 al contrato de obra, la entidad aprobó la inclusión de los NPs 13 y 14, de acuerdo a los nombres, valores y cantidades que se relacionan a continuación:

N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	NP013	CUNETA DE CONCRETO, 3000 PSI ACELERADA A TRES DÍAS FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	931	$784,539.92	730,406,665.52
2	NP014	GAVION	M3	500	$221,082.00	110,541,000.00

4. Reportes ejecución mensual contrato de obra

4.1. Informe semanal

A continuación, se anexan los informes semanales del 31 al 34, en el formato MS-GP-FR-034 INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	

PERIODO DE INFORME SEMANAL

	COPEBA SAS	**FECHA**	04/03/2024	**SEMANA No.**	**31**	DEL	**26-feb-24**	AL	**03-mar-24**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE-FUSAGASUGA-PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	VIA SIBATE - FUSAGASUGA - PASCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	815 DEL 2023	**CONTRATO No.:**	708 DEL 2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES, QUINCE (15) DIAS	**PLAZO INICIAL:**	6 MESES, QUINCE (15) DIAS
CONTRATISTA:	COPEBA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO PASCA CNJ
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de agosto de 2023	**FECHA DE INICIACIÓN:**	1 de agosto de 2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE MARZO DEL 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30 DE MARZO DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	242 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	242 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	DOSCIENTOS CATORCE (214) DIAS	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	DOSCIENTOS CATORCE (214) DIAS
VALOR INICIAL :	$ 1,032,790,821	**VALOR INICIAL :**	$ 17,678,836,940
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1,032,790,821	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 17,678,836,940
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 1,032,790,821	**VALOR POR PAGAR:**	$ 17,678,836,940
VALOR ANTICIPO:	$ -	**VALOR ANTICIPO:**	$ 5,358,746,830
SUPERVISOR:	JAISON FONSECA MARIÑO	**SUPERVISOR:**	JAISON FONSECA MARIÑO

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

FRENTE DE OBRA No 04: PR 09+774 AL PR 10+240 : INSTALACION DE ARENA Y ADOQUIN COSTADO IZQUIERDO PR 10+085 AL PR 10+120. **FRENTE DE OBRA No 05**: PR 10+260 AL PR 10+660 : ARMADO DE MALLAS PARA GAVION PR 10+520 AL PR 10+530 COSTADO IZQUIERDO. **FRENTE DE OBRA No 07**: PR 07+500 AL PR 08+487 (SAN MIGUEL): EXCAVACION, CORTE Y FIGURADO DE ACERO Y FUNDIDA DE CONCRETO ACELERADO PR 07+922 AL PR 08+050 COSTADO DERECHO Y FUNDIDA DE CUNETA PR 08+164 AL PR 08+240 COSTADO IZQUIERDO. **FRENTE DE OBRA PASCA (PASO MALO)**: EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE PENDIENTE LONGITUDINAL E INSTALACION DE FRESADO DEL PR 08+135 AL PR 08+300, CARRIL IZQUIERDO Y DEL PR 08+135 AL PR 08+200 CARRIL DERECHO. DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO AREA AFECTADA EN EL BOX EXISTENTE. BACHEO EN 10 AREAS EN SENTIDO PASCA- FUSAGASUGA. **ESPACIO PUBLICO LA AGUADITA**: SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION, INSTALACION DE GEOTEXTIL, GEOCELDA, MEJORAMIENTO DE SUELO E INSTALACION DE BORDILLOS, FUNDIDA DE BERMA CUNETAS EN CONCRETO ACELERADO Y FUNDIDA DE CONCRETO ESTAMPADO POR EL COSTADO DERECHO Y POR EL COSTADO IZQUIERDO SE INICIARON ACTIVIDADES DE EXCAVACION, INSTALACION DE GEOCELDA, RELLENO Y FUNDIDAD DE ANDEN ESTAMPADO. **FRENTE DE OBRA ESPACIO PUBLICO AGUABONITA**: SE REALIZO EXCAVACION, INSTALACION DE GEOTEXTIL, GEOCELDA Y RELLENO DE GEOCELDA E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL ESTABILIZADO Y FUNDIDA DE BERMA CUNETA EN CONCRETO ACELERADO DEL PR 06+180 AL PR 06+240.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
2.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	10-ago-23	24-nov-23	106	21-sep-23		ejecución	-42	ejecución
2.9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	10-ago-23	01-nov-23	83	10-ago-23		ejecución	0	ejecución
NP 07	PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIAMETRO 1.2M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS EN CONCRETO MEZCLADO EN OBRA)	29-ago-23	11-nov-23	74	08-ago-23	11-oct-23	Fin	21	Fin
3.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-15 cm)	22-ago-23	29-dic-23	129	22-ago-23	12-ene-24	Fin	0	-14
3.5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	07-nov-23	29-dic-23	52	20-nov-23	12-feb-24	Fin	-13	-45
3.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	22-sep-23	20-ene-24	120	29-sep-23		ejecución	-7	ejecución
3.9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	22-sep-23	20-ene-24	120	29-sep-23		ejecución	-7	ejecución
NP 001	BASE ESTABILIZADA CON 1,5% DE CEMENTO Y CON 4,5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	01-sep-23	18-ene-24	139	29-ago-23		ejecución		ejecución
1.6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	01-ago-23	30-ago-23	29	08-ago-23		ejecución	-7	ejecución
3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	09-sep-23	25-dic-23	107	21-sep-23		ejecución	-12	ejecución
3.11	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)			0	24-nov-23		ejecución		ejecución
4.16	CUNETA DE CONCRETO, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	13-nov-23	24-nov-23	11	18-oct-23		ejecución	26	ejecución
4.23	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	09-sep-23	25-dic-23	107	21-sep-23		ejecución	-12	ejecución
4.24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES								
4.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500	06-nov-23	24-nov-23	18	21-sep-23		ejecución	46	ejecución
4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	22-nov-23	12-dic-23	20	18-sep-23		ejecución	65	ejecución
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	21-oct-23	08-nov-23	18	30-oct-23		ejecución	-9	ejecución

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	

PERIODO DE INFORME SEMANAL

	COPEBA SAS	FECHA	04/03/2024	SEMANA No.	31	DEL	26-feb-24	AL	03-mar-24

NP 004	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	13-nov-23	24-nov-23	11	16-oct-23		ejecución	28	ejecución
NP 005	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	25-oct-23	13-nov-23	19	18-oct-23		ejecución	7	ejecución
NP 008	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	28-oct-23	16-nov-23	19	18-oct-23		ejecución	10	ejecución
NP 009	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO MEJORADO CON 3% DE CEMENTO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	01-nov-23	20-nov-23	19	18-oct-23		ejecución	14	ejecución
NP 010	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	01-nov-23	12-ene-24	72	01-nov-23		ejecución	0	ejecución
NP 011	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD-19 CON CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO TIPO III	01-nov-23	14-ene-24	74	27-nov-23	06-dic-23	10	-26	39
NP 012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO R-50	01-nov-23	14-ene-24	74	27-nov-23	06-dic-23	10	-26	39
NP 013	CUNETA DE CONCRETO, 3000 PSI ACELERADO A 3 DÍAS FUNDIDA EN EL LUGAR	15-dic-23	29-feb-24	76	15-dic-23		ejecución	0	ejecución
NP 014	GAVION	01-feb-24	29-feb-24	28	12-feb-24		ejecución	-11	ejecución

Plazo del proyecto: 242 días


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	77.89%	75.93%	-1.97%
Durante el periodo	2.39%	3.91%	1.53%
Acumulado Actual	80.28%	79.84%	-0.44%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

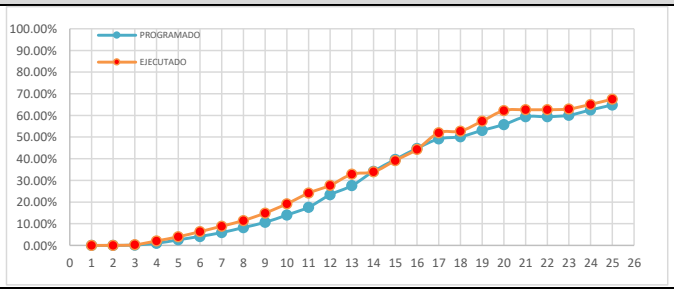

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
242	215.00	27	-1.07

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 13,770,553,186	$ 13,422,910,805	97%
Durante el periodo	$ 422,179,950	$ 691,898,838	164%
Acumulado Actual	$ 14,192,733,136	$ 14,114,809,643	99%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

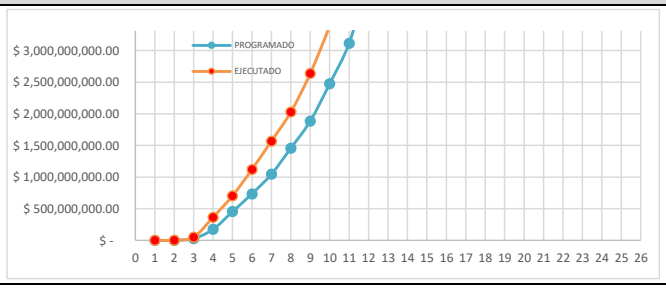


AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-1%

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 3,936,746,830	$ 3,936,746,830	100%
Durante el periodo	$ 474,000,000	$ 474,000,000	100%
Acumulado Actual	$ 4,410,746,830	$ 4,410,746,830	100%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

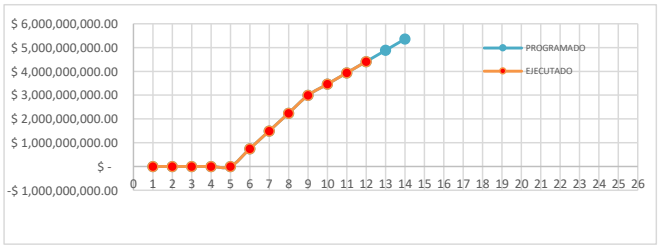

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

0%

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Se realizo visita por parte del especialista Ambiental de la Interventoria y el Contratista a los sitios de acopio temporal de la obra y al Tramo 3 donde se construiran los gaviones evidenciando una posible intervencion sobre la vegetacion del area.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

El 28 de febrero de 2024, se realizó visita a la Secretaría de Infraestructura del municipio de Fusagasugá con el fin de verificar los paz y salvos y cierres correspondientes por parte de la administración para adelantar el proceso de liquidación del contrato, así mismo, se indaga sobre la titularidad del lote en el sector la aguadita para socializar el procesos del espacio público es esta zona, luego se realizó acompañamiento a la parte social en la socialización de los espacios públicos donde la comunidad tiene dudas en el proceso de intervención. El 29 de febrero de 2024, se recibe visto bueno del informe social por parte de la supervisión del contrato del área social al informe de enero de 2024, y se asiste a comité integral para resolver las dificultades en relación a la intervención del espacio público.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

PERIODO DE INFORME SEMANAL

	COPEBA SAS	**FECHA**	04/03/2024	**SEMANA No.**	**31**	DEL	**26-feb-24**	AL	**03-mar-24**

El contratista mediante oficio CNJ-ICCU708-O-0268 del 06/02/2024, radica el informe SST No 6 para revision de la Interventoria.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

Se realizan ensayos de control de calidad al concreto asfaltico e hidraulico tanto del mejoramiento vial como del espacio publico en Aguadita.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista solicita mediante oficio CNJ-ICCU708-O-0276 del 09/012/2024 presentado a la Interventoria la prorroga del contrato por 30 dias calendario, hasta el 30 de marzo para la terminacion de las actvidades contractuales, esta prorroga se dio hasta el 30/03/2024 por parte del ICCU, para culminar con el alcance contractual definido inicialmente..

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cuenta con 1 director de Obra, Un Ingeniero Residente y Un HSE para todo el contrato. **En el Frente de Obra No 04**: Del PR 09+774 al PR 10+240: Se tiene Un (01) Inspector de Obra, Un (01) Topógrafo, Dos (02) Controladores de tráfico, Dos (02) maestros de obra, Seis (06) Ayudantes de Obra. **En el Frente de obra No 05**: Del PR 10+260 al PR 10+660: Un (01) Inspector de Obra, Dos (02) maestros gavioneros, Cuatro (04) Ayudantes de obra, Un (01) Operador de maquinaria, Dos (02) Controladores de Trafico, Dos (02) Conductores de volqueta. **En el Frente de Obra Tramo 7** (San Miguel): PR 07+500 al PR 08+487: Un (01) Inspector de obra, Un (01) Maestro de obra, Cuatro (04) Ayudantes de obra, en el Acopio de Fresado de San Miguel: Un (01) ayudante de obra prestando vigilancia y despachando fresado para Pasca. **En el frente de obra de Pasca (Paso malo**): Un (01) Topógrafo, Un (01) cadenero, Un (01) Maestro de obra, Cuatro (04) Ayudantes de obra,Dos (02) Auxiliares de trafico, Cuatro (04) Operadores de maquinaria, Una (01) Cuadrilla de asfalto, Un (01) Conductor de carrotanque, Dos (02) Conductores de volqueta. **En el frente de obra de Espacio Público de Aguadita** se tiene: Tres (03) cuadrillas (Oficial + 5 ayudantes), Un (01) Ingeniero residente, Un (01) Inspector de Obra, Un (01) Operador, Dos (02) controladores de tráfico, Un (01) Conductor de volqueta. **En el espacio Público de Aguabonita**: Se tiene Un (01) maestro de obra, Tres (03) Ayudantes de obra, Un (01) Operador de maquinaria, Dos (02) Auxiliares de tráfico. Para el contrato en general se tiene los siguientes equipos: Tres (03) Retrocargadores, Una (01) Excavadora sobre orugas, Tres (03) Volquetas de 14 M3, Una (01) Volqueta de 6 M3, Dos (02) Minicargador, Un (01) Vibro compactador autopropulsado. En el frente de Obra del Espacio Público sector Aguadita: Se tiene Tres (03) Oficiales y Quince (15) ayudantes. En general para todo el contrato cuenta con el siguiente personal: Un (01) director de Obra, Un (01) Residente de Obra, Un (01) HSE, Cuatro (04) Inspectores de Obra, Dos (02) Topógrafos, Un (01) Cadenero; Dos (02) maestros de obra, Cinco (05) Oficiales de Obra, Seis (06) Auxiliares para control de tráfico, Veintiún (21) Ayudante de Obra, Seis (06) (Operadores maquinaria), Tres (03) Conductores de volqueta.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Lo ejecutado a la fecha el contratista de acuerdo a la reprogramacion entregada por el contratista muestra un acumulado programado de $ 14,192,733.135,83 millones frente a $ 14.114,809.643,19 aproximadamente de ejecutado. Corresponde a un 80.28 % programado para un 79,84 % ejecutado acumulado.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Al contratista se le realizan observaciones en la ejecucion de las actividades diarias, la proximidad con la terminacion contractual esta conduciendo a ejecuciones presuradas con observaciones en terminados, y es asi como en el tramo 4 (articulado carril derecho), presento hundimientos y desplazamiento de adoquin..

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se requiere realizar tramite ante la CAR, para solventar la dificultad para el inicio de los gaviones en tramo 3.

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Los sectores de trabajo se encuentran debidamente demarcados y el personal cuenta con EPPs.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Se realiza verificación y avances del proyecto de cultura vial para su desarrolló y ejecución de presupuesto PAGA.

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Presentar informe por especialista Forestal ante la CAR	Contratista	
Presentar informe ante la DIAN por presunta invasion en predio de Tramo 5	Contratista	
Presentar balanceo del contrato	Contratista	

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se tienen aprobados los **NP 001**-BASE ESTABILIZADA CON 1,5% DE CEMENTO Y CON 4,5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1 EL **NP 002**-ANDÉN CONCRETO 3000 PSI E=0.15M EL **NP 003** - ESTAMPADO PARA CONCRETO (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE). EL **NP 004** - REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA, **EL NP 005** - GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).; EL **NP 006** - LOSETA DE CONCRETO A20 TIPO PANOT TR. LIVIANO 20X20X6CM COLOR OCRE Y/O TERRACOTA O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO); EL **NP 007** - PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO 1.2M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS EN CONCRETO MEZCLADO EN OBRA). **NP 008** - RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE; **NP 009** - RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO MEJORADO CON 3% DE CEMENTO COMPACTADO MECÁNICAMENTE. **NP 010** - MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO); NP 010-MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO); **NP 011** - MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD-19 CON CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO TIPO III; **NP 012** - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO R-50. **NP 013**-CUNETA DE CONCRETO, 3000 PSI ACELERADO A 3 DÍAS FUNDIDA EN EL LUGAR; **NP 014** - GAVION.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	

PERIODO DE INFORME SEMANAL

	COPEBA SAS	**FECHA**	04/03/2024	**SEMANA No.**	**31**	DEL	**26-feb-24**	AL	**03-mar-24**

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se esta evidenciando fallos en algunos de los trabajos realizados por el contratista (articulada Tramo 4), lo que genera reprocesos y preocupacion con el plazo de terminacion de las obras programadas.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fundida de cuneta PR 08+164 al PR 08+240 costado izquierdo San Miguel



Fundida de cuneta PR 08+164 al PR 08+240 costado izquierdo San Miguel



Berma - cuneta fundida PR 08+008 al PR 08+050 costado izquierdo San Miguel



Formaleta y mallas gavion PR 10+520 al PR 10+530



Lleno de mallas para Gavion PR 10+520 al PR 10+530.



Gavion terminado en lleneo de mallas PR 10+520 al PR 10+550.



Instalacion de Bordillo, geocelda y lleno Espacio Publico Aguadita



Fundida de berma- cuneta costado derecho Espacio publico Agua Bonita



Fundida de Berma cuneta en espacio publico Aguadita

ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	

PERIODO DE INFORME SEMANAL

	COPEBA SAS	**FECHA**	11/03/2024	**SEMANA No.**	**32**	DEL	**4-mar-24**	AL	**10-mar-24**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE-FUSAGASUGA-PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	VIA SIBATE - FUSAGASUGA - PASCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	815 DEL 2023	**CONTRATO No.:**	708 DEL 2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES, QUINCE (15) DIAS	**PLAZO INICIAL:**	6 MESES, QUINCE (15) DIAS
CONTRATISTA:	COPEBA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO PASCA CNJ
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de agosto de 2023	**FECHA DE INICIACIÓN:**	1 de agosto de 2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE MARZO DEL 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30 DE MARZO DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	242 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	242 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	DOSCIENTOS VEINTI DOS (222) DIAS	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	DOSCIENTOS VEINTI DOS (222) DIAS
VALOR INICIAL :	$ 1.032.790.821	**VALOR INICIAL :**	$ 17.678.836.940
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.032.790.821	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 17.678.836.940
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 1.032.790.821	**VALOR POR PAGAR:**	$ 17.678.836.940
VALOR ANTICIPO:	$ -	**VALOR ANTICIPO:**	$ 5.358.746.830
SUPERVISOR:	JAISON FONSECA MARIÑO	**SUPERVISOR:**	JAISON FONSECA MARIÑO

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

FRENTE DE OBRA No 03: PR 07+986 AL PR 08+300 : EXCAVACION PARA GAVION ENTRE EL PR 08+982 AL PR 08+002 . **FRENTE DE OBRA No 04**: PR 09+774 AL PR 10+240 : FUNDIDAD DE CUNETA REFORZADA ENTRE EL PR 10+080 AL PR 10+120 COSTADO IZQUIERDO. **FRENTE DE OBRA No 05**: PR 10+260 AL PR 10+660 : CONSTRUCCION DE FILTRO TIPO FRANCES EN LA ESPALDA Y FRENTE DEL GAVION PR 10+520 AL PR 10+530 COSTADO IZQUIERDO. **FRENTE DE OBRA No 07**: PR 07+500 AL PR 08+487 (SAN MIGUEL): EXCAVACION, CORTE Y FIGURADO DE ACERO Y FUNDIDA DE CONCRETO ACELERADO PR 08+240 AL PR 08+298 COSTADO DERECHO Y FUNDIDA DE CUNETA PR 08+091 AL PR 08+130 COSTADO IZQUIERDO. **FRENTE DE OBRA PASCA (PASO MALO)**: EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE PENDIENTE LONGITUDINAL E INSTALACION DE FRESADO DEL PR 08+135 AL PR 08+300, E INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR DEL PR 08+250 AL PR 10+295 CAPA COMPLETA Y DEL PR 08+135 AL PR 08+175 PRIMERA CAPA EN EL ANCHO TOTAL DE LA CALZADA. CORTE, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO Y FUNDIDA DEL SECTOR DEL BOX AVERIADO EN EL PR 08+195. BACHEO EN 02 AREAS EN SENTIDO PASCA- FUSAGASUGA. **ESPACIO PUBLICO LA AGUADITA**: SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION, INSTALACION DE GEOTEXTIL, GEOCELDA, MEJORAMIENTO DE SUELO E INSTALACION DE BORDILLOS, FUNDIDA DE BERMA CUNETAS EN CONCRETO ACELERADO Y FUNDIDA DE CONCRETO ESTAMPADO POR EL COSTADO DERECHO Y POR EL COSTADO IZQUIERDO SE INICIARON ACTIVIDADES DE EXCAVACION, INSTALACION DE GEOCELDA, RELLENO Y FUNDIDAD DE ANDEN ESTAMPADO. **FRENTE DE OBRA ESPACIO PUBLICO AGUABONITA**: SE REALIZO EXCAVACION, INSTALACION DE GEOTEXTIL, GEOCELDA Y RELLENO DE GEOCELDA E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL ESTABILIZADO Y FUNDIDA DE BERMA CUNETA EN CONCRETO ACELERADO DEL PR 06+110 AL PR 06+180.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
2,1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	10-ago-23	24-nov-23	106	21-sep-23		ejecución	-42	ejecución
2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	10-ago-23	1-nov-23	83	10-ago-23		ejecución	0	ejecución
NP 07	PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIAMETRO 1.2M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS EN CONCRETO MEZCLADO EN OBRA)	29-ago-23	11-nov-23	74	8-ago-23	11-oct-23	Fin	21	Fin
3.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-15 cm)	22-ago-23	29-dic-23	129	22-ago-23	12-ene-24	Fin	0	-14
3.5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	7-nov-23	29-dic-23	52	20-nov-23	12-feb-24	Fin	-13	-45
3.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	22-sep-23	20-ene-24	120	29-sep-23		ejecución	-7	ejecución
3.9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	22-sep-23	20-ene-24	120	29-sep-23		ejecución	-7	ejecución
NP 001	BASE ESTABILIZADA CON 1,5% DE CEMENTO Y CON 4,5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	1-sep-23	18-ene-24	139	29-ago-23		ejecución		ejecución
1.6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	1-ago-23	30-ago-23	29	8-ago-23		ejecución	-7	ejecución
3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	9-sep-23	25-dic-23	107	21-sep-23		ejecución	-12	ejecución
3.11	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)			0	24-nov-23		ejecución		ejecución
4.16	CUNETA DE CONCRETO, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	13-nov-23	24-nov-23	11	18-oct-23		ejecución	26	ejecución
4.23	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	9-sep-23	25-dic-23	107	21-sep-23		ejecución	-12	ejecución
4,24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES								
4.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500	6-nov-23	24-nov-23	18	21-sep-23		ejecución	46	ejecución
4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	22-nov-23	12-dic-23	20	18-sep-23		ejecución	65	ejecución
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	21-oct-23	8-nov-23	18	30-oct-23		ejecución	-9	ejecución

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	

PERIODO DE INFORME SEMANAL

	COPEBA SAS	FECHA	11/03/2024	SEMANA No.	32	DEL	4-mar-24	AL	10-mar-24

NP 004	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	13-nov-23	24-nov-23	11	16-oct-23		ejecución	28	ejecución
NP 005	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	25-oct-23	13-nov-23	19	18-oct-23		ejecución	7	ejecución
NP 008	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	28-oct-23	16-nov-23	19	18-oct-23		ejecución	10	ejecución
NP 009	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO MEJORADO CON 3% DE CEMENTO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	1-nov-23	20-nov-23	19	18-oct-23		ejecución	14	ejecución
NP 010	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	1-nov-23	12-ene-24	72	1-nov-23		ejecución	0	ejecución
NP 011	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD-19 CON CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO TIPO III	1-nov-23	14-ene-24	74	27-nov-23	6-dic-23	10	-26	39
NP 012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO R-50	1-nov-23	14-ene-24	74	27-nov-23	6-dic-23	10	-26	39
NP 013	CUNETA DE CONCRETO, 3000 PSI ACELERADO A 3 DÍAS FUNDIDA EN EL LUGAR	15-dic-23	29-feb-24	76	15-dic-23		ejecución	0	ejecución
NP 014	GAVION	1-feb-24	29-feb-24	28	12-feb-24		ejecución	-11	ejecución

Plazo del proyecto: 242 días


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	80,28%	79,84%	-0,44%
Durante el periodo	2,39%	2,07%	-0,32%
Acumulado Actual	82,67%	81,91%	-0,76%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

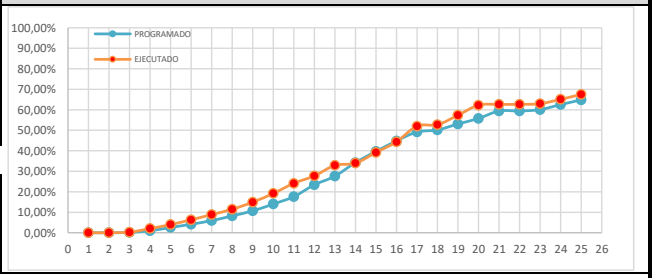

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
242	222,00	20	-1,84

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 14.192.733.136	$ 14.114.809.643	99%
Durante el periodo	$ 422.179.950	$ 365.321.210	87%
Acumulado Actual	$ 14.614.913.086	$ 14.480.130.853	99%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-1%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

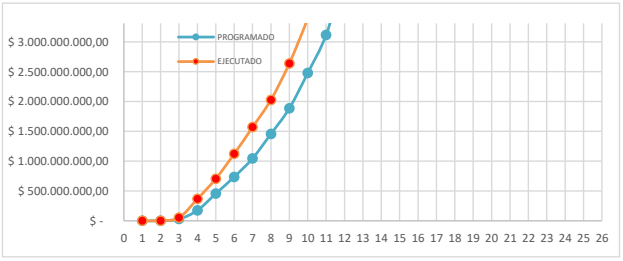


AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 3.936.746.830	$ 3.936.746.830	100%
Durante el periodo	$ 474.000.000	$ 474.000.000	100%
Acumulado Actual	$ 4.410.746.830	$ 4.410.746.830	100%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

El contratista continua utilizando los acopios temporales, principalmente el del PR 12+200, arriba de Aguadita. Se inicio la construccion del gavion de 20 mts de Tramo 3.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

El 8 de marzo de 2024, se realizó verificación en campo de los avances en las intervenciones en los espacios públicos de Aguabonita y la Aguadita donde a la fecha aún no se ha dado inicio con el proceso de remates contra predios y no se ha efectuado la socialización a predios para definir la empradización mediante el comunicado ADM-ICCU-815-2023-148 se realiza devolución de actas de vecindad de cierre dejando como claridad que esto no es el recibo del espacio público, solo hace referencia a la no afectación de los inmuebles.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	

PERIODO DE INFORME SEMANAL

	COPEBA SAS	**FECHA**	11/03/2024	**SEMANA No.**	**32**	DEL	**4-mar-24**	AL	**10-mar-24**

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

El contratista mediante oficio CNJ-ICCU708-O-0268 del 06/02/2024, radica el informe SST No 6 para revision de la Interventoria.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

Se realizan ensayos de control de calidad al concreto asfaltico e hidraulico tanto del mejoramiento vial como del espacio publico en Aguadita.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista solicita mediante oficio CNJ-ICCU708-O-0276 del 09/012/2024 presentado a la Interventoria la prorroga del contrato por 30 dias calendario, hasta el 30 de marzo para la terminacion de las actvidades contractuales, esta prorroga se dio hasta el 30/03/2024 por parte del ICCU, para culminar con el alcance contractual definido inicialmente..

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cuenta con 1 director de Obra, Un Ingeniero Residente y Un HSE para todo el contrato. **En el Frente de Obra No 03**: del PR 07+896 al PR 08+300: Un (01) Topografo, Dos (02) Controladores de trafico, Un (01) Operador, Dos (02) conductores de volqueta. **En el Frente de Obra No 04**: Del PR 09+774 al PR 10+240: Se tiene Un (01) Inspector de Obra, Dos (02) Controladores de tráfico, Un (01) maestro de obra, Seis (06) Ayudantes de Obra. **En el Frente de obra No 05**: Del PR 10+260 al PR 10+660: Un (01) Inspector de Obra, Cuatro (04) Ayudantes de obra, Un (01) Operador de maquinaria, Dos (02) Controladores de Trafico. **En el Frente de Obra Tramo 7** (San Miguel): PR 07+500 al PR 08+487: Un (01) Inspector de obra, Un (01) Maestro de obra, Cuatro (04) Ayudantes de obra. **En el frente de obra de Pasca (Paso malo**): Un (01) Topógrafo, Un (01) cadenero, Un (01) Maestro de obra, Cuatro (04) Ayudantes de obra,Dos (02) Auxiliares de trafico, Cuatro (04) Operadores de maquinaria, Una (01) Cuadrilla de asfalto, Un (01) Conductor de carrotanque, Dos (02) Conductores de volqueta. **En el frente de obra de Espacio Público de Aguadita** se tiene: Tres (03) cuadrillas (Oficial + 5 ayudantes), Un (01) Ingeniero residente, Un (01) Inspector de Obra, Un (01) Operador, Dos (02) controladores de tráfico, Un (01) Conductor de volqueta. **En el espacio Público de Aguabonita**: Se tiene Un (01) maestro de obra, Tres (03) Ayudantes de obra, Un (01) Operador de maquinaria, Dos (02) Auxiliares de tráfico. Para el contrato en general se tiene los siguientes equipos: Tres (03) Retrocargadores, Una (01) Excavadora sobre orugas, Tres (03) Volquetas de 14 M3, Una (01) Volqueta de 6 M3, Dos (02) Minicargador, Un (01) Vibro compactador autopropulsado. En el frente de Obra del Espacio Público sector Aguadita: Se tiene Tres (03) Oficiales y Quince (15) ayudantes. En general para todo el contrato cuenta con el siguiente personal: Un (01) director de Obra, Un (01) Residente de Obra, Un (01) HSE, Cuatro (04) Inspectores de Obra, Dos (02) Topógrafos, Un (01) Cadenero; Dos (02) maestros de obra, Cinco (05) Oficiales de Obra, Seis (06) Auxiliares para control de tráfico, Veintiún (21) Ayudante de Obra, Seis (06) (Operadores maquinaria), Tres (03) Conductores de volqueta.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Lo ejecutado a la fecha el contratista de acuerdo a la reprogramacion entregada por el contratista muestra un acumulado programado de $ 14,614,913.085,98 millones frente a $ 14.480,130.853,13 aproximadamente de ejecutado. Corresponde a un 82.67 % programado para un 81,91 % ejecutado acumulado.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Al contratista se le realizan observaciones en la ejecucion de las actividades diarias, la proximidad con la terminacion contractual esta conduciendo a ejecuciones presuradas con observaciones en cumplimiento de especificaciones tecnicas de los materiales utilizados.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se realizo tramite ante la CAR, mediante el cual se logro iniciar la construccion de los gaviones en tramo 3.

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Los sectores de trabajo se encuentran debidamente demarcados y el personal cuenta con EPPs.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

No se ha dado inicio y no se muestras avances con relación a la inversión social y al desarrollo del proyecto de cultura vial.

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Presentar informe por especialista Forestal ante la CAR	Contratista	
Presentar informe ante la DIAN por presunta invasion en predio de Tramo 5	Contratista	
Presentar balanceo del contrato	Contratista	

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se tienen aprobados los **NP 001**-BASE ESTABILIZADA CON 1,5% DE CEMENTO Y CON 4,5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1 EL **NP 002**-ANDÉN CONCRETO 3000 PSI E=0.15M EL **NP 003** - ESTAMPADO PARA CONCRETO (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE). EL **NP 004** - REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA, **EL NP 005** - GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).; EL **NP 006** - LOSETA DE CONCRETO A20 TIPO PANOT TR. LIVIANO 20X20X6CM COLOR OCRE Y/O TERRACOTA O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO); EL **NP 007** - PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO 1.2M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS EN CONCRETO MEZCLADO EN OBRA). **NP 008** - RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE; **NP 009** - RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO MEJORADO CON 3% DE CEMENTO COMPACTADO MECÁNICAMENTE. **NP 010** - MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO); NP 010-MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO); **NP 011** - MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD-19 CON CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO TIPO III; **NP 012** - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO R-50. **NP 013**-CUNETA DE CONCRETO, 3000 PSI ACELERADO A 3 DÍAS FUNDIDA EN EL LUGAR; **NP 014** - GAVION.

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	

PERIODO DE INFORME SEMANAL

	COPEBA SAS	**FECHA**	11/03/2024	**SEMANA No.**	**32**	DEL	**4-mar-24**	AL	**10-mar-24**

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se esta evidenciando fallos en algunos de los trabajos realizados por el contratista (articulada Tramo 4), lo que genera reprocesos y preocupacion con el plazo de terminacion de las obras programadas.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Corte y alistado de recalce de cuneta PR 08+164 al PR 08+240 costado izquierdo San



Fundida de cuneta PR 08+164 al PR 08+240 costado izquierdo San Miguel



Refuerzo en doble parilla para berma - cuneta costado izquierdo San Miguel



Instalacion de fresado PR 08+135 al PR 08+300 Paso malo - Pasca



Reparacion del Box Culvert en paso malo - Pasca



Instalacion de sub base granular entre el PR 08+135 al PR 08+300 Paso Malo- Pasca.



Instalacion y fundidad de berma - cuneta espacio publico Agua Bonita.



Instalacion de la doble parilla para la berma - cuneta Espacio publico Agua Bonita



Espacio publico Aguadita

ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	

PERIODO DE INFORME SEMANAL

	COPEBA SAS	**FECHA**	18/03/2024	**SEMANA No.**	**33**	DEL	**11-mar-24**	AL	**17-mar-24**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE-FUSAGASUGA-PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	VIA SIBATE - FUSAGASUGA - PASCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	815 DEL 2023	**CONTRATO No.:**	708 DEL 2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES, QUINCE (15) DIAS	**PLAZO INICIAL:**	6 MESES, QUINCE (15) DIAS
CONTRATISTA:	COPEBA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO PASCA CNJ
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de agosto de 2023	**FECHA DE INICIACIÓN:**	1 de agosto de 2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE MARZO DEL 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30 DE MARZO DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	243 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	243 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	DOSCIENTOS VEINTI NUEVE (229) DIAS	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	DOSCIENTOS VEINTI NUEVE (229) DIAS
VALOR INICIAL :	$ 1.032.790.821	**VALOR INICIAL :**	$ 17.678.836.940
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.032.790.821	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 17.678.836.940
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 1.032.790.821	**VALOR POR PAGAR:**	$ 17.678.836.940
VALOR ANTICIPO:	$ -	**VALOR ANTICIPO:**	$ 5.358.746.830
SUPERVISOR:	JAISON FONSECA MARIÑO	**SUPERVISOR:**	JAISON FONSECA MARIÑO

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

FRENTE DE OBRA No 03: PR 07+986 AL PR 08+300 : GAVION ENTRE EL PR 07+982 AL PR 07+982 . **FRENTE DE OBRA No 04**: PR 09+774 AL PR 10+240 : FUNDIDAD DE CUNETA REFORZADA ENTRE EL PR 10+080 AL PR 10+120 COSTADO IZQUIERDO. **FRENTE DE OBRA No 05**: PR 10+260 AL PR 10+660 : CONSTRUCCION DE FILTRO TIPO FRANCES EN LA ESPALDA Y FRENTE DEL GAVION PR 10+520 AL PR 10+530 COSTADO IZQUIERDO. **FRENTE DE OBRA No 07**: PR 07+500 AL PR 08+487 (SAN MIGUEL): EXCAVACION, CORTE Y FIGURADO DE ACERO Y FUNDIDA DE CONCRETO ACELERADO PR 08+240 AL PR 08+298 COSTADO DERECHO Y FUNDIDA DE CUNETA PR 08+091 AL PR 08+130 COSTADO IZQUIERDO. **FRENTE DE OBRA PASCA (PASO MALO)**: INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR DEL PR 08+135 AL PR 10+295 CAPA COMPLETA, RELLENO DEL AREA REPARADA DEL BOX PR 08+195. INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 DEL PR 08+140 AL PR 08+185 Y DEL PR 08+200 AL PR 08+295 COSTADO IZQUIERDO Y DEL PR 08+140 AL PR 08+180 Y DEL PR 08+195 AL PR 08+140 COSTADO DERECHO. **ESPACIO PUBLICO LA AGUADITA**: SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION, INSTALACION DE GEOTEXTIL, GEOCELDA, MEJORAMIENTO DE SUELO E INSTALACION DE BORDILLOS, FUNDIDA DE BERMA CUNETAS EN CONCRETO ACELERADO Y FUNDIDA DE CONCRETO ESTAMPADO POR EL COSTADO DERECHO Y POR EL COSTADO IZQUIERDO SE INICIARON ACTIVIDADES DE EXCAVACION, INSTALACION DE GEOCELDA, RELLENO Y FUNDIDAD DE ANDEN ESTAMPADO. **FRENTE DE OBRA ESPACIO PUBLICO AGUABONITA**: SE REALIZO EXCAVACION, INSTALACION DE GEOTEXTIL, GEOCELDA Y RELLENO DE GEOCELDA E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL ESTABILIZADO Y FUNDIDA DE BERMA CUNETA EN CONCRETO ACELERADO DEL PR 06+110 AL PR 06+180. **FRENTE DE OBRA DEMARCACION VIAL** : SE REALIZO LA DEMARCACCION HORIZONTAL CON PINTURA EN FRIO (LINEAS LATERALES Y DE CENTRO) DE LOS BACHEOS (15) ENTRE FUSA GASUGA -AGUADITA, ESPACIO PUBLICO AGUADITA, TRAMO 6, TRAMO 5 (EXCEPTO EL AREA SIN MDC-19), TRAMO 4 (EXCEPTO EL AREA DEL ARTICULADO), TRAMO 3, TRAMO 2 Y TRAMO 1 (FALTA DEL PR 01+930 AL PR 02+100).

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
2,1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	10-ago-23	24-nov-23	106	21-sep-23		ejecución	-42	ejecución
2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	10-ago-23	1-nov-23	83	10-ago-23		ejecución	0	ejecución
NP 07	PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO 1.2M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS EN CONCRETO MEZCLADO EN OBRA)	29-ago-23	11-nov-23	74	8-ago-23	11-oct-23	65	21	Fin
3.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-15 cm)	22-ago-23	29-dic-23	129	22-ago-23	12-ene-24	144	0	-14
3.5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	7-nov-23	29-dic-23	52	20-nov-23	12-feb-24	85	-13	-45
3.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	22-sep-23	20-ene-24	120	29-sep-23		ejecución	-7	ejecución
3.9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	22-sep-23	20-ene-24	120	29-sep-23	29-ene-24	123	-7	-9
NP 001	BASE ESTABILIZADA CON 1,5% DE CEMENTO Y CON 4,5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	1-sep-23	18-ene-24	139	29-ago-23		ejecución		ejecución
1.6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	1-ago-23	30-ago-23	29	8-ago-23		ejecución	-7	ejecución
3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	9-sep-23	25-dic-23	107	21-sep-23		ejecución	-12	ejecución
3.11	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)			0	24-nov-23		ejecución		ejecución
4.16	CUNETA DE CONCRETO, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	13-nov-23	24-nov-23	11	18-oct-23		ejecución	26	ejecución
4.23	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	9-sep-23	25-dic-23	107	21-sep-23		ejecución	-12	ejecución
4,24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES								
4.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500	6-nov-23	24-nov-23	18	21-sep-23		ejecución	46	ejecución

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	

PERIODO DE INFORME SEMANAL

	COPEBA SAS	FECHA	18/03/2024	SEMANA No.	33	DEL	11-mar-24	AL	17-mar-24

4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	22-nov-23	12-dic-23	20	18-sep-23		ejecución	65	ejecución
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	21-oct-23	8-nov-23	18	30-oct-23		ejecución	-9	ejecución
NP 004	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	13-nov-23	24-nov-23	11	16-oct-23		ejecución	28	ejecución
NP 005	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	25-oct-23	13-nov-23	19	18-oct-23		ejecución	7	ejecución
NP 008	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	28-oct-23	16-nov-23	19	18-oct-23		ejecución	10	ejecución
NP 009	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO MEJORADO CON 3% DE CEMENTO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	1-nov-23	20-nov-23	19	18-oct-23		ejecución	14	ejecución
NP 010	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	1-nov-23	12-ene-24	72	1-nov-23		ejecución	0	ejecución
NP 011	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD-19 CON CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO TIPO III	1-nov-23	14-ene-24	74	27-nov-23	6-dic-23	10	-26	39
NP 012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO R-50	1-nov-23	14-ene-24	74	27-nov-23	6-dic-23	10	-26	39
NP 013	CUNETA DE CONCRETO, 3000 PSI ACELERADO A 3 DÍAS FUNDIDA EN EL LUGAR	15-dic-23	29-feb-24	76	15-dic-23		ejecución	0	ejecución
NP 014	GAVION	1-feb-24	29-feb-24	28	12-feb-24		ejecución	-11	ejecución

Plazo del proyecto: 242 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	82,67%	81,91%	-0,76%
Durante el periodo	2,39%	1,96%	-0,43%
Acumulado Actual	85,06%	83,87%	-1,19%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
243	229,00	14	-2,89

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

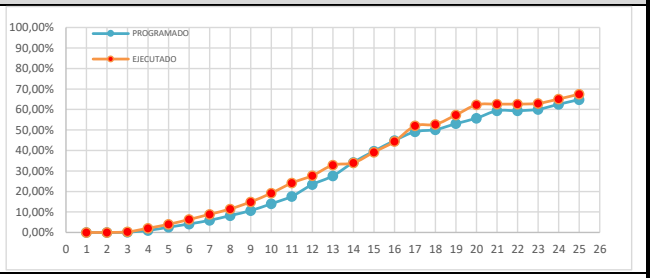

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 14.614.913.086	$ 14.480.130.853	99%
Durante el periodo	$ 422.179.950	$ 346.492.095	82%
Acumulado Actual	$ 15.037.093.036	$ 14.826.622.948	99%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-1%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

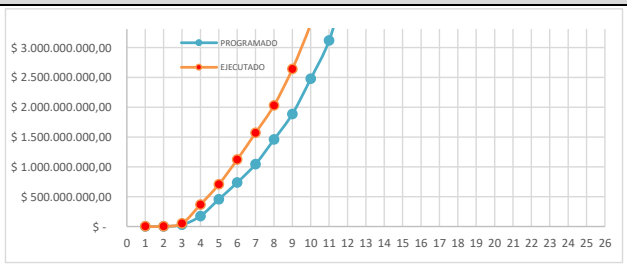


AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 3.936.746.830	$ 3.936.746.830	100%
Durante el periodo	$ 474.000.000	$ 474.000.000	100%
Acumulado Actual	$ 4.410.746.830	$ 4.410.746.830	100%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

El contratista continua utilizando los acopios temporales, principalmente el del PR 12+200, arriba de Aguadita. Se finalizo la construccion del gavion de 20 mts de Tramo 3.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

El 16 de marzo de 2024, se recibe el informe mensual con radicado CNJ-ICCU708-O-0306 por parte de contratista, el 13 de marzo se remiten las observaciones por parte de la Interventoría mediante el comunicado SOC-ICCU-815-2023-023, se recibe el ajuste al informe, el 14 de marzo de 2024 se remite por parte del contratista el ajuste a las observaciones del informe con radicado CNJ-ICCU708-O-0154 para su revisión y posterior aprobación.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	

PERIODO DE INFORME SEMANAL									
	COPEBA SAS	FECHA	18/03/2024	SEMANA No.	33	DEL	11-mar-24	AL	17-mar-24

El contratista mediante oficio CNJ-ICCU708-O-0268 del 06/02/2024, radica el informe SST No 6 para revision de la Interventoria.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

Se realizan ensayos de control de calidad al concreto hidraulico tanto del mejoramiento vial como del espacio publico en Aguadita.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista solicita mediante oficio CNJ-ICCU708-O-0312 del 15/03/2024 la suspension del contrato a partir del 23/03/2024 para reiniciar el 01/04/2024, debido entre otros factores que la semana santa para este año presenta solo dos dias habiles de labores, siendo la nueva terminacion del contrato el 09 de abril.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cuenta con 1 director de Obra, Un Ingeniero Residente y Un HSE para todo el contrato. **En el Frente de Obra No 03**: del PR 07+896 al PR 08+300: Un (01) Topografo, Dos (02) Controladores de trafico, Un (01) Operador, Dos (02) conductores de volqueta, Dos (02) maestros gavioneros, Tres (03) ayudantes de obra. **En el Frente de Obra No 04**: Del PR 09+774 al PR 10+240: Se tiene Un (01) Inspector de Obra, Dos (02) Controladores de tráfico, Un (01) maestro de obra, Dos (02) Ayudantes de Obra. **En el Frente de obra No 05**: Del PR 10+260 al PR 10+660: Un (01) Inspector de Obra, Tres (03) Ayudantes de obra, Un (01) Operador de maquinaria, Dos (02) Controladores de Trafico. **En el Frente de Obra Tramo 7** (San Miguel): PR 07+500 al PR 08+487: Un (01) Inspector de obra, Un (01) Maestro de obra, Cuatro (04) Ayudantes de obra. **En el frente de obra de Pasca (Paso malo**): Un (01) Topógrafo, Un (01) cadenero, Un (01) Maestro de obra, Nueve (09) Ayudantes de obra,Dos (02) Auxiliares de trafico, Dos (02) Operadores de maquinaria, Un (01) Conductor de carrotanque. **En el frente de obra de Espacio Público de Aguadita** se tiene: Un (01) maestro de obra, Dos (02) Ayudantes de obra. **En el espacio Público de Aguabonita**: Se tiene Un (01) maestro de obra, Tres (03) Ayudantes de obra, Un (01) Operador de maquinaria, Dos (02) Auxiliares de tráfico. **Frente de Obra Demaracion Horizontal**: Se tiene personal subcontratado (1 Pintor y Dos Ayudantes). Para el contrato en general se tiene los siguientes equipos: Tres (03) Retrocargadores, Una (01) Excavadora sobre orugas, Tres (03) Volquetas de 14 M3, Una (01) Volqueta de 6 M3, Dos (02) Minicargador, Un (01) Vibro compactador autopropulsado. En el frente de Obra del Espacio Público sector Aguadita: Se tiene Tres (03) Oficiales y Quince (15) ayudantes. En general para todo el contrato cuenta con el siguiente personal: Un (01) director de Obra, Un (01) Residente de Obra, Un (01) HSE, Cuatro (04) Inspectores de Obra, Dos (02) Topógrafos, Un (01) Cadenero; Dos (02) maestros de obra, Cinco (05) Oficiales de Obra, Seis (06) Auxiliares para control de tráfico, Veintiún (21) Ayudante de Obra, Seis (06) (Operadores maquinaria), Tres (03) Conductores de volqueta.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Lo ejecutado a la fecha el contratista de acuerdo a la reprogramacion entregada por el contratista muestra un acumulado programado de $ 15,037,093.036,14 millones frente a $ 14.826,622.948,47 aproximadamente de ejecutado. Corresponde a un 85.06 % programado para un 83,87 % ejecutado acumulado.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Al contratista se le realizan observaciones en la ejecucion de las actividades diarias, la proximidad con la terminacion contractual esta conduciendo a ejecuciones presuradas con observaciones en cumplimiento de especificaciones tecnicas de los materiales utilizados.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se realizo tramite ante la CAR, mediante el cual se logro iniciar la construccion de los gaviones en tramo 3.

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Los sectores de trabajo se encuentran debidamente demarcados y el personal cuenta con EPPs.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Se ha recibido por parte del contratista solicitudes para adecuación de espacios públicos lo cual se encuentra en evaluación técnica y presupuestal

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Presentar informe por especialista Forestal ante la CAR	Contratista	Se cumplio
Presentar informe ante la DIAN por presunta invasion en predio de Tramo 5	Contratista	
Presentar balanceo del contrato	Contratista	

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se tienen aprobados los **NP 001**-BASE ESTABILIZADA CON 1,5% DE CEMENTO Y CON 4,5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1 EL **NP 002**-ANDÉN CONCRETO 3000 PSI E=0.15M EL **NP 003** - ESTAMPADO PARA CONCRETO (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE). EL **NP 004** - REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA, **EL NP 005** - GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).; EL **NP 006** - LOSETA DE CONCRETO A20 TIPO PANOT TR. LIVIANO 20X20X6CM COLOR OCRE Y/O TERRACOTA O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO); EL **NP 007** - PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO 1.2M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS EN CONCRETO MEZCLADO EN OBRA). **NP 008** - RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE; **NP 009** - RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO MEJORADO CON 3% DE CEMENTO COMPACTADO MECÁNICAMENTE. **NP 010** - MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO); NP 010-MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO); **NP 011** - MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD-19 CON CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO TIPO III; **NP 012** - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO R-50. **NP 013**-CUNETA DE CONCRETO, 3000 PSI ACELERADO A 3 DÍAS FUNDIDA EN EL LUGAR; **NP 014** - GAVION.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	

PERIODO DE INFORME SEMANAL

	COPEBA SAS	FECHA	18/03/2024	SEMANA No.	33	DEL	11-mar-24	AL	17-mar-24

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

El contratista no esta realizando consultas previas a la Interventoria, y se encuentra ejecutando obras de correcion no concertadas o autorizadas por la Interventoria

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Refuerzo en doble parilla para berma - cuneta costado izquierdo San Miguel



Fundida de cuneta PR 08+545 al PR 07+591 costado izquierdo San Miguel



Mejoramiento del suelo de fundacion para berma - cuneta costado izquierdo San Miguel



Excavacion manual para instalacion de sardinel Paso malo - Pasca



Sardinel instalado en paso malo - Pasca



Instalacion de sub base granular Paso Malo-Pasca.



Fundidad de berma - cuneta espacio publico Agua Bonita.



Construccion de gavion PR 07+962 al PR 07+982 Tramo 3



Demaracacion horizontal Espacio publico Aguadita

ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	

PERIODO DE INFORME SEMANAL

	COPEBA SAS	**FECHA**	18/03/2024	**SEMANA No.**	**34**	DEL	**18-mar-24**	AL	**22-mar-24**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE-FUSAGASUGA-PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	VIA SIBATE - FUSAGASUGA - PASCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	815 DEL 2023	**CONTRATO No.:**	708 DEL 2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES, QUINCE (15) DIAS	**PLAZO INICIAL:**	6 MESES, QUINCE (15) DIAS
CONTRATISTA:	COPEBA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO PASCA CNJ
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de agosto de 2023	**FECHA DE INICIACIÓN:**	1 de agosto de 2023
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	23 de marzo de 2024	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	23 de marzo de 2024
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	1 de abril de 2024	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	1 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE ABRIL DEL 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	23 DE ABRIL DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	257 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	257 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO (234) DIAS	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO (234) DIAS
VALOR INICIAL :	$ 1.032.790.821	**VALOR INICIAL :**	$ 17.678.836.940
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.032.790.821	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 17.678.836.940
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 1.032.790.821	**VALOR POR PAGAR:**	$ 17.678.836.940
VALOR ANTICIPO:	$ -	**VALOR ANTICIPO:**	$ 5.358.746.830
SUPERVISOR:	JAISON FONSECA MARIÑO	**SUPERVISOR:**	JAISON FONSECA MARIÑO

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

FRENTE DE OBRA No 03: PR 07+986 AL PR 08+300 : EXCAVACION PARA GAVION ENTRE EL PR 08+052 AL PR 08+089 COSTADO IZQUIERDO. GAVION ENTRE EL PR 08+052 AL PR 08+089 . **FRENTE DE OBRA No 04**: PR 09+774 AL PR 10+240 : FUNDIDA DE CUNETA REFORZADA ENTRE EL PR 10+080 AL PR 10+120 COSTADO IZQUIERDO. REINSTALACION DE ADOQUIN ENTRE EL PR 10+080 AL PR 10+150. **FRENTE DE OBRA No 05**: PR 10+260 AL PR 10+660 : CONSTRUCCION DE FILTRO TIPO FRANCES EN LA ESPALDA Y FRENTE DEL GAVION PR 10+520 AL PR 10+530 COSTADO IZQUIERDO. **FRENTE DE OBRA No 07**: PR 07+500 AL PR 08+487 (SAN MIGUEL): EXCAVACION, CORTE Y FIGURADO DE ACERO Y FUNDIDA DE CONCRETO ACELERADO PR 07+720 AL PR 07+758, DEL PR 08+041 AL PR 08+076 COSTADO IZQUIERDO . **FRENTE DE OBRA PASCA (PASO MALO)**: INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR DEL PR 08+135 AL PR 10+295 CAPA COMPLETA, ADECUACION Y FUNDIDAD DE CUNETA CON REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDAD DEL PR 08+156 AL 08+190 Y DEL PR 08+200 AL PR 08+210 COSTADO IZQUIERDO. **ESPACIO PUBLICO LA AGUADITA**: SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION, INSTALACION DE GEOTEXTIL, GEOCELDA, MEJORAMIENTO DE SUELO E INSTALACION DE BORDILLOS, FUNDIDA DE BERMA CUNETAS EN CONCRETO ACELERADO Y FUNDIDA DE CONCRETO ESTAMPADO POR EL COSTADO DERECHO Y POR EL COSTADO IZQUIERDO SE INICIARON ACTIVIDADES DE EXCAVACION, INSTALACION DE GEOCELDA, RELLENO Y FUNDIDAD DE ANDEN ESTAMPADO. **FRENTE DE OBRA ESPACIO PUBLICO AGUABONITA**: SE REALIZO EXCAVACION, INSTALACION DE GEOTEXTIL, GEOCELDA Y RELLENO DE GEOCELDA E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL ESTABILIZADO Y FUNDIDA DE BERMA CUNETA EN CONCRETO ACELERADO DEL PR 06+255 AL PR 06+280. **FRENTE DE OBRA DEMARCACION VIAL** : SE REALIZO LA DEMARCACCION HORIZONTAL CON PINTURA EN FRIO (LINEAS LATERALES Y DE CENTRO) PR 01+930 AL PR 02+100 (TRAMO 1) Y DEL PR 07+500 AL PR 08+487 (TRAMO 7), Y DESDE LOS BACHEOS 1 HASTA EL EL No 08 Y LOS BACHEOS 10 Y 11 EN LA VIA PASCA-FUSAGASUGA.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
2,1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	10-ago-23	24-nov-23	106	21-sep-23		ejecución	-42	ejecución
2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	10-ago-23	1-nov-23	83	10-ago-23		ejecución	0	ejecución
NP 07	PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIAMETRO 1.2M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS EN CONCRETO MEZCLADO EN OBRA)	29-ago-23	11-nov-23	74	8-ago-23	11-oct-23	65	21	Fin
3.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-15 cm)	22-ago-23	29-dic-23	129	22-ago-23	12-ene-24	144	0	-14
3.5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	7-nov-23	29-dic-23	52	20-nov-23	12-feb-24	85	-13	-45
3.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	22-sep-23	20-ene-24	120	29-sep-23		ejecución	-7	ejecución
3.9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	22-sep-23	20-ene-24	120	29-sep-23	29-ene-24	123	-7	-9
NP 001	BASE ESTABILIZADA CON 1,5% DE CEMENTO Y CON 4,5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	1-sep-23	18-ene-24	139	29-ago-23		ejecución		ejecución
1.6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	1-ago-23	30-ago-23	29	8-ago-23		ejecución	-7	ejecución
3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	9-sep-23	25-dic-23	107	21-sep-23		ejecución	-12	ejecución
3.11	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)			0	24-nov-23		ejecución		ejecución
4.16	CUNETA DE CONCRETO, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	13-nov-23	24-nov-23	11	18-oct-23		ejecución	26	ejecución
4.23	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	9-sep-23	25-dic-23	107	21-sep-23		ejecución	-12	ejecución
4,24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES								
4.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500	6-nov-23	24-nov-23	18	21-sep-23		ejecución	46	ejecución

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	

PERIODO DE INFORME SEMANAL

	COPEBA SAS	FECHA	18/03/2024	SEMANA No.	34	DEL	18-mar-24	AL	22-mar-24

4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	22-nov-23	12-dic-23	20	18-sep-23		ejecución	65	ejecución
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	21-oct-23	8-nov-23	18	30-oct-23		ejecución	-9	ejecución
NP 004	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	13-nov-23	24-nov-23	11	16-oct-23		ejecución	28	ejecución
NP 005	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	25-oct-23	13-nov-23	19	18-oct-23		ejecución	7	ejecución
NP 008	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	28-oct-23	16-nov-23	19	18-oct-23		ejecución	10	ejecución
NP 009	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO MEJORADO CON 3% DE CEMENTO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	1-nov-23	20-nov-23	19	18-oct-23		ejecución	14	ejecución
NP 010	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	1-nov-23	12-ene-24	72	1-nov-23		ejecución	0	ejecución
NP 011	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD-19 CON CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO TIPO III	1-nov-23	14-ene-24	74	27-nov-23	6-dic-23	10	-26	39
NP 012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO R-50	1-nov-23	14-ene-24	74	27-nov-23	6-dic-23	10	-26	39
NP 013	CUNETA DE CONCRETO, 3000 PSI ACELERADO A 3 DÍAS FUNDIDA EN EL LUGAR	15-dic-23	29-feb-24	76	15-dic-23		ejecución	0	ejecución
NP 014	GAVION	1-feb-24	29-feb-24	28	12-feb-24		ejecución	-11	ejecución

Plazo del proyecto: 257 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	85,06%	83,87%	-1,19%
Durante el periodo	2,39%	1,67%	-0,72%
Acumulado Actual	87,45%	85,54%	-1,91%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
257	234,00	23	-4,90

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

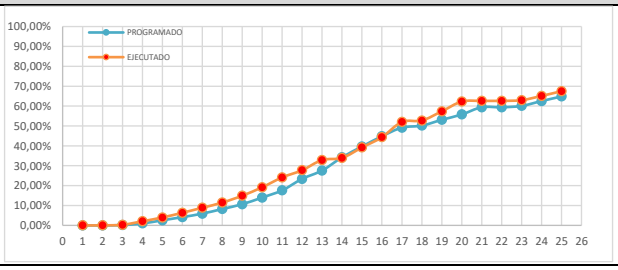

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 15.037.093.036	$ 14.826.622.948	99%
Durante el periodo	$ 422.179.950	$ 295.494.825	70%
Acumulado Actual	$ 15.459.272.986	$ 15.122.117.773	98%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-2%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

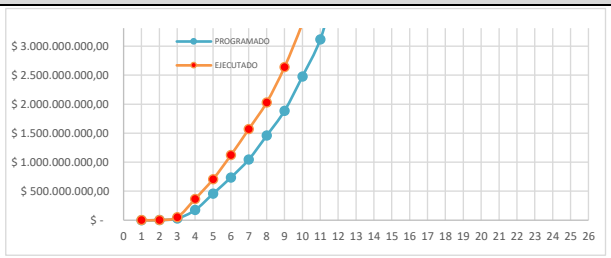


AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 3.936.746.830	$ 3.936.746.830	100%
Durante el periodo	$ 474.000.000	$ 474.000.000	100%
Acumulado Actual	$ 4.410.746.830	$ 4.410.746.830	100%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

El contratista continua utilizando los acopios temporales, principalmente el del PR 12+200, arriba de Aguadita. Se finalizo la construccion del gavion de 20 mts de Tramo 3.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

El 18 de marzo de 2024, se remite vía correo electrónico al contratista la aprobación del informe mensual No 7 mediante el comunicado SOC-ICCU-815-2023-023; así mismo, se remite a la supervisión social del ICCU el Informe mensual correspondiente al mes de febrero para su revisión y visto bueno.
Se realizó verificación de comunicaciones por parte del contratista para la comunidad con el fin de ir adelantando cierre de PQRS e información a la comunidad de la suspensión del proyecto durante la Semana Santa, de igual manera se verifican los predios en el tramo de Pasca con el fin de que los acuerdos con los propietarios hayan quedado escritos en el uso de los predios.

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	

PERIODO DE INFORME SEMANAL

	COPEBA SAS	**FECHA**	18/03/2024	**SEMANA No.**	**34**	DEL	**18-mar-24**	AL	**22-mar-24**

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

El contratista mediante oficio CNJ-ICCU708-O-0307 del 11/03/2024, radica el informe SST No 6 para revision de la Interventoria.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

Se realizan ensayos de control de calidad al concreto hidraulico tanto del mejoramiento vial como del espacio publico en Aguadita.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista solicita mediante oficio CNJ-ICCU708-O-0312 del 15/03/2024 la suspension del contrato a partir del 23/03/2024 para reiniciar el 01/04/2024, debido entre otros factores que la semana santa para este año presenta solo dos dias habiles de labores, siendo la nueva terminacion del contrato el 09 de abril.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cuenta con 1 director de Obra, Un Ingeniero Residente y Un HSE para todo el contrato. **En el Frente de Obra No 03**: del PR 07+896 al PR 08+300: Un (01) Topografo, Dos (02) Controladores de trafico, Un (01) Operador, Dos (02) conductores de volqueta, Dos (02) maestros gavioneros, Tres (03) ayudantes de obra. **En el Frente de Obra No 04**: Del PR 09+774 al PR 10+240: Se tiene Un (01) Inspector de Obra, Dos (02) Controladores de tráfico, Un (01) maestro de obra, Dos (02) Ayudantes de Obra. **En el Frente de obra No 05**: Del PR 10+260 al PR 10+660: Un (01) Inspector de Obra, Tres (03) Ayudantes de obra, Un (01) Operador de maquinaria, Dos (02) Controladores de Trafico. **En el Frente de Obra Tramo 7** (San Miguel): PR 07+500 al PR 08+487: Un (01) Inspector de obra, Un (01) Maestro de obra, Cuatro (04) Ayudantes de obra. **En el frente de obra de Pasca (Paso malo**): Un (01) Topógrafo, Un (01) cadenero, Un (01) Maestro de obra, Nueve (09) Ayudantes de obra,Dos (02) Auxiliares de trafico, Dos (02) Operadores de maquinaria, Un (01) Conductor de carrotanque. **En el frente de obra de Espacio Público de Aguadita** se tiene: Un (01) maestro de obra, Dos (02) Ayudantes de obra. **En el espacio Público de Aguabonita**: Se tiene Un (01) maestro de obra, Tres (03) Ayudantes de obra, Un (01) Operador de maquinaria, Dos (02) Auxiliares de tráfico. **Frente de Obra Demaracion Horizontal**: Se tiene personal subcontratado (1 Pintor y Dos Ayudantes). Para el contrato en general se tiene los siguientes equipos: Tres (03) Retrocargadores, Una (01) Excavadora sobre orugas, Tres (03) Volquetas de 14 M3, Una (01) Volqueta de 6 M3, Dos (02) Minicargador, Un (01) Vibro compactador autopropulsado. En el frente de Obra del Espacio Público sector Aguadita: Se tiene Tres (03) Oficiales y Quince (15) ayudantes. En general para todo el contrato cuenta con el siguiente personal: Un (01) director de Obra, Un (01) Residente de Obra, Un (01) HSE, Cuatro (04) Inspectores de Obra, Dos (02) Topógrafos, Un (01) Cadenero; Dos (02) maestros de obra, Cinco (05) Oficiales de Obra, Seis (06) Auxiliares para control de tráfico, Veintiún (21) Ayudante de Obra, Seis (06) (Operadores maquinaria), Tres (03) Conductores de volqueta.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Lo ejecutado a la fecha el contratista de acuerdo a la reprogramacion entregada por el contratista muestra un acumulado programado de $ 15,459,272.986,30 millones frente a $ 15.122,117.773,47 aproximadamente de ejecutado. Corresponde a un 87.45 % programado para un 85,54 % ejecutado acumulado.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Al contratista se le realizan observaciones en la ejecucion de las actividades diarias, la proximidad con la terminacion contractual esta conduciendo a ejecuciones presuradas con observaciones en cumplimiento de especificaciones tecnicas de los materiales utilizados.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se realizo tramite ante la CAR, mediante el cual se logro iniciar la construccion de los gaviones en tramo 3.

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Los sectores de trabajo se encuentran debidamente demarcados y el personal cuenta con EPPs.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Los compromisos de las respuestas de las PQRS no han sido informadas por parte del contratista, sin embargo se le solicito en comité integral y a la fecha las diligencias que adelantó con las entidades municipales y el predio correspondiente a la DIAN.

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Presentar informe por especialista Forestal ante la CAR	Contratista	Se cumplio
Presentar informe ante la DIAN por presunta invasion en predio de Tramo 5	Contratista	
Presentar balanceo del contrato	Contratista	

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se tienen aprobados los **NP 001**-BASE ESTABILIZADA CON 1,5% DE CEMENTO Y CON 4,5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1 EL **NP 002**-ANDÉN CONCRETO 3000 PSI E=0.15M EL **NP 003** - ESTAMPADO PARA CONCRETO (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE). EL **NP 004** - REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA, **EL NP 005** - GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).; EL **NP 006** - LOSETA DE CONCRETO A20 TIPO PANOT TR. LIVIANO 20X20X6CM COLOR OCRE Y/O TERRACOTA O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO); EL **NP 007** - PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO 1.2M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS EN CONCRETO MEZCLADO EN OBRA). **NP 008** - RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE; **NP 009** - RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO MEJORADO CON 3% DE CEMENTO COMPACTADO MECÁNICAMENTE. **NP 010** - MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO); NP 010-MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO); **NP 011** - MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD-19 CON CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO TIPO III; **NP 012** - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO R-50. **NP 013**-CUNETA DE CONCRETO, 3000 PSI ACELERADO A 3 DÍAS FUNDIDA EN EL LUGAR; **NP 014** - GAVION.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	

PERIODO DE INFORME SEMANAL

	COPEBA SAS	**FECHA**	18/03/2024	**SEMANA No.**	**34**	DEL	**18-mar-24**	AL	**22-mar-24**

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

El contratista no esta realizando consultas previas a la Interventoria, y se encuentra ejecutando obras de correcion no concertadas o autorizadas por la Interventoria

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Excavacion y demolicion de cuneta existente para berma - cuneta costado izquierdo San



Mejoramiento del suelo de fundacion de para PR 07+591 al PR 07+758 costado izquierdo San



Fundida berma - cuneta PR 08+041 al PR 08+076 costado izquierdo San Miguel



Cereo de sub base granular Paso malo - Pasca



Sub base cereada del PR 08+135 al PR 08+300 en paso malo - Pasca



Fundida de cuneta reforzada del PR 08+156 al PR 08+190 costado izquierdo Paso Malo



Relleno con suelo mejorado para la berma - cuneta espacio publico Agua Bonita.



Instalacion de adoquin PR 10+080 al PR 10+150



Demaracacion horizontal Tramo 7

ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

4.2. Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

En el Formato se registra el control diario de maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras y se registra el cumplimiento y estado del equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones.

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

CONTROL DE EQUIPOS

CONTRATO N°:	ICCU 708 DE 2023.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO PASCA CNJ - NIT. 901.715.912-1		
INTERVENTOR :	COPEBA S.A.S	**CONTRATO No.:**	ICCU-815-2023
PERÍODO DEL SEGUIMIENTO:	DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL 2024		
ACTA PARCIAL DE OBRA No.:	08 DEL 2023		

ELEMENTO O EQUIPO	FRECUENCIA	TIPO DE CONTROL	PARAMETROS DE CONTROL	CRITERIO DE ACEPTACION	ERROR PERMITIDO	OBSERVACIONES
Fresadora CAT PM 102	Diaria	Diario	Maquinaria minima	Aplica	Ninguno	
Minicargador New Holland L 218	Diaria	Diario	Maquinaria adicional	Aplica	Ninguno	
Minicargador CAT 262 D3	Diaria	Diario	Maquinaria adicional	Aplica	Ninguno	
Motoniveladora CAT 120 K	Por necesidad (semanal)	Diario	Maquinaria minima	Aplica	Ninguno	
Vibrocompactador DYNAPAC 12 Ton.	Por necesidad (semanal)	Diario	Maquinaria minima	Aplica	Ninguno	
Carrotanque 3000 Gls- Agua	Diaria	Diario	Maquinaria minima	Aplica	Ninguno	
Excavadora sobre orugas 75 SY SANY	Por necesidad (semanal)	Diario	Maquinaria minima	Aplica	Ninguno	
Volqueta Doble troque Kenworth	Diaria	Diario	Maquinaria minima	Aplica	Ninguno	
Volqueta Doble troque International	Diaria	Diario	Maquinaria minima	Aplica	Ninguno	
Vibrocompactador Benitin 1 Ton	Por necesidad (semanal)	Diario	Maquinaria adicional	Aplica	Ninguno	
Retroexcavadora Caterpillar 426 F	Diaria	Diario	Maquinaria minima	Aplica	Ninguno	
Finisher CAT SE 34 VT	Por necesidad (semanal)	Diario	Equipo adicional	Aplica	Ninguno	
Vibrocompactador tandem CAT CC 34 B	Por necesidad (semanal)	Diario	Equipo adicional	Aplica	Ninguno	

NOMBRE: WILLIAM LEONARDO OLIVEROS RAMIREZ
CARGO: DIRECTOR CONTRATO DE OBRA

NOMBRE: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE LA OBRA

4.3. Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

En el Formato se presenta el registro de la verificación del pago de aportes legales y de seguridad social efectuados por el Contratista, se registra el control diario de personal dispuesto en la obra en cumplimiento de previsto en el pliego de condiciones.

Para el presente periodo, el Contratista cuenta en obra con los siguientes profesionales aprobados por la interventoría y los cuales se requieren para la ejecución del proyecto, de acuerdo a las condiciones contractuales del contrato de obra:

- 1 Ingeniero director de obra.
- 2 Ingenieros residente de obra.
- 2 Ingeniero auxiliar de residente.
- 1 Profesional HSE.
- 1 Profesional social.
- 1 Especialista Ambiental

A continuación, se anexa cuadro de control.

INIMO LEGA	2.023	$ 1.160.000				3.200.000					
CANTIDAD	Nombre_Completo	DÍAS TRABAJADOS	VALOR MENSUAL DEVENGADO PROPUESTA ECONOMICA	VALOR TOTAL DEVENGADO	40% DEL VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	IBC SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL PENSION 16%	TOTAL SALUD 12,5% y 4%	IBC RIESGOS	TARIFA SISTEMA	ARL	TOTAL APORTES
1	WILLIAM LEONARDO OLIVEROS RAMIREZ	30	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	800.000	200.000	5.000.000	0,0696	348.000	1.348.000
1	NERIETH DEL PILAR SALAS JARA	30	2.880.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	432.000	108.000	2.700.000	0,0696	187.900	727.900
1	DANIELA RIVEROS TRIANA	30	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	320.000	80.000	2.000.000	0,0696	1.866.667	2.266.700
1	NATALIA QUECHO SARMIENTO	30	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	1.040.000	260.000	6.500.000	0,0696	452.400	1.752.400
1	JOSE ALEXANDER CAICEDO BARRIOS	30	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	640.000	160.000	4.000.000	0,0696	278.400	1.078.400
1	GERSSON REYNEL BENITEZ GONZALEZ	30	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	640.000	160.000	4.000.000	0,0696	278.400	1.078.400
1	MAURICIO PRADA RODRIGUEZ	30	4.815.000	4.815.000	4.815.000	4.815.000	770.400	192.600	4.815.000	0,0696	335.100	1.298.100
1	JOSE ALEJANDRO ESPINOSA RIVEROS	30	9.999.000	9.999.000	9.999.000	9.999.000	1.599.800	400.000	9.999.000	0,0696	695.900	2.695.700
1	LUIGGY SANTIAGO REINA MERCHAN	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	SERGIO DAVID HERNANDEZ BURGOS	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	OSCAR RAMIREZ PARRA	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	145.000	1.160.000	0,0105	12.200	342.800
1	EDGAR ARDILA ROA	30	4.876.900	4.876.900	4.876.900	4.876.900	780.300	195.100	4.876.900	0,0696	339.400	1.314.800
1	JONNY ARLEY CASTRO CANDIA	30	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	672.000	168.000	4.200.000	0,00522	21.900	861.900
1	CARLOS ANDRES RIVERA GUZMAN	30	1.463.021	1.463.021	1.463.021	1.463.021	234.100	58.500	1.463.021	0,0696	101.800	394.400
1	LUIS FERNANDO CHAPARRO PINEDA	30	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000	227.400	56.800	1.421.000	0,0696	98.900	383.100
1	EDGAR YOVANNY MARTINEZ DAZA	30	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	432.000	108.000	2.700.000	0,0696	187.900	727.900
1	HUBER SNEIDER MORALES REY	30	1.421.967	1.421.967	1.421.967	1.421.967	227.500	56.900	1.421.967	0,0696	99.000	383.400
1	MIGUEL ANDRES BERMUDEZ BUENO	30	1.409.883	1.409.883	1.409.883	1.409.883	225.600	56.400	1.409.883	0,0696	98.100	380.100
1	EDUAR ALEXANDER CARDENAS RIOS	30	1.292.917	1.292.917	1.292.917	1.292.917	206.900	51.700	1.292.917	0,0696	90.000	348.600
1	YURI KARINA GAITAN MARTINEZ	30	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	268.000	67.000	1.675.000	0,0696	116.600	451.600
1	MAURICIO MESTIZO DIAZ	30	1.639.406	1.639.406	1.639.406	1.639.406	262.300	65.600	1.639.406	0,0696	114.100	442.000
1	LEIDY JOHANA ALVAREZ GONZALEZ	30	1.253.646	1.253.646	1.253.646	1.253.646	200.600	50.100	1.253.646	0,0696	87.300	338.000
1	ELIANA PATRICIA ROZO MOLINA	30	1.279.021	1.279.021	1.279.021	1.279.021	204.600	51.200	1.279.021	0,0696	89.000	344.800
1	LUDWING ALBERTO CABALLERO PEÑA	30	2.230.667	2.230.667	2.230.667	2.230.667	356.900	89.200	2.230.667	0,0696	155.300	601.400
1	MIGUEL ENRIQUE BEJARANO	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	SEDIEL MONTAÑA ESTUPIÑAN	30	2.962.500	2.962.500	2.962.500	2.962.500	474.000	118.500	2.962.500	0,0696	206.200	798.700
1	PLACIDO ARIMESDY POVEDA	30	1.955.333	1.955.333	1.955.333	1.955.333	312.900	78.200	1.955.333	0,0696	136.100	527.200
1	MAURICIO SANABRIA	1	1.639.406	54.647	54.647	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	RONALDO STEVEN PINEDA ACOSTA	30	1.166.042	1.166.042	1.166.042	1.166.042	186.600	46.600	1.166.042	0,0696	81.200	314.400
1	OSCAR DANILO ABRIL HURTADO	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ PEÑA	23	1.160.000	889.333	889.333	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	YEISON ANDRES PIÑEROS TIQUE	20	1.160.000	773.333	773.333	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	JHONATAN DANIEL TABACO PINEDA	30	1.374.841	1.374.841	1.374.841	1.374.841	220.000	55.000	1.374.841	0,0696	95.700	370.700
1	JOSE AUGUSTO PORRAS	30	1.296.300	1.296.300	1.296.300	1.296.300	207.400	51.900	1.296.300	0,0696	90.200	349.500
1	EDUIN ALEXANDER SANTANA MORENO	30	2.635.487	2.635.487	2.635.487	2.635.487	421.700	105.400	2.635.487	0,0696	183.400	710.500
1	JOSE DANIEL GOMEZ ESPEJO	30	2.902.500	2.902.500	2.902.500	2.902.500	464.400	116.100	2.902.500	0,0696	202.000	782.500
1	YESSICA NATALIA PULIDO MESA	30	1.306.692	1.306.692	1.306.692	1.306.692	209.100	52.300	1.306.692	0,0696	90.900	352.300
1	LUIS ALVARO MACIAS NUÑEZ	30	1.383.542	1.383.542	1.383.542	1.383.542	221.400	55.300	1.383.542	0,0696	96.300	373.000
1	ADRINA MILENA PULIDO MESA	30	1.347.292	1.347.292	1.347.292	1.347.292	215.600	53.900	1.347.292	0,0696	93.800	363.300
1	JULIAN CAMILO CASTIBLANCO OSPINA	30	1.302.221	1.302.221	1.302.221	1.302.221	208.400	52.100	1.302.221	0,0696	90.600	351.100
1	JESUS DANIEL FEO SALCEDO	30	1.398.042	1.398.042	1.398.042	1.398.042	223.700	55.900	1.398.042	0,0696	97.300	376.900
1	ERASMO VASQUEZ ARIAS	30	2.196.334	2.196.334	2.196.334	2.196.334	351.400	87.900	2.196.334	0,0696	152.900	592.200
1	JAIRO ANTONIO LOAIZA ZULUAGA	30	2.937.703	2.937.703	2.937.703	2.937.703	470.000	117.500	2.937.703	0,0696	204.500	792.000
1	MARCO ANTONIO BARRETO PAREDES	27	2.800.000	1.225.008	1.225.008	1.225.008	196.000	49.000	1.225.008	0,0696	85.300	330.300
1	JEIMY VIVIANA FRESNEDA PATIÑO	30	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000	396.800	99.200	2.480.000	0,0696	172.600	668.600
1	JEISON BEDOYA VILLADIEGO	30	1.766.270	1.766.270	1.766.270	1.766.270	282.600	70.700	1.766.270	0,0696	122.900	476.200
1	SERGIO ANDRES CASTILLO RODRIGUEZ	30	1.650.782	1.650.782	1.650.782	1.650.782	264.100	66.000	1.650.782	0,0696	114.900	445.000
1	JOSE DUVER CADENA GUZMAN	30	1.420.034	1.420.034	1.420.034	1.420.034	227.200	56.800	1.420.034	0,0696	98.800	382.800
1	JOSE DANIEL ORDOÑEZ MARTINEZ	30	1.413.992	1.413.992	1.413.992	1.413.992	226.200	56.600	1.413.992	0,0696	98.400	381.200
1	JAIME ALEJANDRO VERGARA BANQUET	20	1.413.992	942.661	942.661	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	VICTORINO MATTOS CENTENO	30	1.773.817	1.773.817	1.773.817	1.773.817	283.800	71.000	1.773.817	0,0696	123.500	478.300
1	PLINIO RINCON PEDRAZA	30	2.140.937	2.140.937	2.140.937	2.140.937	342.500	85.600	2.140.937	0,0696	149.000	577.100
1	FAUSTO ALEJANDRO ZAMUDIO MARTINEZ	30	2.077.346	2.077.346	2.077.346	2.077.346	332.400	83.100	2.077.346	0,0696	144.600	560.100
1	LUIS MAURICIO CAMARGO GONZALEZ	30	1.739.577	1.739.577	1.739.577	1.739.577	278.300	69.600	1.327.476	0,0696	92.400	440.300
1	LUIS CARLOS RUEDA CAMACHO	30	2.581.819	2.581.819	2.581.819	2.581.819	413.100	103.300	2.581.819	0,0696	179.700	696.100
1	CARLOS TAPASCO AZCARATE	30	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	432.000	108.000	2.700.000	0,0696	187.900	727.900
1	JOSE BENJAMIN MORA MORA	23	1.160.000	889.333	889.333	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	JAIME ALBERTO ARROYO GARCIA	30	1.420.034	1.420.034	1.420.034	1.420.034	227.200	56.800	1.420.034	0,0696	98.800	382.800
1	BRAIJAN EDUARDO SILVA FLOREZ	30	2.314.125	2.314.125	2.314.125	2.314.125	370.300	92.600	2.314.125	0,0696	161.100	624.000
1	CARLOS ANDRES GARCIA RIOS	30	3.923.812	3.923.812	3.923.812	3.923.812	627.800	157.000	3.923.812	0,0696	273.100	1.057.900
1	RONAL JOHAN ALARCON FOREO	30	1.314.425	1.314.425	1.314.425	1.314.425	210.300	52.600	1.314.425	0,0696	91.500	354.400
1	ALEXANDER DE LA CRUZ MARTINEZ	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	ANDRES FELIPE ZAMORA MORENO	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700

1	FRANCISCO CAMACHO TORO	8	1.160.000	309.333	309.333	309.333	49.500	12.400	309.333	0,0696	21.500	83.400
1	HECTOR HERNANDO ARIZA LEGUIZANO	30	2.370.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000	379.200	94.800	2.370.000	0,0696	165.000	639.000
1	CRISTOBAL FLOREZ ESCOBAR	30	1.943.333	1.943.333	1.943.333	1.943.333	310.900	77.700	1.943.333	0,0696	135.300	523.900
1	JULIAN DOMINGO MESA CARDONA	30	1.392.001	1.392.001	1.392.001	1.392.001	222.700	55.700	1.093.934	0,0696	76.100	354.500
1	MIGUEL ANTONIO HORTUA CAMELO	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	ALVARO LOPEZ RODRIGUEZ	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	CAMILO RUIZ CASTILLO	30	1.828.500	1.828.500	1.828.500	1.828.500	292.600	73.100	1.828.500	0,0696	127.300	493.000
1	GEIMAR BELTRAN MARTINEZ	30	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	208.000	52.000	1.300.000	0,0696	90.500	350.500
1	ORLANDO MARTINEZ BELTRAN	30	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	208.000	52.000	1.300.000	0,0696	90.500	350.500
1	CAMPO ELIAS CASTRO CASTRO	30	1.684.639	1.684.639	1.684.639	1.684.639	269.500	67.400	1.684.639	0,0696	117.300	454.200
1	ALVARO BOTIA PINILLA	11	2.410.864	883.983	883.983	883.983	141.400	35.400	883.983	0,0696	61.500	238.300
1	CESAR JULIO AMAYA SIERRA	30	1.644.446	1.644.446	1.644.446	1.644.446	263.100	65.800	1.543.043	0,0696	107.400	436.300
1	DONALDO NAVARRO ESQUEA	30	2.756.124	2.756.124	2.756.124	2.756.124	441.000	110.200	2.756.124	0,0696	191.800	743.000
1	EDWIN EUGENIO AGUILAR PEÑA	30	1.604.184	1.604.184	1.604.184	1.604.184	256.700	64.200	1.604.184	0,0696	111.700	432.600
1	JOSE RENE GONZALEZ RODRIGUEZ	30	2.060.297	2.060.297	2.060.297	2.060.297	329.600	82.400	2.060.297	0,0696	143.400	555.400
1	OLIVER JOSE AVILA MENDEZ	1	1.567.934	52.264	52.264	52.264	8.400	2.100	52.264	0,0696	3.600	14.100
1	CARLOS WILLIAM CASTIBLANCO UPEGUI	8	1.631.733	435.129	435.129	435.129	69.600	17.400	435.129	0,0696	30.300	117.300
1	CAMILO ANDRES MENDOZA VILORIA	5	1.160.000	193.333	193.333	193.333	30.900	7.700	193.333	0,0696	13.500	52.100
1	JHOHN JAIVER VELASCO MOSQUERA	30	2.841.750	2.841.750	2.841.750	2.841.750	454.700	113.700	2.841.750	0,0696	197.800	766.200
1	JIANCARLO PALACIOS VALERA	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	OSCAR JAVIER SIERRA CHARRY	30	1.961.239	1.961.239	1.961.239	1.961.239	313.800	78.400	1.961.239	0,0696	136.500	528.700
1	GRACILIANO ANGEL BUITRAGO	30	3.420.525	3.420.525	3.420.525	3.420.525	547.300	136.800	3.420.525	0,0696	238.100	922.200
1	EDWIN CAMILO ZAMORA MORENO	18	1.160.000	696.000	696.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	JHON KENNEDY LAVAO CABEZA	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	REINERIO DE JESÚS LOPEZ CARDONA	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	DIEGO PIRANEQUE ROJAS	30	2.016.525	2.016.525	2.016.525	2.016.525	322.600	80.700	2.016.525	0,0696	140.400	543.700
1	LUIS MANUEL GONZALEZ	30	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	193.300	48.300	1.208.333	0,0696	84.100	325.700
1	LUIS ENRIQUE CORREA TORRES	30	1.910.132	1.910.132	1.910.132	1.910.132	305.600	76.400	1.910.132	0,0696	132.900	514.900
1	GERMAN ANDRES CASTRO SERVA	30	2.198.999	2.198.999	2.198.999	2.198.999	351.800	88.000	2.198.999	0,0696	153.100	592.900
1	LUIS ALEJANDRO PACHECO QUINTANA	14	676.200	315.560	315.560	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	ELIECER DE JESUS CUBILLOS PEÑA	30	1.767.068	1.767.068	1.767.068	1.767.068	282.700	70.700	1.767.068	0,0696	123.000	476.400
1	WILFRIDO ANTONIO ZABALETA PEREZ	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	JUAN ANDRES LOPEZ VIDES	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	GEOVANIS RODRIGUEZ PUERTA	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	PAULINO DIAZ SALAS	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	EDUER ENRIQUE GONZALEZ PEÑA	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	MANUEL ALEJANDRO CELEITA GONZALEZ	30	1.264.400	1.264.400	1.264.400	1.264.400	202.300	50.600	1.264.400	0,0696	88.000	340.900
1	SAMUEL CHACON SEPULVEDA	4	154.667	20.622	20.622	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	ALBERT RAFAEL GUTIERREZ DE LA CRUZ	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	ANDRES ALFONSO SALINAS MADARIAGA	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	DAMAR ANTONIO GUTIERREZ GAMERO	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	JHAN FRANCO DE LA HOZ GUTIERREZ	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	CARLOS ARTURO RIVERA ZABALETA	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	CESAR JULIO GUTIERREZ RODRIGUEZ	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	LUIS RICARDO GIL PARRA	30	1.262.708	1.262.708	1.262.708	1.262.708	202.000	50.500	1.262.708	0,0696	87.900	340.400
1	LUIS ALBERTO GONZALEZ	30	1.455.801	1.455.801	1.455.801	1.455.801	232.900	58.200	1.455.801	0,0696	101.300	392.400
1	JULIO EDUARDO REY MORALES	30	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	ANTONY DANIEL GUEVARA ANGULO	11	1.261.500	462.550	462.550	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	JOHN MILLER CARDENAS CARVAJAL	10	1.578.806	526.269	526.269	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	FABIAN SANTIAGO GAITAN BELLAIZAN	10	1.263.434	421.145	421.145	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	OSCAR HERNANDO RAMIREZ BOLIVAR	11	1.752.864	642.717	642.717	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	JOHN SEBASTIAN RODRIGUEZ	10	2.430.000	810.000	810.000	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	JHOHN FREDY MICOLTA MARQUINEZ	7	1.147.917	267.847	267.847	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	YEISON ANDREY PARADA SARMIENTO	10	1.160.000	386.667	386.667	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	ROGELIO BARRERA	19	1.160.000	734.667	734.667	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	JAIDER DE JESUS JIMENEZ EGARA	5	1.160.000	193.333	193.333	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
1	KEVIN EDUARDO DIAZ RIVEROS	5	1.160.000	193.333	193.333	1.160.000	185.600	46.400	1.160.000	0,0696	80.700	312.700
97	TOTAL		$ 197.147.451,00	$ 185.527.241,60	$ 185.027.241,60	$ 188.586.373,40	$ 30.173.700,00	$ 7.642.300,00	$ 187.774.802,40		$ 14.457.167,00	$ 52.273.200,00

4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Para respaldar las obligaciones presupuestales contraídas con el Contrato, el ICCU tiene autorización para comprometer los recursos de presupuesto y no para vigencias futuras.

VIGENCIA	VALOR
2023	$ 17.862.489.434,00
TOTAL	$ 17.862.489.434,00

A continuación, se presenta formato de seguimiento financiero del contrato de obra.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA: 26/02/2024 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No :	708 DE 2023	**PLAZO INICIAL:**	31 de diciembre de 2023	**PLAZO ACTUAL:**	08 de mayo de 2024
OBJETO :	"MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".	**FECHA DE INICIO:**	01 de agosto de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 17.862.489.434,00
INTERVENTORÍA:	COPEBA S.A.S.	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N.A.	**ADICIONES:**	$ -
CONTRATISTA:	CONSORCIO PASCA CNJ				
PERIODO:	MARZO DE 2024	**FECHA DE FIN:**	08 de mayo de 2024	**VALOR CON ADICIONES:**	$ 17.862.489.434,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo del registro presupuestal	Saldo del Contrato	Observaciones
						$ 17.862.489.434,00	**$ 17.862.489.434,00**	**Valor contractual del contrato**
	Anticipo del 30%				$ 5.358.746.830,00	$ 12.503.742.604,00	$ 17.862.489.434,00	
1	01 al 31 de agosto de 2023	$ 53.444.824,56	$ 16.033.447,00	$ 37.411.377,56	$ 5.342.713.383,00	$ 12.466.331.226,44	$ 17.809.044.609,44	
2	01 al 30 de septiembre de 2023	$ 2.003.239.821,46	$ 600.971.946,00	$ 1.402.267.875,46	$ 4.741.741.437,00	$ 11.064.063.350,98	$ 15.805.804.787,98	
3	01 al 31 de octubre de 2023	$ 2.905.262.314,41	$ 871.578.694,00	$ 2.033.683.620,41	$ 3.870.162.743,00	$ 9.030.379.730,57	$ 12.900.542.473,57	
4	1 al 30 de noviembre de 2023	$ 4.337.202.626,77	$ 1.301.160.788,00	$ 3.036.041.838,77	$ 2.569.001.955,00	$ 5.994.337.891,80	$ 8.563.339.846,80	
5	1 al 31 de diciembre de 2023	$ 1.658.404.513,08	$ 497.521.354,00	$ 1.160.883.159,08	$ 2.071.480.601,00	$ 4.833.454.732,72	$ 6.904.935.333,72	
6	1 al 31 de enero de 2024	$ 1.588.867.321,45	$ 476.660.196,00	$ 1.112.207.125,45	$ 1.594.820.405,00	$ 3.721.247.607,27	$ 5.316.068.012,27	
7	01 al 29 de Febrero del 2024	$ 1.780.792.334,00	$ 534.237.700,00	$ 1.246.554.634,00	$ 1.060.582.705,00	$ 2.474.692.973,27	$ 3.535.275.678,27	
8	01 al 23 de Marzo del 2024	$ 1.395.259.641,31	$ 1.060.582.705,00	$ 334.676.936,31	$ -	$ 2.140.016.036,96	$ 2.140.016.036,96	
TOTALES		**$ 15.722.473.397,04**	**$ 5.358.746.830,00**	**$ 10.363.726.567,04**	**$ -**	**$ 2.140.016.037**	**$ 2.140.016.036,96**	

4.5. Estado General del Tiempo

En el siguiente formato se presenta el registro del estado general del tiempo imperante en la zona del proyecto durante el presente mes.

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

FECHA 12/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA **DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

CONTRATO DE OBRA No: ICCU 708 DE 2023. **CONTRATISTA:** CONSORCIO PASCA CNJ - NIT. 901.715.912-1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Marzo del 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: ICCU-815-2023 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
Seco	24	23,5	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24									527,5
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24									

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: **Alexander Caicedo**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: **70202 - 382427 TLM**

Firma
Nombre: **Giovanni Ariza Arias**
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202 - 74644 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

A continuación, presenta resumen de los ensayos de laboratorio realizados por el contratista de obra en el presente mes.

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

CONSORCIO PASCA CNJ

COPEBA SAS

FECHA: 20/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN : CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No.: ICCU- 708 DEL 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO PASCA CNJ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DEL 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU - 815 DEL 2023- 2021

INTERVENTOR: COPEBA SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Dia/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
14	4/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 28 días	Según Diseño	ANDEN AGUADITA	A-089	≥100%	101,35%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	4/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 28 días	Según Diseño		A-090	≥100%	101,78%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	7/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 28 días	Según Diseño	ANDEN AGUADITA	A-095	≥100%	102,03%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	7/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 28 días	Según Diseño		A-096	≥100%	102,13%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	7/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 14 días	-	ANDEN AGUADITA	A-099	-	90,80%	-	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	7/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 14 días	-		A-100	-	91,34%	-	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	21/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 28 días	Según Diseño		A-101	≥100%	102,40%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	21/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 28 días	Según Diseño		A-102	≥100%	100,92%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	1/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 7 días	-	ANDEN AGUADITA	A-103	-	72,07%	-	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	1/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 7 días	-		A-104	-	73,10%	-	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	8/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 14 días	-		A-105	-	93,54%	-	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	8/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 14 días	-		A-106	-	94,50%	-	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	22/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 28 días	Según Diseño		A-107	≥100%	101,24%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	22/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 28 días	Según Diseño		A-108	≥100%	102,61%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	2/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 7 días	-	ANDEN AGUADITA	A-109	-	73,85%	-	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	2/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 7 días	-		A-110	-	72,89%	-	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	9/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 14 días	-		A-111	-	92,30%	-	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	9/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 14 días	-		A-112	-	91,45%	-	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	23/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 28 días	Según Diseño		A-113	≥100%	100,69%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	23/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 28 días	Según Diseño		A-114	≥100%	100,40%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	8/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 7 días	-	ANDEN AGUADITA	A-115	-	70,17%	-	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	8/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 7 días	-		A-116	-	70,96%	-	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	15/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 14 días	-		A-117	-	94,32%	-	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	15/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 14 días	-		A-118	-	93,41%	-	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	29/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 28 días	Según Diseño		A-119	≥100%	102,69%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	29/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 28 días	Según Diseño		A-120	≥100%	102,05%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

CONSORCIO PASCA CNJ

COPEBA SAS

FECHA: 20/04/2024 (Día / Mes / Año)

14	28/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 7 días	-	CUNETA PASCA	X-251	-	74,89%	-	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	28/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 7 días	-		X-252	-	73,86%	-	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	29/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 7 días	-	CUNETA PASCA	X-257	-	71,30%	-	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	29/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 7 días	-		X-258	-	71,75%	-	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	30/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 7 días	-	CUNETA PASCA	X-263	-	70,05%	-	Concreto de 3000 PSI Premezclado
14	30/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 7 días	-		X-264	-	71,32%	-	Concreto de 3000 PSI Premezclado
15	1/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño	CUNETA TRAMO 7	A3-045	≥100%	101,86%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	1/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño		A3-046	≥100%	100,77%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	2/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño	CUNETA TRAMO 7	A3-047	≥100%	102,84%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	2/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño		A3-048	≥100%	102,82%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	2/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño	CUNETA AGUADITA	A3-049	≥100%	102,77%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	2/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño		A3-050	≥100%	102,12%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	10/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño	CUNETA TRAMO 7	A3-051	≥100%	102,77%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	10/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño		A3-052	≥100%	101,30%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	10/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño	CUNETA AGUABONITA	A3-053	≥100%	102,77%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	10/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño		A3-054	≥100%	102,12%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	11/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño	CUNETA AGUABONITA	A3-055	≥100%	102,77%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	11/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño		A3-056	≥100%	102,12%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	14/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño	CUNETA TRAMO 7	A3-057	≥100%	102,77%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	14/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño		A3-058	≥100%	102,12%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	15/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño	CUNETA TRAMO 7	A3-059	≥100%	102,77%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	15/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño		A3-060	≥100%	102,12%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	15/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño	CUNETA AGUABONITA	A3-061	≥100%	102,77%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	15/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño		A3-062	≥100%	102,12%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	17/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño	CUNETA TRAMO 7	A3-063	≥100%	102,77%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	17/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño		A3-064	≥100%	102,12%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	18/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño	CUNETA AGUABONITA	A3-065	≥100%	102,77%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	18/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño		A3-066	≥100%	102,12%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	22/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño	CUNETA AGUABONITA	A3-067	≥100%	102,77%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	22/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño		A3-068	≥100%	102,12%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	24/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño	CUNETA TRAMO 7	A3-069	≥100%	102,79%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	24/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño		A3-070	≥100%	102,12%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	24/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño	CUNETA AGUABONITA	A3-071	≥100%	102,77%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	24/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño		A3-072	≥100%	102,12%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

CONSORCIO PASCA CNJ

COPEBA SAS

FECHA: 20/04/2024 (Día / Mes / Año)

15	25/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño	CUNETA TRAMO 7	A3-073	≥100%	102,77%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	25/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño		A3-074	≥100%	102,12%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	25/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño	CUNETA AGUABONITA	A3-075	≥100%	102,77%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
15	25/03/2024	Resistencia a la Compresión - Rotura a los 3 días	Según Diseño		A3-076	≥100%	102,12%	SI	Concreto de 3000 PSI Premezclado Acelerado 3 Días
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de

Firma

Nombre: WILLIAN LEONARDO OLIVEROS RAMIREZ
Director de Obra
Matricula No.: 25202- 253901 CND

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-065

AUSCULTAR
ENSAYOS E INGENIERÍA

INFORME RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

Código	IE-018
Versión	5
Fecha	2022-11-21
Página	1 de 1

ENTIDAD CONTRATANTE: CONSORCIO CNJ PASCA
DIRECCIÓN CONTRATANTE: NA
PROYECTO: CONTRATO ICCU-708 DE 2023 MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA
SECTOR: TRAMO 1
DESCRIPCIÓN: CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI
FECHA DE EMISIÓN 30/03/2024

INFORME No.: CC-2024-04
FECHA RECEPCIÓN: 5/02/2024
FECHA EJECUCIÓN: 30/03/2024
RESISTENCIA DE DISEÑO 210 Kg/cm²
ABSCISA: NA

CONTROL DE MUESTRAS CONCRETO: 0

ELEMENTO / No. MUESTRA	FECHA DE TOMA	No. CILINDRO	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	AREA (mm²)	VOLUMEN (m³)	PESO (kg)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA A LA COMPRESION		PORCENTAJE CON RESPECTO A f´c	TIPO DE FALLA						
												MPa	P.S.I.		Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6	Otro
ANDEN AGUADITA																					
	5/02/2024	A-089	28	4/03/2024	103,1	203,7	8348,5	0,002	4,005	2355	175,014	20,963	3040,500	101,35%			X				
	5/02/2024	A-090	28	4/03/2024	101,3	203,5	8059,5	0,002	3,785	2308	169,672	21,052	3053,400	101,78%				X			
ANDEN AGUADITA																					
	8/02/2024	A-095	28	7/03/2024	102,9	204,0	8316,1	0,002	3,995	2355	175,504	21,104	3060,900	102,03%				X			
	8/02/2024	A-096	28	7/03/2024	102,6	205,0	8267,7	0,002	3,912	2308	174,654	21,125	3063,900	102,13%				X			
ANDEN AGUADITA																					
	22/02/2024	A-099	14	7/03/2024	101,3	205,2	8059,5	0,002	3,910	2364	151,368	18,781	2724,000	90,80%					X		
	22/02/2024	A-100	14	7/03/2024	101,6	205,0	8107,3	0,002	3,869	2328	153,171	18,893	2740,200	91,34%				X			
	22/02/2024	A-101	28	21/03/2024	101,3	203,2	8059,5	0,002	3,857	2355	170,705	21,181	3072,000	102,40%		X					
	22/02/2024	A-102	28	21/03/2024	101,6	204,0	8107,3	0,002	3,817	2308	169,236	20,875	3027,600	100,92%			X				
ANDEN AGUADITA	23/02/2024	A-103	7	1/03/2024	101,3	204,0	8059,5	0,002	3,883	2362	120,144	14,907	2162,100	72,07%				X			
	23/02/2024	A-104	7	1/03/2024	101,6	203,2	8107,3	0,002	3,949	2397	122,584	15,120	2193,000	73,10%		X					
	23/02/2024	A-105	14	8/03/2024	103,9	204,7	8478,5	0,002	4,103	2364	164,042	19,348	2806,200	93,54%			X				
	23/02/2024	A-106	14	8/03/2024	103,1	205,5	8348,5	0,002	3,994	2328	163,185	19,547	2835,000	94,50%					X		
	23/02/2024	A-107	28	22/03/2024	101,3	205,5	8059,5	0,002	3,900	2355	168,772	20,941	3037,200	101,24%				X			
	23/02/2024	A-108	28	22/03/2024	101,6	203,5	8107,3	0,002	3,808	2308	172,070	21,224	3078,300	102,61%			X				
ANDEN AGUADITA	24/02/2024	A-109	7	2/03/2024	102,1	204,2	8187,3	0,002	3,949	2362	125,064	15,275	2215,500	73,85%		X					
	24/02/2024	A-110	7	2/03/2024	102,4	202,9	8235,5	0,002	4,005	2397	124,164	15,077	2186,700	72,89%			X				
	24/02/2024	A-111	14	9/03/2024	102,4	203,7	8235,5	0,002	3,966	2364	157,228	19,092	2769,000	92,30%		X					
	24/02/2024	A-112	14	9/03/2024	102,4	203,5	8235,5	0,002	3,902	2328	155,781	18,916	2743,500	91,45%			X				
	24/02/2024	A-113	28	23/03/2024	103,1	204,2	8348,5	0,002	4,015	2355	173,874	20,827	3020,700	100,69%					X		
	24/02/2024	A-114	28	23/03/2024	102,9	205,0	8316,1	0,002	3,935	2308	172,700	20,767	3012,000	100,40%				X			
ANDEN AGUADITA	1/03/2024	A-115	7	8/03/2024	101,6	202,9	8107,3	0,002	3,867	2351	117,670	14,514	2105,100	70,17%			X				
	1/03/2024	A-116	7	8/03/2024	103,4	202,9	8397,1	0,002	4,006	2351	123,249	14,678	2128,800	70,96%		X					
	1/03/2024	A-117	14	15/03/2024	103,4	204,2	8397,1	0,002	4,009	2338	163,822	19,509	2829,600	94,32%			X				
	1/03/2024	A-118	14	15/03/2024	103,4	204,7	8397,1	0,002	3,952	2299	162,242	19,321	2802,300	93,41%				X			
	1/03/2024	A-119	28	29/03/2024	102,6	202,9	8267,7	0,002	3,883	2315	175,613	21,241	3080,723	102,69%					X		
	1/03/2024	A-120	28	29/03/2024	103,1	204,7	8348,5	0,002	4,079	2387	176,222	21,108	3061,500	102,05%			X				

TIPOS DE FALLA



TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6

DECLARACION DE CONFORMIDAD: N / A

OBSERVACIONES:

El laboratorio no se hace responsable sobre la información suministrada por el cliente. Los resultados corresponden unicamente a la muestra ensayada, como se recibió. El alcance del laboratorio no incluye el muestreo y transporte del material. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad, parcialmente ni será válido sin la firma del director técnico. La información suministrada por el cliente se identifica mediante el subrayado al texto. Los valores de incertidumbre expandida reportados en el presente documento corresponden a una incertidumbre combinada multiplicada por k=2 y con una probabilidad de cobertura del 95%.

REVISÓ Y APROBÓ

OSCAR IVAN MENDEZ SILVA
LABORATORISTA

FIN DE INFORME

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-065

AUSCULTAR ENSAYOS E INGENIERÍA

INFORME RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

Código	IE-018
Versión	5
Fecha	2022-11-21
Página	1 de 1

ENTIDAD CONTRATANTE: CONSORCIO CNJ PASCA
DIRECCIÓN CONTRATANTE: NA
PROYECTO: CONTRATO ICCU-708 DE 2023 MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA
SECTOR: TRAMO 1
DESCRIPCIÓN: CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI
FECHA DE EMISIÓN 30/03/2024

INFORME No.: CC-2024-04
FECHA RECEPCIÓN: 5/02/2024
FECHA EJECUCIÓN: 30/03/2024
RESISTENCIA DE DISEÑO 210 Kg/cm²
ABSCISA: NA

CONTROL DE MUESTRAS CONCRETO: 0

ELEMENTO / No. MUESTRA	FECHA DE TOMA	No. CILINDRO	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	AREA (mm²)	VOLUMEN (m³)	PESO (kg)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA A LA COMPRESION		PORCENTAJE CON RESPECTO A f´c	TIPO DE FALLA						
												MPa	P.S.I.		Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6	Otro
CUNETA PASCA	21/03/2024	X-251	7	28/03/2024	102.4	204.0	8235.5	0.002	3.941	2346	127.571	15.490	2246.700	74.89%			x				
	21/03/2024	X-252	7	28/03/2024	102.6	204.5	8267.7	0.002	3.988	2359	126.309	15.277	2215.800	73.86%					x		
CUNETA PASCA	22/03/2024	X-257	7	29/03/2024	102.1	204.5	8187.3	0.002	4.008	2394	120.745	14.748	2139.000	71.30%				x			
	22/03/2024	X-258	7	29/03/2024	102.9	204.5	8316.1	0.002	3.980	2340	123.419	14.841	2152.500	71.75%					x		
CUNETA PASCA	23/03/2024	X-263	7	30/03/2024	102.9	204.0	8316.1	0.002	3.951	2329	120.495	14.489	2101.500	70.05%				x			
	23/03/2024	X-264	7	30/03/2024	101.6	204.0	8107.3	0.002	3.845	2325	119.599	14.752	2139.600	71.32%				x			

TIPOS DE FALLA



DECLARACION DE CONFORMIDAD: N / A

OBSERVACIONES:

El laboratorio no se hace responsable sobre la información suministrada por el cliente. Los resultados corresponden únicamente a la muestra ensayada como se recibió. El alcance del laboratorio no incluye el muestreo y transporte del material. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad parcialmente ni será valido sin la firma del director técnico. La información suministrada por el cliente se identifica mediante el subrayado al texto. Los valores de incertidumbre expandida reportados en el presente documento corresponden a una incertidumbre combinada multiplicada por k=2 y con una probabilidad de cobertura del 95%

REVISÓ Y APROBÓ:

OSCAR IVAN MENDEZ SILVA
LABORATORISTA

FIN DE INFORME

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-065

AUSCULTAR
ENSAYOS E INGENIERÍA

INFORME RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

Código	IE-018
Versión	5
Fecha	2022-11-21
Página	1 de 1

ENTIDAD CONTRATANTE: CONSORCIO CNJ PASCA
DIRECCIÓN CONTRATANTE: NA
PROYECTO: CONTRATO ICCU-708 DE 2023 MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA
SECTOR: TRAMO 1
DESCRIPCIÓN: CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI - ACELERADO 3 DÍAS
FECHA DE EMISIÓN 25/03/2024

INFORME No.: CC-2024-05
FECHA RECEPCIÓN: 27/02/2024
FECHA EJECUCIÓN: 25/03/2024
RESISTENCIA DE DISEÑO 210 Kg/cm²
ABSCISA: NA

CONTROL DE MUESTRAS CONCRETO: 0

ELEMENTO / No. MUESTRA	FECHA DE TOMA	No. CILINDRO	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	AREA (mm²)	VOLUMEN (m³)	PESO (kg)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA A LA COMPRESION		PORCENTAJE CON RESPECTO A f'c	TIPO DE FALLA						
												MPa	P.S.I.		Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6	Otro
CUNETA TRAMO 7	27/02/2024	A3-045	3	1/03/2024	103,6	204,5	8429,6	0,002	3,984	2311	177,603	21,069	3055,800	101,86%		x					
	27/02/2024	A3-046	3	1/03/2024	103,6	203,2	8429,6	0,002	4,108	2398	175,702	20,844	3023,100	100,77%					x		
CUNETA TRAMO 7	28/02/2024	A3-047	3	2/03/2024	102,1	203,5	8187,3	0,002	3,917	2351	174,158	21,272	3085,200	102,84%				x			
	28/02/2024	A3-048	3	2/03/2024	102,9	205,2	8316,1	0,002	3,962	2322	176,863	21,268	3084,600	102,82%			x				
CUNETA AGUADITA	28/02/2024	A3-049	3	2/03/2024	102,1	203,2	8187,3	0,002	3,838	2307	174,039	21,257	3083,100	102,77%			x				
	28/02/2024	A3-050	3	2/03/2024	102,1	202,9	8187,3	0,002	3,949	2377	172,938	21,123	3063,600	102,12%			x				
CUNETA TRAMO 7	7/03/2024	A3-051	3	10/03/2024	101,9	204,5	8155,3	0,002	3,954	2371	173,359	21,257	3083,100	102,77%				x			
	7/03/2024	A3-052	3	10/03/2024	101,6	204,5	8107,3	0,002	3,933	2372	169,873	20,953	3039,000	101,30%					x		
CUNETA AGUABONITA	7/03/2024	A3-053	3	10/03/2024	102,1	204,7	8187,3	0,002	4,011	2393	174,039	21,257	3083,100	102,77%				x			
	7/03/2024	A3-054	3	10/03/2024	103,4	205,2	8397,1	0,002	4,048	2349	177,370	21,123	3063,600	102,12%		x					
CUNETA AGUABONITA	8/03/2024	A3-055	3	11/03/2024	103,6	202,9	8429,6	0,002	3,989	2332	179,190	21,257	3083,100	102,77%				x			
	8/03/2024	A3-056	3	11/03/2024	103,9	205	8478,5	0,002	4,005	2304	179,089	21,123	3063,600	102,12%		x					
CUNETA TRAMO 7	11/03/2024	A3-057	3	14/03/2024	101,3	204,5	8059,5	0,002	3,909	2372	171,322	21,257	3083,100	102,77%			x				
	11/03/2024	A3-058	3	14/03/2024	103,6	203,7	8429,6	0,002	3,942	2296	178,056	21,123	3063,600	102,12%		x					
CUNETA TRAMO 7	12/03/2024	A3-059	3	15/03/2024	101,3	205,5	8059,5	0,002	3,895	2352	171,322	21,257	3083,100	102,77%					x		
	12/03/2024	A3-060	3	15/03/2024	101,3	202,9	8059,5	0,002	3,817	2334	170,239	21,123	3063,600	102,12%			x				
CUNETA AGUABONITA	12/03/2024	A3-061	3	15/03/2024	103,9	204,2	8478,5	0,002	4,005	2313	180,229	21,257	3083,100	102,77%				x			
	12/03/2024	A3-062	3	15/03/2024	102,1	203,5	8187,3	0,002	3,920	2353	172,938	21,123	3063,600	102,12%				x			
CUNETA TRAMO 7	14/03/2024	A3-063	3	17/03/2024	103,9	204,7	8478,5	0,002	4,009	2310	180,229	21,257	3083,100	102,77%			x				
	14/03/2024	A3-064	3	17/03/2024	103,1	203,2	8348,5	0,002	4,071	2400	176,343	21,123	3063,600	102,12%				x			
CUNETA AGUABONITA	15/03/2024	A3-065	3	18/03/2024	103,4	204,7	8397,1	0,002	4,036	2348	178,499	21,257	3083,100	102,77%						x	
	15/03/2024	A3-066	3	18/03/2024	102,1	204,2	8187,3	0,002	4,007	2397	172,938	21,123	3063,600	102,12%		x					
CUNETA AGUABONITA	19/03/2024	A3-067	3	22/03/2024	103,1	204,5	8348,5	0,002	3,956	2317	177,466	21,257	3083,100	102,77%				x			
	19/03/2024	A3-068	3	22/03/2024	101,9	205,5	8155,3	0,002	4,004	2389	172,262	21,123	3063,600	102,12%		x					
CUNETA TRAMO 7	21/03/2024	A3-069	3	24/03/2024	102,6	203,7	8267,7	0,002	3,975	2360	175,779	21,261	3083,649	102,79%			x				
	21/03/2024	A3-070	3	24/03/2024	102,9	203,7	8316,1	0,002	3,920	2314	175,659	21,123	3063,600	102,12%					x		
CUNETA AGUABONITA	21/03/2024	A3-071	3	24/03/2024	103,6	204	8429,6	0,002	3,948	2296	179,190	21,257	3083,100	102,77%			x				
	21/03/2024	A3-072	3	24/03/2024	102,9	204,5	8316,1	0,002	3,990	2346	175,659	21,123	3063,600	102,12%				x			
CUNETA TRAMO 7	22/03/2024	A3-073	3	25/03/2024	102,9	204,7	8316,1	0,002	3,912	2298	176,777	21,257	3083,100	102,77%		x					
	22/03/2024	A3-074	3	25/03/2024	103,9	204,7	8478,5	0,002	4,053	2335	179,089	21,123	3063,600	102,12%					x		
CUNETA AGUABONITA	22/03/2024	A3-075	3	25/03/2024	103,6	205,2	8429,6	0,002	3,975	2298	179,190	21,257	3083,100	102,77%					x		
	22/03/2024	A3-076	3	25/03/2024	102,1	205,5	8187,3	0,002	4,026	2393	172,938	21,123	3063,600	102,12%			x				

TIPOS DE FALLA



DECLARACION DE CONFORMIDAD: N / A

OBSERVACIONES:

El laboratorio no se hace responsable sobre la información suministrada por el cliente. Los resultados corresponden únicamente a la muestra ensayada, como se recibió. El alcance del laboratorio no incluye el muestreo y transporte del material. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad, parcialmente ni será valido sin la firma del director técnico. La información suministrada por el cliente se identifica mediante el subrayado al texto. Los valores de incertidumbre expandida reportados en el presente documento corresponden a una incertidumbre combinada multiplicada por k=2 y con una probabilidad de cobertura del 95%.

REVISÓ Y APROBÓ:

OSCAR IVAN MENDEZ SILVA
LABORATORISTA

FIN DE INFORME

4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A continuación, se anexan el formato MS-GC-FR-06 ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS, de la póliza del contrato principal, así como de la póliza actualizada de acuerdo a la orden de inicio.

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-06
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	ACTA APROBACION DE PÓLIZAS	FECHA	11/11/2022

Tipo de garantía (Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015):	Contrato de seguro contenido en una póliza	X
	Patrimonio autónomo	
	Garantía Bancaria	
Otra:		

Contrato No:	OBRA 708 DE 2023
Convenio No:	
Resolución No:	
Contratista o responsable:	CONSORCIO PASCA CNJ Nit. 901.715.912-1
Garantía No:	NB-100263154, certificado 71634040 Cumplimiento - NB-100063167, certificado 71634020, RCE
Garantía emitida por:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía:	Junio 13 de 2023
Razón de la aprobación: (Indique brevemente la razón de aprobación, ejemplo: firma de contrato, actualización por acta de inicio, prorroga, adición, suspensión de contrato, reinicio de contrato, garantías de permisos, entre otras)	FIRMA DEL CONTRATO

CLASE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
CUMPLIMIENTO	$ 3.572.497.887,00	2023	05	31	2024	06	15
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 5.358.746.831,00	2023	05	31	2024	06	15
PRESTACIONES SOCIALES	$ 893.124.472,00	2023	05	31	2026	12	15
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 5.358.746.831,00	2023	12	15	2028	12	15
RCE	$ 893.124.472,00	2023	05	31	2023	12	15

Notas u observaciones:

Se aprueban las pólizas citadas en la referencia por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos, de acuerdo con el documento de la referencia.

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
Jefe Oficina Asesora Gestión Jurídica y Contractual
Proyecto: Carlos A. Jiménez C. Profesional Especializado

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.06.01 14:42:01 -05:00

Código de Seguridad: 3d4MD785GeecuKAieOIfWg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100063167	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71634020	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/06/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	31/05/2023	24:00 Horas Del	15/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PASCA CNJ	No. DOC. IDENTIDAD	901.715.912-1
DIRECCIÓN	CARRERA 7 # 75-51 OFICINA -602	TELÉFONO	6401500
ASEGURADO	CONSORCIO PASCA CNJ	No. DOC. IDENTIDAD	901.715.912-1
DIRECCIÓN	CARRERA 7 # 75-51 OFICINA -602	TELÉFONO	6401500
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. ICCU 708 DE 2023 , CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE - FUSAGASUGA - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS S DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PASCA CNJ , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	446562236.00	893124472.00	893.124.472,00	1.695.713,04
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	446562236.00	893124472.00	893.124.472,00	0,00
PATRONAL	446562236.00	893124472.00	893.124.472,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	446562236.00	893124472.00	893.124.472,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 893.124.472,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROIS PROGRAMADORA DE INVERS Y SEGUROS LTD	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$ 1.695.713,04
DESCUENTOS	$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	$ 1.695.713,04
GASTOS EXP.	$ 5.000,00
IVA	$ 323.135,48
TOTAL A PAGAR	$ 2.023.848,52

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 01/06/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

[redacted]

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100063167	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71634020	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/06/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	31/05/2023	24:00 Horas Del	15/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $893.124.471,70

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $893.124.471,70

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.06.01 14:41:06 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: H0G6ItFAMyMS+Q5/iVtIZQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUSZR000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100263154	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71634040	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/06/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	31/05/2023	24:00 Horas Del	15/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PASCA CNJ	No. DOC. IDENTIDAD	901.715.912-1
DIRECCIÓN	CARRERA 7 # 75-51 OFICINA -602	TELÉFONO	6401500
ASEGURADO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -	No. DOC. IDENTIDAD	900.258.711-1
DIRECCIÓN	CL 26 N 51-53	TELÉFONO	7491624
BENEFICIARIO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -	No. DOC. IDENTIDAD	900.258.711-1
DIRECCIÓN	CL 26 N 51-53	TELÉFONO	7491624

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. ICCU 708 DE 203, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ FUSAGASUGÁ PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE POLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS - NIT: 800140959-1 (PART. 80,0 %)
INTEGRANTE 2 - JMS INGENIERIA SAS - NIT: 900527061-7 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 3 - NAICA INGENIERIA SAS - NIT: 901635303-0 (PART. 10,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO PASCA CNJ)
CODIGO ASEGURADO 6819054

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 31/05/2023	24:00 Horas Del 15/06/2024	3.572.497.887,00	13.051.851,87
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 31/05/2023	24:00 Horas Del 15/06/2024	5.358.746.831,00	19.577.777,81
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 31/05/2023	24:00 Horas Del 15/12/2026	893.124.472,00	11.082.084,20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 15/12/2023	24:00 Horas Del 15/12/2028	5.358.746.831,00	93.880.840,03
		TOTAL ASEGURADO	$ 15.183.116.021,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROIS PROGRAMADORA DE INVERS Y SEGUROS LTD	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	137.592.553,91
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	137.592.553,91
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	26.144.067,24
TOTAL A PAGAR	$	163.744.421,15

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 01/06/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

[redacted]

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos tos sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100263154	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71634040	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/06/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	31/05/2023	24:00 Horas Del	15/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SERA DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD
LA POLIZA AMPARA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ESTARAN VIGENTES HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-06
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	ACTA APROBACION DE PÓLIZAS	FECHA	11/11/2022

Tipo de garantía (Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015):	Contrato de seguro contenido en una póliza	X
	Patrimonio autónomo	
	Garantía Bancaria	
Otra:		

Contrato No:	OBRA 708 DE 2023
Convenio No:	
Resolución No:	
Contratista o responsable:	CONSORCIO PASCA CNJ Nit. 901.715.912-1
Garantía No:	NB-100263154, certificado 71711032 Cumplimiento - NB-100063167, certificado 71711005, RCE
Garantía emitida por:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía:	Agosto 15 de 2023
Razón de la aprobación: (Indique brevemente la razón de aprobación, ejemplo: firma de contrato, actualización por acta de inicio, prorroga, adición, suspensión de contrato, reinicio de contrato, garantías de permisos, entre otras)	ACTA DE INICIO Agosto 1 de 2023

CLASE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
CUMPLIMIENTO	$ 3.572.497.887,00	2023	08	01	2024	08	16
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 5.358.746.831,00	2023	08	01	2024	08	16
PRESTACIONES SOCIALES	$ 893.124.472,00	2023	08	01	2027	02	15
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 5.358.746.831,00	2024	02	15	2029	02	15
RCE	$ 893.124.472,00	2023	08	01	2024	02	15

Notas u observaciones: La vigencia para el amparo de estabilidad y calidad de la obra será de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo a satisfacción de las obras por parte de la entidad.
Se aprueban las pólizas citadas en la referencia por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos, de acuerdo con el documento de la referencia.

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
Jefe Oficina Asesora Gestión Jurídica y Contractual
Proyecto: Carlos A. Jiménez C. Profesional Especializado

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.08.09 12:21:28 -05:00

Código de Seguridad: kg9xJKV1ZcgAOs52moR7BQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100063167	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71711005	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/08/2023	24:00 Horas Del	15/02/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PASCA CNJ	No. DOC. IDENTIDAD	901.715.912-1
DIRECCIÓN	CARRERA 7 # 75-51 OFICINA -602	TELÉFONO	6401500
ASEGURADO	CONSORCIO PASCA CNJ	No. DOC. IDENTIDAD	901.715.912-1
DIRECCIÓN	CARRERA 7 # 75-51 OFICINA -602	TELÉFONO	6401500
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 01/08/2023, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA EN LA REFERENCIA. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. ICCU 708 DE 2023 , CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE - FUSAGASUGA - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS S DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PASCA CNJ , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	446562236.00	893124472.00	893.124.472,00	1.695.713,04
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	446562236.00	893124472.00	893.124.472,00	0,00
PATRONAL	446562236.00	893124472.00	893.124.472,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	446562236.00	893124472.00	893.124.472,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 893.124.472,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROIS PROGRAMADORA DE INVERS Y SEGUROS LTD	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.695.713,04
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.695.713,04
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	323.135,48
TOTAL A PAGAR	$	2.023.848,52

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/08/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA COLOMBIA
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100063167	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71711005	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/08/2023	24:00 Horas Del	15/02/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $893.124.471,70

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $893.124.471,70

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA AFF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.08.09 12:16:55 -05:00

Código de Seguridad: qWmExg0q9I2jhvnD3ozH7A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100263154	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71711032	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/08/2023	24:00 Horas Del	15/02/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PASCA CNJ	No. DOC. IDENTIDAD	901.715.912-1
DIRECCIÓN	CARRERA 7 # 75-51 OFICINA -602	TELÉFONO	6401500
ASEGURADO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -	No. DOC. IDENTIDAD	900.258.711-1
DIRECCIÓN	CL 26 N 51-53	TELÉFONO	7491624
BENEFICIARIO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -	No. DOC. IDENTIDAD	900.258.711-1
DIRECCIÓN	CL 26 N 51-53	TELÉFONO	7491624

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 01/08/2023, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA EN LA REFERENCIA.LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. ICCU 708 DE 203, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ FUSAGASUGÁ PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE POLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS - NIT: 800140959-1 (PART. 80,0 %)
INTEGRANTE 2 - JMS INGENIERIA SAS - NIT: 900527061-7 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 3 - NAICA INGENIERIA SAS - NIT: 901635303-0 (PART. 10,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/08/2023	24:00 Horas Del 16/08/2024	3.572.497.887,00	13.051.851,87
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 01/08/2023	24:00 Horas Del 16/08/2024	5.358.746.831,00	19.577.777,81
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 01/08/2023	24:00 Horas Del 15/02/2027	893.124.472,00	11.882.084,20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 15/02/2024	24:00 Horas Del 15/02/2029	5.358.746.831,00	93.880.840,03
		TOTAL ASEGURADO	$ 15.183.116.021,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROIS PROGRAMADORA DE INVERS Y SEGUROS LTD	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	137.592.553,91
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	137.592.553,91
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	26.144.067,24
TOTAL A PAGAR	$	163.744.421,15

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/08/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100263154	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71711032	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/08/2023	24:00 Horas Del	15/02/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO PASCA CNJ)
CODIGO ASEGURADO 6819054

LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SERA DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD
LA POLIZA AMPARA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ESTARAN VIGENTES HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-06
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	ACTA APROBACION DE PÓLIZAS	FECHA	11/11/2022

Tipo de garantía (Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015):	Contrato de seguro contenido en una póliza	X
	Patrimonio autónomo	
	Garantía Bancaria	
Otra:		

Contrato No:	OBRA 708 DE 2023
Convenio No:	
Resolución No:	
Contratista o responsable:	CONSORCIO PASCA CNJ Nit. 901.715.912-1
Garantía No:	NB-100263154, anexo 3, certificado 71807636 – Cumplimiento – NB-100063167, anexo 3, certificado 71807608, RCE
Garantía emitida por:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía:	Diciembre 5 de 2023
Razón de la aprobación: (Indique brevemente la razón de aprobación, ejemplo: firma de contrato, actualización por acta de inicio, prorroga, adición, suspensión de contrato, reinicio de contrato, garantías de permisos, entre otras)	MODIFICATORIO 1, 2, 3 Items no previstos – anexo 1

CLASE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
CUMPLIMIENTO	$ 3.572.497.887,00	2023	08	01	2024	08	16
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 5.358.746.831,00	2023	08	01	2024	08	16
PRESTACIONES SOCIALES	$ 893.124.472,00	2023	08	01	2027	02	15
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 5.358.746.831,00	2024	02	15	2029	02	15
RCE	$ 893.124.472,00	2023	08	01	2024	02	15

Notas u observaciones: La vigencia para el amparo de estabilidad y calidad de la obra será de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo a satisfacción de las obras por parte de la entidad.
Se aprueban las pólizas citadas en la referencia por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos, de acuerdo con el documento de la referencia.

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
Jefe Oficina Asesora Gestión Jurídica y Contractual
Proyecto: Carlos A. Jiménez C. Profesional Especializado

Ing. Vaisa

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.04 11:27:32 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA-REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: f1Om7b1OJjxr3b4PaEW/yg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO. 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000519-D001

No. PÓLIZA	NB-100263154	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71807636	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/08/2023	24:00 Horas Del	15/02/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PASCA CNJ	No. DOC. IDENTIDAD	901.715.912-1
DIRECCIÓN	CARRERA 7 # 75-51 OFICINA -602	TELÉFONO	6401500
ASEGURADO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -	No. DOC. IDENTIDAD	900.258.711-1
DIRECCIÓN	CALLE 26 NO 51-53 TORRE CENTRAL PISO 6	TELÉFONO	7491624
BENEFICIARIO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -	No. DOC. IDENTIDAD	900.258.711-1
DIRECCIÓN	CALLE 26 NO 51-53 TORRE CENTRAL PISO 6	TELÉFONO	7491624

OBJETO DEL CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CERTIFICA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL MODIFICATORIO NO. 1, MODIFICATORIO NO. 2 Y MODIFICATORIO NO. 3. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. ICCU 708 DE 203, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ FUSAGASUGÁ PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE POLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS - NIT: 800140959-1 (PART. 80,0 %)
INTEGRANTE 2 - JMS INGENIERIA SAS - NIT: 900527061-7 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 3 - NAICA INGENIERIA SAS - NIT: 901635303-0 (PART. 10,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/08/2023	24:00 Horas Del 16/08/2024	3.572.497.887,00	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 01/08/2023	24:00 Horas Del 16/08/2024	5.358.746.831,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 01/08/2023	24:00 Horas Del 15/02/2027	893.124.472,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 15/02/2024	24:00 Horas Del 15/02/2029	5.358.746.831,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 15.183.116.021,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROIS PROGRAMADORA DE INVERS Y SEGUROS LTD	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

[illegible] LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A [illegible] CON EL NUMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO. [illegible] EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL TAMBIEN PUEDE [illegible] A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 [illegible] BOGOTA 327 47 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100263154	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71807636	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/08/2023	24:00 Horas Del	15/02/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO PASCA CNJ)
CODIGO ASEGURADO 6819054

LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SERA DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD
LA POLIZA AMPARA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ESTARAN VIGENTES HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

#RUADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.04 11:28:18 -05:00

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 38-03-2021-1317-P-06-PPSIS888888888827-D001

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: R/1VHNZUSS4NCM6xGdYA6Q==

No. PÓLIZA	NB-100063167	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71807608	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/08/2023	24:00 Horas Del	15/02/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PASCA CNJ	No. DOC. IDENTIDAD	901.715.912-1
DIRECCIÓN	CARRERA 7 # 75-51 OFICINA -602	TELÉFONO	6401500
ASEGURADO	CONSORCIO PASCA CNJ	No. DOC. IDENTIDAD	901.715.912-1
DIRECCIÓN	CARRERA 7 # 75-51 OFICINA -602	TELÉFONO	6401500
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CERTIFICA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL MODIFICATORIO NO. 1, MODIFICATORIO NO. 2 Y MODIFICATORIO NO. 3. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. ICCU 708 DE 2023 , CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE - FUSAGASUGA - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS S DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PASCA CNJ , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	446.562.236,00	893.124.472,00	893.124.472,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	446.562.236,00	893.124.472,00	893.124.472,00	0,00
PATRONAL	446.562.236,00	893.124.472,00	893.124.472,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	446.562.236,00	893.124.472,00	893.124.472,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 893.124.472,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROIS PROGRAMADORA DE INVERS Y SEGUROS LTD	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTE LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DEL DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARLA LÍNEA [illegible] 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 Y 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100063167	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71807608	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/08/2023	24:00 Horas Del	15/02/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $893.124.471,70

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $893.124.471,70

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta recidando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	71807608

Fecha de Facturación	04/12/2023	Fecha Límite de Pago	03/01/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
Póliza No.	NB-100063167	IVA	00,00
Periodo Facturado	01/08/2023 — 15/02/2024	VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO PASCA CNJ
CARRERA 7 # 75-51 OFICINA-602	901715912
Intermediario	PROIS PROGRAMADORA DE INVERS Y SEGUROS LTD

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma **presencial** (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente al **01/01/2024** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de este (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	71807608

Fecha de Facturación	04/12/2023	Fecha Límite de Pago	03/01/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
Póliza No.	NB-100063167	IVA	00,00
Periodo Facturado	01/08/2023 — 15/02/2024	VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO PASCA CNJ
CARRERA 7 # 75-51 OFICINA-602	901715912
Intermediario	PROIS PROGRAMADORA DE INVERS Y SEGUROS LTD

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000071807608(3900)000000000000(96)20240103

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229900718076083900)000000000000(96)20240103

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6


INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1



OPCIÓN 2





VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-06
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	ACTA APROBACION DE PÓLIZAS	FECHA	11/11/2022

Tipo de garantía (Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015):	Contrato de seguro contenido en una póliza	X
	Patrimonio autónomo	
	Garantía Bancaria	
Otra:		

Contrato No:	OBRA 708 DE 2023
Convenio No:	
Resolución No:	
Contratista o responsable:	CONSORCIO PASCA CNJ Nit. 901.715.912-1
Garantía No:	NB-100263154, anexo 4, certificado 71821931 - Cumplimiento - NB-100063167, anexo 4, certificado 71821921, RCE
Garantía emitida por:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía:	Febrero 7 de 2023
Razón de la aprobación: (Indique brevemente la razón de aprobación, ejemplo: firma de contrato, actualización por acta de inicio, prorroga, adición, suspensión de contrato, reinicio de contrato, garantías de permisos, entre otras)	PRORROGA 1 Hasta el 29 de febrero de 2024

CLASE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
CUMPLIMIENTO	$ 3.572.497.887,00	2023	08	01	2024	08	29
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 5.358.746.831,00	2023	08	01	2024	08	29
PRESTACIONES SOCIALES	$ 893.124.472,00	2023	08	01	2027	03	01
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 5.358.746.831,00	2024	02	29	2029	03	01
RCE	$ 893.124.472,00	2023	08	01	2024	02	29

Notas u observaciones: La vigencia para el amparo de estabilidad y calidad de la obra será de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo a satisfacción de las obras por parte de la entidad.
Se aprueban las pólizas citadas en la referencia por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos, de acuerdo con el documento de la referencia.

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
Jefe Oficina Asesora Gestión Jurídica y Contractual
Proyecto: Carlos A. Jiménez C. Profesional Especializado

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.19 11:06:13 -05:00

Código de Seguridad: 20LjspQ6atJwaAXkavCg6A==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 86-04-2021-1317-P-05-FPSUSZR0000086059-D00I

No. PÓLIZA NB-100263154 | No. ANEXO 4 | No. CERTIFICADO 71821931 | No. RIESGO

TIPO DE DOCUMENTO | FECHA DE EXPEDICIÓN 19/12/2023 | SUC. EXPEDIDORA BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 01/08/2023	24:00 Horas Del 01/03/2029	N/A	N/A	N/A N/A

TOMADOR	CONSORCIO PASCA CNJ	No. DOC. IDENTIDAD	901.715.912-1
DIRECCIÓN	CARRERA 7 # 75-51 OFICINA -602	TELÉFONO	6401500
ASEGURADO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -	No. DOC. IDENTIDAD	900.258.711-1
DIRECCIÓN	CALLE 26 NO 51-53 TORRE CENTRAL PISO 6	TELÈFONO	7491624
BENEFICIARIO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -	No. DOC. IDENTIDAD	900.258.711-1
DIRECCIÓN	CALLE 26 NO 51-53 TORRE CENTRAL PISO 6	TELÉFONO	7491624

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y CONFORME PRORROGA No 1 , SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA EN LA REFERENCIA.
VIGENCIA GLOBALES
CUMPLIMIENTO DESDE 01/08/2023 HASTA 29/08/2024
ANTICIPO DESDE 01/08/2023 HASTA 29/08/2024
PRESTACIONES SOCIALES DESDE 01/08/2023 HASTA 01/03/2027
ESTABILIDAD DESDE 29/02/2024 HASTA 01/03/2029

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. ICCU 708 DE 203, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ FUSAGASUGÁ PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 18/12/2023	24:00 Horas Del 29/08/2024	3.572.497.887,00	445.338,78
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 18/12/2023	24:00 Horas Del 29/08/2024	5.358.746.831,00	668.008,17
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 18/12/2023	24:00 Horas Del 01/03/2027	893.124.472,00	119.898,90
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 29/02/2024	24:00 Horas Del 01/03/2029	5.358.746.831,00	0,00

TOTAL ASEGURADO $ 15.183.116.021,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROIS PROGRAMADORA DE INVERS Y SEGUROS LTD	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.233.245,85
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.233.245,85
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	234.316,71
TOTAL A PAGAR	$	1.467.562,56

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 19/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestra gente en la fuerza regional del oriente.
Protegemos el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HOJA No

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 No. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO 2859300 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100263154	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71821931	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	19/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/08/2023	24:00 Horas Del	01/03/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

MARCO DEL PLAN 500

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE POLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS - NIT: 800140959-1 (PART. 80,0 %)
INTEGRANTE 2 - JMS INGENIERIA SAS - NIT: 900527061-7 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 3 - NAICA INGENIERIA SAS - NIT: 901635303-0 (PART. 10,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO PASCA CNJ)
CODIGO ASEGURADO 6819054

LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SERA DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD
LA POLIZA AMPARA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ESTARAN VIGENTES HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ESTADOS ALIADOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ADF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100263154** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **CONSORCIO PASCA CNJ** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - / INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -** , expedida por la Compañía en **19/12/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **19** días del mes **DICIEMBRE** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.19 11:08:05 -05:00

Código de Seguridad: DuMMWveAoEGCE2GJoZNS1g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 38-03-2021-1317-P-86-PPSUSBR000000027-D001

No. PÓLIZA NB-100863167 | No. ANEXO 4 | No. CERTIFICADO 71821921 | No. RIESGO

TIPO DE DOCUMENTO : | FECHA DE EXPEDICIÓN 19/12/2023 | SUC. EXPEDIDORA BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 01/08/2023	24:00 Horas Del 29/02/2024		N/A N/A	N/A N/A

TOMADOR	CONSORCIO PASCA CNJ	No. DOC. IDENTIDAD	901.715.912-1
DIRECCIÓN	CARRERA 7 # 75-51 OFICINA -602	TELÉFONO	6401500
ASEGURADO	CONSORCIO PASCA CNJ	No. DOC. IDENTIDAD	901.715.912-1
DIRECCIÓN	CARRERA 7 # 75-51 OFICINA -602	TELÉFONO	6401500
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y CONFORME PRORROGA No 1 , SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA EN LA REFERENCIA.
VIGENCIA GLOBALES
RCE DESDE 01/08/2023 HASTA 29/02/2024

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. ICCU 708 DE 2023 , CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE - FUSAGASUGA - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	446.562.236,00	893.124.472,00	893.124.472,00	119.898,90
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	446.562.236,00	893.124.472,00	893.124.472,00	0,00
PATRONAL	446.562.236,00	893.124.472,00	893.124.472,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	446.562.236,00	893.124.472,00	893.124.472,00	0,00

TOTAL ASEGURADO $ 893.124.472,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROIS PROGRAMADORA DE INVERS Y SEGUROS LTD	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	119.898,90
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	119.898,90
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	22.780,79
TOTAL A PAGAR	$	142.679,69

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 19/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO
Cumplimos las metas de esta página web haciendo responsable de ellas. Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DARCO ÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2355600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

N.I.T. 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NB-100063167	4	71821921	

TIPO DE DOCUMENTO | FECHA DE EXPEDICIÓN: 19/12/2023 | SUC. EXPEDIDORA: BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/08/2023	24:00 Horas Del	29/02/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS S DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PASCA CNJ , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $893.124.471,70

SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOSEXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, POR LO CUAL LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $893.124.471,70

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICACIONES EN CARTERA COLOMBIANA DE SEGUROS GENERALES NIT 860.037.013-6 Y PASA: AFF

4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

A continuación, se presenta el formato de seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD DE OBRA

INFORME GESTION DE CALIDAD	
	VERSION: 0

NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE-FUSAGASUGA-PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500.

TIPO DE PROYECTO Interventoría ■ Consultoría ☐ Diseño ☐



CLIENTE INSTITUTO DE CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

N -	**8**
Fecha	**MARZO 31 DE 2024**

Control de Cambios Documento inicial para implementacion

SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD CONSORCIO CNJ PASCA

SEGUIMIENTO OBJETIVOS DE CALIDAD POR FRENTE DE TRABAJO




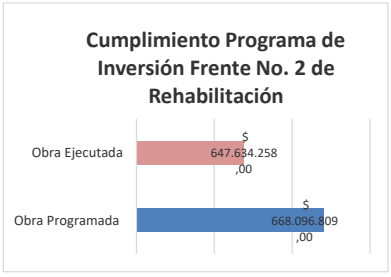
No	Actividad	Actividades de Gestión de Calidad realizadas	Indicador	Registro	
				NA	SI
1	**Sitio Crítico N° 8 Frente de Trabajo**	**Verificación Objetivo de calidad Cumplir con la programación de obra aprobada por el cliente.** Según programa de inversión aprobado, se tiene que el contratista para el sitio crítico #8 tenía programada una inversión acumulada de $1,661,438,581, encontrándose que se cumplió dicha inversión de obra, la cual fue ejecutada en un valor de $1,649,354,692. El contratista en el periodo de octubre de 2023, terminó todas las obras del sitio crítico, pilotes y viga cabezal.			Seguimiento Acta de Reunión
2	**Mejoramiento Frente de Trabajo # 1**	**Verificación Objetivo de calidad Cumplir con la programación de obra aprobada por el cliente.** Tramo #1: El frente ubicado entre el K1+340 al K2+040,se encuentra terminado, se corrigió el fallo que se presentó en la carpeta asfáltica.			Seguimiento Acta de Reunión
2	**Mejoramiento Frente de Trabajo #2**	**Verificación Objetivo de calidad Cumplir con la programación de obra aprobada por el cliente.** Tramo #2: Entre el tramo K7+276 al K7+520 , se completó el 100% hasta la colocación de MDC-19.			Seguimiento Acta de Reunión

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD DE OBRA

INFORME GESTION DE CALIDAD	
	VERSION: 0

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE-FUSAGASUGA-PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500.

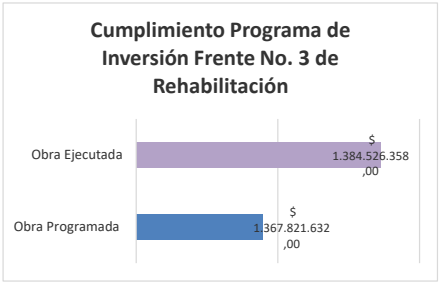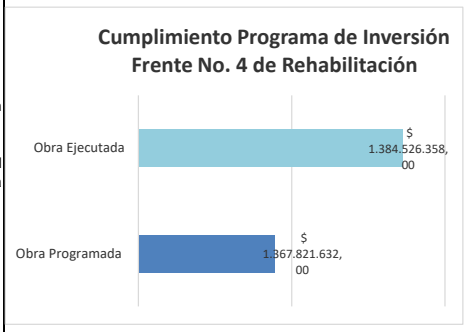
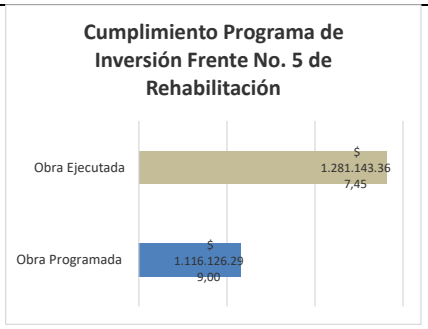
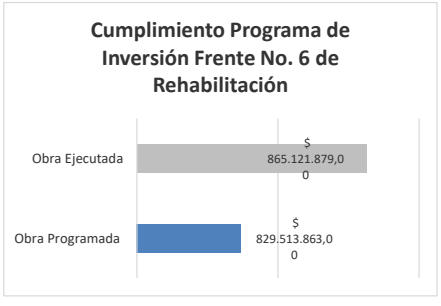
2	**Mejoramiento Frente de Trabajo #3**	**Verificación Objetivo de calidad Cumplir con la programación de obra aprobada por el cliente.** Tramo #3: Entre el tramo K7+896 al K8+305, se completó estabilización del 100%, se colocó el 100% de MDC-25, se corrigieron fallos por fisuras en los siguientes puntos: K8+300, K8+220, K8+270, K8+198, K7+990, K8+080, K8+070. En el tramo No.3 se está ejecutando construcción de gavión ubicado en el K7+960 al K7+980.			Seguimiento Acta de Reunión
	Mejoramiento Frente de Trabajo #4	**Verificación Objetivo de calidad Cumplir con la programación de obra aprobada por el cliente.** Tramo #4: En el sector entre el K9+774 al K10+085 y K10+150 al K10+240 se colocó MDC-19. En el tramo 4 se está ejecutando la construcción del articulado en zona de falla.			Seguimiento Acta de Reunión
	Mejoramiento Frente de Trabajo #5	**Verificación Objetivo de calidad Cumplir con la programación de obra aprobada por el cliente.** Tramos #5 :En el tramo No. 5 se presentaronn fallos de piel de cocodrilo, los cuales aún no han sido retirados para poder colocar la MDC-19.			Seguimiento Acta de Reunión
	Mejoramiento Frente de Trabajo #6	**Verificación Objetivo de calidad Cumplir con la programación de obra aprobada por el cliente.** Tramos #6. El tramo se encuentra construido al 100%. No se presentan fallos.			Seguimiento Acta de Reunión

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD DE OBRA

INFORME GESTION DE CALIDAD	
	VERSION: 0

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE-FUSAGASUGA-PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500.

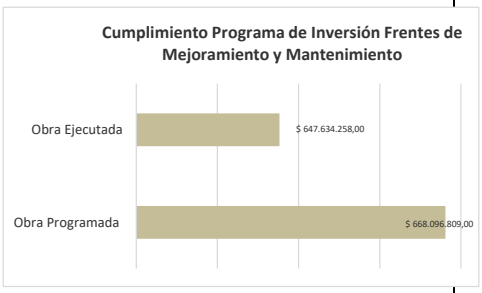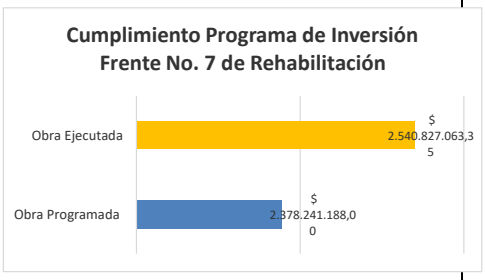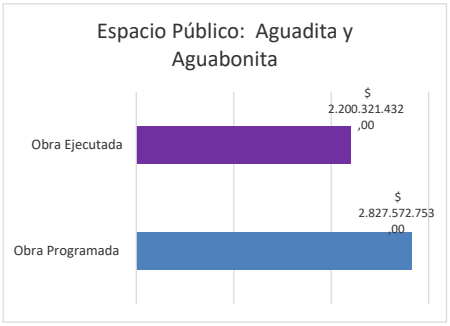	Mejoramiento Frente de Trabajo #6	**Verificación Objetivo de calidad Cumplir con la programación de obra aprobada por el cliente.** Tramo #6:El tramo No. 6 se ejecutó al 100%. No presenta observaciones.			Seguimiento Acta de Reunión
	Mejoramiento Frente de Trabajo #7	Tramo #7: Tramo terminado K7+500 al K8+090, K8+140 al K8+190, K8+240 al K8+483 hasta la capa de MDC-19, faltan cunetas.			Seguimiento Acta de Reunión
3	**Espacio Público**	Espacio público de Aguadita: Se llevan las siguientes actividades: Costado Izquierdo: - K13+175 al K13+225: Se instaló concreto. - K12+840 al K12+890: Se instaló concreto. - K13+250 al K13+340: Se instaló concreto - K13+090 al K13+170: Excavación e instalación de prefabricado. - K13+090 al K12+930: Pendiente de ejecutar - K12+925 al K12+820: Finalizado Costado Derecho: -K13+230 al K12+925: Finalizado. Espacio Público de Aguabonita: Se iniciaron actividades constructivas, llevan una ejecución de $324,167,068,70, mientras que en Aguadita llevan un ejecución de $1,483,332,332.			





INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD DE OBRA

INFORME GESTION DE CALIDAD	
	VERSION: 0

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE-FUSAGASUGA-PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500.

SEGUIMIENTO PROCESOS APOYO

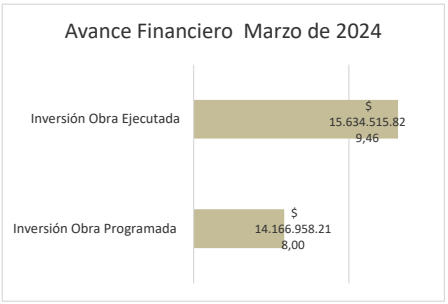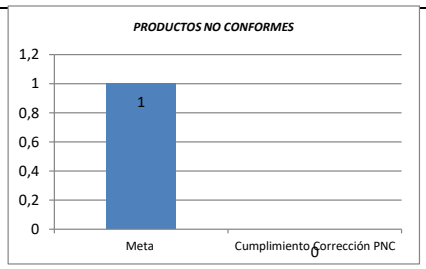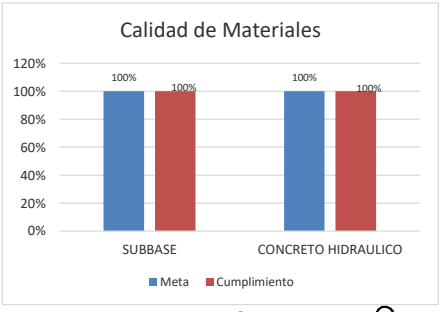No	Actividad	Actividades de Gestión de Calidad realizadas	Indicador	Registro	
				NA	SI
4	**Seguimiento avance de obra**	El contratista durante el periodo de Marzo de 2024 cuenta con los siguientes frents de obra: frente para Espacio Público en Aguadita y otro en Aguabonita, frente para Pasca - Paso Malo, un frente para construcción de pavimento articulado en el Tramo No. 4, frente para construcción de gaviones en Tramo No.3.			Informe Semanal
5	**Productos No conformes**	Se presentó 1 productos no conformes en la colocación del adoquín que se instaló en Tramo No.4. Para el periodo de Marzo de 2024 está programado rehacer el tramo debido a que se presentó desnivel en el alinemiento vertical.			NA
6	**Gestión de la Mejora**	El contratista implementó frente de trabajo para rehabilitación de alcantarillas.			Acta de Comité
7	**Calidad de Materiales**	Con base en las actividades que se están realizando de construcción se anexan los ensayos de laboratorio que validan la calidad de materiales implementados. Se adjunta ensayos de laboratorio de materiales.			Certificado de materiales

4.8.1.Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia)

A continuación, se presenta el formato de seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

INFORME EJECUTIVO - PLAN DE GERENCIA

ETAPA DE OBRA	INFORME:	MENSUAL ☑ / FINAL ☐	Nº 7	PERIODO DEL INFORME ENTRE: viernes, 1 de marzo de 2024 AL viernes, 22 de marzo de 2024

LOCALIZACION:	Municipios de Sibaté, Fusagasugá y Pasca, Departamento de Cundinamarca.
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500

INFORMACIÓN CONTRACTUAL GENERAL

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.:	ICCU 708 DE 2023	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PASCA CNJ	
PERDIODO PRECONSTRUCCIÓN	QUINCE (15) DÍAS	
PERDIODO CONSTRUCCIÓN	SIETE (7) MESES y QUINCE (15) DÍAS	
FECHA DE INICIO:	1 de agosto de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de marzo de 2024	
VALOR INICIAL :	$ 17.862.489.434,00	
VALOR ADICION(ES):	**Fecha:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$17.862.489.434,00	

ESQUEMA CONSTRUCCIÓN




SEGUIMIENTO AL PLAZO

Seguimiento a los indicadores

ANALISIS DE EJECUCION						
Versión de la programación de obra (vigente) :			**PASCA V 4**	**MES**	**FEBRERO**	
Fecha CORTE			**miércoles, 31 de enero de 2024**			
% Programado:	**88,38%**	**% Ejecutado:**	**88,02%**	**% Facturado:**	**70,24%**	
Balance facturación	**0,80**	**Desempeño cronograma**			**1,00**	

SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN

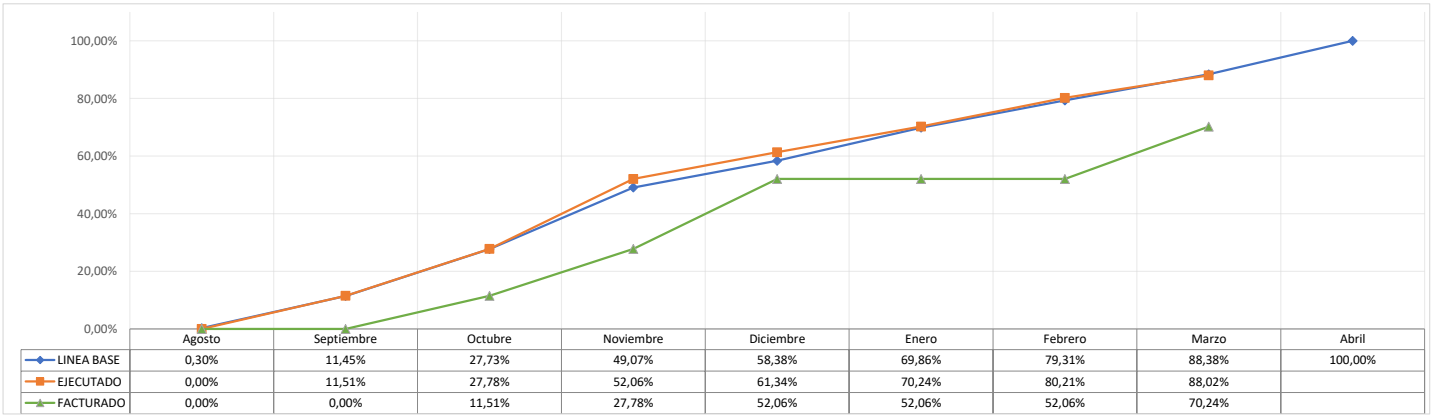

	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril
LINEA BASE	0,30%	11,45%	27,73%	49,07%	58,38%	69,86%	79,31%	88,38%	100,00%
EJECUTADO	0,00%	11,51%	27,78%	52,06%	61,34%	70,24%	80,21%	88,02%	
FACTURADO	0,00%	0,00%	11,51%	27,78%	52,06%	52,06%	52,06%	70,24%	

ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE (COSTO DIRECTO)

ACTTIVIDADES	CANTIDAD	TOTAL
BASE ESTABILIZADA CON 1,5% DE CEMENTO Y CON 4,5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	3433,06	$ 1.898.806.673
MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD-19 CON CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO TIPO III	918,31	$ 1.267.231.861
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	1249,80	$ 1.201.403.763
PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO 1.2M. DIAMETRO 1,2 M CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	168,00	$ 1.094.278.028
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	948,32	$ 995.952.172
MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	899,29	$ 949.420.421
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	85453,31	$ 587.412.383
CUNETA DE CONCRETO, 3000 PSI ACELERADO A 3 DÍAS FUNDIDA EN EL LUGAR	720,15	$ 564.988.855


FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-15 cm)	69609,14	$ 450.757.833
CUNETA DE CONCRETO, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	559,07	$ 307.707.139
GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	4309,72	$ 285.642.932
SARDINEL PREFABRICADO A-10	2146,20	$ 259.400.860
MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	1564,26	$ 205.821.249
REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	15089,61	$ 177.832.518
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	6440,01	$ 155.051.585
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	40821,46	$ 103.051.513
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	9158,70	$ 94.768.800
TUBERÍA DRENAJE PVC 110	2476,04	$ 84.979.527
LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	17854,50	$ 83.638.413
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	53994,12	$ 80.391.242
CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 psi (bases)	111,96	$ 76.413.115
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO R-50	5708,10	$ 70.690.423
RIEGO DE IMPRIMACIÓN	12695,92	$ 66.009.380
ESTAMPADO PARA CONCRETO (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE).	1265,21	$ 60.982.621
GAVIÓN	272,56	$ 60.258.110
ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	513,20	$ 54.331.534
SUBBASE GRANULAR	283,37	$ 51.421.999
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO MEJORADO CON 3% DE CEMENTO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	732,35	$ 49.674.024
ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	714,59	$ 48.536.677
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	256,67	$ 46.350.001
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	3531,70	$ 39.102.469
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	1342,60	$ 35.229.805
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	42,00	$ 31.262.093
LOSETA DE CONCRETO A20 TIPO PANOT TR. LIVIANO 20X20X6CM COLOR OCRE Y/O TERRACOTA O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	106,18	$ 12.873.196
RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	134,50	$ 12.718.519
ANDÉN CONCRETO 3000 PSI E=0.15M	119,78	$ 12.118.983
RELLENO PARA ESTRUCTURAS	56,42	$ 4.744.212
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	154,00	$ 1.712.366
CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	4,21	$ 1.689.760
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	0,01	$ 16.845
		$ 11.584.673.899

SEGUIMIENTO AL COSTOS (Seguimiento al balance, Tramite de NPs o actividades complementarias, Adiciones)


SEGUIMIENTO AL BALANCE CONTRACTUAL (*)					Observaciones
Valor contractual	Valor ejecutado a la fecha con AIU	%	Proyección	% desviación	La producción realizada del mes de marzo fue de $1.395.259.641
$ 17.862.489.434	$ 15.722.473.397	88,02%	$ -	0,00%	

OBSERVACIONES

Las actividades mas representativas durante el mes de marzo fueron:

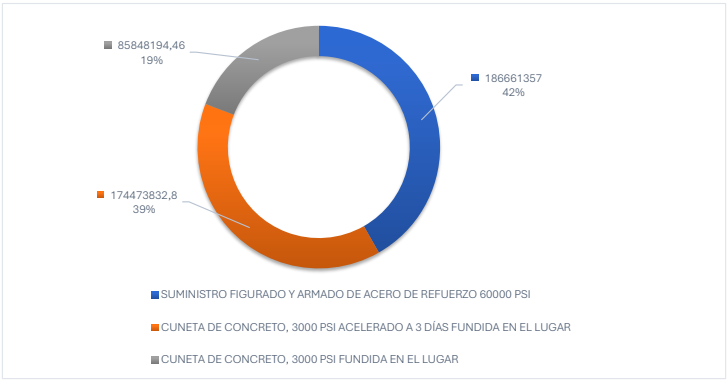

Las actividades mas representativas del contrato a corte acumulado al 22 de marzo

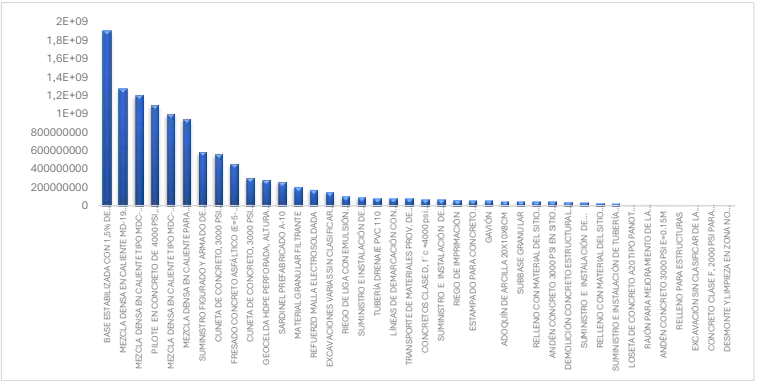

CONCLUSIONES

*Teniendo en cuenta las condiciones de movilidad por los festivos de la semana mayor se presentó una suspensión de contrato ya que esto dificulta las actividades de desarrollo de obra en la vía.

*Se realizo reunión con la comunidad y el contratista del polideportivo de Aguabonita, teniendo en cuenta que también se encuentran en obra y fue necesario aclarar los temas de intervención y garantías, ya que una vez finalizada nuestra ejecución ellos realizarán el empalme y posiblemente intervendrán parte del espacio público. Se deja en acta de compromiso realizar acta de vecindad para que en caso de daños sea el contratista del polideportivo quien asuma las garantías.

*La ejecución de espacio público que estaba programada para Aguabonita se inició teniendo en cuenta las solicitudes de la comunidad. Se construyó una cuneta de 4m a un solo nivel con anden estampado en un ancho de 2m se realizó socialización y se firma un acta con los compromisos adquiridos con la comunidad.

*Teniendo en cuenta las condiciones de turismo del centro poblado de Aguadita se recomendó e implemento el uso de concreto acelerado para las bermas adyacentes a los andenes, ya que actualmente funcionan como parqueo temporal de los vehículos que están de paso sobre el corredor que conduce a Fusagasugá.

*Se realiza la construcción de gaviones de tramo 3 teniendo en cuenta el diseño presentado y supervisado por el especialista y la interventoría.

*Teniendo en cuenta las recomendaciones del especialista de estructuras, se realizó la intervención del box culvert, utilizando los aditivos recomendados.

*Se realizo la instalación de adoquín articulado en tramo 4 teniendo en cuenta las recomendaciones del especialista de pavimentos, adicionalmente se construyeron filtros transversales en el segmento para darle manejo al agua.

*Se inicio con la demarcación horizontal de los segmentos intervenidos, instalación de elementos tipo estoperoles, tachas y pintura de zona escolar.

Elaboró:

Firma:

ING. DORALEE VASQUEZ SERRANO
ESPECIALISTA GERENCIA

Revisó:

Firma:

ING. WILLIAM OLIVEROS
DIRECTOR DE OBRA

INFORME EJECUTIVO - PLAN DE GERENCIA

INFORME N.: 7 **PERIODO:** viernes, 22 de marzo de 2024

OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
EN EL MARCO DEL PLAN 500

CONTRATO No.: ICCU 708 DE 2023



FOTO N.1: Instalación subbase Sector 4



FOTO N.2: Instalación adoquin Sector 4



FOTO N.3: Construcción de gavión Sector 3



FOTO N.4: Construcción de gavión Sector 3



FOTO N.5: Relleno cuneta Sector 7



FOTO N.6: Fundida cuneta Sector 7

INFORME EJECUTIVO - PLAN DE GERENCIA

INFORME N.: 7 **PERIODO:** viernes, 22 de marzo de 2024

OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
EN EL MARCO DEL PLAN 500

CONTRATO No.: ICCU 708 DE 2023



FOTO N.7: Demarcación Vial



FOTO N.8: Demarcación Vial



FOTO N.9: Excavación Pasca



FOTO N.10: Lleno con material seleccionado Pasca



FOTO N.11: Subbase granular Pasca



FOTO N.12: Cunetas Pasca

INFORME N.: 7 **PERIODO:** viernes, 22 de marzo de 2024

OBJETO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
EN EL MARCO DEL PLAN 500

CONTRATO No.: ICCU 708 DE 2023



FOTO N.13: Espacio Publico Aguabonita



FOTO N.14: Espacio Publico Aguabonita



FOTO N.15: Espacio Publico Aguabonita



FOTO N.16: Espacio Publico Aguabonita



FOTO N.17: Espacio Publico Aguabonita



FOTO N.18: Espacio Publico Aguabonita

4.9. Otros documentos seguimiento mensual

4.9.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo

En el mes de septiembre de 2023 el contratista recibió el desembolso del anticipo por valor de 5.358.746.830,20, a continuación, se anexa el formato del informe No. 2 correspondiente al mes de octubre de INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO.

A la fecha del 23 de marzo de 2024, el contratista ha amortizado un total de $5.358.746.830,20 del anticipo otorgado, mediante las actas de obra No. 1 correspondiente al mes de agosto, No.2 correspondiente al mes de septiembre, No. 3 correspondiente al mes de octubre, No. 4 correspondiente al mes de noviembre, No. 5 correspondiente al mes de diciembre, No. 6 correspondiente al mes de enero, No. 7 correspondiente al mes de febrero y acta No. 8 correspondiente al mes de marzo de 2024.

Así mismo, de acuerdo a los informes presentados de la fiducia para el presente periodo, se evidencia que durante el mes de septiembre el anticipo otorgado al contratista obtuvo rendimientos por valor de $5,982,398.79, los cuales fueron trasladados al ICCU por concepto de rendimientos, el día 10 de octubre de 2023.

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

INFORME Nº 8 DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

CONTRATO N°: ICCU 708 DE 2023.
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

TIPO DE CONTRATO: OBRA
(PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.
(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR DEL CONTRATO: $ 17.678.836.940,00
(VALOR EN NUMEROS)

VALOR DEL ANTICIPO: $ 5.358.746.830,20
(VALOR EN NUMEROS)

CHEQUE/ COMPROBANTE	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Anticipos y/o pagos de contratos de obra y/o mano de obra y/o suministros	$ 1.258.746.830	$ 1.256.980.075,00	$ -	$ 1.256.980.075	$ 1.766.755
2	Transporte de materiales granulares (Fabricación de concreto en obra, estructura de vías y estructura de andenes), transporte de material proveniente de actividades de excavaciones y fresado, transporte de mezclas asfalticas y transporte de maquinaria	$ 450.000.000	$ 447.347.485,00	$ -	$ 447.347.485	$ 2.652.515
3	Compra de materiales	$ 3.650.000.000	$ 3.382.023.417,00	$ -	$ 3.382.023.417	$ 267.976.583
				TOTAL	$ 5.086.350.977	$ 272.395.853

NOTA: Se aclara que del valor otorgado como anticipo, ingreso $5.090.809.488 netos, por lo tanto queda un saldo de $4.458.511 para ser invertidos

FIRMA
NOMBRE WILLIAM LEONARDO OLIVEROS RAMIREZ
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE ANDREA DEL PÑILAR PEÑA SANCHEZ
INTERVENTOR

ORIGINAL: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
COPIA Nº 1: CONTRATISTA
COPIA Nº 2: INTERVENTORIA

000124

fiduciaria popular

SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Popular S A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

31511-P.A. ANTICIPO CONSORCIO PASCA CNJ

Periodo: 202403

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**14,780,108.41**	**4,445,784.17**	**12,390,560.12**	**6,835,332.46**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**7,994,613.84**	**4,411,742.75**	**7,979,225.12**	**4,427,131.47**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**7,994,613.84**	**4,411,742.75**	**7,979,225.12**	**4,427,131.47**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**7,994,613.84**	**4,411,742.75**	**7,979,225.12**	**4,427,131.47**
11150501		**CUENTA AHORROS**	**NAPL**	**7,994,613.84**	**4,411,742.75**	**7,979,225.12**	**4,427,131.47**
1115050101		BANCO POPULAR- AHORROS	NAPL	7,994,613.84	4,411,742.75	7,979,225.12	4,427,131.47
	500804763267	P.A. ANTICIPO CONSORCIO PASCA CNJ	NAPL	7,994,613.84	4,411,742.75	7,979,225.12	4,427,131.47
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**6,785,494.57**	**34,041.42**	**4,411,335.00**	**2,408,200.99**
1302		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**6,785,494.57**	**34,041.42**	**4,411,335.00**	**2,408,200.99**
130205		**EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**6,785,494.57**	**34,041.42**	**4,411,335.00**	**2,408,200.99**
13020501		**PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS**	**NAPL**	**6,785,494.57**	**34,041.42**	**4,411,335.00**	**2,408,200.99**
1302050105		FONDOS DE INVERSION COLECTIVA FIDUPOPULAR	NAPL	6,785,494.57	34,041.42	4,411,335.00	2,408,200.99
	70083604614	ENCARGO FIDUCIARIO 70083604614	NAPL	6,785,494.57	34,041.42	4,411,335.00	2,408,200.99
2		**PASIVO**	**NAPL**	**.00**	**7,947,435.38**	**7,947,435.38**	**.00**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**7,947,435.38**	**7,947,435.38**	**.00**
2590		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**7,947,435.38**	**7,947,435.38**	**.00**
259095		**OTROS**	**NAPL**	**.00**	**7,947,435.38**	**7,947,435.38**	**.00**
25909501		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**7,947,435.38**	**7,947,435.38**	**.00**
2590950101		CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR	NAPL	.00	7,947,435.38	7,947,435.38	.00
	900258711	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	NAPL	.00	7,947,435.38	7,947,435.38	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-14,780,108.41**	**12,356,110.95**	**4,411,335.00**	**-6,835,332.46**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-26,835,952.97**	**4,411,335.00**	**4,411,335.00**	**-26,835,952.97**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-5,113,186,929.00**	**4,411,335.00**	**4,411,335.00**	**-5,113,186,929.00**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-5,113,186,929.00**	**4,411,335.00**	**4,411,335.00**	**-5,113,186,929.00**
35050501		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-5,113,186,929.00**	**4,411,335.00**	**4,411,335.00**	**-5,113,186,929.00**
3505050105		APORTES EN DINERO	NAPL	-5,113,186,929.00	4,411,335.00	4,411,335.00	-5,113,186,929.00
	800140959	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S	NAPL	-4,091,833,431.40	4,411,335.00	3,529,068.00	-4,090,951,164.40
	900527061	JMS INGENIERIA SAS	NAPL	-510,676,748.80	.00	441,133.50	-511,117,882.30
	901635303	NAICA INGENIERÍA SAS	NAPL	-510,676,748.80	.00	441,133.50	-511,117,882.30
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**5,086,350,976.03**	**.00**	**.00**	**5,086,350,976.03**
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**5,086,350,976.03**	**.00**	**.00**	**5,086,350,976.03**
35101000		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**5,086,350,976.03**	**.00**	**.00**	**5,086,350,976.03**
3510100095		OTROS	NAPL	5,086,350,976.03	.00	.00	5,086,350,976.03
	17101950	VELANDIA POVEDA GUSTAVO HERNAN	NAPL	66,318,814.00	.00	.00	66,318,814.00
	830099238	CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.	NAPL	50,400,000.00	.00	.00	50,400,000.00
	830512347	CONCREMOVIL S.A	NAPL	490,000,000.00	.00	.00	490,000,000.00
	860007668	ALAMBRES Y MALLAS S.A.	NAPL	329,000,112.50	.00	.00	329,000,112.50
	900097459	INCOASFALTOS SA	NAPL	223,917,588.00	.00	.00	223,917,588.00
	900115530	HUMBERTO QUINTERO Y CIA S.C.A.	NAPL	478,718,357.00	.00	.00	478,718,357.00
	900215394	DROMOS PAVIMENTOS SA	NAPL	1,809,987,359.00	.00	.00	1,809,987,359.00
	900659905	TRANSPORTES MARTINEZ RIOS SAS	NAPL	286,602,176.00	.00	.00	286,602,176.00
	900773521	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	NAPL	70,000,000.00	.00	.00	70,000,000.00
	900803958	ALTARA INGENIERIA SAS	NAPL	509,373,415.00	.00	.00	509,373,415.00
	901047848	ASFALCARGO SAS	NAPL	110,607,783.53	.00	.00	110,607,783.53
	901353771	INCOCARGA S.A.S.	NAPL	20,137,525.00	.00	.00	20,137,525.00
	901529044	KOUMI SAS	NAPL	611,287,846.00	.00	.00	611,287,846.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3510100095	1024499729	GALINDEZ CORTES DIEGO ALEJANDRO	NAPL	30,000,000.00	.00	.00	30,000,000.00
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**12,055,844.56**	**7,944,775.95**	**.00**	**20,000,620.51**
3910		**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**12,163,174.68**	**.00**	**.00**	**12,163,174.68**
391001		**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**12,163,174.68**	**.00**	**.00**	**12,163,174.68**
39100101		**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**12,163,174.68**	**.00**	**.00**	**12,163,174.68**
3910010101		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	12,163,174.68	.00	.00	12,163,174.68
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	12,163,174.68	.00	.00	12,163,174.68
3915		**GANANCIAS DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-107,330.12**	**.00**	**.00**	**-107,330.12**
391501		**GANANCIAS DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-107,330.12**	**.00**	**.00**	**-107,330.12**
39150101		**GANANCIAS DEL EJECICIO**	**NAPL**	**-107,330.12**	**.00**	**.00**	**-107,330.12**
3915010101		GANANCIAS DEL EJERCICIO	NAPL	-107,330.12	.00	.00	-107,330.12
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	-107,330.12	.00	.00	-107,330.12
3920		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**7,944,775.95**	**.00**	**7,944,775.95**
392001		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**7,944,775.95**	**.00**	**7,944,775.95**
39200101		**PÉRDIDA DEL EJECICIO**	**NAPL**	**.00**	**7,944,775.95**	**.00**	**7,944,775.95**
3920010101		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	.00	7,944,775.95	.00	7,944,775.95
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	.00	7,944,775.95	.00	7,944,775.95
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-110,138.39**	**.00**	**34,449.17**	**-144,587.56**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**NAPL**	**-110,138.39**	**.00**	**34,449.17**	**-144,587.56**
4103		**INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONALES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-1,313.40**	**.00**	**407.75**	**-1,721.15**
410395		**OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-1,313.40**	**.00**	**407.75**	**-1,721.15**
41039501		**OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-1,313.40**	**.00**	**407.75**	**-1,721.15**
4103950101		OTROS INTERESES	NAPL	-1,313.40	.00	407.75	-1,721.15
	860007738	BANCO POPULAR S.A.	NAPL	-1,313.40	.00	407.75	-1,721.15
4108		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**-108,824.99**	**.00**	**34,041.42**	**-142,866.41**
410805		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO**	**NAPL**	**-108,824.99**	**.00**	**34,041.42**	**-142,866.41**
41080501		**PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)**	**NAPL**	**-108,824.99**	**.00**	**34,041.42**	**-142,866.41**
4108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)	NAPL	-108,824.99	.00	34,041.42	-142,866.41
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	-108,824.99	.00	34,041.42	-142,866.41
5		**GASTOS**	**NAPL**	**110,138.39**	**7,979,225.12**	**7,944,775.95**	**144,587.56**
51		**GASTOS OPERACIONALES**	**NAPL**	**2,808.27**	**7,979,225.12**	**.00**	**7,982,033.39**
5108		**VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.**	**NAPL**	**2,808.27**	**.00**	**.00**	**2,808.27**
510805		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**2,808.27**	**.00**	**.00**	**2,808.27**
51080501		**PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)**	**NAPL**	**2,808.27**	**.00**	**.00**	**2,808.27**
5108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)	NAPL	2,808.27	.00	.00	2,808.27
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	2,808.27	.00	.00	2,808.27
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**31,789.74**	**.00**	**31,789.74**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**31,789.74**	**.00**	**31,789.74**
51400501		**G.M.F.**	**NAPL**	**.00**	**31,789.74**	**.00**	**31,789.74**
5140050101		G.M.F. CUENTAS AHORROS	NAPL	.00	31,789.74	.00	31,789.74
	860007738	BANCO POPULAR S.A.	NAPL	.00	31,789.74	.00	31,789.74

Fiduciaria Popular S A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

31511-P.A. ANTICIPO CONSORCIO PASCA CNJ

Periodo: 202403

22/04/24 03:16 PM

Programa: SCMRSLNA

Leidy Michell Vergara Vasquez

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
5167		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**7,947,435.38**	**.00**	**7,947,435.38**
516701		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**7,947,435.38**	**.00**	**7,947,435.38**
51670101		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**7,947,435.38**	**.00**	**7,947,435.38**
5167010101		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	.00	7,947,435.38	.00	7,947,435.38
	900258711	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	NAPL	.00	7,947,435.38	.00	7,947,435.38
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**107,330.12**	**.00**	**7,944,775.95**	**-7,837,445.83**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**107,330.12**	**.00**	**7,944,775.95**	**-7,837,445.83**
590501		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**107,330.12**	**.00**	**7,944,775.95**	**-7,837,445.83**
59050101		**GANANCIAS**	**NAPL**	**107,330.12**	**.00**	**7,944,775.95**	**-7,837,445.83**
5905010101		GANANCIAS	NAPL	107,330.12	.00	7,944,775.95	-7,837,445.83
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	107,330.12	.00	7,944,775.95	-7,837,445.83
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL**	**NAPL**	**.00**	**1,423,500.00**	**1,423,500.00**	**.00**
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-773,500.00**	**.00**	**773,500.00**	**-1,547,000.00**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-773,500.00**	**.00**	**773,500.00**	**-1,547,000.00**
829501		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-773,500.00**	**.00**	**773,500.00**	**-1,547,000.00**
82950101		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-773,500.00**	**.00**	**773,500.00**	**-1,547,000.00**
8295010101		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-773,500.00	.00	773,500.00	-1,547,000.00
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	-773,500.00	.00	773,500.00	-1,547,000.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**773,500.00**	**1,423,500.00**	**650,000.00**	**1,547,000.00**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**773,500.00**	**1,423,500.00**	**650,000.00**	**1,547,000.00**
840500		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**773,500.00**	**1,423,500.00**	**650,000.00**	**1,547,000.00**
84050000		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**773,500.00**	**1,423,500.00**	**650,000.00**	**1,547,000.00**
8405000000		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	773,500.00	1,423,500.00	650,000.00	1,547,000.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	.00	650,000.00	650,000.00	.00
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	773,500.00	773,500.00	.00	1,547,000.00
			Total	.00	34,152,055.62	34,152,055.62	.00

DIRECTOR CONTABLE

REPRESENTANTE LEGAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-804-76326-7	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDUCIARIA POPULAR S.A.	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CR 13 A NO 29 24 PI20 21 24	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C.	Desde 2024/03/01 Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	2136	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21 89	7994635 73
03 02	2137	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21 89	7994657 62
03 03	2137	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21 89	7994679 51
03 04	2203	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21 89	7994701 40
03 05	2135	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21 89	7994723 29
03 06	2137	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21 89	7994745 18
03 07	2135	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	21 89	7994767 07
03 08	1830	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111N27002623	6026018 89	0 00	1968748 18
03 08	1830	SAN DIEGO	N/D.GMF AUTOMA	933J111N27002623	24104 08	0 00	1944644 10
03 08	1834	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111N27000387	1919424 71	0 00	25219 39
03 08	1834	SAN DIEGO	N/D.GMF AUTOMA	933J111N27000387	7677 70	0 00	17541 69
03 08	1837	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111N27000388	678 38	0 00	16863 31
03 08	1837	SAN DIEGO	N/D.GMF AUTOMA	933J111N27000388	2 71	0 00	16860 60
03 08	1839	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111N27000389	678 59	0 00	16182 01
03 08	1839	SAN DIEGO	N/D.GMF AUTOMA	933J111N27000389	2 71	0 00	16179 30
03 11	0532	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A/C.	150A048N2A000003	0 00	4411335 00	4427514 30
03 11	2135	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	12 12	4427526 42
03 12	2137	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	12 12	4427538 54
03 13	2146	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	12 12	4427550 66
03 14	1220	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111N2D000182	634 81	0 00	4426915 85
03 14	1220	SAN DIEGO	N/D.GMF AUTOMA	933J111N2D000182	2 54	0 00	4426913 31
03 14	2135	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	12 12	4426925 43
03 15	2135	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	12 12	4426937 55
03 16	2136	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	12 12	4426949 67
03 17	2136	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	12 12	4426961 79
03 18	2136	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	12 12	4426973 91
03 19	2135	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	12 12	4426986 03
03 20	2136	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	12 12	4426998 15
03 21	0005	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	12 12	4427010 27
03 22	2137	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	12 12	4427022 39
03 23	2138	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	12 12	4427034 51
03 24	2138	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	12 12	4427046 63
03 25	2139	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	12 12	4427058 75
03 26	2145	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	12 12	4427070 87
03 27	2115	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	12 12	4427082 99
03 28	2116	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	12 12	4427095 11
03 29	2116	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	12 12	4427107 23
03 30	2117	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	12 12	4427119 35
03 31	2118	SAN DIEGO	N/C.INTERESES	150P541COP 00002	0 00	12 12	4427131 47

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
7994613 84	7979225 12	4411742 75	4905461 23	0 00	4427131 47

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 – 83 Bogotá Tel: 5439850 – 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

t. 900247285

fiduciaria popular

NIT. 800141235

P.A. ANTICIPO CONSORCIO PASCA CNJ
P.A. ANTICIPO CONSORCIO PASCA CNJ
CR 7 75 51 OF 602
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 31511

Fiduliquidez Fondo de Inversión Abierto

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Marzo 2024 **al** 31 Marzo 2024 **Número de Encargo:** XXXXXXX4614-8

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Marzo 2024		$ 6,785,494.57
Aportes	$ 0.00	
Retiros	$ -4,411,335.00	
Gravamen a los movimientos financieros	$ 0.00	
Rendimientos	$ 34,041.42	
Retención en la fuente	$ 0.00	
Saldo Final a 31 Marzo 2024		$ 2,408,200.99

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN

Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en $	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en $	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en $
01/03/2024 al 31/03/2024	F ANTICIPOS	12,369.411694	548.570517	12,481.557109	192.940750	2,408,200.99

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
01/03/2024	SALDO ANTERIOR		6,785,494.57	12,369.411694	548.570517	6,785,494.57
07/03/2024	RETIROS	-355.629770	-4,411,335.00	12,404.290558	191.398255	2,374,159.57

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
F ANTICIPOS	2.00%	$856,135,938,962.85

	Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)						Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
F ESPECIAL	12.647	14.012	11.872	13.065	12.359	8.856	0.217	0.629	0.275	0.583	0.535	0.524
F ANTICIPOS	11.212	12.560	10.447	11.624	10.928	7.468	0.217	0.629	0.275	0.583	0.535	0.524
F INV DIREC	11.980	13.338	11.210	12.396	11.692	8.209	0.217	0.629	0.275	0.583	0.535	0.524
F NEG FIDU	11.212	12.560	10.447	11.624	10.928	7.468	0.217	0.629	0.275	0.583	0.535	0.524
F TP01 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP02 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP03 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP04 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP05 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP06 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP07 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

P.A. ANTICIPO CONSORCIO PASCA CNJ
P.A. ANTICIPO CONSORCIO PASCA CNJ
CR 7 75 51 OF 602
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 31511

Fiduliquidez Fondo de Inversión Abierto

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Marzo 2024 **al** 31 Marzo 2024 **Número de Encargo:** XXXXXXX4614-8

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
F TP08 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP09 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
[illegible]10 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP11 INMOB	11.212	12.560	10.447	11.624	10.928	7.468	0.217	0.629	0.275	0.583	0.535	0.524
ICIAL ESPECIAL	12.536	13.899	11.761	12.953	11.322	7.434	0.217	0.629	0.275	0.583	0.566	0.532

s obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los neros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones opias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por nguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los ecios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

ualquier inquietud comuníquese con Servicio al Cliente al PBX 6079977, 5951506 Opción 3, a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo rvicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29 24 piso 20, 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, mitirla a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico marisolrincon@kpmg.com o al número telefónico 6079977 Ext 502. El reglamento y la ficha técnica drá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión. Recuerde que cuenta con la Defensoría del nsumidor Financiero: calle 70 A No 11 83 en Bogotá, Teléfonos: (1) 5439850 (1)2351604. Correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co



CODIGO NEGOCIO	31511
NOMBRE NEGOCIO	P.A.CONSORCIO PASCA CNJ
ENTIDAD	POPULAR
TIPO CUENTA	AHORROS
NÚMERO CUENTA	500-80476326-7

Mes: MARZO

Año: 2024

FECHA	CONCEPTO BANCARIO (SI APLICA)	DESCRIPCION MOVIMIENTO	VALOR
INGRESOS			
Aporte INICIAL			
dic-23	APORTE	APORTE INCIAL DIC	$ 7.992.622,06
Sub Total Aportes			**$ 7.992.622,06**
Ingresos por Traslados			
1/mar/2024	traslado	TRASLADO FONDO DE RESERV/	$ 4.411.335,00
Sub Total Ingresos por Traslados			**$ 4.411.335,00**
Rendimientos			
dic-23	INTERESES	RENDIMIENTOS GENERADOS	$ 678,38
ene-24	INTERESES	RENDIMIENTOS GENERADOS	$ 678,59
feb-24	INTERESES	RENDIMIENTOS GENERADOS	$ 634,81
mar-24	INTERESES	RENDIMIENTOS GENERADOS	$ 407,75
Sub Total Rendimientos			**$ 2.399,53**
TOTAL INGRESOS			$ 12.406.356,59
EGRESOS			
Pagos			
mar-24	PAGOS	PAGO RENDIMIENTOS	$ 7.947.435,38
Sub Total Pagos			**$ 7.947.435,38**
GMF			
mar-24	PAGOS	GMF X RENDIMIENTOS	$ 31.789,74
Sub Total GMF			**$ 31.789,74**
TOTAL EGRESOS			$ 7.979.225,12
SALDO FINAL			$ 4.427.131,47

CODIGO NEGOCIO	31511
NOMBRE NEGOCIO	P.A.CONSORCIO PASCA CNJ
ENTIDAD	POPULAR
TIPO CUENTA	FIDULIQUIDEZ RESERVA
NÚMERO CUENTA	70083604614-8

FECHA	CONCEPTO BANCARIO (SI APLICA)	DESCRIPCION	VALOR
INGRESOS			
Aportes			
dic-23	APORTE	APORTE INCIAL DIC	$ 6.584.526,21



Sub Total Aportes			$	**6.584.526,21**
Rendimientos				
dic-23	INTERESES	RENDIMIENTOS GENERADOS	$	94.951,64
ene-24	INTERESES	RENDIMIENTOS GENERADOS	$	49.203,68
feb-24	INTERESES	RENDIMIENTOS GENERADOS	$	56.813,04
mar-24	INTERESES	RENDIMIENTOS GENERADOS	$	34.041,42
Sub Total Rendimientos			$	**235.009,78**
TOTAL INGRESOS			$	6.819.535,99

EGRESOS				
Egresos por Traslados				
1/mar/2024	TRASLADO	TRASLADO A CUENTA	$	4.411.335,00
Sub Total Egresos por Traslados			$	**4.411.335,00**
TOTAL EGRESOS			$	4.411.335,00

SALDO FINAL	$	2.408.200,99

000182

P.A. ANTICIPO CONSORCIO PASCA CNJ- 31511

PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO BANCO POPULAR N°500-80476326-7

			24/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	15/11/2023	
ITEM	PLAN DE INVERSION	VALOR ANTICIPO POR RUBRO	ORDEN No. 8	ORDEN No. 9	ORDEN No. 10	ORDEN No. 11	SALDO ANTICIPO POR RUBRO
1	anticipos o pagos de contratos mano de obra y suministros	$ 1.258.746.830,00		$ 61.852.879,00		$ 346.613.936,00	$ 1.766.755,00
2	trnsporte de materiales granulares (fabricacion de concreto en obra, estructura de vis y estructura de andenes) transportes de materiales provinientes	$ 450.000.000,00	$ 20.137.525,00		$ 38.948.126,00	$ 86.602.176,00	$ 2.652.516,00
3	compra de materiales	$ 3.650.000.000,00	$ 343.917.588,00		$ 599.885.630,00	$ 808.820.085,00	$ 267.976.584,00
	TOTAL PLAN DE INVERSION	**$ 5.358.746.830,00**	**$ 364.055.113,00**	**$ 61.852.879,00**	**$ 638.833.756,00**	**$ 1.242.036.197,00**	**$ 4.458.513,00**
	Recursos Establecidos Contractualmente	**$ 5.358.746.830,00**					
	RECURSOS INGRESARON 29/12/2022	**$ 5.090.809.488,00**					
		$ 267.937.342,00					

Fiduciaria popular

Fideico - Sistema de Fideicomiso

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

Fecha 01-03-2024 hasta 31-03-2024

Programa: FDMRPGDF
22/04/2024 16:28:29
Leidy Michell Vergara Vasquez

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 31511 P.A. ANTICIPO CONSORCIO PASCA CNJ

Fec.Causac.	FPg	Banco Origen Banc	Cuenta	Beneficiario	Banco Destino Banc	Cuenta	Vlr Bruto	Vlr Dscto	Vlr Neto	Estado	Observaciones	Conceptos Descripción	Fch Aprb. GG.	Num. Oper
06/03/2024	PT	2	500804763267	900258711 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU			6,026,018.89	0.00	6,026,018.89	PAGADA	REND-RENDIMIENTOS OCT-23	**DEVOLUCIONES**	06/03/2024	30
06/03/2024	PT	2	500804763267	900258711 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU			1,919,424.71	0.00	1,919,424.71	PAGADA	REND-RENDIMIENTOS NOV-23	**DEVOLUCIONES**	06/03/2024	31
06/03/2024	PT	2	500804763267	900258711 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU			678.38	0.00	678.38	PAGADA	REND-RENDIMIENTOS DIC-23	**DEVOLUCIONES**	06/03/2024	32
06/03/2024	PT	2	500804763267	900258711 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU			678.59	0.00	678.59	PAGADA	REND-RENDIMIENTOS ENE-24	**DEVOLUCIONES**	06/03/2024	33
12/03/2024	PT	2	500804763267	900258711 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU			634.81	0.00	634.81	PAGADA	PAGO RENDIMIENTOS DE FEBRERO 2024	**DEVOLUCIONES**	12/03/2024	37
				Nro. de Operaciones: 5	**TOTAL**		7,947,435.38	0.00	7,947,435.38					

Formas de Pago

EF	PAGO ELECTRONICO ACH
CT	TRANSFERENCIA BANCARIA POR CARTA
PT	PAGO TERCEROS POR CARTA
AC	CHEQUE GERENCIA CLIENTES DIRECTOS BANCO POPULAR
CF	CHEQUE GERENCIA FIDEICOMISOS BANCO POPULAR
CH	CHEQUE VENTANILLA FIDUC POPULAR
TW	TRANSFERENCIA WEB -BANCOS

Bancos

67	MIBANCO S.A.
1	BANCO DE BOGOTA
6	BANCO CORPBANCA-ITAU
9	CITIBANK
12	BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA
14	HELM BANK-ITAU
23	BANCO DE OCCIDENTE
37	ADMINISTRADORA COUNTRY
51	BANCO DAVIVIENDA
60	BANCO PICHINCHA
531	FIDUCOLOMBIA
58	BANCO CREDIFINANCIERA S.A.
63	BANCO FINANDINA S.A.
59	BANCAMIA S.A.-BANCO MICROFINAN
64	BANCO MULTIBANK S.A
65	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO
292	CONFIAR COOPERATIVA FNANCIERA
68	BANCO MUNDO MUJER S.A.
70	LULO BANK S.A.
289	COTRAFA FINANCIERA
130	BANCO UNION S.A.
0	BANCO DE LA REPUBLICA
2	BANCO POPULAR S.A.
7	BANCOLOMBIA
10	HSBC COLOMBIA
13	BBVA COLOMBIA
19	BANCO COLPATRIA
32	BANCO CAJA SOCIAL
40	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
52	BANCO AV VILLAS
147	BANCO ALIADAS
8	SCOTIABANK COLOMBIA S.A COLPAT
51	BANCO COOMEVA S.A.
62	BANCO FALABELLA S.A.
53	BANCO WWB S.A..
66	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
121	FINANCIERA JURISCOOP S.A.
108	IRIS CF-COMPAÑIA DE FINANCI
46	COLTEFINANCIERA S.A.
286	JKF COOPERATIVA FINANCIERA
25	OCCIDENTAL BANK (BARBADOS) LTD

INFORMACION RESTRINGIDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos | www.fogafin.gov.co

banco popular
NIT 860.007.738-9

CLIENTE	PAGINA Nº 0001 De 0001
NOMBRE P.A. CONSORCIO C&J - FIDUCIARIA POPULAR	
DIRECCION ENTREGA PERSONAL	
CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	OFI: 150

CUENTA Nº	220-150-19333-2
OFICINA	Fecha Corte
SAN DIEGO	2023/03/01
	2023/03/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3 1	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3805		10285 49	199469011 73
3 2	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3804		10286 02	199479297 75
3 3	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	11422		10286 55	199489584 30
3 4	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	11423		10287 08	199499871 38
3 5	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	11424		10287 61	199510158 99
3 6	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3808		10288 14	199520447 13
3 7	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3817		10288 67	199530735 80
3 8	1113	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	8884292	1151 44		199529584 36
3 8	1113	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8884292	287861 24		199241723 12
3 8	2257	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3807		10274 30	199251997 42
3 9	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3825		10274 83	199262272 25
3 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	11479		10275 36	199272547 61
3 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	11480		10275 89	199282823 50
3 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	11481		10276 42	199293099 92
3 13	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3809		10276 95	199303376 87
3 14	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3809		10277 48	199313654 35
3 15	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3806		10278 01	199323932 36
3 16	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3800		10278 54	199334210 90
3 17	2239	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	15209		10279 07	199344489 97
3 18	2239	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	15210		10279 60	199354769 57
3 19	2239	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	15211		10280 13	199365049 70
3 20	2239	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	15212		10280 66	199375330 36
3 21	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3791		10281 19	199385611 55
3 22	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3785		10281 72	199395893 27
3 23	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3779		10282 25	199406175 52
3 24	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	11365		10282 78	199416458 30
3 25	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	11366		10283 31	199426741 61
3 26	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	11367		10283 84	199437025 45
3 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3798		10284 37	199447309 82
3 28	1541	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	8978286	214078		199445169 04
3 28	1541	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8978286	53519424		198909974 80
3 28	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3792		10257 19	198920231 99
3 29	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3782		10257 72	198930489 71
3 30	1342	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	8991610	440000 00		198490489 71
3 30	1342	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8991610	110000000 00		88490489 71
3 30	1342	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	8991612	288000 00		88202489 71
3 30	1342	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	8991612	72000000 00		16202489 71
3 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3779		726 47	16203216 18
3 31	1620	GER SOPORTE Y S	ABONOS POR A.C.	20614708		794000 00	16997216 18
3 31	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	11317		762 10	16997978 28

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
199458726 24	8	183554347 70	32	1093599 74	187565928		16997978 28

Linea verde al 7434646 Bogota o 018000184646 resto Pais. Revisoria Fiscal KPMG S.A.S revisoriafiscal@bancopopular.com.co o Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5439850-2351604

000135

Fiduciaria popular

Fideico - Sistema de Fideicomiso

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS
Fecha 01-04-2023 hasta 14-04-2023

Programa: FDMRPGDF
14/04/2023 10:30:53
DIANA KARINA ARIAS AVELL

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 319326 PA ANT CONSORCIO C&J AEROCIVIL

Fec.Causac.	FPg	Banco Origen Banc	Cuenta	Beneficiario	Banc	Banco Destino Cuenta	Vlr Bruto	Vlr Dscto	Vlr Neto	Estado	Observaciones	Descripción	Conceptos	Fch Aprb. GG.	Num. Oper
05/04/2023	EF	2	150193332	899999059 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	23	221800287	299,599.74	0.00	299,599.74	PAGADA	PAGO RENDIMIENTOS DE MARZO 2023	DEVOLUCIONES		05/04/2023	39

Nro. de Operaciones: 1 **TOTAL** 299,599.74 0.00 299,599.74

Formas de Pago

EF	PAGO ELECTRONICO ACH
CT	TRANSFERENCIA BANCARIA POR CARTA
PT	PAGO TERCEROS POR CARTA
AC	CHEQUE GERENCIA CLIENTES DIRECTOS BANCO POPULAR
CF	CHEQUE GERENCIA FIDEICOMISOS BANCO POPULAR
CH	CHEQUE VENTANILLA FIDUC POPULAR
TW	TRANSFERENCIA WEB -BANCOS

Bancos

67	BANCO COMPARTIR S.A.	0	BANCO DE LA REPUBLICA
1	BANCO DE BOGOTA	2	BANCO POPULAR S.A.
6	BANCO CORPBANCA-ITAU	7	BANCOLOMBIA
9	CITIBANK	10	HSBC COLOMBIA
12	BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA	13	BBVA COLOMBIA
14	HELM BANK-ITAU	19	BANCO COLPATRIA
23	BANCO DE OCCIDENTE	32	BANCO CAJA SOCIAL
40	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	51	BANCO DAVIVIENDA
52	BANCO AV VILLAS	60	BANCO PICHINCHA
531	FIDUCOLOMBIA	8	SCOTIABANK COLOMBIA S.A COLPAT
58	BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.	61	BANCO COOMEVA S.A.
63	BANCO FINANDINA S.A.	62	BANCO FALABELLA S.A.
59	BANCAMIA S.A.-BANCO MICROFINAN	53	BANCO WWB S.A..
64	BANCO MULTIBANK S.A	66	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
65	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO	121	FINANCIERA JURISCOOP S.A.
292	CONFIAR COOPERATIVA FNANCIERA	68	BANCO MUNDO MUJER S.A.
70	LULO BANK S.A.	25	OCCIDENTAL BANK (BARBADOS) LTD

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO
P.A. CONSORCIO C&J AEROCIVIL - CÓDIGO 319326
NIT. 830.053.691-8

INFORMA:

Que en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos celebrado entre CONSORCIO C&J AEROCIVIL 2022, y FIDUCIARIA POPULAR S.A., suscrito el día 20 de septiembre de 2022, denominado PATRIMONIO AUTÓNOMO ANTICIPO CONSORCIO C&J AEROCIVIL– CÓDIGO 319326, cuyo objeto es la administración del anticipo derivado del CONTRATO N 22001132 H4 DE 2022 para *"REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CERGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTA"*. Se registraron en la cuenta bancaria No 220-150-19333-2 en la cual se administran los recursos *del anticipo, los rendimientos f*inancieros que se relacionan a continuación:

PERIODO	VALOR
Marz-23	$ 299,599.74
TOTAL	**$ 299,599.74**

Conforme con lo anterior, se informa que los rendimientos financieros generados en el mes de marzo de 2023 antes mencionados, los cuales fueron girados día 13 de abril de 2023 a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL** (entidad otorgante) de acuerdo con lo instruido por esta.

Se expide en la ciudad de Bogotá, a los catorce (14) días del mes de abril de 2023, por solicitud del Fideicomitente.

Cordialmente,

Diana Karina Arias Avellaneda

DIANA KARINA ARIAS
Coordinadora de Negocios Fiduciarios

Elaboro: Maria Valentina López Galeano.
Revisó: Diana Karina Arias avellaneda

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4.9.2.Seguimiento Programa de Inversión

A continuación, se presenta el formato de seguimiento al Programa de Inversión

INSTITUTO DE INFREASTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CONSORCIO PASCA CNJ

FECHA: 1 (Día) / 04 (Mes) / 24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: ICCU - 708 DEL 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE-FUSAGASUGA-PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500.

CONTRATISTA: CONSORCIO PASCA CNJ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU 815 DEL 2023

INTERVENTOR: COPEBA SAS

PLAZO INICIAL: 6.5 MESDES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 8 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 01 DE AGOSTO DEL 2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23 DE ABRIL DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 17.678.836.940,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 17.678.836.940,00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 AGOSTO	2 SEPTIEMBRE	3 OCTUBRE	4 NOVIEMBRE	5 DICIEMBRE	6 ENERO	7 FEBRERO	8 MARZO	ABRIL	100%
CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES														
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	$1.542.782,00	0,01%	0,14%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$23.142,00	0,00%	$24.816.573	$ P	$ 15.828,94	$ 7.313,06	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E	$ 15.828,94	$ 15.428,00				$ 14.497.715,54		$ 10.287.600,40		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,06%	0,00%	
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	$16.577.176,00	0,09%	0,27%	% P	0,02%	0,09%	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$76.888.843,00	0,43%	$47.849.531	$ P	$ 2.742.106,32	$ 16.577.176,00	$0	$0	$ 28.784.780,34	$ 28.784.780,34	$0	$0	$0	
				$ E		$ 24.417.205,00			$ 13.339.751,04		$ 10.092.574,80			
				% E	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	$1.097.520.300,00	6,21%	0,61%	% P	0,00%	0,04%	0,27%	0,13%	0,26%	0,13%	0,16%	0,00%	0,24%	
	$217.853.264,00	1,23%	$108.528.176	$ P	$0	$ 7.951.439,40	$ 47.020.352,09	$ 23.454.759,34	$ 45.952.265,00	$ 22.976.132,50	$ 28.199.326,27	$0	$ 42.298.989,40	
				$ E	$ 2.742.106,32	$ 7.951.439,00	$ 47.020.352,09	$ 23.454.759,34			$ 27.359.519,18			
				% E	0,02%	0,04%	0,27%	0,13%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	
CAPITULO 2. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES														
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	$153.682.618,00	0,87%	0,01%	% P	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$2.311.694,00	0,01%	$2.311.694	$ P	$0	$0	$ 2.311.694,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E			$ 2.311.694,01							
				% E	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
CAPITULO 3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO														
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	$437.199.750,00	2,47%	0,30%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,13%	0,13%	0,06%	0,00%	
	$67.996.892,00	0,38%	$52.788.310	$ P	$0	$0	$0	$0	$ 12.665.630,80	$ 22.665.630,80	$ 22.865.941,28	$ 9.799.689,12	$0	
				$ E					$ 7.360.349,99	$ 10.188.022,97	$ 27.302.483,39	$ 7.937.453,55		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,06%	0,15%	0,04%	0,00%	
BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO Y CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	$3.790.864.350,00	21,44%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$0,00	0,00%	$0	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
RIEGO DE IMPRIMACIÓN	$205.305.750,00	1,16%	0,50%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,22%	0,33%	0,00%	0,00%	0,05%	
	$160.545.587,00	0,91%	$89.112.662	$ P	$0	$0	$0	$ 54.893.774,06	$ 38.613.937,65	$ 58.613.937,65	$0	$0	$ 8.423.937,65	
				$ E				$ 54.893.774,06	$ 18.562.307,02	$ 15.656.581,40				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,10%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	$99.684.000,00	0,56%	0,79%	% P	0,00%	0,06%	0,07%	0,41%	0,06%	0,06%	0,05%	0,00%	0,12%	
	$145.129.510,00	0,82%	$139.119.549	$ P	$0	$ 10.260.738,24	$ 12.273.264,48	$ 71.714.639,14	$ 9.946.581,02	$ 11.242.482,76	$ 8.907.541,31	$0	$ 20.784.263,06	
				$ E		$ 10.260.738,00	$ 12.273.264,48	$ 71.714.639,14	$ 4.789.330,56	$ 26.894.266,08	$ 7.826.744,64	$ 5.360.565,19		
				% E	0,00%	0,06%	0,07%	0,41%	0,03%	0,15%	0,04%	0,03%	0,00%	
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	$3.964.537.655,00	22,43%	9,17%	% P	0,00%	1,99%	3,91%	0,77%	0,42%	0,42%	0,00%	0,00%	2,03%	
	$1.688.088.454,00	9,55%	$1.621.907.278	$ P	$0	$ 351.643.459,37	$ 691.841.019,51	$ 135.546.958,45	$ 74.994.367,33	$ 74.994.367,33	$0	$0	$ 359.068.282,00	
				$ E		$ 351.643.459,00	$ 691.841.019,51	$ 135.546.958,45	$ 240.247.088,73	$ 202.628.752,38				
				% E	0,00%	1,99%	3,91%	0,77%	1,36%	1,15%	0,00%	0,00%	0,00%	
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 MODIFICADA CON CAUCHO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	$2.448.552.876,00	13,85%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$0,00	0,00%	$0	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	$229.466.055,00	1,30%	7,25%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	2,79%	1,07%	0,68%	1,35%	0,00%	3,14%	
	$1.596.285.600,00	9,03%	$1.281.717.569	$ P	$0	$0	$0	$ 493.632.960,06	$ 188.404.328,79	$ 120.000.000,00	$ 238.274.493,35	$0	$ 555.973.817,81	
				$ E				$ 593.632.960,06	$ 240.355.003,20		$ 392.771.772,90	$ 54.657.832,80		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	3,36%	1,36%	0,00%	2,22%	0,31%	0,00%	
FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-15 cm)	$255.703.500,00	1,45%	3,44%	% P	0,28%	0,48%	0,75%	1,60%	0,16%	0,08%	0,05%	0,00%	0,12%	
	$622.049.424,00	3,52%	$608.523.022	$ P	$ 48.808.771,51	$ 84.429.012,12	$ 132.713.351,05	$ 283.312.963,91	$ 27.758.593,09	$ 13.879.296,54	$ 9.344.230,74	$0	$ 21.803.205,05	
				$ E	$ 48.808.771,50	$ 84.429.012,00	$ 132.713.351,05	$ 283.312.963,91	$ 36.373.014,24		$ 20.076.702,36	$ 2.809.206,74		
				% E	0,28%	0,48%	0,75%	1,60%	0,21%	0,00%	0,11%	0,02%	0,00%	

INSTITUTO DE INFREASTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

AFIRMADO	$104.361.165,00	0,59%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	$0,00	0,00%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	$420.505.452,00	2,38%	0,10%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 7.659.480,00	$0	
	$7.659.480,00	0,04%	$17.170.001	$ E							$ 7.659.480,00	$ 9.510.521,00		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	0,00%	
BASE ESTABILIZADA CON 1,5% DE CEMENTO Y CON 4,5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	$0,00	0,00%	14,50%	% P	0,00%	2,38%	5,99%	1,84%	0,61%	0,89%	1,20%	1,80%	0,00%	
				$ P	$0	$ 421.215.768,84	$ 1.058.863.507,39	$ 326.121.440,69	$ 107.502.751,94	$ 157.502.751,94	$ 211.806.666,88	$ 317.710.000,32	$0	
	$2.600.722.888,00	14,71%	$2.563.389.008	$ E		$ 421.215.769,00	$ 1.058.863.507,39	$ 426.121.440,69	$ 657.188.291,40					
				% E	0,00%	2,38%	5,99%	2,41%	3,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	$0,00	0,00%	7,61%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	2,29%	0,00%	2,06%	0,00%	3,21%	1,38%	
				$ P	$0	$0	$0	$ 405.337.711,84	$0	$ 364.784.187,25	$0	$ 568.234.573,14	$ 243.529.102,77	
	$1.581.885.575,00	8,95%	$1.344.535.432	$ E				$ 505.337.711,84		$ 839.197.720,00				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	2,86%	0,00%	4,75%	0,00%	0,00%	0,00%	
MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD-19 CON CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO TIPO III	$0,00	0,00%	9,68%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	8,65%	0,74%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P	$0	$0	$0	$ 1.529.798.196,78	$ 131.331.195,39	$ 49.642.934,83			$0	
	$1.710.772.327,00	9,68%	$1.710.763.012	$ E				$ 1.710.763.011,82						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	9,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO R-50	$0,00	0,00%	0,54%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P	$0	$0	$0	$ 95.432.071,00	$0	$0	$0	$0	$0	
	$95.432.071,00	0,54%	$95.432.071	$ E				$ 95.432.071,40						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
CAPITULO 4. ESTRUCTURA DE ANDENES														
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	$5.850.540,00	0,03%	0,32%	% P	0,01%	0,00%	0,13%	0,00%	0,07%	0,03%	0,23%	0,00%	0,00%	
				$ P	$ 1.579.645,80	$0	$ 23.557.097,02	$ -	$ 11.558.317,58	$ 5.779.158,79	$ 40.737.035,81	$0	$0	
	$83.211.255,00	0,47%	$56.721.687	$ E			$ 4.207.188,32		$ 22.235.952,36	$ 10.586.227,10	$ 19.692.319,59			
				% E	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,13%	0,06%	0,11%	0,00%	0,00%	
LOSETA PREFABRICADA A-40	$8.094.560,00	0,05%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	$0,00	0,00%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
LOSETA PREFABRICADA A-60	$30.156.420,00	0,17%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	$0,00	0,00%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	$57.168.800,00	0,32%	0,41%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,46%	0,07%	0,62%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$ 25.814.571,64	$ 81.715.939,34	$ 12.257.390,90	$ 110.316.518,11	
	$230.104.420,00	1,30%	$73.347.570	$ E								$ 73.347.570,40		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,00%	
SARDINEL PREFABRICADO A-10	$259.437.120,00	1,47%	1,98%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,62%	0,22%	0,28%	0,29%	0,12%	
				$ P	$0	$0	$0	$ 72.511.859,21	$ 109.285.529,60	$ 39.642.764,80	$ 49.007.196,16	$ 51.457.555,97	$ 22.053.238,27	
	$343.958.144,00	1,95%	$350.191.162	$ E				$ 72.511.859,21	$ 31.703.542,40	$ 58.854.697,61	$ 112.031.148,80	$ 75.089.913,60		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,18%	0,33%	0,63%	0,42%	0,00%	
SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	$74.474.400,00	0,42%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	$0,00	0,00%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	$192.559.500,00	1,09%	0,37%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,37%	0,19%	0,50%	0,06%	0,00%	
				$ P	$0	$0	$0	$ 19.954.390,81	$ 65.579.744,40	$ 32.789.877,20	$ 88.532.654,93	$ 9.836.961,66	$0	
	$216.693.624,00	1,23%	$65.524.880	$ E				$ 19.954.390,81	$ 10.121.294,10	$ 17.141.413,30	$ 18.307.732,01			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,06%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	
SUBBASE GRANULAR	$73.493.700,00	0,42%	0,39%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,12%	0,19%	0,00%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$ 33.317.144,00	$ 22.028.511,60	$ 33.042.767,40	$0	
	$88.388.423,00	0,50%	$69.419.699	$ E								$ 69.419.699,23		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,00%	
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	$2.703.600,00	0,02%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	$0,00	0,00%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	$3.225.240,00	0,02%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	$0,00	0,00%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	$4.492.980,00	0,03%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	$0,00	0,00%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TACHAS REFLECTIVAS	$5.363.000,00	0,03%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	$0,00	0,00%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

ANDÉN CONCRETO 3000 PSI E=0.15M	$0,00	0,00%	0,09%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	$0,00	0,00%	$16.360.628	$ E									$ 16.360.627,67		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	0,00%	
ESTAMPADO PARA CONCRETO (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE).	$0,00	0,00%	0,47%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,50%	0,21%	0,00%		
				$ P	$0	$0		$ 14.160.188,37	$0	$0	$ 88.618.422,64	$ 37.979.323,99	$0		
	$140.757.935,00	0,80%	$82.326.799	$ E				$ 14.160.188,37	$ 7.182.300,61	$ 16.696.785,33	$ 27.244.520,72	$ 17.042.954,07			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,04%	0,09%	0,15%	0,10%	0,00%		
REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	$0,00	0,00%	1,36%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,38%	0,19%	0,19%	0,02%	0,00%		
				$ P	$0	$0	$0	$ 90.785.646,05	$ 67.312.212,33	$ 33.656.106,16	$ 33.595.900,62	$ 3.732.877,85	$0		
	$229.082.743,00	1,30%	$240.074.039	$ E				$ 111.652.183,97	$ 35.598.122,67	$ 12.249.338,66	$ 17.756.831,73	$ 62.717.562,17			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,63%	0,20%	0,07%	0,10%	0,35%	0,00%		
GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	$0,00	0,00%	2,18%	% P	0,00%	0,00%	0,10%	0,24%	0,00%	0,81%	0,66%	0,49%	0,00%		
				$ P	$0	$0	$ 17.618.793,99	$ 42.671.911,95	$0	$ 143.036.537,36	$ 117.029.894,21	$ 86.688.810,49	$0		
	$407.045.948,00	2,30%	$385.617.869	$ E			$ 17.618.793,99	$ 42.671.911,95	$ 44.060.853,80	$ 60.630.089,85	$ 173.120.682,48	$ 47.515.536,83			
				% E	0,00%	0,00%	0,10%	0,24%	0,25%	0,34%	0,98%	0,27%	0,00%		
LOSETA DE CONCRETO A20 TIPO PANOT TR. LIVIANO 20X20X6CM COLOR OCRE Y/O TERRACOTA O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	$0,00	0,00%	0,10%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,08%	0,13%	0,01%	0,00%		
				$ P	$0	$0	$0	$ 3.664.245,26	$0	$ 14.651.739,40	$ 23.346.359,40	$ 2.594.039,93	$0		
	$44.256.384,00	0,25%	$17.378.814	$ E				$ 3.664.245,26	$ 1.407.562,50	$ 4.455.098,98	$ 4.055.744,03	$ 3.796.163,32			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	0,03%	0,02%	0,02%	0,00%		
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	$0,00	0,00%	0,28%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,17%	0,08%	0,05%	0,10%	0,10%		
				$ P	$0	$0	$0	$ 6.600.553,92	$ 29.933.917,63	$ 14.966.958,82	$ 8.980.175,33	$ 17.960.350,65	$ 17.960.350,65		
	$96.402.307,00	0,55%	$49.223.632	$ E				$ 6.600.553,92	$ 12.423.551,04	$ 7.689.912,77	$ 15.376.672,98	$ 7.132.941,22			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,07%	0,04%	0,09%	0,04%	0,00%		
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO MEJORADO CON 3% DE CEMENTO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	$0,00	0,00%	0,38%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,11%	0,05%	0,03%	0,06%	0,06%		
				$ P	$0	$0	$0	$ 6.550.403,37	$ 18.644.573,04	$ 9.322.286,52	$ 5.593.371,81	$ 11.186.743,63	$ 11.186.743,63		
	$62.484.127,00	0,35%	$67.060.423	$ E				$ 6.550.403,37	$ 6.764.123,36	$ 27.490.525,44	$ 18.961.979,55	$ 7.293.386,03			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,16%	0,11%	0,04%	0,00%		
CUNETA DE CONCRETO, 3000 PSI ACELERADO A 3 DÍAS FUNDIDA EN EL LUGAR	$0,00	0,00%	4,31%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,67%	2,23%	1,88%	0,40%	0,40%		
				$ P	$0	$0	$0	$0	$ 117.851.426,49	$ 394.419.599,20	$ 331.644.580,62	$ 71.066.695,85	$ 71.066.695,85		
	$986.048.998,00	5,58%	$762.734.955	$ E							$ 527.195.280,58	$ 235.539.674,29			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,98%	1,33%	0,00%		
CAPITULO 5. OBRAS DE ARTE Y MUROS DE CONTENCIÓN															
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	$112.330.368,00	0,64%	0,86%	% P	0,00%	0,07%	0,12%	0,13%	0,00%	0,01%	0,10%	0,00%	0,00%		
				$ P	$0	$ 12.040.411,32	$ 21.630.421,47	$ 22.180.121,96	$ -	$ 2.631.830,48	$ 18.232.420,77	$0	$0		
	$76.715.206,00	0,43%	$152.597.922	$ E	$ 1.579.645,80	$ 12.040.411,00	$ 21.630.421,47	$ 22.180.121,96		$7.310.250	$ 11.974.430,23	$ 75.882.641,40			
				% E	0,01%	0,07%	0,12%	0,13%	0,00%	0,04%	0,07%	0,43%	0,00%		
PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.2M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	$448.550.301,00	2,54%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
	$0,00	0,00%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 psi (bases)	$50.675.900,00	0,29%	0,58%	% P	0,00%	0,08%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				$ P	$0	$ 14.760.508,00	$ 88.397.197,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
	$103.157.705,00	0,58%	$103.157.705	$ E		$ 14.760.508,00	$ 88.397.197,20								
				% E	0,00%	0,08%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 psi (elevaciones)	$20.749.938,00	0,12%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
	$0,00	0,00%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	$52.432.000,00	0,30%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,57%	0,22%	0,14%	0,00%	0,00%		
				$ P	$0	$0	$0	$0	$ 100.000.000,00	$ 39.437.331,84	$ 25.511.977,16	$0	$0		
	$164.949.309,00	0,93%	$0	$ E					$0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
RELLENO PARA ESTRUCTURAS	$16.119.556,00	0,09%	0,04%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%		
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$ 14.903.778,00	$0	$0	$0		
	$14.903.778,00	0,08%	$6.404.686	$ E								$ 6.404.685,57			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%		
CONCRETOS f´c =3000 PSI (BASES)	$27.895.593,00	0,16%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
	$0,00	0,00%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (ELEVACIONES)	$85.094.520,00	0,48%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
	$0,00	0,00%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (BOX-COULVERT)	$61.918.220,00	0,35%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%		
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$ 33.340.580,00	$0	$0	$0		
	$33.340.580,00	0,19%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	$17.880.951,00	0,10%	0,01%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,01%	0,00%	0,00%		
				$ P	$0	$ 438.896,07	$0	$0	$0	$ 11.763.783,55	$ 1.679.440,38	$0	$0		
	$13.882.120,00	0,08%	$2.281.176	$ E		$ 438.896,00						$ 1.842.279,80			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%		
PIEDRA PEGADA PARA DESCOLE DE LAS ESTRUCTURAS	$7.842.160,00	0,04%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,02%		
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$ 5.159.315,79	$0	$0	$ 2.682.844,21		
	$7.842.160,00	0,04%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

INSTITUTO DE INFREASTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CONSORCIO PASCA CNJ

CUNETA DE CONCRETO, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	$679.876.110,00	3,85%	2,35%	% P	0,00%	0,00%	0,57%	0,12%	1,22%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P	$0	$0	$ 100.279.868,64	$ 21.131.887,00	$ 215.888.521,20	$ 11.925.703,20	$0	$0	$0	
	$349.225.980,00	1,98%	$415.404.638	$ E			$ 100.279.868,64	$ 21.131.886,96	$ 60.193.184,35	$ 117.904.635,13		$ 115.895.062,52		
				% E	0,00%	0,00%	0,57%	0,12%	0,34%	0,67%	0,00%	0,66%	0,00%	
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	$870.510.400,00	4,92%	4,49%	% P	0,00%	0,05%	0,30%	0,00%	1,43%	0,57%	0,35%	0,35%	0,00%	
				$ P	$0	$ 9.115.465,60	$ 53.753.843,20	$0	$ 253.208.390,35	$ 101.181.530,40	$ 61.877.327,72	$ 61.877.327,72	$0	
	$541.013.885,00	3,06%	$793.006.717	$ E		$ 9.115.466,00	$ 53.753.843,20		$ 102.912.230,40	$ 105.452.166,40	$ 269.780.179,20	$ 251.992.832,00		
				% E	0,00%	0,05%	0,30%	0,00%	0,58%	0,60%	1,53%	1,43%	0,00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	$118.572.654,00	0,67%	0,24%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,25%	0,33%	0,04%	0,00%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$ 8.008.325,00	$ 45.000.000,00	$ 59.007.896,10	$ 6.556.432,90	$0	
	$118.572.654,00	0,67%	$42.203.826	$ E						$ 23.111.619,00		$ 19.092.207,01		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,11%	0,00%	
TUBERÍA DRENAJE PVC 110	$20.849.850,00	0,12%	0,65%	% P	0,00%	0,10%	0,22%	0,12%	0,00%	0,14%	0,08%	0,00%	0,00%	
				$ P	$0	$ 18.069.870,00	$ 38.939.393,00	$ 21.748.710,20	$0	$ 25.140.285,80	$ 13.899.900,00	$0	$0	
	$116.898.159,00	0,66%	$114.722.361	$ E		$ 18.069.870,00	$ 38.939.393,00	$ 21.748.710,20	$ 23.676.163,00			$ 13.188.225,13		
				% E	0,00%	0,10%	0,22%	0,12%	0,13%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	$234.260.130,00	1,33%	0,67%	% P	0,00%	0,11%	0,23%	0,13%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P	$0	$ 19.067.685,00	$ 40.139.921,50	$ 22.949.670,50	$0	$ 26.528.528,00	$0	$0	$0	
	$108.685.805,00	0,61%	$119.244.972	$ E		$ 19.067.685,00	$ 40.139.921,51	$ 22.949.670,10	$ 21.707.826,00			$ 15.379.869,01		
				% E	0,00%	0,11%	0,23%	0,13%	0,12%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	
MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	$549.942.480,00	3,11%	1,57%	% P	0,00%	0,24%	0,49%	0,27%	0,00%	0,34%	0,13%	0,54%	0,00%	
				$ P	$0	$ 41.565.420,00	$ 87.500.538,00	$ 46.967.219,35	$0	$ 60.889.716,66	$ 23.667.421,20	$ 94.669.684,80	$0	
	$355.260.000,00	2,01%	$277.858.687	$ E		$ 41.565.420,00	$ 87.500.538,00	$ 46.967.219,35	$ 50.830.600,80	$ 1.348.211,70		$ 49.646.696,85		
				% E	0,00%	0,24%	0,49%	0,27%	0,29%	0,01%	0,00%	0,28%	0,00%	
PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO 1.2M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS EN CONCRETO MEZCLADO EN OBRA)	$0,00	0,00%	8,36%	% P	0,00%	5,57%	2,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P	$0	$ 984.850.225,00	$ 492.425.113,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	$1.477.275.338,00	8,36%	$1.477.275.338	$ E		$ 984.850.225,00	$ 492.425.112,56							
				% E	0,00%	5,57%	2,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
GAVIÓN	$0,00	0,00%	0,46%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%	0,00%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 74.615.175,00	$ 74.615.175,00	$0	
	$149.230.350,00	0,84%	$81.348.448	$ E							$ 62.246.963,59	$19.101.485		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,11%	0,00%	
CAPITULO 6. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL														
LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	$130.660.164,00	0,74%	0,64%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%	0,18%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 126.480.000,00	$ 31.620.000,00	
	$158.100.000,00	0,89%	$112.911.858	$ E								$ 112.911.858,00		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%		
MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	$3.192.768,00	0,02%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 31.233.600,00	
	$31.233.600,00	0,18%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	$18.470.172,00	0,10%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,71%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 14.031.753,00	$ 126.285.779,00	
	$140.317.532,00	0,79%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	$47.660.760,00	0,27%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 79.434.600,00	
	$79.434.600,00	0,45%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
DEFENSA METÁLICA.	$147.989.760,00	0,84%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 115.617.000,00	
	$115.617.000,00	0,65%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	$3.979.332,00	0,02%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 7.737.590,00	
	$7.737.590,00	0,04%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

INSTITUTO DE INFREASTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CONSORCIO PASCA CNJ

TOPE DEFENSA METÁLICA	$4.769.964,00	0,03%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$ 9.274.930,00**	
	$9.274.930,00	0,05%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS	$4.089.600,00	0,02%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$ 4.089.600,00**	
	$4.089.600,00	0,02%	$0	$ E										
				% E	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 17.678.836.940	100,00%	88%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 17.678.836.940	100,00%	$ 14.798.280.974,81											

17.678.836.940,00

		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,30%**	**11,27%**	**16,45%**	**21,56%**	**9,41%**	**11,60%**	**9,55%**	**9,16%**	**10,70%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$53.146.352,57**	**$1.991.993.388,02**	**$2.908.365.375,30**	**$3.811.122.288,21**	**$1.663.225.388,95**	**$2.050.385.624,55**	**$1.688.719.800,63**	**$1.619.437.634,32**	**$1.892.441.087,46**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,30%**	**11,57%**	**28,02%**	**49,58%**	**58,98%**	**70,58%**	**80,14%**	**89,30%**	**100,00%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$53.146.353**	**$2.045.139.741**	**$4.953.505.116**	**$8.764.627.404**	**$10.427.852.793**	**$12.478.238.418**	**$14.166.958.218**	**$15.786.395.853**	**$17.678.836.940**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,30%**	**11,31%**	**16,34%**	**24,40%**	**9,33%**	**8,94%**	**10,02%**	**7,85%**	**0,00%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$53.146.353**	**$1.999.841.531**	**$2.889.015.466**	**$4.312.953.641**	**$1.649.132.494**	**$1.579.984.079**	**$1.770.833.763**	**$1.387.457.051**	**$0**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,30%**	**11,61%**	**27,95%**	**52,35%**	**61,68%**	**70,62%**	**80,63%**	**88,48%**	**88,48%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$53.146.353**	**$2.052.987.884**	**$4.942.003.350**	**$9.254.956.991**	**$10.904.089.485**	**$12.484.073.564**	**$14.254.907.327**	**$15.642.364.378**	**$15.642.364.378**	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	$99.419.810
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$84.232.684
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$183.652.494
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$183.652.494
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$17.862.489.434**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$17.862.489.434**

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ VALOR	$ VALOR
CURVAS	- - - - - -	———

Firma:
Nombre: DIEGO F. ESPINOSA RIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Aprueba Firma:
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Revisó Firma:
Nombre: JAISON FONSECA MARIÑO
Supervisor de Contrato de Interventoría

4.9.3.Seguimiento al Programa de Obra

El programa de obra presentado por el contratista esta discriminado en los siguientes capítulos:


i. Sitio Critico 008
ii. Aguadita
iii. Aguabonita
iv. Estructura de pavimento
v. Alcantarillado
vi. Señalización Horizontal y vertical

A continuación, se presenta el formato de seguimiento al programa del Contrato de Obra.

DIAGRAMA DE GANTT
ICCU-708-2023

CONSORCIO PASCA CNJ

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**ICCU - 708 DEL 2023**	**186 días**	**mar 1/08/23**	**jue 29/02/24**
2	INICIO DE OBRA	0 días	mar 1/08/23	mar 1/08/23
3	**CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**180 días**	**mar 1/08/23**	**jue 22/02/24**
4	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	54 días	mar 1/08/23	sáb 30/09/23
5	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	54 días	mar 1/08/23	sáb 30/09/23
6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	180 días	mar 1/08/23	jue 22/02/24
7	**CAPITULO 2. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**	**30 días**	**sáb 30/09/23**	**sáb 4/11/23**
8	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	30 días	sáb 30/09/23	sáb 4/11/23
9	**CAPITULO 3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	**185 días**	**mar 1/08/23**	**mié 28/02/24**
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	75 días	sáb 2/12/23	mar 27/02/24
11	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	49 días	sáb 4/11/23	sáb 30/12/23
12	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	150 días	vie 1/09/23	mar 20/02/24
13	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	150 días	vie 1/09/23	mar 20/02/24
14	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	90 días	sáb 4/11/23	jue 15/02/24
15	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-15 cm)	185 días	mar 1/08/23	mié 28/02/24
16	BASE ESTABILIZADA CON 1,5% DE CEMENTO Y CON 4,5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	150 días	vie 1/09/23	mar 20/02/24
17	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	100 días	sáb 4/11/23	mar 27/02/24
18	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD-19 CON CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO TIPO III	77 días	sáb 4/11/23	mié 31/01/24
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRIO R-50	65 días	vie 10/11/23	mar 23/01/24
20	**CAPITULO 4. ESTRUCTURA DE ANDENES**	**184 días**	**mar 1/08/23**	**mar 27/02/24**
21	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	175 días	mar 1/08/23	vie 16/02/24
22	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	45 días	sáb 30/12/23	mar 20/02/24
23	SARDINEL PREFABRICADO A-10	100 días	sáb 4/11/23	mar 27/02/24
24	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	100 días	sáb 4/11/23	mar 27/02/24
25	SUBBASE GRANULAR	26 días	sáb 30/12/23	lun 29/01/24
26	ESTAMPADO PARA CONCRETO (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE).	100 días	sáb 4/11/23	mar 27/02/24
27	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	100 días	sáb 4/11/23	mar 27/02/24
28	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	125 días	lun 2/10/23	jue 22/02/24
29	LOSETA DE CONCRETO A20 TIPO PANOT TR. LIVIANO 20X20X6CM COLOR OCRE Y/O TERRACOTA O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	95 días	sáb 4/11/23	mié 21/02/24
30	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	90 días	sáb 4/11/23	jue 15/02/24
31	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO MEJORADO CON 3% DE CEMENTO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	92 días	sáb 4/11/23	sáb 17/02/24
32	**CAPITULO 5. OBRAS DE ARTE Y MUROS DE CONTENCIÓN**	**181 días**	**sáb 5/08/23**	**jue 29/02/24**
33	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	181 días	sáb 5/08/23	jue 29/02/24
34	CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 psi (bases)	55 días	vie 1/09/23	vie 3/11/23
35	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	75 días	sáb 2/12/23	mar 27/02/24
36	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	27 días	sáb 30/12/23	mar 30/01/24
37	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI (BOX-COULVERT)	27 días	sáb 30/12/23	mar 30/01/24

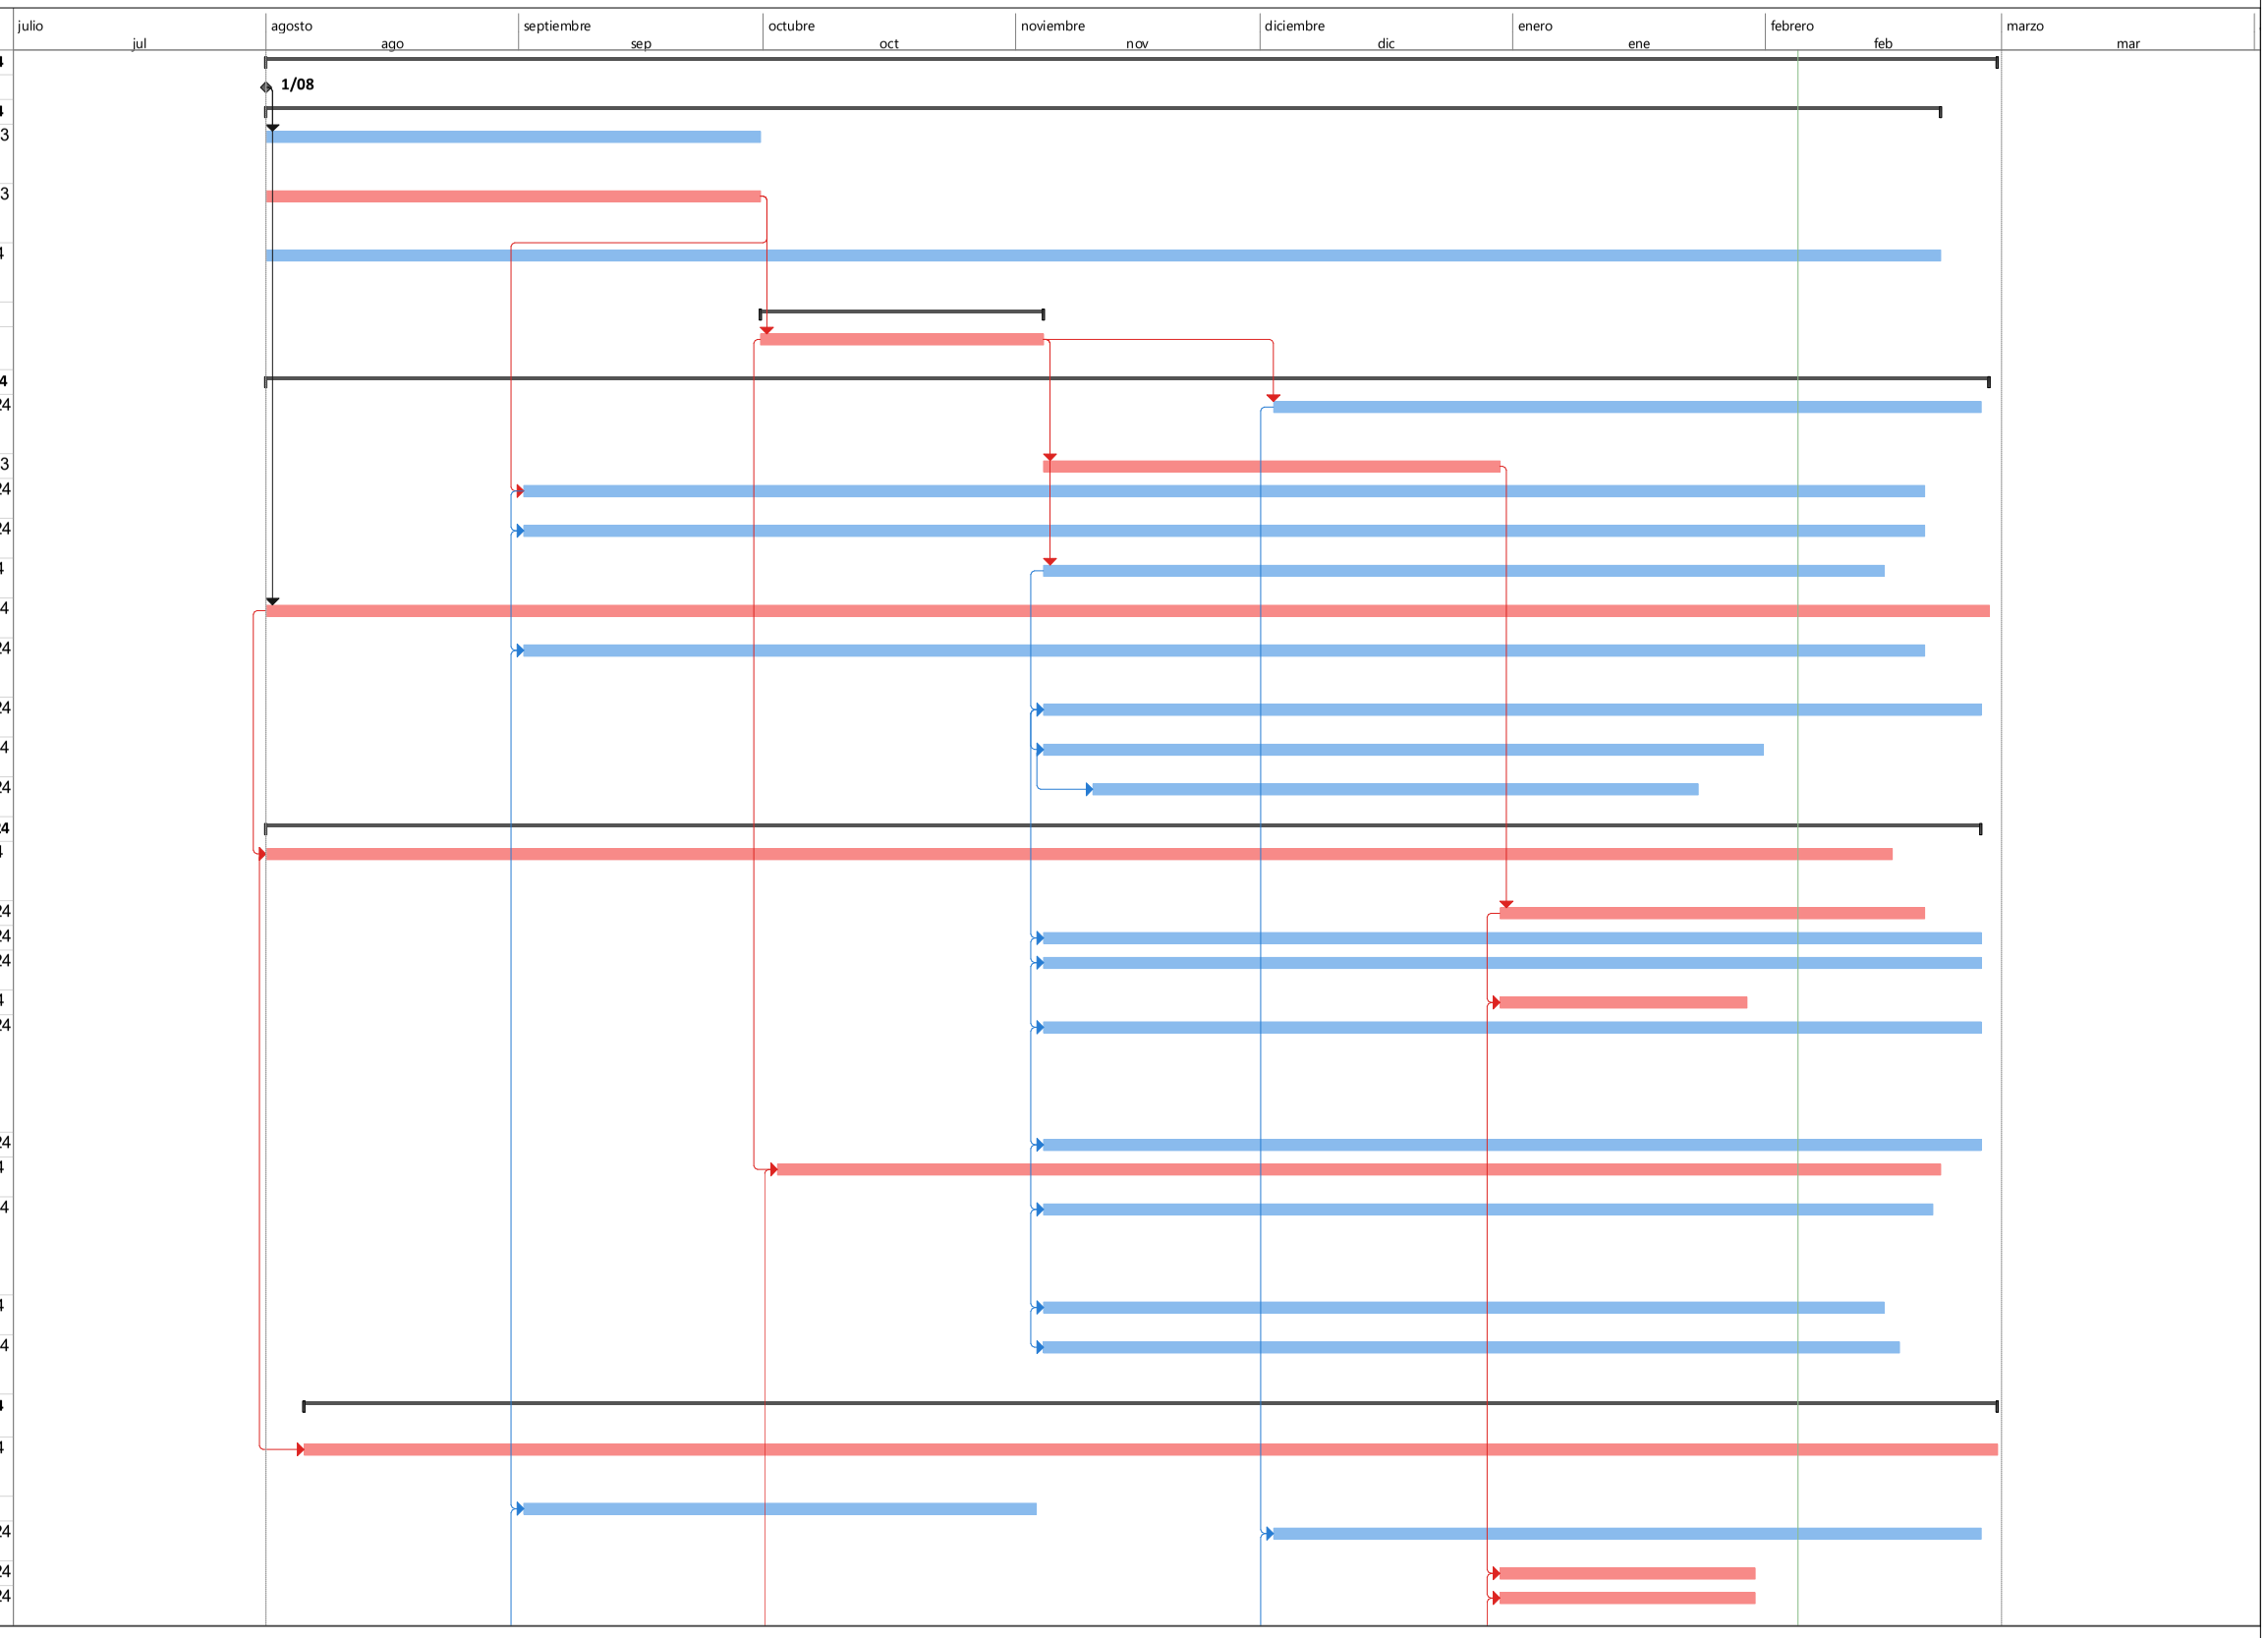


Proyecto: DIAGRAMA_GANNT_ICC
Fecha: lun 5/02/24

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

DIAGRAMA DE GANTT
ICCU-708-2023

CONSORCIO PASCA CNJ

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
38	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	28 días	vie 1/09/23	mar 3/10/23
39	PIEDRA PEGADA PARA DESCOLE DE LAS ESTRUCTURAS	50 días	sáb 30/12/23	lun 26/02/24
40	CUNETA DE CONCRETO, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	131 días	lun 2/10/23	jue 29/02/24
41	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	150 días	vie 1/09/23	mar 20/02/24
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	70 días	sáb 2/12/23	mié 21/02/24
43	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	133 días	vie 1/09/23	mié 31/01/24
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	133 días	vie 1/09/23	mié 31/01/24
45	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	133 días	vie 1/09/23	mié 31/01/24
46	PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO 1.2M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS EN CONCRETO MEZCLADO EN OBRA)	52 días	vie 1/09/23	mar 31/10/23
47	**CAPITULO 6. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL**	**53 días**	**sáb 30/12/23**	**jue 29/02/24**
48	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	53 días	sáb 30/12/23	jue 29/02/24
49	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	53 días	sáb 30/12/23	jue 29/02/24
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	53 días	sáb 30/12/23	jue 29/02/24
51	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	53 días	sáb 30/12/23	jue 29/02/24
52	DEFENSA METÁLICA.	53 días	sáb 30/12/23	jue 29/02/24
53	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	53 días	sáb 30/12/23	jue 29/02/24
54	TOPE DEFENSA METÁLICA	53 días	sáb 30/12/23	jue 29/02/24
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS	53 días	sáb 30/12/23	jue 29/02/24
56	FIN DE OBRA	0 días	jue 29/02/24	jue 29/02/24

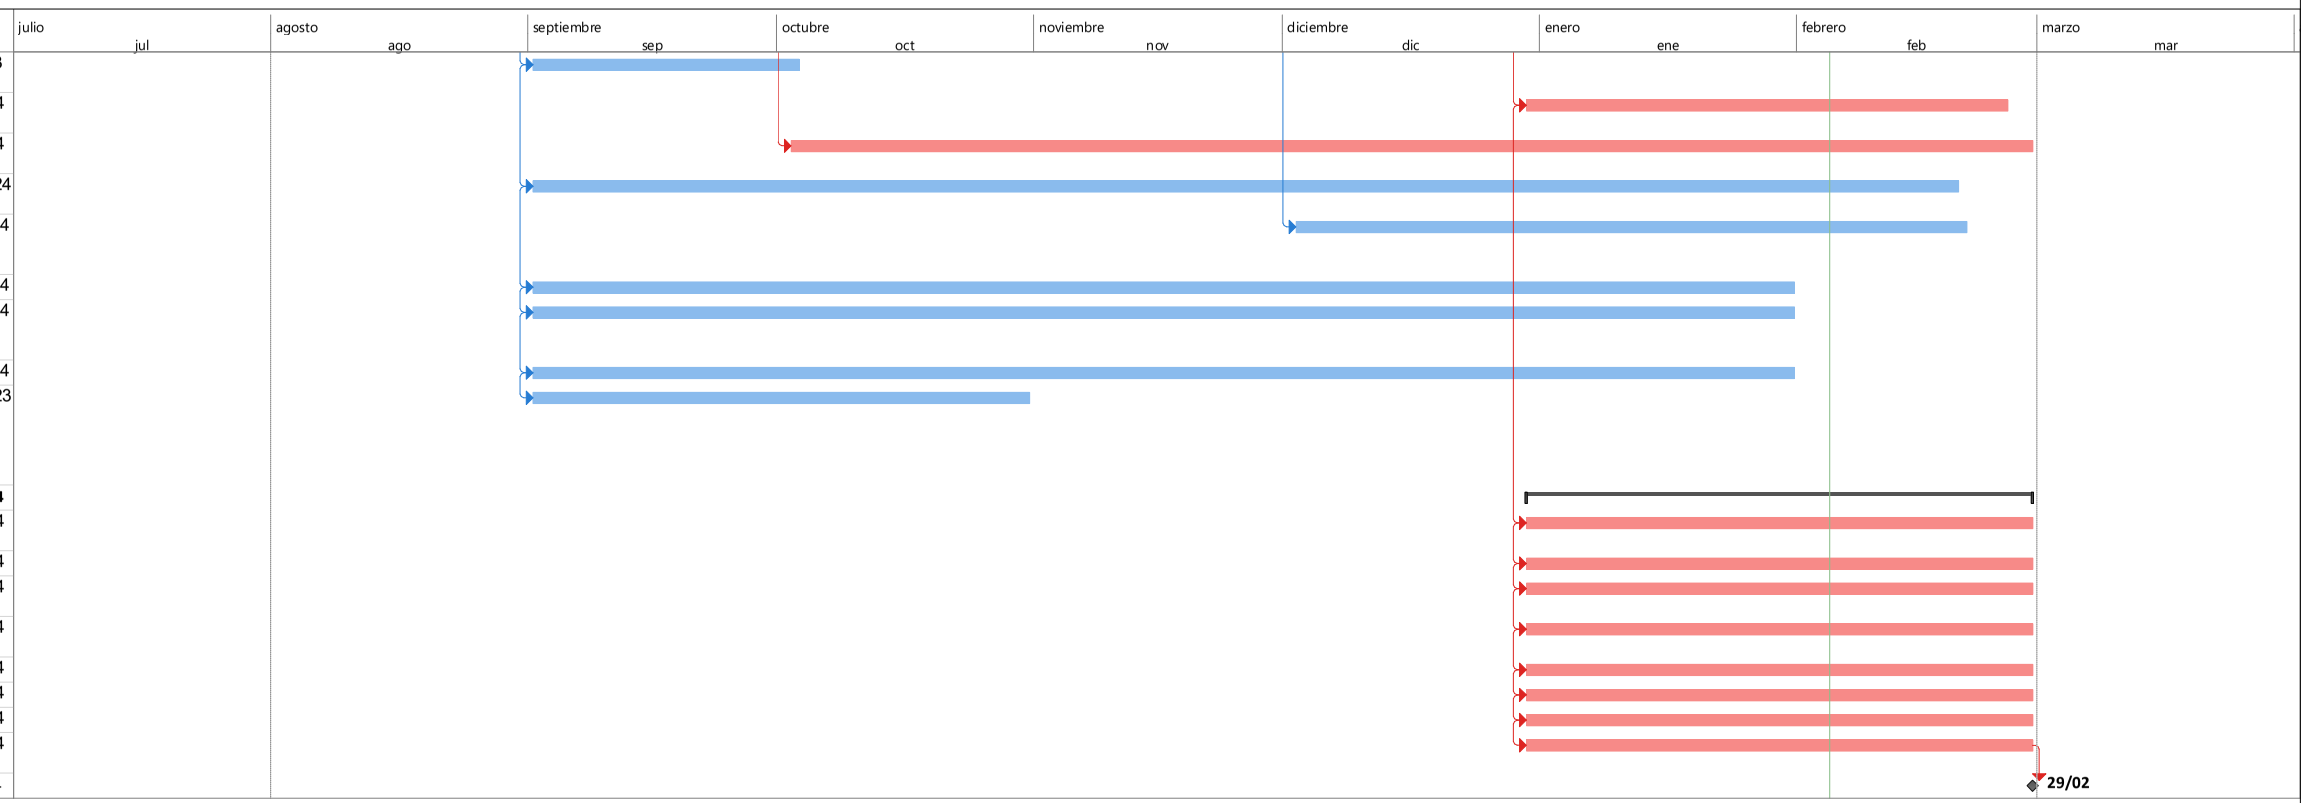

Firma:
Nombre: DIEGO F. ESPINOSA RIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Aprueba Firma:
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado


Revisó Firma:
Nombre: JAISON FONSECA MARIÑO
Supervisor de Contrato de Interventoría


Proyecto: DIAGRAMA_GANNT_ICC
Fecha: lun 5/02/24

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

4.10. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

ESTADO DE AVANCE POR FRENTES DE TRABAJO:

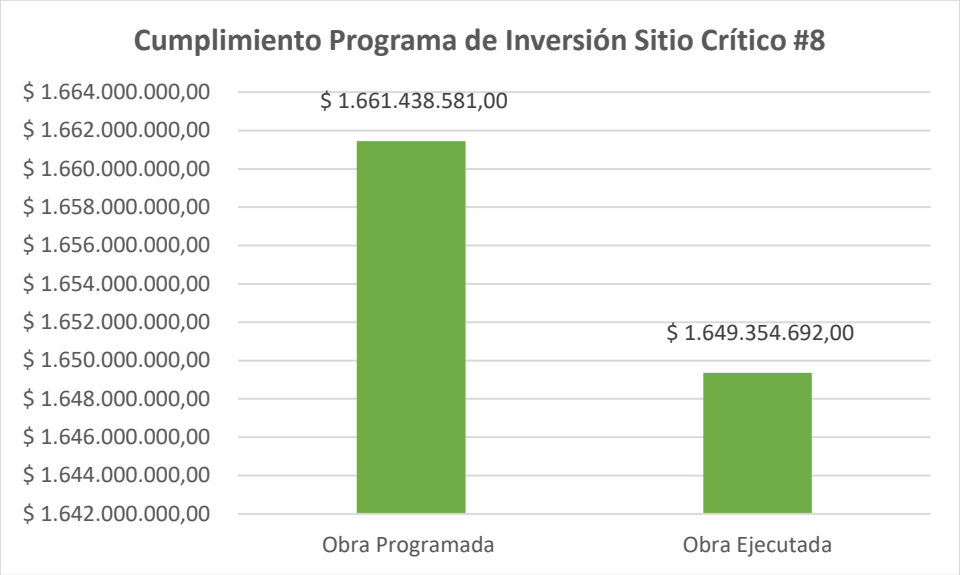Frente de Obra N°1: Sitio Crítico N°8	
Según programa de inversión aprobado, se tiene que el contratista para el sitio crítico #8 tenía programada una inversión acumulada de $1,661,438,581, encontrándose que se cumplió dicha inversión de obra, la cual se ejecutó en $1.649.354.692. El contratista en el periodo de octubre de 2023, terminó todas las obras del sitio crítico, pilotes y viga cabezal. Nota: Los valores reportados incluyen AIU	

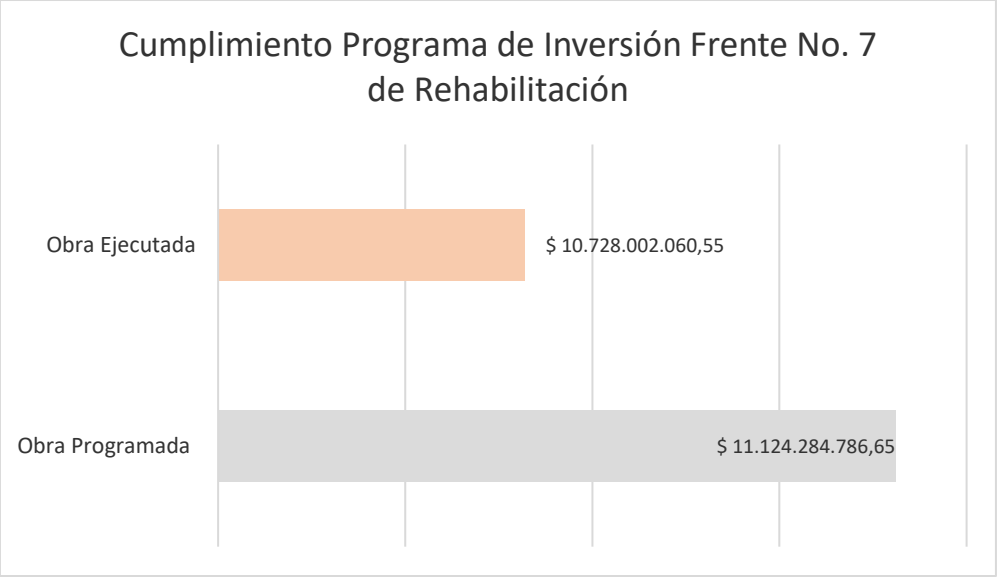Frente de Obra N°1 al #7:	Cumplimiento Programa de Inversión Frente No. 7 de Rehabilitación
Mejoramiento sector: - Tramo No1: K1+340 al K2+100. - Tramo No.2: K7+257,5 al K7+520 - Tramo No.3: K7+986 al K8+305 - Tramo No.4 y 5: K9+780 al K10+240 - Tramo No.6 y 7: K10+270 al K10+910 - Tramo No.7: K7+500 al K8+500 - Tramos de Mantenimiento Vial	

Frente de Obra N°1 al # 7

Incluye Acciones de Movilidad

Tramo #1: El frente ubicado entre el K1+340 al K2+040,se encuentra terminado, se corrigió falló en la carpeta.

Tramo #2: Entre el tramo K7+276 al K7+520 , se completó el 100% hasta la colocación de MDC-19.


Tramo #3: Entre el tramo K7+896 al K8+305, se completó estabilización del 100%, se lleva 100% de MDC-25 y al 100% en MDC-19. El tramo está ejecutándose gaviones, el primer gavión de 20 ml está terminado y el segundo gavión de 37 ml está al 50% su construcción.

Tramo #4: El tramo #4 está terminado, el sector donde se construyó pavimento articulado le falta hacer los remates entre el bordillo y los cortes de adoquín.

Tramos #5 y #6: En el tramo No. 5 está a nivel de MDC-19 a excepción de 60 ml que están en MDC-25, los cuales están en estudio debido a la presencia de fallos. En el tramo #6 la carpeta a nivel de MDC-19 está al 100%.

Tramo #7: Tramo terminado K7+500 al K8+090, K8+140 al K8+190, K8+240 al K8+483 hasta la capa de MDC-19, falta la terminación de cunetas y bordillos.

Nota: Los valores reportados incluyen AIU

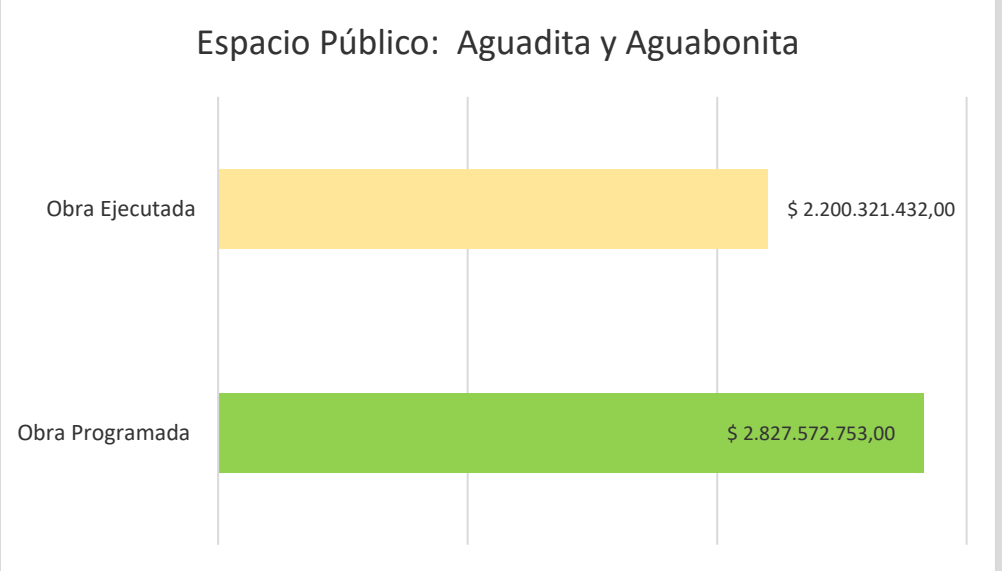Frente de Obra N°3: Espacio Público	

Espacio público de Aguadita: Se llevan las siguientes actividades:

Costado Izquierdo:

- K13+175 al K13+225: Se instaló concreto.
- K12+840 al K12+890: Se instaló concreto.
- K13+250 al K13+340: Se instaló concreto

- K13+090 al K13+170: Excavación e instalación de prefabricado.
- K13+090 al K12+930: Pendiente de ejecutar
- K12+925 al K12+820: Finalizado


Costado Derecho:

-K13+230 al K12+925: Finalizado.

Espacio Público de Aguabonita: Se lleva avance del 85%.

Nota: Los valores reportados incluyen AIU

Frente de Obra: Paso Malo - PASCA

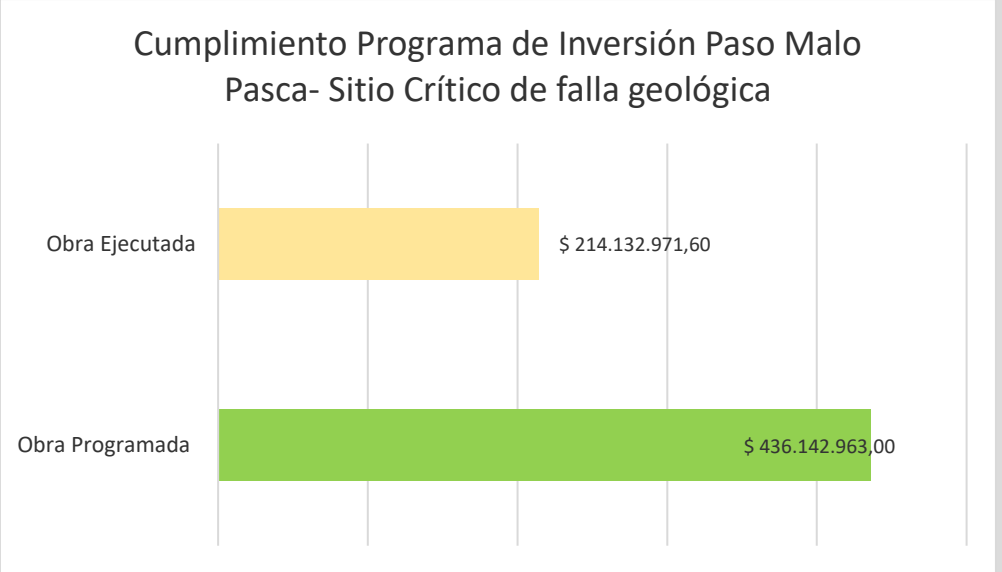

El sector total a intervenir es de 170 ml, afectados por falla geológica. Debido a esta circunstancia su ejecución se está desarrollando mediante pavimento articulado.

En el periodo de marzo de 2024, el tramo se encuentra en la etapa de subbase, los bordillos están terminados al igual que las cunetas, y se inició colocación de adoquín.

Nota: Los valores reportados incluyen AIU

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Frentes de obra	Problemática que genera atrasos	Acciones Correctivas
Mejoramiento y Rehabilitación de las vías	i. Contratista no ha desocupado sitios de acopio de materiales de escombro. ii. Tramo 4 presenta atrasos en ejecución de sector que se está construyendo en articulado. iii. Tramo de Pasca presenta atrasos. iv. Atrasos en ejecución de obras hidráulicas.	i. Contratista debe realizar actividades de movimiento de material de los sitios de acopio. ii. Contratista reniveló subbase del Tramo No.4 para corregir intervención de articulado. iii. Contratista asignó frente de trabajo para Pasca. Se encuentra ejecutado el 50%. El contratista tramitará prórroga de 15 días. iv. Contratista debe implementar frente de trabajo para atención de obras hidráulicas.
Espacio Público	i. Faltan ejecutar remates de espacio público y cierre de actas de vecindad.	i. Se solicitó al contratista colocar mayor personal para la ejecución del Espacio Público de Aguadita. ii. El contratista lleva adelanto significativo en espacio público de Aguabonita. Fecha de terminación aproximada al 10 de abril de 2024. iii. El contratista tramitará prórroga de 15 días hasta el 23 de abril de 2024.

5. Información contrato de interventoría

5.1. Información general del contrato de interventoría

Número del proceso:	ICCU-CM-028 DE 2023
Contrato de Interventoría Nº:	ICCU 815 del 2023
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".
Contratista:	COPEBA SAS
NIT:	830.011.122-9
Dirección correspondencia:	Carrera 21 N° 100 – 20Off. 602 Bogotá)
Teléfono:	6012564013
Correo electrónico:	Interventoriaiccu815@gmail.com
Valor inicial del contrato incluido IVA:	$ 1.032.790.821,oo
Valor actualizado del contrato incluido IVA:	$ 1.032.790.821,oo
Fecha de inicio del contrato:	01 de agosto del 2023
Plazo inicial del contrato:	Seis (6) meses y Quince (15) días.
Plazo inicial del contrato:	Cinco (05) meses.
Plazo actual del contrato:	Nueve (09) Meses Ocho (08) Días.
Fecha inicial del contrato:	31 de diciembre del 2023.
Fecha Actual del contrato:	08 de mayo del 2024.

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas, tanto en campo como en oficina, por el personal profesional y técnico de la Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales:

- ✓ Recorridos de inspección y seguimiento a la obra.
- ✓ Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.
- ✓ Control de permanencia del personal calificado y no calificado, en obra.

- ✓ Control implementación del Plan de manejo de Transito PMT.
- ✓ Registro fotográfico de las actividades realizadas por el contratista de obra.
- ✓ Registro de cantidades de obra.
- ✓ Correspondencia con el Contratista.
- ✓ Diligenciamiento de bitácora de obra.
- ✓ Presentación de informe semanal.
- ✓ Elaboración del Informe Mensual.
- ✓ Actividades de topografía.
- ✓ Control calidad a muestras.
- ✓ Comités de obra con el contratista de obra, interventoría e ICCU.
- ✓ Comunicación constante con el Contratista y el ICCU, para tratar temas relacionados con el desarrollo de las obras.

5.3. Informes especialistas y profesionales

A continuación, se anexan los informes presentados por los especialistas de la interventoría para el periodo comprendido entre el 01 al 22 de marzo del 2024.

INFORME DEL ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS DE INTERVENTORÍA

Bogotá, 26 de marzo de 2024

Señores
COPEBA S.A.S
Atención: Ing. Andrea Peña
Directora de Interventoría
Dirección: Cr 21 No. 100 – 20. Of. 602.
Bogotá D.C.

Referencia: MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ - FUSAGASUGÁ - PASCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Asunto: Análisis ensayos de laboratorio material de mezcla MDC-19 y concreto.

Respetada Ing. Peña,

De acuerdo con los ensayos de laboratorio realizados, los cuales fueron ejecutados en los materiales siguientes:

i. Mezcla asfáltica MDC-19 en las abscisas siguientes:
   a. PR10+150 a PR10+240
   b. PR08+100 a PR08+240

Cuya evaluación correspondió a los ensayos enunciados seguidamente, así:

- ✓ Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos.
- ✓ Flujo
- ✓ Relación Estabilidad/Flujo

De acuerdo con la información relacionada anteriormente, se procedió a determinar si los materiales evaluados cumplen las especificaciones del INVIAS, tal y como se puede observar en la tabla que se presenta a continuación.

Tabla 1 Evaluación de ensayos ejecutados.

CARACTERÍSTICA	NORMA	MEZCLA DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS			RESULTADO	CUMPLE	RESULTADO	CUMPLE
	ENSAYO	CATEGORÍA DE TRÁNSITO						
	INV	NT1	NT2	NT3				
Estabilidad mínima (N)	E-748 (E-800)	5000	7,500 (16,875)	9,000 (33,750)	15916	OK	15681	OK
Flujo (mm)(Nota 2)		2.0 a 4.0	2.0 A 4.0 (3.0 A 6.0)	2.0 A 3.5 (3.0 a 5.3)	3,2	OK	3,2	OK
Relación Estabilidad / Flujo (kN/mm)		2.0 a 4.0	3.0 A 5.0 (4.5 A 7.5)	3.0 A 6.0 (4.5 A 9.0)	5,07	NO	4,99	NO

Ilustración 1 Gradación del material granular estabilizado con cemento.

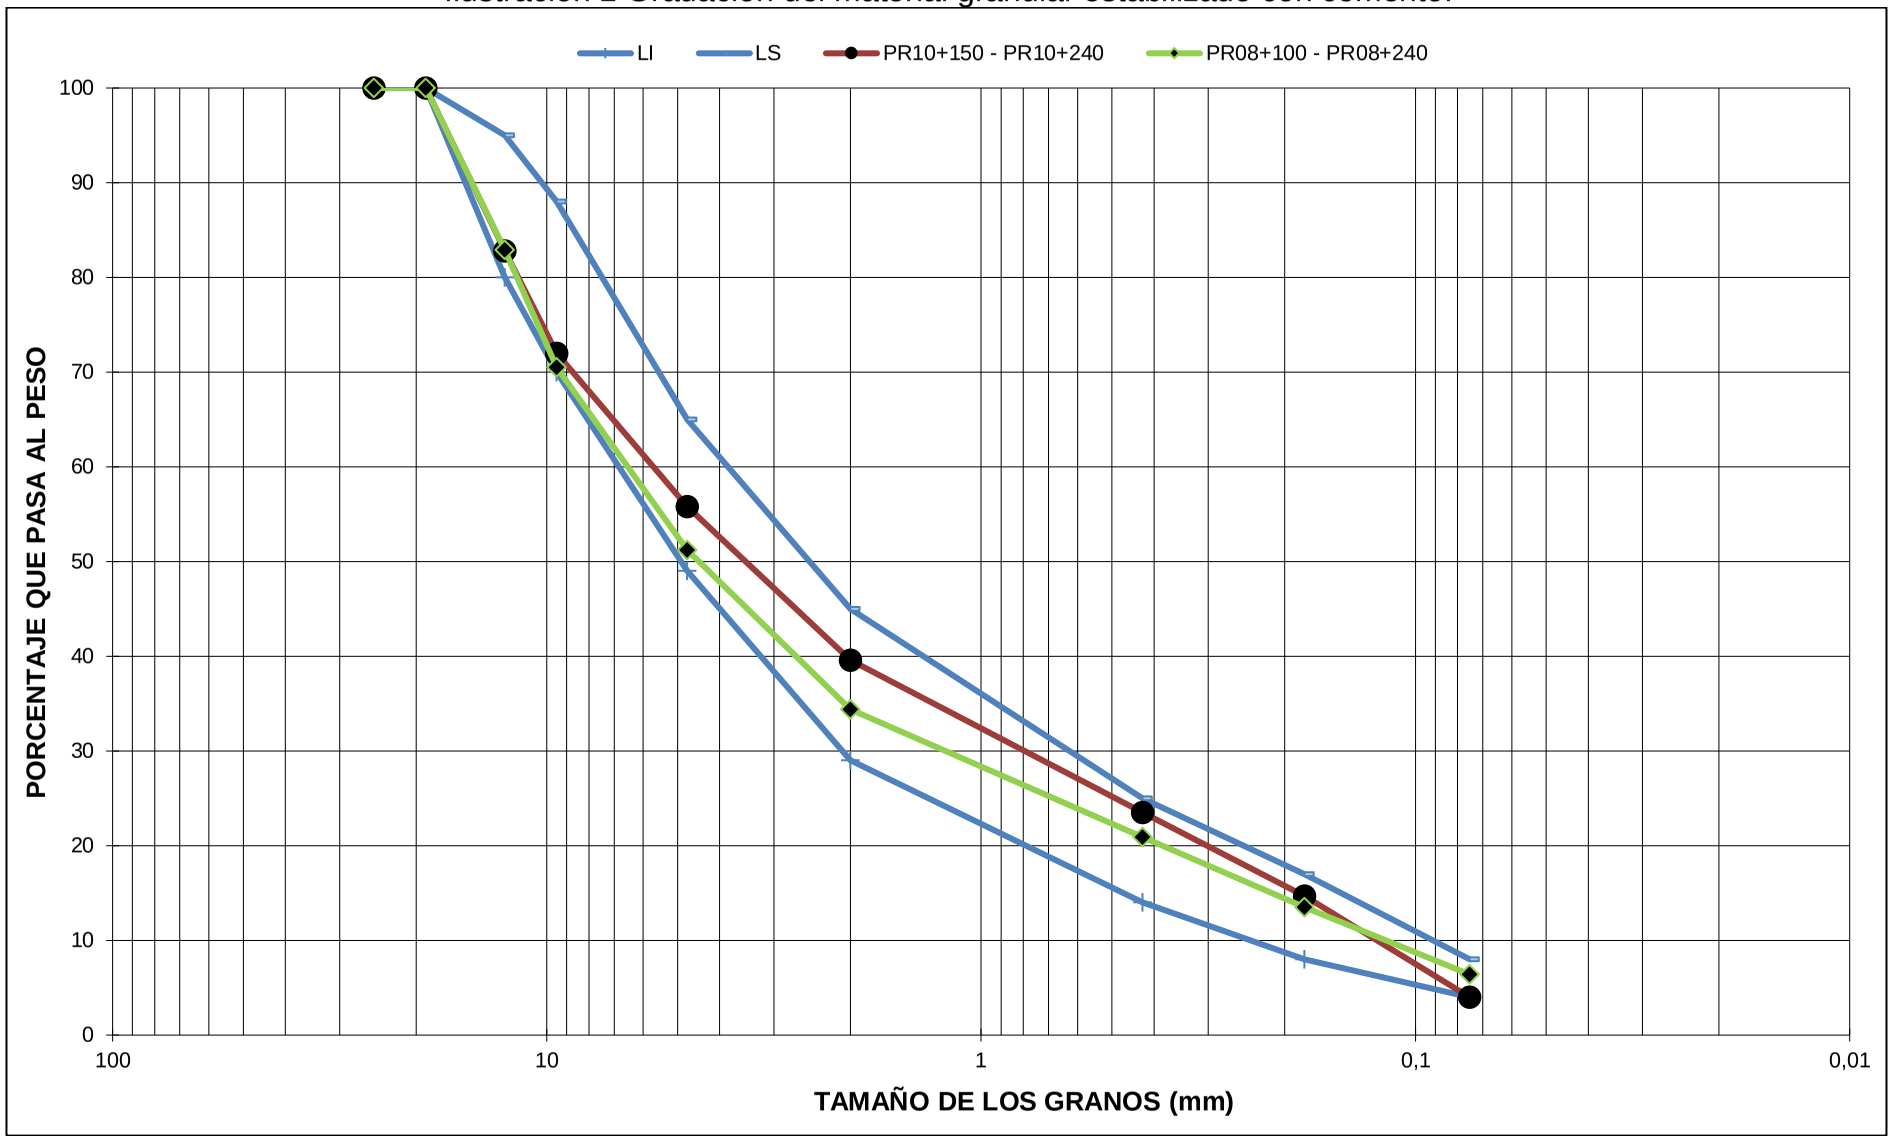


Tabla 2 Relación cilindros de concreto, edad del cilindro y resistencia del concreto.

Elemento	No. Cilindro	Días de Curado	Resistencia
Anden PR13+030 - PR13+073	1	7	78,94%
	2	7	78,77%
Cuneta Aguadita	5	7	78,54%
	6	7	78,50%
	7	14	92,17%
Cuneta	9	7	78,32%
	10	7	79,78%
	11	14	89,35%
Cuneta PR10+580	9	7	Pendiente
	10	7	Pendiente
	11	14	Pendiente
	12	28	Pendiente
Cuneta Agua Bonita	13	7	80,62%
	14	7	79,76%

Ilustración 2 Curva de resistencia del concreto.



Con base en la tabla presentada, la ilustración 1 y 2, se puede señalar que los materiales empleados en el proyecto cumplen los parámetros evaluados para ser empleado, no obstante, se recomienda para la resistencia de los concretos evaluar

la misma a las edades de 14 y 28 días, lo anterior con el fin de verificar y garantizar que la resistencia de diseño es alcanzada.

Finalmente, y partiendo de la información anteriormente mostrada, se puede establecer que los materiales empleados cumplen los requisitos del proyecto, sin embargo, con el fin de dar cumplimiento a cabalidad de las especificaciones INVIAS 2013 se debe continuar realizando el seguimiento a la calidad de los mismos.

Sin otro particular, suscribimos cordialmente.

Atentamente,



NICOLÁS ORTEGA R.
Especialista en Pavimentos

INFORME DEL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA DE INTERVENTORÍA

Bogotá, 04 de marzo de 2024

Señores
COPEBA S.A.S
Atención: Ing. Andrea Peña
Directora de Interventoría
Dirección: Cr 21 No. 100 – 20. Of. 602.
Bogotá D.C.

Referencia: MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ - FUSAGASUGÁ - PASCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Asunto: Respuesta oficio – ODR-063-24 – Concepto geotécnico para construcción de gavión K10+530.

Respetada Ing. Peña,


Con base en el oficio señalado en el asunto del presente documento, mediante el cual el consultor del contratista realiza la presentación los análisis de estabilidad y las recomendaciones constructivas para la construcción de un muro de contención de tipo gavión, esta interventoría se permite precisar lo siguiente:

i. Presentan el perfil con dimensiones geométricas.

El consultor de manera inicial presenta la sección transversal de análisis del muro tipo gavión, con dimensiones geométricas, en el cual contemplan las recomendaciones realizadas previamente por interventoría, en cuanto a profundizar dicho elemento, con el fin de evitar que las superficies de falla se generen a nivel de la rasante de la vía.

La sección de análisis se presenta en la figura siguiente.

Figura 1 Sección transversal de análisis.

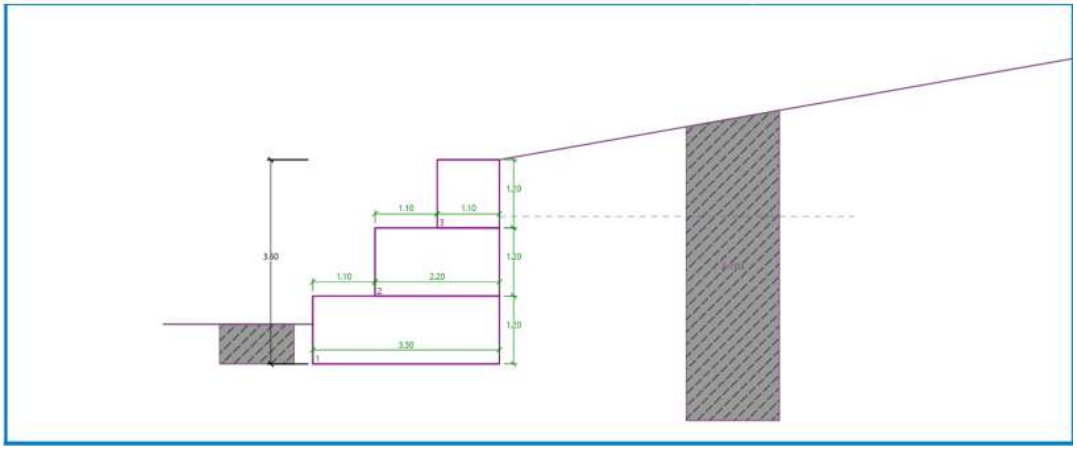

Fuente: Oficio ODR-063-24.

ii. Parámetros de diseño (Ver Tabla 1).

Posteriormente el consultor del contratista presenta lo parámetros de diseño empleados para la modelación, los cuales corresponden de manera general a dichos materiales tanto estructural como el suelo de apoyo, tal y como se muestra en la tabla siguiente.

Tabla 1 Parámetros de diseño.

Soil parameters

Arcilla

Unit weight :	γ =	17.00 kN/m³
Stress-state :		effective
Angle of internal friction :	φ_{ef} =	25.00 °
Cohesion of soil :	c_{ef} =	2.00 kPa
Angle of friction struc.-soil :	δ =	17.00 °
Soil :		cohesive
Poisson's ratio :	ν =	0.32
Saturated unit weight :	γ_{sat} =	19.00 kN/m³

Fuente: Oficio ODR-063-24.

iii. Análisis Gavión

Con base en los puntos anteriores, el consultor realiza la evaluación del muro, obteniendo factores adecuados para la implementación de este, cuyos resultados se puede observar en la

Tabla 2 Resultados comportamiento gavión.

Verification of complete wall

Check for overturning stability
Resisting moment M_{res} = 267.97 kNm/m
Overturning moment M_{ovr} = 74.11 kNm/m

CDR CDR = 3.62
Wall for overturning is SATISFACTORY

Check for slip
Resisting horizontal force H_{res} = 69.94 kN/m
Active horizontal force H_{act} = 59.39 kN/m

CDR CDR = 1.18
Wall for slip is SATISFACTORY

Overall check - WALL is SATISFACTORY

Maximum stress in footing bottom : 55.65 kPa

Verification of construction joint above the block No.: 1

Check for overturning stability
Resisting moment M_{res} = 84.58 kNm/m
Overturning moment M_{ovr} = 19.24 kNm/m

CDR CDR = 4.40
Joint for overturning stability is SATISFACTORY

Check for slip
Resisting horizontal force H_{res} = 40.10 kN/m
Active horizontal force H_{act} = 27.96 kN/m

CDR CDR = 1.43
Joint for slip is SATISFACTORY

Maximum pressure on the bottom block = 42.91 kPa
Red.Coeff. by offset of top block = 0.00
Average value of pressure on face = 4.50 kPa
Shear force transferred by friction = 54.50 kN/m

Bearing capacity against transverse pressure:
Joint bear.capacity = 26.00 kN/m
Computed stress-state = 2.45 kN/m

Transverse pressure check is SATISFACTORY

Joint btw. blocks check:
Mesh material bear.capacity = 26.00 kN/m
Computed stress-state = 2.45 kN/m


Joint between blocks is SATISFACTORY

Fuente: Oficio ODR-063-24.

iv. Análisis de Estabilidad Muro Gavión


Con base en los puntos anteriores, el consultor realiza la modelación del muro en gaviones para las condiciones estática y pseudoestática, en donde se obtienen factores de seguridad adecuados, toda vez que son superiores a los mínimos exigidos en la normativa actual 1.50 y 1.05 respectivamente, cuyos resultados se puede observar en la Figura 2 y Figura 3, siendo estas incluidas seguidamente.

Figura 2 Análisis de estabilidad condición estática.

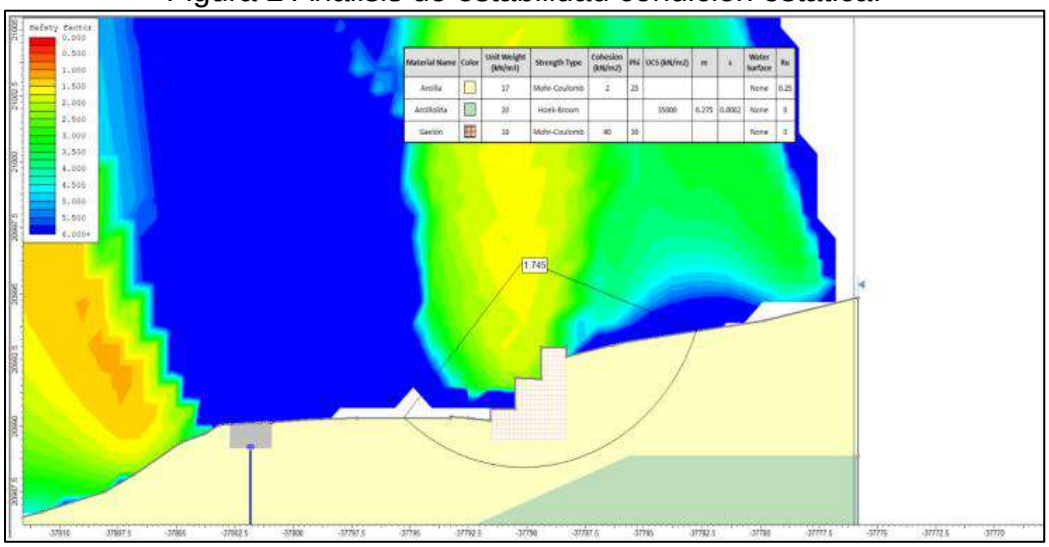

Fuente: Oficio ODR-063-24.

Figura 3 Análisis de estabilidad condición Pseudoestática.

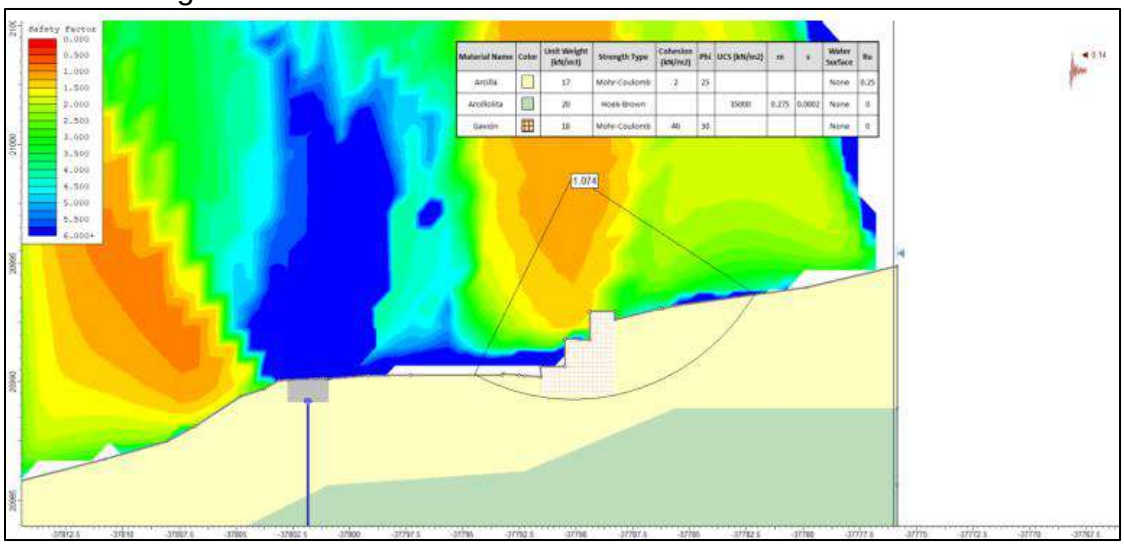

Fuente: Oficio ODR-063-24.


v. Proyección Muro en Gavión

Teniendo en cuenta los parámetros de diseño y los análisis de estabilidad realizados el contratista procede a proyectar las obras respectivas (muro en gaviones)

considerando las recomendaciones efectuadas desde interventoría, las cuales estaban en caminada a facilitar el proceso constructivo, en el sentido de realizar el escalonamiento de los gaviones según la pendiente o rasante del corredor, debido que se tiene que garantizar la estabilidad de la zona, con un muro de gaviones de tres (3) escalones. Además de esto, también se incluyo la obra de drenaje (Filtro) en espaldar del muro, con el fin de evitar la pérdida de materiales finos.


Con base en lo señalado anteriormente se presenta la implantación del muro de gaviones en el perfil del corredor, así:

Figura 4 Análisis de estabilidad condición Pseudoestática.

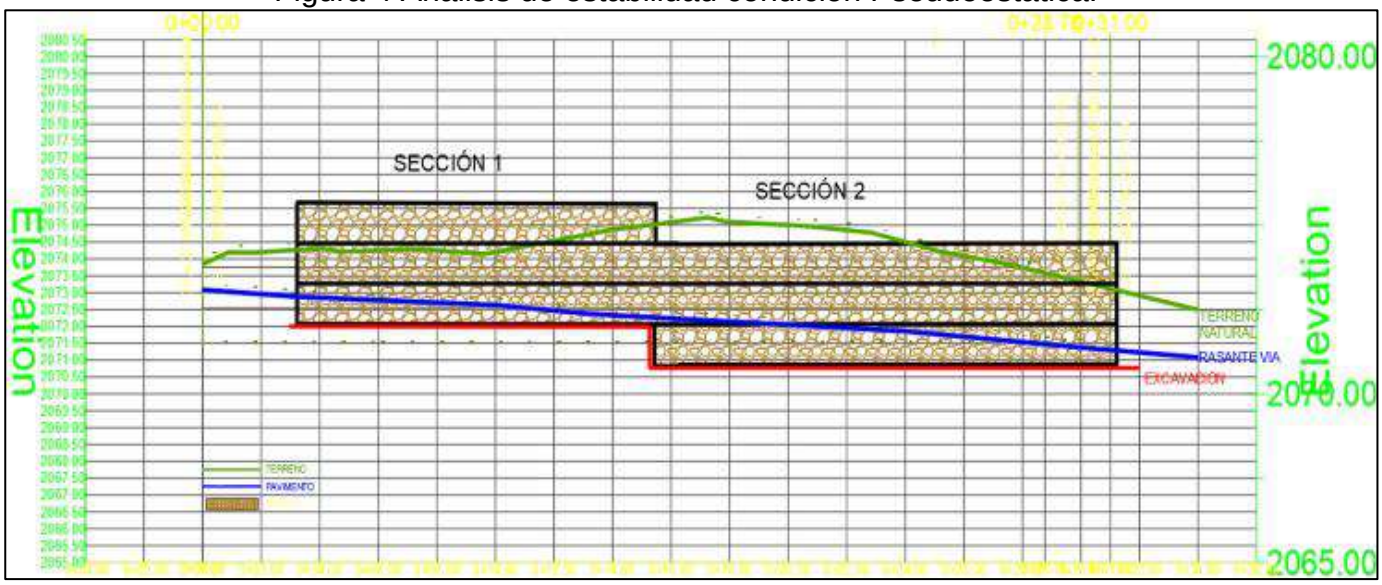


Fuente: Oficio ODR-063-24.

Figura 5 Análisis de estabilidad condición Pseudoestática.

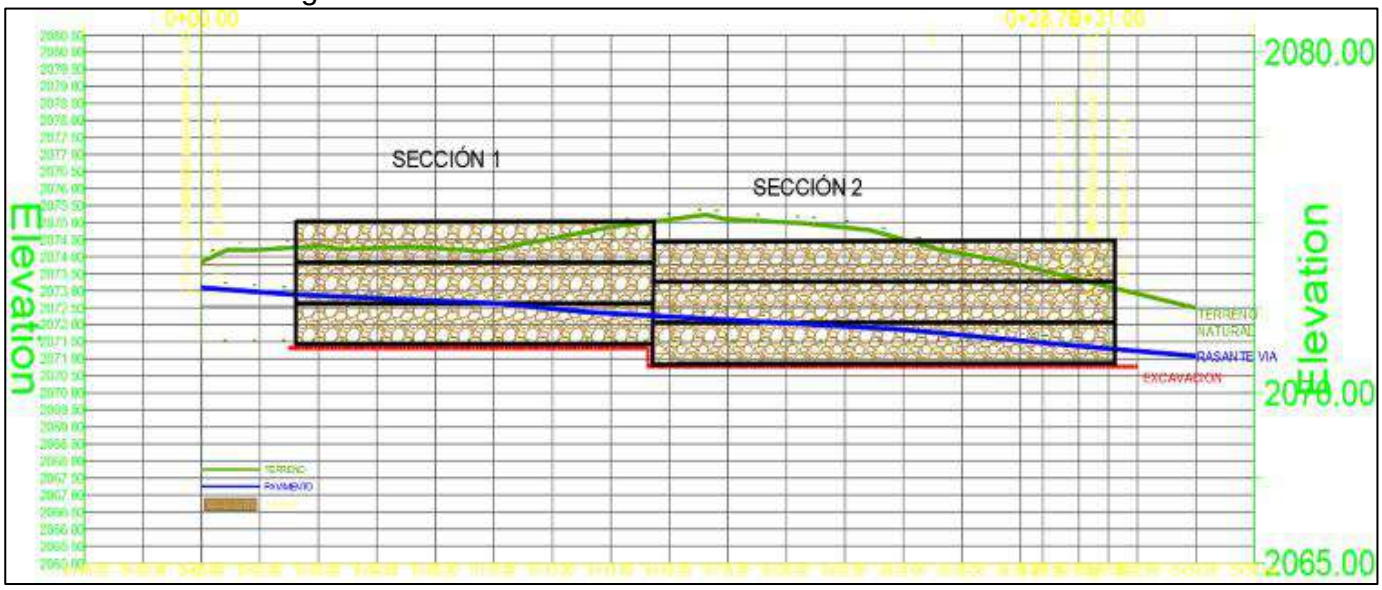

Fuente: Oficio ODR-063-24.

Figura 6 Análisis de estabilidad condición Pseudoestática.

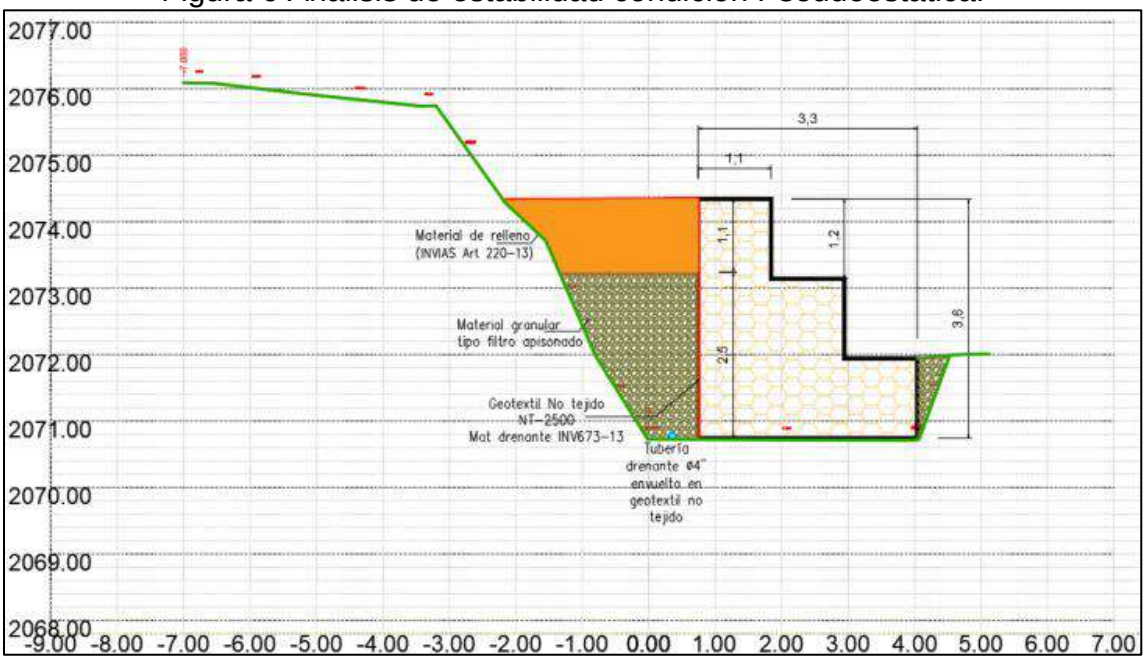

Fuente: Oficio ODR-063-24.

Finalmente, de acuerdo con lo presentado esta interventoría manifiesta estar de acuerdo con la obra proyectada, su disposición, y las obras adicionales para el control y encauzamiento del agua de escorrentía e infiltración.

Sin otro particular, suscribimos cordialmente.

Atentamente,

NICOLAS ORTEGA R.
Especialista en Pavimento

INFORME DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA

Gmail Licitaciones Copeba <licitacionescopeba@gmail.com>

RV: Informe mensual ambiental mes de marzo 2024 Proyecto Sibaté-Fusagasugá-Pasca

1 mensaje

Perla Rocio Lombo Cortes <perla.lombo@cundinamarca.gov.co>
Para: Licitaciones Copeba <licitacionescopeba@gmail.com>
CC: Jaison Fonseca Marin <jaison.fonseca@cundinamarca.gov.co>

Buenos Días,

Respecto al informe correspondiente al mes de marzo , se informa que no se presentan observaciones al componente ambiental.

Quedo atenta.

Cordialmente,

Perla Lombo

Apoyo Ambiental Plan 500

De: Andres Felipe Tolosa Remolina
Enviado el: martes, 14 de mayo de 2024 4:45 p. m.
Para: Perla Rocio Lombo Cortes <perla.lombo@cundinamarca.gov.co>
Asunto: Re: informe mensual ambiental mes de marzo 2024 Proyecto Sibaté-Fusagasugá-Pasca

Inge Perla

Luego de la revisión al informe mensual ambiental IMA # 8 y sus correspondientes anexos, período del 01 al 31 de Marzo del 2023, se da el Vo. Bo. desde el componente ambiental al informe del período en m

Muy respetuosamente,

Andrés Tolosa

De: Perla Rocio Lombo Cortes
Enviado: martes, 14 de mayo de 2024 10:08 a. m.
Para: Andres Felipe Tolosa Remolina
Asunto: RV: informe mensual ambiental mes de marzo 2024 Proyecto Sibaté

Buenos días Andres,

Te envió el informe del proyecto sibate, para tu revisión.

Quedo atenta.

Cordialmente,

Perla.

De: Licitaciones Copeba [mailto:licitacionescopeba@gmail.com]
Enviado el: viernes, 10 de mayo de 2024 4:57 p. m.
Para: John Cano <john_cano25@hotmail.com>
CC: Perla Rocio Lombo Cortes <perla.lombo@cundinamarca.gov.co>; Andres Felipe Tolosa Remolina <andres.tolosa@cundinamarca.gov.co>
Asunto: Re: informe mensual ambiental mes de marzo 2024 Proyecto Sibaté


Buenas tardes,

Remito copia de comunicación reenviando informe ambiental mensual del mes de marzo de 2024 para su revisión y aprobación.

Gracias

El lun, 15 abr 2024 a la(s) 6:10 p.m., John Cano (john_cano25@hotmail.com) escribió:

> Ing. Perla buenas tardes.
>
> Envío informe del asunto para revisión y concepto.



Marzo

Saludos,

John Cano.

--

Cordialmente,

Ing. Alejandro Correa Santana

Área Licitaciones y Propuestas

COPEBA LTDA.

Tel: +57 (1) 256 40 13 - 218 32 92

Cel: 310 201 50 21

Cra. 21 No. 100 - 20 Oficina 602

Bogotá D.C. - Colombia

Email: licitacionescopeba@gmail.com

IMPORTANTE: El contenido del presente mensaje tiene carácter formal y por lo tanto sus efectos son equivalentes a los de la comunicación impresa.

Aviso Legal: Las opiniones y los archivos anexos contenidos en este mensaje son responsabilidad exclusiva de su autor, y no necesariamente representan la opinión oficial de la Gobernación de Cundinamarca. Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si este mensaje le ha llegado por error, por favor elimínelo de su sistema, y notifique de ello al remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. La Gobernación de Cundinamarca no es responsable por eventuales daños derivados del recibo y uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

INFORME MENSUAL AMBIENTAL N° 8 DE INTERVENTORÍA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N. ICCU-815 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL N"MEJORAMIENTO, NREHABILITACIÓN, NMANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DELNPLANN500".

PERIODO DEL 01 AL 22 DE MARZO DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO PASCA CNJ

INITERVENTORIA: COPEBA SAS

MARZO 2024

Hoja de control del documento

Control de Modificaciones		
Versión	**Descripción de Modificaciones**	**Fecha**
0	Informe mensual Ambiental de interventoría	Marzo 2024

Fecha	Elaboró
1 al 22 de marzo de 2024	JOHN OSWALDO CANO GARCIA
Cargo	Especialista Ambiental – Interventoría

CONTENIDO

1. OBJETIVOS 6
1.1. Objetivo general 6
1.2. Objetivos específicos 6
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 7
2.1. Información general del contrato 7
3. LOCALIZACIÓN 8
4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR 8
5. DEMANDA DE RECURSOS AMBIENTALES 9
6. SEGUIMIENTO PLAN DE IMPLEMENTACION PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA). 12
6.1. PROGRAMA 1 GESTIÓN DEL PROYECTO 12
6.1.1. Subprograma Conformación del grupo de gestión ambiental social 12
6.1.2. Subprograma Capacitación y concientización del personal de obra. 13
6.1.3. Subprograma cumplimiento de requisitos legales 13
6.2. PROGRAMA 2 MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 15
6.2.1. Subprograma manejo integral de materiales de construcción 15
6.2.2. Subprograma 2. Manejo integral de explotación de materiales de construcción. 17
6.2.3. Subprograma 2.3: Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales 19
6.2.4. Subprograma Seguimiento manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición. 19
6.3. PROGRAMA 3: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 25
6.4. Programa 4: Programa de biodiversidad y servicios ecosistémicos 27
PBSE-4.2-15. Subprograma 4. Protocolo de fauna en obra 27
6.5. Programa 5: Manejo de instalación temporales, de maquinaria y equipos . 27
Subprograma 1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio ... 27
7. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR INTERVENTORIA 30
8. EVALUACIÓN DESEMPEÑO AMBIENTAL DEL PERIODO 31

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 32

1.1. Conclusiones 32

1.2. Recomendaciones 32

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Datos de supervisor. 7
Tabla 2. Datos de interventoría. 7
Tabla 3. Datos del Contratista. 7
Tabla 4. Datos proveedor de agregado. 9
Tabla 5. Datos del proveedor de mezcla asfáltica. 9
Tabla 6. Disposición final material RCD. 10
Tabla 7. Residuos a generar. 11

INTRODUCCIÓN

El presente informe relaciona las actividades de seguimiento realizado por la Interventoría Ambiental establecido en el contrato de Interventoría **No. ICCU-815 DE 2023**, cuyo objeto es la "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGALNALN"MEJORAMIENTO,NREHABILITACIÓN,NMANTENIMIENTONDENLANVÍAN SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCONDELN PLANN 500"."**; para el periodo comprendido entre el **1 y el 31 de marzo de 2024**, teniendo en cuenta la gestión desarrollada y los compromisos adquiridos por el contratista **CONSORCIO PASCA CNJ**, enmarcados en el Plan de Adaptación a la Guía de Manejo Ambiental según contrato de obra No. **ICCU-708 DE 2023**, la Guía de manejo Ambiental Sector Construcción y las normas técnicas relacionadas con la gestión ambiental establecidas por el Instituto de infraestructura y concesiones de Cundinamarca.

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo general

Presentar los registros de supervisión, seguimiento y control del cumplimiento a los compromisos establecidos en los aspectos ambientales, por el contratista CONSORCIO PASCA CNJ, según contrato de Obra No. ICCU- 708 DE 2023, para el periodo comprendido entre 1 y el 31 de marzo de 2024.

1.2. Objetivos específicos

- Realizar recorrido de obra en el área de influencia directa para la ejecución del contrato de obra ICCU 708 DE 2023 **"REHABILITACIÓN,NMANTENIMIENTONDENLANVÍAN SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN ELNMARCONDELN PLANN 500".**

- Revisar en campo las áreas sensibles y las más vulnerables desde el punto de vista ambiental.

- Verificar in situ manejo y disposición de escombros, estado de drenajes y fuentes de agua, estado de campamentos y fuentes de materiales para la ejecución de la obra.

- Hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para el desarrollo del presente contrato en materia ambiental.
- Verificar en campo las necesidades mínimas que debe cumplir el PAGA para su implementación durante la ejecución del presente contrato.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. Información general del contrato

Descripción de la supervisión, interventoría y contratante:

Tabla 1. Datos de supervisor.

DATOS DE LA SUPERVISIÓN	
Fecha de oficio designación de Supervisor/Gestor	Enero de 2024
Persona designada:	Ing. Mauricio Delgadillo Diaz Subgerente de infraestructura Instituto de infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU

Fuente: COPEBA SAS.

Tabla 2. Datos de interventoría.

DATOS DE LA INTERVENTORIA	
CONTRATO NO.	ICCU 815 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".
CONTRATISTA:	COPEBA S.A.S
NIT:	830.011.122-9
FECHA DE INICIO	01 de agosto de 2023
FECHA TERMINACIÓN	31 de marzo de 2024
VALOR DEL CONTRATO	1.032.790.821

Fuente: COPEBA SAS.

Tabla 3. Datos del Contratista.

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO NO.	**ICCU 708 DE 2023**
OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500
CONTRATISTA:	CONSORCIO PASCA CNJ
NIT:	901715912-1
FECHA DE INICIO	01 de agosto de 2023
FECHA TERMINACIÓN	31 de marzo de 2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 17.862.489.434

Fuente: COPEBA SAS.

3. LOCALIZACIÓN

El contrato de obra ICCU 708 de 2023 cuyo objeto es rehabilitación, mantenimiento de la vía Sibaté - Fusagasugá - Pasea, departamento de Cundinamarca, en el marco del plan 500; se intervendrá la vía de carácter segundaria que conecta el municipio de Sibaté, municipio de Fusagasugá y municipio de Pasea en el departamento de Cundinamarca, con una longitud de 4.6 KM aproximadamente.

Ilustración 1. Localización general del proyecto.



Fuente: Google earth

4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

- Transporte de material
- Excavación
- Suministro e instalación de Geotextil
- Fresado
- Estructura de pavimento: MDC-19 modificada con caucho, base estabilizada con cemento y emulsión asfáltica, base granular, subbase granular, sello de afirmado, Rajón, fresado, excavación y riesgo de liga de emulsión asfáltica.
- Mantenimiento, limpieza y construcción de obras de drenaje transversales (alcantarillado) y longitudinales a lo largo del tramo.
- Construcción de andenes en dos sectores (Agua Bonita y La Aguadita)
- Construcción de estructura de contención
- Señalización vertical y horizontal.
- Bacheo, parcheo, reemplazo de carpeta asfáltica, construcción de filtros y cunetas.

5. DEMANDA DE RECURSOS AMBIENTALES

- **Agregados pétreos:**

Tabla 4. Datos proveedor de agregado.

EMPRESA	NÚMERO DE LA NORMATIVIDAD	REGISTRO MINERO	RUCOM
Transportes MR S.A.S	Resolución 1123 de 2015-ANLA	Contrato de concesión 2655 Vigencia: 8/08/2029	Comercializados Autorizado RUCOM: 2022071622009
Dromos Pavimentos	Resolución 2687 de 2016	CAR	RUCOM-2021062919311

Fuente: Consorcio PASCA CNJ

Tabla 5. Datos del proveedor de mezcla asfáltica.

EMPRESA	Componente Ambiental	NÚMERO DE LA NORMATIVIDAD	ENTIDAD QUE EMITE	REGISTRO MINERO	RUCOM
Dromos Pavimentos S.A.S	Aire	Resolución No. 50207100864 de 2020	CAR	NA	NA
	Agregado	Resolución 2687 de 2016	CAR	CONTRATO DE CONCESIÓN L 685 VIGENCIA: 10/07/2036	RUCOM-2021062919311

Fuente: Consorcio PASCA CNJ

- **Material RCD:**

Tabla 6. Disposición final material RCD.

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD	ESCOMBRERA	UBICACIÓN	Autorización
Excavación	13.874	J Pachón S.A.S	Fusagasugá	Decreto 626 de 2019-Fusagasuga Autorizado CAR oficio: 20192186634
Excavación, cimientos, pilotajes, arcillas y materiales pétreos	1000	Fundación día azul futuro verde	Sibaté	Autorización CAR Oficio:20232078160

Fuente: Consorcio PASCA CNJ

- **Consumo de agua**

  Uso industrial: El proyecto no requiere permiso de concepción de agua, el suministro de este recurso será por medio de carrotanque mediante la empresa GALINDEZ CORTES DIEGO ALEJANDRO, quién ADQUIERE EL suministro por el Acueducto de Bogotá.

- **Uso doméstico**: Durante la ejecución de las obras del proyecto, el agua de consumo será suplida mediante la compra de botellones y/o bolsas plásticas (Esta última se va a restringir el consumo para disminuir la generación de residuos plásticos en los puntos de obra).

- **Vertimiento**

En el proyecto no realizara descargue de aguas residuales no domésticos-ARnD directas, por tal razón no se requiere contar con un permiso de vertimientos para dichas aguas.

De igual manera, las aguas domésticas-ARD generadas por las baterías sanitarias, serán debidamente manejadas y dispuesta por el proveedor Soluciones en baños portátiles de Colombia S.A.S, debidamente autorizado.

- **Emisiones atmosféricas**

No es necesario tramitar permisos de emisiones atmosféricas; La mezcla asfáltica será suministrada por la empresa Dromos Pavimentos S.A.S los cuales cuentan con permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas, otorgada con la resolución 2803 de 29 de diciembre de 2008, renovada mediante la resolución 372 del 12 de febrero de 2019 y modificada mediante la resolución 50207100864 de 202º. Ver Anexo 1 Licencia Adquisición de materiales, subcarpeta 2. Mezcla asfáltica.

- **Aprovechamiento forestal**

Teniendo en cuenta las características del proyecto y las zonas a intervenir, no se requiere adelantar permisos de tala por emergencia o de aprovechamiento forestal.

- **Ocupación de cauces**

Para el mejoramiento de box coulvert, desde el área técnica, se deben definir los puntos de intervención, una vez establecidos, se enviará la información al ICCU para que realice la correspondiente consulta a la CAR sobre la necesidad de solicitar permiso de Ocupación de Cauce para su respectivo tramite y gestión ante la Autoridad Ambiental, con el objeto de que se autorice su intervención.

- **Residuos peligrosos y no peligrosos**

En la ejecución de la obra se generarán los siguientes residuos:

Tabla 7. Residuos a generar.

RESIDUO GENERADO	TRATAMIENTO	PROVEEDOR
Residuos orgánicos	Relleno sanitario	EMSERFUSA E.S. P
Papel, cartón, plásticos sucios		
Elementos fabricados por poliéster		
Residuos de barrido		
Madera	Recuperador	C & L SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Chatarra		

RESIDUO GENERADO	TRATAMIENTO	PROVEEDOR
Llantas o neumáticos		
Empaques, envases y embalajes (sin contaminar)		
Residuos peligrosos	Incineración	VALCO CONSTRUCTORES LTDA
Materiales Pétreos	Escombreras	J PACHON S.A.S

Fuente: Consorcio PASCA CNJ

6. SEGUIMIENTO PLAN DE IMPLEMENTACION PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA).

Se tomarán los programas del Plan De Adaptación De La Guía Ambiental (PAGA), para realizar la evaluación del cumplimiento de los compromisos establecidos en materia Ambiental por el contratista CONSORCIO PASCA CNJ, según contrato de Obra No. ICCU-708 DE 2023, ya que en ellas están contenidas las actividades que deben ser realizadas tanto legal como contractualmente en este aspecto.

6.1. PROGRAMA 1 GESTIÓN DEL PROYECTO

6.1.1. Subprograma Conformación del grupo de gestión ambiental social

- En el mes de marzo de 2024 se realizó la implementación del PAGA, radicado en el mes de agosto de 2023, donde se realizaron actividades de capacitación, revisión de permisos de los proveedores, manejo de materiales, entre otras actividades. Ver Anexo 3 Radicación de PAGA.

- En este periodo se realizaron las siguientes actividades: Instalación de alcantarilla, espacio público, instalación de asfalto y bacheo.

- En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024, se realizó inducción del componente ambiental a 5 personas.

Anexo 1. Inducción.

- El Grupo de gestión Ambiental- Social está conformado por:

Contratista

- Especialista Ambiental: Nerieth Salas
- Trabajador Social: Daniela Riveros
- Profesional SST: Natalia Quecho

Interventoría

- Especialista Ambiental: John Cano García
- Trabajador Social: Nuri García
- Profesional SST: John Peña

6.1.2. Subprograma Capacitación y concientización del personal de obra.

- En el Anexo 1. Inducción, se anexa la evaluación de la inducción realizada al personal cada vez que ingresa.

- El día 14 de marzo de 2024, se realizó una capacitación sobre nuevas tecnologías para ahorro de agua y energía.

- El día 22 de marzo de 2024, se llevó a cabo una charla Cambio climático y contaminación ambiental.

Anexo 2. Charla y capacitación.

6.1.3. Subprograma cumplimiento de requisitos legales

- El día 30 de agosto de 2023, se radico en físico el "PAGA" aprobado por el componente social y ambiental, mediante el oficio CNJ-ICCU708-O-0044.

Anexo 3. Radicación de PAGA.

- Durante este periodo se adquirió material granular en las siguientes canteras:

EMPRESA	NÚMERO DE LA NORMATIVIDAD	REGISTRO MINERO	RUCOM
Dromos Pavimentos S.A.S	Resolución 2687 de 2016	CONTRATO DE CONCESIÓN L 685 VIGENCIA: 10/07/2036	RUCOM-2021062919311

- Durante este periodo se adquirió asfaltó en la siguiente empresa:

EMPRESA	Componente Ambiental	NÚMERO DE LA NORMATIVIDAD	ENTIDAD QUE EMITE	REGISTRO MINERO	RUCOM
Dromos Pavimentos S.A.S	Aire	Resolución No. 50207100864 de 2020	CAR	NA	NA
	Agregado	Resolución 2687 de 2016	CAR	CONTRATO DE CONCESIÓN L 685 VIGENCIA: 10/07/2036	RUCOM-2021062919311

- Hasta la fecha se tiene autorizado para realizar disposición final la siguiente escombrera:

TIPO DE MATERIAL	ESCOMBRERA	UBICACIÓN	Autorización
Excavación	J Pachón S.A.S	Fusagasugá	Decreto 626 de 2019-Fusagasuga Autorizado CAR oficio: 20192186634
Escombro, concretos y agregados sueltos de construcción, capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación, ladrillo, acero, concreto y similares	Fundación día Azul Futuro Verde	Sibaté	Resolución 472 de 2017 Autorizado CAR Oficio:20232078160

Anexo 4. Licencia adquisición de materiales

Anexo 5. Licencia escombrera.

Anexo 6. requisitos legales del proyecto.

6.2. PROGRAMA 2 MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

6.2.1. Subprograma manejo integral de materiales de construcción

Materiales Pétreos

- En los puntos de obra solo se está almacenando el material que se va a utilizar en la jornada laboral.

- Los Agregados se almacenan temporalmente en sitios donde se tenga una base de asfalto para evitar contaminación del suelo, este material se cubrió con plástico para evitar esparcimiento de partículas.





Foto 1 y 2. Colocación de material granular.

- En caso de ser necesario se riega el sitio de almacenamiento para evitar esparcimiento de partículas que contaminen o puedan afectar la circulación de los vehículos.

- La arena de gravilla en la fabricación de los gaviones y como base en la construcción del articulado con adoquín y como base en la construcción de los adoquines.

- Los vehículos que transporte material cuentan con su respectiva carpa, para evitar esparcimiento de partículas en el transporte de este.

Concreto

- Durante este periodo no se almacenó cemento; el cemento utilizado se llevaba y se mezclaba con fresado para realizar el estabilizado.
- No se mezcló el concreto directamente en el suelo

- Durante este periodo se utilizó mezcladora y se prohibió lavar la mezcladora en cuerpo de agua y frente de trabajo
- Se cubrió el material con plástico para evitar deterioro del material.
- El concreto llevó premezclado al frente de obra a través de mixer para actividades de espacio público y cuneta.
- Durante este periodo se utilizó mezcladora en las actividades de espacio público y se prohibió lavar la mezcladora en cuerpo de agua y frente de trabajo.





Foto 3 y 4. Se realizó instalación de concreto.

Asfalto

- En este periodo se realizó la instalación de asfaltó.
- En la obra no se realizó almacenamiento de asfaltó, el material instalado es en caliente.
- El asfaltó en la obra será suministrado por medio de volquetas cumpliendo toda la legislación vigente
- El asfaltó se cargó con volquetas, el cual es descargado directamente en la finisher.





Foto 5 y 6. Se realizó instalación de mezcla asfáltica.

- Durante las actividades de aplicación de mezcla se verifico que no se generara residuos de este en las zonas verdes cerca al punto de obra.
- Al finalizar la actividad se verificó que el área se deje en óptimas condiciones.

Prefabricados

Para las actividades de espacio urbano se adquirieron 286 Bloques de cemento.

Ver Anexo 7. Certificado de prefabricados

6.2.2. Subprograma 2. Manejo integral de explotación de materiales de construcción.

Durante este periodo se adquirió el siguiente material:

MATERIAL	CANITDAD (m3)
Arena lavada	37
Grava 3/ 4"	21
Granular	23
Grava 2"	188,76
Recebo común	75,35

Anexo 7. Certificado de agredo DROMOS y Transporte MR SAS

La mezcla asfáltica se obtuvo en la empresa DROMOS PAVIMENTO, en el Anexo 4. Licencia adquisición de materiales, subcarpeta Mezcla asfáltica se adjuntó licencia de la planta. En el Anexo 9. Se anexo soporte de la adquisición de asfalto:

EMPRESA	Componente Ambiental	NÚMERO DE LA NORMATIVIDAD	ENTIDAD QUE EMITE	REGISTRO MINERO	RUCOM
Dromos Pavimentos S.A.S	Aire	Resolución No. 50207100864 de 2020	CAR	NA	NA
	Agregado	Resolución 2687 de 2016	CAR	CONTRATO DE CONCESIÓN L 685 VIGENCIA: 10/07/2036	RUCOM-2021062919311

En este periodo se adquirió la siguiente cantidad:

MATERIAL	CANITDAD (m3)
Mezcla asfáltica MDC 19	59,95

Anexo 8. Mezcla asfáltica

- El concreto se adquirió en la empresa CONCREMOVIL, se instaló 269,75 m3, se utilizó este material en espacio público y construcción de cunetas.

Anexo 9. Concreto.





Foto 7 y 8. Instalación de concreto hidráulico.

6.2.3. Subprograma 2.3: Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales

- Implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT)





Foto 9 y 10. Implementación de PMT

- Durante este periodo no se realizaron actividades nocturnas.

6.2.4. Subprograma Seguimiento manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición.

En Este periodo se generó el siguiente material:

TIPO DE MATERIAL	UBICACIÓN DE MATERIAL	CANTIDAD (M3)
Material de excavación	Tramo 7	412.88
	Tramo 5	705.47
	Pasca	448.31
	Alcantarillas	287.57
	Tramo 3 - Gaviones	873.48
	Aguabonita	307.32
Fresado	Paso malo Pasca	50.12

- El material de excavación se generó en la adecuación de la zona de gaviones, alcantarillo, cunetas y espacio público.





Foto 11 y 12. Cargue de material RCD.

En este periodo se realizó la reutilización del siguiente material:

TIPO DE MATERIAL	UBICACIÓN DE MATERIAL	CANTIDAD (M3)
Material de excavación	Tramo 7	1.37
	Alcantarillas	92.91
	Aguabonita	194.69
	Aguadita	26.22
Fresado	Paso malo Pasca	545.26





Foto 13 y 14. Reutilización de material RCD.

Durante este periodo se realizó entrega autorizada por parte del ICCU, a la alcaldía de PASCA aproximadamente 55 M3. Ver Anexo 12. Entrega de fresado.

Consolidado generación, reutilización y disposición de RCD.

Material	Cantidad producida en el mes (m3)	Cantidad reutilizada en el mes (m3)	Disposición final en el mes (m3)	Acumulado de material dispuesto en escombrera (m3)	Cantidad de material almacenado (m3)	Lugar temporal de almacenamiento
Excavación	3035.03	315.19	3404.8	7136.8	2185.76	Predio Finca Colinas de Barro blanco – Diego Felipe Pinilla. Finca Villa Omar – Jacinto Rodriguez.
Fresado	50.12	50.12	0	0	0	Punto de obra – paso malo Pasca

- No se realizó el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente de los materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre zonas verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedades y en general cualquier cuerpo de agua. (Resolución 541 de 1994).
- Actualmente se está almacenando temporalmente material en la Finca Colinas de barro Blanco, Salvania, Santa Rita alta; Propiedad del señor Diego Felipe Pinilla Martinez y en el tramo 7 Ver Anexo 18. Autorización De Almacenamiento Temporal, el cual se encuentra alejado de las obras y no están cerca a fuentes de agua. En el Anexo 11. Certificado de acopio, donde se justifica técnicamente por que se esta almacenando temporalmente este material.
- El sitio de almacenamiento temporal no interfiere con el paso de peatones o vehicular
- Los vehículos encargados del transporte cuentan con su respectiva carpa, para evitar esparcimiento de partículas.
- Se tiene prohibido botar mezcla de concreto al lado de la vía en zonas verdes o duras. Estos sobrantes son tratados como escombros.
- Durante este periodo se realizó disposición de 2632 m3 de material de excavación en la escombrera J.PACHON S.A.S Nit: 900.298.031-2.

Anexo 10. Anexo 11. Autorización De Almacenamiento Temporal.

Anexo 11. Entrega de fresado.

Anexo 12. certificación escombrera.

Subprograma 5. Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales

- En los diferentes puntos de obra se tiene instalados puntos ecológicos, que constan de recipientes de 55 galones en cuatro colores con el fin de facilitar la segregación de los residuos de acuerdos a sus características.

- En el punto de atención al usuario se tiene un punto ecológico, constituido de cuatros colores, como se puede observar en la siguiente imagen:





Foto 18 y 19. Puntos ecológicos en obra y oficina.

- Los residuos se separan en la fuente utilizando tres (3) colores, en cumplimiento de la resolución 2184 de 2019; conformado por los siguientes colores:

✓ Blanco: Depositar residuos aprovechables como plástico, botellas, latas, vidrio, metales, papeles y cartón.
✓ Negro: Depositar residuos no aprovechables como las servilletas, cartones contaminados con comida, papeles metalizados entre otros.
✓ Verde: Depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas etc



Semanalmente las canecas son lavadas, para evitar que se produzcan malos olores
Los residuos son tratados por las siguientes empresas:

RESIDUO GENERADO	TRATAMIENTO	PROVEEDOR
Residuos orgánicos	Relleno sanitario	EMSERFUSA E.S. P
Papel, cartón, plásticos sucios		
Elementos fabricados por poliéster		
Residuos de barrido		
Madera	Recuperador	C & L SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Chatarra		
Llantas o neumáticos		
Empaques, envases y embalajes (sin contaminar)		
Residuos peligrosos	Incineración	VALCO CONSTRUCTORES LTDA

Anexo 13. Licencia de residuos especiales.

Anexo 14. Licencia de residuos peligrosos.

- A cada empleado que ingresa se le realiza el proceso de inducción, donde se le explica las tres R (reducir, reciclar y reutilizar y como se debe clasificar los residuos de acuerdo con sus características, Ver Anexo 1 Inducción.
- Diariamente se recolectan los residuos que se generan en la obra, los ordinarios son depositados en un contenedor ubicado en La Aguadita donde la empresa pública de aseo EMSERFUSA E.S. P realiza la recolección todos los jueves.





Foto 20 y 21. Puntos recolección residuos ordinarios.

- Los residuos peligrosos como son las bolsas de cemento se están guardando en una bodega externa para ser entregados posteriormente a la empresa C & L SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S, quienes definirán si este residuo, lo ingresa nuevamente al ciclo productivo o realizan la disposición final con su aliado VALCO CONSTRUCTORES LTDA.
- El aceite resultado de mantenimientos preventivos de la maquinaria de la empresa JMS INGENIERIA S.A.S, acumulara este líquido hasta tener 55 galones para realizar su respectiva entrega a la empresa ECOALF para su disposición final o regreso al ciclo productivo como materia prima de jabones
- Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2024, Se generaron 63 kg de residuos ordinarios, los cuales son pesados semanalmente. Ver Anexo.16 Control de residuos
- En obra se estableció un punto de almacenamiento de ACPM, este proceso se realiza en un tanque portátil el cual cuenta con todo lo necesario para realizar cargue seguro de la maquinaria.
- Actualmente en obra solo se está manejando los siguientes químicos: ACPM, gasolina y emulsión asfáltica.
- Se etiquetan todos los recipientes donde se almacenan químicos,
- Todas las maquinarias y punto de obra tienen un extintor para en caso de emergencia.
- No realizan trabajos de mantenimiento que generen chispas o llamas en las áreas donde se encuentren almacenadas las sustancias peligrosas.
- En caso de presentarse derrames, cada punto de obra cuenta con su respectivo kit antiderrame.

Anexo 15. Control de residuos.



Foto 22. Kit antiderrame.

6.3. PROGRAMA 3: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Subprograma 1. Manejo de aguas superficiales

- Los recursos hídricos para las actividades constructivas se están suministrado por medio de carrotanque; este recurso es suministrado por el acueducto de Bogotá.
- Durante el periodo comprendido entre 1 al 31 de marzo de 2024, se consumió 20 m3 de agua para las actividades de estabilizado e instalación de asfalto en el tramo 3, tramo 4 y espacio público. Ver anexo 18. Certificado de suministro de agua.
- Se utilizó el agua para el funcionamiento de la maquinaria de asfalto
- No se realizó captación de aguas lluvias o de fuentes superficiales



Foto 23. Carro tanque en frente de obra.

Subprograma 2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales

- Actualmente el Consorcio PASCA CNJ cuenta con dos baños portátiles, ubicados en el sitio denominado "paso malo" y el otro en espacio publico en Aguabonita, suministrados por Soluciones en baños portátiles de Colombia S.A.S; Ver Anexo 17. Licencia Vertimientos.



Foto 24. Baños en frente de obra.

- Semanalmente se realizan dos aseos a los baños portátiles, Ver Anexo 19. Certificado de baños.
- En el periodo de 1 al 31 de marzo de 2024, se trató 320 litros de agua residuales, producto del aseo de los tres baños, ubicados en los tres puntos de obra que tiene el Consorcio PASCA CNJ.

- En la obra de tiene prohibido todo vertimiento de aguas residuales a las calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillado para aguas lluvias
- No se permite lavado de maquinaria y equipos, directamente al suelo que puedan ser descargados a los cauces de agua y evitar los vertimientos en estos.

6.4. Programa 4: Programa de biodiversidad y servicios ecosistémicos

PBSE-4.2-15. Subprograma 4. Protocolo de fauna en obra

- En la obra se tiene prohibido el tránsito de maquinaria fuera de los frentes de obra, donde se pueda afectar la fauna silvestre.
- Se tiene prohibido el uso o porte de armas de fuego dentro de la obra, con excepción del personal de vigilancia.
- Se tiene prohibido a los trabajadores o colaboradores la caza, pesca y compra de cualquier especie de fauna silvestre.
- Se tiene prohibido a los trabajadores o subcontratistas del Consorcio Pasca CNJ capturar especies de fauna silvestre.
- Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2024, no se presentó fauna silvestre atropellada por vehículos o maquinaria en los frentes de obra.

6.5. Programa 5: Manejo de instalación temporales, de maquinaria y equipos

Subprograma 1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio

El campamento este compuesto por una camilla, extintor, botiquín, kit antiderrame y baño portátil.



Foto 25. Campamento de frente de obra.

- El Campamento temporal se ubicará en zonas que quede protegido de la acción del agua.
- No se realizaron cortes de terreno
- Se contó con dos baterías portátiles suministrados por la empresa Soluciones en baños portátiles de Colombia S.A.S., la cual realiza dos aseos a la semana Ver Anexo 19. Certificado aseo de baño

Anexo 168. Aseo Baños.

- El agua industrial fue suministrada por medio de carrotanques, mediante la empresa GALIDEZ CORTES DIEGO ALEJANDRO "SERVIAGUA EXPRES". Ver Anexo 16. Certificado de suministro de agua.
- El agua para consumo humano se suministró por medio de botellones.

Anexo 19. Suministro agua potable.

- Se prohibió a los trabajadores o subcontratistas el vertimiento de aguas residuales en cuerpos de agua cercano.
- Se mantiene el campamento se mantiene el orden y aseo.

- Diariamente se recolectan los residuos que se generan en la obra, los residuos ordinarios son depositados en un contenedor ubicado en La Aguadita donde la empresa pública de aseo EMSERFUSA E.S. P realiza la recolección.
- Los residuos peligrosos como son las bolsas vacías de cemento se están guardando en una bodega externa para ser entregados posteriormente a la empresa C & L

SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S, quienes definirán si este residuo lo ingresan nuevamente al ciclo productivo o realizan la disposición final con su aliado VALCO CONSTRUCTORES LTDA.

- Se tuvieron en los puntos de obra los siguientes elementos de emergencia, botiquín, extintor, camilla y kit de antiderrame.



Foto 26. Elementos de emergencia

- En el punto crítico 8, se tiene un sitio de almacenamiento de ACPM, mediante un tanque portátil de combustible, el cual tiene sistema interno antiderrame.

Subprograma 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

- En periodo comprendido entre el 01 al 31 marzo de 2024, no se realizó mantenimiento de maquinaria en los puntos de obra, se realizaron inspecciones.
- En el Anexo 20. Hoja de vida con mantenimiento de maquinaria, en este documento adjunto se describen las características de la maquinaria, fecha del mantenimiento, horómetro de la máquina, tipo de mantenimiento, descripción de la actividad ejecutada y observación.
- Los mantenimientos ejecutados durante este mes en las maquinas, fueron realizados en las instalaciones de la empresa JMS INGENIERIA S.A.S que es la propietaria de la maquinaria.
- La empresa JMS INGENIERIA S.A.S, tiene disponible un mecánico y auxiliar mecánico, para realizar las respectivas revisiones y mantenimiento de la maquinaria.

- En caso de realizarse mantenimientos en la obra, será ejecutado por personal autorizado por la empresa JMS INGENIERIA S.A.S, antes de iniciar se realizará protección del suelo y señalizará el área.
- No se acepta en los puntos de obra equipos con modificaciones.
- Todas las maquinas cuentan con extintor y pito de reserva
- Las dos volquetas que transportaron material cuentan con su carpa
- El combustible se almaceno en zonas abiertas y con ventilación
- Actualmente solo se está almacenado ACPM, en un tanque de combustible portátil, la cual esta señalizada y fuera de posibles fuentes de ignición.
- El transporte de maquinaria se realiza cumpliendo todos los requisitos legales vigente.
- El aceite resultado de mantenimientos preventivos de la maquinaria, la empresa JMS INGENIERIA S.A.S, acumulara este líquido hasta tener 55 galones para realizar su respectiva entrega a la empresa ECOALF para su disposición final o regreso al ciclo productivo como materia prima de jabones.

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR INTERVENTORIA


En cumplimiento del Contrato No **ICCU-815 DE 2023**, la firma de Interventoría **COPEBA SAS** cuyo objeto corresponde a la "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,NAMBIENTALNYNLEGALNALN"MEJORAMIENTO,NREHABILITACIÓN,N MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.NENNELNMARCONDELNPLANN500".**", durante el período ejecuto las siguientes actividades de gestión ambiental:

- Revisión de las obligaciones ambientales del Contrato de Interventoría No ICCU-815 DE 2023.
- Revisión de las obligaciones ambientales del Contrato de obra No. ICCU-708 DE 2023.
- Seguimiento a la ejecución del PAGA como instrumento ambiental para la ejecución de las obras.
- Revisión de los informes ambientales, como instrumento de seguimiento de las actividades ejecutadas en el periodo.
- Verificación documental de las escombreras y canteras cerca al área de influencia del proyecto.
- Verificación documental de certificados de material correspondiente al mes de marzo de 2024.
- Recorridos para verificar las condiciones ambientales en el campamento y zonas de acopio.
- Se realizó verificación documental de las inducciones ambientales realizadas al personal de obra que ingresa.
- Se verificó el orden y aseo en el campamento instalado por el contratista de obra.

- Se realiza verificación documental de las sensibilizaciones ambientales llevadas a cabo por el contratista en el presente periodo.
- Se verificaron los acopios de material y RCD realizados por el contratista.
- Se Verificó la protección con cinta y delineadores tubulares realizada por el contratista en el periodo.
- Se realizó la verificación de la implementación de las campañas ambientales

8. EVALUACIÓN DESEMPEÑO AMBIENTAL DEL PERIODO

El desempeño ambiental para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2024, por parte del contratista dentro de la implementación del PAGA aprobado por la interventoría para la ejecución del presente contrato de obra, corresponde a un 100%, teniendo en cuenta que se han venido implementando las actividades correspondientes a cada uno de los programas ambientales que componen la Guía ambiental.

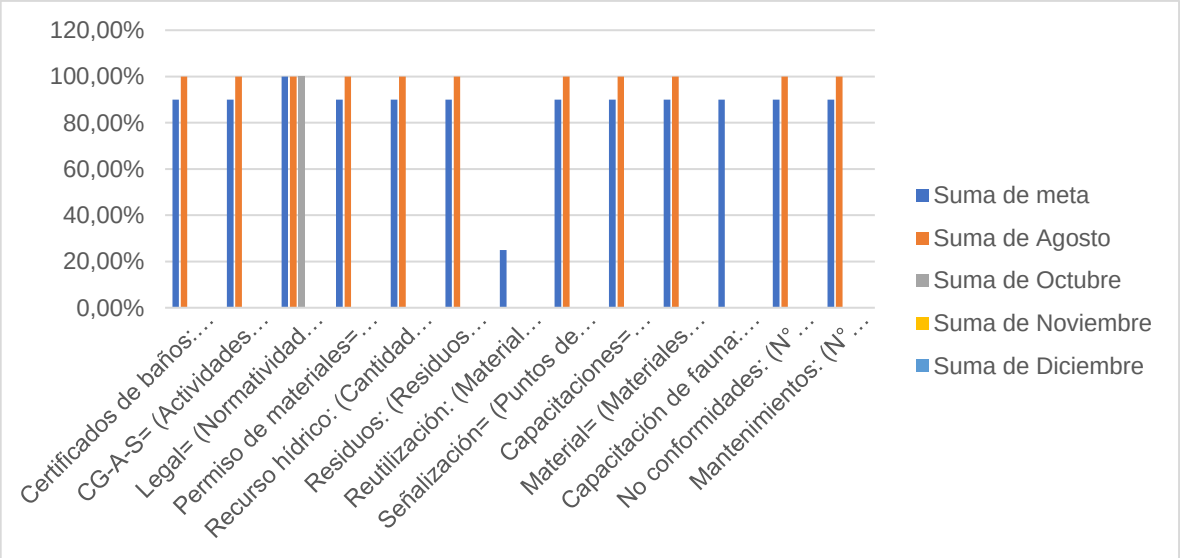

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1. Conclusiones

- Se realizó el seguimiento de las actividades ambientales conforme al PAGA del contratista CONSORCIO PASCA CNJ, según contrato de Obra No. ICCU-708 DE 2023, teniendo en cuenta los procedimientos que se establecieron en él, para así cumplir con los requerimientos del ICCU.

- Las actividades realizadas por la interventoría durante el presente periodo se encaminaron con base al seguimiento realizado al contratista durante la ejecución a las actividades constructivas ejecutadas para el presente corte.

- Al presente corte, no se tiene establecido la necesidad de solicitar permisos ambientales ante la Corporación para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual.

- El plan de adaptación de la guía ambiental PAGA, está elaborado con el contenido establecido para una complejidad baja, y cumple con todos los ítems establecidos.

- El contratista realizó el proceso de inducción al 100% en los empleados que ingresaron al proyecto.

- Los materiales de construcción están siendo adquiridos con proveedores que cuentan con sus permisos tanto ambientales como mineros para el desarrollo de esta actividad.

- Los RCD generados en obra que no pueden ser aprovechados IN SITU, se están llevando a escombrera autorizada por la CAR para esta actividad.

- El agua para uso industrial se compra por medio de carro tanque a la Empresa de Acueducto de Bogotá.

9.2. Recomendaciones

- Se recomienda continuar con la implementación de los programas del PAGA.

- Realizar la entrega de los certificados pendientes del periodo.

- Realizar el seguimiento a la generación de residuos y clasificación en la fuente.

- Garantizar la permanencia del punto de acopio de sustancias químicas.
- Garantizar la permanencia del punto ecológico en los frentes de intervención.
- Asegurar el orden y aseo de los campamentos y oficina.
- Realizar los acopios conforme a lo establecido en el PAGA.

INFORME DE LA PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO INTERVENTORÍA: ICCU 815-2023 COPEBA S.A.S

CONTRATO CONTRATISTA: ICCU 708-2023- CONSORCIO PASCA CNJ

CUNDINAMARCA

PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

NJGL-Nury García López - Profesional Social. - Email: socialcopeba@gmail.com
Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. (Fax) 2571094 2564013 2183292

Hoja de control del documento

Control de Modificaciones		
Versión	**Descripción de Modificaciones**	**Fecha**
0	Informe mensual de la Gestión Social de la interventoría	Marzo 2024

Fecha	Elaboró
1 al 31 de marzo de 2024	NURY JAZMÍN GARCÍA LÓPEZ
Cargo	Residente Social – Interventoría
Descripción	Elaboración del documento para revisión inicial

Tabla de contenido

1. Introducción 5
2. Datos del contrato 6
3. Objetivos 7
3.1. Objetivo General 7
3.2. Objetivos específicos 7
4. Programa 6: Gestión Social 8
4.1. Seguimiento programas y subprogramas de la Gestión Social 8
4.1.1. Documento PAGA 8
4.2. Subprograma 1: mano de obra contratada con enfoque de género, de derechos y diferencial 9
4.3. Programa 7: comunidades étnicas, preservación del patrimonio y sitios de interés sociocultural 10
4.4. Programa 8: gestión social de infraestructura, predios y servicios públicos 11
4.5 Programa 9. Accesibilidad 12
4.5.1. Subprograma 1: accesibilidad de la población e integración territorial 12
4.6 Programa 10: Participación, gobernanza e inclusión social. 12
4.6.1. Subprograma 1: atención a la comunidad 12
4.6.2. Subprograma 2: información y divulgación 15
5. Comunicaciones 18
5.1 Informes mensuales 20
5.2 Comité social 21
6. Conclusiones 22

Tablas

Tabla 1 Datos del contrato 6
Tabla 2 Seguimiento al documento PAGA 8
Tabla 3 Reporte mensual de contratación 9
Tabla 4 Seguimiento a consulta de la ARN 9
Tabla 5 Indicadores de gestión – Contratación 10
Tabla 6 Seguimiento a la gestión institucional 10
Tabla 7 Indicadores de gestión – Consultas institucionales 11
Tabla 8 Indicadores de gestión- Acompañamiento actividades técnicas 12
Tabla 9 Datos del Punto de Atención al Usuario – SAU 13
Tabla 10 Seguimiento a las PQRS 13
Tabla 11 Indicador de gestión -PQRS 15
Tabla 12 seguimiento a piezas comunicativas 15
Tabla 13 Seguimiento a reuniones mensuales 16
Tabla 14 Indicador de gestión – Información y divulgación 17
Tabla 15 Indicador de gestión – cultura vial y participación comunitaria 18
Tabla 16 Consolidado de comunicaciones enviadas 18
Tabla 17 Seguimiento a la entrega del informe mensual 20

Registros Fotográficos

Registro Fotográfico 1 Ubicación Punto SAU 14
Registro Fotográfico 2 Distribución de volantes ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Anexos

Anexo 1 Soportes del contratista CONSORCIO PASCA CNJ 9
Anexo 2 Levantamiento de actas de vecindad y formato de entrega de copias de actas de vecindad 11
Anexo 3 Soporte del contratista CONSORCIO PASCA CNJ 15
Anexo 4 Actas de reuniones extraordinarias 16
Anexo 5 Comunicaciones enviadas 18
Anexo 6 Informe contratista 21

1. Introducción

El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca-ICCU y la Interventoría COPEBA S.A.S con el propósito de beneficiar a la comunidad cundinamarquesa ejecutara obras que permitan mejorar la accesibilidad, conectividad, transitabilidad y seguridad vial a través de la intervención de la infraestructura mejorando las vías del departamento con el fin de propender el desarrollo económico de los sectores para el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes.

Por lo anterior, el presente informe se enmarca dentro de las bases teóricas, conceptuales y legales establecidos en los lineamientos contemplados en Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA para la verificación en el cumplimiento de programas y subprogramas establecidos en la identificación de impactos sociales, que la obra genere por parte del el contratista de obra ***CONSORCIO PASCA CNJ*** garantizando la participación y la apropiación del proyecto del ***CONTRATO N 708 DE 2023*** que tiene por objeto ***"MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500."***

Por ello, el objetivo de este informe mensual es evidenciar las actividades adelantadas en la Gestión Social en el presente periodo dando cumplimiento de las actividades contempladas en las fichas PAGA relevantes durante la ejecución del contrato.

.

2. Datos del contrato

A continuación, se presenta las generalidades del contrato:

Tabla 1 Datos del contrato

DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	ICCU No. 815 DE 2023
FIRMA INTERVENTORA	COPEBA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
NIT	NIT: 830.011.122-9
OBJETO	OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".
VALOR	$ 1.032.790.821
FECHA DE INICIO	1 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES 15 DÍAS
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO DE OBRA No.	708 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO PASCA CNJ
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ESPINOZA
NIT	NIT. 901.715.912-1
OBJETO	"MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500"
VALOR	$ 17.678.836.940
FECHA DE INICIO	1 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2023
PRÓRROGA	1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 (PRIMERA) 1 AL 30 DE MARZO DE 2024 (SEGUNDA)
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES 15 DÍAS

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Evaluar la ejecución de los programas y subprogramas desarrolladas durante la ejecución del Contrato de obra ***708 DE 2023*** por el contratista ***CONSORCIO PASCA CNJ***, establecidos en el documento PAGA, acompañando y verificando la información pertinente en el manejo de los impactos sociales en la ejecución del presente proyecto.

3.2. Objetivos específicos

- Realizar seguimiento y control a la implementación al cumplimiento de los programas, subprogramas y actividades de la gestión social contempladas en el documento PAGA.

- Verificar, y realizar seguimiento a las actividades contempladas en el programa de Gestión Social en el Subprograma 1: mano de obra contratada con enfoque de género, de derechos y diferencial de las actividades.

- Realizar seguimiento y control a las actividades que se desarrollan en el Programa 7: comunidades étnicas, preservación del patrimonio y sitios de interés sociocultural y sus subprogramas.

- Acompañar y mediar en el programa accesibilidad en atención y manejo de comunidad caso de requerirse de manera temporal.

- Acompañar y participar del programa 10: participación, gobernanza e inclusión social y subprogramas de atención, información y divulgación a la comunidad.

- Verificar la participación y promoción de la comunidad en el Subprograma 3: cultura vial y participación comunitaria

4. Programa 6: Gestión Social

4.1. Seguimiento programas y subprogramas de la Gestión Social

Con el fin de garantizar la ejecución y verificación de los programas y subprogramas establecidos en el desarrollo de la Gestión Social e informar de manera clara, precisa y oportuna el cumplimiento para el objeto contractual en el *mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento de la vía Sibaté - Fusagasugá - Pasca, departamento de Cundinamarca. en el marco del plan 500.* Se implementan los programas de los lineamientos, que contienen como base general las directrices en materia de gestión social.

A continuación, en el ejercicio de las obligaciones contractuales de la interventoría se presenta el seguimiento a los programas y subprogramas que se desarrollaron durante el presente mes.

4.1.1. Documento PAGA

De acuerdo con las obligaciones contractuales para el cumplimiento de los programas y subprogramas de la gestión social, se relacionará este ítem en los informes mensuales, con el fin de dar constancia de la trazabilidad del proceso que se efectuó en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental- PAGA en el desarrollo y cumplimientos de las actividades para el presente contrato como se relaciona a continuación:

Tabla 2 Seguimiento al documento PAGA

Fecha	Consecutivo	Solicitud
22 de agosto de 2023	SOC-ICCU-815-2023-001	Recomendaciones para la entrega del documento PAGA.
22 de agosto de 2023	SOC-ICCU-815-2023-002	Respuesta al comunicado CNJ-ICCU708-O-0039 y observaciones al documento PAGA.
30 de agosto de 2023	SOC-ICCU-815-2023-003	Respuesta al comunicado CNJ-ICCU708-O-0043 ajuste a las observaciones del documento PAGA.
30 de agosto de 2023	CONT-ICCU-708-2023-028	Solicitud entrega en físico del documento PAGA aprobado por la interventoría.
6 de septiembre de 2023	ADM-ICCU-815-2023-023	Radicación PAGA físico
14 de septiembre de 2023	Correo electrónico supervisión social ICCU	Revisión Paga contrato de obra ICCU 708 de 2023- se emite concepto de no objeción al componente social.

Fuente: Copeba S.A.S

4.2. Subprograma 1: mano de obra contratada con enfoque de género, de derechos y diferencial

Con el fin de promover el desarrollo local en temas de empleabilidad, se presenta el seguimiento al subprograma de la contratación de mano de obra contratada en el territorio de mujeres y hombres para la ejecución del contrato. Teniendo en cuenta a la información suministrada por el contratista se verifica el porcentaje mínimo de cumplimiento que equivale al 30% en la vinculación de la mano de obra de los municipios de intervención. A continuación, se presentan las acciones desarrolladas por el contratista en este ítem.

Así mismo, el área SST de la interventoría y en su conteo de verificación reporta la siguiente información al igual que las certificaciones municipio:

Anexo 1 Soportes del contratista CONSORCIO PASCA CNJ

Tabla 3 Reporte mensual de contratación

Total, del personal	MOC	MONC	MOC-MONC municipal	Porcentaje de cumplimiento	Mujeres	Certificado Municipal
107	55	52	17	15%	14	17

Fuente: Copeba S.A.S

Durante el periodo no se presentaron respuesta por parte de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN, en referencia a la base de datos del personal:

Tabla 4 Seguimiento a consulta de la ARN

No.	FECHA	REFERENCIA	ASUNTO
1	23 de junio de 2023	Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN CNJ-ICCU708-O-0006	Certificado de existencia o no de personas en proceso de reintegración.
2	4 de julio de 2023	Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN OFI23-011636 / GPU	Respuesta – EXT23-009959 Certificado de existencia o no de personas en proceso de reintegración.
3	6 de julio de 2023	Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN CNJ-ICCU708-O-0009	Respuesta OFI23-011636 / GPU
4	6,11, 13, 26 de julio y 04 de agosto de 2023	Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN correos electrónicos OFI23-011636	Solicitud de bases de datos
5	04 de agosto de 2023	Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), CNJ-ICCU708-O-0020	Solicitud de base de datos

Fuente: Copeba S.A.S

Tabla 5 Indicadores de gestión – Contratación

Programa generación de empleo		
Indicador	**Formula**	**Resultado**
Productividad	Total, personal MONC y MOC local = 17 Total, personal contratado= 107	15%
Productividad	Total, personal femenino = 14 Total, personal contratado = 107	13%

Fuente: Copeba S.A.S

4.3. Programa 7: comunidades étnicas, preservación del patrimonio y sitios de interés sociocultural

Verificar las respectivas indagaciones a las entidades y las consultas que permitirán establecer los planes de manejo y con el fin de establecer la protección, conservación, recuperación, sostenibilidad y divulgación de lo que corresponde a la preservación del Patrimonio Arqueológico y/o sitios de interés socio cultural para determinar la aplicación de cada uno de los subprogramas.

Para el periodo de este informe, la contratista continua el proceso para cierre de la consulta ante el Ministerio del Interior.

Tabla 6 Seguimiento a la gestión institucional

Entidad	Consulta	Respuesta	Observación
Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura	16 de agosto de 2023 CNJ-ICCU708-O-0030	24 de agosto de 2023 Rad. 411-2023	…Se indica que, revisado el listado de consulta de bienes de interés cultural del ámbito nacional, BICN, competencia del Ministerio de Cultura, …no cuentan con dicha declaratoria, no son colindantes, ni se encuentran en zona de influencia de algún BICN…
Dirección Autoridad Nacional de Consulta Previa Ministerio del Interior	16 de agosto de 2023 CNJ-ICCU708-O-0032 Rad. MC22633E2023 27 de noviembre de 2023 18 de diciembre de 2023	25 de agosto de 2023 Radicado 2023-2-002410-037963 Id: 187645 Radicado 2023-2-002410-037963 Radicado 2023-2-002410-061679 ID: 253212	…lo exhorta a diligenciar el Formato de Solicitud de Determinación de Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa para la Ejecución de Proyectos, Obras o Actividades, que corresponde al Anexo 1 Versión 8, el cual adjuntamos a esta comunicación y también lo podrá encontrar en el enlace https://www.mininterior.gov.co/documentos-direccion-de-la-autoridad-nacional-de-consulta-previa/. Asunto: Respuesta Radicado 2023-2-002410-037963 Solicitud de pronunciamiento al desarrollo y cumplimiento de la Consulta Previa. **Asunto:** Solicitud de información adicional para el proyecto "NO. ICCU 708 DE 2023 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".

Entidad	Consulta	Respuesta	Observación
Instituto Colombiano De Antropología E Historia-ICANH	16 de agosto de 2023 CNJ-ICCU708-O-0029	13 de septiembre de 2023 ICANH 2023162000090971	Entrada 2023184200079152 … el proyecto "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500", no se encuentra en la obligación legal de registrar e implementar un Programa de Arqueología Preventiva ante esta entidad...
Servicio Geológico Colombiano	16 de agosto de 2023 CNJ-ICCU708-O-0031	05 de septiembre de 2023 Radicado SGC No.: 20233800093471	… no existe declaratoria ni solicitud de declaratoria de Zona de Protección Patrimonial Geológica y Paleontológica en los puntos señalados …

Fuente: Copeba S.A.S

Tabla 7 Indicadores de gestión – Consultas institucionales

Programa Comunidades étnicas, preservación del patrimonio y sitios de interés sociocultural		
Indicador	**Formula**	**Resultado**
Productividad	Oficios enviados a entidades * 100% Oficio requeridos ICANH, MIN. IINTERIOR, SERV. GEOLÓGICO.	100%

Fuente: Copeba S.A.S

4.4. Programa 8: gestión social de infraestructura, predios y servicios públicos

4.4.1. Subprograma 1: infraestructura de predios y servicios públicos

La interventoría verificará y acompañará el registro del estado físico de los inmuebles que se encuentran en el área directa de intervención con el fin de establecer el estado actual antes de inicio de la obra.

El contratista durante el mes de marzo de 2024, adelanto el levantamiento de actas de vecindad de cierre en el sector de la Aguadita y la entrega de copias; esta actividad.

- Aguadita: 20 actas de vecindad de cierre
- Aguadita: 15 total de copias entregadas

Anexo 2 Levantamiento de actas de vecindad y formato de entrega de copias de actas de vecindad

Tabla 8 Indicadores de gestión- Acompañamiento actividades técnicas

Programa acompañamiento actividades técnicas		
Indicador	Formula	Resultado
Productividad	Total, de actas de vecindad realizadas predios = 60 Total, actas de vecindad proyectadas pedios = 61	98%
	Total, de actas de vecindad cerradas = 37 Total, actas de vecindad proyectadas a cerrar = 60	61%

Fuente: Copeba S.A.S

4.5 Programa 9. Accesibilidad

4.5.1. Subprograma 1: accesibilidad de la población e integración territorial

Este subprograma se desarrollará de acuerdo con las acciones que se presenten que alteren la movilidad del sector de intervención y estos produzcan traumatismos en la accesibilidad de bienes y servicios en las zonas de intervención. Para este periodo no se presentaron actividades en este ítem.

A la fecha el contratista cuenta con el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la interventoría mediante el comunicado ADM-ICCU-815-2023-005.

4.6 Programa 10: Participación, gobernanza e inclusión social.

4.6.1. Subprograma 1: atención a la comunidad

Se realizará seguimiento y verificación por parte de la interventoría a los mecanismos de información y de atención propuestos con el fin de revisar el sistema de recepción de PQRS que sean generadas por el proyecto las actividades de obra, ambientales y /o sociales donde se dé respuesta oportuna a los requerimientos y tiempos establecidos en legalmente, a la comunidad y autoridades locales.

Durante este periodo se verifica que el contratista cuenta con:

- Ubicación del Punto SAU
- Atención en el horario de atención
- Atención al canal virtual – correo electrónico y línea telefónica

Tabla 9 Datos del Punto de Atención al Usuario – SAU

Ubicación	Horario de atención	Correo electrónico	Línea telefónica
Vereda la Aguadita	Martes y jueves de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.	iccu708social@gmail.com	3188481569

Fuente: Copeba S.A.S

Durante el periodo se cuenta con un consolidado de (23) PQRS a continuación se relaciona en el estado en que se encuentran es:

- Abiertas: 20
- Cerradas: 3

Se continúan atendiendo por el área técnica y /o ambiental los requerimientos presentados por la comunidad dado que son adecuaciones constructivas como acceso a predios, rampas y donación de material.

Tabla 10 Seguimiento a las PQRS

No	Fecha de recepción	Nombre del peticionario	Sector	Teléfono	Descripción de la PQRSD	Área Responsable	Estado/ fecha de cumplimiento
1	23 de octubre de 2023	Gladis Zambrano Ruiz	Agua bonita	3108577767	Solicitud de arreglos al acceso de la escuela rural de Santa Isabel	Técnico - social	Cierre 18/12/2023 CNJ-ICCU708-O-0213
2	20 de noviembre de 2023	Antonio Álzate Vargas	Aguadita	No reporta	Acceso a predios - rampas vehiculares	Técnico - social	14 de diciembre de 2023 – seguimiento / CNJ-ICCU708-O-0201 adecuación de anden
3	21 de noviembre de 2023	Miguel Guevara	Aguadita	No reporta	Adecuación de anden	Técnico - social	14 de diciembre de 2023 – seguimiento / CNJ-ICCU708-O-0200 adecuación de anden
4	23 de noviembre de 2023	Ángel Augusto Ramos Néstor Perilla Gina Pedraza	Aguadita	3143943040	Cese de actividades de cargue y descargue - restablecimiento de la línea de concreto por donde transitan los vehículos entre otros.	Técnico - social	Cierre 13/12/2023 Correo electrónico
5	23 de noviembre de 2023	Jorge Prieto Cortes	Aguadita	No reporta	Solicitud de rampa persona con discapacidad	Técnico - social	14 de diciembre de 2023 – seguimiento / CNJ-ICCU708-O-0199 se efectuará la rampa.
6	25 de noviembre de 2023	Imelda Daza Marlen Roa	Aguadita	3107686348 - 3138494869	Solicitud de donación de material para vías terciarias - Colegio Francisco José de Caldas	Técnico - social	18 de diciembre de 2023- seguimiento / CNJ-ICCU708-O-0215 pendiente por autorizar donación de material
7	30 de noviembre de 2023	Jacinto Rodríguez	Aguadita	3108691276	Solicitud de material sobrante	Técnico - ambiental - social	18 de diciembre de 2023- seguimiento / CNJ-ICCU708-O-0216 pendiente por autorizar donación de material - enviado el 19 de diciembre de 2023 por correo electrónico
8	04 de diciembre de 2023	Jennifer Mejía Corregidora Norte	Aguadita	No reporta	Solicitud de material fresado	Técnico - ambiental - social	No reporta seguimiento
9	10 de enero de 2023	Camilo Andrés Aponte	Aguadita	3209805913	Solicitud de rampa	Técnico - social	Seguimiento
10	10 de enero de 2023	Marlen Roa	Aguadita	3138444869	Solicitud de rampa	Técnico - social	Seguimiento
11	10 de enero de 2023	Evangelina Díaz Valero	Aguadita	3224820146	Solicitud de rampa y reposición de una teja	Técnico - social	Seguimiento
12	11 de enero de 2023	Ana Sofia Olaya	Aguadita	3213551096	Solicitud de rampa	Técnico - social	Cierre 8 de febrero de 2024

No	Fecha de recepción	Nombre del peticionario	Sector	Teléfono	Descripción de la PQRSD	Área Responsable	Estado/ fecha de cumplimiento
13	02 de febrero de 2024	Gladys Sandoval	Aguadita	3173212181	Solicitud de rampa	Técnico - social	Seguimiento
14	02 de febrero de 2024	Alejandro Bermúdez	Aguadita	3006091012	Solicitud de rampa	Técnico - social	Seguimiento
15	02 de febrero de 2024	Astrid Suárez	Aguadita	3118500420	Solicitud de rampa	Técnico - social	Seguimiento
16	02 de febrero de 2024	Hernán Olaya	Aguadita	3124355926	Solicitud de rampa	Técnico - social	Seguimiento
17	02 de febrero de 2024	Propietarios restaurantes	Aguadita	Varios	Reducción de anden	Técnico - social	Seguimiento
18	05 de febrero de 2024	JAC y Comunidad	Aguadita	Varios	Continuidad de anden para establecimiento educativo	Técnico - social	Seguimiento
19	09 de febrero de 2024	Nohemí García	Aguadita	3134565440	Solicitud de rampa	Técnico - social	Seguimiento
20	09 de febrero de 2024	Luz Marina Huertas	Aguadita	3213554422	Solicitud de rampa	Técnico - social	Seguimiento
21	09 de febrero de 2024	Fiyer Pachón	Aguadita	3133335468	Solicitud de rampa	Técnico - social	Seguimiento
22	09 de febrero de 2024	Propietarios comerciantes	Aguadita	Varios	Reparación de anden	Técnico - social	Seguimiento
23	13 de febrero de 2024	Institución Educativa San Miguel	San Miguel	No reporta	Solicitud de material	Técnico - social	Seguimiento

Fuente: Copeba S.A.S

Registro Fotográfico 1 Ubicación Punto SAU



Foto 1: Punto SAU- 1 piso Vereda la Aguadita



Foto 2: Buzón - Punto SAU

Fuente: Copeba S.A.S

Tabla 11 Indicador de gestión -PQRS

Subprograma atención a la ciudadanía		
Indicador	Formula	Resultado
Productividad	Total, PQRS cerradas = 3 / Total, PQRS abiertas 23	13%

Fuente: Copeba S.A.S

4.6.2. Subprograma 2: información y divulgación

Se realizará por parte de la interventoría verificación a la ejecución de las acciones efectuadas por el contratista en la realización de las reuniones de inicio, extraordinarias y finalización, así mismo se evaluará las acciones de divulgación que se requieran para informar de manera oportuna y eficaz a las comunidades y entidades de los municipios de intervención.

Divulgación:

Se informó mediante el comunicado CNJ-ICCU708-O-0318 de 20 de marzo de 2024 la reprogramación de las actividades por suspensión de la Semana Santa para la comunidad de la aguadita y se relaciona comunicado:

Anexo 3 Soporte del contratista CONSORCIO PASCA CNJ

Tabla 12 seguimiento a piezas comunicativas

Fecha	Pieza	Tipo	Total	Observación
21 y 23 de septiembre de 2023	Oficios de invitaciones personalizada s	Socialización de reunión de inicio	7	Alcaldía municipal de Fusagasugá – Silvania Corregidor norte JAC. Agua bonita JAC. Aguadita Cootransfusa Expreso Fusacatan S. A
5 de octubre de 2023	oficios de invitaciones personalizadas- Socialización de inicio de obra	Cootransfusa	1	CNJ-ICCU708-O-0102
		Expreso Fusacatan S.A.	1	CNJ-ICCU708-O-0101
		Alcaldía Municipal de Fusagasugá	1	CNJ-ICCU708-O-0096
		Alcaldía Municipal de Silvania	1	CNJ-ICCU708-O-0097
		Corregidora Norte	1	CNJ-ICCU708-O-0098
		JAC - Aguadita	Vía WhatsApp - 3188481569	CNJ-ICCU708-O-0100
		JAC - Agua bonita		CNJ-ICCU708-O-0099
	Volante No 1. Socialización de inicio	Predio a predio Sectores - Aguadita y Agua bonita	69	Soporte - formato control de entrega de piezas comunicativas

Fecha	Pieza	Tipo	Total	Observación
29 de noviembre de 2023	Socialización predio a predio	Predio a predio Sector - Aguadita	6	Área directa de intervención
27 de diciembre de 2023	Volante No 2. Recomendaciones en la temporada vacacional	Alcaldía Municipal de Silvania	1	CNJ-ICCU708-O-0222
				Correo electrónico:
				contactenos@silvania-cundinamarca.gov.co
		Personería Municipal de Silvania	1	CNJ-ICCU708-O-0224
				Correo electrónico:
				personeria@silvania-cundinamarca.gov.co
28 de diciembre de 2023		Alcaldía Municipal de Fusagasugá	1	CNJ-ICCU708-O-0221
				Rad- R-2023-62679- ID:361659
		Personería Municipal de Fusagasugá	1	CNJ-ICCU708-O-0223
		Corredor vial - peaje Sibaté	200	Área directa de intervención
12 de enero de 2024		Corredor vial - peaje Sibaté	200	Peaje - Área directa de intervención
20 de marzo de 2024	oficio	Corregidora Norte	1	CNJ-ICCU708-O-0318
Total			492	Piezas comunicativas distribuidas

Fuente: Copeba S.A.S

Información:

Durante este periodo se llevaron a cabo diversas reuniones extraordinarias de acuerdo con las necesidades presentadas para el proyecto:

- El 07 de marzo de 2024, se realizó reunión extraordinaria con el señor Agustín Novoa para no efectuar la intervención del espacio público en el sector de la Agua bonita de su predio. Total, de asistentes: 3
- El 08 de marzo de 2024, se efectuó la reunión extraordinaria con la señora Zoila González, manifestó que el lote ubicado en el PR 13 + 060 al PR 13 + 090 la Aguadita está en proceso de sucesión y no contempla la intervención del espacio público. Total, de asistentes: 3
- El 15 de marzo de 2024, por solicitud de la corregidora norte y el propietario del predio del lote ubicado frente a la plaza Aguadita PR 13 + 060 al PR 13 + 090 se determinó la intervención del espacio público y se establecieron compromisos para su ejecución. Total, de asistentes: 7

Anexo 4 Actas de reuniones extraordinarias

Tabla 13 Seguimiento a reuniones mensuales

Fecha	Tema	Lugar	Hora	Asistentes	Observación
09 de octubre de 2023	Socialización de inicio	Salón comunal de la Aguadita	4:00 p.m.	43	Convocados sectores la Aguadita y Agua bonita

Fecha	Tema	Lugar	Hora	Asistentes	Observación
23 de noviembre de 2023	Reunión extraordinaria, JAC y comunidad del área directa de intervención	Salón comunal de la Agua bonita	2:30 p.m.	15	Convocada por la JAC y la comunidad del AID
13 de febrero de 2024	Reunión extraordinaria Institución Educativa Departamental San Miguel	Institución Educativa Departamental San Miguel	10:00 a.m.	3	Rector, contratista área técnica y social
13 de febrero de 2024	Reunión extraordinaria - tramo Pasca	Finca Pasca propietario señor Marco Fidel Guerrero	3:00 p.m.	3	Propietario, contratista área técnica y social
19 de febrero de 2024	Reunión extraordinaria comunidad del sector de la Cruz Chiquita	Salón comunal de la Agua bonita	4:00 p.m.	15	Comunidad del sector de la Cruz Chiquita
27 de febrero de 2024	Reunión extraordinaria - Agua bonita	Predio del señor Wilber Quintero - socialización de adecuación del Espacio Público	3:00 p.m.	5	Propietario, contratista área técnica y social
28 de febrero de 2024	Reunión extraordinaria - Aguadita	Predio de la señora Liliana Guasta - socialización de adecuación del Espacio Público	10:30 a.m.	5	Propietario, interventoría y contratista áreas técnica y social
07 de marzo de 2024	Reunión extraordinaria - Agua bonita	Predio del señor Agustín Novoa - socialización de adecuación del Espacio Público	11:00 a.m.	3	Propietario, contratista, áreas técnica y social
08 de marzo de 2024	Reunión extraordinaria - Aguadita	Predio de la señora Zoila González - socialización de adecuación del Espacio Público	4:30 p.m.	3	Propietario, contratista, áreas técnica y social
15 de marzo de 2024	Reunión extraordinaria - Aguadita	Socialización de adecuación del Espacio Público - lote PR 13 + 060 al PR 13 + 090	10:30 a.m.	7	Corregidora norte, propietario, interventoría y contratista áreas técnica y social

Fuente: Copeba S.A.S

Tabla 14 Indicador de gestión – Información y divulgación

Subprograma de información y divulgación		
Indicador	**Formula**	**Resultado**
Productividad	Total, reuniones realizadas en el mes = 3 / Total, reuniones programadas en el mes 3	100%
Productividad	Total, de piezas comunicativas entregadas en el mes = 1 / Total de piezas comunicativas programadas en el mes 1	100%

Fuente: Copeba S.A.S

4.6.3. Subprograma 3: cultura vial y participación comunitaria

La interventoría verificara las estrategias propuestas por el contratista en los procesos que se lleven a cabo con las comunidades del área de intervención directa en la implementación de las metodologías educativas y de sostenibilidad que contribuyan al mejoramiento del entorno.

Para el presente informe se ha recomendado al contratista mediante el comunicado SOC-ICCU-815-2023-023. Dar celeridad en la inversión proyectada en el PAGA para la elaboración de los talleres en la fase de finalización del proyecto con las instituciones educativas para no tener pasivos sociales en la fase de liquidación.

Tabla 15 Indicador de gestión – cultura vial y participación comunitaria

Subprograma cultura vial y participación comunitaria		
Indicador	**Formula**	**Resultado**
Productividad	Total, de talleres propuestos =	0/0*100% =0%

Fuente: Copeba S.A.S

5. Comunicaciones

Se relacionan los oficios remitidos al contratista de obra a continuación, se anexan comunicaciones:

Anexo 5 Comunicaciones enviadas

Tabla 16 Consolidado de comunicaciones enviadas

Fecha	Consecutivo	Solicitud
Periodo agosto de 2023		
22 de agosto de 2023	SOC-ICCU-815-2023-001	Recomendaciones para la entrega del documento PAGA
22 de agosto de 2023	SOC-ICCU-815-2023-002	Respuesta al comunicado CNJ-ICCU708-O-0039 y observaciones al documento PAGA.
30 de agosto de 2023	SOC-ICCU-815-2023-003	Respuesta al comunicado CNJ-ICCU708-O-0043 ajuste a las observaciones del documento PAGA. Concepto de aprobación del componente social.
Periodo septiembre de 2023		
6 de septiembre de 2023	SOC-ICCU-815-2023-004	Ajuste a las observaciones del documento PAGA
14 de septiembre de 2023	SOC-ICCU-815-2023-005	Observaciones al informe No1 de la Gestión Social radicado CNJ-ICCU708-O-0063

Fecha	Consecutivo	Solicitud
25 de septiembre de 2023	SOC-ICCU-815-2023-006	Aprobación del informe No 1 de la Gestión Social
29 de septiembre de 2023	SOC-ICCU-815-2023-007	Recomendaciones para la socialización de inicio de obra
Periodo octubre de 2023		
12 de octubre de 2023	SOC-ICCU-815- 2023-008	Observaciones al informe mensual de la gestión social No.2
20 de octubre de 2023	SOC-ICCU-815- 2023-009	Aprobación del informe No. 2 de las Gestión Social
Periodo noviembre de 2023		
14 de noviembre de 2023	SOC-ICCU-815- 2023-010	Observaciones al comunicado CNJ-ICCU708-O-0154, informe Mensual No. 3 de la gestión social.
20 de noviembre de 2023	SOC-ICCU-815- 2023-011	Aprobación del informe No. 3 de las Gestión Social
Periodo diciembre de 2023		
07 de diciembre de 2023	SOC-ICCU-815- 2023-012	Observaciones al comunicado CNJ-ICCU708-O-0188, informe Mensual N°4 de la Gestión Social.
14 de diciembre de 2023	SOC-ICCU-815- 2023-013	Aprobación informe mensual N°4 de la Gestión Social.
15 de diciembre de 2023	SOC-ICCU-815- 2023-014	Incumplimiento al cierre de las PQRS
Periodo enero de 2024		
09 de enero de 2024	SOC-ICCU-815- 2023-015	Observaciones al informe No. 5 de la Gestión social
29 de enero de 2024	SOC-ICCU-815- 2023-016	Aprobación al informe mensual N°5 de la gestión social

Fecha	Consecutivo	Solicitud
29 de enero de 2024	SOC-ICCU-815- 2023-017	Recomendaciones para dar trámite a los cierres y la ejecución en la fase final para el cumplimiento del PAGA
Periodo febrero de 2024		
12 de febrero de 2024	SOC-ICCU-815- 2023-018	Observaciones del informe mensual social No 6
20 de febrero de 2024	SOC-ICCU-815- 2023-019	Recomendaciones sociales
20 de febrero de 2024	SOC-ICCU-815- 2023-020	Aprobación al informe mensual N°6 de la gestión social
22 de febrero de 2024	SOC-ICCU-815- 2023-021	Traslado de oficio 13227425700026 de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá con "asunto: Solicitud información por ocupación y obras en intermediación de inmueble propiedad de la NACIÓN-DIAN del Consorcio PASCA CNJ en el marco del Contrato de Obra ICCU 708 DE 2023 Tramo 5"
Periodo marzo de 2024		
04 de marzo 2024	SOC-ICCU-815- 2023-022	Traslado de oficio 00373945 Remitente: Destinatario: CONSORCIO PASCA CNJ, asunto: Solicitud de suministro de material RCD
12 de marzo 2024	SOC-ICCU-815- 2023-023	Observaciones del informe mensual social No 7 respuesta al comunicado CNJ-ICCU708-O-0306
18 de marzo de 2024	SOC-ICCU-815- 2023-024	Aprobación al informe mensual N°7 de la gestión social

Fuente: Copeba S.A.S

5.1 Informes mensuales

Se relaciona el anexo el informe del contratista correspondiente al mes de febrero de 2024

Tabla 17 Seguimiento a la entrega del informe mensual

Fecha	Interventoría /contratista	Estado
21 de septiembre / 2023	Informe social No. 1 – interventoría	Correo electrónico No objeción
25 de septiembre / 2023	Informe social No. 1 – contratista	SOC-ICCU-815-2023-006- Aprobación
13 de octubre de 2023	Informe social No. 2 – interventoría	Correo electrónico No objeción
20 de octubre de 2023	Informe social No. 2 – contratista	SOC-ICCU-815-2023-009 - Aprobación
20 de noviembre de 2023	Informe social No. 3 – interventoría	Correo electrónico No objeción
20 de noviembre de 2023	Informe social No. 3 – contratista	SOC-ICCU-815- 2023-011 Aprobación
14 de diciembre de 2023	Informe social No. 4 – contratista	SOC-ICCU-815- 2023-013

		Aprobación
29 de enero de 2024	Informe social No. 5 – contratista	SOC-ICCU-815- 2023-016 Aprobación
20 de febrero 2024	Informe social No. 6 – contratista	SOC-ICCU-815- 2023-020 Aprobación
18 de marzo de 2024	Informe social No. 7 – contratista	SOC-ICCU-815- 2023-024 Aprobación

Fuente: Copeba S.A.S

Anexo 6 Informe contratista

5.2 Comité social

A continuación, se relaciona el seguimiento de las actividades de la Gestión Social:

Fecha	Lugar	Hora	Asistentes	Observación	Enlace actas
13 de septiembre de 2023	Virtual meet.google .com/iex-vfgf-rhc	3:45: p.m..	3	Logística de reunión de inicio	https://drive.google.com/drive/folders/14h6juTCXS2Gvd405C7Q-wiPTx4BqO9_4?usp=drive_link
27 de octubre de 2023	ICUU	8:30: a. m	3	Comité social	
23 de noviembre de 2023	Punto PAC	10: 00 a.m.	2		
7 de diciembre de 2023	Virtual	10: 00 a.m.	3		
19 de febrero de 2023	Punto PAC	10: 00 a.m.	2		

6.

7. Conclusiones

Se concluye la verificación y seguimiento de las obligaciones contractuales especificadas en el PAGA que se han desarrollado de acuerdo con las obligaciones específicas de la gestión social y efectuadas durante el mes en el desarrollaron las actividades propuestas. De igual manera se presenta el resultado de las actividades propuestas:

- En la fase final la contratación continúa realizando el seguimiento al personal para ejecución de actividades se cuenta con las certificaciones municipales a la fecha se cuenta con 17 personas del área directa de intervención.

- Se continua con el cierre y entrega de copias de actas de vecindad en los sectores de Agua bonita y aguadita para presente informe se cuenta con 37 actas cerradas.

- Se adelantaron reuniones extraordinarias con la comunidad con el fin de establecer compromisos y ajustes a las dinámicas de la obra para viabilizar las actividades del proyecto.

- Se continua con el seguimiento para el cierre de las PQRS interpuestas por la comunidad donde se encuentran un consolidado de (23) veintitrés PQRS pendientes por cierre y (20) PQRS cerradas (3) tres.

- Se entregan comunicación a la comunidad de la aguadita por la suspensión de los trabajos en Semana Santa.

Anexo 1. Soportes de contratación MONC y MOC

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.

CONTRATISTA: CONSORCIO PASCA CNJ | INTERVENTOR: COPEBA S.A.S

CONTRATO ICCU: 708 de 2023 | CONTRATO ICCU: 815 DE 2023

CONSOLIDADO CONTRATACIÓN MANO DE OBRA NO CALIFICADA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FECHA		CEDULA	EMPRESA	ACTIVO-A / RETIRDO R	TIPO DE POBLACIÓN	PROCEDENCIA	OBSERVACIÓN
		INGRESO	EGRESO						
HUBER SNEIDER MORALES REY	AUX DE TRAFICO	2/08/2023	N/A	1003519563	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	FUSAGASUGA	CERT RESIDENCIA
LUIS FERNANDO CHAPARRO PINEDA	AUX DE TRAFICO	2/08/2023	N/A	91498359	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	FUSAGASUGA	CERT RESIDENCIA
MIGUEL ANDRES BERMUDEZ BUENO	AYUDANTE DE OBRA	9/08/2023	N/A	1003520064	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	AGUADITA	CERT RESIDENCIA
ELIANA PATRICIA ROZO MOLINA	AUX DE TRAFICO	22/08/2023	N/A	1069730169	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	TIERRA NEGRA	CERT RESIDENCIA
LEIDY JOHANA ALVAREZ GONZALEZ	AUX DE TRAFICO	22/08/2023	N/A	1069744142	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	AGUABONITA	CERT RESIDENCIA
MAURICIO SANABRIA	AYUDANTE DE OBRA	30/08/2023	N/A	11255257	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	FUSAGASUGA	CERT RESIDENCIA
JOSE AUGUSTO PORRAS HASTAMORIR	AYUDANTE DE OBRA	18/09/2023	N/A	3129331	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	AGUABONITA	CERT RESIDENCIA
JHONATAN DANIEL TABACO PINEDA	AYUDANTE DE OBRA	15/09/2023	11/03/2024	1069755520	JMS INGENIERIA SAS	R	N/A	TIERRA NEGRA	CERT RESIDENCIA
LUIS ALVARO MACIAS NUÑEZ	AYUDANTE DE OBRA	21/09/2023	11/03/2024	81741452	JMS INGENIERIA SAS	R	N/A	AGUABONITA	CERT RESIDENCIA
ADRIANA MILENA PULIDO MESA	AUX DE TRAFICO	21/09/2023	N/A	1007847172	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	VEREDA LOS ROBLES	CERT RESIDENCIA
JESUS DANIEL FEO SALCEDO	AUX DE TRAFICO	21/09/2023	N/A	1006502823	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	FUSGASUGA	CERT RESIDENCIA
SERGIO ANDRES CASTILLO RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	29/09/2023	N/A	1007772949	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
JOSE DUVER CADENA GUZMAN	AYUDANTE DE OBRA	29/09/2023	N/A	93086432	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
JOSE DANIEL ORDOÑEZ MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	29/09/2023	N/A	1072749535	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
JAIME ALEJANDRO VERGARA BANQUET	AYUDANTE DE OBRA	29/09/2023	N/A	19592687	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
JAIME ALBERTO ARROYO GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	5/10/2023	N/A	1129537047	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
ALEXANDER DE LA CRUZ MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	12/10/2023	22/03/2024	1079911023	CONSTRUOBRA	R	N/A	BOGOTA	
ALVARO LOPEZ RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	27/10/2023	N/A	11230874	CONSTRUOBRA	A	N/A	BOGOTA	
CESAR JULIO AMAYA SIERRA	AYUDANTE DE OBRA	31/10/2023	N/A	5824796	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
CARLOS WILLIAM CASTIBLANCO UPEGUI	AYUDANTE DE OBRA	31/10/2023	N/A	14323979	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
JIANCARLO PALACIOS	AYUDANTE DE OBRA	13/11/2023	N/A	1033791974	CONSTRUOBRA	A	N/A	BOGOTA	
REINERIO DE JESUS LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	15/11/2023	22/03/2024	4572780	CONSTRUOBRA	R	N/A	BOGOTA	
LUIS MANUEL GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA	15/11/2023	N/A	5.436.913	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
ELIECER DE JESUS CUBILLOS PELA	AYUDANTE DE OBRA	21/11/2023	N/A	80.819.326	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
MANUEL ALEJANDRO CELEITA GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA	21/11/2023	N/A	1069765545	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	FUSAGASUGA	CERT RESIDENCIA
LUIS RICARDO GIL PARRA	AYUDANTE DE OBRA	23/11/2023	N/A	1031127075	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	AGUADITA	
LUIS ALBERTO GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA	23/11/2023	N/A	3170951	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	FUSAGASUGA	
ANTONY DANIEL GUEVARA ANGULO	AYUDANTE DE OBRA	30/11/2023	N/A	6125902	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
JAIDER DE JESUS JIMENEZ EGARA	AYUDANTE DE OBRA	27/12/2023	N/A	1048320507	CONSTRUOBRA	A	N/A	BOGOTA	
KEVIN EDUARDO DIAZ RIVEROS	AYUDANTE DE OBRA	27/12/2023	N/A	1000137161	CONSTRUOBRA	A	N/A	BOGOTA	
CESAR JULIO GUTIERREZ RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	9/01/2024	N/A	85083863	R7	A	N/A	BOGOTA	
DAMAR ANTONIO GUTIERREZ GAMERO	AYUDANTE DE OBRA	9/01/2024	N/A	1080019776	R7	A	N/A	BOGOTA	
JHAN FRANCO DE LA HOZ GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA	9/01/2024	N/A	1080017416	R7	A	N/A	BOGOTA	
ALBERT RAFAEL GUTIERREZ DE LA CURZ	AYUDANTE DE OBRA	9/01/2024	N/A	85081914	R7	A	N/A	BOGOTA	
DAVISON LEON CLAROS	AYUDANTE DE OBRA	29/01/2024	14/02/2024	1078751142	CONSTRUOBRA	R	N/A	BOGOTA	
ELIAS JOSE GONZALEZ TUIRAN	AYUDANTE DE OBRA	31/01/2024	1/03/2024	1118861965	CONSTRUOBRA	R	N/A	BOGOTA	
MONICA LIZETH ROMERO AHUMADO	AUXILIAR DE TRAFICO	1/02/2024	N/A	1069735057	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	AGUABONITA	CERT RESIDENCIA
KEVIN STIVEN ROMERO AHUMADO	AUXILIAR DE TRAFICO	1/02/2024	N/A	1029141425	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	SANTA ISABEL	CERT RESIDENCIA
ANYELA MILENA GARCIA GARZON	AUXILIAR DE TRAFICO	1/02/2024	N/A	52294878	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	SANTA ISABEL	CERT RESIDENCIA
ANGELICA MARIA PAEZ JIMENEZ	AUXILIAR DE TRAFICO	1/02/2024	N/A	1069763722	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	FUSAGASUGA	
EDUIN JOSE HERNANDEZ RAMIREZ	AUXILIAR DE TRAFICO	14/02/2024	N/A	1032461388	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	CORREGIMIENTO NORTE	CERT RESIDENCIA
SANDRA MARCELA DUARTE RAMIREZ	AUXILIAR DE TRAFICO	14/02/2024	1/03/2024	53931775	JMS INGENIERIA SAS	R	N/A	AGUADITA	
JUAN GILBERTO QUINTERO DUITAMA	AUXILIAR DE TRAFICO	15/02/2024	N/A	1069715398	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	LA PALMA	CERT RESIDENCIA
YURI ALEXANDRA BOBADILLA SOACHA	AUXILIAR DE TRAFICO	15/02/2024	N/A	1003614537	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	LA AGUADITA	
HARRY ESTEBAN ROJAS CICUAMIA	AYUDANTE DE OBRA	7/02/2024	N/A	1034279401	SOLUCIONES R&A S.A.S	A	N/A	BOGOTA	
WILBERTO CASTELLANOS PIÑA	AUXILIAR DE CONTRUCCIÓN	7/02/2024	N/A	5658826	SOLUCIONES R&A S.A.S	A	N/A	BOGOTA	
JHON ALEXANDER CARDONA	AYUDANTE DE OBRA	9/02/2024	N/A	1032387817	JOSE ARGEON MORA SERRANO	A	N/A	BOGOTA	
JOSE HERIBERTO LOPEZ ROJAS	AYUDANTE DE OBRA	9/02/2024	N/A	3080739	JOSE ARGEON MORA SERRANO	A	N/A	BOGOTA	
REINEL RIOS ZEA	AYUDANTE DE OBRA	9/02/2024	N/A	5935728	JOSE ARGEON MORA SERRANO	A	N/A	BOGOTA	
OSCAR IVAN POLO QUINTERO	AYUDANTE DE OBRA	12/02/2024	N/A	1065882096	JOSE ARGEON MORA SERRANO	A	N/A	BOGOTA	
JHAN CARLOS POLO QUINTERO	AYUDANTE DE OBRA	12/02/2024	N/A	1065903456	JOSE ARGEON MORA SERRANO	A	N/A	BOGOTA	
FERNANDO HUERTAS POLO	AYUDANTE DE OBRA	12/02/2024	N/A	9690916	JOSE ARGEON MORA SERRANO	A	N/A	BOGOTA	
JOSE ALEXANDER ANZOLA RUIZ	AYUDANTE DE OBRA	16/02/2024	N/A	6101976	JOSE ARGEON MORA SERRANO	A	N/A	BOGOTA	
YSIDRO RAFAEL RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	16/02/2024	N/A	6698415	JOSE ARGEON MORA SERRANO	A	N/A	BOGOTA	
FRANK EDUARD MORENO MADRID	AYUDANTE DE OBRA	16/02/2024	N/A	88243803	JOSE ARGEON MORA SERRANO	A	N/A	BOGOTA	
CRISTIAN DARIO BARRAGAN VACA	AYUDANTE DE OBRA	20/02/2024	24/03/2024	1003518449	R7	R	N/A	BOGOTA	
CHISTIAN ALEJANDRO ROJAS RAMIREZ	AUXILIAR DE CONSTRUCCION	20/02/2024	N/A	1019005395	SOLUCIONES R&A S.A.S	A	N/A	BOGOTA	
ARNOL GARCIA ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	21/02/2024	22/03/2024	1073674157	CONSTRUOBRA	R	N/A	BOGOTA	
MAICOL ESTIBEN GARCIA ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	21/02/2024	22/03/2024	1012328306	CONSTRUOBRA	R	N/A	BOGOTA	
ALEXIS GARCIA OSPINA	AYUDANTE DE OBRA	21/02/2024	22/03/2024	1012391529	CONSTRUOBRA	R	N/A	BOGOTA	
JAIR FERNEY GARZON CESPEDES	AYUDANTE DE OBRA	21/02/2024	22/03/2024	1030545408	CONSTRUOBRA	R	N/A	BOGOTA	
JUAN JOSE LIZARAZO ZAMBRANO	AYUDANTE DE OBRA	21/02/2024	N/A	1069722158	CONSTRUOBRA	A	N/A	BOGOTA	
SANDRA LILIANA CLAVIJO GAITAN	AUXILIAR DE TRAFICO	8/03/2024	N/A	39626744	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	FUSAGASUGA	
JHON JAIRO VILLAMIL MENDOZA	AYUDANTE DE OBRA	11/03/2024	N/A	79985177	SOLUCIONES R&A S.A.S	A	N/A	BOGOTA	
HERNANDO LLANOS SANHEZ	AYDUANTE DE OBRA	12/03/2024	24/03/2024	12202193	R7	R	N/A	BOGOTA	

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.

CONTRATISTA: CONSORCIO PASCA | INTERVENTOR: COPEBA S.A.S

CONTRATO ICCU: 708 de 2023 | CONTRATO ICCU: 815 DE 2023

CONSOLIDADO CONTRATACIÓN MANO DE OBRA CALIFICADA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FECHA		CEDULA	EMPRESA	ACTIVO-A / RETIRDO R	TIPO DE POBLACIÓN	PROCEDENCIA	OBSERVACIÓN
		INGRESO	EGRESO						
WILLIAM LEONARDO OLIVEROS	DIRECTOR DE OBRA	1/08/2023	N/A	1026270626	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	SIBATE	
JOSE ALEXANDER CAICEDO BARRIOS	INGENIERO RESIDENTE	2/08/2023	N/A	93089177	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
GERSSON REYNEL BENITEZ GONZALEZ	INSPECTOR VIAL	2/08/2023	N/A	1026568117	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
NATALIA QUECHO SARMIENTO	PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES	1/08/2023	N/A	37901187	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
NERIETH DEL PILAR SALAS JARA	AMBIENTAL	1/08/2023	N/A	1119816708	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
DANIELA RIVEROS TRIANA	PROFESIONAL SOCIAL	1/08/2023	N/A	1110561485	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
JOSE ALEJANDRO ESPINOSA RIVEROS	ESP PAVIMENTOS	4/08/2023	N/A	93373726	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
SERGIO DAVID HERNANDEZ BURGOS	TOPOGRAFO	4/08/2023	N/A	1022399163	PEDRO ARIZA TUNJANO	A	N/A	BOGOTA	
OSCAR RAMIREZ PARRA	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	11/08/2023	N/A	79610058	OSCAR RAMIREZ PARRA	A	N/A	BOGOTA	
EDGAR ARDILA ROA	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	11/08/2023	N/A	79424918	CONSORCIO INTERVENTORÍA BOGOTÁ	A	N/A	BOGOTA	
JONNY ARLEY CASTRO CANDIA	ESPECIALISTA HIDRAULICO	1/09/2023	N/A	1121823741	GEVIAL	A	N/A	BOGOTA	
MIGUEL ENRIQUE BEJARANO	CONDUCTOR	22/08/2023	N/A	11434789	TRANSPORTE MARTINEZ	A	N/A	BOGOTA	
YURY KARINA GAITAN MARTINEZ	INSPECTOR SST	10/08/2023	N/A	1069726650	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	FUSAGASUGA	CERT RESIDENCIA
EDGAR YOVANNY MARTINEZ DAZA	INSPECTOR DE OBRA	2/08/2023	N/A	10293659	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
MAURICIO MESTIZO DIAZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	18/08/2023	N/A	80366796	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
LUDWING ALBERTO CABALLERO PEÑA	OPERADOR DE MAQUINARIA	22/08/2023	N/A	1096228451	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
PLACIDO ARIMESDY POVEDA	OFICIAL DE OBRA	30/08/2023	N/A	83116084	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
JOSE DANIEL GOMEZ ESPEJO	INSPECTOR DE OBRA	21/09/2023	N/A	12229993	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
OSCAR DANILO ABRIL HURTADO	CONDUCTOR	5/09/2023	30/03/2024	79189427	TRANSPORTE MARTINEZ	A	N/A	BOGOTA	
EDUIN ALEXANDER SANTANA MORENO	OPERADOR DE MAQUINARIA	21/09/2023	N/A	80182197	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
ERASMO VASQUEZ ARIAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	25/09/2023	N/A	1049896430	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
JAIRO ANTONIO LOAIZA ZULUAGA	OPERADOR DE MAQUINARIA	25/09/2023	N/A	75003056	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
MARCO ANTONIO BARRETO PAREDES	TOPOGRAFO	25/09/2023	N/A	18882284	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
JEIMY VIVIANA FRESNEDA PATIÑO	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	26/09/2023	N/A	1013627428	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
JEISON BEDOYA VILLADIEGO	RASTRILLERO	29/09/2023	N/A	1085038745	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
VICTORINO MATTOS CENTENO	RASTRILLERO	29/09/2023	N/A	93089177	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
PLINIO RINCON PEDRAZA	TORNILLERO	29/09/2023	N/A	79415678	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
FAUSTO ALEJANDRO ZAMUDIO MARTINEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	29/09/2023	N/A	80832576	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
LUIS MAURICIO CAMARGO GONZALEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	29/09/2023	N/A	80437219	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
LUIS CARLOS RUEDA CAMACHO	OPERADOR DE MAQUINARIA	29/09/2023	N/A	79002788	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
CARLOS TAPASCO AZCARATE	INSPECTOR DE OBRA	3/10/2023	N/A	1115945364	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
BRAIJAN EDUARDO SILVA FLOREZ	TORNILLERO	10/10/2023	N/A	1071915076	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
CARLOS ANDRES GARCIA RIOS	OPERADOR DE MAQUINARIA	10/10/2023	N/A	1124242978	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
CRISTOBAL FLOREZ ESCOBAR	OFICIAL DE OBRA	18/10/2023	N/A	18974955	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
CAMILO RUIZ CASTILLO	OPERADOR DE MAQUINARIA	27/10/2023	N/A	1069475131	FCR CONSTRATISTAS S.A.S	A	N/A	BOGOTA	
ALVARO BOTIA PINILLA	OPERADOR DE MAQUINARIA	31/10/2023	N/A	79452903	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
DONALDO NAVARRO ESQUEA	RASTRILLERO	31/10/2023	N/A	19618708	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
JOSE RENE GONZALEZ RODRIGUEZ	RASTRILLERO	31/10/2023	N/A	93202523	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
JOHN JAIVER VELASCO MOSQUERA	INSPECTOR DE OBRA	31/10/2023	N/A	79924405	CONSTUOBRAS	A	N/A	BOGOTA	
OSCAR JAVIER SIERRA CHARRY	OPERADOR DE MAQUINARIA	14/11/2023	N/A	17616651	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA	A	N/A	BOGOTA	
JHON KENNEDY LAVAO CABEZA	OFICIAL DE OBRA	15/11/2023	N/A	1121838904	CONSTUOBRAS	A	N/A	BOGOTA	
GERMAN ANDRES CASTRO SERNA	OPERADOR DE MAQUINARIA	15/11/2023	N/A	1.022.989.298	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
OSCAR HERNANDO RAMIREZ BOLIVAR	CONDUCTOR	1/12/2023	N/A	79701813	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
JOHN SEBASTIAN RODRIGUEZ	INSPECTOR DE OBRA	4/12/2023	N/A	1002365346	JMS INGENIERIA SAS	A	N/A	BOGOTA	
JOHANA MILENA JAIMES MARIN	TOPOGRAFO	9/01/2024	N/A	1013659041	PEDRO ARIZA TUNJANO	A	N/A	BOGOTA	
HENRY ENRIQUE RUA DOMINGUEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	9/01/2024	N/A	1067593903	JMS INGENIERIA	A	N/A	BOGOTA	
GUSTAVO RODRIGUEZ PINEDA	OFICIAL DE OBRA	15/01/2024	N/A	74358720	CONSTRUOBRA	A	N/A	BOGOTA	
JUAN SEBASTIAN BARRETO BONILLA	INSPECTOR DE OBRA	29/01/2024	N/A	1023947834	CONSTRUOBRA	A	N/A	BOGOTA	
MAURICIO BERNAL BERNAL	OFICIAL DE OBRA	31/01/2024	2/03/2024	79668686	CONSTRUOBRA	R	N/A	BOGOTA	
ORLANDO BERNAL BERNAL	OFICIAL DE OBRA	31/01/2024	2/03/2024	79768634	CONSTRUOBRA	R	N/A	BOGOTA	
JUAN CARLOS CHARRIS RUA	RESIDENTE DE OBRA	31/01/2024	N/A	8496851	R7	A	N/A	BOGOTA	
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ GALVIS	OFICIAL DE OBRA	7/02/2024	N/A	1010224232	SOLUCIONES R&A S.A.S	A	N/A	BOGOTA	
EMERSON BOLAÑO CASTILLO	OFICIAL DE OBRA	7/02/2024	N/A	10183574	SOLUCIONES R&A S.A.S	A	N/A	BOGOTA	
OSCAR HERNANDO MORA SERRANO	ENCARGADO DE OBRA	9/02/2024	N/A	79547096	JOSE ARGEON MORA SERRANO	A	N/A	BOGOTA	
ADRIANA MARIA SAAVEDRA	INGENIERO RESIDENTE	12/02/2024	N/A	65824937	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA	A	N/A	BOGOTA	
LEONEL FUENMAYOR GARCIA	OFICIAL DE OBRA	12/02/2024	5/03/2024	1317289	R7	R	N/A	BOGOTA	
ADOLFO SAMUEL LOPEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	21/02/2024	N/A	5107445	FCR CONSTRATISTAS S.A.S	A	N/A	BOGOTA	
JHON MILLER CARDENAS CARVAJAL	AMARRADOR DE HIERRO	25/02/2024	15/03/2024	79976643	SOLUCIONES R&A S.A.S	R	N/A	BOGOTA	
PAULINO DIAZ SALAS	OFICIAL DE OBRA	9/01/2024	N/A	8828412	R7	A	N/A	BOGOTA	
LUIS DANIEL GARZON BELTRAN	OFICIAL DE OBRA	19/01/2024	N/A	79202246	CONSTRUOBRA	A	N/A	BOGOTA	
JIMMY FABIAN RAMIREZ ZABALA	OFICIAL DE OBRA	13/03/2024	13/03/2024	79989946	CONSTRUOBRA	R	N/A	BOGOTA	
JORGE ELIECER MORENO	OFICILA DE OBRA	13/03/2024	13/03/2024	11385239	CONSTRUOBRA	R	N/A	BOGOTA	
JUAN DARIO GUASCA MORENO	OFICILA DE OBRA	13/03/2024	13/03/2024	11385619	CONSTRUOBRA	R	N/A	BOGOTA	

Medellín, 05 de Abril de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de JMS INGENIERIA SAS, en el centro de trabajo 0000000021 - ICCU 708, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C52294878	GARCIA GARZON ANYELA MILENA	01/02/2024		195tE244	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C519880652409653251

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/04/2024 14:47:31 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 200.118.16.108, 192.230.104.5, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA SANTA ISABEL
NIT:901279741-6
PERSONERIA JURIDICA N°00693 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 1972

La **JUNTA** de **ACCION COMUNAL** de la vereda **SANTA ISABEL** del municipio de Silvania, en cabeza de su presidenta

CERTIFICAN QUE:

La Señora **ANYELA MILENA GARCIA GARZON** identificado con CC **52294878** de **Bogotá**, reside en la vereda **Santa Isabel**, finca Montecillo, desde hace más de 5 años.

La presente se expide a los 26 (VEINTISEIS) días del mes de febrero de 2024, a solicitud del interesado.

Atentamente

GLADIS ZAMBRANO
Presidenta
J.A.C. Santa Isabel

Correo electrónico: jacsantaisabel1972@gmail.com- teléfono 3108577767-3107847239

Anexo 2 copias y actas de vecindad de cierre

FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			ICCU
CODIGO FO-SC-19	**PROCESO** Divulgación e información	**VERSION** 3.0	

TIPO DE PIEZA: Entrega de Actas de vecindad.

CONTRATO ICCU N°: 308 de 2023 **RESPONSABLE:** Daniela R. **FECHA** Marzo.

DEPARTAMENTO: Cundinamarca **MUNICIPIO:** Fosagasuga **VEREDA:** Aguadita **TRAMO:** Aguadita - Espacio publico.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Adriana Milena Duarte B.	Arepa con amor	3232825285	Aguadita	xAdriana Duarte	1	
2	Alejandro Bermudez	Jeronimo.	300691012	Aguadita.	x	1	
3	Gloria Suarez	N/A	N/A	Aguadita	xGloria Suarez	1	
4	Liliana Gaita	Restaurante.	3134871820	Aguadita	x	2	
5	Milena Quintero	N/A.	3202713064.	Aguadita.		1	
6	Nohemi Garcia	N/A	3134565440	Aguadita	NOHEMI	1	
7	Aleida Marin.	N/A	3125214460	Aguadita	xAleida Marin	1	
8	Graciela Chavez	N/A	3186731885	Aguadita.	graciela chavez	1	
9	Jorge Ivan Prieto	La Playita.	3125841291	Aguadita.	JP	1	
10	Gladys Sobogal	Niña Bonita	3175242181	Aguadita	Gladys Sabogal	1	
11	Jorge Enrique Montaño.	N/A	3112311119	Aguadita,	Jorge E Montaño	2	
12	Jose Isidro Amador.	N/A	3142517494	Aguadita	JoseIsidroA	1	
13	Julio Sandro Rodriguez	Iglesia.	3103279415	Aguadita.		1	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 15

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Daniela Rivelos	
FIRMA	Daniela R.	

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	05/03/24 (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**: Cundinamarca	**Municipio**: Fusagasugá	**Vereda**: Aguadita	**PR**
Dirección	N/A - Sabiopan.	**Teléfonos**	3103371564	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Luis Luz Andrea Bejarano	CC No.	35252756	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		Propia	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Luz Andrea Bejarano	CC No.	35252756	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	Ninguno
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	Ninguno

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Ninguno	No se presentaron afectaciones al predio y se encuentra en las mismas caracteristicas del acta inicial

FIRMAS

Firma Nombre: Daniela R. **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1110561485	Firma Nombre: Alexander Carreño **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 70202-382427	Firma Nombre: GIOVANNI ARIZA ARIAS **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.: 2520-74614	Firma Nombre: Andrea Bejarano **Testigo** C.C. O NIT: 35252756

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.		FECHA	05/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**		

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACION

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1110561485	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 70202-38 2427	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoria** Matrícula profesional No 2522-206164	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT: 35252756

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	06/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas: 4, En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	13/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Cundinamarca	Fusagasuga	Aguadita	

Dirección	Droguería - Residencial.	Teléfonos	3124641813
Nombre de la persona que atiende la visita:	Leidy Viviana Gomez	CC No.	1069713332
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		Propia
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Leidy Viviana Gomez	CC No.	1069713332

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno.

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Ninguno.	El predio no presenta afectación y presenta las mismas caracteristicas del acta inicial.

FIRMAS

Firma	Daniela Rivera	Firma		Firma		Firma	
Nombre:		Nombre:	Alexander Carreño	Nombre:		Nombre	
Responsable Unidad Social		**Ing. Residente Contratista**		**Ing. Residente Interventoría**		**Testigo**	
C.C. O NIT:	1110561485	Matrícula profesional No.:	70202-382427	Matrícula profesional No.:	2520-74566	C.C. O NIT:	

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	13/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACION

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma
Nombre: Daniela R.
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 1110561485

Firma
Nombre: Alexander Cardozo
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 70202-382427

Firma
Nombre: [illegible]
Ing. Residente Interventoria
Matrícula profesional No.: 2582-74664

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.		FECHA 13/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas: 4, En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.
FECHA	19/03/24 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 708 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 815 / 2023 | **Acta de Vecindad de Cierre**

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Cundinamarca	Fusagasugá	Aguadita.	

Dirección	N/A	**Teléfonos**	3212364847
Nombre de la persona que atiende la visita:	Jesús ospina	CC No.	5828236
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		Propia
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Jesús ospina	CC No.	5828236.

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DANOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno
DANOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno.

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Ninguno.	NO hubo afectación en el predio. El(acta) predio se encuentra en las mismas condiciones del acta inicial.

FIRMAS

Firma	Daniela R.	Firma	Firma
Nombre:		Nombre: Alexander Cortes	Nombre: Jesus Ospina
Responsable Unidad Social		**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoria**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1110561485		Matrícula profesional No.: 70202-382427	Matrícula profesional No.: 25202-74644	C.C. O NIT:

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA 19/03/24 (Dia / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACION

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma
Nombre: Daniela R.
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 1110561485

Firma
Nombre: Alexander Carreño
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 70202-332477

Firma
Nombre: GABRIEL ARIZA ALLAS
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No. 25702-76646

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas: 4, En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1


OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	13/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Cundinamarca	Fusagasugá	Aguadita.	

Dirección	El ciclista	Teléfonos	3142732377
Nombre de la persona que atiende la visita:	Jorge Vargas	CC No.	11386305
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		Arriendo
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Martha Isabel velasquez	CC No.	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA

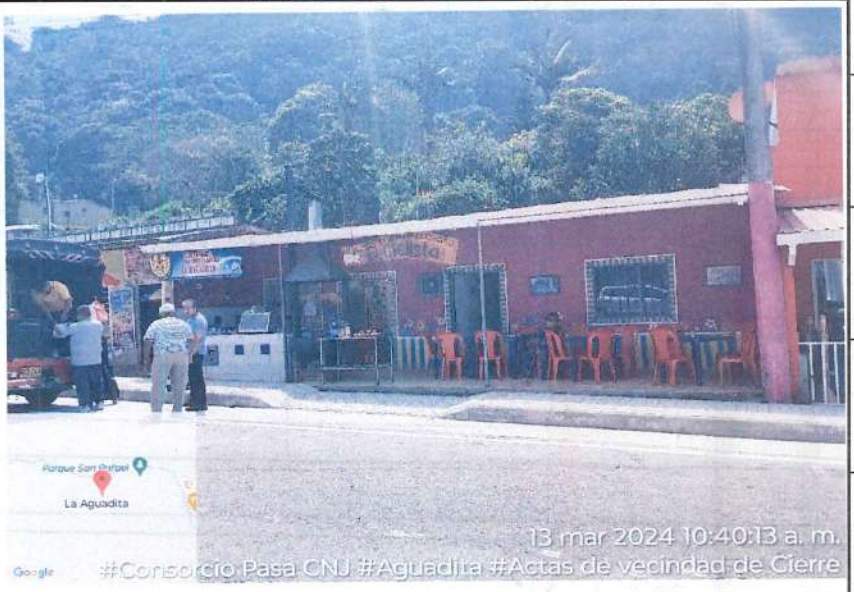

3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Ninguno.	No se evidencian afectaciones al predio y presenta las mismas caracteristicas del acta inicial.

FIRMAS

Firma Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1110561485.	Firma Nombre: Alexander Carrillo **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 70202-382427	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.: 2352-74SAC	Firma Nombre x Jorge Vargas **Testigo** C.C. O NIT: 11386305

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGA – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	13103 124 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACION

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1110561485	Firma Nombre: A. Gil B. Alexander Gonzalo **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 70202-382427	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No 2520-70649	Firma Nombre Jorge Vargas **Testigo** C.C. O NIT: 11386705

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.		FECHA 13/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoria No. 815 / 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas: 4, En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Cundinamarca	Fusagasuga	Aguadita.	
Dirección	N/A	Teléfonos	3203713064	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Milena Quintero	CC No.	53931787	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		Propia	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Lilia Eodora Quintero	CC No.	20567777	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno.

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Ninguno	El predio no presenta afectaciones y se encuentra en las mismas condiciones del acta inicial.

FIRMAS

Firma	Nombre:	Cargo	C.C. O NIT:
Daniela R.		Responsable Unidad Social	1110561485.
	Alexander Caicedo	Ing. Residente Contratista	Matrícula profesional No. 70202-382427
	GIOVANNI ARIZA ARIAS	Ing. Residente Interventoría	Matrícula profesional No. 2520Z-74644
Sandra Milena Quintero		Testigo	53.931.787.

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACION

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma Nombre: Daniela R. **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1110561485	Firma Nombre: Alexander Caicedo **Ing. Residente Contratista** Matricula profesional No.: 70202-382427	Firma Nombre: [illegible] **Ing. Residente Interventoria** Matricula profesional No.: 2542-71614	Firma Nombre x Sandra Milena Quintero **Testigo** C.C. O NIT: 53.931.787

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 4, En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: **Contratista.**
Copias: **Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.**

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	13103124 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**: Cundinamarca	**Municipio**: Fusagasugá	**Vereda**: Aguadita	**PR**
Dirección	Don Jeronimo.	**Teléfonos**	3006091012	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Alejandro Bermudez	CC No.	82.394061.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		Apoio.	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Alejandro Bermudez	CC No.	82394061	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	Ninguno
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	Ninguna

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Ninguna.	El predio no presenta afectación y se encuentra en las mismas condiciones del acta inicial.

FIRMAS

Firma: Daniela R.	Firma:	Firma:	Firma: x
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1110561485.	Matrícula profesional No.: 70202-382427	Matrícula profesional No.: 70202-796056	C.C. O NIT:

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA 13/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACION

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma Nombre: Daniela R. **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1110561485.	Firma Nombre: A. Alexander Cortés B. **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 70202-382427	Firma Nombre: [illegible] **Ing. Residente Interventoria** Matrícula profesional No.: 25202-74684	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	13/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas: 4, En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	13/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**: Cundinamarca	**Municipio**: Fusagasugá	**Vereda**: Aguadita.	**PR**
Dirección		**Teléfonos**	3134643357	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Gloria Suarez	CC No.	39 660365.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		Propia	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Gloria Suarez	CC No.	39610365	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	Ninguno
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	Ninguno

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Ninguno	El predio no presenta afectación, y se encuentra en las mismas caracteristicas del acta inicial

FIRMAS

Firma: Daniela R. Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1110561485	Firma: Nombre: Alexander Acevedo **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 70202-382427	Firma: Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.: 25252-74626	Firma: x Gloria Suarez Tenorio Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	13/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACION

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma Nombre: Daniela R. **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1110561485	Firma Nombre: A. Alexander Cruz B. **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 70202-382427	Firma Nombre: [illegible] **Ing. Residente Interventoria** Matrícula profesional No.: 25252-76524	Firma Nombre Obra Suárez Herrera **Testigo** C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	13103124 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	13/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**: Cundinamarca	**Municipio**: Fusagasugá	**Vereda**: Aguadita.	**PR**
Dirección	Restaurante.	**Teléfonos**	3134871828	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Liliana Goata	CC No.	35250855	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		Propia	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Liliana Goata	CC No.	35250855	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno.

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Ninguna	El predio no presenta afectacion y se encuentra en las mismas caracteristicas del acta inicial.

FIRMAS

Firma: Daniela R.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Alexander Cuellar Bo	Nombre: Gisselle Ariza Arias	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1110561485.	Matrícula profesional No.: 70202-382427	Matrícula profesional No.: 252-246446	C.C. O NIT: 35250855 Fagá

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.		FECHA 13/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma
Nombre: Daniela Riveros
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 1110561485

Firma
Nombre: Alexander Cuervo Bo
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 70202-382427

Firma
Nombre: GIOVANNI ARIZA ARIAS
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 2520-76644

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT: 35750855 F 9 96

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	13

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.		FECHA	13/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	Acta de Vecindad de Cierre		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA 19/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento** Cundinamarca	**Municipio** Fusagasugá	**Vereda** Aguadita.	**PR**
Dirección	NIA	**Teléfonos**	3134565440.	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Nohemi García.	CC No.	28994467	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		Arriendo.	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Lucero Riveros	CC No.	—	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	Ninguno
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	Ninguno.

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Ninguna	No se presentaron afectaciones al predio, se encuentra en las mismas condiciones del acta inicial.

FIRMAS

Firma: Daniela R.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Alexander Caicedo	Nombre: Giovanni Ariza Arias	Nombre: Nohemi García
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1110561485	Matrícula profesional No.: 70202-382427	Matrícula profesional No.: 25202-216240	C.C. O NIT: 28994467

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19/05/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACION

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma Nombre: Daniela R. **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1110561483	Firma Nombre: Alexander Carreño **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 70202-382427	Firma Nombre: GIOVANNI ARIZA ARIAS **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.: 2520-74624	Firma Nombre NOHEMI GARCIA **Testigo** C.C. O NIT: 28994467

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19103124 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO





Notas: 4, En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**: Cundinamarca	**Municipio**: Fusagasugá	**Vereda**: Aguadita	**PR**
Dirección	N/A	**Teléfonos**	3112311119.	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Jorge Enrique Montaño	CC No.	79119943	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		Propia	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Jorge Enrique Montaño	CC No.	79114943	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	Ninguno
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	Ninguno

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Ninguna	No presento afectacion en supredio. El predio se encuentra en las mismas caracteristicas del acta inicial.

FIRMAS

Firma: Daniela R. Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1110561485	Firma: Nombre: Alexander Carcedo **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 70202-382427	Firma: Nombre: ESQUAPLI ACTA ACUAJ **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.: 2520-71694	Firma: X Jorge E. Montaño Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACION

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma Nombre: Daniela R. **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1110561485.	Firma Nombre: Alexander Cuellar Bs. **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 70202-382427	Firma Nombre: GONZALO ARIZA ARIAS **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.: 2520-74644	Firma Nombre Jorge E. Portaro **Testigo** C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas: 4, En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19/05/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**: Cundinamarca	**Municipio**: Fusagasuga	**Vereda**: Aguadita.	**PR**
Dirección	Trochas HSA	**Teléfonos**	3125214460.	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Aleida Marin	CC No.	39620023	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		propia.	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Luis Hernan Daza.	CC No.	93388103	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	Ninguno
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	Ninguno.

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Ninguno.	El predio no presenta afectacion, se encuentra en las mismas caracteristicas del acta inicial

FIRMAS

Firma: Daniela R.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Alexander Carreño	Nombre: GLORIA MIRA ARIAS	Nombre: Aleyda Marin
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoria**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1110561485.	Matrícula profesional No.: 50202 - 352427	Matrícula profesional No.: 75202 - 246960	C.C. O NIT:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	14/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACION

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Daniela R.	Nombre: Alexander Castro	Nombre: [illegible]	Nombre [illegible]
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoria**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1.110561485	Matrícula profesional No.: 70202-382427	Matrícula profesional No. 2582-74614	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO





Notas: 4, En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**: Cundinamarca	**Municipio**: Fusagasuga	**Vereda**: Aguadita.	**PR**
Dirección	Nina Bonita.	**Teléfonos**	3173212181	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Gladys Sabogal	**CC No.**	20654616.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		Propia	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Glady Sabogal	**CC No.**	20654614	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DANOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno
DANOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno.

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Ninguna	El predio no sufrio afectacion, se encuentra con las mismas caracteristicas del acta inicial.

FIRMAS

Firma: Daniela R Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1110561485	Firma: Nombre: Alexander Cano B **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 70202-382427	Firma: Nombre: GIOVANNI ARIZA ARIAS **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.: 2520 2-74645	Firma: Gladys Sabogal Nombre **Testigo** C.C. O NIT: 20654616

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19 03 24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma Nombre: Daniela R. **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1110561485	Firma Nombre: Alexander Cabrera **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 70202-382427	Firma Nombre: GIOVANNI AVILA ACUÑA **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.: 25202-79696	Firma Nombre Gladys Sabogal **Testigo** C.C. O NIT: 20654616

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.		FECHA	14/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoria No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO







Notas: 4, En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Cundinamarca	Fusagasuga	Aguadita.	
Dirección	N/A	Teléfonos	3186731883	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Graciela chavez	CC No.	—	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		Propia.	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Graciela Chavez.	CC No.	—	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno.

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Ninguna	No hubo afectacion del predio. El predio se encuentra con las mismas caracteristicas del acta inicia

FIRMAS

Firma: Daniela R.	Firma: A. Ariel B.	Firma:	Firma: x Graciela Chavez S.
Nombre:	Nombre: Alexander Caicedo	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1110561485.	Matrícula profesional No.: 70202-382427	Matrícula profesional No.: 7520-74534	C.C. O NIT:

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19/05/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACION

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: Daniela R.	Firma:	Firma:	Firma: Graciela Chaves R.
Nombre:	Nombre: Alexander Cardozo	Nombre: GIOVANNI ARIZA ARIAS	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1110561485	Matrícula profesional No.: 702D2-382427	Matrícula profesional No.: 2520-74644	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO





Notas: 4, En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Cundinamarca	Fusagasuga	Aguadita.	
Dirección	La Playita.	**Teléfonos**	3125841291	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Jorge Ivan Prieto.	CC No.	11259856.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		Propia.	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Jorge Prieto Cates	CC No.	5934533	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DANOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	Ninguno
DANOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	Ninguno

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Ninguno	No hubo afectación al predio. El predio se encuentra en las mismas caracteristicas del acta inicial.

FIRMAS

Firma	Daniela R.	Firma		Firma		Firma	
Nombre:		Nombre:	Alexander Cabrera	Nombre:		Nombre	
Responsable Unidad Social		**Ing. Residente Contratista**		**Ing. Residente Interventoría**		**Testigo**	
C.C. O NIT:	1110561485	Matrícula profesional No.:	70202-382427	Matrícula profesional No.:	2582-74554	C.C. O NIT:	11259856

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19 03 24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACION

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma
Nombre: Daniela R.
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 1165614 85

Firma
Nombre: Alexander Cabezas
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. 70202-382427

Firma
Nombre: GIOVANNI ARIAS ARIAS
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 25202-74644

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT: 11259856

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19/03/24 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**

5. REGISTRO FOTOGRAFICO





Notas: 4, En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Cundinamarca	Fusagasuga	Aguadita	
Dirección	N/A	Teléfonos	3142517494	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Isidro Amador.	CC No.	11380058	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		propia	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Jose Isidro Amador	CC No.	11380058	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno.

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Ninguna	No hubo afectación en el predio. se encuentra en las mismas caracteristicas del acta inicial.

FIRMAS

Firma Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1105614485.	Firma Nombre: Alexander Cardenas **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 70202-382427	Firma Nombre: Stephanie Arias Arias **Ing. Residente Interventoria** Matrícula profesional No. 252a2-74664	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT: X Jose Isidro A

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.		FECHA 14 03 24 (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACION

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Dia / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [x] NO [ ]

Firma Nombre: Daniela R. **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1110561485.	Firma Nombre: Alexander Cabrera **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 70202-382427	Firma Nombre: GIOVANNI ARIZA ARIAS **Ing. Residente Interventoria** Matrícula profesional No.: 25252-76694	Firma Nombre Jose Isidro A **Testigo** C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	14103124 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas: 4, En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Cundinamarca	Fusagasuga	Aguadita	
Dirección	N/A	**Teléfonos**	3112311119	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Jorge Enrique Montaño	CC No.	79114943	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		Propia	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Jorge Enrique Montaño	CC No.	79114943	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno.

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Ninguno	No se generaron afectaciones al predio. El predio se encuentra en las mismas caracteristicas del acta inicial

FIRMAS

Firma: Daniela R.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Alexander Caicedo	Nombre: Susana Avila Arias	Nombre: Jorge E Montaño
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoria**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1110561485.	Matrícula profesional No.: 40202-382427	Matrícula profesional No.: 25202-246649	C.C. O NIT:

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA 19 03 24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACION

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma
Nombre: Daniela R.
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 1105614855.

Firma
Nombre: Alexander Cuervo
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 70202-382427

Firma
Nombre: GIOVANNI AVILA ARIAS
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 2520-76644

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT: Jorge E Montaño -


Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO



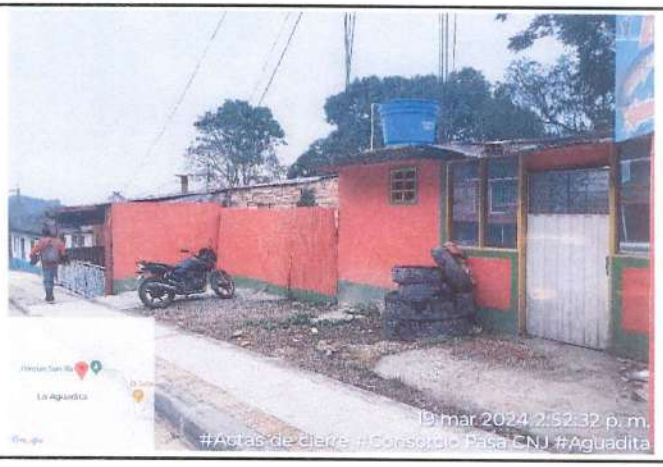

Notas: 4, En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

272

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	05/03/2024 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Cundinamarca	Fusagasugá	Aguadita	

Dirección	N/A - al lado de la Iglesia	Teléfonos	3173272787

Nombre de la persona que atiende la visita:	Gladys Sabogal	CC No.	20654616.

Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva	propia

Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Gladys Sabogal	CC No.	20654616

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Ninguno	El predio no presenta afectacion, Se encuentra en las mismas caracteristicas del acta inicial.

FIRMAS

Firma Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1110561485	Firma Nombre: **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 70202-382427	Firma Nombre: **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.: 2572-79604	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:
Daniela R.	Alexander Cancelo		Gladys Sabogal

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	05/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACION

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma: Daniela R.	Firma:	Firma:	Firma: Gladys Sabogal
Nombre: **Responsable Unidad Social**	Nombre: Alexander Cuervo **Ing. Residente Contratista**	Nombre: GIOVANNI ARIZA ARIAS **Ing. Residente Interventoría**	Nombre **Testigo**
C.C. O NIT: 1110561485	Matrícula profesional No.: 70202-382427	Matrícula profesional No.: 25202-74624	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	05/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas: 4, En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19/03/24 (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**: Cundinamarca	**Municipio**: Fusagasugá	**Vereda**: Aguadita.	**PR**
Dirección	Iglesia.	**Teléfonos**	3103274415	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Julio Sandio Rodriguez	CC No.	82390511	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		Arrend.	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Julio Sandio R.	CC No.	82390511	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1. Ninguno
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno.

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Ninguna.	No se realizo afectación en el predio. El predio se encuentra en las mismas caracteristicas del acta inicial.

FIRMAS

Firma Nombre: Daniela R. **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1110561485.	Firma Nombre: Alexander Caicedo **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 770202-382427	Firma Nombre: [illegible] **Ing. Residente Interventoria** Matrícula profesional No.: 25202-74664	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA 14/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma	Daniela R.	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Alexander Caicedo	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1105614185	Matrícula profesional No.: 3202-382427	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	19/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas: 4. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: **Contratista.**
Copias: **Interventor**, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del **INVIAS.**

278

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	05/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Cundinamarca	Fusagasuga	Aguadita	
Dirección	Finca	Teléfonos	3103382588	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Ines Mesa	CC No.	39618327	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		propia	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Ing Mesa	CC No.	39618327	

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☒
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	1 Ninguno

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Ninguno	No se presenta afectación en el predio, El predio presenta las mismas caracteristicas del acta inicial.

FIRMAS

Firma: Daniela R.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Alexander Cardozo	Nombre: GIOVANNI MEJIA ARIAS	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoria**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1110561485.	Matrícula profesional No.: 70202-382427	Matrícula profesional No.: 25202-74644	C.C. O NIT:

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	05/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACION

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma Nombre: Daniela R **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1110561435	Firma Nombre: Alexander Cabrera **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 70202-382427	Firma Nombre: GIOVANNI ACUÑA ACUÑA **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.: 25202-71686	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	05/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas: 4, En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA 15 3 24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de Cierre**

1. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
	Cundinamarca	Fusagasuga	Aguadita	

Dirección: Villa omar – Teléfonos: 3108691276

Nombre de la persona que atiende la visita: Jacinto Rodriguez Varela. CC No. 17.337.768

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — Propia

Nombre del responsable / propietario de la construcción: Jacinto Rodriguez Varela. CC No. 17.337.768

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

La construcción sufrió alguna afectación a causa de la intervención del proyecto	SI ☐ NO ☑
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	Ninguno
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (EXTERIORES E INTERIORES) 0. No aplica; 1. Ninguno; 2. Ligero; 3. Moderado; 4. Fuerte; 5. Severo	Ninguno.

ÁREA AFECTADA	DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
Ninguna	El propietario manifiesta que no se presentaron daños ni perjuicios.
	El propietario manifiesta que viajo para cumplir los compromisos adquiridos con el contrato.

FIRMAS

Firma: Daniela R.	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Alexander Caycedo	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 1110561485	Matrícula profesional No.: 70202-382427	Matrícula profesional No.: 25202 74649	C.C. O NIT: 17337768

ICCU	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	15 3 24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION MEDIDAS POR RECLAMACION

ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA (Día / Mes / Año)
El predio del señor Jacinto Rodriguez fue utilizado como acopio Temporal de materiales y parqueo provisional de maquinaria.	15-marzo 2024
A la fecha no se evidencian daños ni perjuicios en el Cole y Vivienda, por el contrario el propietario manifesta que se encuentra satisfecho con las actividades realizadas, renunciando a ningun tipo de reclamacion o o accion que pueda perjudicar al consorcio Pasca. CNJ.	
Encontrandose a paz y Salvo entre las partes.	

Firma el acta de cierre a satisfacción SI [X] NO [ ]

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1105614883.	Firma Nombre: Alexander Caicedo Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 70202-382427	Firma Nombre: GONZALO ARIZA ARIAS Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 2520-246060	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT: 17377768

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.
3. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	15 03 24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	Acta de Vecindad de Cierre	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO





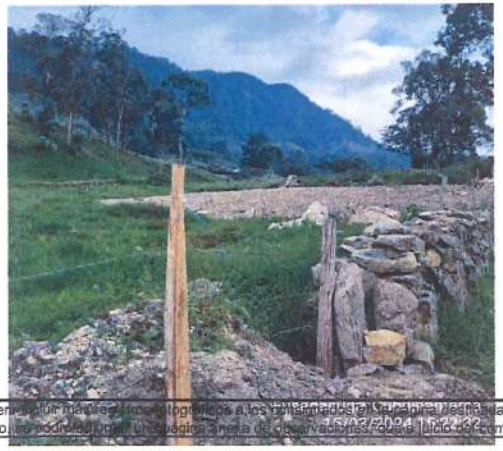



Notas: 4. En caso de requerir más registros fotográficos a los establecidos en esta hoja, se podrán insertar más páginas.
5. Si fuera necesario, se podrá utilizar una página anexa de observaciones, donde todo componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el diligenciamiento adecuado del formato.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del INVIAS.

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	13/03/2024 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio** [X] **Seguimiento** [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**: Cundinamarca	**Municipio**: Pasca	**Vereda**: –	**PR**: –	
Dirección	Finca el Mirador.	**Teléfonos**	3178136512		
Nombre de la persona que atiende la visita:	Marco Fidel Guerrero	CC No.	3650.568		
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		Propio		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Marco Fidel Guerrero	CC No.	3650569		
Edad de la construcción		No. de Apartamentos		No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	1	Mujeres jefes de hogar	0
Niños (menos de 14 años)	0	Adultos mayores (más de 60 años)	1	Personas en situación de discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	**1.** Urbano; **2.** Rural				Rural
ESTADO DEL PREDIO:	**1.** Sin edificar; **2.**Obra Gris; **3.** Terminado				1
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**1.** Sí ; **2.** No				NO
PENDIENTE DEL TERRENO	**1.** Plano; **2.** Ondulado; **3.** Escarpado				Ondulado.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
6, Internet		X	
7, Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				**ACCESOS VEHICULARES**
1. Residencial	[ ]	7. Educativo	[ ]	Garaje
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]	SI [X] NO [ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]	**Uso del garaje:**
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]	
5. Agropecuario	[ ]	11.Institucional	[ ]	
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[X]	

FIRMAS

Firma: Daniela R.	Firma: A. Cand Bo	Firma:	Firma: X
Nombre:	Nombre: Alexander Caicedo	Nombre: Gonzalo Avila Acuña	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1110561485.	Matrícula profesional No.: 70202-382427	Matrícula profesional No: 25202-74699	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	13/03/2024 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	**IRREGULARIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Pisca de cimentación	☐	☒ No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
☒ No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál?		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paneles en madera	☐	**TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
		1. Reformas (sí / no)		11. Pórticos y paneles en otros	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐			14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		15. Construcción improvisada	☐		
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	5. Estructuras ligeras	☐
5. Otro. Cuál?		8. Otro. Cuál?		17. Otro. Cuál?		6. Construcciones simples	☐
						7. Otro. Cuál?	

Observaciones: No aplica por ser lote - Finca.

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Propiedad con acceso a la finca en la parte posterior del predio, con cerramiento en alambre de puas, Finca en la que cultiva cebolla y mazorca.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:
En la parte que colinda a la vía se encuentra con cerramiento de alambre, y parte del terreno se esta usando temporalmente por el contratista para guardar maquinaria y campamento.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Predio con zona vegetal y parte del terreno con ~~bob~~ tierra. Tambien el terreno cuenta con zona rocosa.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
La finca tiene cerca de alambre de puas de 3 lineas, espacio que se esta utilizando como acopio temporal de material, disposición del campamento y parqueo de maquinaria.

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSECIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	13/03/2024 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	Acta de Vecindad de	Inicio ☑ Seguimiento ☐

5. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: no aplica

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Lote con vivienda al fondo de la finca, al cual no se permite el acceso porque el propietario no lo ve necesario.

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: N/A

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: N/A

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: N/A

ESTADO DE _____ (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: N/A

FIRMAS


Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT: 1110561408	Matrícula profesional No.: 70202-382427	Matrícula profesional No. 702-79644	C.C. O NIT:


Notas:
3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio del cual se va a recopilar información (sala, comedor, cocina, baño, habitación 1, habitación 2, entre otros)
4. Si en el predio se identifican más espacios interiores de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una o varias hojas complementarias que sigan los lineamientos preestablecidos.

	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSECIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.	FECHA	13/03/24 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

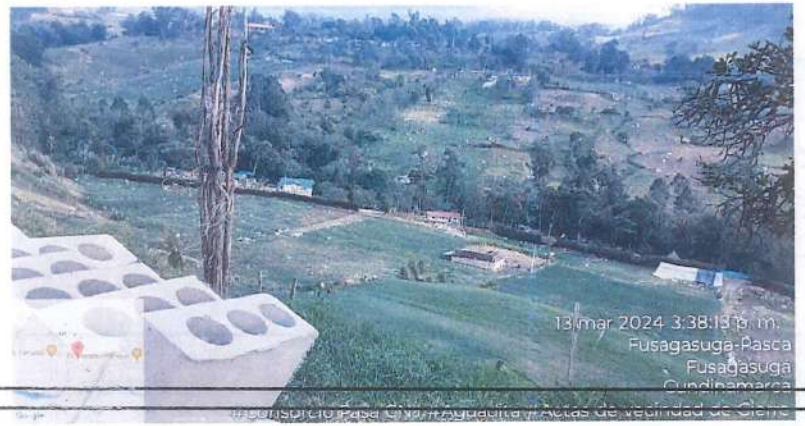

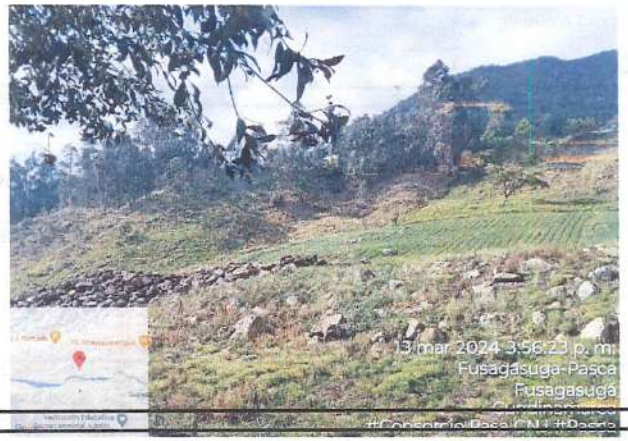






Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSECIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.		FECHA	13/03/24 (Dia / Mes / Año)
Contrato de Obra No. 708 / 2023	Contrato de Interventoría No. 815 / 2023	**Acta de Vecindad de**	**Inicio** ☒ **Seguimiento** ☐	

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION

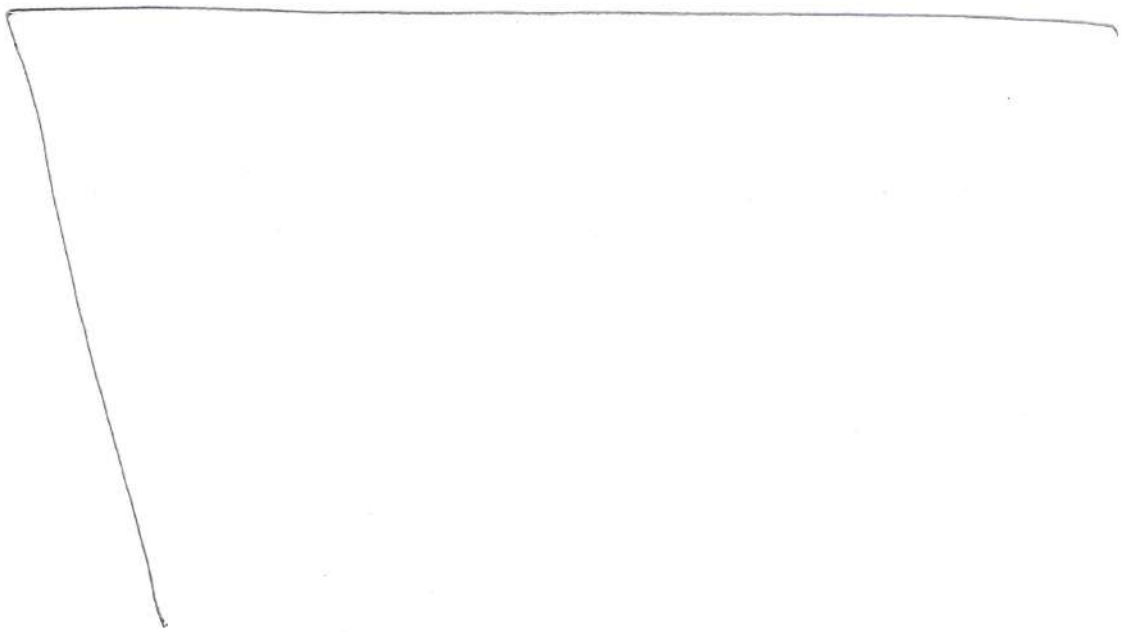

FIRMAS

Firma: Daniela R. Nombre: **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 1110561485	Firma: Nombre: Alexander Cuervo **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 70202-382427	Firma: Nombre: GUSTAVO ARIZA AVILA **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.: 25202-74604	Firma: Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Anexo 3. ***Oficio CONSORCIO PASCA CNJ***

CONSORCIO PASCA CNJ
NIT. 901.715.912-1

CONSORCIO PASCA CNJ

Rdo-H-032

CORREGIMIENTO NORTE
FUSAGASUGA
RECIBIDO NOV 20-03-2024
HORA 11:40 am
FIRMA Ana Teresa Zorrilla

Fusagasugá, 20 de marzo de 2024

CNJ-ICCU708-O-0318

Señora
JENNIFER MEJIA REYES
Corregidora Norte-Comunidad Vereda la Aguadita
Ciudad


Asunto: Reprogramación de trabajos de obra durante la Semana Santa

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el compromiso adquirido con ustedes en la reunión del 19 de febrero de 2024 en las instalaciones del salón comunal la Aguadita, que debido al inicio de la Semana Santa el contrato entra en suspensión a partir del 23 al 31 de marzo del 2024.

Por lo tanto, se reiniciarán las obras correspondientes a la reparación de las cintas de concreto en la vía Cruz Chiquita hasta el predio Villa Omar; así mismo, solicitamos de su colaboración en replicar la información a la comunidad de la vereda la Aguadita del cese de actividades durante la Semana Mayor.

De acuerdo con los compromisos adquiridos es importante que conozcan los avances que se han efectuado de acuerdo con las peticiones formuladas por la comunidad de vía Cruz Chiquita como se presenta a continuación en el registró fotográfico:

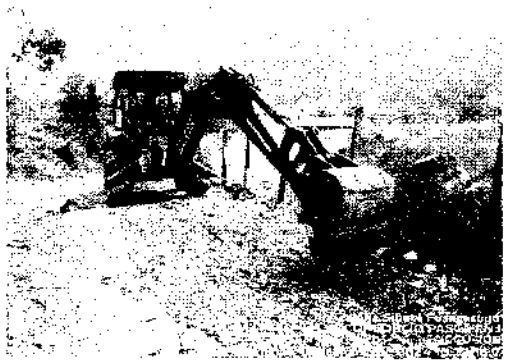



Adecuación de material en el predio Villa Omar



Adecuación y limpieza de cunetas

Esperamos que en la conmemoración de la Semana Mayor sea para ustedes del pleno desarrollo de sus tradiciones, les invitamos a conducir con prudencia en esta temporada, a respetar la señalización y a transitar con precaución.

Atentamente,

WILLIAM LEONARDO OLIVEROS RAMÍREZ
Director de Obra

Anexo 4 Actas de reuniones extraordinarias

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	01/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	07/03/2024	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	11:00 am	HORA FINALIZACIÓN:	11:20 am
LUGAR DE REUNIÓN:	Agua bonita - (carniceria)		
DEPENDENCIA:	Tecnico-social - Consorcio Pasca CNT		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunión Sr. Agustin sobre su espacio publico

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Sr Agustin solicita reunión para manifestar que no es necesario que se le realice el andén, debido a que el espacio publico se encuentra en buen estado, obra que el realizo con sus propios medios, lo que esta actualmente construido no esta dentro de las responsabilidades del contrato ICCU 708.

CONCLUSIONES

El Señor Agostin Novoa manifiesta que no se le realice intervención de anden, ya que el frente de su casa se encuentra en buen estado.

* No se realiza anden frente al predio del Sr. Agostin Novoa.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Agustin Novoa	1C. 3547600 Pasca	
William Oliveros Ramirez	icau708director@gmail.com	
Ing. Viviana Acevedo Patiño	Correspondencia.iccu708@gmail.com	

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	04/10/2022

FECHA DE REUNIÓN:	08/03/24	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	4:30 pm	HORA FINALIZACIÓN:	4:50 p.m.
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:	Tecnico - social		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Definir solicitud de anden predio de la Sra Zoila Gonzales, lote arrendado a Enel-Codensa)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Por decisión de la Sra. Zoila Gonzalez Florez no se realizará anden en el lote ubicado en la Aguadita, teniendo en cuenta que el uso actual del predio, en el cual implica la entrada de vehiculos pesados y la condición de ser un predio en sucesión el propietario solicitante desiste de su peticion de realizar anden.

CONCLUSIONES

La Sra. Zoila desiste de su peticion de realizar anden, en su lote (arrendado a enel-codensa)

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Zoila Gonzalez Florez	Zoilagonflor@gmail.com	
Daniela Rueda	iccu708social@gmail.com	
William Oliveros Ramirez	iccu708director@gmail.com	

ICCU	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	4/10/2022
FECHA DE REUNIÓN :	15-MARZO-24	ACTA No.			
HORA DE INICIO:	10:30	HORA FINALIZACIÓN:			
LUGAR DE REUNIÓN:	Salon Comunal Aguadita				
DEPENDENCIA:	Area Tecnica				
OBJETO DE LA REUNIÓN	Definicion construccion Arden frente a plaza de toros.				

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El propietario manifiesta que el lote es de uso comercial. a futuro el contrato de Codensa finaliza en abril y ya no realizan acceso de materiales.

La interventoria manifiesto que el uso del lote no es el adecuado para la construccion del espacio público.

El Contratista manifiesta al corregimiento y a los propietarios las condiciones de garantia. del contrato y el diseño de cerchas con malla electrosoldada. de acuerdo con lo estipulado por el contrato.

El propietario manifiesta que realizara la construcción de locales para lo que el contratista manifiesta que no realiza intervención de redes, se le sugiere revisar Tema de conexiones. Sobre la cuneta se les manifiesta que ya esta fundido y el alcantarillado esta bajo la estructura.

Actualmente funciona el lote como zona de cargue y descargue de basuras, adicionalmente como parqueadero.

Powered by CamScanner

CONCLUSIONES

- El propietario manifiesta realizar el cerramiento del lote.
- Desde la comunidad asumen la funcion de veedor y cuidado del espacio publico.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
• Realizar Cerramiento del lote para evitar parqueos.	1-abril-24.
• La comunidad se compromete a darle uso adecuado al espacio publico.	
• El contratista realizara la construccion del anden de acuerdo con el diseño estructural 42cm, geotextil, Geoceldo, malla electrosoldada y concreto.	1-abril-24

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Viviana Troncoso P.	correspondencia.lacv708@gmail.	
Aurelio José Alzate C.	@psoeviveo2@yahoo.com	
Carlos Vega	santahelena6t@gmail.com	
Zoila Gonzalez	santahelena6t@gmail.com	
Jennifer Mejia Reyes	[illegible]	
JOVANNY ARIZA ARIAS	Interventoria1cv8152@gmail.com	
Alexander Caicedo Barrios	lcev708residente@gmail.com	

Powered by CamScanner

Anexo 5 Comunicaciones

SOC-ICCU-815-2023-022

Bogotá, marzo 04 de 2024

SEÑORES:
CONSORCIO PASCA CNJ
Atn: Ing. Diego Espinoza
Representante Legal
consorciopasca@cyg.com.co
Cra.47A # 95-56 Ofc. 406
Bogotá

REF. CTO DE INTERVENTORÍA ICCU-815-2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".

ASUNTO: Traslado de oficio ***00373945 Remitente: Destinatario: CONSORCIO PASCA CNJ, asunto: Solicitud de suministro de material RCD***

Respetado Ingeniero:

De acuerdo al comunicado de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá con radicado 00373945 de fecha 01 de marzo de 2024 recibido por esta interventoría, realizamos el traslado de la solicitud su conocimiento y atención , la cual consiste en suministrar material RCD para el mantenimiento de las vías terciarias, para ello, la Secretaría de Infraestructura facilitará el transporte y traslado de material con volquetas del municipio, asimismo se contará con la certificación y cantidad del material.

Es necesario, se informe a esta interventoría la respuesta en un tiempo no mayor a dos (2) días hábiles, a partir de la fecha de recibo de la comunicación.

Cordialmente,

ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante Legal
COPEBA S.A.S.

Se anexa comunicación en 1 folio

Proyectó: Nury García López - Profesional Social

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00373945

Al contestar cite Radicado E-2024-02967 Id: 373945
Folios: 1 Fecha: 2024-03-01 10:06:16
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: CONSORCIO PASCA CNJ

Fusagasugá, marzo 01 de 2.024.

Señores:
CONSORCIO PASCA CNJ
E-mail: socialcopeba@gmail.com – interventoriaiccu815@gmail.com
La ciudad.

Atn.: Ing. ANDREA PEÑA SANCHEZ
Directora de Obra.


Asunto: Solicitud de suministro de material RCD

Respetada ingeniera:

Por medio de la presente y en forma respetuosa, me permito solicitarle se sirva apoyar a la Secretaría de Infraestructura, con el suministro de material RCD que se requiere para atender las solicitudes de mantenimiento de las comunidades, que utilizan para mejorar la movilidad en las vías terciarias del municipio de Fusagasugá.

La Secretaría de Infraestructura, está atenta para facilitar el transporte y traslado del material, con volquetas y personal de la dependencia, que ha bien lo requiera.

Cordialmente,



Raul Aranguren martinez
SECRETARIO DE DESPACHO

Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Destinatario.
1ª Copia: Secretaría de Infraestructura.
Proyectó: Juan Carlos Gámez Pabón.
Revisó y aprobó: Raúl Aranguren Martínez

SOC-ICCU-815-2023-023

Bogotá, marzo 12 de 2024

SEÑORES:
CONSORCIO PASCA CNJ
Atn: Ing. Diego Espinoza
Representante Legal
consorciopasca@cyg.com.co
Cra.47A # 95-56 Ofc. 406
Bogotá

REF. CTO DE INTERVENTORÍA ICCU-815-2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".

ASUNTO: OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL SOCIAL N°7_RESPUESTA AL COMUNICADO CNJ-ICCU708-O-0306

Respetado Ingeniero:

Luego de la revisión efectuada por esta interventoría al informe mensual social No.7 correspondiente al corte del 1 al 29 de febrero de 2024, se emiten las siguientes observaciones:

1. ***Subprograma 1: mano de obra contratada con enfoque de género, de derechos y diferencial:*** el total del personal de MONC, MOC y mujeres. (Verificar y ajustar incluyendo los indicadores), La revisión por parte de la interventoría y la base datos del contratista presenta los siguientes datos:

- Total: 110
- MONC: 49
- MOC: 61
- Mujeres:10

Base de datos contratista:

- Total: 126
- MONC: 66
- MOC: 65
- Mujeres:15

SOC-ICCU-815-2023-023

2. ***Programa 7: comunidades étnicas, preservación del patrimonio y sitios de interés sociocultural***
   El indispensable cerrar la consulta ante el ministerio del interior para el proceso de liquidación del contrato.

3. ***Programa 8: gestión social de infraestructura, predios y servicios públicos:*** incluir el excel en la relación de actas una vez sea devueltas por la interventoría proceder a incluirlas en el mismo anexo.

4. ***Subprograma 1: atención a la comunidad:*** se recomienda ir realizando los respectivos cierres y respuestas a la comunidad conforme a sus solicitudes interpuestas, asimismo esperamos las respuestas o las proyecciones para revisión de los traslados interpuestos por la DIAN y Secretaría de infraestructura de Fusagasugá.

5. ***Subprograma 3: cultura vial y participación comunitaria:*** Nos encontramos en la fase final del contrato, lo que significa que el tiempo para ejecutar el presupuesto social es limitado. Si no se avanza de manera diligente, existe el riesgo de no cumplir con la inversión social comprometida y propuesta en el PAGA, adicionalmente se convierte en un pasivo para el cierre del contrato.

La atención de estas observaciones, se deberá hacer en un término no mayor a un (1) día hábil, a partir de la fecha de recibo de esta comunicación.

Cordialmente,

ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante Legal
COPEBA S.A.S.

Proyectó: Nury García López - Profesional Social

SOC-ICCU-815-2023-024

Bogotá, marzo 18 de 2024

SEÑORES:
CONSORCIO PASCA CNJ
Atn: Ing. Diego Espinoza
Representante Legal
consorciopasca@cyg.com.co
Cra.47A # 95-56 Ofc. 406
Bogotá

REF. CTO DE INTERVENTORÍA ICCU-815-2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".

ASUNTO: APROBACIÓN AL INFORME MENSUAL N°7 DE LA GESTIÓN SOCIAL

Respetado Ingeniero:

Luego de la revisión efectuada por esta interventoría al informe mensual No.7 de la Gestión Social y luego de subsanar las observaciones realizadas al contenido, se emite APROBACIÓN al informe del asunto.

Cordialmente,

ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante Legal
COPEBA S.A.S.

Proyectó: Nury García López - Profesional Social

Anexo 6 Informe del contratista

CONTRATO ICCU No. 708 DE 2023

CONSORCIO PASCA CNJ

MARZO 2024

El presente documento rige para el desarrollo del contrato cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500"

CONTROL DE FIRMAS

	RESPONSABLE	CARGO
ELABORO	Daniela Riveros. **Daniela Riveros Triana**	**Profesional social**

APROBACION INTERVENTORIA

	RESPONSABLE	CARGO
REVISO	**Nury García**	**Profesional Social**
APROBO		

VERSION DE CAMBIOS

FECHA	VERSION	OBSERVACION
05/04/2024	**Versión 1**	
12/04/2024	**Versión 2**	Atención observaciones oficio SOC-ICCU-815-2023-025

Contenido

INTRODUCCION: 4
DATOS DEL CONTRATO 4
OBJETIVOS 5
OBJETIVO GENERAL 5
OBJETIVOS ESPECIFICOS 5
COMPONENTE SOCIAL 6
Subprograma1: mano de obra contratada con enfoque de género, de derechos y diferencial. 6
PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS. 7
Subprograma 1: infraestructura de predios y servicios públicos 7
PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL 9
Subprograma 1 Atención A La Comunidad 9
Conclusiones: 10
Listado de Anexos: 10
ANEXOS 11

INTRODUCCION:

El periodo por reportar es del 01 de febrero al 22 de marzo de 2024, Consorcio Pasca CNJ, realizo la gestión pertinente para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato en temas del componente social, queriendo mitigar, corregir y reducir los impactos que se generen por la ejecución de la obra, de acuerdo con lo establecido en la Guía de Manejo ambiental "PAGA", para el contrato No. ICCU 708 DE 2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500". A partir del 23 al 31 de Marzo de 2024, debido al inicio de la semana santa el contrato inicia en suspensión, por lo cual no se pueden ejecutar actividades.

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA – CONSORCIO PASCA CNJ

CONTRATO:	ICCU 708 DE 2023
OBJETO DE CONTRATO	"MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500"
FECHA DE INICIO	01-AGOSTO-2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	23-ABRIL-2024

INTERVENTORÍA – COPEBA

CONTRATO:	**ICCU 815 DE 2023**
OBJETO DE CONTRATO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500"
FECHA DE INICIO	01-AGOSTO-2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	23-ABRIL-2024

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Generar desde CONSORCIO PASCA CNJ, la atención a los actores sociales de la obra que se adelanta en la vía que conecta el municipio de Sibaté, Fusagasugá y Pasca, en el departamento de Cundinamarca, mediante procedimientos sociales que contribuyan a reducir y mitigar los impactos de la intervención en sus áreas de influencia, a través de los programas de la Guía de Manejo ambiental "PAGA".

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Brindar información clara y veraz a la población del área de influencia acerca de las actividades técnicas y operativas inherentes al proyecto, mediante la implementación de mecanismos de comunicación directos con la comunidad.
- Presentar informes mensuales según los programas ejecutados
- Propiciar el 30% de la vinculación de la mano de obra no calificada, pertenezcan al área de influencia directa a la intervención de la obra.
- Propiciar la contratación de mujeres de la zona de influencia

COMPONENTE SOCIAL

Acorde a lo estipulado en los términos de referencia del contrato, se reportan las siguientes actividades de seguimiento de las actividades sociales del periodo del 01 al 22 de marzo de 2024, las cuales están alineadas con el PAGA teniendo en cuanta la guía ambiental del 2022. En el marco del proyecto se realizan los siguientes subprogramas:

Subprograma1: mano de obra contratada con enfoque de género, de derechos y diferencial.

La meta del contrato es la vinculación del 30% de la población de mano de obra no Calificada del área de influencia directa a la intervención, siendo 25% hombres y 05% de mujeres como mínimo.

El reporte de contratación de mano de obra son la siguiente:

El total del personal fueron 107 personas, de las cuales Cincuenta y dos (52) son mano de obra no calificada, y cincuenta y cinco (55) son mano de obra calificada.

Del total del personal contratado diecisiete (17) son residentes del área de influencia directa, 16 son MONC y 1 es MOC.

- Se tienen contratadas catorce (14) mujeres.

Anexo1: Consolidado mano de obra no calificada
Anexo2: Consolidado mano de obra calificada
Anexo3. Certificados de ARL y Residencia

Indicador:

MONC: 17 personas MONC local *100%= 32.6%
52 personas MONC

MOC: 1 personas MOC local *100%= 1.8%
55 personas MOC

MONC mujer: 06 mujeres MONC local *100%=35.2%
17 personas MONC local

PROGRAMA 8. GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Subprograma 1: infraestructura de predios y servicios públicos







- Se realiza entrega de las actas de vecindad en Aguadita, se entregaron 15 actas de vecindad.
- Se vienen realizando las actas de cierre en Aguadita, las cuales se firman 20 actas de cierre en marzo para llevar un total de 37 actas de cierre firmadas.

Anexo4. Registro entrega de actas de vecindad Aguadita
Anexo5. Actas de cierre Aguadita
Anexo 6. Consolidado de actas de vecindad Aguadita y Aguabonita



Se realiza acta de vecindad, que se tenía pendiente en Aguabonita del predio de la Sra. Luz Marina Angarita.

Anexo7. Acta de vecindad Aguabonita- Luz Marina Angarita.

	
Se realiza acta de cierre al lote del sr Jacinto Rodriguez, que fue utilizado como acopio temporal de materiales y parqueo provisional de maquinaria, quedando paz y salvo. Anexo8. Acta de cierre Jacinto Rodriguez	

	
Se realiza acta de vecindad en el predio ubicado en Pasca, del sr Marco Guerrero propietario de la finca el Mirador Anexo9 Acta de vecindad Marco Guerrero-PASCA	

Indicadores:

Actas de vecindad Aguadita: 37 Actas de cierre *100%= 80.4%
46 viviendas aledañas

PROGRAMA 10. PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

Subprograma 1 Atención A La Comunidad

• Reunión Aguabonita El 07 de marzo de 2024, se realiza reunión por solicitud del propietario el Sr. Agustín Novoa, quien manifiesta que no se le realice el andén debido a que él realizo su espacio público y se encuentra en buen estado, quedando claro que lo que está construido no está dentro de las responsabilidades del contrato ICCU 708. Anexo10. Acta de reunión Sr Agustín-Espacio público Aguabonita	

- Se realiza reunión el 08 de marzo de 2024, con la Sra. Zoila Gonzalez, el cual desiste de su petición de realizar anden en su lote, teniendo en cuenta que el uso actual del predio arrendado a las empresas Enel y condensa, implica la entrada de vehículos pesados. (Anexo11. Acta de reunión-desistimiento de solicitud de anden). El 15 de marzo, se realiza reunión extraordinaria solicitada por la Sra. Zoila Gonzalez y corregidora Norte Jennifer Mejía Reyes, con el objetivo de definir construcción de anden frente a plaza de toros (Lote), queda como compromisos: realizar cerramiento del lote para evitar parqueos(Por parte del propietario), la comunidad se compromete a darle uso adecuado al espacio publico y el contratista realizara la construcción del anden de acuerdo con el diseño estructural 42cm geotextil, geocelda, malla electro soldada y concreto. (Anexo12. Acta Aguadita-Definición construcción de anden lote)

- Se realiza reunión en Aguabonita 15 de marzo de 2024, para definir construcción de espacio publico frente al polideportivo de Aguabonita, en lo que se concluye que el contratista revisara los recursos para la construcción de espacio público. (Anexo13. Acta Aguabonita – Polideportivo)

- Se realiza visita al sr Marco Guerrero propietario de la finca el Mirador (Pasca), para aclarar que la obra que se esta realizando en la vía que colinda con su finca, el espacio que se amplio es temporal, y sera removido para darle salida a las aguas del box. (Anexo14. Reunión MARCO GUERRERO-PASCA)



- Se remite oficio el 20 de marzo de 2024 a la corregidora Norte Jennifer Mejía Reyes y la comunidad, para informar que debido a la semana santa el contrato entra en suspensión a partir del 23 al 31 de marzo del 2024, por lo tanto, las actividades correspondientes a la reparación de las cintas de concreto en la vía Cruz Chiquita hasta el predio Villa Omar se reiniciaran la primera semana de abril. (Anexo15. Reprogramación de trabajos de obra durante semana santa)

Conclusiones:

- La contratación de mano de obra no calificada residente en la zona de influencia ha sido regular, debido a que ha disminuido la recepción de las hojas de vida.
- Se ha evidenciado la deserción de personal debido a que el contrato está próximo a finalizar.
- Se ha dado cumplimiento a los programas y subprogramas que se tienen estipulados dadas las características del contrato y su baja complejidad.

Listado de Anexos:

Anexo1: Consolidado mano de obra no calificada

Anexo2: Consolidado mano de obra calificada

Anexo3. Certificados de ARL y Residencia

Anexo4. Registro entrega de actas de vecindad Aguadita

Anexo5. Actas de cierre Aguadita

Anexo 6. Consolidado de actas de vecindad Aguadita y Aguabonita.

Anexo7. Acta de vecindad Aguabonita- Luz Marina Angarita.

Anexo8. Acta de cierre Jacinto Rodriguez

Anexo9 Acta de vecindad Marco Guerrero-PASCA

Anexo10. Acta de reunión Sr Agustín-Espacio público Aguabonita

Anexo11. Acta de reunión-desistimiento de solicitud de anden.

Anexo12. Acta Aguadita-Definición construcción de anden LOTE

Anexo13. Acta Aguabonita – Polideportivo

Anexo14. Reunión MARCO GUERRERO-PASCA

Anexo15. Reprogramación de trabajos de obra durante semana santa

INFORME DEL PROFESIONAL SISO DE INTERVENTORÍA

[redacted]

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA - ICCU 815 DE 2023

PERÍODO DE EJECUCIÓN: DEL 01 AL 22 DE MARZO 2024

[redacted]

SEGUIMIENTO AL INFORME

En la siguiente tabla, se relaciona la distribución de entrega del presente informe:

COPIAS DIGITALES

DEPENDENCIA	No. DE COPIAS
COPIA 1 - OFICINA INTERVENTORÍA. ARCHIVO	1

CONTROLES DE ELABORACIÓN

Elaboración Prof. Jhon Peña Guzmán Profesional SISO Fecha 26/03/2024	
Revisión y aprobación: ING. Andrea del Pilar Peña S. Directora de Interventoría Fecha:	
Revisión y aprobación Oficina principal Copeba S.A.S. Fecha:	

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
..... 5
2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST 6
3. POLITICAS 7
3.1 Política De Seguridad y Salud en el Trabajo 7
3.2 Política De Prevención De No Acoso Laboral 7
3.3 Política Integrada De Prevención De No Consumo De Alcohol, Drogas Y Tabaco 8
4. SISTEMA DE GESTÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 9
4.1 MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO 9
4.1.1 Exámenes Medico Ocupacionales 9
4.1.2 Certificado de Aptitud Laboral. 9
4.1.3 Inducción al Personal. 9
4.1.4 Registros de Capacitaciones. 10
4.1.5 Inspección de vehículos 10
4.1.6 Investigación de Accidentes. 10
4.1.7 Afiliaciones y aportes parafiscales Interventoría. 10
5. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 10
5.1 Elementos de Protección personal (E.P.P's) 10
6. ACTIVIDADES REALIZADAS 11
6.1 Actividades realizadas por el Contratista – Marzo 2024 11
6.2 Personal de Obra a corte Marzo 2024 11
6.4. Retiros de Personal de Obra – Mes Marzo de 2024 14
6.5. Actividades realizadas por la Interventoría – Mes Marzo 2024 14
6.6 Personal Interventoría 15
6.7. Ingresos Interventoría 16
6.8. Retiros Interventoría 16
7. MAQUINARIA Y VEHÍCULO 16
7.1. MAQUINARIA Y VEHÍCULO CONTRATISTA 16
7.2. VEHÍCULOS INTERVENTORÍA 18
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES CONTRATISTA 19
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES INTERVENTORÍA 20
10. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 21
10.1 Acciones Preventivas 21
10.2 Acciones Correctivas 21
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21
11.1 Conclusiones 21
11.2 Recomendaciones 21
ANEXOS 23

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602
Tel. (Fax) 6012564013 - 3102015021
E-mail interventoriaiccu815@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El trabajo, es la base y fundamento de la vida social e individual, ya que se ha convertido en la actividad por medio de la cual el hombre se relaciona con la naturaleza para satisfacer sus necesidades y desarrollarse a sí mismo.

Dentro del medio laboral, el trabajador interactúa con diferentes condiciones de trabajo que pueden afectarlo positiva o negativamente, por lo cual se establece una relación directa entre la SALUD y el TRABAJO entendida como el vínculo del individuo con la labor que desempeña y la influencia que sobre la salud acarrea dicha labor.

La Seguridad y Salud en el Trabajo busca con la intervención de varias disciplinas busca dicho cuidado, por lo cual en el presente documento se relacionan las actividades dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por la interventoría COPEBA S.A.S, en el marco del Contrato de Interventoría ICCU-815 DE 2023, cuyo objeto es; INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL “MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500”.

A continuación, se presenta la información general de la Interventoría en concordancia a la normatividad del Ministerio del Trabajo y Ministerio de Protección Social, así como también, se especifican las actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo desarrolladas por la interventoría de acuerdo a la normatividad (Decreto 1072 del 2015 y Resolución de 0312 del 2019), en la ejecución de las obras del contrato de la referencia.

1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el Departamento de Cundinamarca, al sur de la ciudad de Bogotá entre los municipios de Chusacá, Sibaté, Fusagasugá y Pasca, el corredor se encuentra mayoritariamente ubicado dentro de la Provincia de Sumapaz. El tramo en el estudio, se encuentra ubicado sobre la sabana sur occidental, tiene una longitud de 23.668 kilómetros.

A continuación, se presenta la localización de los tramos que comprende el proyecto, según el alcance específico por vía y la sectorización del proyecto.



Fuente: Anexo Técnico proceso ICCU-LP-020 DE 2023

2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST

La empresa COPEBA S.A.S, expresa sus objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a la Política de seguridad y salud en el trabajo y coherentes con el plan anual de trabajo para el año 2024.

1. Disminuir la accidentalidad y aparición de enfermedades de origen laboral
2. Fortalecer los conocimientos de seguridad y salud en el trabajo, mediante la implementación de un Plan Anual de Capacitación.
3. Implementar eficazmente las medidas de prevención y control de acuerdo a la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
4. Realizar las evaluaciones médicas requeridas para el monitoreo de las condiciones de salud de los trabajadores.
5. Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602
Tel. (Fax) 6012564013 - 3102015021
E-mail interventoriaiccu815@gmail.com

3. POLITICAS

3.1 Política De Seguridad y Salud en el Trabajo

COPEBA S.A.S establece dentro de sus prioridades, la protección de la seguridad y salud de los trabajadores directos, temporales, contratistas y proveedores de la empresa, mediante la prevención y control de riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

Es compromiso de COPEBA S.A.S, dar cumplimiento a la legislación nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que apliquen y los demás requisitos que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo ha suscrito la empresa. Con este fin, la Gerencia se compromete a asignar los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para el adecuado desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta política será divulgada y publicada a todos los colaboradores de la empresa Copeba S.A.S, para tener así su cooperación y participación, siguiendo el ejemplo manifestado y demostrado desde el compromiso gerencial de COPEBA S.A.S.

3.2 Política De Prevención De No Acoso Laboral

COPEBA S.A.S, está comprometida a proporcionar un ambiente de trabajo sano, seguro y adecuado a sus trabajadores, implementando mecanismos que erradiquen el acoso laboral, contando con la participación de los trabajadores y la alta Gerencia.

Los colaboradores tienen derecho a trabajar en un entorno libre de toda forma de discriminación y conductas que se puedan considerar hostigamiento o alteración.

Por su parte COPEBA S.A.S, se compromete a prevenir las conductas de acoso laboral y a defender el de todos(as) los (as) trabajadores(as) para ser tratados con dignidad en el trabajo, de manera que se integre la prevención de estas conductas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de lograr una colaboración conjunta en la instauración en el plan de prevención contra el acoso laboral en el lugar de trabajo. Los encargados de las distintas áreas que componen esta organización fomentaran la exclusión de cualquier tipo de hostigamiento entre las posibles conductas, tanto de dirigir a los(as) trabajadores(as) como de relación de estos entre sí.

Cualquier persona involucrada en un comportamiento de hostigamiento será sujeta a investigación de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, procedimientos y sus respectivas medidas disciplinarias.

3.3 Política Integrada De Prevención De No Consumo De Alcohol, Drogas Y Tabaco

COPEBA S.A.S, ha establecido la presente política con el fin de prevenir entre sus colaboradores, los contratistas y subcontratistas, el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas (incluyendo drogas legales, inhalantes, drogas legales no prescritas medicamente o usadas por fuera de las instrucciones de un médico) para preservar la salud, seguridad y bienestar, previniendo riesgos para su integridad y productividad. En razón de lo anterior:

- Se prohíbe el consumo de alcohol y drogas, por parte de los empleados, visitantes y contratistas, durante las horas de trabajo, sean estas dentro o fuera de las instalaciones de la misma.
- Se prohíbe el ingreso a laborar a las diferentes áreas de la empresa en estado de embriaguez o bajo efecto de sustancias psicoactivas.
- Se prohíbe fumar en las instalaciones cerradas de la organización, así como en las áreas donde haya riesgo de incendio o explosión. En Copeba S.A.S, se respira un ambiente libre de humo.
- Se prohíbe el uso ilícito de drogas legales o el uso, posesión, distribución y venta de drogas ilegales por parte de empleados y contratistas en las instalaciones de la organización o en el desarrollo de sus negocios.
- La empresa podrá realizar pruebas de alcohol y sustancias psicoactivas, directamente o a través de terceros, en cualquier momento o cuando exista razones para sospechar del abuso y/o consumo de las mismas por parte de un trabajador.

La gerencia de Copeba S.A.S, velará por el cumplimiento a lo establecido en este documento, y será de estricto cumplimiento por todos los colaboradores y demás empresas vinculadas.

Las políticas anteriores son divulgas al personal cada vez que ingresan a laborar en Copeba S.A.S, donde en el mes de marzo de 2024, se dan a conocer dichas políticas al nuevo integrante de COPEBA S.A.S, en el proyecto.

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602
Tel. (Fax) 6012564013 - 3102015021
E-mail interventoriaiccu815@gmail.com

4. SISTEMA DE GESTÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1 MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO

El subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, tiene como objetivo promover, prevenir y controlar la salud del trabajador, a través de la identificación, control y seguimiento de los factores de riesgos ocupacionales, para que su sitio de trabajo sea acorde con unas condiciones de trabajo psico-fisiológicas y ambientales adecuadas.

Las actividades que se llevan a cabo en este programa son las siguientes:

4.1.1 Exámenes Medico Ocupacionales

Se realizan evaluaciones médicas ocupacionales que permiten a la empresa obtener un Diagnóstico de Salud de su población trabajadora, donde pueden visualizar la distribución demográfica, los riesgos a los que están expuestos sus colaboradores y las patologías encontradas en ellos; estén o no relacionadas con el trabajo, facilitándoles brindar acompañamiento para la promoción y prevención de la salud de los empleados no solo en el ambiente laboral, también las orienta en la implementación de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica.

Los exámenes ocupacionales de pre-Ingreso evalúan la salud física, mental y social del candidato a trabajar, determinando su capacidad o no para la ejecución de la labor a realizar, sin que ponga en riesgo su salud y/o la de terceros, de acuerdo con las demandas del trabajo y los riesgos a los que va a estar expuesto.

Por lo anterior Copeba S.A.S en cumplimiento de la normatividad legal vigente realiza exámenes de ingreso a sus colaboradores a través de IPS autorizadas, los cuales reposan en archivo principal SST de la empresa. Para el mes en mención, se realiza exámenes de ingreso a los Profesionales que ingresan al proyecto.

4.1.2 Certificado de Aptitud Laboral.

El certificado o Concepto de Aptitud Laboral fue dado por el médico laboral quien practicó las evaluaciones médicas ocupacionales comparando el perfil del cargo a desempeñar con las condiciones físicas y mentales de un trabajador. Puede resultar en Apto, no apto o apto con limitaciones o restricciones para el desarrollo del cargo y tareas requeridas, las cuales son tenidas en cuenta por el área SST de Copeba S.A.S oficina principal, para dar respectiva contratación al personal.

4.1.3 Inducción al Personal.

Al ingresar personal a Copeba S.A.S, se lleva a cabo la respectiva inducción donde se les da a conocer las políticas de la empresa, los factores de riesgo a los cuales se encuentran expuestos, plan de evacuación entre otros.

Para el mes de febrero, se llevó a cabo la inducción de los nuevos integrantes del proyecto. ***Ver Anexo 1. "Inducciones"***.

4.1.4 Registros de Capacitaciones.

Las capacitaciones se realizan mes a mes, quedando sujetas a modificaciones por motivo de imprevistos y prioridades en la obra. Para el mes de febrero de 2024, la interventoría dio las siguientes capacitaciones: ***Ver Anexo 2. "Asistencia a capacitaciones".***

FECHA	TEMA	ENCARGADO	CARGO
12-03-2024	Higiene del Sueño	Jhon Alexander Peña	Profesional SST
20-03-2024	Cuidado de Miembros Superiores	Jhon Alexander Peña	Profesional SST

Tabla 1.

4.1.5 Inspección de vehículos

Las inspecciones de seguridad, se llevarán a cabo de manera diaria en las cuales se contempla la revisión pre-operativa de vehículos y los correspondientes equipos de emergencia. ***Ver Anexo 3. "Inspección de Seguridad"***

4.1.6 Investigación de Accidentes.

A la fecha no se reportaron accidentes ni incidentes de trabajo, por lo cual no se implementó el registro de Investigación de Accidentes interno, al darse algún accidente de trabajo, se utilizará el Formato Único para Reporte de accidente de Trabajo (FURAT) dado por la ARL Seguros Bolívar.

4.1.7 Afiliaciones y aportes parafiscales Interventoría.

COPEBA S.A.S, realizó las afiliaciones correspondientes del personal que está laborando en el proyecto a las diferentes al SGSSI y realizó los respectivos pagos del mes de febrero de 2024, soportados mediante planillas las cuales se anexan al presente informe. ***Ver Anexo 4. "Aportes parafiscales"***

5. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

5.1 Elementos de Protección personal (E.P.P's)

Como medida de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos los EPP´S, se suministran al personal al momento de ser contratados y su reposición se hará de acuerdo con el desgaste de estos. Para el periodo en mención, se entregaron los

elementos de protección personal al personal que ingresó en el proyecto. ***Ver Anexo 5. "Entrega de Elementos de Protección Personal".***

6. ACTIVIDADES REALIZADAS

6.1 Actividades realizadas por el Contratista – marzo 2024

dentro de las actividades realizadas en la visita de campo por parte de la interventoría del componente SST, se evidencio lo siguiente:

1. trabajos efectuados en el tramo 7: dilatación de placas para cunetas, perfilación y corte de asfalto, fundida de concreto en cunetas.
2. trabajos efectuados en el tramo 3, excavación mecánica, conformación de gaviones, mejoramiento de terreno y replanteo de topografía.
3. trabajos efectuados en el tramo 4: instalación de adoquín, encofrado de bordillo.
4. trabajos efectuados en el tramo 5: instalación de concreto, construcción de filtro descole de gaviones.
5. trabajos efectuados en agua bonita: instalación de concreta excavación mecánica, amarre de acero.
6. trabajos efectuados en la aguadita: corrección de observaciones, realización de encole de alcantarilla.
7. trabajos efectuados en pasca: instalación de sardinel, céreo de pista, nivelación de pista y alistado de caja.

6.2 Personal de Obra a corte marzo 2024

A continuación, se relaciona el personal con el que cuenta el Contratista de Obra a la fecha.

WILLIAM LEONARDO	OLIVEROS RAMIREZ	JMS INGENIERIA	DIRECTOR DE OBRA	1/08/2023
NERIETH DEL PILAR	SALAS JARA	JMS INGENIERIA	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1/08/2023
DANIELA	RIVEROS TRIANA	JMS INGENIERIA	PROFESIONAL SOCIAL	1/08/2023
NATALIA	QUECHO SARMIENTO	C&G INGENIEROS	PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES	1/08/2023
JOSE ALEXANDER	CAICEDO BARRIOS	JMS INGENIERIA	INGENIERO RESIDENTE	2/08/2023
GERSSON REYNEL	BENITEZ GONZALEZ	JMS INGENIERIA	INSPECTOR VIAL	2/08/2023
MAURICIO	PRADA RODRIGUEZ	JMS INGENIERIA	INSPECTOR VIAL	3/08/2023
JOSE ALEJANDRO	ESPINOSA RIVEROS	JMS INGENIERIA	ESPECIALISTA DE PAVIMENTO	4/08/2023
LUIGGY SANTIAGO	REINA MERCHAN	PEDRO ARIZA TUNJANO	CADENERO	4/08/2023
SERGIO DAVID	HERNANDEZ BURGOS	PEDRO ARIZA TUNJANO	TOPOGRAFO	4/08/2023
OSCAR	RAMIREZ PARRA	OSCAR RAMIREZ PARRA	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	11/08/2023
EDGAR	ARDILA ROA	CONSORCIO INTERVENTORÍA BOGOTÁ	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	11/08/2023

LUIS FERNANDO	CHAPARRO PINEDA	JMS INGENIERIA	AUXILIAR DE TRAFICO	2/08/2023
EDGAR YOVANNY	MARTINEZ DAZA	JMS INGENIERIA	INSPECTOR DE OBRA	2/08/2023
HUBER SNEIDER	MORALES REY	JMS INGENIERIA	AUXILIAR DE TRAFICO	2/08/2023
YURI KARINA	GAITAN MARTINEZ	JMS INGENIERIA	INSPECTORA SST	10/08/2023
MAURICIO	MESTIZO DIAZ	JMS INGENIERIA	OPERADOR DE MAQUINARIA	18/08/2023
LEIDY JOHANA	ALVAREZ GONZALEZ	JMS INGENIERIA	AUXILIAR DE TRAFICO	22/08/2023
ELIANA PATRICIA	ROZO MOLINA	JMS INGENIERIA	AUXILIAR DE TRAFICO	22/08/2023
LUDWING ALBERTO	CABALLERO PEÑA	JMS INGENIERIA	OPERADOR DE MAQUINARIA	22/08/2023
MIGUEL ENRIQUE	BEJARANO	TRANSPORTE MARTINEZ	CONDUCTOR	22/08/2023
PLACIDO	ARIMESDY POVEDA	JMS INGENIERIA	OFICIAL DE OBRA	30/08/2023
MAURICIO	SANABRIA	JMS INGENIERIA	AYUDANTE DE OBRA	30/08/2023
JOSE AUGUSTO	PORRAS	JMS INGENIERIA	AYUDANTE DE OBRA	18/09/2023
ADRIANA MILENA	PULIDO	JMS INGENIERIA	TRAFICO	21/09/2023
YESSICA NATALIA	PULIDO	JMS INGENIERIA	TRAFICO	22/09/2023
JESUS DANIEL	FEO	JMS INGENIERIA	TRAFICO	21/09/2023
MARCO	BARRETO	JMS INGENIERIA	TOPOGRAFO	13/12/2017
ERASMO	VASQUEZ ARIZA	CONSTUOBRAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	1/10/2023
JAIRO ANTONIO	LOAIZA	CONSTUOBRAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	17/12/2023
ALEXANDER	DE LA CRUZ MARTINEZ	CONSTUOBRAS	AYUDANTE DE OBRA	19/09/2023
JOHNY ARLEY	CASTRO CANDIA	INGENERIA & GESTIÓN VIAL	ESPECIALISTA HIDRAULICO	16/08/2022
JOSE DANIEL	GOMEZ ESPEJO	JMS INGENIERIA	INSPECTOR DE OBRA	21/09/2023
JEIMY VIVIANA	FRESNEDA PATIÑO	JMS INGENIERIA S.A.S.	RESIDENTE ADMINISTRATIVA	24/01/2023
CRISTOBAL	FLOREZ ESCOBAR	JMS INGENIERIA	OFICIAL DE OBRA	17/10/2023
ALVARO LOPEZ	RODRIGUEZ	CONSTUOBRAS	AYUDANTE DE OBRA	25/10/2023
CAMILO	RUIZ CASTILLO	FCR CONTRATISTAS SAS	OPERARIO MAQUINARIA AMARILLA	1/02/2017
JOHN JAIVER	VELASCO MOSQUERA	JMS INGENIERIA	INSPECTOR DE OBRA	3/10/2023
JIANCARLO	PALACIOS	CONSTUOBRAS	AYUDANTE DE OBRA	13/11/2023
JHON KENNEDY	LAVAO CABEZA	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S	OFICIAL DE OBRA	13/11/2023
PAULINO	DÍAZ SALAS	R7 INGENIERÍA SAS.NIT	OFICIAL DE OBRA	20/11/2023
ALBERT RAFAEL	GUTIERREZ DE LA CRUZ	R7 INGENIERÍA SAS.NIT	AYUDANTE DE OBRA	20/11/2023
CESAR JULIO	GUTIERREZ RODRIGUEZ	R7 INGENIERÍA SAS.NIT	AYUDANTE DE OBRA	20/11/2023
DAMAR ANTONIO	GUTIERREZ GAMERO	R7 INGENIERÍA SAS.NIT	AYUDANTE DE OBRA	20/11/2023
JHAN FRANCO	DE LA HOZ GUTIERREZ	R7 INGENIERÍA SAS.NIT	AYUDANTE DE OBRA	20/11/2023
MANUEL ALEJANDRO	CELEITA GONZALEZ	JMS INGENIERIA	AYUDANTE DE OBRA	21/11/2023
CÉSAR JULIO	GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	R7 INGENIERÍA SAS.NIT	AYUDANTE DE OBRA	20/11/2023
LUIS RICARDO	GIL PARRA	JMS INGENIERIA	AYUDANTE DE OBRA	22/11/2023

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602
Tel. (Fax) 6012564013 - 3102015021
E-mail interventoriaiccu815@gmail.com

LUIS ALBERTO	GONZALEZ	JMS INGENIERIA	AYUDANTE DE OBRA	22/11/2023
ALEXIS	GARCÍA OSPINA	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	21/11/2023
OSCAR HERNANDO	RAMIREZ BOLIVAR	JMS INGENIERIA	CONDUCTOR	24/11/2023
JAIDER DE JESUS	JIMENEZ EGARA	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	26/12/2023
JEISON	BEDOYA VILLADIEGO	JMS INGENIERIA	RASTRILLERO	5/05/2022
SERGIO ANDRES	CASTILLO RODRIGUEZ	JMS INGENIERIA	AYUDANTE DE OBRA	22/11/2022
JOSE DUVER	CADENA GUZMAN	JMS INGENIERIA	AYUDANTE DE OBRA	13/11/2019
JOSE DANIEL	ORDOÑEZ MARTINEZ	JMS INGENIERIA	AYUDANTE DE OBRA	16/06/2023
JAIME ALEJANDRO	VERGARA BANQUET	JMS INGENIERIA	AYUDANTE DE OBRA	23/08/2022
VICTORINO	MATTOS CENTENO	JMS INGENIERIA	RASTRILLERO	1/03/2021
PLINIO	RINCON PEDRAZA	JMS INGENIERIA	TORNILLERO	22/08/2022
FAUSTO ALEJANDRO	ZAMUDIO MARTINEZ	JMS INGENIERIA	OPERADOR DE MAQUINARIA	17/10/2018
LUIS MAURICIO	CAMARGO GONZALEZ	JMS INGENIERIA	OPERADOR DE MAQUINARIA	1/12/2020
LUIS CARLOS	RUEDA CAMACHO	JMS INGENIERIA	OPERADOR DE MAQUINARIA	12/12/2022
JOHN FREDDY	MICOLTA MARQUINEZ	JMS INGENIERIA	AYUDANTE DE OBRA	4/12/2023
JOHN MILLER	CARDENAS CARVAJAL	JMS INGENIERIA	AYUDANTE DE OBRA	30/11/2023
DIEGO	PIRANEQUE ROJAS	JMS INGENIERIA	RASTRILLERO	8/11/2023
LUIS MANUEL	GONZALEZ	JMS INGENIERIA	AYUDANTE DE OBRA	8/11/2023
LUIS ENRIQUE	CORREA TORRES	JMS INGENIERIA	AYUDANTE DE OBRA	1/11/2023
GERMAN ANDRES	CASTRO SERNA	JMS INGENIERIA S.A.S.	OPERARIO MAQUINARIA AMARILLA	20/09/2023
LUIS ALEJANDRO	PACHECO QUINTANA	JMS INGENIERIA	RASTRILLERO	14/11/2023
ELIECER DE JESUS	CUBILLOS PEÑA	JMS INGENIERIA	AYUDANTE DE OBRA	19/07/2023
ALVARO	BOTIA PINILLA	JMS INGENIERIA S.A.S.	OPERARIO MAQUINARIA AMARILLA	10/05/2021
CESAR JULIO	AMAYA SIERRA	JMS INGENIERIA	AYUDANTE DE OBRA	23/08/2023
DONALDO	NAVARRO ESQUEA	JMS INGENIERIA	RASTRILLERO	14/08/2019
EDWIN EUGENIO	AGUILAR PEÑA	JMS INGENIERIA	AYUDANTE DE OBRA	2/05/2023
JOSE RENE	GONZALEZ RODRIGUEZ	JMS INGENIERIA	RASTRILLERO	11/05/2023
OLIVER JOSE	AVILA MENDEZ	JMS INGENIERIA	AYUDANTE DE OBRA	2/05/2023
CARLOS WILLIAM	CASTIBLANCO UPEGUI	JMS INGENIERIA	AYUDANTE DE OBRA	30/06/2021
CARLOS	TAPASCO AZCARATE	JMS INGENIERIA	INSPECTOR OBRA	3/10/2023
JAIMEALBERTO	ARROYO GARCIA	JMS INGENIERIA	AYUDANTE DE OBRA	5/10/2023
BRAIJAN EDUARDO	SILVA FLOREZ	JMS INGENIERIA	TORNILLERO	20/06/2023
CARLOS ANDRES	GARCIA RIOS	JMS INGENIERIA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	16/08/2023
LUIS ALEJANDRO	PACHECO QUINTANA	JMS INGENIERIA	RASTRILLERO	5/01/2024

GUSTAVO	RODRIGUEZ PINEDA	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S	OFICIAL DE OBRA	1/01/2024
HENRY ENRIQUE	RUA DOMINGUEZ	JMS INGENIERIA	OPERADOR DE MAQUINARIA	11/12/2023
EDWIN ALEXANDER	ACOSTA DIAZ	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S	OFICIAL DE OBRA	6/11/2023
JOHANA MILENA	JAIMES MARIN	PEDRO FRANCISCO ARIZA TUNJANO	TOPOGRAFO	12/01/2024
LUIS DANIEL	GARZON BELTRAN	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S	OFICIAL DE OBRA	12/01/2024
CAIMLO ANDRES	RODRIGUEZ GALVIZ	SOLUCIONES R&A SAS	OFICIAL DE OBRA	5/02/2024
EMERSON	BOLAÑOS CASTILLO	SOLUCIONES R&A SAS	OFICIAL DE OBRA	5/02/2024
HARRY ESTEBAN	ROJAS CICUAMIA	SOLUCIONES R&A SAS	AYUDANTE DE OBRA	5/02/2024
MARLON ESTIVEN	NEMOCON MOLINA	SOLUCIONES R&A SAS	AYUDANTE DE OBRA	5/02/2024
WILBERTO	CASTELLANOS PIÑA	SOLUCIONES R&A SAS	AUXILIAR DE OBRA	4/02/2024
JHON ALEXANDER	CARDONA	JOSE ARGEON MORA SERRANO	AYUDANTE DE OBRA	9/02/2024
JOSE HERIBERTO	LÓPEZ ROJAS	JOSE ARGEON MORA SERRANO	AYUDANTE DE OBRA	9/02/2024
OSCAR HERNANDO	MORA SERRANO	JOSE ARGEON MORA SERRANO	OFICIAL DE OBRA	9/02/2024
REINEL	RIOS ZEA	JOSE ARGEON MORA SERRANO	AYUDANTE DE OBRA	9/02/2024

Tabla 2.

6.4. Retiros de Personal de Obra – Mes marzo de 2024

OSCAR DANILO	ABRIL HURTADO	TRANSPORTE MARTINEZ	CONDUCTOR	5/09/2023
JHONATAN DANIEL	TABACO	JMS INGENIERIA	AYUDANTE DE OBRA	14/08/2023
LUIS ALVARO	MACIAS	JMS INGENIERIA	AYUDANTE DE OBRA	21/09/2023
REINERIO DE JESUS	LOPEZ	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S	AYUDANTE DE OBRA	13/11/2023
GEOVANIS	RODRIGUEZ PUERTA	R7 INGENIERÍA SAS.NIT	MAESTRO DE OBRA	20/11/2023
CARLOS ARTURO	RIVERA ZABALETA	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S	OFICIAL DE OBRA	9/01/2024
YEISON ANDREY	PARADA SARMIENTO	CONSTRUCCIONES Y ALIANZAS M&D SAS.	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	9/01/2024

Tabla 4.

6.5. Actividades realizadas por la Interventoría – Mes marzo 2024

1. se evidencio dentro del recorrido señalización de seguridad en todos los tramos, instalación de personal que regule el tráfico, unidades sanitarias limpias como camillas y botiquines.
2. se efectuó la verificación de los informes enviados por parte del contratista vía email, matrices de riesgos y peligros, procedimientos de trabajo seguro, preoperacionales de los vehículos como charlas de sst.
3. se realizó al equipo de interventoría la capacitación en higiene del sueño, donde abordaron tips para un buen descanso pleno como no acostarse lleno, evitar el uso de dispositivos móviles como estableciendo horarios de descanso etc. se efectuó inspección de evaluación de los respectivos elementos de protección

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602
Tel. (Fax) 6012564013 - 3102015021
E-mail interventoriaiccu815@gmail.com

personal al grupo de interventoría.

4. se realizó al equipo de interventoría la capacitación en cuidado de miembros inferiores, donde se les indico con el autocuidado al momento de realizar levantamientos de objetos, movimientos repetitivos en las actividades diarias en obra.

6.6 Personal Interventoría

A continuación, se relaciona el personal con el que cuenta la Interventoría a la fecha.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FECHA INGRESO
GIOVANNI ARIZA ARIAS	ING. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	COPEBA SAS	1 de agosto de 2023
CRISTIAN MARIN	TOPÓGRAFO INSPECTOR 1	COPEBA SAS	23 de noviembre de 2023
SERGIO LUIS SUAREZ ZAMUDIO	TOPÓGRAFO INSPECTOR 2	COPEBA SAS	24 de enero de 2024
JOHN OSWALDO CANO GARCÍA	ESPECIALISTA AMBIENTAL	COPEBA SAS	1 de agosto de 2023
NURY JAZMÍN GARCÍA LÓPEZ	PROFESIONAL GESTOR SOCIAL	COPEBA SAS	2 de agosto de 2023
NICOLÁS ORTEGA RESTREPO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS	COPEBA SAS	2 de agosto de 2023
JUAN SEBASTIAN CARDENAS	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	COPEBA SAS	26 de febrero de 2024
JOSÉ LUIS CHACÓN FIGUEROA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	COPEBA SAS	11 de agosto de 2023
JULIAN CAMILO CASTIBLANCO	CADENERO 1	COPEBA SAS	29 de enero de 2024
WIDMER ALEJANDRO CORREA SANTANA	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 2	COPEBA SAS	11 de agosto de 2023
DIANA MARÍA GARCÍA VALENCIA	SECRETARIA	COPEBA SAS	11 de agosto de 2023
CHRISTIAN JAVIER GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ	CADENERO 2	COPEBA SAS	16 de agosto de 2023
PAULA VALENTINA CARLOS MARTÍNEZ	PROFESIONAL INGENIERA DE APOYO	COPEBA SAS	28 de agosto de 2023
JHON ALEXANDER PEÑA GUZMÁN	PROFESIONAL SISO	COPEBA SAS	1 de septiembre de 2023

Tabla 5.

6.7. Ingresos Interventoría

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FECHA INGRESO

Tabla 6.

En el presente periodo, no hubo un ingreso del personal por parte de la interventoría

6.8. Retiros Interventoría


NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FECHA INGRESO

Tabla 7.

En el presente periodo, no hubo retiros de personal por parte de la interventoría.

7. MAQUINARIA Y VEHÍCULO

1.1. MAQUINARIA Y VEHÍCULO CONTRATISTA

MAQUINARIA USADA POR EL CONTRATISTA								
N° INTERNO	MODELO	TIPO	REFERENCIA	SOAT	TECNOMECA	FOTO	CONDUCTOR	PREOPERACIONAL
MOVIL 017	L-218	MINICARGADOR	CATERPILLAR	N/A	N/A		LUDWING ALBERTO CABALLERO	SIN NOVEDAD (SECTOR 1)
MOVIL 016	K426-F2	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	N/A	N/A		MAURICIO MESTIZO	SIN NOVEDAD (SECTOR 1)
	WEV-268	CAMION DOBLE CABINA	FOTON	13/01/2024	19/12/2023		CARLOS ANDRES RIVERA LICENCIA C2 (15/02/2025)	SIN NOVEDAD
	N/A	MOTONIVELADORA	CHAMPION	N/A	N/A		JOHN ALEXANDER MOGOLLON SANCHEZ	SIN NOVEDAD (SECTOR 1)
	PM-102	FRESADORA DE CONCRETO	CATERPILLAR	N/A	N/A		SEDIEL MONTAÑA ESTUPIÑAN	SIN NOVEDAD (SECTOR 1)
	RD-27	VIBRO COMPACTADOR	WACKER NEUSON	N/A	N/A		LUDWING ALBERTO CABALLERO	SIN NOVEDAD (SECTOR 2)
	N/A	VIBRO COMPACTADOR	DYNAPAC	N/A	N/A		LUDWING ALBERTO CABALLERO	SIN NOVEDAD (SECTOR 1)

	TAQ-017	VOLQUETA DOBLE TROQUE	N/A	20/01/2024	20/01/2024		OSCAR DANILO ABRIL LICENCIA C2 (30/12/2025	SIN NOVEDAD (SECTOR 8)
MOVIL 010	AP 355F	PAVIMENTADORA	CATERPILLAR	N/A	N/A		CARLOS RUEDA	SIN NOVEDAD
	WLM-580	VOLQUETA DOBLE TROQUE	KENWORTH	6/07/2024	6/07/2024		MIGUEL BEJARANO LICENCIA C3 (10/11/2024)	SIN NOVEDAD (SECTOR 8)
	MQO-310	VEHICULO	N/A	10/02/2024	8/05/2024		JOSE GERARDO SOLER LICENCIA C1 (15/04/2024)	SIN NOVEDAD (SECTOR 1)
	TAP-029	CARRO TANQUE AGUA	N/A	19/12/2023			JOSE BENJAMIN MORA	SIN NOVEDAD (SECTOR 1)
	RHM 627	VEHICULO	N/A	13/03/2024	1/08/2024			SIN NOVEDAD
	EJU-689	VEHICULO	N/A					SIN NOVEDAD
	236D3	MINICARGADOR	CATERPILLAR	N/A	N/A		ERASMO VASQUEZ ARIZA	SIN NOVEDAD (SECTOR 2)
	PM-102	FRESADORA DE CONCRETO	CATERPILLAR	N/A	N/A		JAIRO ANTONIO LOAIZA	SIN NOVEDAD (SECTOR 2)
	EC140BLC	EXCAVADORA	VOLVO	N/A	N/A		EDWIN SANTANA	SIN NOVEDAD (SECTOR 1)
	NIT-375	CAMIONETA	FORD	23/11/2024	24/11/2024		OSCAR HERNANDO RAMIREZ LICENCIA C2 (06/01/26)	SIN NOVEDAD
	WFL-545	VOLQUETA DOBLE TROQUE	NAVITRANS	23/08/2024	23/08/2024		GERMAN BELTRAN MARTINEZ LICENCIA C2 (21/02/2025)	SIN NOVEDAD (SECTOR 1)

		COMPRESOR	2002078	N/A	N/A		N/A	SIN NOVEDAD
		PLANTA ELECTRICA	TRUPER	N/A	N/A		N/A	SIN NOVEDAD
		MARTILLO ELECTRICO	N/A	N/A	N/A		N/A	SIN NOVEDAD
		PULIDORA	DEWALT	N/A	N/A		N/A	SIN NOVEDAD
		MEZCLADORA	N/A	N/A	N/A		N/A	SIN NOVEDAD

Tabla 8.

7.2. VEHÍCULOS INTERVENTORÍA

Para el presente periodo, la interventoría cuenta con los siguientes vehículos:

NISSAN XTRAIL de placas RHM 627, modelo 2011
NISSAN de placas KCL 117, modelo 2013

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602
Tel. (Fax) 6012564013 - 3102015021
E-mail interventoriaiccu815@gmail.com

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES CONTRATISTA

FOTOS



Descripción Foto 5. ACTIVIDADES TRAMO 7



Descripción Foto 6. INSPECCIONES DE SST



Descripción Foto 7. TRABAJOS TRAMOS 5



Descripción Foto 8. SECTOR VIVERO

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES INTERVENTORÍA

FOTOS



Descripción Foto 9. ACOMPAÑAMIENTO PASCA



Descripción Foto 10. CHARLA SEGURIDAD TRAMO 5



Descripción Foto 11. CHARLA DE SEGURIDAD PASCA



Descripción Foto 12. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602
Tel. (Fax) 6012564013 - 3102015021
E-mail interventoriaiccu815@gmail.com

10. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

10.1 Acciones Preventivas

- Verificación de los frentes de trabajos efectuados en el momento de la visita (señalización, demarcación, operación de aperturas de tráficos, inspección de unidades sanitarias, elementos de emergencias).
- Charla al equipo de interventoría en el uso y porte adecuado de los elementos de protección personal.
- Verificación de los pre-operacionales del vehículo por parte de la interventoría

10.2 Acciones Correctivas

Se evidencio la realización de la capacitación a todo el personal de obra de los distintos frentes en el buen uso de los elementos de protección personal como dotación; acción de mejora solicitada por parte de la interventoría a todo el personal con su respectiva evaluación de la misma.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

11.1 Conclusiones

- En aspectos generales se evidencia actividades propias del cumplimiento normativo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo como lo son: instalación de señalización de seguridad, diligenciamiento de pre-operacionales inspecciones de campo, diligenciamiento de permisos de trabajo y ATS, aportes a los pagos de seguridad social y parafiscal, unidades sanitarias para cada frente, entre otras.
  Se recuerda que es responsabilidad del empleador hacia su personal como sus contratistas; la implementación de todas las medidas que se requieran pertinentes, para salvaguardar tanto la seguridad como la salud en todos sus frentes de obra.

11.2 Recomendaciones

- Se recomienda seguir con las inspecciones en campo de la maquinaria y equipos en los formatos pre operativos manejados por el contratista.
- Tener en cuenta las horas operativas de la maquinaria amarilla con el fin de realizar el respectivo mantenimiento por horas de uso.
- Se deja la recomendación por parte de la interventoría de efectuar más actividades P y P (Promoción y Prevención) en los distintos frentes de obra.

- En los recorridos realizados se recomienda verificar los cierres viales que se están efectuando, teniendo en cuenta la cantidad de frentes como de personas que hacen labores de tráfico.

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602
Tel. (Fax) 6012564013 - 3102015021
E-mail interventoriaiccu815@gmail.com

ANEXOS

VER ANEXO 1. INDUCCIONES

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602
Tel. (Fax) 6012564013 - 3102015021
E-mail interventoriaiccu815@gmail.com

PARA EL PRESENTE PERIODO, NO SE REALIZARON INDUCCIONES PORQUE NO HUBO INGRESO DE PERSONAL

VER ANEXO 2. ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602
Tel. (Fax) 6012564013 - 3102015021
E-mail interventoriaiccu815@gmail.com

COPEBA S.A.S.	REUNION DE ENTRENAMIENTO	COD:	F-E-01
		VERSION :	3
		FECHA	24/07/2019

TECNICA ☐ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ☒ FINANCIERA ☐ ASEGURAMIENTO CALIDAD ☐

☐ AREA ☒ CONTRATO N°: ICCO815 - Contrato de Interventoria

FECHA: DIA 12 MES 03 AÑO 2024 HORA: 9am A 9:30 am

CAPACITACIÓN N°: _____ LUGAR: OFICINAS ADMÓN ☐ OTRO ☐ _____

METODO UTILIZADO: TALLER ☐ ACETATOS ☐ CHARLA ☒ VIDEO BEAM ☐ VIDEO ☐ CARTELERA ☐

RESPONSABLE DE LA CAPACITACION Jhon Alexander Peña Guzmán

CARGO: Profesional SST FIRMA: Jhon Peña

TEMA CENTRAL

Cuidado de miembros Superiores

ASPECTOS TRATADOS

Tener en cuenta los levantamientos de Objetos o posturas adecuados para el autocuidado de brazos y manos en labores cotidianas

OBSERVACIONES

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Julian Camilo Castiblanco Ospina	Operario	
2	Sergio Suarez Zamudio	Topografo	
3	Juan sebastian Cardenas B	Inspector	
4	Nury Garcia J.	R. Social	
5	Pablo Adolfo Ruiz P	Inspector	
6	Cristian Marin	Topografo	
7	GIOVANNI ARIZA ARIAS	PRESIDENTE	

COPEBA S.A.S.	REUNION DE ENTRENAMIENTO	COD:	F-E-01
		VERSION :	3
		FECHA	24/07/2019

TECNICA ☐ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ☒ FINANCIERA ☐ ASEGURAMIENTO CALIDAD ☐

☐ AREA ☒ CONTRATO N°: ICCU 815 - Contrato de Interventoria

FECHA: DIA 20 MES 03 AÑO 2024 HORA: 8 am A 8:30 am

CAPACITACIÓN N°: _____ LUGAR: OFICINAS ADMÓN ☐ OTRO ☒ Aguadita

METODO UTILIZADO: TALLER ☐ ACETATOS ☐ CHARLA ☒ VIDEO BEAM ☐ VIDEO ☐ CARTELERA ☐

RESPONSABLE DE LA CAPACITACION Jhon Alexander Peña

CARGO: Profesional SST FIRMA: Jhon Peña

TEMA CENTRAL

Higiene del Sueño

ASPECTOS TRATADOS

Se abordaron tips para un descanso pleno como no acostarse lleno, evitar el uso de celular estableciendo horarios de descanso etc.

OBSERVACIONES

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Fabio [illegible]	Inspector	
2	Nury Garcia T.	R. Social	
3	Sergio Suarez	Topografo	
4	Juan Sebastian Cardenas B	Inspector	
5	[illegible]	CADENERO	
6	Cristian Marin	Topografo	
7	GIOVANNI ARIZA ARIAS	RESIDENTE	

VER ANEXO 3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

COPEBA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	F-SST-009
		VERSIÓN:	0
	FORMATO DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS EPP'S	FECHA:	07/02/2024

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 20 de marzo del 2024 LUGAR: Agua dita

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Jhon Alexander Peña Guzmán CARGO Profesional SST

#	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	CHALECO	BOTAS CUERO	CASCO	RATCHET	LENTES DE SEGURIDAD	TAPABOCAS	TAPAOIDOS TIPO COPA	TAPAOIDOS DE INSERCIÓN	GUANTES	ESCAFANDRA	IMPERMEABLE	BOTAS DE CAUCHO	OBSERVACIONES
1	Johan Castiblanco	Cadenero	C	C	C		C	C	C		C				
2	Sergio Suarez	Topo	C	C	C		C	C	C		C				
3	Juan Cardenas	Inspector	N/T	C	C		N/T	N/T	N/T		N/T				No le ha dado (NT)
4	Nory Garcia	Social	C	C	C		N/T	C	C		N/A				
5	Fabio Mdano	Inspector	C	C	C		C	C	C		C				
6	Cristian Marin	Topo	C	C	C		C	C	C		C				
7	Giovanni Ariza	Residente	C	C	C		C	C	C		C				
8											Inserción				
9															
10															

EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (REPORTE DE NOVEDADES)

Describa detalladamente la novedad que se presenta con el elemento de protección personal teniendo en cuenta la durabilidad, confort, protección y ajuste del mismo

Nombre del trabajador que reporta: N/A	Cargo:	Fecha devolución epp:

Criterios de Inspección	
Cumple	C
Requiere cambio	RC

Jhon Peña

Responsable de la Inspección

Este documento es propiedad privada de AVV Consultoría SAS, las versiones vigentes y actualizadas se encuentran en la página web de la empresa.

VER ANEXO 4. APORTES PARAFISCALES INTERVENTORÍA

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500"

Municipio: *SIBATÉ - FUSAGASUGA - PASCA*

Duración en meses de interventoria: *6.50*

COSTOS DE PERSONAL

CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN TOTAL	Tiempo en Meses	Factor Multiplicador	VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL							
Director de interventoria	$ 10,000,000.00	N/A	1.0	50%	6.50	2.30	$ 74,750,000.00
Especialista Pavimentos	$ 4,500,000.00	N/A	1.0	40%	6.50	2.30	$ 26,910,000.00
Especialista en hidraulica	$ 4,500,000.00	N/A	1.0	40%	6.50	2.30	$ 26,910,000.00
Especialista en Geotecnia	$ 4,500,000.00	N/A	1.0	40%	6.50	2.30	$ 26,910,000.00
Especialista en Estructuras	$ 4,500,000.00	N/A	1.0	40%	6.50	2.30	$ 26,910,000.00
Especialista Ambiental	$ 4,500,000.00	N/A	1.0	40%	6.50	2.30	$ 26,910,000.00
Abogado	$ 4,800,000.00	N/A	1.0	20%	6.50	2.30	$ 14,352,000.00
Profesional Gestor Social	$ 6,700,000.00	N/A	1.0	40%	6.50	2.30	$ 40,066,000.00
Profesional SISO	$ 6,700,000.00	N/A	1.0	40%	6.50	2.30	$ 40,066,000.00
Ingeniero Residente de interventoria	$ 6,200,000.00	N/A	1.0	100%	6.50	2.30	$ 92,690,000.00
PERSONAL TECNICO							
*Profesional Ingeniero Apoyo	$ 3,682,070.0	N/A	1.0	100%	6.50	2.30	$ 55,046,947.00
Inspector de interventoria	$ 2,950,000.0	N/A	2.0	100%	6.50	2.30	$ 88,205,000.00
Topógrafo	$ 2,950,000.0	N/A	2.0	100%	6.50	2.30	$ 88,205,000.00
Cadenero 1	$ 1,800,000.0	N/A	2.0	100%	6.50	2.30	$ 53,820,000.00
Secretaria	$ 1,800,000.0	N/A	1.0	100%	6.50	2.30	$ 26,910,000.00
						TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) * (B) = (3)	***$ 708,660,947.00***

2. OTROS COSTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. de Meses	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	Mes	1	6.50	$ 8,700,000.00	$ 56,550,000.00
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias.	Mes	1	6.50	$ 1,397,000.00	$ 9,080,500.00
Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios	Mes	2	6.50	$ 3,500,000.00	$ 45,500,000.00
Oficina (incluye servicios)	Mes	1	6.50	$ 1,000,000.00	$ 6,500,000.00
Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	Mes	1	6.50	$ 300,000.00	$ 1,950,000.00
				Subtotal Otros Costos (2)	***$ 119,580,500.00***

Ensayos de Labortario

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. de Meses	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
**Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	Mes	1	6.50	$ 6,100,000.00	$ 39,650,000.00
				Subtotal Otros Costo (3)	***$ 39,650,000.00***

Presupuesto para Inteventoria

TOTAL COSTOS (1) + (2) + (3)= (4)	***$ 867,891,447.00***
IVA (4) * 19% = (5)	***$ 164,899,374.00***
COSTO TOTAL POR EL TIEMPO DE LA INTERVENTORÍA	***$ 1,032,790,821.00***

*Nota: El valor del Profesional Ingeniero Apoyo no debe ser modificado por el proponente. Este Ingeniero prestará apoyo exclusivo a la supervision del ICCU.

**El valor por Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad) no debe ser modificado por el proponente.

Nota 1: El presente formato de propuesta economica es inmodificable.

Nota 2: El Factor Multiplicador máximo a reconocer por la entidad será de 2,3.
Este Factor Multiplicador (FM) tendrá dos componentes: 1. Factor Prestacional equivalente a 1,6. y 2. Gastos de administración, Legalización, Perfeccionamiento, Imprevistos y Honorarios equivalente a 0,7

Nota 3: El valor de 0,7 correspondiente al componente 2 del FM, será el máximo a reconocer por parte de la Entidad.

Nota 4. El Factor Prestacional correspondiente al componente 1 del FM debe ser ajustado según la modalidad de vinculación del personal a contratar. En todo caso, la Entidad solo reconocerá las prestaciones imputables a la modalidad de vinculación del personal.

Nota 5. Durante la ejecución, se debe presentar una relación mensual de los profesionales que han hecho parte de las actividades ejecutadas dentro del periodo del reporte, indicando el tipo de vinculación, prestaciones sociales pagadas y su valor.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ identificado(a) con CC 52253696

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS008	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$12,999,000	4%	$520,000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$12,999,000	16%	$2.079,900
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		$12,999,000		$65.000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		$12,999,000		$65.000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$12,999,000	6.96%	$904.700
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$12,999,000	4%	$520,000

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 03:15.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NICOLAS ORTEGA RESTREPO identificado(a) con CC 80199838

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$3,600,000	4%	$144,000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$3,600,000	16%	$576,000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		$3,600,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		$3,600,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$3,600,000	6.96%	$250,600
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$3,600,000	4%	$144,000

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 03:12.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHN OSWALDO CANO GARCIA identificado(a) con CC 79858440

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$1,800,000	4%	$72,000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,800,000	16%	$288,000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		$1,800,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		$1,800,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,800,000	6.96%	$125,300
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,800,000	4%	$72,000

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 03:14.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NURY JAZMIN GARCIA LOPEZ identificado(a) con CC 52880586

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22																		$1,965,334	4%	$78,700
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	8										X								$714,667	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$1,965,334	16%	$314,500
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$714,667	16%	$114,400
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22																		$1,965,334		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	8										X								$714,667		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22																		$1,965,334		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	8										X								$714,667		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$1,965,334	6.96%	$136,800
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$714,667	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$1,965,334	4%	$78,700
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$714,667	0%	$0

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 03:13.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JHON ALEXANDER PEÑA GUZMAN identificado(a) con CC 1110482624

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22																		$1,965,334	4%	$78,700
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	8										X								$714,667	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$1,965,334	16%	$314,500
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$714,667	16%	$114,400
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22																		$1,965,334		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	8										X								$714,667		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22																		$1,965,334		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	8										X								$714,667		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$1,965,334	6.96%	$136,800
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$714,667	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$1,965,334	4%	$78,700
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$714,667	0%	$0

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 03:10.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GIOVANNI ARIZA ARIAS identificado(a) con CC 88138476

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22																		$4,546,667	4%	$181,900
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	8										X								$1,653,334	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$4,546,667	16%	$727,500
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$1,653,334	16%	$264,600
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22																		$4,546,667		$22,800
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	8										X								$1,653,334		$8,300
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22																		$4,546,667		$22,800
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	8										X								$1,653,334		$8,300
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$4,546,667	6.96%	$316,500
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$1,653,334	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$4,546,667	4%	$181,900
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$1,653,334	0%	$0

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 03:14.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PAULA VALENTINA CARLOS MARTINEZ identificado(a) con CC 1070989207

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22																		$2,700,185	4%	$108,100
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	8										X								$981,886	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$2,700,185	16%	$432,100
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$981,886	16%	$157,200
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22																		$2,700,185		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	8										X								$981,886		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22																		$2,700,185		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	8										X								$981,886		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$2,700,185	0.522%	$14,100
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$981,886	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$2,700,185	4%	$108,100
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$981,886	0%	$0

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 03:11.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JUAN SEBASTIAN CARDENAS BECERRA identificado(a) con CC 1003174878

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22																		$2,163,334	4%	$86,600
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	8										X								$786,667	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$2,163,334	16%	$346,200
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$786,667	16%	$125,900
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22																		$2,163,334		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	8										X								$786,667		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22																		$2,163,334		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	8										X								$786,667		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$2,163,334	6.96%	$150,600
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$786,667	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$2,163,334	4%	$86,600
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$786,667	0%	$0

Este certificado se expide el día 2024-04-10 a las 12:00.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WIDMER ALEJANDRO CORREA SANTANA identificado(a) con CC 1032412944

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$4,070,000	4%	$162,800
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$4,070,000	16%	$651,200
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		$4,070,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		$4,070,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$4,070,000	6.96%	$283,300
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$4,070,000	4%	$162,800

Este certificado se expide el día 2024-05-09 a las 01:03.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SERGIO LUIS SUAREZ ZAMUDIO identificado(a) con CC 1069753283

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$2,950,000	4%	$118,000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$2,950,000	16%	$472,000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		$2,950,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		$2,950,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$2,950,000	6.96%	$205,400
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$2,950,000	4%	$118,000

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 03:16.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CRISTIAN MARIN identificado(a) con CC 1097994335

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22																		$2,163,334	4%	$86,600
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	8										X								$786,667	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$2,163,334	16%	$346,200
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$786,667	16%	$125,900
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22																		$2,163,334		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	8										X								$786,667		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22																		$2,163,334		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	8										X								$786,667		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$2,163,334	6.96%	$150,600
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$786,667	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$2,163,334	4%	$86,600
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$786,667	0%	$0

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 03:09.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULIAN CAMILO CASTIBLANCO OSPINA identificado(a) con CC 1007847413

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22																		$1,320,000	4%	$52,800
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	8										X								$480,000	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$1,320,000	16%	$211,200
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$480,000	16%	$76,800
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22																		$1,320,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	8										X								$480,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22																		$1,320,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	8										X								$480,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$1,320,000	6.96%	$91,900
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$480,000	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$1,320,000	4%	$52,800
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$480,000	0%	$0

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 03:17.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CHRISTIAN JAVIER GUTIERREZ GUTIERREZ identificado(a) con CC 1105671099

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$2,500,000	4%	$100,000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$2,500,000	6.96%	$174,000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$2,500,000	4%	$100,000

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 02:55.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIANA MARIA GARCIA VALENCIA identificado(a) con CC 53015204

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$2,200,000	4%	$88,000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$2,200,000	16%	$352,000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		$2,200,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		$2,200,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$2,200,000	0.522%	$11,500
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$2,200,000	4%	$88,000

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 03:06.

VER ANEXO 5. APORTES PARAFISCALES OBRA

SALARIO MINIMO	2,024	$ 1,300,000				3,200,000						
CANTIDAD	Nombre_Completo	DÍAS TRABAJADOS	VALOR MENSUAL DEVENGADO PROPUESTA ECONOMICA	VALOR TOTAL DEVENGADO	40% DEL VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	IBC SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL PENSION 16%	TOTAL SALUD 12;5% y 4%	IBC RIESGOS	TARIFA SISTEMA	ARL	TOTAL APORTES
1	WILLIAM LEONARDO OLIVEROS RAMIREZ	30	6,000,000	6,000,000	5,000,000	5,000,000	800,000	200,000	5,000,000	0.0696	348,000	1,348,000
1	NERIETH DEL PILAR SALAS JARA	30	4,280,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	432,000	108,000	2,700,000	0.0696	187,900	727,900
1	DANIELA RIVEROS TRIANA	30	2,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	320,000	80,000	2,000,000	0.0696	1,866,667	2,266,700
1	NATALIA QUECHO SARMIENTO	30	7,300,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	1,040,000	260,000	6,500,000	0.0696	452,400	1,752,400
1	JOSE ALEXANDER CAICEDO BARRIOS	30	4,500,000	4,500,000	4,000,000	4,000,000	640,000	160,000	4,000,000	0.0696	278,400	1,078,400
1	GERSSON REYNEL BENITEZ GONZALEZ	30	4,500,000	4,500,000	4,000,000	4,000,000	640,000	160,000	2,400,000	0.0696	167,000	967,000
1	JOSE ALEJANDRO ESPINOSA RIVEROS	30	15,000,000	15,000,000	9,999,000	9,999,000	1,599,800	400,000	9,999,000	0.0696	695,900	2,695,700
1	OSCAR RAMIREZ PARRA	30	1,300,000	1,300,000	1,160,000	1,300,000	208,000	162,500	1,300,000	0.0105	13,600	384,100
1	EDGAR ARDILA ROA	30	4,876,900	4,876,900	4,876,900	4,876,900	780,300	195,100	4,876,900	0.0696	339,400	1,314,800
1	JONNY ARLEY CASTRO CANDIA	30	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	672,000	168,000	4,200,000	0.00522	21,900	861,900
1	LUIS FERNANDO CHAPARRO PINEDA	30	1,908,022	1,908,022	1,908,022	1,908,022	305,300	76,300	1,734,688	0.0696	120,700	502,300
1	EDGAR YOVANNY MARTINEZ DAZA	30	3,489,750	3,489,750	3,489,750	3,489,750	558,400	139,600	3,093,750	0.0696	215,300	913,300
1	HUBER SNEIDER MORALES REY	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,126,667	0.0696	78,400	338,400
1	MIGUEL ANDRES BERMUDEZ BUENO	30	1,677,813	1,677,813	1,677,813	1,677,813	268,500	67,100	1,677,813	0.0696	116,800	452,400
1	YURI KARINA GAITAN MARTINEZ	30	1,394,793	1,394,793	1,394,793	1,394,793	223,200	55,800	1,091,459	0.0696	76,000	355,000
1	MAURICIO MESTIZO DIAZ	30	2,173,687	2,173,687	2,173,687	2,173,687	347,800	86,900	1,931,979	0.0696	134,500	569,200
1	LEIDY JOHANA ALVAREZ GONZALEZ	30	1,624,323	1,624,323	1,624,323	1,624,323	259,900	65,000	1,624,323	0.0696	113,100	438,000
1	ELIANA PATRICIA ROZO MOLINA	30	1,752,291	1,752,291	1,752,291	1,752,291	280,400	70,100	1,622,291	0.0696	112,900	463,400
1	LUDWING ALBERTO CABALLERO PEÑA	30	2,304,500	2,304,500	2,304,500	2,304,500	368,700	92,200	2,304,500	0.0696	160,400	621,300
1	MIGUEL ENRIQUE BEJARANO	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	PLACIDO ARIMESDY POVEDA	30	2,151,600	2,151,600	2,151,600	2,151,600	344,300	86,100	1,592,517	0.0696	110,800	541,200
1	MAURICIO SANABRIA	30	1,730,626	1,730,626	1,730,626	1,730,626	276,900	69,200	1,557,292	0.0696	108,400	454,500
1	OSCAR DANILO ABRIL HURTADO	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	JHONATAN DANIEL TABACO PINEDA	11	1,300,000	476,667	476,667	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	JOSE AUGUSTO PORRAS	30	1,394,793	1,394,793	1,394,793	1,394,793	223,200	55,800	1,221,459	0.0696	85,000	364,000
1	EDUIN ALEXANDER SANTANA MORENO	30	2,333,838	2,333,838	2,333,838	2,333,838	373,400	93,400	2,333,838	0.0696	162,400	629,200
1	JOSE DANIEL GOMEZ ESPEJO	30	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	432,000	108,000	2,500,000	0.0696	174,000	714,000
1	LUIS ALVARO MACIAS NUÑEZ	11	1,807,814	662,865	662,865	662,865	106,100	26,500	662,865	0.0696	46,100	178,700
1	ADRIANA MILENA PULIDO MESA	30	1,558,647	1,558,647	1,558,647	1,558,647	249,400	62,300	1,385,313	0.0696	96,400	408,100
1	JESUS DANIEL FEO SALCEDO	30	1,695,643	1,695,643	1,695,643	1,695,643	271,300	67,800	1,641,251	0.0696	114,200	453,300
1	ERASMO VASQUEZ ARIAS	30	2,273,335	2,273,335	2,273,335	2,273,335	363,700	90,900	2,214,668	0.0696	154,100	608,700
1	JAIRO ANTONIO LOAIZA ZULUAGA	30	3,432,938	3,432,938	3,432,938	3,432,938	549,300	137,300	3,432,938	0.0696	238,900	925,500
1	MARCO ANTONIO BARRETO PAREDES	30	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	475,200	118,800	2,970,000	0.0696	206,700	800,700
1	JEIMY VIVIANA FRESNEDA PATIÑO	30	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	480,000	120,000	3,000,000	0.0696	208,800	808,800
1	JEISON BEDOYA VILLADIEGO	30	2,403,667	2,403,667	2,403,667	2,403,667	384,600	96,100	2,403,667	0.0696	167,300	648,000
1	SERGIO ANDRES CASTILLO RODRIGUEZ	30	1,568,001	1,568,001	1,568,001	1,568,001	250,900	62,700	1,568,001	0.0696	109,100	422,700
1	JOSE DUVER CADENA GUZMAN	30	1,895,440	1,895,440	1,895,440	1,895,440	303,300	75,800	1,895,440	0.0696	131,900	511,000
1	JOSE DANIEL ORDOÑEZ MARTINEZ	30	1,939,438	1,939,438	1,939,438	1,939,438	310,300	77,600	1,939,438	0.0696	135,000	522,900
1	JAIME ALEJANDRO VERGARA BANQUET	30	1,983,582	1,983,582	1,983,582	1,983,582	317,400	79,300	1,983,582	0.0696	138,100	534,800
1	VICTORINO MATTOS CENTENO	30	2,436,001	2,436,001	2,436,001	2,436,001	389,800	97,400	2,436,001	0.0696	169,500	656,700
1	PLINIO RINCON PEDRAZA	30	1,942,500	1,225,008	1,225,008	1,300,000	208,000	52,000	1,192,500	0.0696	83,000	343,000
1	FAUSTO ALEJANDRO ZAMUDIO MARTINEZ	30	2,027,642	2,027,642	2,027,642	2,027,642	324,400	81,100	1,864,342	0.0696	129,800	535,300
1	LUIS MAURICIO CAMARGO GONZALEZ	30	1,735,063	1,735,063	1,735,063	1,735,063	277,600	69,400	1,081,863	0.0696	75,300	422,300
1	LUIS CARLOS RUEDA CAMACHO	30	2,762,500	2,762,500	2,762,500	2,762,500	442,000	110,500	1,742,500	0.0696	121,300	673,800
1	CARLOS TAPASCO AZCARATE	30	3,359,812	3,359,812	3,359,812	3,359,812	537,600	134,400	3,062,812	0.0696	213,200	885,200
1	JAIME ALBERTO ARROYO GARCIA	30	1,805,917	1,805,917	1,805,917	1,805,917	288,900	72,200	1,805,917	0.0696	125,700	486,800
1	BRAIJAN EDUARDO SILVA FLOREZ	30	2,661,750	2,661,750	2,661,750	2,661,750	425,900	106,500	2,661,750	0.0696	185,300	717,700
1	CARLOS ANDRES GARCIA RIOS	30	3,739,469	3,739,469	3,739,469	3,739,469	598,300	149,600	3,739,469	0.0696	260,300	1,008,200
1	ALEXANDER DE LA CRUZ MARTINEZ	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	CRISTOBAL FLOREZ ESCOBAR	30	2,250,566	2,250,566	2,250,566	2,250,566	360,100	90,000	2,022,300	0.0696	140,800	590,900
1	ALVARO LOPEZ RODRIGUEZ	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,327,476	0.0696	92,400	352,400
1	CAMILO RUIZ CASTILLO	30	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	336,000	84,000	2,100,000	0.0696	146,200	566,200
1	ALVARO BOTIA PINILLA	30	2,247,076	2,247,076	2,247,076	2,247,076	359,500	89,900	2,247,076	0.0696	156,400	605,800
1	CESAR JULIO AMAYA SIERRA	30	2,142,834	2,142,834	2,142,834	2,142,834	342,900	85,700	2,142,834	0.0696	149,100	577,700
1	DONALDO NAVARRO ESQUEA	30	3,210,156	3,210,156	3,210,156	3,210,156	513,600	128,400	3,210,156	0.0696	223,400	865,400
1	JOSE RENE GONZALEZ RODRIGUEZ	30	2,599,666	2,599,666	2,599,666	2,599,666	415,900	104,000	2,599,666	0.0696	180,900	700,800
1	CARLOS WILLIAM CASTIBLANCO UPEGUI	30	1,999,563	1,999,563	1,999,563	1,999,563	319,900	80,000	1,999,563	0.0696	139,200	539,100
1	JHOHN JAIVER VELASCO MOSQUERA	30	3,437,775	3,437,775	3,437,775	3,437,775	550,000	137,500	3,437,775	0.0696	239,300	926,800
1	JIANCARLO PALACIOS VALERA	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	OSCAR JAVIER SIERRA CHARRY	30	2,358,609	2,358,609	2,358,609	2,358,609	377,400	94,300	2,358,609	0.0696	164,200	635,900
1	JHON KENNEDY LAVAO CABEZA	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	REINERIO DE JESÚS LOPEZ CARDONA	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	LUIS MANUEL GONZALEZ	30	1,462,501	1,462,501	1,462,501	1,462,501	234,000	58,500	1,289,167	0.0696	89,700	382,200
1	GERMAN ANDRES CASTRO SERVA	30	2,035,000	2,035,000	2,035,000	2,035,000	325,600	81,400	1,093,934	0.0696	76,100	483,100
1	ELIECER DE JESUS CUBILLOS PEÑA	30	2,023,938	2,023,938	2,023,938	2,023,938	323,800	81,000	2,023,938	0.0696	140,900	545,700

1	MANUEL ALEJANDRO CELEITA GONZALEZ	30	1,661,564	1,661,564	1,661,564	1,661,564	265,900	66,500	1,488,230	0.0696	103,600	436,000
1	LUIS RICARDO GIL PARRA	30	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	240,000	60,000	1,313,334	0.0696	91,400	391,400
1	LUIS ALBERTO GONZALEZ	30	1,427,022	1,427,022	1,427,022	1,427,022	228,300	57,100	1,253,688	0.0696	87,300	372,700
1	ANTONY DANIEL GUEVARA ANGULO	30	1,420,251	1,420,251	1,420,251	1,420,251	227,200	56,800	1,246,917	0.0696	86,800	370,800
1	OSCAR HERNANDO RAMIREZ BOLIVAR	30	2,446,646	2,446,646	2,446,646	2,446,646	391,500	97,900	2,446,646	0.0696	170,300	659,700
1	JOHN SEBASTIAN RODRIGUEZ	30	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	432,000	108,000	2,250,000	0.0696	156,600	696,600
1	KEVIN EDUARDO DIAZ RIVEROS	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,543,043	0.0696	107,400	367,400
1	HENRY ENRIQUE RUA DOMINGUEZ	30	1,458,000	1,458,000	1,458,000	1,458,000	233,300	58,300	1,458,000	0.0696	101,500	393,100
1	CESAR JULIO GUTIERREZ RODRIGUEZ	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	DAMAR ANTONIO GUTIERREZ GAMERO	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	PAULINO DIAZ SALAS	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	JHAN FRANCO DE LA HOZ GUTIERREZ	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	ALBERT RAFAEL GUTIERREZ DE LA CRUZ	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	GUSTAVO RODRIGUEZ PINEDA	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	LUIS DANIEL GARZON BELTRAN	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	JUAN SEBASTIAN BARRETO BONILLA	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	MAURICIO BERNAL BERNAL	2	1,300,000	86,667	86,667	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	ORLANDO BERNAL BERNAL	2	1,300,000	86,667	86,667	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	ELIAS JOSE GONZALEZ TUIRAN	1	1,300,000	43,333	43,333	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	JUAN CARLOS CHARRIS RUA	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	ANGELICA MARIA PAEZ JIMENEZ	30	1,718,439	1,718,439	1,718,439	1,718,439	275,000	68,700	1,545,105	0.0696	107,500	451,200
1	MONICA LIZETH ROMERO AHUMADA	30	1,558,646	1,558,646	1,558,646	1,558,646	249,400	62,300	1,428,646	0.0696	99,400	411,100
1	KEVIN STIVEN SOLORZANO MENDEZ	30	1,622,022	1,622,022	1,622,022	1,622,022	259,500	64,900	1,448,688	0.0696	100,800	425,200
1	ANYELA MILENA GARCIA GARZON	30	1,836,251	1,836,251	1,836,251	1,836,251	293,800	73,500	1,662,917	0.0696	115,700	483,000
1	CAMILO ANDRES RODRIGUEZ GALVIS	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	EMERSON BOLAÑO CASTILLO	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	HARRY ESTEBAN ROJAS CICUAMIA	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	WILBERTO CASTELLANOS PIÑA	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	JHON ALEXANDER CARDONA CASTRO	1	1,300,000	43,333	43,333	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	JOSE HERIBERTO LOPEZ ROJAS	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	OSCAR HERNANDO MORA SERRANO	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	REINEL RIOS ZEA	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	ADRIANA MARIA SAAVEDRA	30	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	864,000	216,000	5,400,000	0.0696	375,800	1,455,800
1	LEONEL FUENMAYOR GARCIA	5	1,300,000	216,667	216,667	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	OSCAR IVAN POLO QUINTERO	2	1,300,000	86,667	86,667	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	JHAN CARLOS POLO QUINTERO	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	FERNANDO HUERTAS POLO	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	EDUIN JOSE HERNANDEZ RAMIREZ	30	1,664,272	1,664,272	1,664,272	1,664,272	266,300	66,600	1,490,938	0.0696	103,800	436,700
1	SANDRA MARCELA DUARTE BELTRAN	1	97,501	3,250	3,250	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	YURI ALEXANDRA BOBADILLA SOACHA	30	1,394,793	1,394,793	1,394,793	1,394,793	223,200	55,800	1,091,549	0.0696	76,000	355,000
1	JUAN GILBERTO QUINTERO DUITAMA	30	1,777,751	1,777,751	1,777,751	1,777,751	284,400	71,100	1,604,417	0.0696	111,700	467,200
1	JOSE ALEXANDER ANZOLA RUIZ	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	YSIDRO RAFAEL RIERA	15	1,300,000	650,000	650,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	FRANK EDUARD MORENO MADRID	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	CRISTIAN DARIO BARRAGAN VACA	24	1,300,000	1,040,000	1,040,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	ARNOL GARCIA HERNANDEZ	22	1,300,000	953,333	953,333	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	MAICOL ESTIBEN GARCIA ORTIZ	22	1,300,000	953,333	953,333	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	ALEXIS GARCIA OSPINA	22	1,300,000	953,333	953,333	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	JAIR FERNEY GARZON CESPEDES	22	1,300,000	953,333	953,333	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	JUAN JOSE LIZARAZO ZAMBRANO	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	ADOLFO SAMUEL LOPEZ	30	2,314,000	2,314,000	2,314,000	2,314,000	370,200	92,600	2,314,000	0.0696	161,100	623,900
1	JHON MILLER CARDENAS CARVAJAL	30	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	SANDRA LILIANA CALVIJO GAITAN	23	1,501,360	1,151,043	1,151,043	1,300,000	208,000	52,000	977,709	0.0696	68,000	328,000
1	JHON JAIRO VILLAMIL MENDOZA	24	1,300,000	1,040,000	1,040,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	HERNANDO LLANOS SANCHEZ	12	1,300,000	520,000	520,000	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	JIMMY FABIAN RAMIREZ ZABALA	1	1,300,000	43,333	43,333	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	JORGE ELIECER MORENO	1	1,300,000	43,333	43,333	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
1	JUAN DARIO GUASCA MORENO	1	1,300,000	43,333	43,333	1,300,000	208,000	52,000	1,300,000	0.0696	90,500	350,500
94	**TOTAL**		**$ 212,408,619.64**	**$ 201,902,845.67**	**$ 194,761,845.67**	**$ 200,740,171.00**	**$ 32,118,700.00**	**$ 8,140,000.00**	**$ 191,210,501.00**		**$ 14,688,767.00**	**$ 54,947,500.00**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900773521	7	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUOBRAS	carrera 11 c 3-60 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4801213	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	551855785	9465309337	E	2024/04/04	2024/04/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,894,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSTRUOBRAS (30 Afiliados)																						$21,630,010	$3,461,800			$22,930,010	$918,200			$24,984,735	$1,000,300			$22,930,010		$1,513,700		$0	$0		$6,894,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900527061	7	JMS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CARRERA 45A NO 91 41 OF 302	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7030651	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	557075236	9465407493	E	2024/04/12	2024/04/05	BANCO DE BOGOTA	0	$75,244,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA (98 Afiliados)																								$242,189,236	$39,165,800			$244,279,236	$11,051,500			$244,109,372	$9,769,500			$244,279,236		$14,189,000		$15,000,000	$750,000		$74,925,800
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (11 Afiliados)																								$25,905,750	$4,145,000			$27,995,750	$1,119,900			$28,919,361	$1,156,900			$27,995,750		$142,400		$0	$0		$6,564,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)																								$25,905,750	$4,145,000			$27,995,750	$1,119,900			$28,919,361	$1,156,900			$27,995,750		$142,400		$0	$0		$6,564,200
1	CC	1069752171	ACOSTA VICTOR																			23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
2	CC	53124398	BARRERA NANCY																			23030 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS017	30	$2,200,000	$88,000	CCF24	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	Si	$539,500
3	PT	5384244	CAMACHO YOJAIDYS													X						23030 1	4	$200,000	$32,000	EPS005	4	$200,000	$8,000	CCF24	4	$200,000	$8,000	14-11	4	$200,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$48,000
4	PT	5384244	CAMACHO YOJAIDYS																			23030 1	26	$1,300,000	$208,000	EPS005	26	$1,300,000	$52,000	CCF24	26	$1,300,000	$52,000	14-11	26	$1,300,000	0.522%	$6,800	26	$0	$0	Si	$318,800
5	CC	51988065	GUTIERREZ JEANNETTE																			23030 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS010	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	0.522%	$23,500	30	$0	$0	Si	$1,103,500
6	CC	36345837	MORA CIELO													X						23030 1	4	$600,000	$96,000	EPS005	4	$600,000	$24,000	CCF24	4	$600,000	$24,000	14-11	4	$600,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$144,000
7	CC	36345837	MORA CIELO																			23030 1	26	$3,900,000	$624,000	EPS005	26	$3,900,000	$156,000	CCF24	26	$3,900,000	$156,000	14-11	26	$3,900,000	0.522%	$20,400	26	$0	$0	Si	$956,400
8	CC	36306901	MURCIA TULIA																			23030 1	30	$1,905,750	$305,000	EPS017	30	$1,905,750	$76,300	CCF24	30	$1,905,750	$76,300	14-11	30	$1,905,750	0.522%	$10,000	30	$0	$0	Si	$467,600
9	CC	79627360	OCHOA RAUL		X																X	23090 1	15	$2,500,000	$400,000	EPS002	15	$2,500,000	$100,000	CCF24	15	$3,423,611	$137,000	14-11	15	$2,500,000	0.522%	$13,100	15	$0	$0	Si	$650,100
10	CC	1002095884	PEREZ BELSY	X																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
11	CC	20211777	RIVEROS LUCY																				0	$0	$0	EPS005	30	$2,090,000	$83,600	CCF24	30	$2,090,000	$83,600	14-11	30	$2,090,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	Si	$178,200
12	CC	1012330294	SIERRA MIGUEL																			25-14	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF24	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	0.522%	$16,800	30	$0	$0	Si	$784,800
13	CC	50848860	VEGA ALBERTINA	X																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Centro de Trabajo: OBRA (87 Afiliados)																								$216,283,486	$35,020,800			$216,283,486	$9,931,600			$215,190,011	$8,612,600			$216,283,486		$14,046,600		$15,000,000	$750,000		$68,361,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (87 Afiliados)																								$216,283,486	$35,020,800			$216,283,486	$9,931,600			$215,190,011	$8,612,600			$216,283,486		$14,046,600		$15,000,000	$750,000		$68,361,600
14	CC	4061363	ACUÑA ALVARO													X						23030 1	5	$216,667	$34,700	MIN001	5	$216,667	$8,700	CCF24	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$52,100
15	CC	4061363	ACUÑA ALVARO									X										23030 1	25	$1,144,272	$183,100	MIN001	25	$1,144,272	$45,800	CCF24	25	$1,144,272	$45,800	14-11	25	$1,144,272	6.960%	$79,700	25	$0	$0	Si	$354,400
16	CC	1069744142	ALVAREZ LEIDY									X										23030 1	30	$1,624,323	$259,900	EPS041	30	$1,624,323	$65,000	CCF24	30	$1,624,323	$65,000	14-11	30	$1,624,323	6.960%	$113,100	30	$0	$0	Si	$503,000
17	CC	5824796	AMAYA CESAR									X										23030 1	30	$2,142,834	$342,900	EPS002	30	$2,142,834	$85,800	CCF24	30	$2,142,834	$85,800	14-11	30	$2,142,834	6.960%	$149,200	30	$0	$0	Si	$663,700
18	CC	80845794	AREVALO LARRY									X										23030 1	30	$2,070,688	$331,400	EPS017	30	$2,070,688	$82,900	CCF24	30	$2,070,688	$82,900	14-11	30	$2,070,688	6.960%	$144,200	30	$0	$0	Si	$641,400
19	CC	83116084	ARISMENDY PLACIDO											X								23020 1	2	$138,387	$22,200	EPS002	2	$138,387	$5,600	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$138,387	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$27,800
20	CC	83116084	ARISMENDY PLACIDO											X								23020 1	8	$420,696	$67,400	EPS002	8	$420,696	$16,900	CCF24	0	$0	$0	14-11	8	$420,696	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$84,300
21	CC	83116084	ARISMENDY PLACIDO									X										23020 1	20	$1,592,517	$254,900	EPS002	20	$1,592,517	$63,800	CCF24	20	$1,592,517	$63,800	14-11	20	$1,592,517	6.960%	$110,900	20	$0	$0	Si	$493,400
22	CC	1129537047	ARROYO JAIME									X										23030 1	30	$1,805,917	$289,000	EPS037	30	$1,805,917	$72,300	CCF24	30	$1,805,917	$72,300	14-11	30	$1,805,917	6.960%	$125,700	30	$0	$0	Si	$559,300
23	CC	18882284	BARRETO MARCO																			25-14	30	$2,970,000	$475,200	EPS017	30	$2,970,000	$118,800	CCF24	30	$2,970,000	$118,800	14-11	30	$2,970,000	6.960%	$206,800	30	$0	$0	Si	$919,600
24	CC	1085038745	BEDOYA JEISON									X										23030 1	30	$2,403,667	$384,600	EPS005	30	$2,403,667	$96,200	CCF24	30	$2,403,667	$96,200	14-11	30	$2,403,667	6.960%	$167,300	30	$0	$0	Si	$744,300
25	CC	1079032568	BELTRAN JADER													X						23020 1	12	$880,000	$140,800	EPS005	12	$880,000	$35,200	CCF24	12	$880,000	$35,200	14-11	12	$880,000	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$211,200
26	CC	1079032568	BELTRAN JADER									X										23020 1	18	$1,423,125	$227,700	EPS005	18	$1,423,125	$57,000	CCF24	18	$1,423,125	$57,000	14-11	18	$1,423,125	6.960%	$99,100	18	$0	$0	Si	$440,800
27	CC	1026568117	BENITEZ GERSSON												X							25-14	14	$2,100,000	$336,000	EPS005	14	$2,100,000	$84,000	CCF24	0	$0	$0	14-11	14	$2,100,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$420,000

365

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900527061	7	JMS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	CARRERA 45A NO 91 41 OF 302	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7030651	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	557075236	9465407493	E	2024/04/12	2024/04/05	BANCO DE BOGOTA	0	$75,244,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				98	$39,373,800	$0	$0	$39,373,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$4,540,100	$0	$0	$4,540,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	$11,809,300	$0	$0	$11,809,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	$16,083,300	$0	$0	$16,083,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$6,541,100	$0	$0	$6,541,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$400,000	$0	$0	$400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				99	$14,195,800	$0	$0	$14,195,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	99	$14,195,800	$0	$0	$14,195,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				99	$9,821,500	$0	$0	$9,821,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	98	$9,769,500	$0	$0	$9,769,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				99	$11,103,500	$0	$0	$11,103,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$133,000	$0	$0	$133,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$651,000	$0	$0	$651,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$3,141,500	$0	$0	$3,141,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	28	$2,364,800	$0	$0	$2,364,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$54,500	$0	$0	$54,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$947,700	$0	$0	$947,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$295,500	$0	$0	$295,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$1,323,300	$0	$0	$1,323,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	$2,192,200	$0	$0	$2,192,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$450,000	$0	$0	$450,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$450,000	$0	$0	$450,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				**99**	**$75,244,600**	**$0**	**$0**	**$75,244,600**

369

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900659905	4	TRANSPORTES MARTINEZ RIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV TR DE OCCIDENTE N 1 59 OF9	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8274563	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	550124871	9465280599	E	2024/04/02	2024/04/02	BANCO DE BOGOTA	0	$9,343,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (22 Afiliados)						$31,104,064	$4,976,800			$31,104,064	$1,244,200			$31,104,064	$1,244,200			$31,104,064	$1,878,000		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)						$3,260,000	$521,600			$3,260,000	$130,400			$3,260,000	$130,400			$3,260,000	$141,900		$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$3,260,000	$521,600			$3,260,000	$130,400			$3,260,000	$130,400			$3,260,000	$141,900		$0	$0
1	CC	1019121627	MARTINEZ PAULA	25-14	30	$3,260,000	$521,600	EPS017	30	$3,260,000	$130,400	CCF21	30	$3,260,000	$130,400	14-11	30	$3,260,000	$141,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: TARIFA 5 (19 Afiliados)						$24,700,000	$3,952,000			$24,700,000	$988,000			$24,700,000	$988,000			$24,700,000	$1,719,500		$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (19 Afiliados)						$24,700,000	$3,952,000			$24,700,000	$988,000			$24,700,000	$988,000			$24,700,000	$1,719,500		$0	$0
2	CC	79189427	ABRIL OSCAR	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	2970255	BARBOSA WILSON	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	11434789	BEJARANO MIGUEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	11437449	CAMACHO FRANCISCO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	80820959	CAMARGO EDWIN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	9398551	CASTAÑEDA MOISES	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	7310459	CASTILLO CELSO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	6613596	CRUZ JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
10	CC	79995803	CUBILLOS ARMANDO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
11	CC	79299148	FORERO HECTOR	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
12	CC	3234430	MAHECHA MIGUELITO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
13	CC	1003691298	MARTINEZ HAROLD	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
14	CC	80019373	MARTINEZ JESUS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
15	CC	80392806	MARTINEZ NEYDER	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
16	CC	17322941	MARTINEZ VICTOR	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
17	CC	1010089604	NIETO BLAGUER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
18	CC	79828316	NIETO JOHN	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
19	CC	4253062	OLIVEROS YOVAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
20	CC	79964178	VELANDIA NORBERTO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: TARIFA1 (2 Afiliados)						$3,144,064	$503,200			$3,144,064	$125,800			$3,144,064	$125,800			$3,144,064	$16,600		$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$3,144,064	$503,200			$3,144,064	$125,800			$3,144,064	$125,800			$3,144,064	$16,600		$0	$0
21	CC	1070943630	GARCIA MAGDALENA	230201	30	$1,572,032	$251,600	EPS008	30	$1,572,032	$62,900	CCF21	30	$1,572,032	$62,900	14-11	30	$1,572,032	$8,300	30	$0	$0
22	CC	20532076	RIOS FLOR	230201	30	$1,572,032	$251,600	EPS017	30	$1,572,032	$62,900	CCF21	30	$1,572,032	$62,900	14-11	30	$1,572,032	$8,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(22)**			$31,104,064	$4,976,800			$31,104,064	$1,244,200			$31,104,064	$1,244,200			$31,104,064	$1,878,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900659905	4	TRANSPORTES MARTINEZ RIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV TR DE OCCIDENTE N 1 59 OF9	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8274563	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	550124871	9465280599	E	2024/04/02	2024/04/02	BANCO DE BOGOTA	0	$9,343,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$4,976,800	$0	$0	$4,976,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$624,000	$0	$0	$624,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$2,185,600	$0	$0	$2,185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,127,200	$0	$0	$1,127,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,878,000	$0	$0	$1,878,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$1,878,000	$0	$0	$1,878,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,244,200	$0	$0	$1,244,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	22	$1,244,200	$0	$0	$1,244,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$1,244,200	$0	$0	$1,244,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$426,900	$0	$0	$426,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$661,300	$0	$0	$661,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				**22**	**$9,343,200**	**$0**	**$0**	**$9,343,200**

372

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que NATALIA QUECHO SARMIENTO identificado(a) con CC 37901187 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NI 800140959

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465459235	572108358	E	2024-04-12	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	17									X									$7,300,000	4%	$292,000
9465459235	572108358	E	2024-04-12	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	13													X					$3,163,333	4%	$126,600
9465459235	572108358	E	2024-04-12	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	17									X									$7,300,000	16%	$1,168,000
9465459235	572108358	E	2024-04-12	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	13													X					$3,163,333	16%	$506,200
9465459235	572108358	E	2024-04-12	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	17									X									$7,300,000	6.96%	$508,100
9465459235	572108358	E	2024-04-12	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	13													X					$3,163,333	0%	$0
9465459235	572108358	E	2024-04-12	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	17									X									$7,300,000	4%	$292,000
9465459235	572108358	E	2024-04-12	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	13													X					$3,163,333	4%	$126,600
9465459235	572108358	E	2024-04-12	FSP	230901	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	17									X									$7,300,000		$36,500
9465459235	572108358	E	2024-04-12	FSP	230901	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	13													X					$3,163,333		$15,900
9465459235	572108358	E	2024-04-12	SUB	230901	SKANDIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	17									X									$7,300,000		$36,500
9465459235	572108358	E	2024-04-12	SUB	230901	SKANDIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	13													X					$3,163,333		$15,900

Este certificado se expide el día 2024-04-15 a las 10:04.

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900773521	7	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUOBRAS	carrera 11 c 3-60 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4801213	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	551855785	9465309337	E	2024/04/04	2024/04/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,894,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	$3,461,800	$0	$0	$3,461,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$48,600	$0	$0	$48,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$777,700	$0	$0	$777,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,491,000	$0	$0	$1,491,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$1,144,500	$0	$0	$1,144,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,513,700	$0	$0	$1,513,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	30	$1,513,700	$0	$0	$1,513,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,000,300	$0	$0	$1,000,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	30	$1,000,300	$0	$0	$1,000,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				30	$918,200	$0	$0	$918,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$132,000	$0	$0	$132,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$38,200	$0	$0	$38,200
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$74,600	$0	$0	$74,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$255,100	$0	$0	$255,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$190,800	$0	$0	$190,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$72,900	$0	$0	$72,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$50,600	$0	$0	$50,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				**30**	**$6,894,000**	**$0**	**$0**	**$6,894,000**

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC**, identificada con **NI** número **901536376**, aportó por el empleado **OSCAR JAVIER SIERRA CHARRY**, identificado(a) con **CC** número **17616651** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **76296572** para el periodo de salud **2024-04** y pensiones **2024-03** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
14-11	ARL SURA	1	0								X							0		30	$2.358.609	$164.200	Marzo - 2024	76296572	18/04/2024	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0								X							0		30	$2.358.609	$94.400	Marzo - 2024	76296572	18/04/2024	S
230301	Porvenir	1	0								X							0		30	$2.358.609	$377.400	Marzo - 2024	76296572	18/04/2024	S
EPS005	Sanitas EPS	1	0								X							0		30	$2.358.609	$94.400	Abril - 2024	76296572	18/04/2024	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 18 días del mes Abril de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC**, identificada con **NI** número **901536376**, aportó por el empleado **ADRIANA MARIA SAAVEDRA** , identificado(a) con **CC** número **65824937** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **76213214** para el periodo de salud **2024-04** y pensiones **2024-03** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
14-11	ARL SURA	1	0															0		30	$5.400.000	$375.900	Marzo - 2024	76213214	18/04/2024	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$5.400.000	$216.000	Marzo - 2024	76213214	18/04/2024	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1	0															0		30	$5.400.000	$864.000	Marzo - 2024	76213214	18/04/2024	S
EPS005	Sanitas EPS	1	0															0		30	$5.400.000	$216.000	Abril - 2024	76213214	18/04/2024	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 18 días del mes Abril de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79610058-0	OSCAR RAMIREZ PARRA	Carrera 71 No. 64D - 05	7256617	oramirezing@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	17/04/2024	75911612	$385.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	5	700	0	163.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Old Mutual	800253055-2	208.000	0	0	0	0	5	900	0	208.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	13.600				13.600	5	100	13.700			136	13.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	163.200
Pensión	1	208.000	208.900
Riesgos Laborales	1	13.600	13.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	384.100	385.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79610058-0	OSCAR RAMIREZ PARRA	Carrera 71 No. 64D - 05	7256617	oramirezing@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	17/04/2024	75911612	$385.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79610058	RAMIREZ PARRA OSCAR	57	0			N																	230901	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	2	13.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que FCR CONTRATISTAS SAS identificado(a) con NI 900777681 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CAMILO RUIZ CASTILLO identificado(a) con CC 1069745131

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465743861	583878281	E	2024-04-18	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30									X									$2,100,000	4%	$84,000
9465743861	583878281	E	2024-04-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$2,100,000	16%	$336,000
9465743861	583878281	E	2024-04-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30									X									$2,100,000		$0
9465743861	583878281	E	2024-04-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30									X									$2,100,000		$0
9465743861	583878281	E	2024-04-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30									X									$0	0%	$0
9465743861	583878281	E	2024-04-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30									X									$0	0%	$0
9465743861	583878281	E	2024-04-18	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$2,100,000	6.96%	$146,200
9465743861	583878281	E	2024-04-18	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$2,100,000	4%	$84,000

Este certificado se expide el día 2024-04-18 a las 10:40.

380

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que FCR CONTRATISTAS SAS identificado(a) con NI 900777681 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ADOLFO SAMUEL LOPEZ identificado(a) con PT 5107445

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465743861	583878281	E	2024-04-18	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30									X									$2,314,000	4%	$92,600
9465743861	583878281	E	2024-04-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$2,314,000	16%	$370,300
9465743861	583878281	E	2024-04-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30									X									$2,314,000		$0
9465743861	583878281	E	2024-04-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30									X									$2,314,000		$0
9465743861	583878281	E	2024-04-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30									X									$0	0%	$0
9465743861	583878281	E	2024-04-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30									X									$0	0%	$0
9465743861	583878281	E	2024-04-18	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$2,314,000	6.96%	$161,100
9465743861	583878281	E	2024-04-18	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$2,314,000	4%	$92,600

Este certificado se expide el día 2024-04-18 a las 10:35.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901749347-4	SOLUCIONES R Y A SAS	CL 106 B SUR NO 5 57	3178871374	soluciones.rya.adm@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	19/04/2024	76300991	$2.149.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	104.000	0		0		0	9	800	0	104.800	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	78.000	0		0		0	9	600	0	78.600	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	93.600	0		0		0	9	800	0	94.400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	104.000	0	0	0	0	9	800	0	104.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	998.400	0	0	0	0	9	7.700	0	1.006.100	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	479.700				479.700	9	3.700	483.400			4.797	483.400	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	275.600	9	2.200	277.800	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	275.600	277.800
Pensión	2	1.102.400	1.110.900
Riesgos Laborales	1	479.700	483.400
CCF	1	275.600	277.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.133.300	2.149.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901749347-4	SOLUCIONES R Y A SAS		CL 106 B SUR NO 5 57	3178871374	soluciones.rya.adm@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	19/04/2024	76300991	$2.149.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010224232	RODRIGUEZ GALVIS CAMILO ANDRES	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	10183574	BOLAÑOS CASTILLO EMERSON	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1034279401	ROJAS CICUAMIA HARRY ESTEBAN	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	5658826	CASTELLANOS PIÑA WILBERTO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	79976643	CARDENAS CARVAJAL JOHN MILLER	1	0			S		X															230201	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS008	650.000	26.000	14-11	650.000	5	45.300	CCF24	650.000	26.000	0	0	0	0	0
6	CC	79985177	VILLAMIL MENDOZA JOHN JAIRO	1	0			S	X																230301	1.040.000	166.400	0	0	0	0	EPS017	1.040.000	41.600	14-11	1.040.000	5	72.400	CCF24	1.040.000	41.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S identificado(a) con NI 830504592 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHNY ARLEY CASTRO CANDIA identificado(a) con CC 1121823741

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465494382	575818103	E	2024-04-15	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$4,200,000	4%	$168,000
9465494382	575818103	E	2024-04-15	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$4,200,000	16%	$672,000
9465494382	575818103	E	2024-04-15	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		$4,200,000		$0
9465494382	575818103	E	2024-04-15	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		$4,200,000		$0
9465494382	575818103	E	2024-04-15	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465494382	575818103	E	2024-04-15	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465494382	575818103	E	2024-04-15	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$4,200,000	0.522%	$22,000
9465494382	575818103	E	2024-04-15	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$4,200,000	4%	$168,000

Este certificado se expide el día 2024-04-23 a las 01:40.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CONSORCIO INTERVENTORIA BOGOTA 005 identificado(a) con NI 901666167 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDGAR ARDILA ROA identificado(a) con CC 79424918

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465645295	575628583	E	2024-04-15	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30									X									$4,876,900	4%	$195,100
9465645295	575628583	E	2024-04-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$4,876,900	16%	$780,400
9465645295	575628583	E	2024-04-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30									X									$4,876,900		$0
9465645295	575628583	E	2024-04-15	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30									X									$4,876,900		$0
9465645295	575628583	E	2024-04-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30									X									$0	0%	$0
9465645295	575628583	E	2024-04-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30									X									$0	0%	$0
9465645295	575628583	E	2024-04-15	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$4,876,900	6.96%	$339,500
9465645295	575628583	E	2024-04-15	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$4,876,900	4%	$195,100

Este certificado se expide el día 2024-04-23 a las 01:41.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901372705	8	R7 INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LA AGUADITA	DG 48 13 L 39 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3167611806	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	599607055	9466280459	E	2024/04/02	2024/04/26	BANCO DE BOGOTA	24	$1,980,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	4	$ 173.334	16%	SIN RIESGO	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.800		NUEVA EPS MOVILIDAD	4	$ 173.334	4%	$ 7.000	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	20	$ 866.667	12%	SIN RIESGO	$ 104.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.100		NUEVA EPS MOVILIDAD	20	$ 866.667	0%	$ 0	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	21	$ 910.000	16%	SIN RIESGO	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.600		COOSALUD MOVILIDAD	21	$ 910.000	4%	$ 36.400	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	9	$ 390.001	12%	SIN RIESGO	$ 46.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.900		COOSALUD MOVILIDAD	9	$ 390.001	0%	$ 0	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	21	$ 910.000	16%	SIN RIESGO	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.600		NUEVA E.P.S.	21	$ 910.000	4%	$ 36.400	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	9	$ 390.001	12%	SIN RIESGO	$ 46.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.900		NUEVA E.P.S.	9	$ 390.001	0%	$ 0	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PROTECCION	3	$ 130.000	16%	SIN RIESGO	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.800		SANITAS	3	$ 130.000	4%	$ 5.200	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PROTECCION	2	$ 86.667	12%	SIN RIESGO	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500		SANITAS	2	$ 86.667	0%	$ 0	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PROTECCION	21	$ 910.000	16%	SIN RIESGO	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.600		NUEVA E.P.S.	21	$ 910.000	4%	$ 36.400	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PROTECCION	9	$ 390.001	12%	SIN RIESGO	$ 46.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.900		NUEVA E.P.S.	9	$ 390.001	0%	$ 0	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	21	$ 910.000	16%	SIN RIESGO	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.600		CAJACOPI	21	$ 910.000	4%	$ 36.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	9	$ 390.000	12%	SIN RIESGO	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.800		CAJACOPI	9	$ 390.000	0%	$ 0	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	21	$ 910.000	16%	SIN RIESGO	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.600		NUEVA E.P.S.	21	$ 910.000	4%	$ 36.400	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	9	$ 390.001	12%	SIN RIESGO	$ 46.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.900		NUEVA E.P.S.	9	$ 390.001	0%	$ 0	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	3	$ 130.000	16%	SIN RIESGO	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.800		SANITAS	3	$ 130.000	4%	$ 5.200	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	10	$ 433.334	12%	SIN RIESGO	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.100		SANITAS	10	$ 433.334	0%	$ 0	$
																					$ 1.198.500						$ 199.400	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 7.000		COMPENSAR	4	$ 173.334	4%	$ 7.000	ARL SURA	4	$ 173.334	6,96%	5	$ 12.100	4	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 0		COMPENSAR	20	$ 866.667	0%	$ 0	ARL SURA	20	$ 866.667	0%	5	$ 0	20	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 36.400		COMPENSAR	21	$ 910.000	4%	$ 36.400	ARL SURA	21	$ 910.000	6,96%	5	$ 63.400	21	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 0		COMPENSAR	9	$ 390.001	0%	$ 0	ARL SURA	9	$ 390.001	0%	5	$ 0	9	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 36.400		COMPENSAR	21	$ 910.000	4%	$ 36.400	ARL SURA	21	$ 910.000	6,96%	5	$ 63.400	21	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 0		COMPENSAR	9	$ 390.001	0%	$ 0	ARL SURA	9	$ 390.001	0%	5	$ 0	9	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 5.200		COMPENSAR	3	$ 130.000	4%	$ 5.200	ARL SURA	3	$ 130.000	6,96%	5	$ 9.100	3	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 0		COMPENSAR	2	$ 86.667	0%	$ 0	ARL SURA	2	$ 86.667	0%	5	$ 0	2	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 36.400		COMPENSAR	21	$ 910.000	4%	$ 36.400	ARL SURA	21	$ 910.000	6,96%	5	$ 63.400	21	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 0		COMPENSAR	9	$ 390.001	0%	$ 0	ARL SURA	9	$ 390.001	0%	5	$ 0	9	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 36.400		COMPENSAR	21	$ 812.000	4%	$ 32.500	ARL SURA	21	$ 910.000	6,96%	5	$ 63.400	21	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 0		COMPENSAR	9	$ 348.000	0%	$ 0	ARL SURA	9	$ 390.000	0%	5	$ 0	9	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 36.400		COMPENSAR	21	$ 910.000	4%	$ 36.400	ARL SURA	21	$ 910.000	6,96%	5	$ 63.400	21	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 0		COMPENSAR	9	$ 390.001	0%	$ 0	ARL SURA	9	$ 390.001	0%	5	$ 0	9	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 5.200		COMPENSAR	3	$ 130.000	4%	$ 5.200	ARL SURA	3	$ 130.000	6,96%	5	$ 9.100	3	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 0		COMPENSAR	10	$ 433.334	0%	$ 0	ARL SURA	10	$ 433.334	0%	5	$ 0	10	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 199.400						$ 195.500						$ 347.300				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901372705	8	R7 INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LA AGUADITA	DG 48 13 L 39 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3167611806	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	599607055	9466280459	E	2024/04/02	2024/04/26	BANCO DE BOGOTA	24	$1,980,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,198,500	$24,500	$0	$1,223,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$974,700	$19,900	$0	$994,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$223,800	$4,600	$0	$228,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$347,300	$7,100	$0	$354,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$347,300	$7,100	$0	$354,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$195,500	$4,000	$0	$199,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$195,500	$4,000	$0	$199,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$199,400	$4,400	$0	$203,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$36,400	$800	$0	$37,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$36,400	$800	$0	$37,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$109,200	$2,300	$0	$111,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$7,000	$200	$0	$7,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$10,400	$300	$0	$10,700
TOTAL				8	$1,940,700	$40,000	$0	$1,980,700

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901372705	8	R7 INGENIERIA SAS	C - MIPYMES	BOGOTATRONCAL	DG 48 13 L 39 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3133881955	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	572096587	9465624755	E	2024/04/02	2024/04/12	BANCO DE BOGOTA	10	$240,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$173,500						$17,40	
																				$173,500						$17,40	
																				$173,500						$17,40	
						$1,300,000	No	Fijo	COLFONDOS	10	$433,334	16%	SIN RIESGO	$69,400	$0	$0	$0	$0	$0	$69,400		SALUD TOTAL	1	$433,334	4	$17,40	
						$1,300,000	No	Fijo	COLFONDOS	20	$866,667	12%	SIN RIESGO	$104,100	$0	$0	$0	$0	$0	$104,100		SALUD TOTAL	2	$866,667	0	$	
																				$173,500						$17,40	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$17,400						$17,400						$30,200				$0		$0		$0		$0	
	$17,400						$17,400						$30,200				$0		$0		$0		$0	
	$17,400						$17,400						$30,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$17,400		COMPENSAR	10	$433,334	4%	$17,400	ARL SURA	10	$433,334	6.96%	5	$30,200	10	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMPENSAR	20	$866,667	0%	$0	ARL SURA	20	$866,667	0%	5	$0	20	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$17,400						$17,400						$30,200				$0		$0		$0		$0	

CERTIFICACIÓN

Yo, **JOSÉ LUIS CLAVIJO OLMOS**, identificado con C. C. **No. 79.685.757** de Bogotá, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO PASCA CNJ**, con NIT 901.715.912-1, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (ICBF, SENA Y CCF), cuando a ello hubiere lugar, para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2024, pagados por la compañía durante el periodo del mes de marzo 2024. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en la ciudad de Bogotá a los cinco (5) días del mes de Abril de 2024

Cordialmente

JOSÉ LUIS CLAVIJO OLMOS
CC. No. 79.685.757
Representante Legal



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.685.757
CLAVIJO OLMOS
APELLIDOS
JOSE LUIS
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-OCT-1974
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

17-DIC-1992 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00031581-M-0079685757-20080726 0001481512A 1 6190009595


CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
Titular
JOSE LUIS
CLAVIJO OLMOS
Arquitecto
C.C.
79.685.757 de Bogotá
Matrícula Profesional
A25041999-79685757

Documento firmado digitalmente por: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.
Página 1 de un total de 1 página (s)

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

E572512

CERTIFICA

Que el Arquitecto JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS con cédula de ciudadanía No. 79685757 de Bogota D.C., registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A25041999-79685757, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 4 del 9 de Abril de 1999 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE.**

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 30 dias del mes de Junio de 2023 .

ALFREDO MANUEL REYES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web [https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digitall] y digite el siguiente código de verificación ng6g23J

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

CERTIFICACIÓN

Yo, **JUAN JOSE FERREIRA SANDINO** identificada con C. C. **No. 79.159.668** de Bogotá, en mi condición de Representante legal de **NAICA INGENIERIA SAS**, con NIT **901.635.303-0,** certifico que no tengo personal a cargo, por lo que no me encuentro obligado a realizar el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (ICBF, SENA Y CCF), cuando a ello hubiere lugar, para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2024

Se expide en la ciudad de Bogotá a los cinco (5) días del mes de abril de 2024

Cordialmente



_____

JUAN JOSE FERREIRA SANDINO
CC. No. 79.159.668
Representante legal

Cra. 7 No 75-51 Off: 602 Bogotá D.C. Colombia PBX: +57 (1) 640 1500


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.159.668
FERREIRA SANDINO
APELLIDOS
JUAN JOSE
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1964
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
31-ENE-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500100-00010381-M-0079159668-20080602
0000354038A 1
1680008989

CERTIFICACIÓN

Yo, **LUZ MARINA ACOSTA GALVIS** identificada con C. C. **No. 52.430.164** de Bogotá, en mi condición de Revisora fiscal de **CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS**, con NIT **800.140.959-1**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (ICBF, SENA Y CCF), cuando a ello hubiere lugar, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2024, pagados por la compañía durante el periodo del mes de marzo 2024. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en la ciudad de Bogotá a los cinco (05) días del mes de Abril de 2024.

Cordialmente



_____

LUZ MARINA ACOSTA GALVIS
CC. No. 59.430.164
Revisora Fiscal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **52.430.164**

ACOSTA GALVIS

APELLIDOS

LUZ MARINA

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-ENE-1979**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-MAR-1997 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00011562-F-0052430164-20080606 0000399523A 1 1140026882




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

239632-T

LUZ MARINA
ACOSTA GALVIS
C.C. 52430164
RES. INSCRIPCION 237 DEL 23/03/2018
FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

245991 265732

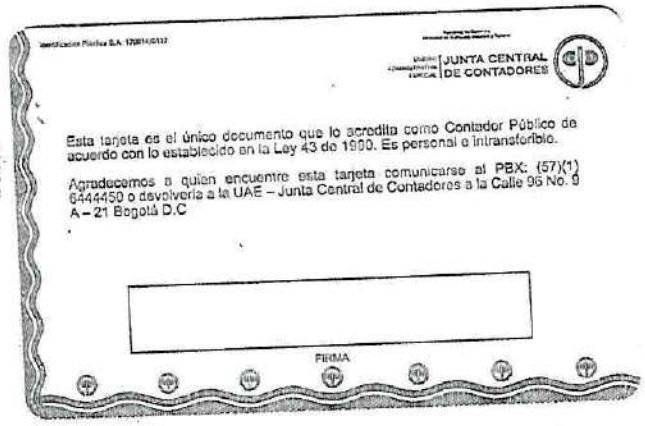

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3EF06ABCFA9763B3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ MARINA ACOSTA GALVIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52430164 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 239632-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **DIEGO FERNEY ESPINOSA RIVEROS**, identificado con cedula de ciudadanía número 93.400.090 en mi condición de Representante Legal de la empresa **JMS INGENIERIA SAS** identificada con NIT 900527061-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía; así mismo, el pago de los respectivos salarios y/o honorarios, liquidaciones y demás obligaciones laborales y contractuales del personal, en el periodo comprendido entre **1 al 31 de Marzo de 2024**.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 o la legislación aplicable vigente. Yo, **JACQUELINE RICO GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía número 39.786.722 de Usaquén y con Tarjeta Profesional TP. N° **122961-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **JMS INGENIERIA SAS** identificada con NIT **900527061-7,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía; cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía; así mismo, el pago de los respectivos salarios y/o honorarios, liquidaciones y demás obligaciones laborales y contractuales del personal, en el periodo entre **1 al 31 de Marzo de 2024**. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 o la legislación aplicable vigente.

La empresa **JMS INGENIERIA SAS**, se encuentra a paz y salvo dando cumplimiento a las obligaciones laborales, pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral, parafiscales, salarios y/o honorarios, Para el contrato **N° 708 DE 2023. "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500"**

Dada en Bogotá D.C., el día 05 del mes de Abril de 2024.

JACQUELINE RICO GONZALEZ
CC. 39.786.722 de Usaquén
TP 122961-T
Revisora Fiscal

DIEGO FERNEY ESPINOSA RIVEROS
Representante Legal



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
122961-T
JACQUELINE
RICO GONZALEZ
C.C. 39786722
RESOLUCION INSCRIPCION 331 FECHA 2006/11/30
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA
PRESIDENTE
HECTOR JAIME CORREA PINZON



FIRMA DEL TITULAR
43590
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
39.786.722
NUMERO
RICO GONZALEZ
APELLIDOS
JACQUELINE
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 22-NOV-1970
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
28-FEB-1989 USAQUEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
ALBABETH Z SERGIO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500101-47152191-F-0039786722-20061109 03937 06312A 02 214981196

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D9ECD963AB4407F4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JACQUELINE RICO GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39786722 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122961-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

VER ANEXO 6. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602
Tel. (Fax) 6012564013 - 3102015021
E-mail interventoriaiccu815@gmail.com

COPEBA S.A.S Nit: 830.011.122-9	FORMATO DE ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CÓDIGO:	F-SST-SI-05
		VERSION:	1
		FECHA:	15/11/2019

"CON MI FIRMA CERTIFICO QUE HE RECIBIDO EL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO Y ME COMPROMETO A CUIDARLO Y EMPLEARLO DE MANERA CORRECTA DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DADAS Y FRENTE A LOS RIESGOS PARA LOS QUE FUE DISEÑADO. DOY FE QUE RECIBÍ Y ENTENDÍ LAS INSTRUCCIONES SOBRE EL USO CORRECTO, MANTENIMIENTO Y NOVEDADES DE LOS EPP'S QUE ME ENTREGAN"

NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	Sergio Suarez Zamudio	CARGO: Topografo	CÉDULA 1069753783	CIUDAD: Fusa FECHA: 28-02-24

FECHA	MARQUE CON UNA "X" LA CASILLA DEL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL SUMINISTRADO											FIRMA DE RECIBIDO
	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCIÓN AUDITIVA (TIPO COPA)	PROTECCIÓN AUDITIVA (INSERCIÓN)	PROTECCIÓN VISUAL	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	CASCO DIELÉCTRICO	BOTAS EN CAUCHO	IMPERMEABLE	GUANTES EN CARNAZA	GUANTES EN VAQUETA	OBSERVACIONES	
28-02-2024	—	—	1	1	10	—	—	—	—	1		Sergio

Entregó: Jhon Alexander Peña Guzmán — Firma: Jhon Peña

COPEBA S.A.S Nit: 830.011.122-9	FORMATO DE ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CÓDIGO:	F-SST-SI-05
		VERSION:	1
		FECHA:	15/11/2019

"CON MI FIRMA CERTIFICO QUE HE RECIBIDO EL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO Y ME COMPROMETO A CUIDARLO Y EMPLEARLO DE MANERA CORRECTA DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DADAS Y FRENTE A LOS RIESGOS PARA LOS QUE FUE DISEÑADO. DOY FE QUE RECIBÍ Y ENTENDÍ LAS INSTRUCCIONES SOBRE EL USO CORRECTO, MANTENIMIENTO Y NOVEDADES DE LOS EPP'S QUE ME ENTREGAN"

NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	Cristian Mario	CARGO:	Topografo	CÉDULA	1097494335	CIUDAD:	Fuso
						FECHA:	28/02/24

FECHA	MARQUE CON UNA "X" LA CASILLA DEL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL SUMINISTRADO											FIRMA DE RECIBIDO
	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCIÓN AUDITIVA (TIPO COPA)	PROTECCIÓN AUDITIVA (INSERCIÓN)	PROTECCIÓN VISUAL	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	CASCO DIELÉCTRICO	BOTAS EN CAUCHO	IMPERMEABLE	GUANTES EN CARNAZA	GUANTES EN VAQUETA	OBSERVACIONES	
28-02-24	/	/	1	1	10	/	/	/	/	1		

Entregó: Jhon Alexander Pena Guzmán

Firma:

COPEBA S.A.S Nit: 830.011.122-9	FORMATO DE ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CÓDIGO:	F-SST-SI-05
		VERSION:	1
		FECHA:	15/11/2019

"CON MI FIRMA CERTIFICO QUE HE RECIBIDO EL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO Y ME COMPROMETO A CUIDARLO Y EMPLEARLO DE MANERA CORRECTA DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DADAS Y FRENTE A LOS RIESGOS PARA LOS QUE FUE DISEÑADO. DOY FE QUE RECIBÍ Y ENTENDÍ LAS INSTRUCCIONES SOBRE EL USO CORRECTO, MANTENIMIENTO Y NOVEDADES DE LOS EPP'S QUE ME ENTREGAN"

NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	Julian Camilo Castiblanco Ospina	CARGO: CONDUCTOR CAMIONETA	CÉDULA 1007847413	CIUDAD: Fusagasuga FECHA: 02/28/24

FECHA	MARQUE CON UNA "X" LA CASILLA DEL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL SUMINISTRADO											FIRMA DE RECIBIDO
	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCIÓN AUDITIVA (TIPO COPA)	PROTECCIÓN AUDITIVA (INSERCIÓN)	PROTECCIÓN VISUAL	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	CASCO DIELÉCTRICO	BOTAS EN CAUCHO	IMPERMEABLE	GUANTES EN CARNAZA	GUANTES EN VAQUETA	OBSERVACIONES	
02/28/24	/	/	1	1	10	/	/	/	/	1		Julian Castiblanco

Entregó: Jhon Alexander Peña Guzmán

Firma: Jhon Peña

COPEBA S.A.S Nit: 830.011.122-9	FORMATO DE ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CÓDIGO:	F-SST-SI-05
		VERSION:	1
		FECHA:	15/11/2019

"CON MI FIRMA CERTIFICO QUE HE RECIBIDO EL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO Y ME COMPROMETO A CUIDARLO Y EMPLEARLO DE MANERA CORRECTA DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DADAS Y FRENTE A LOS RIESGOS PARA LOS QUE FUE DISEÑADO. DOY FE QUE RECIBÍ Y ENTENDÍ LAS INSTRUCCIONES SOBRE EL USO CORRECTO, MANTENIMIENTO Y NOVEDADES DE LOS EPP'S QUE ME ENTREGAN"

NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	Juan Sebastian Cardenas Becerra	CARGO:	Inspector I	CÉDULA	1003174978	CIUDAD: Fusagasuga FECHA: 28/02/2024

FECHA	MARQUE CON UNA "X" LA CASILLA DEL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL SUMINISTRADO										OBSERVACIONES	FIRMA DE RECIBIDO
	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCIÓN AUDITIVA (TIPO COPA)	PROTECCIÓN AUDITIVA (INSERCIÓN)	PROTECCIÓN VISUAL	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	CASCO DIELÉCTRICO	BOTAS EN CAUCHO	IMPERMEABLE	GUANTES EN CARNAZA	GUANTES EN VAQUETA		
28/02/24	1	✓	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Juan Sebastian Cardenas B

Entregó: Jhon Alexander Peña Guarnizo

Firma: Jhon Peña

VER ANEXO 7. CERTIFICADO DE ACCIDENTALIDAD MARZO 2024 - INTERVENTORÍA

SEGUROS BOLÍVAR

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
COPEBA S.A S.
Identificada con NIT No. 830011122

Durante el período comprendido entre el 1 de Marzo de 2024 y el 31 de Marzo de 2024 presentó la siguiente siniestralidad. Certificación generada por fecha de emisión.

TODOS DETALLE DEL EVENTO	AÑO 2024
Numero de Accidentes Calificados de Origen Laboral	0
Numero de Accidentes que Generaron Incapacidad de Origen Laboral	0
Dias de Prorroga de Incapacidad Generadas por Accidentes	0
Dias de Incapacidad Generados por Accidentes de Trabajadores Activos	0
Numero de Accidentes Graves de Acuerdo a Resolucion 1401 de 2007	0

Se expide a solicitud del interesado el 8 de Abril del año 2024.

Firma Representante Legal

** Informaci?n suministrada por la empresa.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VER ANEXO 8. CERTIFICADO DE ACCIDENTALIDAD MARZO 2024 - CONTRATISTA

AXA COLPATRIA

CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTES

Nos permitimos certificar que la empresa CONSTRUOBRAS VIALES S A S identificada con NIT 900773521 y número de afiliación 214074 no reportó ningún accidente de trabajo durante el periodo de radicación comprendido entre 01/03/2024 y 31/03/2024 a la ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES AXA COLPATRIA.

Documento generado a través de la página de internet www.axacolpatria.co a los 02 días del mes de abril del 2024 a las 18:12:58.

Cordialmente,



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

NAICA

NIT: 901.635.303

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE

NAICA INGENIERIA SAS

NIT. 901.635.303-0

CERTIFICA:

Yo, JUAN JOSE FERREIRA SANDINO identificado con C.C. 79.159.668 de Bogotá D.C. en mi calidad de representante legal de NAICA INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT. 901.635.303-0, bajo la gravedad de juramento certifico, a la fecha la Empresa no ha realizado la vinculación de personal en ninguna de sus modalidades de contratación.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 22 días del mes de enero de 2024.

JUAN JOSE FERREIRA SANDINO
Representante legal
NAICA Ingenieria S.A.S.

Medellín, 4 de abril de 2024

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa JMS INGENIERIA SAS, NIT N900527061, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de marzo de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024, para los centros de trabajo seleccionados:

Nombre Centro de Trabajo	Código Centro de Trabajo
ICCU 708	0000000021

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 200.118.16.108, 192.230.104.5, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AXA COLPATRIA

Certificado de accidentalidad

ARL AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A
NIT. 860.002.183

CERTIFICA

Que la empresa CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S identificada con NIT 800140959 con contrato de afiliación No. 9019301 afiliada a ARL AXA COLPATRIA desde el 01 -10-2023 cotizando con nivel de riesgo 5 presenta las siguientes estadísticas respecto a accidentes de trabajo:

DATOS DEL CERTIFICADO

Datos	2024
Número de Trabajadores:	121
Horas hombre trabajadas teóricas:	81,312
Accidentes Laborales:	1
Enfermedad Laboral:	0
Incapacidad permanente parcial (IPP):	0
Número de casos de invalidez:	0
Número de casos fatales:	0
Total días perdidos y cargados:	0
Total días por incapacidad temporal:	0
Días cargados por IPP:	0
Dias cargados por invalidez:	0
Dias cargados por fatales:	0

INDICES DEL CERTIFICADO

Datos	2024
Tasa de accidentalidad:	0.83
Indice de frecuencia:	2.95
Indice de severidad:	0.00
Indice lesion incapacitante:	0.00

"El presente documento fue obtenido por el colaborador Yramosb. Su contenido refleja los reportes de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y demás información suministrada por la empresa a la Administradora de Riesgos Laborales AXA COLPATRIA."	La presente solicitud se expide a los (04-04-2024)

AXA COLPATRIA

CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTES

INFORME DE TOPOGRAFIA DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU



CONTRATO ICCU-815-2023

INFORME DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA COMISIÓN TOPOGRÁFICA CRISTIAN MARIN

INFORME DE TOPOGRAFIA
PERIODO: DEL 01 AL 22 DE MARZO DE 2024

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTENIDO

INTRODUCCION ……2

1. OBJETIVO ……3
   1.1 Objetivo general ……3
2. GENERALIDADES ……4
   2.1 Localización del proyecto ……4
3. RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS……6
   3.1 Trabajos topográficos ……6
      3.1.1 actividades semanales ……6
   3.2 Registro fotográfico……7
   3.3 Cantidades……8
4. Hallazgos……8
5. Conclusiones……8

INTRODUCCION

El presente informe ejecutivo recopila el resumen de las actividades topográficas de campo y oficina del periodo comprendido entre el 01 de marzo 2024 al 22 de marzo 2024, para lo cual se incluyen las actividades ejecutadas por la comisión ***INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".*** registro fotográfico de las diferentes actividades realizadas, hallazgos y conclusiones de las actividades que se deben mejorar por parte del contratista con el fin de que el proceso constructivo cumpla con las especificaciones del manual de interventoría.

1. OBJETIVO

Describir las actividades de campo y oficina desarrollas por la comisión topográfica interventoría integral para la construcción MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500. Dentro del periodo comprendido entre el 01 de marzo del 2024 al 22 de marzo de 2024, chequeo y revisión del proceso constructivo del contratista, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato ICCU 815 de 2023.

1.1 Objetivo General

Hacer chequeo y control de la totalidad de las actividades topográficas ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido entre el 01 de marzo del 2024 al 22 de marzo de 2024, con el fin de que estos trabajos cumplan los parámetros de aceptación de la normatividad vigente del manual para construcción de vías.

Informar a la entidad contratante sobre irregularidades que puedan llegar a alterar el debido desarrollo del contrato, haciendo seguimiento a las actividades estipuladas en el cronograma presentado por el contratista y aprobado por el área técnica.

2. GENERALIDADES

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500

2.1 Localización del proyecto


El corredor vial correspondiente al contrato de obra se localiza ***"VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA"***, construcción mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento de la vía En las ilustraciones 1 y 2 se muestra la localización general del proyecto.

Ilustración 1. Trazado inicial de proyecto.



Fuente: Google Earth

Ilustración 1. Unidades funcionales a lo largo del proyecto.

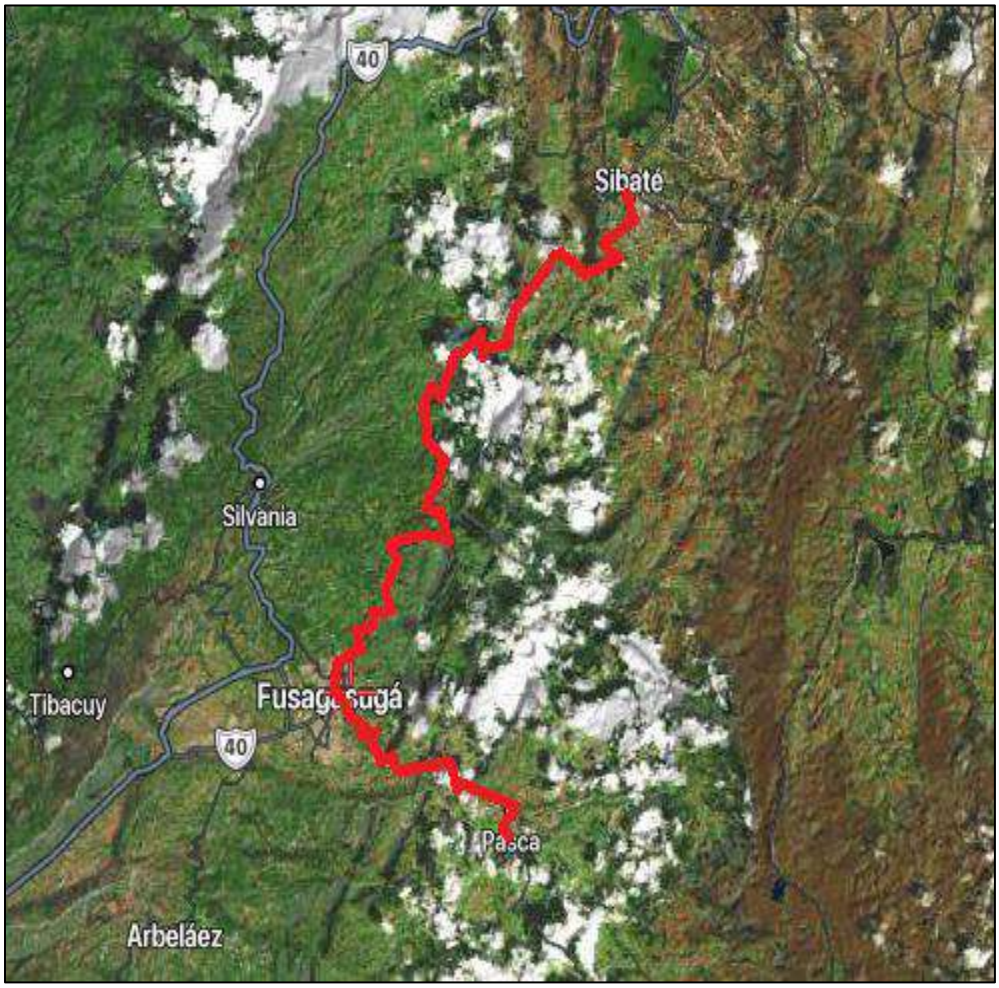

Fuente: Google Earth.

3. RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS

3.1 Trabajos topográficos

3.2 Actividades por mes.

Se desarrollan actividades específicas de topografía, siguiendo, a medida que se van calculando, todas las carteras topográficas y los informes diarios de los trabajos realizados en obra.

Inicio de las actividades más relevantes desde el inicio del proyecto:

INICIO DE ACTIVIDADES 01 DE MARZO 2024 AL 22 MARZO 2024

En estos resultados se puede evidenciar
.

1. Se realizan levantamientos del fresado en bacheos y en aplicación del MDC-19 en el sector pasca en las Abs K8+377.70 al K8+403.61 igualmente en las Abs K8+295.50 a la K8+324.42 siendo los bacheos 10 y 11 según su orden en las carteras entregadas.

2. Se realiza levantamiento topográfico y nivelación de subbase en el tramo pasca comprendido en 166.5 m iniciando entre las Abs k8+135.00 a la Abs k8+301.50 del sitio articulado.

3. Se realiza levantamiento detallado del tramo 3 terreno excavado para cálculo de volúmenes de excavación en este sector, para construcción de gaviones en las Abs 7+959 a la Abs7+981

4. Se hace acompañamiento en las actividades topográficas en el sector del gavión tramo 3 primer gavión para nivelación de suelo de gavión y pendiente del filtro posterior a este.

5. Se continua con las actividades de trabajo de oficina para respectivos cálculos para sustentación de cantidades

6. Se realiza levantamiento de seguimiento en tramo pasca crítico para hacer las respectivas correcciones al contratista, en cuanto a nivelación y alineamiento de bordillo de confinamiento para instalación de adoquín.

7. Se realiza levantamiento de material filtrante el cual se instalo en la parte posterior del gavión ubicado en tramo 5 entre las Abs 10+517.57 a la Abs 10+551.51

3.2 Registro fotográfico

el registro topográfico reposa en la carpeta de informes mensuales, entregados por la comisión de topografía

3.3 Cantidades:

las cantidades (ver carpeta de anexos) Y entrega de liberaciones en físico entregadas al ingeniero residente más los anexos de correspondencia por parte de la comisión de topografía

4. HALLAZGOS

Unidad funcional sector mejoramiento vía san miguel – Fusagasugá-Pasca, sector tramo 1, tramo pasca.

1. Tramo pasca se realizan varias observaciones tanto en campo por la nivelación de la sub base partiendo del diseño presentado donde se realizaron algunos cambios al diseño en campo, solicitando la representación de los cambios en el diseño para su posterior revisión.

2. Tramo 7 en cuanto a nivelación de cunetas se le solicita al contratista la nivelación del terreno y del concreto instalado para garantizar su pendiente de continuidad del agua.

3. Se le solicita al contratista empezar a liberar sectores terminados con planos récord para su respectiva revisión antes de la culminación del contrato.

5. CONCLUSIONES

- Se evidencian errores de centímetros en varias poligonales cerradas que hemos realizado verificación a las placas de amarre de los tramos intervenidos. Es importante tener y conciliar esta información (entre el contratista y nosotros) para así garantizar que estas poligonales no generen errores acumulativos en el proceso constructivo.

- Con el fin de mejorar la calidad de los trabajos y así poder cumplir con los diseños se evidencia mal proceso constructivo ya que continúan trabajos bajo las lluvias y esto satura los materiales colocados presentando posibles fallos a futuro.

- Se da la observación al contratista de apegarse a diseños y carteras para su revisión oportuna, y su excelente proceso constructivo.

6. ANEXOS.

1_Carteras_Topograficas.
2_Dibujos modelo digital y perfiles Dwg.
3_Regitro_fotografico.

Topógrafo residente Interventoría
CRISTIAN MARIN
Matrícula CNPT 01-18908

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC

A continuación, se anexa formato de PAC de Interventoría.

CONTRATO No : 815 DE 2023

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".

INTERVENTORÍA: COPEBA S.A.S. **CONTRATISTA:** CONSORCIO PASCA CNJ

PLAZO INICIAL: 31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO: 01 de agosto de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.
VALOR INICIAL: $ 1.032.790.821,00

PLAZO ACTUAL: 31 de diciembre de 2023
FECHA DE FIN: 31 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
VALOR CON ADICIONES: $ 1.032.790.821,00

COSTOS DE PERSONAL

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO 815 DE 2023

CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	MES 1_AGO-2023		MES 2_SEP-2023		MES 3_OCT-2024		MES 4_NOV-2023		MES 5_DIC-2023		MES 6_ENE-2024		MES 6_FEB-2024	
								DEDICACIÓN	VALOR	DEDICACIÓN	VALOR	DEDICACIÓN	VALOR	DEDICACIÓN	VALOR	DEDICACIÓN	VALOR	DEDICACIÓN	VALOR	DEDICACIÓN	VALOR
PERSONAL PROFESIONAL																					
Director de interventoria	$ 10.000.000,00	N/A	1	50%	6,50	2,30	$ 74.750.000,00	50,00%	$ 11.500.000,00	50,00%	$ 11.500.000,00	50,00%	$ 11.500.000,00	50,00%	$ 11.500.000,00	50,00%	$ 11.500.000,00	50,00%	$ 11.500.000,00	50,00%	$ 11.500.000,00
Especialista Pavimentos	$ 4.500.000,00	N/A	1	40%	6,50	2,30	$ 26.910.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	50,00%	$ 5.175.000,00	50,00%	$ 5.175.000,00
Especialista en hidraulica	$ 4.500.000,00	N/A	1	40%	6,50	2,30	$ 26.910.000,00	0,00%	$ -	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00
Especialista en Geotecnia	$ 4.500.000,00	N/A	1	40%	6,50	2,30	$ 26.910.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00
Especialista en Estructuras	$ 4.500.000,00	N/A	1	40%	6,50	2,30	$ 26.910.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	50,00%	$ 5.175.000,00	50,00%	$ 5.175.000,00	50,00%	$ 5.175.000,00
Especialista Ambiental	$ 4.500.000,00	N/A	1	40%	6,50	2,30	$ 26.910.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	40,00%	$ 4.140.000,00	50,00%	$ 5.175.000,00
Abogado	$ 4.800.000,00	N/A	1	20%	6,50	2,30	$ 14.352.000,00	0,00%	$ -	20,00%	$ 2.208.000,00	20,00%	$ 2.208.000,00	20,00%	$ 2.208.000,00	40,00%	$ 4.416.000,00	40,00%	$ 4.416.000,00	33,10%	$ 3.654.240,00
Profesional Gestor Social	$ 6.700.000,00	N/A	1	40%	6,50	2,30	$ 40.066.000,00	40,00%	$ 6.164.000,00	40,00%	$ 6.164.000,00	40,00%	$ 6.164.000,00	40,00%	$ 6.164.000,00	40,00%	$ 6.164.000,00	40,00%	$ 6.164.000,00	50,00%	$ 7.705.000,00
Profesional SISO	$ 6.700.000,00	N/A	1	40%	6,50	2,30	$ 40.066.000,00	0,00%	$ -	40,00%	$ 6.164.000,00	40,00%	$ 6.164.000,00	40,00%	$ 6.164.000,00	40,00%	$ 6.164.000,00	40,00%	$ 6.164.000,00	40,00%	$ 6.164.000,00
Ingeniero Residente de interventoria	$ 6.200.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	$ 92.690.000,00	100,00%	$ 14.260.000,00	100,00%	$ 14.260.000,00	100,00%	$ 14.260.000,00	100,00%	$ 14.260.000,00	100,00%	$ 14.260.000,00	100,00%	$ 14.260.000,00	50,00%	$ 7.130.000,00
PERSONAL TECNICO																					
Profesional Ingeniero Apoyo	$ 3.682.070,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	$ 55.046.947,00	10,00%	$ 846.876,10	100,00%	$ 8.468.761,00	100,00%	$ 8.468.761,00	100,00%	$ 8.468.761,00	100,00%	$ 8.468.761,00	100,00%	$ 8.468.761,00	50,00%	$ 4.234.380,50
Inspector de interventoria	$ 2.950.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	$ 44.102.500,00	77,00%	$ 5.224.450,00	100,00%	$ 6.785.000,00	100,00%	$ 6.785.000,00	100,00%	$ 6.785.000,00	100,00%	$ 6.785.000,00	100,00%	$ 6.785.000,00	50,00%	$ 3.392.500,00
Inspector de interventoria	$ 2.950.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	$ 44.102.500,00	0,00%	$ -	100,00%	$ 6.785.000,00	100,00%	$ 6.785.000,00	100,00%	$ 6.785.000,00	100,00%	$ 6.785.000,00	100,00%	$ 6.785.000,00	50,00%	$ 3.392.500,00
Topógrafo	$ 2.950.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	$ 44.102.500,00	100,00%	$ 6.785.000,00	100,00%	$ 6.785.000,00	100,00%	$ 6.785.000,00	100,00%	$ 6.785.000,00	100,00%	$ 6.785.000,00	100,00%	$ 6.785.000,00	50,00%	$ 3.392.500,00
Topógrafo	$ 2.950.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	$ 44.102.500,00	0,00%	$ -	100,00%	$ 6.785.000,00	100,00%	$ 6.785.000,00	100,00%	$ 6.785.000,00	100,00%	$ 6.785.000,00	100,00%	$ 6.785.000,00	50,00%	$ 3.392.500,00
Cadenero 1	$ 1.800.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	$ 26.910.000,00	67,00%	$ 2.773.800,00	100,00%	$ 4.140.000,00	100,00%	$ 4.140.000,00	100,00%	$ 4.140.000,00	100,00%	$ 4.140.000,00	100,00%	$ 4.140.000,00	50,00%	$ 2.070.000,00
Cadenero 1	$ 1.800.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	$ 26.910.000,00	60,00%	$ 2.484.000,00	100,00%	$ 4.140.000,00	100,00%	$ 4.140.000,00	100,00%	$ 4.140.000,00	100,00%	$ 4.140.000,00	100,00%	$ 4.140.000,00	50,00%	$ 2.070.000,00
Secretaria	$ 1.800.000,00	N/A	1	100%	6,50	2,30	$ 26.910.000,00	60,00%	$ 2.484.000,00	100,00%	$ 4.140.000,00	100,00%	$ 4.140.000,00	100,00%	$ 4.140.000,00	100,00%	$ 4.140.000,00	100,00%	$ 4.140.000,00	50,00%	$ 2.070.000,00
						VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 708.660.947,00		$ 69.082.126,10		$ 109.024.761,00		$ 109.024.761,00		$ 109.024.761,00		$ 112.267.761,00		$ 113.302.761,00		$ 83.972.620,50

OTROS COSTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES 1_AGO-2023		MES 2_SEP-2023		MES 3_OCT-2024		MES 4_NOV-2023		MES 5_DIC-2023		MES 6_ENE-2024		MES 6_FEB-2024	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Costos Directos																			
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	Mes	1	6,5	$ 8.700.000,00	$ 56.550.000,00	1,00	$ 8.700.000,00	1,00	$ 8.700.000,00	1,00	$ 8.700.000,00	1,00	$ 8.700.000,00	1,00	$ 8.700.000,00	1,00	$ 8.700.000,00	1,00	$ 8.700.000,00
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias.	Mes	1	6,5	$ 1.397.000,00	$ 9.080.500,00	1,00	$ 1.397.000,00	1,00	$ 1.397.000,00	1,00	$ 1.397.000,00	1,00	$ 1.397.000,00	1,00	$ 1.397.000,00	1,00	$ 1.397.000,00	1,00	$ 1.397.000,00
Alquiler equipo completo de topografia y elementos complementarios	Mes	1	6,5	$ 3.500.000,00	$ 22.750.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00
Alquiler equipo completo de topografia y elementos complementarios	Mes	1	6,5	$ 3.500.000,00	$ 22.750.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00
Oficina (incluye servicios)	Mes	1	6,5	$ 1.000.000,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00
Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias	Mes	1	6,5	$ 300.000,00	$ 1.950.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00
Ensayos de Laboratorio																			
**Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	Mes	1	6,5	$ 6.100.000,00	$ 39.650.000,00	0,05	$ 305.000,00	1,00	$ 6.100.000,00	1,00	$ 6.100.000,00	1,00	$ 6.100.000,00	1,00	$ 6.100.000,00	1,00	$ 6.100.000,00	1,00	$ 6.100.000,00
Ajustes por actas de modificación y otros																			7894,615
					VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 159.230.500,00	$ 15.202.000,00		$ 24.497.000,00		$ 24.497.000,00		$ 24.497.000,00		$ 24.497.000,00		$ 24.497.000,00		$ 24.504.894,62
					SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 867.891.447,00	$ 84.284.126,10		$ 133.521.761,00		$ 133.521.761,00		$ 133.521.761,00		$ 136.764.761,00		$ 137.799.761,00		$ 108.477.515,12
				IVA 19%		$ 164.899.374,00	$ 16.013.983,96		$ 25.369.134,59		$ 25.369.134,59		$ 25.369.134,59		$ 25.985.304,59		$ 26.181.954,59		$ 20.610.727,87
					TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 1.032.790.821,00	$ 100.298.110,06		$ 158.890.895,59		$ 158.890.895,59		$ 158.890.895,59		$ 162.750.065,59		$ 163.981.715,59		$ 129.088.242,99
					ACUMULADO		$ 100.298.110,06		$ 259.189.005,65		$ 418.079.901,24		$ 576.970.796,83		$ 739.720.862,42		$ 903.702.578,01		$ 1.032.790.821,00

ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
COPEBA S.A.S.

5.5. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

La interventoría durante el presente periodo ha cumplido con todas las obligaciones contractuales del concurso de méritos, ha dado cumplimiento al pago de parafiscales, mantiene la contratación de las personas en condición de discapacidad y la composición accionaria se mantiene igual que al momento del cierre del proceso de selección.

Así mismo, la Interventoría ha cumplido con la contratación, presentación de las hojas de vida y desarrollo de labores en campo del personal clave evaluable calificado en el proceso de selección.

6. Reportes ejecución mensual contrato de interventoría

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

De acuerdo con las necesidades y demanda de las actividades realizadas en el proyecto la interventoría dispone de un campamento, el cual están ubicado en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca).

- ✓ Un Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos), ubicada en la Carrera 83 No 24ª Bis -15 Bloque 4. Llano grande.

De igual forma, a continuación, se presenta formato con relación de equipos y vehículos que se utilizan en la ejecución del Contrato de Interventoría, durante el presente periodo.

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

FECHA: 10/11/2023 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No :	815 DE 2023	**PLAZO INICIAL:**	31 de diciembre de 2023	**PLAZO INICIAL:**	31 de diciembre de 2023
OBJETO :	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".	**FECHA DE INICIO:**	01 de agosto de 2023	**FECHA DE FIN:**	23 de abril del 2024
INTERVENTORÍA:	COPEBA S.A.S. **CONTRATISTA:** CONSORCIO PASCA CNJ	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N.A.	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
		VALOR INICIAL:	$ 1.032.790.821,00	**VALOR CON ADICIONES:**	$ 1.032.790.821,00

UIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 815 DE 2023

INTERVENTORÍA: COPEBA S.A.S.

CONTRATO DE OBRA No. 708 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO PASCA CNJ

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DIAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Camioneta	Nissan Placa RHM 627 modelo 2011	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Camioneta	VW Placa EJU 689 modelo 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Equipo de topografia completo 1	Estacion digital nivel primas mira tripodes radios	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Campamento 1	Dotacion completa de oficina y servicios	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Equipos de comunicaciones y fotografia	Seis Celular	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Equipos de computo	Cuatro Computadores	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Impresora	Una Impresora tinta	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Equipo de topografia completo 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma

Nombre: **Andrea Del Pilar Peña Sanchez**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202-66675 CND**

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

En formato se registra el control diario del personal empleado por la Interventoría en este mes.

SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE	2.024	$ 1.300.000

CANTIDAD	PERSONAL MINIMO REQUERIDO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DÍAS TRABAJADOS	SUELDO SEGÚN PROPUESTA	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN	VALOR MENSUAL DEVENGADO PROPUESTA ECONOMICA	TOTAL IBC SEGURIDAD SOCIAL	SALUD PATRONAL 8;5%	SALUD TRABAJADOR 4%	PENSION PATRONAL 12%	PENSION TRABAJADOR 4%	TOTAL IBC PARAFISCALES	CAJA DE COMPENSACIÓN 4%	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 3%	SENA 2%	IBC RIESGOS	TARIFA SISTEMA	ARL
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ	22	10.000.000	100,00%	10.000.000	10.000.000	850.000	400.000	1.200.000	400.000	7.333.333	293.300	220.000	146.700	10.000.000	0,0696	696.000
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	GIOVANNI ARIZA ARIAS	22	6.200.000	100,00%	6.200.000	6.200.000	527.000	248.000	744.000	248.000	4.546.667	181.900	136.400	90.900	6.200.000	0,0696	431.500
1	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	NICOLAS ORTEGA RESTREPO	22	4.500.000	40,00%	1.800.000	1.800.000	153.000	72.000	216.000	72.000	1.320.000	52.800	39.600	26.400	1.800.000	0,0696	125.300
1	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	NICOLAS ORTEGA RESTREPO	22	4.500.000	40,00%	1.800.000	1.800.000	153.000	72.000	216.000	72.000	1.320.000	52.800	39.600	26.400	1.800.000	0,0696	125.300
1	ESPECIALISTA AMBIENTAL	JOHN OSWALDO CANO GARCIA	22	4.500.000	40,00%	1.800.000	1.800.000	153.000	72.000	216.000	72.000	1.320.000	52.800	39.600	26.400	1.800.000	0,0696	125.300
1	PROFESIONAL EN GESTION SOCIAL	NURY JAZMIN GARCIA LOPEZ	22	6.700.000	40,00%	2.680.000	2.680.000	227.800	107.200	321.600	107.200	1.965.333	78.600	59.000	39.300	2.680.000	0,0696	186.500
1	PROFESIONAL SISO	JHON ALEXANDER PEÑA GUZMAN	22	6.700.000	40,00%	2.680.000	2.680.000	227.800	107.200	321.600	107.200	1.965.333	78.600	59.000	39.300	2.680.000	0,0696	186.500
1	PROFESIONAL INGENIERO DE APOYO	PAULA VALENTINA CARLOS MARINEZ	22	3.682.070	100,00%	3.682.070	3.682.070	313.000	147.300	441.800	147.300	2.700.185	108.000	81.000	54.000	3.682.070	0,00522	19.200
1	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	JUAN SEBASTIAN CARDENAS BECERRA	22	3.682.070	100,00%	3.682.070	3.682.070	313.000	147.300	441.800	147.300	2.700.185	108.000	81.000	54.000	3.682.070	0,0696	256.300
1	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	ALEJANDRO CORREA SANTANA	22	2.950.000	100,00%	2.950.000	2.950.000	250.800	118.000	354.000	118.000	2.163.333	86.500	64.900	43.300	2.950.000	0,0696	205.300
1	TOPOGRAFO DE INTERVENTORÍA 1	SERGIO LUIS SUAREZ ZAMUDIO	22	2.950.000	100,00%	2.950.000	2.950.000	250.800	118.000	354.000	118.000	2.163.333	86.500	64.900	43.300	2.950.000	0,0696	205.300
1	TOPOGRAFO DE INTERVENTORÍA 2	CRISTIAN MARIN	22	2.950.000	100,00%	2.950.000	2.950.000	250.800	118.000	354.000	118.000	2.163.333	86.500	64.900	43.300	2.950.000	0,0696	205.300
1	CADENERO 1	JULIAN CAMILO CASTIBLANCO	22	1.800.000	100,00%	1.800.000	1.800.000	153.000	72.000	216.000	72.000	1.320.000	52.800	39.600	26.400	1.800.000	0,0696	125.300
1	CADENERO 1	CHRISTIAN JAVIER GUTIERREZ GUTIERREZ	22	1.800.000	100,00%	1.800.000	1.800.000	153.000	72.000	216.000	72.000	1.320.000	52.800	39.600	26.400	1.800.000	0,0696	125.300
1	SECRETARIA	DIANA MARIA GARCIA VALENCIA	22	1.800.000	100,00%	1.800.000	1.800.000	153.000	72.000	216.000	72.000	1.320.000	52.800	39.600	26.400	1.800.000	0,00522	9.400
						0	1.300.000	110.500	0	156.000	52.000	-	-	-	-	1.300.000	0,00522	6.800
						0	1.300.000	110.500	0	156.000	52.000	-	-	-	-	1.300.000	0,00522	6.800
						0	1.300.000	110.500	0	156.000	52.000	-	-	-	-	1.300.000	0,00522	6.800
						0	1.300.000	110.500	0	156.000	52.000	-	-	-	-	1.300.000	0,00522	6.800
						0	1.300.000	110.500	0	156.000	52.000	-	-	-	-	1.300.000	0,00522	6.800
						0	1.300.000	110.500	0	156.000	52.000	-	-	-	-	1.300.000	0,00522	6.800
						0	1.300.000	110.500	0	156.000	52.000	-	-	-	-	1.300.000	0,00522	6.800
						0	1.300.000	110.500	0	156.000	52.000	-	-	-	-	1.300.000	0,00522	6.800
						0	1.300.000	110.500	0	156.000	52.000	-	-	-	-	1.300.000	0,00522	6.800
						0	1.300.000	110.500	0	156.000	52.000	-	-	-	-	1.300.000	0,00522	6.800
						0	1.300.000	110.500	0	156.000	52.000	-	-	-	-	1.300.000	0,00522	6.800
						0	1.300.000	110.500	0	156.000	52.000	-	-	-	-	1.300.000	0,00522	6.800
						0	1.300.000	110.500	0	156.000	52.000	-	-	-	-	1.300.000	0,00522	6.800
						0	1.300.000	110.500	0	156.000	52.000	-	-	-	-	1.300.000	0,00522	6.800
						0	1.300.000	110.500	0	156.000	52.000	-	-	-	-	1.300.000	0,00522	6.800
15	TOTAL			62.914.140	100%	48.574.140	48.574.140	4.129.000	1.943.000	5.828.800	1.943.000	35.621.036	1.424.700	1.068.700	712.500	48.574.140	0	3.027.800
	TOTALES							$ 6.072.000		$ 7.771.800			$ 1.424.700	$ 1.068.700	$ 712.500			$ 3.027.800
																		$ 20.077.500

Contrato N° : 815 DE 2023

Nombre del Supervisor: JAISON FONSECA MARIN

Firma de Revisión:

Fecha:

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

En el formato, se encuentra relacionada la información financiera y presupuestal correspondiente al contrato de Interventoría ICCU 815 del 2023 que tiene un valor actualizado de $ 1.032.790.821,oo, a la fecha se encuentra en trámite el pago de las actas de costos de interventoría No. 1 correspondiente al mes de agosto de 2023 y el acta de costos No. 2 correspondiente al mes de septiembre de 2023.

FECHA 20/02/2024
(Día / Mes / Año)

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No :	815 DE 2023	**PLAZO INICIAL:**	31 de diciembre de 2023	**PLAZO ACTUAL:**	23 de abril de 2024
OBJETO :	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".	**FECHA DE INICIO:**	01 de agosto de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 1.032.790.821,00
INTERVENTORÍA:	COPEBA S.A.S.	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	23/03/2024	**ADICIONES:**	$ -
CONTRATISTA:	CONSORCIO PASCA CNJ	**FEHCA DE REINICIO**	1/04/2024		
PERIODO:	MARZO DE 2024	**FECHA DE FIN:**	8/05/2024	**VALOR CON ADICIONES:**	$ 1.032.790.821,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo del Contrato	Observaciones
								$ 1.032.790.821,00	Valor contractual del contrato
							$ 309.837.246,00	$ 722.953.575,00	Anticipo del 30%
1	01 al 31 de agosto de 2023	$ 83.963.276,10	$ 15.953.022,46	$ 99.916.298,56	$ 75.566.948,00	$ 24.349.350,56	$ 234.270.298,00	$ 698.604.224,44	
2	01 al 30 de septiembre de 2023	$ 114.184.211,00	$ 21.695.000,09	$ 135.879.211,09	$ 102.765.790,00	$ 33.113.421,09	$ 131.504.508,00	$ 665.490.803,35	
3	01 al 31 de octubre de 2023	$ 130.556.761,00	$ 24.805.784,59	$ 155.362.545,59	$ 131.504.508,00	$ 23.858.037,59	$ -	$ 641.632.765,76	
4	01 al 30 de noviembre de 2023	$ 128.395.761,00	$ 24.395.194,59	$ 152.790.955,59	$ -	$ 152.790.955,59	$ -	$ 488.841.810,17	
5	01 al 31 de diciembre de 2023	$ 131.620.761,00	$ 25.007.944,59	$ 156.628.705,59	$ -	$ 156.628.705,59	$ -	$ 332.213.104,58	
6	01 al 31 de enero de 2024	$ 127.480.761,00	$ 24.221.344,59	$ 151.702.105,59	$ -	$ 151.702.105,59	$ -	$ 180.510.998,99	
7	01 al 29 de febrero de 2024	$ 127.358.761,00	$ 24.198.164,59	$ 151.556.925,59	$ -	$ 151.556.925,59	$ -	$ 28.954.073,40	
TOTALES		**$ 843.560.292,10**	**$ 160.276.455,50**	**$ 1.003.836.747,60**	**$ 309.837.246,00**	**$ 693.999.501,60**	**$ -**	**$ 332.213.104,58**	

Firma

Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-6675 CND

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

A continuación, se anexa Formato MS-GC-FR-06 ACTA APROBACIÓN DE POLIZAS del contrato de interventoría, correspondiente a la póliza del contrato principal y la póliza de la orden de inicio.

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-06
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	ACTA APROBACION DE PÓLIZAS	FECHA	11/11/2022

Tipo de garantía (Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015):	Contrato de seguro contenido en una póliza	X
	Patrimonio autónomo	
	Garantía Bancaria	
Otra:		

Contrato No:	INTERVENTORÍA ICCU-815 DE 2023
Convenio No:	N/A
Resolución No:	N/A
Contratista o responsable:	COPEBA S.A.S. Nit. 830.011.122-9
Garantía No:	Cumplimiento: 15-44-101280853, anexo 0
Garantía emitida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía:	Junio 14 de 2023
Razón de la aprobación: (Indique brevemente la razón de aprobación, ejemplo: firma de contrato, actualización por acta de inicio, prorroga, adición, suspensión de contrato, reinicio de contrato, garantías de permisos, entre otras)	FIRMA DEL CONTRATO

CLASE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 309.837.246,30	2023	06	06	2024	06	21
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 103.279.082,10	2023	06	06	2026	12	21
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 206.558.164,20	2023	12	21	2028	12	21
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 154.918.623,15	2023	06	06	2024	06	21

Notas u observaciones: N/A.

Se aprueban las pólizas citadas en la referencia por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos, de acuerdo con el documento de la referencia.

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
Jefe Oficina Asesora Gestión Jurídica y Contractual
Reviso: Carlos A. Jiménez C. - Profesional Especializado

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101280853	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	06	2023	06	06	2023	00:00	21	12	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
COPEBA S.A.S		NIT: 830.011.122-9
DIRECCIÓN: CR 21 NRO. 100 - 20 OFI 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 2564013

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA		NIT: 900.258.711-1
DIRECCIÓN: CALLE 26 NO. 51 - 53 TORRE CENTRAL	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 7491801
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO ICCU NRO. 815 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE - FUSAGASUGA - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/06/2023	21/06/2024	$309,837,246.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/06/2023	21/12/2026	$103,279,082.10
CALIDAD DEL SERVICIO	21/12/2023	21/12/2028	$206,558,164.20
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/06/2023	21/06/2024	$154,918,623.15

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***4,147,433.00	$ ******20,000.00	$ *****791,812.00	$ *********4,959,245.00	$ ******774,593,115.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101280853

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante E. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-44-101280853**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	**06**	**2023**	**06**	**06**	**2023**	**00:00**	**21**	**12**	**2028**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	COPEBA S.A.S		**NIT: 830.011.122-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
CR 21 NRO. 100 - 20 OFI 602		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2564013	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA		**NIT: 900.258.711-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO	
CALLE 26 NO. 51 - 53 TORRE CENTRAL		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		7491801	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO ICCU NRO. 815 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE - FUSAGASUGA - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**06/06/2023**	**21/06/2024**	**$309,837,246.30**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**06/06/2023**	**21/12/2026**	**$103,279,082.10**
CALIDAD DEL SERVICIO	**21/12/2023**	**21/12/2028**	**$206,558,164.20**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**06/06/2023**	**21/06/2024**	**$154,918,623.15**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***4,147,433.00	$ ******20,000.00	$ *****791,812.00	$ *********4,959,245.00	$ ******774,593,115.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101280853

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-06
ICCU	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	ACTA APROBACION DE PÓLIZAS	FECHA	11/11/2022

Tipo de garantía (Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015):	Contrato de seguro contenido en una póliza	X
	Patrimonio autónomo	
	Garantía Bancaria	
Otra:		

Contrato No:	INTERVENTORÍA ICCU-815 DE 2023
Convenio No:	N/A
Resolución No:	N/A
Contratista o responsable:	COPEBA S.A.S. Nit. 830.011.122-9
Garantía No:	Cumplimiento: 15-44-101280853, anexo 2
Garantía emitida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía:	Agosto 30 de 2023
Razón de la aprobación: (Indique brevemente la razón de aprobación, ejemplo: firma de contrato, actualización por acta de inicio, prorroga, adición, suspensión de contrato, reinicio de contrato, garantías de permisos, entre otras)	INICIO 1 de agosto de 2023

CLASE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 309.837.246,30	2023	08	01	2024	08	16
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 103.279.082,10	2023	08	01	2027	02	15
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 206.558.164,20	2024	02	15	2029	02	15
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 154.918.623,15	2023	08	01	2024	08	16

Notas u observaciones: Según acta de inicio se modifican las vigencias de la póliza

Se aprueba la póliza citada en la referencia por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos, de acuerdo con el documento de la referencia.

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
Jefe Oficina Asesora Gestión Jurídica y Contractual
Reviso: Carlos A. Jiménez C. - Profesional Especializado

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-44-101280853**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	**08**	**2023**	**01**	**08**	**2023**	**00:00**	**15**	**02**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	COPEBA S.A.S		**NIT: 830.011.122-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
CR 21 NRO. 100 - 20 OFI 602		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2564013	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA		**NIT: 900.258.711-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO	
CALLE 26 NO. 51 - 53 TORRE CENTRAL		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		7491801	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO ICCU NRO. 815 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE - FUSAGASUGA - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**01/08/2023**	**16/08/2024**	**$309,837,246.30**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**01/08/2023**	**15/02/2027**	**$103,279,082.10**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**15/02/2024**	**15/02/2029**	**$206,558,164.20**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**01/08/2023**	**16/08/2024**	**$154,918,623.15**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO AL CONTRATO ICCU NO. 815 DE 2023 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.
.
TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.
.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***4,147,433.00	$ ******20,000.00	$ *****791,812.00	$ *********4,959,245.00	$ ******774,593,115.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101280853

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101280853	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	08	2023	01	08	2023	00:00	15	02	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
COPEBA S.A.S			**NIT: 830.011.122-9**
DIRECCIÓN: CR 21 NRO. 100 - 20 OFI 602	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2564013

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA			**NIT: 900.258.711-1**
DIRECCIÓN: CALLE 26 NO. 51 - 53 TORRE CENTRAL	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7491801

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101280853

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

ADRIANABERNALC

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-06
ICCU	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	ACTA APROBACION DE PÓLIZAS	FECHA	11/11/2022

Tipo de garantía (Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015):	Contrato de seguro contenido en una póliza	X
	Patrimonio autónomo	
	Garantía Bancaria	
Otra:		

Contrato No:	INTERVENTORÍA ICCU-815 DE 2023
Convenio No:	N/A
Resolución No:	N/A
Contratista o responsable:	COPEBA S.A.S. Nit. 830.011.122-9
Garantía No:	Cumplimiento: 15-44-101280853, anexo 3
Garantía emitida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía:	Diciembre 5 de 2023
Razón de la aprobación: (Indique brevemente la razón de aprobación, ejemplo: firma de contrato, actualización por acta de inicio, prorroga, adición, suspensión de contrato, reinicio de contrato, garantías de permisos, entre otras)	MODIFICATORIO 1 Anexo técnico

CLASE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 309.837.246,30	2023	08	01	2024	08	16
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 103.279.082,10	2023	08	01	2027	02	15
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 206.558.164,20	2024	02	15	2029	02	15
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 154.918.623,15	2023	08	01	2024	08	16

Notas u observaciones: Por medio del anexo se deja constancia que la compañía de seguros conoce el modificatorio No. 1.

Se aprueba la póliza citada en la referencia por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos, de acuerdo con el documento de la referencia.

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
Jefe Oficina Asesora Gestión Jurídica y Contractual
Reviso: Carlos A. Jiménez C. - Profesional Especializado

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101280853	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	12	2023	01	08	2023	00:00	15	02	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
COPEBA S.A.S		NIT: 830.011.122-9	
DIRECCIÓN: CR 21 NRO. 100 - 20 OFI 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2564013

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA		NIT: 900.258.711-1	
DIRECCIÓN: CALLE 26 NO. 51 - 53 TORRE CENTRAL	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	8454001
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO ICCU NRO. 615 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE - FUSAGASUGA - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	01/08/2023	16/08/2024	$309,837,246.30	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/08/2023	15/02/2027	$103,279,082.10	
CALIDAD DEL SERVICIO	15/02/2024	15/02/2029	$206,558,164.20	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/08/2023	16/08/2024	$154,918,623.15	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA DE SEGUROS CONOCE EL MODIFICATORIO NRO 1 AL CONTRATO PRINCIPAL

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******774,593,115.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

15-44-101280853

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101280853, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 04 días del mes de DICIEMBRE de 2023

15-44-101280853

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101280853	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2023	01	08	2023	00:00	15	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
COPEBA S.A.S	NIT: 830.011.122-9	CR 21 NRO. 100 - 20 OFI 602	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2564013

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	NIT: 900.258.711-1	CALLE 26 NO. 51 - 53 TORRE CENTRAL	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	8454001

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO ICCU NRO. 815 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE - FUSAGASUGA - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	01/08/2023	31/08/2024	$309,837,246.30	$309,837,246.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/08/2023	28/02/2027	$103,279,082.10	$103,279,082.10
CALIDAD DEL SERVICIO	15/02/2024	15/02/2029	$206,558,164.20	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/08/2023	31/08/2024	$154,918,623.15	$154,918,623.15

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA No 1 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA SEGUN NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL 29 DE FEBRERO DEL 2024.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******50,111.00	$ *******8,000.00	$ ******11,041.00	$ **********69,152.00	$ ******774,593,115.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101280853

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101280853	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2023	01	08	2023	00:00	15	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	COPEBA S.A.S		**NIT: 830.011.122-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 21 NRO. 100 - 20 OFI 602		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2564013

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA		**NIT: 900.258.711-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CALLE 26 NO. 51 - 53 TORRE CENTRAL		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		8454001

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

15-44-101280853

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101280853, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 15 días del mes de DICIEMBRE de 2023



15-44-101280853

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-06
ICCU	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	ACTA APROBACION DE PÓLIZAS	FECHA	11/11/2022

Tipo de garantía (Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015):	Contrato de seguro contenido en una póliza	X
	Patrimonio autónomo	
	Garantía Bancaria	
Otra:		

Contrato No:	**INTERVENTORÍA ICCU-815 DE 2023**
Convenio No:	N/A
Resolución No:	N/A
Contratista o responsable:	**COPEBA S.A.S. Nit. 830.011.122-9**
Garantía No:	Cumplimiento: 15-44-101280853, anexo 4
Garantía emitida por:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
Fecha de aprobación de la garantía:	**Diciembre 19 de 2023**
Razón de la aprobación: (Indique brevemente la razón de aprobación, ejemplo: firma de contrato, actualización por acta de inicio, prorroga, adición, suspensión de contrato, reinicio de contrato, garantías de permisos, entre otras)	**PRORROGA No. 1**

CLASE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 309.837.246,30	2023	08	01	2024	08	31
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 103.279.082,10	2023	08	01	2028	02	28
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 206.558.164,20	2024	02	15	2029	02	15
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 154.918.623,15	2023	08	01	2024	08	31

Notas u observaciones: Por medio del anexo se deja constancia que la compañía de seguros conoce el modificatorio No. 1.

Se aprueba la póliza citada en la referencia por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos, de acuerdo con el documento de la referencia.

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
Jefe Oficina Asesora Gestión Jurídica y Contractual
Reviso: Jhonatan Laiton. - Contratista

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101280853	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2023	01	08	2023	00:00	15	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	COPEBA S.A.S		NIT: 830.011.122-9
DIRECCIÓN: CR 21 NRO. 100 - 20 OFI 602	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2564013

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA		NIT: 900.258.711-1
DIRECCIÓN: CALLE 26 NO. 51 - 53 TORRE CENTRAL	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	8454001

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO ICCU NRO. 815 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE - FUSAGASUGA - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	01/08/2023	31/08/2024	$309,837,246.30	$309,837,246.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/08/2023	28/02/2027	$103,279,082.10	$103,279,082.10
CALIDAD DEL SERVICIO	15/02/2024	15/02/2029	$206,558,164.20	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/08/2023	31/08/2024	$154,918,623.15	$154,918,623.15

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA No 1 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA SEGUN NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL 29 DE FEBRERO DEL 2024.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******50,111.00	$ *******8,000.00	$ ******11,041.00	$ ***********69,152.00	$ ******774,593,115.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101280853

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101280853	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2023	01	08	2023	00:00	15	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	COPEBA S.A.S		**NIT: 830.011.122-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 21 NRO. 100 - 20 OFI 602		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2564013

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA		**NIT: 900.258.711-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CALLE 26 NO. 51 - 53 TORRE CENTRAL		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		8454001

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

15-44-101280853

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF052848B

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101280853, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 15 días del mes de DICIEMBRE de 2023



15-44-101280853

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Se anexa formato de seguimiento del plan de calidad del contrato de interventoría para el presente periodo.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORÍA

INFORME GESTION DE CALIDAD	
	VERSION: 0

NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE-FUSAGASUGA-PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500.
TIPO DE PROYECTO	Interventoría [ ] Consultoría [ ] Diseño [ ]
CLIENTE	INSTITUTO DE CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU
Control de Cambios	Documento inicial para implementacion


N -	8
Fecha	MARZO 31 DE 2024

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS Y CONDICIONES ESPECIALES A SER TENIDAS EN CUENTA

1	**El Sistema de Gestión de Calidad a implementar en el Proyecto es el de COPEBA SAS**
2	Llevar el control del archivo de interventoría con la finalidad de integrar un expediente claro del desarrollo del contrato
3	Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, y especificaciones de cada uno de los aspectos ambientales contenidos en el contrato.
4	Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el contratista, a partir de las especificaciones técnicas dadas por el IICCU
5	Armonizar la interacción del contratante y contratista, para el logro general del objeto contractual que satisfaga las necesidades de la comunidad




MAPA DE PROCESOS DEL PROYECTO






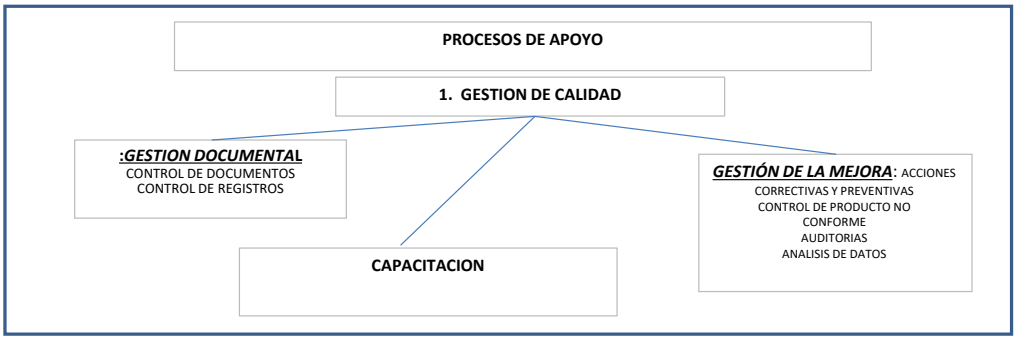


ELEMENTOS DE CONTROL PROCESO GESTION DE CALIDAD

SEGUIMIENTO PROCESO DE INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS

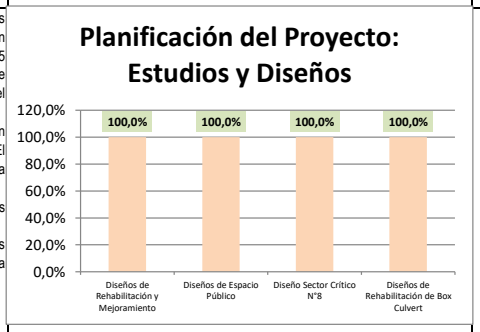No	Actividad	Actividades de Gestión de Calidad realizadas	Indicador	Registro	
				NA	SI
1	**Revisión documentos contractuales**	El contratista de obra tramitó solicitud de suspensión por 8 días teniendo en cuenta que entre 23 y el 30 de marzo de 2024 que correspondieron a días que no se podían trabajar por restricciones vehiculares asociadas al periodo de semana santa. El contratista tramitó en el periodo de Marzo de 2024, prórroga de 15 días hasta el 23 de abril de 2024. Tanto la suspensión como la prórroga fueron debidamente tramitadas ante la Entidad Contratante y aprobadas por el ICCU. .			Formato Acta de Reunión
2	**Revisión Contractual: Planificación del Proyecto**	i) Diseños de Rehabilitación y Mejoramiento: El contratista implementó soluciones técnicas de filtros y cunetas en el tramo 1, debido a que no se contaba con información de diseños hidráulicos. Se cuentan con diseños para el sector 2, 3, los sectores 4 y 5 no cuentan con diseño de estabilidad de talud, por lo cual solo se intervendrá la parte que no presenta inestabilidad. En el sector 6, se está a la espera que la Entidad remita el diseño de muro de gavión. ii) Diseños de Espacio Público: Los diseños entregados por la Entidad solo contemplan el diseño geométrico, no se remitió diseño urbanístico, ni de estructura de andén. El Contratista remitió diseños ajustados con especificaciones del tipo de estructura a construir y diseño geométrico para andenes y bahías de parqueo. iii) Diseño Sector Crítico N°8: El Diseño entregado cumple para la construcción de los 21 pilotes, se realizó rediseño geométrico para que la viga cabezal no invada la vía. iv) Diseños de Rehabilitación de Box Culvert: Se encuentran incorporados los diseños de rehabilitación de los box culvert. A la fecha el contratista entregó los diseños para intervención de box culverts.			Registro F-PQ-05: "PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO"
3	**Proveedores servicios Interventoria (Opcional en caso de requerirse)**	Dentro de los proveedores, se tiene como Especialistas que participaron durante este periodo: Estructuras, Ambiental, Social, Geotecnia y Especialista en Pavimentos. Los informes fueron entregados dentro del plazo establecido. Los informes ambientales y sociales se encuentran en estado de revisión y aprobación.			

SEGUIMIENTO PROCESOS APOYO

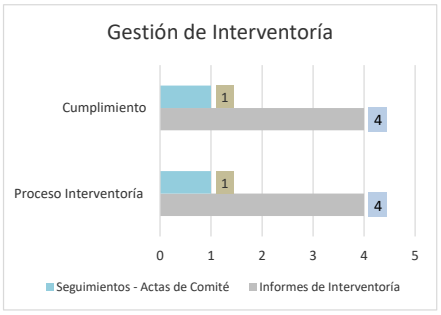No	Actividad	Actividades de Gestión de Calidad realizadas	Indicador	Registro	
				NA	SI
4	**Gestión Documental**	A continuación se presenta la organización de la gestión documental del contratista: Se implemento la carpeta No. 23, tal como se muestra a continuación:  01. ICCU-LP-020 DE 2023 02. CONSORCIO PASCA CNI 03. ANTICIPO 04. EYD 05. PLAN DE CALIDAD 06. HV - PERSONAL MINIMO 07. EQUIPO MINIMO 08. BALANCE 09. PMT 10. APUS 11. PAGA 12. ACTAS 13. SITIO CRITICO 8 14. PRESUPUESTO OBRA 15. PROGRAMA DE INVERSION 16. PÓLIZAS 17. ESPACIO PÚBLICO 18. ACTAS DE OBRA 19. INFORMES MENSUALES 20. ACTAS DE MODIFICACIONES 21. PROGRAMA AHORRO Y USO EFICIENTE ENERGÍA 22. CESION ECONOMICA PRORROGA N°2 23. SUSPENSION MARZO DE 2024	 		Registro F-CDD-05: "Control de Documentos Externos"
5	**Comunicación con el cliente**	Durante el mes de Marzo del 2024, se mantuvo informado al ICCU, mediante comunicación de la Interventoría Nº INVIAS ADM-ICCU-815-2023-133, se da alcance a radicación de NPs 013 y 014, complementando los oficios de solicitud con los que el contratista de obra radicó los APUS no previstos. Con comunicación de Interventoría Nº ADM-ICCU-815-2023-134, se radicó Informe Técnico de Obra No. 6, ADM-ICCU-815-2023-135 se radicó informe mensual No 6 de Interventoría, ADM-ICCU-815-2023-136 se remite certificación de COPEBA SAS para el pago del acta, ADM-ICCU-815-2023-137 se radica al ICCUla correspondencia enviada al contratista de obra, ADM-ICCU-815-2023-138 se remite al ICCU los informes semanales No. 30 y No.31, ADM-ICCU-815-2023-139 donde se remite correspondencia radicada al contratista de obra, ADM-ICCU-815-2023-140 se radica concepto de Interventoría respecto a la solicitud de suspensión del contrato de obra, ADM-ICCU-815-2023-141 se radica solicitud de suspensión del contrato de interventoría, ADM-ICCU-815-2023-142 se radica concepto de aval a la Prórroga No. 3, ADM-ICCU-815-2023-143 se solicita prorrogar el contrato de interventoría hasta el 23 de abril de 2024, ADM-ICCU-815-2023-144 se radica Acta de Recibo Parcial No. 7, ADM-ICCU-815-2023-145 se radica acta de costos de interventoría No. 7, ADM-ICCU-815-2023-146 se informa al ICCU sobre reductor de velocidad que no fue colocado por el contratista de obra y que puede afectar la estabilidad de obra, ADM-ICCU-815-2023-147 se radica acta de suspensión de contrato de obra e interventoría. Igualmente, a la Entidad se le ha mantenido informada sobre el avance del proyecto a través de los informes semanales y reuniones de comité semanales.	 		Oficios a Entidad Contratante
6	**Gestión de Interventoría**	Durante el presente periodo se tramitaron los informes semanales N°31 al N°34, Se realizaron seguimientos de obra y se levantó el actas de comité de la N°27.	 		Informes Semanales y Actas de Comité
7	**Gestión de la Mejora**	No se presentaron acciones de mejora.	 		Registro "CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Y/O ACCION DE MEJORA"

Bogotá, 12 de abril de 2024

Señores
COPEBA S.A.S
Atención: Ing. Andrea Peña
Directora de Interventoría
Dirección: Cr 21 No. 100 – 20. Of. 602.
Bogotá D.C.

Referencia: MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ - FUSAGASUGÁ - PASCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Asunto: Análisis ensayos de laboratorio material MDC-19, Material Granular y concreto de cunetas.

Respetada Ing. Peña,

De acuerdo con los ensayos de laboratorio realizados, los cuales fueron ejecutados en los materiales siguientes:

i. Material de mezcla MDC-19 en las abscisas siguientes:

1. PR8+100 A PR8+240 VÍA SIBATÉ - FUSAGASUGÁ
2. PR10+150 A PR10+240 VÍA SIBATÉ - FUSAGASUGÁ

Cuyo análisis correspondió a los ensayos enunciados seguidamente, así:

- ✓ Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos.
- ✓ Flujo
- ✓ Relación Estabilidad/Flujo


Tabla 1 Evaluación de ensayos ejecutados en Mezcla MDC-19.

CARACTERÍSTICA	NORMA	MEZCLA DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS			RESULTADO	CUMPLE	RESULTADO	CUMPLE
	ENSAYO	CATEGORÍA DE TRÁNSITO						
	INV	NT1	NT2	NT3				
Estabilidad mínima (N)	E-748 (E-800)	5000	7,500 (16,875)	9,000 (33,750)	15749	OK	16665	OK
Flujo (mm) (Nota 2)		2.0 a 4.0	2.0 A 4.0 (3.0 A 6.0)	2.0 A 3.5 (3.0 a 5.3)	3,3	OK	3,2	OK
Relación Estabilidad / Flujo (kN/mm)		2.0 a 4.0	3.0 A 5.0 (4.5 A 7.5)	3.0 A 6.0 (4.5 A 9.0)	4,8	NO	5,21	NO
Vacíos con aire	E-736 o E-799	3.0 a 5.0	3.0 a 5.0	4.0 a 6.0	-	No Reporta	-	No Reporta

Tabla 2 Evaluación de ensayos ejecutados en Mezcla MDC-19.

Especificación				1	2
				PR 8+100 A PR8+240 VÍA SIBATÉ FUSAGASUGÁ	PR 10+150 A PR10+240 VÍA SIBATÉ FUSAGASUGÁ
Tamiz		LI	LS		
25,000	1"	100	100	100,0	100,0
19,000	3/4"	100	100	100,0	100,0
12,500	1/2"	80	95	83,8	82,9
9,500	3/8"	70	88	71,5	72,1
4,750	No 4	49	65	55,1	56,0
2,000	No 10	29	45	38,8	39,9
0,425	No 40	14	25	22,1	23,3
0,180	No 80	8	17	13,3	14,6
0,075	No 200	4	8	4,6	3,7

Ilustración 1 Gradación de la mezcla MDC-19.

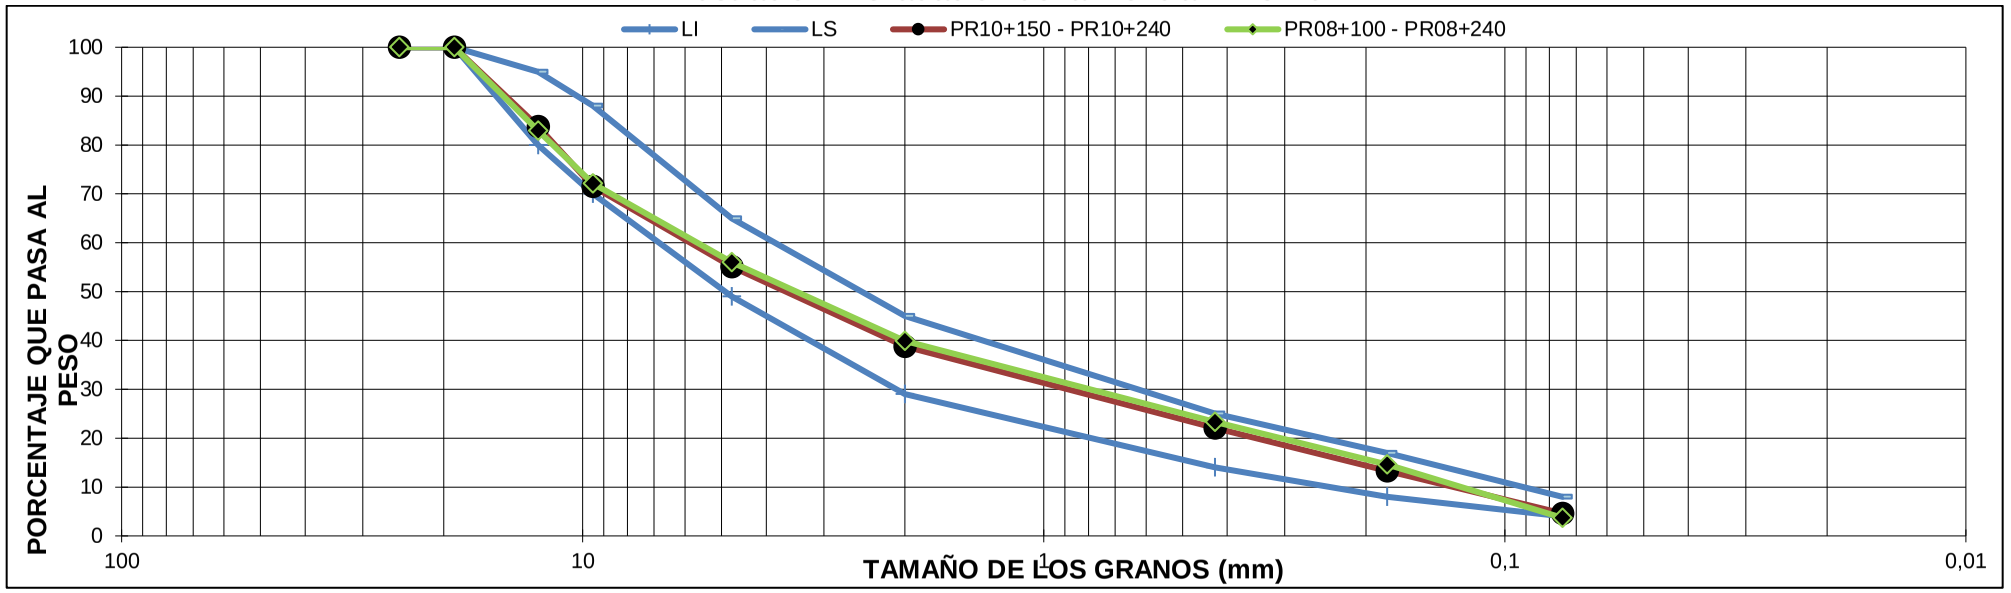

ii. Material granular

1. NN VÍA SIBATÉ - FUSAGASUGÁ

Cuya evaluación correspondió a los ensayos enunciados seguidamente, así:

- ✓ Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos.
- ✓ Límites de Atterberg, límite líquido y límite plástico
- ✓ Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños menos de 37,5mm (1 1/2") por medio de la Máquina de Los Ángeles.
- ✓ Equivalente de arena.
- ✓ Peso Unitario
- ✓ Porcentaje de compactación

De acuerdo con la información relacionada anteriormente, se procedió a determinar si los materiales evaluados cumplen las especificaciones del INVIAS, tal y como se puede observar en la tabla que se presenta a continuación.


Tabla 3 Evaluación de ensayos ejecutados

No.	Ensayo	Material	SBG	
			Si	No
1	Límites de Consistencia	Material Granular	X	
2	Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños menos de 37,5 mm (1 1/2") por medio de la Máquina de los Ángeles	Material Granular	X	
3	Equivalente de arena	Material Granular	X	
4	Sanidad de los agregados frente a la acción de los sulfatos (mg)	Material Granular	X	
5	Porcentaje de partículas deleznables F.	Material Granular	X	
6	% Compactación	Material Granular	X	

Tabla 4 Gradación Material Granular.

Especificación				NN VÍA SIBATÉ FUSAGASUGÁ	CUMPLE
Tamiz		LI	LS		
50,800	1 1/2"	100	100	100	SI
25,000	1"	100	100	94,55	NO
19,000	3/4"	75	100	89,84	SI
12,500	1/2"	50	80	79,24	SI
9,500	3/8"	45	75	71,30	SI
4,750	No 4	30	60	54,55	SI
2,380	No 8	20	45	35,88	SI
0,425	No 40	10	27	15,74	SI
0,150	No 100	5	18	12,35	SI
0,075	No 200	3	15	12,15	SI

Ilustración 2 Gradación del Material Granular Estabilizado con Cemento.

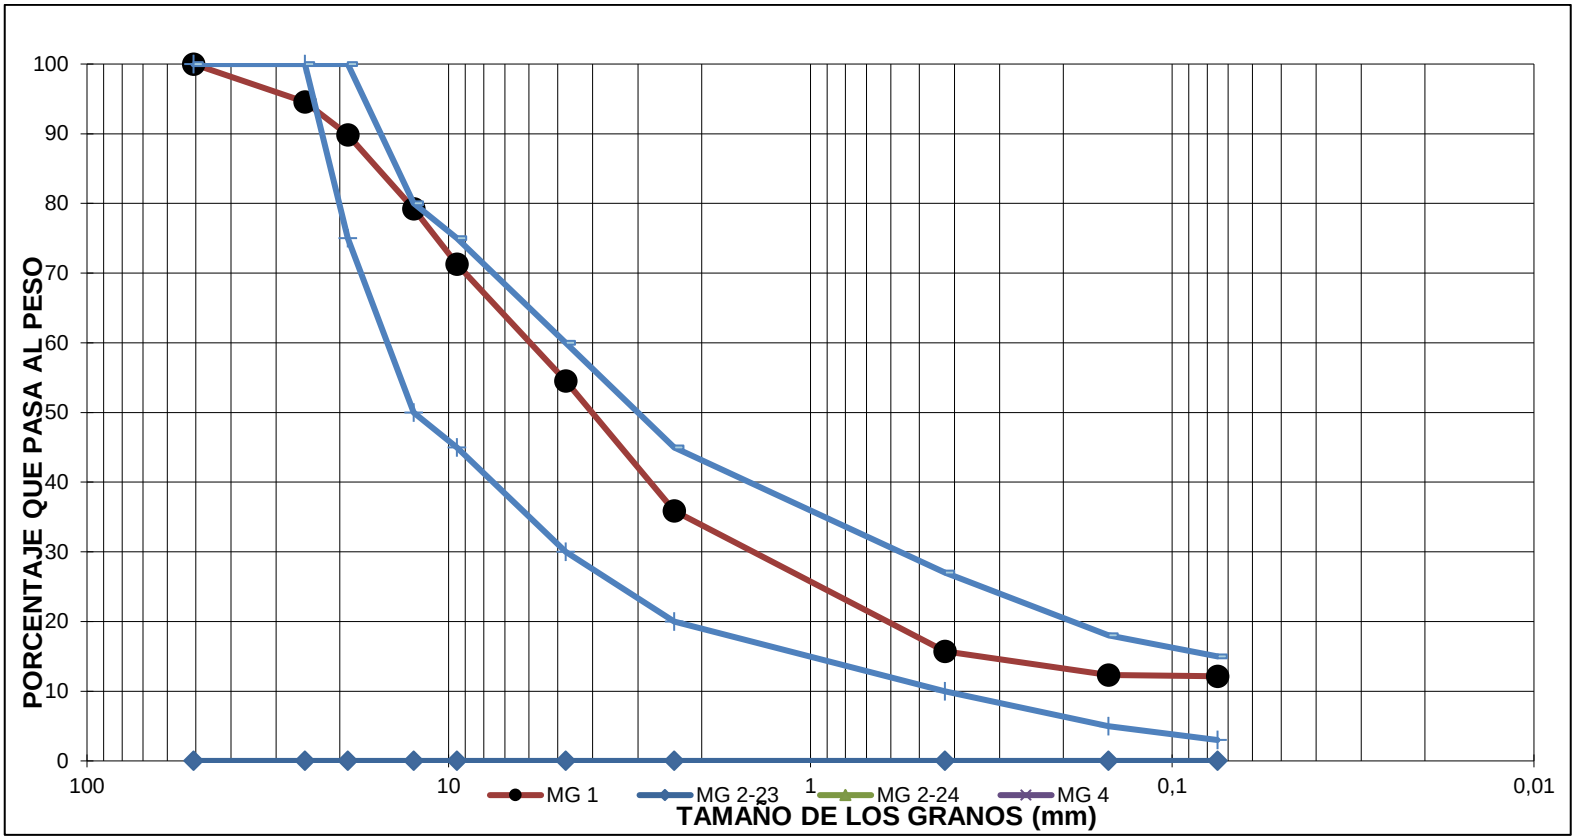

i. Concreto


1. NN VÍA SIBATÉ - FUSAGASUGÁ

Teniendo en cuenta el material empleado para las cunetas, se procedió a determinar la resistencia del concreto de dichos elementos, con el fin de conocer si dicho material es aceptable y se encuentra de acuerdo con el diseño respectivo.

Tabla 5 Resultados de resistencia del concreto de cunetas.

Elemento	No. Cilindro	Días de Curado	Resistencia
Cunetas PR07+992 3000 PSI	9	7	80,60%
	10	7	81,57%
	11	14	94,02%
	12	28	25,82%

Ilustración 3 Curva de resistencia del concreto de cunetas.

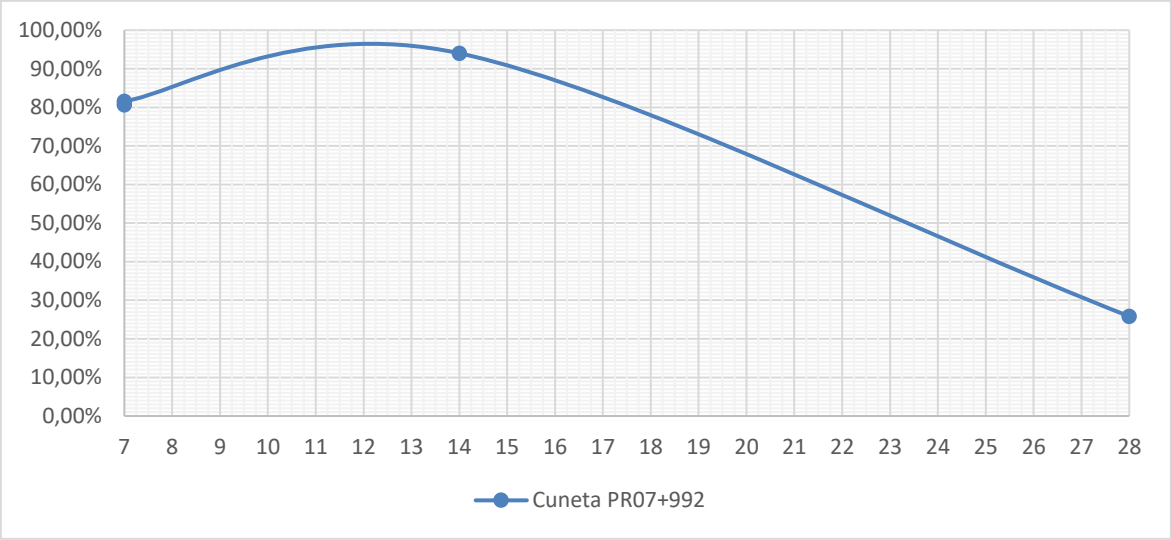

Con base en las tablas presentadas y las ilustraciones, el material granular tipo subbase de manera general cumple los parámetros evaluados, no obstante, se aclara que para dicho material se recomienda que se revise la gradación, con el fin de evitar exceso de gruesos.

En cuanto al material de la mezcla MDC-19, se puede establecer que su granulometría cumple, sin embargo, es imperativo seguir realizando su control para evitar cualquier tipo de alteración en su fracción gruesa y fina.

Finalmente se debe revisar el concreto de las cunetas, en el sentido de evaluar la resistencia a compresión de los cilindros a 28 días, ya que según los resultados el cilindro No. 12 solo tiene una resistencia del 28%, sin embargo, los demás cilindros con edades de 7 y 14 días, si muestran un porcentaje de resistencia adecuado según su edad.

Finalmente, se recomienda continuar con el control de calidad de los materiales, a fin de garantizar que sus propiedades son óptimas y puede seguir siendo empleado en el proyecto.

Sin otro particular, suscribimos cordialmente.

Atentamente,

NICOLÁS ORTEGA R.
Especialista en Pavimento

Concolab S.A.S. LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS.	**ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS** **INV E - 213 - 13**	Código: HC-LAB-001 Versión: 00 Fecha: 08/01/2018 Pág 1 de 1

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500"

DIRECTORA: ING. ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ

FUENTE: NN VIA SIBATE FUSAGASUGA

TIPO:

DESCRIPCIÓN MATERIAL GRANULAR DE COLOR MARRON OSCURO-ESTABILIZADO - CEMENTO 1,5% EMULSION 4,5 %


FECHA: viernes, 24 de noviembre de 2023

OBSERVACIONES: CUMPLE COMO BASE ESTABILIZADA, FALTA HOMOGENIZAR LOS MATERIALES EN OBRA, TENER EN CUENTA LA HUMEDAD OPTIMA EN EL MOMENTO DE SU COMPACTACIÓN.

Peso de material seco antes de lavado (g):	7563,3	Peso de material despues de lavado (g):	6644,4	ESPECIFICACIÓN: Tabla 330-3. INVIAS 2013 Tipo BG - 40			
TAMIZ		PESO	%	RETENIDO	%	LIMITES (PORCENTAJE PASA)	CUMPLE
ALTERNO	NORMAL (mm)	RETENIDO	RETENIDO	ACUMULADO	PASA	SUPERIOR - INFERIOR	SI - NO
21/2"	76,100	0,0	0,00	0,00	100,00	100 - 100,00	---
2"	50,000	0,0	0,00	0,00	100,00	100 - 100,00	---
11/2"	50,800	0,0	0,00	0,00	100,00	100 - 100	SI
1"	25,000	412,3	5,45	5,45	94,55	100 - 100	SI
3/4"	19,000	356,3	4,71	10,16	89,84	100 - 75	SI
1/2"	12,500	801,2	10,59	20,76	79,24	80 - 50	SI
3/8"	9,500	601,2	7,95	28,70	71,30	75 - 45	SI
No. 40	4,750	1266,3	16,74	45,45	54,55	60 - 30	SI
No. 8	2,380	1412,3	18,67	64,12	35,88	45 - 20	SI
No. 40	0,425	1523,3	20,14	84,26	15,74	27 - 10	NO
No. 100	0,150	256,3	3,39	87,65	12,35	18 - 5	NO
No. 200	0,075	15,2	0,20	87,85	12,15	15 - 3	SI
FONDO		0,00	0,00	87,85	12,15		

RESULTADOS GRANULOMETRIA

% GRAVA :	**64,12**
% ARENA :	**23,73**
% FINOS :	**12,15**
TAMAÑO MÁXIMO :	**1½"**
TAMAÑO NOMINAL:	**1"**
CUMPLE ESPECIFICACIÓN:	**SI**
D10	**--**
D30	**--**
D60	**--**
Cc	**--**
Cu	**--**
CLASIFICACION S.U.C.S.	**GP-GM**

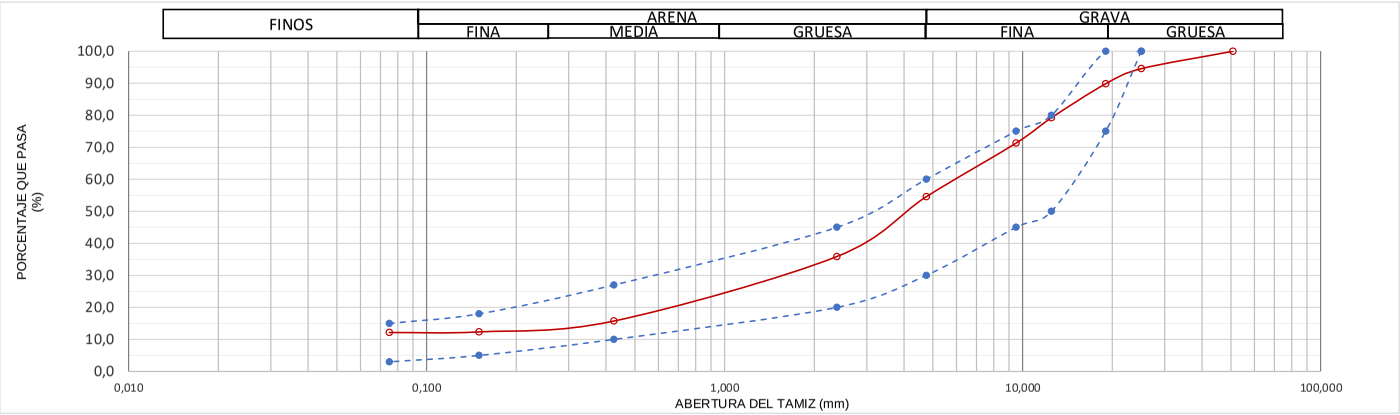

ENSAYÓ:	*CAROLINA HORMAZA* **LABORATORISTA**		***CONCOLAB S.A.S.***
REVISÓ:	*JUAN PABLO CARREÑO* **GERENTE TECNICO**		

Concolab S.A.S. LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS.	**LÍMITES DE ATTERBERG: LÍMITE LÍQUIDO Y LÍMITE PLÁSTICO** **INV E-125-126**	Código: HC-LAB-002 Versión: 00 Fecha: 08/01/2018 Pág 1 de 1


PROYECTO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500"	**DIRECTORA:**	ING. ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
FUENTE:	NN VIA SIBATE FUSAGASUGA	**TIPO:**	0
DESCRIPCIÓN	MATERIAL GRANULAR DE COLOR MARRON OSCURO	**FECHA:**	viernes, 24 de noviembre de 2023
OBSERVACIONES:	RESULTADOS COMPARADOS CON LAS TABLAS DEL CAPITULO 3 ARTICILO 320 DE LAS ESPECIFICACIONES VIGENTES DEL INVIAS		


LIMITES DE ATTERBERG

LÍMITE LÍQUIDO			
No. De Golpes			
Recipiente No.			
P1: Pr+Masa húmeda (g)	NL		
P2: Pr+Masa seca (g)			
P3: Pr+Masa recipiente (g)			
Masa seca (g)			
HUMEDAD (%)			

LÍMITE PLÁSTICO		
Recipiente No.		
P1: Pr+Masa húmeda (g)	NP	
P2: Pr+Masa seca (g)		
P3: Pr+Masa recipiente (g)		
Masa seca (g)		
HUMEDAD (%)		

HUMEDAD NATURAL
Wn (%)
125
220,10
198,30
48,30
150,00
14,53

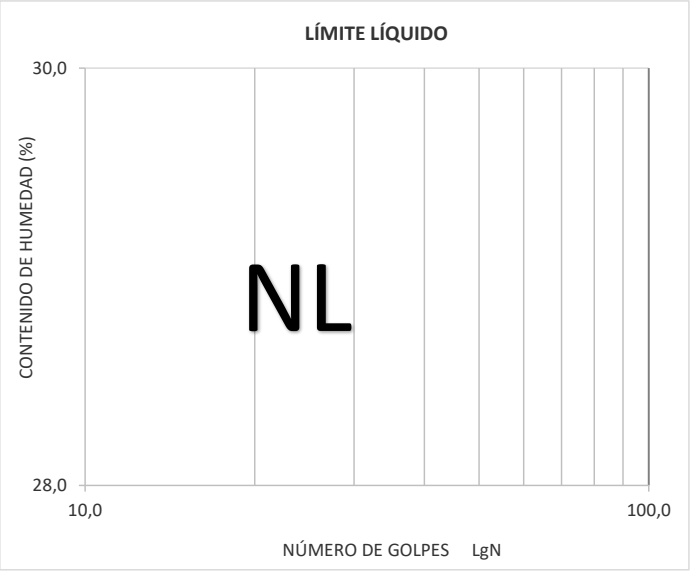

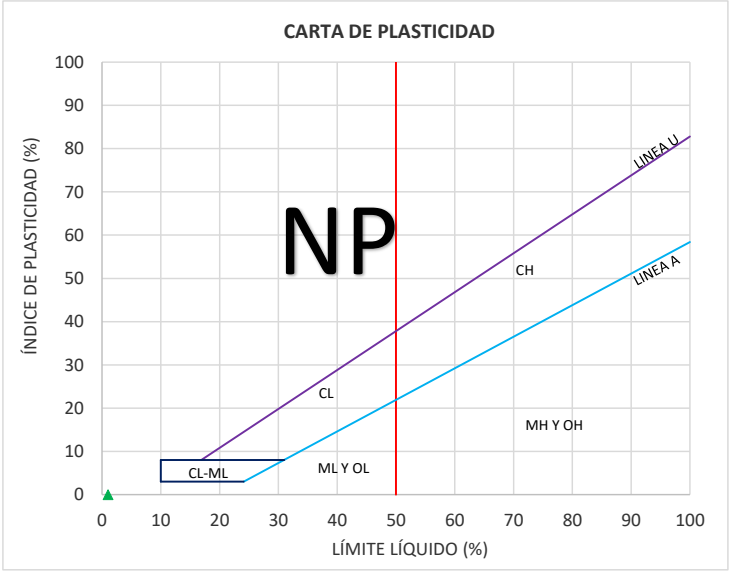

RESULTADOS	
LÍMITE LÍQUIDO (%)	NO LÍQUIDO
LÍMITE PLÁSTICO (%)	NO PLÁSTICO
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)	0,00
CLASIFICACIÓN U.S.C.S.	**GP-GM**

ESPECIFICACIÓN		
LÍMITE LÍQUIDO (%)	25 MAX	TABLA 320 - 2
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)	6 MAX	

ENSAYÓ:	*CAROLINA HORMAZA* **LABORATORISTA**		***CONCOLAB S.A.S.***
REVISÓ:	*JUAN PABLO CARREÑO* **DEPARTAMENTO TECNICO**	MP. 25502-043513 CND.	

CALLE 16 No. 8-11, Soacha, Cundinamarca / Telefono: 300 8118288
E-mail: concolabsas@gmail.com

Concolab S.A.S. LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS.	**RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENOS DE 37,5 mm (1 1/2") POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES INV E-218**	Código: HC-LAB-003 Versión: 00 Fecha: 08/01/2018 Pág 1 de 1

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500" **DIRECTORA:** ING. ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ

FUENTE: NN VIA SIBATE FUSAGASUGA **TIPO:** 0

DESCRIPCIÓN MATERIAL GRANULAR DE COLOR MARRON OSCURO **FECHA:**

OBSERVACIONES: RESULTADOS COMPARADOS CON LAS TABLAS DEL CAPITULO 3 ARTICILO 320 DE LAS ESPECIFICACIONES VIGENTES DEL INVIAS

V

GRANULOMETRIA	NÚMERO DE ESFERAS	MASA DE LA CARGA (g)
A	12	5000±25
B	11	4584±25
C	8	3330±20
D	6	2500±15

TAMAÑOS DE TAMIZ		MASAS DE LAS DIFERENTES FRACCIONES, g			
		GRANULOMETRÍAS			
PASA TAMIZ	RETENIDO EN TAMIZ	A	B	C	D
37.5 (1 1/2")	25.0 (1")				
25.0 (1")	19.0 (3./4")	1250±25			
19.0 (3./4")	12.5 (1/2")	1250±25			
12.5 (1/2")	9.5 (3/8")	1250±10	2500±10		
9.5 (3/8")	6.3 (1/4")	1250±10	2500±10	2500±10	
6.3 (1/4")	4.75 (No. 4)			2500±10	
4,75 (No. 4)	2,36 (No. 8)				5000±10
Total		**5000±10**	**5000±10**	**5000±10**	**5000±10**

DESGASTE MATERIAL SECO

Peso seco inicial (g)	5112
Peso seco 100 revoluciones (g)	4706
Peso seco 500 revoluciones (g)	3269

RESULTADOS		ESPECIFICACIÓN	
Desgaste 100 revoluciones (%)	7,9	8	TABLA 320 - 2
Degaste 500 revoluciones (%)	36,1	40 MAX	

DESGASTE MATERIAL HÚMEDO

Peso inicial SSS*** (g)	N.A.
Peso final 500 revoluciones (g)	N.A.

RESULTADOS		ESPECIFICACIÓN
Desgaste despues de 48 horas, 500 revoluciones (%)	N.A.	---
Relación húmedo / seco 500 revoluciones	N.A.	---

**** Saturado superficialmente seco*

ENSAYÓ:	CAROLINA HORMAZA **LABORATORISTA**	***CONCOLAB S.A.S.***
REVISÓ:	JUAN PABLO CARREÑO **DEPARTAMENTO TECNICO** MP. 25502-043513 CND.	

Concolab S.A.S LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS.	**CÁLCULO DEL EQUIVALENTE DE ARENA**	Código:	CCB-FLAB-023
		Versión:	2
		Fecha:	10/01/2019
		Pagina:	1 de 1

OBRA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500"	NORMA:	INV-133
DIRECTORA:	ING. ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ	Nª CONTRATO:	
LOCALIZACION:	NN VIA SIBATE FUSAGASUGA		
DESCRIPCION:	MATERIAL GRANULAR DE COLOR MARRON OSCURO-ESTABILIZADO - CEMENTO 1,5% EMULSION 4,5 %		
FECHA DE TOMA:	viernes, 24 de noviembre de 2023		
OBSERVACIONES:		Fecha Informe:	12/12/2023

TABLA DE DATOS

ENSAYOS	1	2	3
Solución Stock Conc. (Sol./Agua)	88 c.c./ 3.785 Lts.	88 c.c./ 3.785 Lts.	88 c.c./ 3.785 Lts.
TIEMPO	20min	20min	20min
LECTURA ARCILLA	24,2	26,3	26,3
LECTURA ARENA	5,1	5,6	5,3
EQUIV. ARENA	21,07	21,29	20,15

PROMEDIO E.A. = 21,18

$$\text{EQUIVALENTE DE ARENA E.A.} = \frac{\text{LECTURA ARENA}}{\text{LECTURA ARCILLA}} * 100$$

OBSERVACIONES: Se realiza mínimo dos veces el ensayo para comprobar resultados arrojados en las lecturas, y establecer un promedio del ensayo.

Laboratorista

Gerente técnico

Concolab S.A.S LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS.	**SANIDAD DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE LOS SULFATOS (Mg)**	Código:	CCB-FLAB-024
		Versión:	2
		Fecha:	10/01/2019
		Pagina:	1 de 1

OBRA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500"	NORMA:	INV-E-220
DIRECTORA:	ING. ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ		
LOCALIZACION:	NN VIA SIBATE FUSAGASUGA		
DESCRIPCION:	MATERIAL GRANULAR DE COLOR MARRON OSCURO-ESTABILIZADO - CEMENTO 1,5% EMULSION 4,5 %		
FECHA DE TOMA:	viernes, 24 de noviembre de 2023	Fecha Informe:	12/12/2023
OBSERVACIONES:	CUMPLE COMO BASE ESTABILIZADA, FALTA HOMOGENIZAR LOS MATERIALES EN OBRA, TENER EN CUENTA LA HUMEDAD OPTIMA EN EL MOMENTO DE SU COMPACTACIÓN.		

PESOS INICIALES ANTES DEL ENSAYO

TAMICES		PORCENT.	PESO NORMA	PESO REAL	PESO TAMIZ	PESO TAMIZ	TAMIZ
mm	pulg.	%	grs.	ENSAYO	INFERIOR	INFERIOR (%)	NF. (pulg)
							No.8
de 9,51 a 12,7	de 3/8" a 1/2"	33%	300 + ó - 5	801,2	800,0	0,15	1/4"
de 12.5 a 19.0	de 1/2" a 3/4"	67%	670 + ó - 10	356,3	352,3	1,12	1/4"
de 19.0 a 25.0	de 3/4" a 1"	33%	500 + ó - 30	412,3	405,6	1,63	1/2"
de 25.0 a 37.5	de 1 " a 1 1/2"	67%	1000 + ó - 50	0	0,0	0,00	1/2"
de 37.5 a 50.0	de 1 1/2" a 2 "	40%	2000 + ó - 200	0	0	0,00	1"

CALCULO DE LA PERDIDA MEDIA

TAMICES		GRANUL.	% PERDIDA
mm	pulg.	INICIAL	CORREGIDA
25,40	1"	412,3	4,63
19,00	3/4"	356,3	5,79
9,51	3/8"	601,2	0,90
4,760	1/2"	0,0	0,00
2,360	No. 40	0,0	0,00
	TOTAL		**11,32**

Valor perdida media por acción del Sulfato de Magnesio (Mg)= **11,32%**

ESTADO INICIAL Y FINAL DE LAS PARTICULAS MAYORES A 3/4"

TAMIZ QUE RETIENE	PESO INICIAL grs.	No. PARTICULAS INICIALES	No. PARTICULAS FINALES	PARTICULAS AFECTADAS	CLASIFICACION SEGÚN ACCION
3/4"				-	_
3/8"				_	_

OBSERVACIONES: EL MATERIAL CUMPLE CON LA NORMA; ESTA EXIGE MAXIMO 18% CUANDO SE UTILIZA SULFATO DE MAGNESIO

Laboratorista

Gerente técnico

Concolab s.a.s LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS.	PORCENTAJE DE PARTICULAS DELEZNABLES F.	Codigo:	CCB-FLAB-038
		Version:	2
		Fecha:	10/01/2019
		Pagina:	1 de 1

OBRA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500"	NORMA:	INV-211
DIRECTORA:	ING. ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ		
LOCALIZACION:	NN VIA SIBATE FUSAGASUGA		
DESCRIPCION:	MATERIAL GRANULAR DE COLOR MARRON OSCURO-ESTABILIZADO - CEMENTO 1,5% EMULSION 4,5 %		
FECHA DE TOMA:	viernes, 24 de noviembre de 2023	Fecha Informe:	12/12/2023
OBSERVACIONES:			

TABLA DE DATOS

ENSAYOS	1	2	3
TAMIZ MATERIAL	No. 16	No. 16	No. 16
TAMIZ LAVADO	No. 20	No. 20	No. 20
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO	25,00	25,50	25,00
MASA DE LAS PARTICULAS RETENIDAS	24,90	25,30	24,96
PORCENTAJE DE TERRONES DE ARCILLA	0,40	0,78	0,16

PROMEDIO P.D.. = 0,45

$$\%\ \text{TERRONES Y PARTICULAS DELEZ.} = \frac{\text{Masa muestra - masa retenida}}{\text{Masa muestra}} * 100$$

OBSERVACIONES:

Laboratorista	Gerente técnico

CCB-FLAB-038 PORCENTAJE DE PARTÍCULAS DELEZNABLES	CONCOLAB S.A.S

Concolab S.A.S LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS.	**PORCENTAJE DE PARTICULAS DELEZNABLES G.**	Codigo:	CCB-FLAB-039
		Version:	2
		Fecha:	10/01/2019
		Pagina:	1 de 1

OBRA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN,	NORMA:	INV-211
DIRECTORA:	ING. ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ		
LOCALIZACION:	NN VIA SIBATE FUSAGASUGA		
DESCRIPCION:	MATERIAL GRANULAR DE COLOR MARRON OSCURO-ESTABILIZADO - CEMENTO 1,5% EMULSION 4,5 %		
FECHA DE TOMA:	viernes, 24 de noviembre de 2023	Fecha Informe:	12/12/2023
OBSERVACIONES:			

TABLA DE DATOS

ENSAYOS	1	2	3
TAMIZ MATERIAL	No. 3/8"	No. 3/8"	No. 3/8"
TAMIZ LAVADO	No. 4	No. 4	No. 4
MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO	512,30	512,30	521,3
MASA DE LAS PARTICULAS RETENIDAS	508,30	510,20	517,2
PORCENTAJE DE TERRONES DE ARCILLA	0,78	0,41	0,79

PROMEDIO P.D.. = 0,66

$$\%\ \text{TERRONES Y PARTICULAS DELEZ.} = \frac{\text{Masa muestra - masa retenida}}{\text{Masa muestra}} * 100$$

OBSERVACIONES: _____

Laboratorista

Gerente técnico

Concolab S.A.S CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION: NORMA INVIAS E-410 Y NTC 673-1513

Código	CSB-L-F040
Versión	02
Fecha	20/05/2014
Página	1 de 1

OBRA: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".

CLIENTE: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL

LOCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Concreto hidráulico para elementos estructurales

FECHA RECIBO: ver remision

OBSERVACIONES:

NORMA: NTC 673 -1513; INV E-410

FECHA: 4 de abril de 2024

CONTRATO/ELEMENTO / No. MUESTRA	FECHA DE TOMA	No. CILINDRO		DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	AREA (cm²)	VOLUMEN (cm³)	PESO (gr)	DENSIDAD (gr/cm³)	CARGA APLICADA (KN)	CARGA APLICADA (Kg)	RESISTENCIA A LA FECHA		RESISTENCIA ESTIMADA A LOS 28 DIAS (P.S.I.)	PORCENTAJE CON RESPECTO A f´c	TIPO DE FALLA				
														(Kg/cm²)	P.S.I.							
CUNETA AGUA BONITA	22/02/2024	SM	13	7	29-feb-24																	
		SM	14	7	29-feb-24																	
CUENTAS PR-07+992 3000PSI	12/02/2024	SM	9	7	19-feb-24	15,0	30,1	176,7	5319,1	13121	2,47	391,20	39882,8	225,7	3224,2		80,60%	X				
		SM	10	7	19-feb-24	15,1	30,0	179,1	5372,4	13115	2,44	401,20	40902,3	228,4	3262,9		81,57%			X		
		SM	11	14	26-feb-24	15,0	30,2	176,7	5336,8	13124	2,46	456,30	46519,8	263,2	3760,7		94,02%			X		
		SM	12	28	11-mar-24	15,0	30,0	176,7	5301,4	13128	2,48	125,30	12774,3	72,3	1032,7		25,82%	X				

La información aquí reportada pertenence unicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de CONCOLAB S.A.S

Laboratorista

Jefe de Laboratorio

Concolab s.a.s LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS.	**RELACIONES HUMEDAD-PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION) INV E-142**	**CODIGO: F-PS-09** **VERSION: 1** **Pagina 1 de 1**

PROYECTO: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".

CLIENTE : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO No ICCU-815 del 2023

DESCRIPCIÓN: MATERIAL GRAVO ARCILLOSO COLOR AMARILLO

FUENTE : TOMADA EN EL PR-10+500

NORMA: I.N.V.E - 142

PROFUNDIDAD: N.A.


LOCALIZACIÒN: VIA SIBATE - FUSAGASUGA

MUESTRA: N.A.

FECHA DE ENSAYO: 27/01/2024

PRUEBA	1	2	3	4
Apique No.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Número de golpes	56	56	56	56
Humedad natural de la muestra %	1,00	1,00	1,00	1,00
Humedad adicional %	3	5	7	8
Peso de la muestra húmeda, g.	5500	5500	5500	5500
Peso de la muestra seca, grs	5446	5446	5446	5446
Molde No.	1	1	1	1
Peso de la muestra húmeda y molde,g.	10453	10557	10476	10464
Peso del molde, g.	6026	6026	6026	6026
Peso de la muestra húmeda, grs	4427	4531	4450	4438
% Humedad (horno)	6,3	9,9	12,6	11,8
Peso de la muestra seca, g.	4165	4124	3953	3970
Volumen del molde, cm^3	2095	2095	2095	2095
Densidad de la muestra seca, g/cm^3	1,988	1,968	1,887	1,895

HUMEDAD DE COMPACTACION	P1	610,1	534,1	499,1	485,1
	P2	578,1	492,1	454,1	444,1
	P3	70	67	96	96
	w (%)	6,3	9,9	12,6	11,8

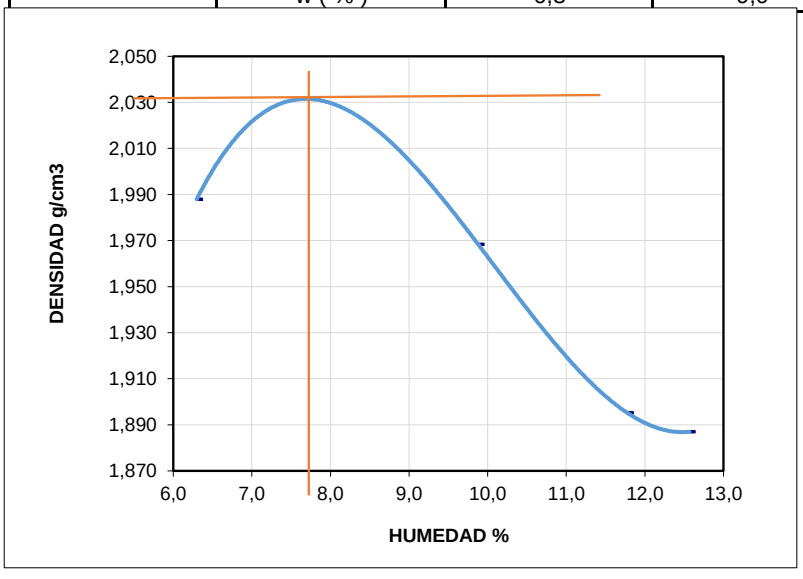

Densidad máx.	g / cm^3	2,030
Humedad óptima	%	7,9
Humedad natural	%	1,0

OBSERVACIONES

MUESTRA TOMADA EN OBRA

LABORATORISTA:

FIRMA

NOMBRE : CAROLINA HORMAZA ABRIL

RESPONSABLE:

FIRMA


NOMBRE : ING JUAN PABLO CARREÑO

Concolab S.A.S LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS.	ENSAYO		Código:	CCB-FLAB-002
	PESO UNITARIO SECO EN EL TERRENO - MÉTODO CONO DE ARENA		Versión:	2
			Fecha:	10/01/2019
	NORMA	PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	Pagina:	1 de 1
	INV E - 161-07	MVS-29	Elaboró:	J.P.C.M

CLIENTE:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO No ICCU-815 del 2023	**ÓRDEN DE TRABAJO**	_
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".	**NORMA DEL CLIENTE**	INVIAS
		CLASE DE MATERIAL	SUB BASE
LOCALIZACIÓN	VIA SIBATE - FUSAGASUGA	**PROCEDENCIA**	
ATENCIÓN			
FECHA DE TOMA:	2024-mar-18	**FECHA DE INFORME:**	2024-abr-01

DETERMINACION	1	2	3			
Localización	PR-8+292	PR-8+237				
Capa No	ULTIMA	ULTIMA				
Costado	IZQ	DER				
Espesor (cm)	15	15				
Peso Inicial Frasco + Arena (gr)	5639	5615				
Peso final del frasco + Arena (gr)	2117	2256				
Peso de la arena usada (gr)	3522	3359				
Constante del cono (gr)	1648	1648				
Peso de la arena en el hueco (gr)	1874	1711				
Densidad de la arena (gr/cm3)	1,49	1,49				
Volúmen del hueco (cm3)	1258	1148				
Peso material húmedo (gr)	2815	2569				
% humedad del material	9,8%	10,0%				
Peso seco del material (gr)	2606	2335				
Peso unitario seco (gr/cm3)	2,072	2,034				
Peso unitario seco máximo laboratorio (gr/cm3)	2,030	2,030				
% compactación (gr/cm3)	98,0%	99,8%				

ESQUEMA



OBSERVACIONES

EJECUTÓ	APROBÓ

El presente formato no deberá ser reproducido ni duplicado sin la autorización firmada y notificada emitida por CONCOLAB SAS.

Concolab S.A.S LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS.	**EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DE ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS Y ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO. RESISTENCIA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE (MARSHALL)**	**Codigo**	**CCB-FLAB-044**
		Version	1
		Fecha	10/01/2019
		Pagina	1 de 1
	NORMA: INV E-732,782,733,748		

OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".

ÓRDEN DE TRABAJO

CLIENTE: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO No ICCU-815 del 2023

MUESTRA No

LOCALIZACIÓN DESCRIPCION: PR-8 +100 A PR8+240 VIA SIBATE FUSAGASUGA


CLASE DE MATERIAL MDC-19

FECHA DE INGESO: 2024-ene-26 **FECHA DE ENSAYO:** 2024-feb-05

BRIQUETA No.	**1**	**2**	**3**	**4**	**Promedio**
Espesor medida No 1 (cm)	6,99	7,00	7,00	7,00	
Espesor medida No 2 (cm)	7,00	7,10	7,10	7,00	
Espesor medida No 3 (cm)	7,00	6,99	6,99	6,99	
Espesor promedio (cm)	7,00	7,03	7,03	7,00	
Peso en el aire (g)	1147,3	1147,3	1150,0	1156,3	
Peso en el agua (g)	653,2	656,3	662,3	659,3	
Peso SSS (g)	1192,3	1192,3	1196,3	1198,3	
Volumen de la briqueta (cm3)	539,1	536,0	534,0	539,0	
Densidad briqueta (g/cm3)	2,128	2,140	2,154	2,145	**2,142**
Estabilidad (Kgf)	1668,3	16665,3	1665,3	1665,3	
Factor de corrección	0,96	0,96	0,96	0,96	
Lectura del anillo					
Estabilidad corregida (Kgf)	1601,6	15998,7	1598,7	1589,3	**5197,1**
Flujo (1/100")	12,5	13,0	12,5	13,5	
Flujo (mm)	3,2	3,3	3,2	3,4	**3,3**
% Vacios con aire					
Relacion Estabilidad/Flujo					
1574,9					

EXTRACCION	
Prueba No. 1	
Peso inicial (g)	1625,3
Peso final (g)	1526,3
P. filtro inicial (g)	15,9
P. filtro final (g)	16,8
Diferencia	98,1
% de asfalto	**6,04%**
EXTRACCION	
Prueba No. 2	
Peso inicial (g)	1630,2
Peso final (g)	1526,6
Peso inicial (g)	16,3
Peso final (g)	15,3
Diferencia	104,6
% de asfalto	**6,4%**
% Asfalto promedio	**6,2%**
Densidad máxima medida (Rice)	2,345
% Vacios	8,66

Peso Inicial		2456,3								
mm	ALTERNO	1		% RETENIDO ACUMULADO	% PASA	INFERIOR	SUPERIOR	DISEÑO	INFERIOR	SUPERIOR
1"	25,400				**100,0**	100	100			
3/4"	19,050				**100,0**	100	100			
1/2"	12,700	398,3	16,2	16,2	**83,8**	80	95			
3/8"	9,525	302,3	12,3	28,5	**71,5**	70	88			
No. 4	4,750	401,2	16,3	44,9	**55,1**	49	65			
No. 10	2,000	401,2	16,3	61,2	**38,8**	29	45			
No. 40	0,425	410,2	16,7	77,9	**22,1**	14	25			
No. 80	0,180	215,3	8,8	86,7	**13,3**	8	17			
No. 200	0,075	215,3	8,8	95,4	**4,6**	4	8			
FONDO		112,5	4,6							

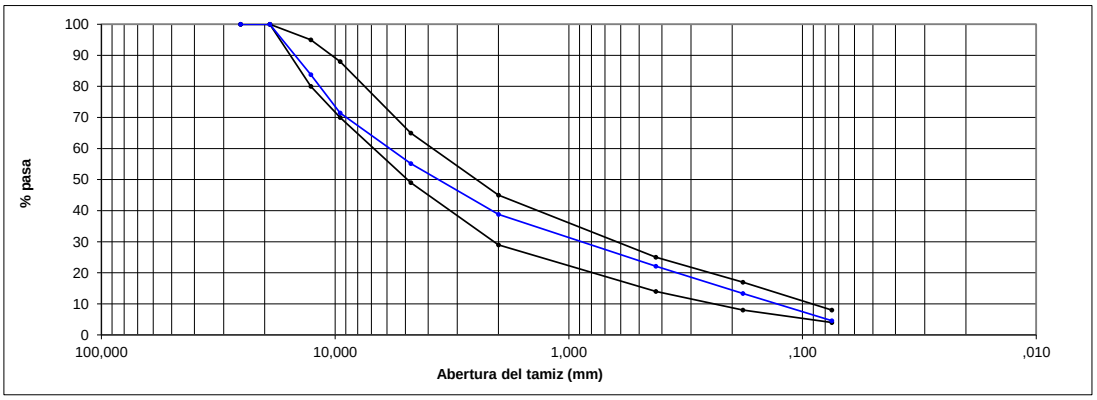

Observaciones

LABORATORISTA **GERENTE GENERAL**

Concolab S.A.S LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS.	**EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DE ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS Y ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO. RESISTENCIA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE (MARSHALL)**	**Codigo**	**CCB-FLAB-044**
		Version	1
		Fecha	10/01/2019
		Pagina	1 de 1
	NORMA: INV E-732,782,733,748		

OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".

ÓRDEN DE TRABAJO

CLIENTE: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO No ICCU-815 del 2023

MUESTRA No

LOCALIZACIÓN DESCRIPCION: PR-10 +150 A PR-10+240 VIA SIBATE FUSAGASUGA

CLASE DE MATERIAL MDC-19


FECHA DE INGESO: 2024-feb-18 **FECHA DE ENSAYO:** 2024-feb-28

BRIQUETA No.	**1**	**2**	**3**	**4**	**Promedio**
Espesor medida No 1 (cm)	7,00	7,00	6,99	7,00	
Espesor medida No 2 (cm)	7,10	7,10	7,10	7,10	
Espesor medida No 3 (cm)	6,99	6,90	6,98	7,00	
Espesor promedio (cm)	7,03	7,00	7,02	7,03	
Peso en el aire (g)	1153,2	1155,3	1152,3	1156,3	
Peso en el agua (g)	660,2	650,3	665,3	652,3	
Peso SSS (g)	1198,3	1193,2	1198,3	1197,2	
Volumen de la briqueta (cm3)	538,1	542,9	535,3	544,9	
Densidad briqueta (g/cm3)	2,143	2,128	2,153	2,122	**2,136**
Estabilidad (Kgf)	1675,3	1670,3	1672,3	1679,3	
Factor de corrección	0,96	0,96	0,96	0,96	
Lectura del anillo					
Estabilidad corregida (Kgf)	1608,3	1645,3	1723,3	1689,0	**1666,5**
Flujo (1/100")	12,0	12,5	13,0	12,3	
Flujo (mm)	3,0	3,2	3,3	3,1	**3,2**
% Vacios con aire					
Relacion Estabilidad/Flujo					
520,8					

EXTRACCION	
Prueba No. 1	
Peso inicial (g)	1628,3
Peso final (g)	1526,3
P. filtro inicial (g)	15,3
P. filtro final (g)	16,3
Diferencia	101,0
% de asfalto	**6,20%**
EXTRACCION	
Prueba No. 2	
Peso inicial (g)	1628,3
Peso final (g)	1528,3
Peso inicial (g)	15,3
Peso final (g)	16,2
Diferencia	99,1
% de asfalto	**6,1%**

% Asfalto promedio	**6,1%**
Densidad máxima medida (Rice)	2,345
% Vacios	8,89

Peso Inicial		2489,3								
mm	ALTERNO	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% RETENIDO ACUMULADO	% PASA	INFERIOR	SUPERIOR	DISEÑO	INFERIOR	SUPERIOR
1"	25,400				**100,0**	100	100			
3/4"	19,050				**100,0**	100	100			
1/2"	12,700	426,4	17,1	17,1	**82,9**	80	95			
3/8"	9,525	267,3	10,7	27,9	**72,1**	70	88			
No. 4	4,750	402,3	16,2	44,0	**56,0**	49	65			
No. 10	2,000	401,2	16,1	60,1	**39,9**	29	45			
No. 40	0,425	412,3	16,6	76,7	**23,3**	14	25			
No. 80	0,180	216,4	8,7	85,4	**14,6**	8	17			
No. 200	0,075	270,2	10,9	96,3	**3,7**	4	8			
FONDO		93,3	3,7							

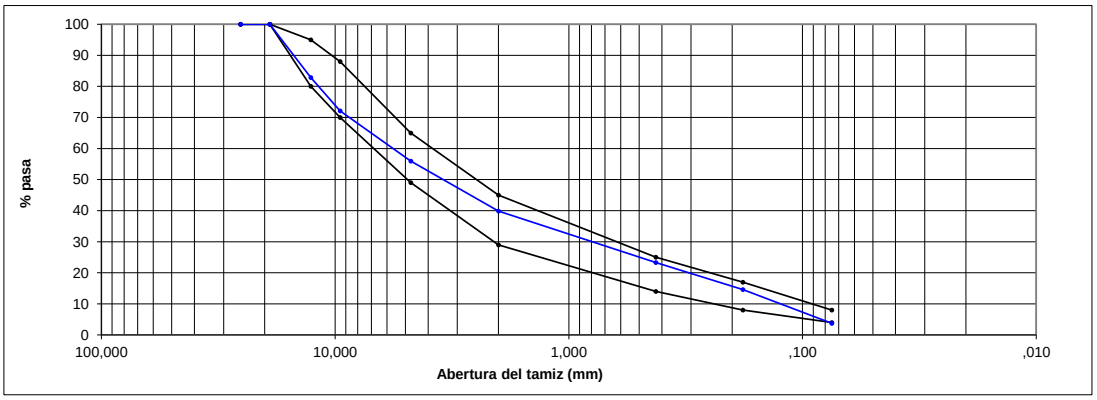

Observaciones

LABORATORISTA **GERENTE GENERAL**

6.6. Otros Documentos seguimiento mensual

6.6.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo

Mediante comunicación ADM-ICCU-815-2023-009 de fecha 11 de agosto de 2023, la interventoría solicitó a la Subdirección Administrativa y Financiera de ICCU la autorización para la cesión de derechos económicos del contrato de interventoría, se está a la espera de la respuesta del ICCU para proceder a gestionar el anticipo de la interventoría ante el Instituto, el cual de acuerdo a la cláusula 6 del contrato, corresponde a un valor del TRESCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($309.837.246), equivalente al 30% del valor del contrato de interventoría, a la fecha se encuentra en trámite de la entidad la gestión para el desembolso del respectivo anticipo, sin embargo, y con el fin de dar cumplimiento a la cláusula 6 del contrato, en cuanto a que la amortización total del anticipo se debe hacer un mes antes del vencimiento del contrato, la interventoría ha amortizado en anticipo en un valor de $ 75,566,948.00 en el acta de costos No. 1 y un valor de $ 102,765,790 en el acta de costos No. 2.

6.6.2. Actas de comité

A continuación, se remite el acta de comité No. 27, que se desarrollaron en el presente periodo.

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	Marzo 13 /2024	ACTA No.	27
HORA DE INICIO:	10:00 am	HORA FINALIZACIÓN:	1:00 pm.
LUGAR DE REUNIÓN:	Virtual		
DEPENDENCIA:	Interventoría.		

OBJETO DE LA REUNIÓN

- Seguimiento a Avance de Obra por frentes de trabajo.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


1) Tramo N°3: Se está excavando pero la banca se está viniendo, se hizo contención con madera. Al día de hoy se llevan 11 ml de gavión en el primer nivel. Hoy se está comenzando instalación del segundo cuerpo del gavión. El actual gavión en intervención del K7+960 al K7+980, trae dos cuerpos. Fecha de terminación: Marzo 18 de 2024.
- Segundo gavión: Inicia excavación. K8+040 + K8+077. L=37 ml. Terminación: Abril 12 de 2024.
- Falta terminar reparación de cuneta.
- Colocación de Filtros. Entrega de documento de diseño de filtro para el viernes 15 de Marzo de 2024.

2) Tramo N°4: Hoy se entrega cerrada la subbase. Colocación adoquín en una semana Terminación Marzo 20 de 2024. Faltan dos tuberías con reparación. que les falta remate de ois falto.

3) Espacio Público: Aguadita → Reconstrucción de cunetas.
- Limpieza de cunetas inicio el 15 de Marzo de 2024.

Social: Se solicita poder dar cierre social al predio de Don Jocinto.

- Existe solicitud del Municipio de Fusagasugá para usar RCD. El contratista se compromete a dar respuesta el Jueves 14 de Marzo de 2024.
- Contratista realizará recuperación de la cinta de concreto y realizar limpieza de canal. Contratista iniciará 15 de Marzo de 2024.
- Lote DIAN: Se solicito respuesta al contratista por parte de la Interventoría. Dian respondió que la escritura dice que es hasta el fin de la vía.

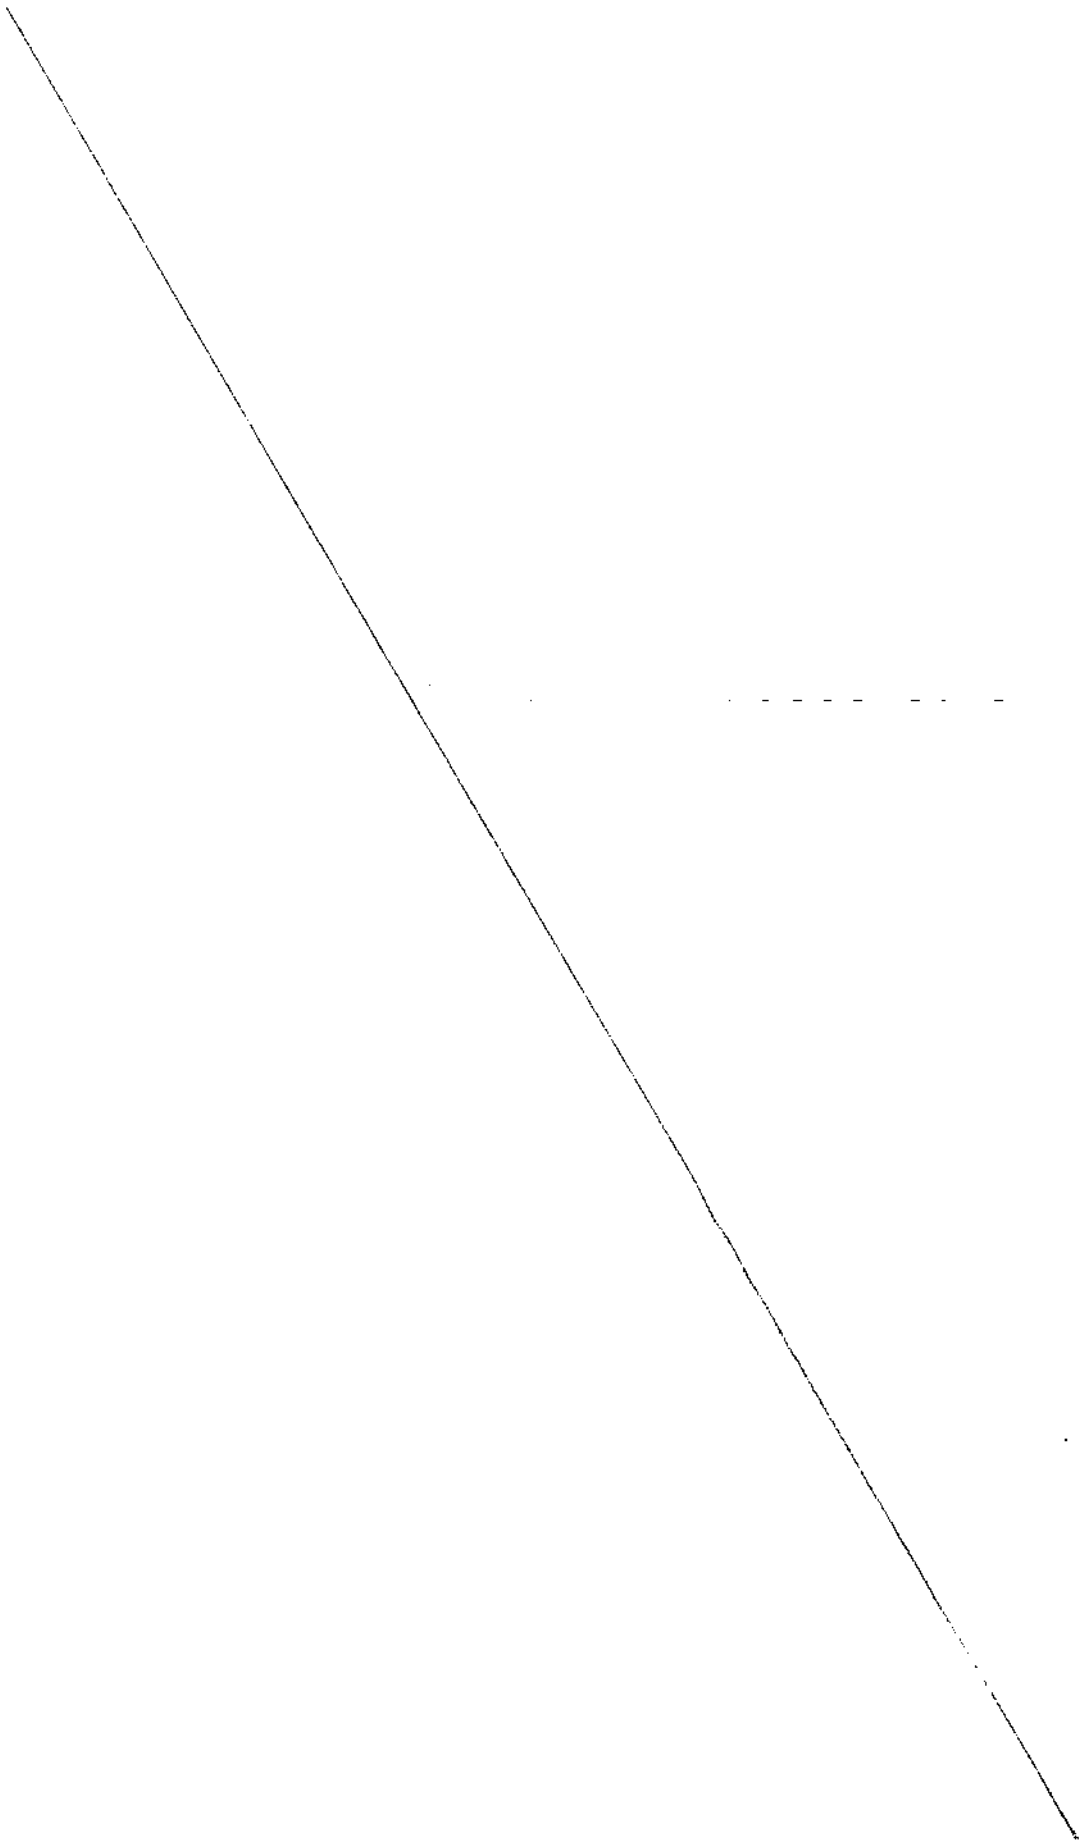

CONCLUSIONES
Ambiental Interventoria: Se solicita que el material quede debidamente recogido, y evitar que d material comprometa conducción del agua, para evitar que el pavimento se manche. Tramo N°7: Ejecución total de cunetas = 584 ml. Meta: 792 ml. Terminación: Marzo 22 de 2024.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
terminar Gavión ubicado en el K7+960 al K7+980	Marzo 18 de 2024
Entrega de Diseño hidráulico para gavión tramo 3	Marzo 15 de 2024
Inicio de Colocación adoquín Tramo N°4	Marzo 14 de 2024
Limpieza de cunetas Aguadita	Marzo 15 de 2024
Solicitar por oficio al Iccu hasta donde limites de predio tramo Lote DIAN para determinar ejecución tramo	Marzo 13 de 2024
Box Pasca se requiere concepto del Especialista Estructural del contratista de obra, para construcción entrada Demarcación - Inicio	Marzo 20 de 2024 Marzo 13 de 2024

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Andrea Peña Sánchez	Directora de Interventoria	Firma Presencial
Giovanni Ariza	Residente de Interventoria	Virtual
William Oliveros	Director de Obra	Virtual
Viviana Trasneda	Inspector de Obra	Virtual
Alexander Coicedo	Residente de Obra	Virtual
John Cano	Espec. Ambiental Interv.	Virtual
Nury García	Profesional Social	Virtual
Valentina Carlos	Apoyo Ingeniera Iccu	Virtual

Pasca - Paso Malo: Esta terminando instalación de subbase. El jueves 14 de marzo de 2024, se verificarán cotas por topografía.

- Total de intervención: 170 ml.
- Bordillo terminación: Marzo 16 de 2024.
- Fundida cuneta 170 ml: Marzo 20 de 2024 terminación.
- Inicio instalación adoquín: 21 de Marzo 2024.
- Se solicitará prórroga por parte del contratista.

Espacio Público:

Aguaditas: Falta por definir espacio público en predio que está en sucesión.

- Faltan remates contra las viviendas: Se realizará emboquillados, cunetas para transición de agua.

Actas cerradas de vecindad 24 de 46: Faltan 22 actas.

Compromiso de cierre total de actas de vecindad para el 23 de Marzo de 2024.

Aguabonitas: Ejecución: 180 ml.

Por intervenir: 30 ml + colisco = 50 ml. Total: 80 ml.

Total de intervención: 260 ml.

Terminación aproximada al 10 de abril de 2024.

Obras hidráulicas: Alcantarillas.

1) K9+890: Falta remate de cuneta contra encole.

2) K10+240: Falta remate de cuneta contra encole. y losa de entrega al descole.

3) K11+924: Sin intervenir

4) K11+954: Solo se ha colocado tubería.


5) K12+033: Falta estructura de entrada.


6) Box Pasual: Falta encole y descole. se programa visita de Esp. Estructural para miércoles 20 de Marzo de 2024. para reconstrucción de encole y descole.

La interventoría solicita que se haga acta de vecindad con el predio que colinda con el descole de la actividad

Demarcación: Presupuesto aproximado contractual: $287 millones.

se inició en sectores de bacheo: Aguaditas
- Tramo 3.
- Tramo 5.

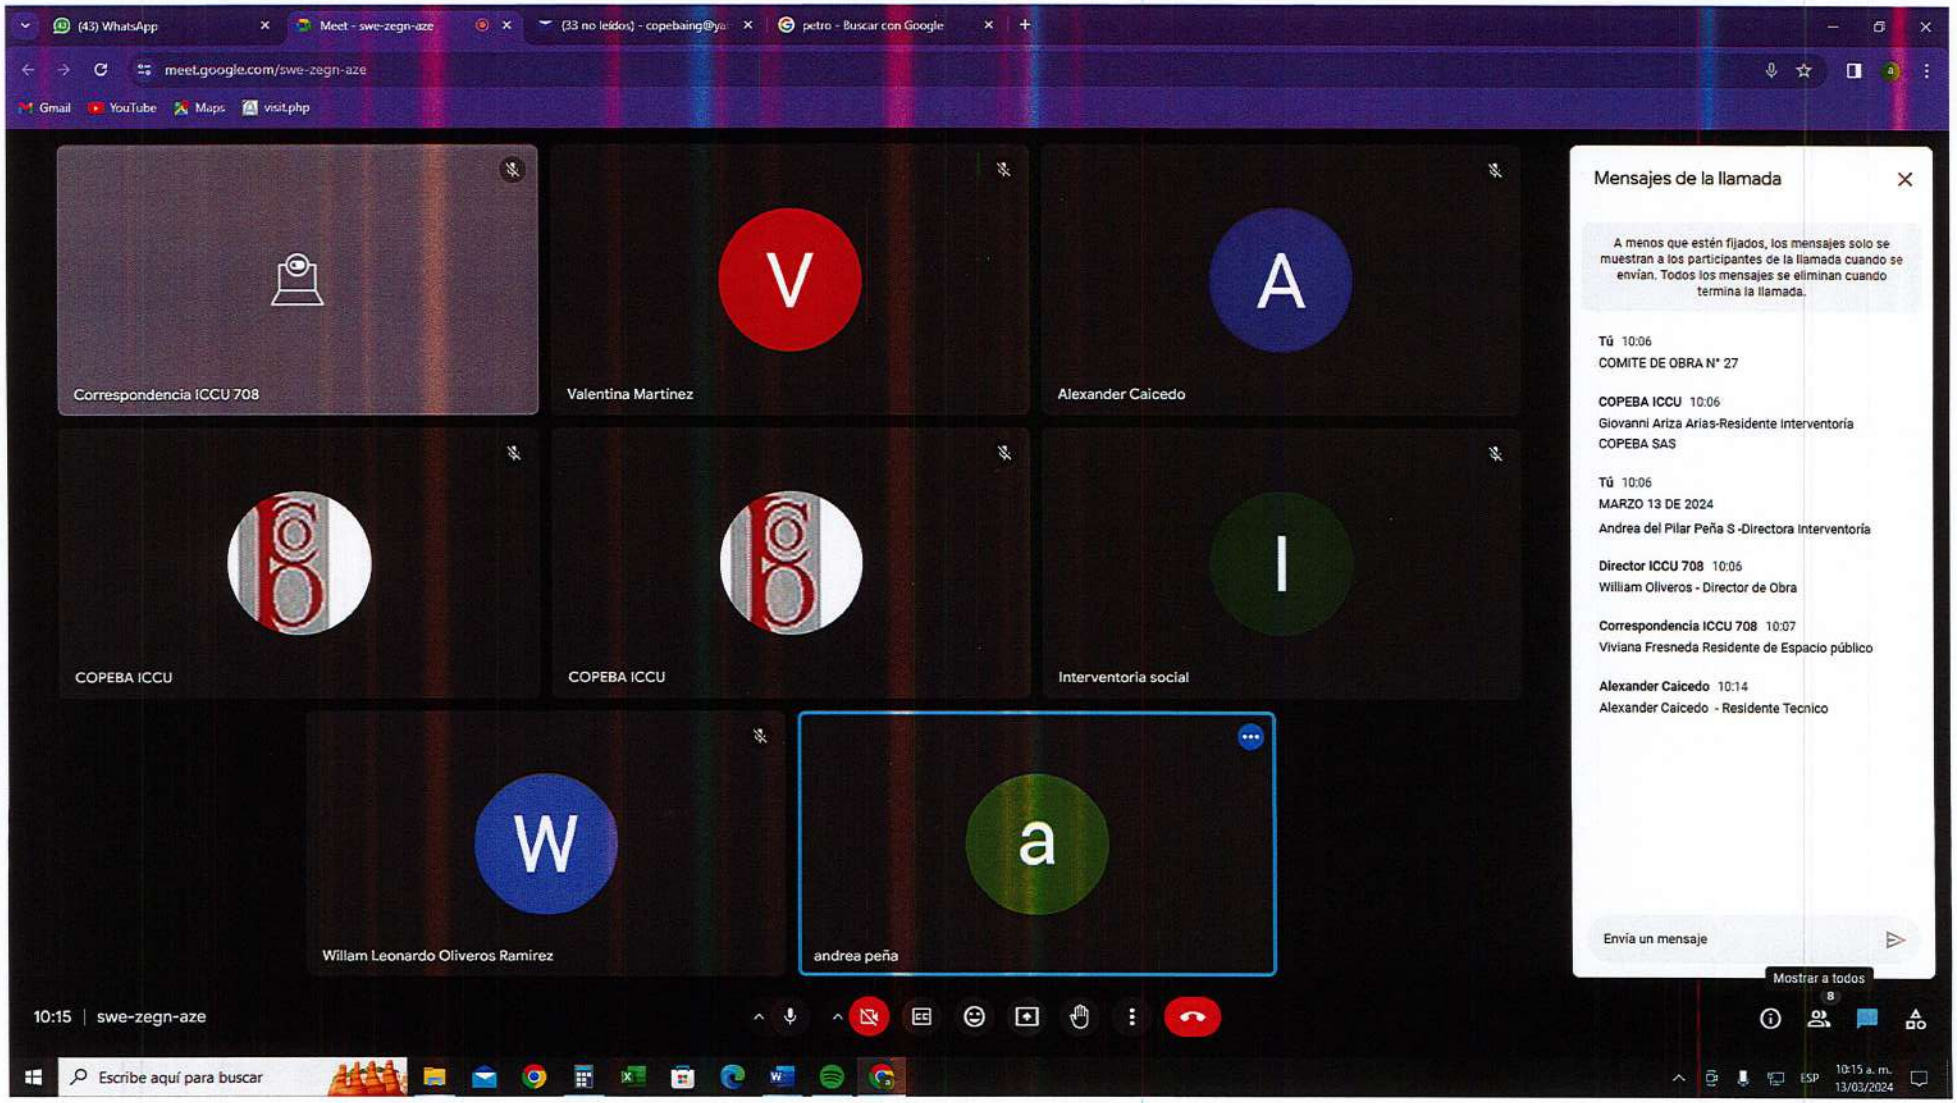
(43) WhatsApp
Meet - swe-zegn-aze
(33 no leídos) - copebaing@ya
petro - Buscar con Google
meet.google.com/swe-zegn-aze
Gmail
YouTube
Maps
visit.php
Correspondencia ICCU 708
Valentina Martinez
Alexander Caicedo
COPEBA ICCU
COPEBA ICCU
Interventoria social
Willam Leonardo Oliveros Ramirez
andrea peña
Mensajes de la llamada
A menos que estén fijados, los mensajes solo se muestran a los participantes de la llamada cuando se envían. Todos los mensajes se eliminan cuando termina la llamada.
Tú 10:06
COMITE DE OBRA N° 27
COPEBA ICCU 10:06
Giovanni Ariza Arias-Residente Interventoría COPEBA SAS
Tú 10:06
MARZO 13 DE 2024
Andrea del Pilar Peña S -Directora Interventoría
Director ICCU 708 10:06
William Oliveros - Director de Obra
Correspondencia ICCU 708 10:07
Viviana Fresneda Residente de Espacio público
Alexander Caicedo 10:14
Alexander Caicedo - Residente Tecnico
Envía un mensaje
Mostrar a todos
10:15 | swe-zegn-aze
Escribe aquí para buscar
ESP
10:15 a. m.
13/03/2024

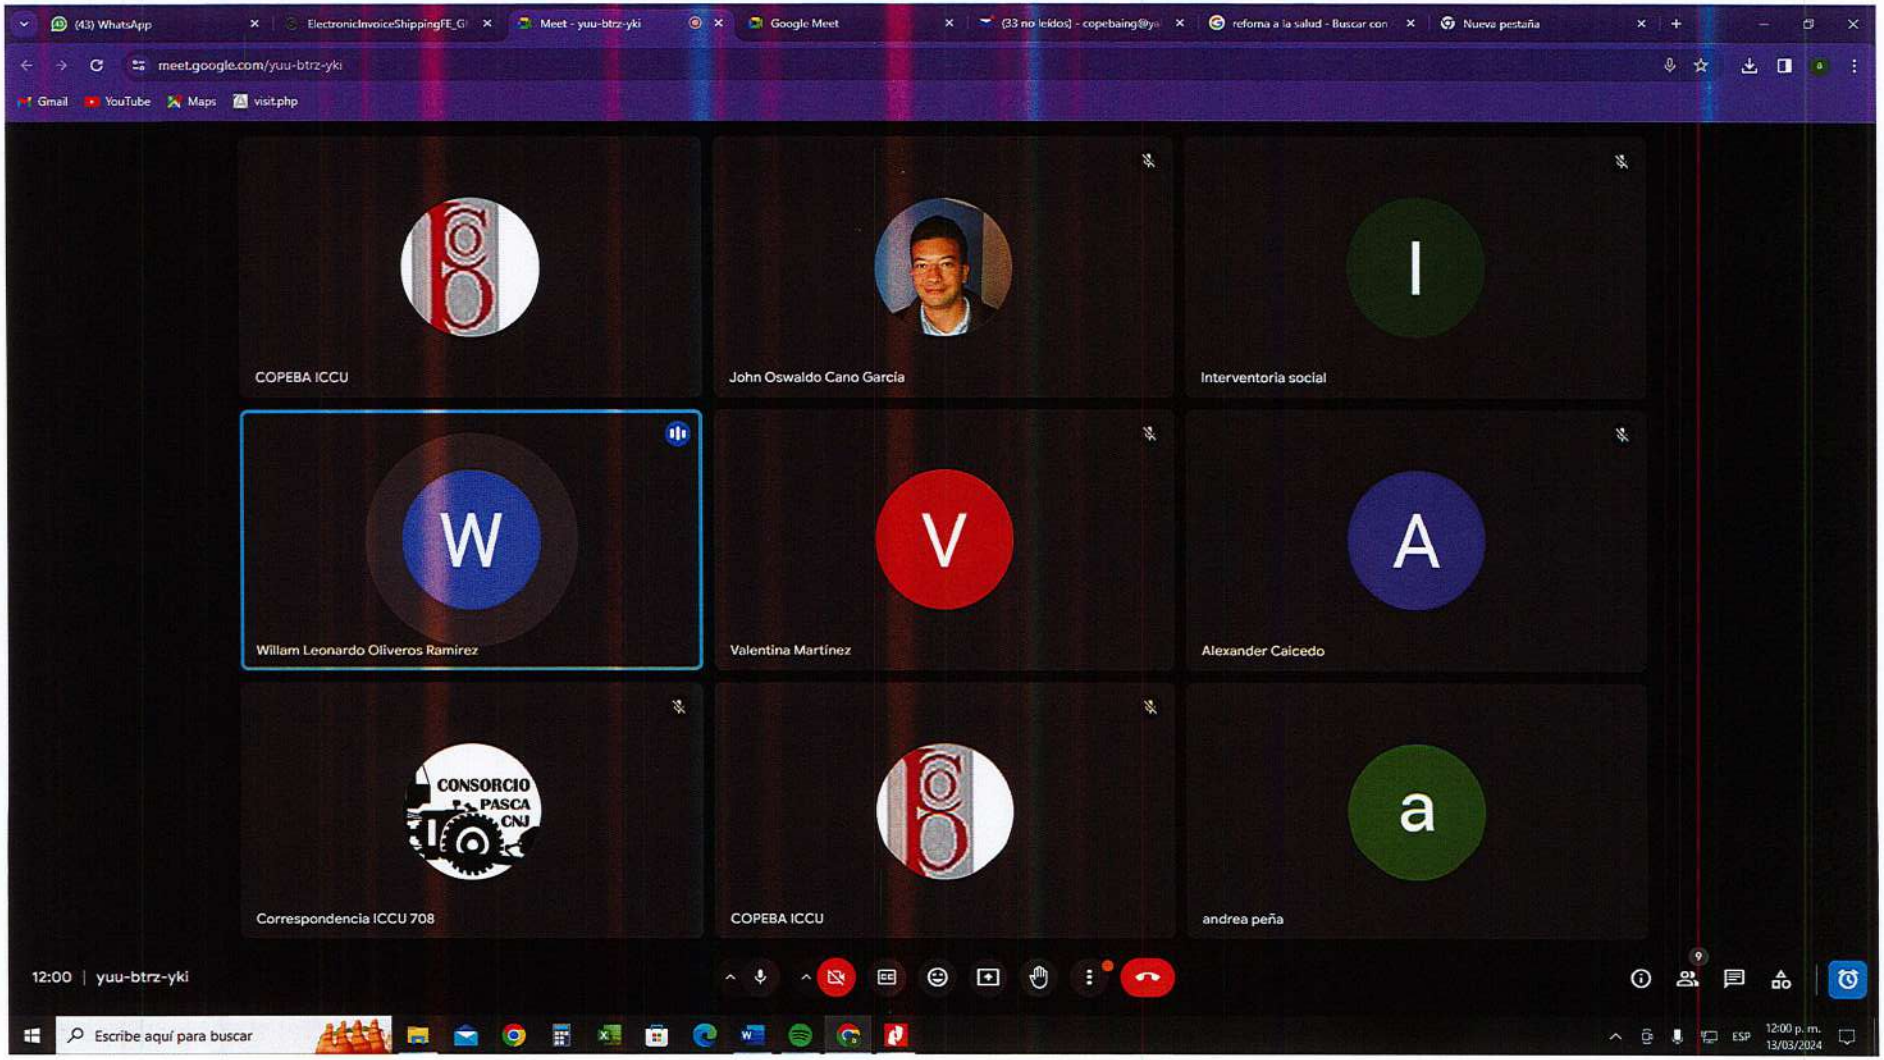
meet.google.com/yuu-btrz-yki
COPEBA ICCU
John Oswaldo Cano García
Interventoria social
W
Willam Leonardo Oliveros Ramírez
V
Valentina Martínez
A
Alexander Caicedo
CONSORCIO PASCA CNJ
Correspondencia ICCU 708
COPEBA ICCU
a
andrea peña
12:00 | yuu-btrz-yki
Escribe aquí para buscar
12:00 p. m.
13/03/2024

6.6.3.Actas de Reunión

En el presente periodo no se realizaron actas de reunión.

7. Conclusiones y recomendaciones

- ✓ El contratista requiere implementar más personal para abrir los frentes de obra faltantes, está interviniendo los frentes escalonadamente con el mismo personal; esto genera atrasos y una facturación a futuro por debajo del proyectada y consecuentemente atraso.

- ✓ Se requiere al contratista tanto verbalmente como por escrito para mejorar sistemas constructivos, pues a futuro se requerirá realizar intervención correctiva.

- ✓ Al contratista se le ha requerido en los comités de obra para presentar los NP que se requieren para finalizar el contrato y no los ha presentado, lo que puede estar generando retrasos.

- ✓ La ejecución para este periodo es de $ 1,395.219.641.31; contra una inversión programada de $ 1.619.437.634,32 en costo básico.

- ✓ Las actividades de demarcación o señalización fueron iniciadas.

- ✓ En obra se observa material de excavación en acopios temporales, los cuales no están siendo desocupados.

8. Anexos

8.1. Correspondencia

Se remite cuadro resumen de correspondencia generada durante el periodo comprendido entre el 01 al 22 de marzo de 2024. Toda la correspondencia aquí relacionada se ha radicado en físico en la oficina del ICCU.

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA AL ICCU - MARZO DE 2024			
CONSECUTIVO	**ASUNTO**	**FECHA**	**DIRIGIDO A**
ADM-ICCU-815-2023-134	RADICACIÓN INFORME MENSUAL No. 6 TÉCNICO DE OBRA	marzo 01 de 2024	ICCU
ADM-ICCU-815-2023-135	RADICACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°6 – PERIODO ENERO 01 AL 31 DE 2024.	marzo 01 de 2024	ICCU
ADM-ICCU-815-2023-136	RADICACIÓN CERTIFICACION BANCARIA PARA PAGO DE CESIÓN MES DE MARZO 2024 A CARGO DEL CONTRATISTA DE OBRA.	Marzo 01 de 2024	ICCU
ADM-ICCU-815-2023-137	RADICACIÓN CORRESPONDENCIA ENVIADA AL CONTRATISTA P-10	Marzo 04 de 2024	ICCU
ADM-ICCU-815-2023-138	RADICACIÓN INFORME SEMANAS 30 Y 31 DEL CONTRATO DE OBRA 708 DEL 2023.	Marzo 06 de 2024	ICCU
ADM-ICCU-815-2023-139	RADICACIÓN CORRESPONDENCIA ENVIADA AL CONTRATISTA P-11	Marzo 14 de 2024	ICCU
ADM-ICCU-815-2023-140	APROBACION SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA No 708 DE 2023	Marzo 14 de 2024	ICCU
ADM-ICCU-815-2023-141	SOLICITUD SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No 815 DE 2023	Marzo 14 de 2024	ICCU
ADM-ICCU-815-2023-142	CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 3 DEL CONTRATO DE OBRA 708 DE 2023.	Marzo 15 de 2024	ICCU
ADM-ICCU-815-2023-143	SOLICITUD DE PRORROGA No 3 CONTRATO DE INTERVENTORIÁ N°815 DE 2023	Marzo 15 de 2024	ICCU
ADM-ICCU-815-2023-144	RADICACIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7	Marzo 15 de 2024	ICCU
ADM-ICCU-815-2023-145	RADICACIÓN ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	Marzo 15 de 2024	ICCU
ADM-ICCU-815-2023-146	TRASLADO COMUNICACIÓN CNJ-ICCU708-O-0319 – INSTALACION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN PEAJE SAN MIGUEL	Marzo 21 de 2024	ICCU
ADM-ICCU-815-2023-147	REMISIÓN ACTAS DE SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	Marzo 22 de 2024	ICCU

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA AL CONTRATISTA - MARZO DE 2024			
CONSECUTIVO	**ASUNTO**	**FECHA**	**DIRIGIDO A**
CONT-ICCU-708-2023-144	TRASLADO COMUNIACION ICCU-815-2023–023-AM_ENTREGA PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA GAVIONES A CONSTRUIR EN TRAMO 3.	MARZO 01-2024	CONSORCIO PASCA CNJ
CONT-ICCU-708-2023-145	APREMIO ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA POR TRAMOS PENDIENTES DE TERMINAR.	MARZO 04-2024	CONSORCIO PASCA CNJ
CONT-ICCU-708-2023-146	REMISIÓN CONCEPTO REPARACIÓN BOX COULVERT – SITIO 5	MARZO 04-2024	CONSORCIO PASCA CNJ
CONT-ICCU-708-2023-147	SOLICITUD REUBICACION LINEA DE GAS SAN MIGUEL-SIBATE.	MARZO 06-2024	CONSORCIO PASCA CNJ
CONT-ICCU-708-2023-148	DEVOLUCIÓN ACTAS DE CIERRE DE VECINDAD FIRMADAS ESPACIO PÚBLICO AGUADITA	MARZO 07-2024	CONSORCIO PASCA CNJ
CONT-ICCU-708-2023-149	INCUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIÓN CUNETA SECTOR 4 ARTIICULADO	MARZO 07-2024	CONSORCIO PASCA CNJ
CONT-ICCU-708-2023-150	MATERIAL SIN ESPECIFICACION FILTROS GAVION TRAMO	MARZO 11-2024	CONSORCIO PASCA CNJ
CONT-ICCU-708-2023-151	OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL SST DE OBRA N°7 – PERIODO 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.	MARZO 13-2024	CONSORCIO PASCA CNJ
CONT-ICCU-708-2023-152	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO DE LA SUBSANACIÓN DEL INFORME MENSUAL SST N°7 - REQUERIDA MEDIANTE COMUNICACIÓN CONT-ICCU-708-2023-151 DEL 13 DE MARZO DE 2024	MARZO 19-2024	CONSORCIO PASCA CNJ
CONT-ICCU-708-2023-153	TRASLADO DE DOCUMENTO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DE ACUERDO A LA PRORROGA No. 3	MARZO 19-2024	CONSORCIO PASCA CNJ
CONT-ICCU-708-2023-154	REMISIÓN COMUNICACIÓN ICCU-815-2023–024-AM_APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL No.7	MARZO 22-2024	CONSORCIO PASCA CNJ

8.2. Registro fotográfico del avance de las obras.

Se anexa a continuación, registro fotográfico de las obras adelantadas en el periodo.

CONTRATO INTERVENTORIA ICCU-815 DEL 2023: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".

Registro Fotografico Antes y Después Febrero del 2024

No	ABSCISA	TRAMO 4 - TRAMO 7	
1		ANTES	DESPUES
	PR 10+080 AL PR 10+150		
2		ANTES	DESPUES
	PR 10+080 AL PR 10+150		
3		ANTES	DESPUES
	07+930		
1		ANTES	DESPUES
	PR 7+580		

CONTRATO INTERVENTORIA ICCU-815 DEL 2023: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".

Registro Fotografico Antes y Después febrero del 2024

No	ABSCISA	INSTALACION MDC PARA BACHEO	
		ANTES	DESPUES
1	Bacheo No 10 via Pasca-Fusa		
		ANTES	DESPUES
2	Bacheo No 11 via Pasca-Fusa		

CONTRATO INTERVENTORIA ICCU-815 DEL 2023: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".

Registro Fotografico Antes y Después Febrero del 2024

No	ABSCISA	INTERVENCION BOX PASCA-PASO MALO	
1		ANTES	DESPUES
			
2		ANTES	DESPUES
			
3		ANTES	DESPUES
			
		ANTES	DESPUES
4			

CONTRATO INTERVENTORIA ICCU-815 DEL 2023: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".

Registro Fotografico Antes y Después febrero del 2024

No	ABSCISA	ARTICULADO PASO MALO-PASCA	
		ANTES	DESPUES
1			
		ANTES	DESPUES
2			
		ANTES	DESPUES
3			
		ANTES	DESPUES
4			

CONTRATO INTERVENTORIA ICCU-815 DEL 2023: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".

Registro Fotografico Antes y Después Febrero del 2024

No	ABSCISA	Espacio Publico Aguadita - AguaBonita	
		ANTES	DESPUES
1	12+990		
		ANTES	DESPUES
2	12+969		
		ANTES	DESPUES
3	06+252		
		ANTES	DESPUES
4	06+042		

CONTRATO INTERVENTORIA ICCU-815 DEL 2023: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".

Registro Fotografico Antes y Después febrero del 2024

No	ABSCISA	TRAMO 5 -FILTRO-CUNETAS	
1		ANTES	DESPUES
			
2		ANTES	DESPUES
			
3		ANTES	DESPUES
			
4		ANTES	DESPUES
			

8.3. Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.

A continuación, se remite registro fotográfico de las actividades ejecutadas ambientales y sociales en el mes de septiembre. El contrato no contempla gestión predial.

Registro Fotográfico

Registro Fotográfico marzo de 2024





Foto 1 y 2. Colocación material granular





Foto 3 y 4. Manejo de concretos en obra.





Foto 5 y 6. Instalación de mezcla asfáltica.





Foto 7 y 8. Instalación concreto hidráulico.





Foto 9 y 10. Implementación PMT en frente de obra.





Foto 11 y 12. Reutilización de material de estructura.





Foto 13 y 14. Puntos ecológicos en obra y oficina.





Foto 15 y 16. Puntos recolección residuos ordinarios.





Foto 17 y 18. Almacenamiento de combustible y kit antiderrames.





Foto 18 y 19. Mantenimiento de baños.





Foto 20 y 21. Carro tanque en frente de obra y agua para consumo humano.

8.4. Bitácora del mes correspondiente

A continuación, se remite copia de las bitácoras de obra.

01-03-2024 Viernes

FRENTE DE OBRA No. 4


CLIMA: Seco

PERSONAL: Ing Residente (1), Topógrafo (1), Ayudantes de obra (3), Operador de maquinaria (1), Auxiliares de tráfico (2) ——

EQUIPOS: Excavadora sobreorugas SANY 75UC (1), Vibrocompactador de una tonelada (1) ——

ACTIVIDAD: El contratista al dar el carril izquierdo en uso por el tráfico se evidenció el fallo total del articulado, mediante la observación de hundimiento y adoquín desplazado. ——

A. Civil Bo.
Residente Tecnico
Consorcio pasca CNJ.



FRENTE DE OBRA No7


CLIMA: Seco

PERSONAL: Inspector de obra (1), Maestro de obra (1), Ayudantes de obra (5) —

EQUIPOS: Retrocargador CAT#426 (1) ——

ACTIVIDAD: El contratista continuó con la excavación, corte y figurado de acero y fundida de cuneta en concreto de 3000 PSI concreto acelerado del PRO7+992 al PRO8+050, costado izquierdo ——


A. Civil Bo.
Residente Tecnico
Consorcio pasca CNJ.



Powered by CamScanner


FRENTE DE OBRA PASCA (PASO MALO)
CLIMA: Seco
PERSONAL: Maestro de obra (1), Ayudantes de obra (2), Auxiliares de tráfico (2), Operador de maquinaria (1)
EQUIPO: Retrocargador CAT 428F (1), Vibrocompactador (1) ———
ACTIVIDAD: El contratista realizó instalación de acero de refuerzo e instalación de formaleta box para reparación. ———
Nota:

A. Civil Bs.
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ.




FRENTE DE OBRA M/TO PASCA-FUSA-BACHEO
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), Topógrafo (1), Ayudantes de obra (2), Auxiliares de tráfico (2), Operadores de maquinaria (4), Conductores de volqueta (2), Cuadrilla de asfalto (1). ———
EQUIPO: Fresadora CAT PM102 (1), Vibro Tándem CAT CC34B (1), Finisher CAT SE 34V (1), Volquetas (2), Estación topográfica (1) ———
ACTIVIDAD: El contratista continuó con el bacheo en sentido Pasca-Fusa y se fresó e instaló MDC-19 en segunda capa en el bacheo No. 8 y 9. Se fresó e instaló parcialmente MDC-19 en bacheo No. 10 ———

A Civil Bs
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ.



22-03-2024 Sábado FRENTE DE OBRA No. 4.
CLIMA: Seco
PERSONAL: Ing. Residente (1), Ayudantes de obra (6), Operador de maquinaria (1) Auxiliares de tráfico (2) ———
EQUIPOS: Minicargador CAT 363D3 (1) ———
ACTIVIDAD: El contratista realizó el levantamiento del adoquín por el sector fallado del carril izquierdo. ———

A. Civil Bs
Residente tecnico
Consorcio Pasca CNJ.



FRENTE DE OBRA No.7
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), Maestro de obra (1), Ayudantes de obra (5)
EQUIPO: Retrocargador CAT F426 (1)
ACTIVIDAD: El contratista realizó corte y figurado de refuerzo para berma-cuneta.

A. Civil Bs
Residente Técnico
Consorcio Pasca CNJ.

FRENTE DE OBRA M/TO PASCA - (PASO MALO)
CLIMA: Seco
PERSONAL: Maestro de obra (1), Ayudantes de obra (5), Auxiliares de tráfico (2), Operadores de maquinaria (2), Topógrafos (2), Conductor de carrotanque (1)
EQUIPO: Retrocargador CAT 428 F (1), Vibrocompactador (1), Minicargador NEW HOLLAND L218 (1), Carrotanque con agua de 3000 gl (1), Estación topográfica (1), Nivel de topografía (1)
ACTIVIDAD: El contratista realizó nivelación y cerco de la capa de fresado del PR08+135 al PR08+300. El contratista no está utilizando motoniveladora para cercar las capa de fresado en el articulado.

A. Civil Bs
Residente Técnico
Consorcio Pasca CNJ

03-03-2024 Domingo
FRENTE DE OBRA
El contratista no programó ejecución de actividades. Los equipos estuvieron en stand by.

A. Civil Bs
Residente Técnico
Consorcio Pasca CNJ.

04-03-2024 Lunes
Frente DE OBRA No.4
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), Ayudantes de obra (4), Auxiliares de tráfico (2)
EQUIPO: Minicargador (1) CAT 262 D3 (1)

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD: El contratista terminó de realizar el retiro del adoquín por el carril izquierdo que se encontraba fallado y el retiro del bordillo prefabricado, ~~tanto~~ por el costado izquierdo.

A. Civil Bs
Residente Tecnico
Consorcio pasca cnj.

FRENTE DE OBRA No. 7
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), Maestro de obra (1), Ayudantes de obra (5),
EQUIPOS: Herramienta menor.
ACTIVIDAD: El contratista realizó corte del hombro del pavimento del PR08+240 al PR08+290 por el costado izquierdo, de igual manera se realizó corte y figurado de refuerzo. El contratista se le ha indicado que en los tramos comprendidos entre el PR07+500 al PR07+780, costado izquierdo se requiere realizar mejoramiento del estrato de sustento de la cuneta, mediante la instalación de rajón y material de relleno. Se le indicó tener precaución en los trabajos de excavación por la presencia de la red de gas y la línea del acueducto del sector.
Nota: se atienden las observaciones.

A. Civil Bs
Residente Tecnico
Consorcio pasca cnj.

FRENTE DE OBRA PASCA (PASO MALO)
CLIMA Seco
PERSONAL: Ing. Residente (1), Inspector de obra (1), Maestro de obra (2), Oficial de obra (1), Ayudantes de obra (5), Auxiliares de tráfico (2), Operador de maquinaria (1), Topógrafos (2)
EQUIPOS: Retrocargador CAT 426F (1) Vibrocompactador DYNA PAC (1) Estación topográfica (1), Nivel topográfico (1)
ACTIVIDAD: El contratista realizó nivelación y cerco de la capa de fresado del PR08+135 al PR08+195, calzada completa. Se evidencia nuevamente la falta de motoniveladora para realizar el cereo. El contratista realizó las perforaciones para instalar el refuerzo en varillas de 3/4 pulg. perteneciente a traslapos o conectores entre la

estructura antigua y nueva a reparar. Inició la instalación de varillas de 1mts de longitud, de las cuales 25cms van anclados con el uso de epóxico al concreto antiguo del box culvert existente

A. Civil Bs
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ.

FRENTE DE OBRA M/TO PASCA-FUSA-BACHEO
CLIMA: Seco
PERSONAL: Topógrafo(1), Inspector de obra(1), Ayudantes de obra(1), Auxiliares de tráfico(2) (los mismos ~~del~~ únicos del tramo), Operadores de maquinaria(4), Conductor de volqueta MDC(2), Cuadrilla de asfalto(1) ——
EQUIPOS: Fresadora CAT PM102(1) Vibro Tándem CAT CC34B(1), Finisher CAT SE34V(1), Volquetas(2), Estación de topografía(1) ——
ACTIVIDAD: El contratista continuó con el bacheo en sentido Pasca-Fusa y se fresó e instaló MDC-19 en el bacheo No. 10 y 11.

A. Civil Bs
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ.

05-03-2024. Monto

FRENTE DE OBRA No 04.
CLIMA: SECO
PERSONAL: Ing. Residente(1), Inspector de obra(1), Ayudantes de obra(4), Operador(2), Auxiliar de trafico(2). ——
EQUIPOS: Minicargador CAT 248(1), Excavadora SY75C SANY(1). ——
ACTIVIDAD: El contratista realizó la rectificación de la pendiente longitudinal en la capa de subbase y se realizó la adición de material de reemplazo, se ranuló el bordillo prefabricado por el cami izquierdo. Se requiere que el contratista corrija los procedimientos constructivos para evitar el fallo nuevamente del adoquín.

A. Civil Bs
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ

Powered by CamScanner

FRENTE DE OBRA No 07
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra(1), Maestro de obra (1), Ayudante de obra (5). ———
EQUIPO: Herramienta menor; Retrocargueador JHOU DEERE
ACTIVIDAD: Se realizó fundida de rezales de cuneta entre el pr 08+240 al pr 08+285 costado izquierdo, incluye la preinstalacion de la parrilla de refuerzo, se realizó la topografia por parte de la Interventoria de los tramos de rezales faltantes para determinar volumenes y secciones transversales para determinar si hay necesidad de relleno o no. ———

A. Civil Bo
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ

FRENTE DE OBRA PASCA — PASO MALO
CLIMA: Seco
PERSONAL: Ing. Residente (1), Maestro de obra (2), Oficial de obra (1), Ayudante de obra (4), Auxiliares de tráfico (2), Operador maquinaria (3), Topografo (2), Cadenero (1) ———
EQUIPO: Retrocargueador CAT 426 F(1); Motoniveladora CAT 120 K(1), Vibrocompactador DYNAPAC (1), Minicargueador NEW HOLLAND L218(1), Planta y herramienta menor. ———
ACTIVIDAD: El contratista realizo la instalacion de los anclajes en varilla de 3/4" con epóxico (34 lado izquierdo y 29 lado derecho de 1 mt de longitud) instalo el refuerzo longitudinal y transversal rectificando el refuerzo expuesto e instalando refuerzo nuevo en el sector a recuperar del box fallado. El contratista realizo el cerco mediante la instalacion de tacos de topografia del fraguado instalado del pr 08+225 al pr 08+300 y se dejo en la cota de diseño.
Nota: la separacion del Box culvert se realiza de acuerdo a especificaciones tecnicas presentadas por el especialista.

A. Civil Bo
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ

06-03-2024 Miercoles

FRENTE DE OBRA N 08 (SAN MIGUEL)
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), Residente de obra (1), Ayudante de obra (5).
EQUIPO: Herramienta menor.
ACTIVIDAD: El contratista continuo con la construcción de las canastas fundidas en sitio en concreto de 3000 psi con doble parrilla de refuerzo debido al espesor de la losa de canasta (0.20mt) del pr 08+285 al pr 08+298 costado izquierdo en el sentido Sibuto - Paya San Miguel.

Residente Tecnico
Consorcio Paya ENJ.

FRENTE DE OBRA No 4
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), Ayudante de obra (5), Auxiliares de trafico (2), Operador (1).
EQUIPO: Vibrocompactador CAT 1 Ton. (1), Herramienta menor.
ACTIVIDAD: El contratista realizo el acondicionamiento del suelo para realizar posteriormente la fundicion de la canasta por el canal izquierdo, durante la compactacion del material de relleno y de soporte de la canasta, se evidencio hundimiento y cuarteo del suelo, lo que supone que se debe realizar un mejoramiento del tramo fallado del suelo de fundacion, con el fin de garantizar el soporte de la canasta a construir.

Residente Tecnico
Consorcio Paya ENJ.

Powered by CamScanner

FRENTE DE OBRA N° 5.
CLIMA: Seco.
PERSONAL: Inspector de obra (1), Ayudantes de obra (6) Operador maquinaria (2) ———
EQUIPO: Minicargador CAT 238 F (1), Excavadora S4 75 C SANY (1) ———
ACTIVIDAD: El contratista inicio la construccion del filtro de expulsion del gavion con material filtrante envuelto o cubierto por geotextil no tejido y la instalacion de la manguera perforada en la base del gavion, de igual forma inicio la construccion del filtro de pata del gavion por el lado frontal paralelo a la via, se debe observar que el material filtrante no esta lavado y presenta visualmente adherencia de finos.

Ing Civil
Residente Tecnico
Consorcio pasca ONJ

INTERVENTORIA

FRENTE DE OBRA PASCA (PASO MALO)
CLIMA: Seco
PERSONAL: Ing Residente (1) Maestro de obra (1) oficial de obra (1), Ayudantes de obra (5), Auxiliar de trafico (2), Topografo (2), Operador maquinaria (2). ———
EQUIPO: Motoniveladora CAT 120 F (1), Minicargador NEW HOLLAND L 218 (1) Vibrocompactador DYNAPAC (1) compresor (1), Estacion topografica (1), Nivel Topografico (1)
ACTIVIDAD: El contratista continuo con el cargo de la capa de fondo del pr 08+140 al pr 08+175, se dejo el material en la cota de diseño. Se realizo la instalacion del refuerzo total del area de reposicion en el box culvert, tanto en el piso como en los muros laterales.

Ing Civil
Residente Tecnico
Consorcio pasca ONJ

INTERVENTORIA

07-03-2024 / JUEVES. FRENTE DE OBRA No 03.

CLIMA: Seco

PERSONAL: Inspector de obra (1), Topografo (1), Ayudantes de obra (2), Auxiliares de trafico (2), Operador de maquina (1), Conductor volqueta (2).

EQUIPO: Retrocargador John deere 310 SG (1), Volquetas 14 M³ (2). ~~Estacion topografica (1).~~

ACTIVIDAD: El contratista apuntalado con la Interventoria realizaron el replanteo de los box culvert e inicio con la excavacion mecanica del canal del pr 07+962 al pr 07+982 costado izquierdo.

Ing. Civil
Residente Tecnico
Consorcio pasca cnj.

FRENTE DE OBRA No 04.

CLIMA: Seco

PERSONAL: Inspector de obra (1), Maestro de obra (2), Ayudantes de obra (9), Auxiliares de trafico (2), Operador maquinaria (1).

EQUIPO: Retrocargador CAT 262 D (1), Vibrocompactador 1 Ton CAT (1).

ACTIVIDAD: El contratista realizo la fundida de la cuneta de 3000 PSI del pr 10+080 al pr 10+130 costado izquierdo, y realizo la instalacion del refuerzo para la estructura del cordon de la alcantarilla pr 09+890

NOTA: El contratista en la fundida de las cunetas no mejoro el alineamiento de la cuneta y siguio como linea de la cuneta el perfil del terreno, generando una cuneta sin simetria longitudinal.

Ing. Civil
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ.

Powered by CamScanner

FRENTE DE OBRA No 05.
CLIMA: SECO
PERSONAL: Inspector de obra (1), Ayudantes de obra (6), Operador maquinaria (2).
EQUIPO: Minicargador CAT 262 D (1) el mismo de turno 4, Excavadora sobre orugas SY 75 C SANY (1).
ACTIVIDAD: El contratista continuo con la construccion del filtro de espaldar del gavion de acuerdo al diseño, pero con la solicitud que ha generado excavacion adicional del terreno natural sin aprobacion de la Interventoria, y se continua con la construccion del filtro frontal, se ha realizado por parte de la Interventoria las observaciones en campo sobre la falta de lavado del material granular del filtro.

Nota: las excavaciones adicionales se deben a desprendimiento del terreno natural, dificultando la instalacion del filtro.

A. Civil
Residente Tecnico

FRENTE DE OBRA No 07.
CLIMA: SECO
PERSONAL: Inspector de obra (1), Maestro de obra (1), Ayudantes de obra (5), Operador maquinaria (1), Conductor de volqueta (1).
EQUIPO: Retrocargador CAT 426 F (1), Volqueta (1).
ACTIVIDAD: Se realizo la fundida de la cuneta en sitio en concreto de 3000 PSI del PR 08+091 al PR 08+130 costado derecho y se continuo con la excavacion mecanica del PR 07+600 al PR 07+720 costado izquierdo para la posterior fundida de la cuneta; se esta instalando refuerzo en doble parrilla.

A. Civil
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ

FRENTE DE OBRA PASCA (PASO MALO)
CLIMA: Seco
PERSONAL: Ing Residente (1), Maestro de obra (1), Oficial de obra (1), Ayudante de obra (5), Auxiliar de tráfico (2), Operador maquinaria (2), Topografo (1), Conductor (1).
EQUIPO: Motoniveladora CAT 120 K (1), Minicargador NEW HOLLAND L218 (1), Vibrocompactador DYNAPAC (1), Estación topografica (1), Nivel topografico (1).
ACTIVIDAD: El contratista inicio la colocación de la subbase granular esparcida en dos capas debidamente humectadas y compactadas del pr 08+250 al pr 08+295 capa completa y del pr 08+230 al pr 08+250 en la primera capa. Se realizo la fundida de la losa de piso reforzada desde el encole hasta la linea de salida de la reparacion del box con malla electrosoldada instalada como refuerzo y la fundida de la losa y el cunetas en 0.3 mt de los muros laterales del area del box a reparar. Se utilizó los aditivos solicitados e incluidos en el diseño por los especialistas estructurales en la dosificacion correspondiente.

A. Civil Bs
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ

28-03-2024 FRENTE DE OBRA No. 3
CLIMA: Seco
PERSONAL: Topógrafo (1), Ayudante de obra (1), Auxiliares de tráfico (2), Operador de maquinaria (1), Conductores de volqueta (2)
EQUIPOS: Retrocargador JHON DEER J310 (1), Volquetas (2), Estación de topografía (1)
ACTIVIDAD: El contratista inició con la excavación del gavión ubicado entre el PR07+986 al PR08+006, costado izquierdo. El material de excavación se está transportando al acopio temporal, ubicado en la Aguadita.

A Civil Bs
Residente tecnico
Consorcio Pasca CNJ

Powered by CamScanner

FRENTE DE OBRA No. 4.

CLIMA: Seco

PERSONAL: Inspector de obra (1), Maestro de obra (1), Operador de maquinaria (1), Ayudantes de obra (6), Auxiliares de trafico (2).

EQUIPOS: Minicargador CAT 262D (1), Herramienta menor.

ACTIVIDAD: El contratista realizó la formaleteada y fundida en concreto de 3000 de la estructura del encole de la alcantarilla ubicada en el PR09+890. Se realizó alistado y mejoramiento del suelo de fundación para la cuneta del PR10+130 al PR10+145, costado izquierdo.

A. Civil Bs
Residente Tecnico
Consorcio pasca ENJ.

INTERVENTORIA

FRENTE DE OBRA No. 5.

CLIMA: Seco

PERSONAL: Inspector de obra (1-el mismo de tramo 4), Operador de maquinaria (1) Ayudantes de obra (4).

EQUIPOS: Excavadora S475C SANY (1).

ACTIVIDAD: El contratista continúa con la construcción del filtro de espalda del gavión. Para la construcción de este filtro se presentó un diseño, el cual se debe consultar con la interventoría para aterrizar la construcción del mismo, pues se observa una sobreexcavación que no fue autorizada por la Interventoría, de igual forma, el material filtrante se evidencia (existe registro fotográfico) que no está limpio, se observa con presencia de limo contraviniendo la especificación ~~###~~ INV-663-07.

Nota: las excavaciones adicionales se deben a desprendimientos del terreno natural, dificultando la realización del filtro.

A. Civil Bs
Residente Tecnico

INTERVENTORIA

FRENTE DE OBRA No. 7

CLIMA: Seco

PERSONAL: Inspector de obra (1), Ayudantes de obra (5), Maestro de obra (1) Operador de maquinaria (1), Conductor de volqueta (1).

EQUIPOS: Retrocargador CAT 426F (1), Volqueta (1).

ACTIVIDAD: El contratista realizó excavación mecánica y mejoramiento del suelo de fundación de la cuneta del PR07+500 al PR07+720.

A. Civil Bs
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ

FRENTE DE OBRA PASCA (PASO MALO)

CLIMA: Seco

PERSONAL: Ing. Residente (1), Inspector de obra (1), Maestro de obra (1), Topógrafo (1), Cadenero (1), Ayudantes de obra (4), Auxiliares de tráfico (2) Operadores de maquinaria (2)

EQUIPOS: Minicargador NEW HOLLAND L218 (1), Motoniveladora CAT 120K (1) Vibrocompactador DYNA PAC (1), Mezcladora de tres bultos (1), Estación topografica (1), Nivel de topografía (1).

ACTIVIDAD: El contratista continuó con la instalación de la subbase granular entre el PROB+140 al PROB+175 y del PROB+245 al PROB+295, con el fin de cumplir con las cotas de diseño para subbase. Se realizó la instalación del refuerzo y formaleteo de la losa de piso y muros laterales del box a reparar, se logró fundir la losa de renivelación desde el encole hasta la entrada del sector a reparar y de la losa de piso y arranque de los muros (Esta actividad se realizó el día anterior). Se realizó la instalación y formaleta de los muros laterales y losa superior del box a reparar. 7

A. Civil Bs
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ

DEMARCACION VIAL:

CLIMA: Seco

PERSONAL: Personal subcontratado para demarcación vial.

EQUIPOS: Equipos de pintura para demarcación vial.

ACTIVIDAD: El contratista realizó la demarcación de las líneas laterales de los sectores donde se realizó bacheo entre Aguadita y Tesagasugá.

A. Civil Bs.
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ

Powered by CamScanner

07-08-2021
Sabado

FRENTE DE OBRA N. 03.
CLIMA: SECO
PERSONAL: Inspector de obra (1), Topografo (1), Ayudante de obra (2), Auxiliar de trafico (2), Operador maquinaria (1), Conductor volqueta (2).
EQUIPO: Retroexcavadora John Deere 410 J (1), Volqueta TATA (2), Estacion topografica (1).
ACTIVIDAD: El contratista continuo con la excavacion para la construccion del aguion entre el pr 07+986 a pr 08+006 costado izquierdo, el material proveniente de la excavacion se esta transportando hasta un acopio temporal en la Aguadita; se observa que se retiro que se removio el talud superior donde estaba ubicado el aguion se dejo nuevamente sobre el area excavada

Ing. Civil Bo
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CVJ

RESIDENTE INTERVENTORIA

FRENTE DE OBRA N. 04
CLIMA: SECO
PERSONAL: Inspector de obra (1), Ayudante de obra (1).
EQUIPO: Herramienta menor.
ACTIVIDAD: El contratista realizo limpieza en el area de la alcantarilla especificamente en el area del cabezal

Ing. Civil Bo
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CVJ

RESIDENTE INTERVENTORIA

FRENTE DE OBRA N. 05
CLIMA: SECO
PERSONAL: Inspector de obra (1), Maestro de obra (1), Ayudante de obra (4), Operador maquinaria (2), Auxiliar

de trafico (2), Conductor retroexcavadora (1). ———
EQUIPO: Excavadora SY 75C (1), Minicargador CAT 262 D (1), Herramienta menor. ———
ACTIVIDAD: El contratista continua construyendo el filtro en la espalda del gavión, se evidencia por parte de la Interventoria que el material granular filtrante esta siendo instalado sin lavar, se observa limo adherido al granular, y el material de relleno sobre el filtro frontal pareciera a la vista, es un material incadecuado porque presenta gran porcentaje de roca de gran tamaño, este material debe ser un material sin presencia de roca, debido al riesgo de romper el geotextil. ———

RESIDENTE INTERVENTORIA

FRENTE DE OBRA No 07.
CLIMA: SECO.
PERSONAL: Inspector de obra (1) Ayudante de obra (3).
EQUIPO: Vibrocompactador manual tipo rana (1). ———
ACTIVIDAD: El contratista realizo el mejoramiento del suelo de fundacion mediante la instalacion de recebo o material de relleno, para la cuneta del pr 07+500 al pr 07+600 costado izquierdo la empresa de gas aprovecho reinstalo la linea del gas. ———

A. Cuellar
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ

RESIDENTE INTERVENTORIA

FRENTE DE OBRA PASTA (PASO MALO)
CLIMA: SECO.
PERSONAL: Ing. Residente (1), Inspector de obra (1), Maestro de obra (2), Ayudante de obra (7), Operador maquina (2)

Powered by CamScanner

Auxiliar de topografo (2), Topografo (1) ——
EQUIPO: Motoniveladora CAT 120 K (1), Minicargador NEW HOLLAND L 218 (1), Vibrocompactador DYNAPAC (1), Mezcladora de 3 bultos (1), Cisternas de Agua (1)
ACTIVIDAD: El contratista realizó la fundida de los muros laterales y la losa superior del box ubicado en la seccion de reposicion. El contratista continuo instalado subbases para alcanzar la cota de diseño e inicio la instalacion del sardinel o bordillo prefabricado de la abscisa 00+250 al pr 00+280 costado izquierdo. ——

A. Civil Bs
Residente Tecnico
Consorcio Pasca ENJ.

RESIDENTE TECNICO

10-03-2024 Domingo

FRENTE DE OBRA No. 3
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), Ayudantes de obra (3), Operador de obra (1)
EQUIPOS: Herramienta menor. Retrocargador JHON DEER 410 J (1) ——
ACTIVIDAD: El contratista realizo entibado del talud superior, debido al deslizamiento de la masa del suelo. ——

A. Civil Bs
Residente Tecnico
Consorcio Pasca ENJ.

RESIDENTE TECNICO

FRENTE DE OBRA No. 5.
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), (el mismo de tramo 3), Ayudantes de obra (3)
EQUIPOS: Herramienta menor. ——
ACTIVIDAD: El contratista realizó ~~llenado~~ cosido de filtros ——

A. Civil Bs
Residente Tecnico
Consorcio Pasca ENJ.

RESIDENTE TECNICO

Powered by CamScanner

FRENTE DE OBRA PASCA (PASO MALO)
CLIMA: Seco
PERSONAL: Maestro de obra (1), Ayudantes de obra (3)
EQUIPOS: Herramienta menor.
ACTIVIDAD: El contratista realizó excavación e instalación de sardinel del PR08+265 al PR08+295, costado izquierdo.

A. Cuil B.
Residente Técnico
Consorcio Pasca CNJ.

RESIDENTE INTERVENTOR

11-03-2024 Lunes.

FRENTE DE OBRA No. 3
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), Topógrafo (1), Maestros gavioneros (2), Ayudantes de obra (2), Operador de maquinaria (1).
EQUIPO: Retrocargador JHON DEER 410S (1), Nivel de topografía (1)
ACTIVIDAD El contratista inició con la construcción del gavión realizando con anterioridad el mejoramiento del suelo (instaló fresado) para poder iniciar con la primera malla de los gaviones

A. Cuil B.
Residente Técnico
Consorcio Pasca CNJ.

RESIDENTE INTERVENTOR

FRENTE DE OBRA No. 4
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), Maestro de obra (1), Ayudantes de obra (4), Auxiliares de tráfico (2), Operador de maquinaria (1).
EQUIPOS: Minicargador CAT 262D (1), Excavadora S475C SANY (1)
ACTIVIDAD El contratista realizó la fundida de la cuneta por el costado izquierdo del PR10+110 al PR10+130 y realizó instalación de subbase granular de renivelación del PR10+080 al PR10+110 por el carril izquierdo.


A. Cuil B.
Residente Técnico
Consorcio Pasca CNJ.

RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner


FRENTE DE OBRA No. 5.
CLIMA: Seco
PERSONAL: Ayudantes de obra (2)
EQUIPO Herramienta menor
ACTIVIDAD: El contratista continuó con el cosido y construcción del filtro, tipo francés, por el espaldar del gavión. Este filtro presenta unas extradimensiones para el flujo de agua a recoger. La interventoría no ha autorizado tales dimensiones.

A. Civil Bo
Residente tecnico
Consorcio posca cnv




FRENTE DE OBRA No. 7
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra(1), Maestro de obra(1), Ayudantes de obra(4). Operador de maquinaria (1)
EQUIPOS: Mixer (1), Retrocargador (1)
ACTIVIDAD: El contratista realizó fundida de cunetas en concreto de 3000 PSI del PR07+500 al PR07+545, costado izquierdo. Preliminar a la fundida se realizó mejoramiento del suelo con adición de material. La Empresa Vave gas S.A. E.S.P. tiene dispuesto personal para la reubicación de la línea de gas en este sector.

A. Civil Bo
Consorcio posca cnv
CNV Residente tecnico



FRENTE DE OBRA PASCAL (PASO NASLO)
CLIMA: Seco
PERSONAL: Maestro de obra(1), Ayudantes de obra (3), Operador de maquinaria(1)
EQUIPO: Herramienta menor. Minicargador NEW HOLLAND L218(1)
ACTIVIDAD: El contratista continuó con la instalación del bordillo por el lado izquierdo.

A. Civil Bo
Consorcio posca cnv.
Residente tecnico



12-03-2024
Martes

FRENTE DE OBRA No.3
CLIMA: Seco
PERSONAL: Maestros gavioneros (2), Ayudantes de obra (3), Inspector de obra (1), Operador de maquinaria (1), Conductor de volqueta (1).
EQUIPOS: Retrocargador JHON DEER 410J (1), Volqueta (1)
ACTIVIDAD: El contratista continuó la construcción del gavión del PR07+962 al PR07+982, costado izquierdo. A la fecha de hoy van construidas diez (10) mallas de 2X1,20X1,10 mts que corresponde a 26,04 mts3.

A. Civil Bo
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ.

RESIDENTE INTERVENTORIA

FRENTE DE OBRA No.5
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), Oficial de obra (1), Operadores de maquinaria (2), Ayudantes de obra (4) Auxiliares de tráfico (2) Conductor de volqueta (1)
EQUIPOS: Excavadora sobreorugas 547C SANY (1), Minicargador CAT 262D (1), Volqueta (1).
ACTIVIDAD: El contratista continuó con la construcción del extrafiltro a espaldas del gavión. Este filtro, el contratista lo entregó perpendicularmente al caño existente, quedando a una longitud con respecto a la vía de 10mts. y 4mts. aguas arriba de la obra de drenaje existente, lo que quiere decir, que este filtro está dentro del predio de la DIAN. El contratista realizó limpieza y perfilada del talud por detrás de la cuneta del PR10+460 al PR10+500.

A. Civil Bo
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ.


RESIDENTE INTERVENTORIA

FRENTE DE OBRA No.7
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), Maestro de obra (1) Ayudante de obra (4), Operador de maquindria (1).

Powered by CamScanner


EQUIPOS: Mixer (1), Retrocargador (1)
ACTIVIDAD: El contratista continuó con el mejoramiento del suelo de fundación de las cunetas del PR07+600 al PR07+630 con un espesor aproximado de 20cm. y realizó la fundida de la cuneta reforzada en concreto de 3000 PSI del PR07+545 al PR07+591, costado izquierdo de la vía

A. Civil Bs.
Residente Tecnico
Consorcio Pasca ENV



FRENTE DE OBRA PASCA (PASO MALO).
CLIMA: SECO
PERSONAL: Oficial de obra (1), Ayudante de obra (8), Auxiliar de tráfico (2), Operador maquinaria (1), Topografo (1)
EQUIPO: Minicargador NEW HOLAND L218 (1), Vibro compactador DYNAPAC (1), Cargue (1), Estacion topografica (1).-
ACTIVIDAD: El contratista realizó el llano por encima del box cultvert reposado en material de frasado y material seleccionado y lo compacto por capas con cargue. Continuo con la instalacion de sardinel prefabricado A-10 por el costado derecho de la via del pr 08+140 al pr 08+160 y del pr 08+250 al pr 08+290.

A. Civil Bs
Residente Tecnico
Consorcio Pasca ENV




13-03-2024
Miercoles

FRENTE DE OBRA No 03
CLIMA: SECO
PERSONAL: Inspector de obra (1), Maestro aguacero (2), Ayudante de obra (4), Operador Maquinaria (1), Auxiliar de tráfico (2).-
EQUIPO: Retrocargador JOHN DEERE 410J (1).
ACTIVIDAD: El contratista continuo con la construccion del aguacero No 01, y realizó el armado de 4 Mallas para aguacero correspondiente a 10.56 M3.


FRENTE DE OBRA No 04.
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), Topografo (1), Ayudante de obra (1), Registro de obra (1), Auxiliar de trafico (2), Operador maquinaria (1), Conductor volqueta (1).
EQUIPO. Excavadora CAT 262 D (1), Vibrocompactador 1 Ton. (1) CAT, Volqueta (1).
ACTIVIDAD: El contratista realizo cargo del carril derecho e izquierdo del tramo del articulado y la topografia de la Interventoria lo reviso encontrado que el carril derecho cumple con las cotas de diseño en la subbase y el bordillo para el carril izquierdo el bordillo se encuentra 0.04 mts por encima de la rasante de diseño., de igual forma y debido a la presencia de fallas en la estructura de soporte por incuatria propia y sin consultar o informar a la Interventoria inicio la construccion de un filtro tipo francés transversal a la via.

A. Cuil B.
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ



FRENTE DE OBRA No 05.
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), Operador maquinaria (3), Ayudante maquinaria (3), Conductor volqueta (1).
EQUIPO: Excavadora SY 75C SANY (1), Volqueta (1).
ACTIVIDAD: El contratista continua con la construccion del filtro de espalda del muro (extra dimensionado), con la entrega a 10 mt hacia dentro del predio.

A. Cuil B.
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ



Powered by CamScanner

FRENTE DE OBRA No 07.
CLIMA: SECO
PERSONAL: Inspector de obra (1), Maestro de obra (1), Operador maquinaria (1), Ayudante de obra (4), Conductor volqueta (1).
EQUIPO: Retrocargador CAT 426 F (1), Volqueta (1), Cuna (1).
ACTIVIDAD: El contratista realizó la excavación mecánica para la construcción de la cuneta por el costado izquierdo del pr 07+720 al pr 07+760; realizó la demolición y retiro de cuneta existente del pr 08+060 al pr 08+112 por el costado izquierdo (ancho 1.70 y espesor 0,15 mt), y realizó la excavación del pr 08+057 al pr 08+067 por el costado derecho

A. Civil Bo
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ

RESIDENTE INTERVENTORIA

FRENTE DE OBRA No PASCA (PASO MALO)
CLIMA: SECO
PERSONAL: Operador maquinaria (2), Oficial obra (1), Ayudante de obra (8), Auxiliar de trafico (2), Topografo (1)
EQUIPO: Minicargador New Holland L218 (1), Motoniveladora CAT K 120 (1), Vibrocompactador Dynapac (1), Estacion de topografia (1)
ACTIVIDAD: El contratista continuo con la instalacion del sardinel prefabricado A-10.

A. Civil Bo
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ

RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

14-03-2024. Jueves

FRENTE DE OBRA No 03.

CLIMA: Seco

PERSONAL: Inspector de obra (1), Maestro de obra (2), Ayudantes (4). ———

EQUIPO: Herramienta menor.

ACTIVIDAD: El contratista continua con la construcción del cunetón No 01 del pr 09+862 al pr 09+882, teniendo a la fecha 17 mallas llenas.

A. Civil
Residente técnico
Consorcio Pasca CNV

RESIDENTE INTERVENTORIA

FRENTE DE OBRA No 04

CLIMA. Seco

PERSONAL: Inspector de obra (1), El mismo de turno 3, Oficial de obra (1), Operador maquinaria (1). Ayudante de obra (1). ———

EQUIPO: Excavadora 84 75C SANY (1). ———

ACTIVIDAD: El contratista continua construyendo el filtro tipo francés transversalmente a la vía, se ha desarrollado la presencia de agua en la excavación realizada (hay el registro fotográfico). El día de hoy se observa dotado al tráfico el hundimiento del sardinel fue profundizado por el costado izquierdo y como consecuencia la cuneta fundida está en una cota o nivel por encima del bordillo o sardinel (hay registro fotográfico).


A. Civil
Residente técnico
Consorcio Pasca CNV

RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner


FRENTE DE OBRA No 05.
CLIMA: Seco
PERSONAL: Ayudante de obra (2), Operador maquinaria (1).
EQUIPO: Minicargador CAT 262 D (1), Conguo (1), Cotadora de asfalto (1).
ACTIVIDAD: El contratista realizo el corte del hombro del pavimento para definir el remate de la cuneta a construir y la compactacion y conformacion del material de fundacion de la cuneta frente al guarda. La Interventoria realizo el levantamiento del filtro de espaldon del guarda para determinar a que distancia (10 mts) se encuentra hacia adentro del predio

A. Civil Bo
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNV



FRENTE DE OBRA No 07.
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), Maestro de obra (1), Ayudante de obra (4).
EQUIPO: Mixer (1), Cuna vibro manual (1).
ACTIVIDAD: El contratista continuo en la fundacion en sitio de la cuneta en concreto de 3000 PSI del pr 07+591 al pr 07+634 costado izquierdo y realizo la instalacion de material para el mejoramiento del suelo de fundacion de la cuneta del pr 07+591 al pr 07+634.
El espesor del mejoramiento es de 0.06 mt (Hay registro)


A. Civil Bo
Residente tecnico Co
Consorcio Pasca CNV.



FRENTE DE OBRA PASCA (PASO MALO).
CLIMA: Lluvias de 10:00 a 10:30 am.
PERSONAL: Inspector de obra (1), Topografo (1), Maestro de obra (1), Ayudante de obra (9), Auxiliar de trafico (2), Operador maquinaria (2).


ACTIVIDAD: El contratista realizó el corte definitivo con motoniveladora del pr 08+250 al pr 08+295 y del pr 08+138 al pr 08+250, de la subbase, continuo con la instalacion del sardinel prefabricado A-10 por el costado izquierdo.

A. Civil
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ




DEMARCACION VIAL
PERSONAL: Subcontratista
EQUIPO: Como delineador
ACTIVIDAD: Se ha realizado la demarcacion horizontal con las franjas laterales y central (amarilla) de los bachos realizados entre Aguadita y Fusagasuga, Tramo del espacio publico en Aguadita completo y el tramo 6 los.

A. Civil
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ



15-03-2024 FRENTE DE OBRA No 03.
Viernes. CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), Maestro cauchero (2), Ayudante de obra (3), Auxiliar de trafico (2), Operador Maquinaria (1).
EQUIPO: Retrocargador CAT 426 F (1)
ACTIVIDAD: El contratista continuo con la construccion del cajon del pr 08+962 al pr 08+982 mediante el armado y llenado y amarre de cajon (malla) a la fecha llevan 25 mallas q' corresponden a 66 M3.


A. Civil
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ



Powered by CamScanner


FRENTE DE OBRA No 04
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), el mismo de turno 5, Oficial de obra (1), Ayudante de obra (2), Auxiliar de trafico (2).
EQUIPO: Herramienta menor.
ACTIVIDAD: El contratista ejecuta actividades que no han sido consultadas a la Interventoría como el filtro transversal del articulado, hoy realizo la reinstalacion del sardinel prefabricado A-10 por el sector que atraviesa el filtro construido.

A. Civil
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ.



FRENTE DE OBRA No 05.
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1) el mismo de turno 4, Operador maquinaria (1), Ayudante de obra (3).
EQUIPO: Minicargador CAT 262 D(1), Herramienta menor.
ACTIVIDAD: El contratista continua colocando material filtrante contaminado (la totalidad del filtro) en la espalda del gavion construido, aumentando el tamaño del filtro a una dimension innecesaria. y no consultada con la Interventoria.

A. Civil
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ




FRENTE DE OBRA No 07
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), Maestro de obra (1), Ayudante de obra (4)
EQUIPO: Vibrocompactador manual tipo rana (1)
ACTIVIDAD: El contratista continua realizando el mejoramiento del suelo de fundacion con adicion de material en espesores

Powered by CamScanner

que van desde los 0.06 mts a los 0.10 mt de lo cual hay evidencia fotografica, se adecuo del pr 07+634 al pr 07+680. costado izquierdo y se realizo la instalacion de la doble parrilla de ϕ1/2", la formaleta que se esta usando es madera tarcida y rota (hay registro fotografico).

Nota: se realiza reposicion de madera y fundida guardia sin bordillo.

A. Anil B.
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CAS




FRENTE DE OBRA PASCA (PASO MALO).

CLIMA: Seco

PERSONAL: Inspector de obra (1), Operador maquinaria (2), Ayudante de obra (9), Maestro de obra (1), Auxiliar de trafico (2), Topografo (1), Conductor camioneta agua (1).

EQUIPO: Motoniveladora CAT 120 K (1), Minicargador NEW HOLLAND L 218 (1), Vibrocompactador DYNAPAC (1), Camioneta con agua (1), Estacion topografica (1), Kilo manual tipo nona (1).

ACTIVIDAD: El contratista realizo el corte definitivo de la subbase granular del pr 08+190 al pr 08+300 y realizo la adecuacion del suelo de fundacion de la cuneta del pr 08+180 al pr 08+190 y del pr 08+200 al pr 08+220 costado izquierdo, no se funclo por no haber material granular y concreto para la fundida y el trompo o mezcladora no se encontraba en el frente de obra (Actividad subcontratada a todo costo). El contratista debio iniciar la actividad de profundizacion del filtro tipo franco del pr 08+135 al pr 08+145 debido a que instalo alto con respecto a la cota de la rasante, se evidencio en la excavacion del filtro el material filtrante contaminado con limos o finos adheridos.



Powered by CamScanner

FRENTE DE OBRA DEMARCACION VIAL
CLIMA: Seco
PERSONAL: Subcontratista de demarcacion vial (Conductor equipo – Ayudantes (2).
EQUIPO: Vehiculo tipo furgon con equipo de pintura a presion (1).
ACTIVIDAD: El contratista continuo con la demarcacion con pintura en frio de la linea de eje de los tramos o frentes de obra 6, Tramo 5 – Tramo 4 (area o pavimento ampliado) Tramo 3, Tramo 2 y del pr 01+340 al pr 001+930 del tramo 1.

A. Civil
Residente tecnico
Consorcio Pasca CNJ

RESIDENTE INTERVENTORIA

16-03-2024 Sabado

FRENTE DE OBRA N. 03.
CLIMA: SECO
PERSONAL: Inspector de obra (1), Maestro general (2), Ayudante de obra (4), Auxiliar de trafico (2).
EQUIPO: Herramienta menor.
ACTIVIDAD: El contratista continuo con el armado, instalacion y llenado de mallas para confinar el gavion entre el pr 07+962 al pr 07+982 costado izquierdo.


A. Civil
Residente tecnico
Consorcio Pasca CNJ

RESIDENTE INTERVENTORIA

FRENTE DE OBRA N. 05.
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), Operador de maquinaria (1), Ayudantes de obra (2).
EQUIPOS: Minicargador CAT 262D (1)
ACTIVIDAD: El contratista continuó con la ejecución del filtro de espalda del gavión, el cual se encuentra extradimen-


sionado y con material granular filtrante contaminado.

A. Cruz Bo
Residente Técnico
Consorcio Pasca ENJ




FRENTE DE OBRA No. 7
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra(1), Maestro de obra(1), Ayudantes de obra(4)
EQUIPOS: Mixer (1), Herramienta menor
ACTIVIDAD: El contratista realizó la fundida en sitio de la cuneta en concreto de 3.000 PSI con previa instalación de doble parrilla de acero #4 1/2" del PR07+654 al PR07+700, costado izquierdo.

A. Cruz Bo
Residente Técnico
Consorcio Pasca ENJ



FRENTE DE OBRA PASCA (PASO MALO)
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra(1), Maestro de obra(1), Operador de maquinaria(1), Ayudantes de obra(7), Auxiliares de tráfico (2), Topógrafo(1).
EQUIPOS: Minicargador NEW HOLLAD L218(1), Vibrocompactador DYNA PAC(1), Carrotanque con agua(1)
ACTIVIDAD: El contratista continuó con la instalación del sardinel prefabricado a 10(diez) del PR08+150 al PR08+270, costado derecho. Realizó la instalación y cerco de subbase granular con minicargador del PR08+135 al PR08+190, carril derecho. El contratista continúa con la reinstalación del filtro tipo francés del PR08+140 al PR08+160, costado izquierdo, este se reinstaló debido a que inicialmente se construyó sin tener en cuenta la cota de la rasante, por lo tanto, quedó alto.

A. Cruz Bo
Residente Técnico
Consorcio Pasca ENJ



Powered by CamScanner

17-03-2024
Domingo

FRENTE DE OBRA ——
CLIMA: Lluvia en algunos sectores
EQUIPOS: En stand by
ACTIVIDAD: El contratista no ejecutó actividades en los frentes de obra que tiene.

A. Civil Bc
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ.

RESIDENTE INTERVENTORIA

18-03-2024
Lunes

FRENTE DE OBRA No. 3
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), Operador de maquinaria (1), Maestros gavioneros (2), Ayudantes de obra (2), Auxiliares de tráfico (2), Conductores de volqueta (2), Topógrafo (1) ——
EQUIPOS: Retrocargador CAT 428F (1), Volquetas (2) ——
ACTIVIDAD: El contratista inició la construcción del gavión No. 2, inicialmente con la excavación y el transporte del material de excavación al acopio temporal. El gavión intervenido se encuentra entre el PR08+038 al PR08+075, costado izquierdo. Este gavión, de acuerdo al diseño presentado por el contratista, está compuesto por tres niveles. ——

A. Civil Bc
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ.

RESIDENTE INTERVENTORIA

FRENTE DE OBRA No. 5
CLIMA: Seco
PERSONAL: Oficial de obra (1), Ayudantes de obra (3) ——
EQUIPOS: Mixer (1) ——
ACTIVIDAD: El contratista realizó la fundida de la cuneta en concreto de 3.000 PSI, reforzada con malla electrosoldada del PR10+552 al PR10+600, costado izquierdo. Estas cunetas se les verificó el espesor y se validó que se encuentra entre 0,12 mts. y 0,15 mts. ——


A. Civil Bc
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CNJ.

RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner


FRENTE DE OBRA No.7
CLIMA: Seco
PERSONAL: Maestro de obra(1), Ayudantes de obra(4)
EQUIPOS: Mixer(1)
ACTIVIDAD: El contratista realizó adecuación del suelo de fundación, instalación de doble parrilla en ϕ 1/2" del PR07+690 al PR07+723 costado izquierdo, en un espesor de 20cms.

A. Civil Bo
Residente Tecnico
Consorcio pasca cvl




FRENTE DE OBRA PASCA (PASO MALO)
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra(1), Ayudantes de obra(5), Topógrafo(1), Operado
EQUIPOS: Minicargador NEW HOLLAND L218(1), Estación topográfica(1)
ACTIVIDAD: El contratista realizó la instalación del sardinel prefabricado A20, completando por el lado izquierdo 195 unidades y por el lado derecho 180.

A. Civil Bo
Residente Tecnico
Consorcio pasca cvl



DEMARCACION VIAL:
PERSONAL: Subcontratista
EQUIPOS: Carro delineador de pinturas(1)
ACTIVIDAD: El contratista realizó la demarcación vial de las líneas laterales blancas y en el eje amarilla del PR01+930 al PR02+100, en el tramo 1 y del PR07+500 al PR08+487 en tramo 7

A. Civil Bo
Residente Tecnico
Consorcio pasca cvl



Powered by CamScanner

12-03-2024
Martes

FRENTE DE OBRA No. 3.
CLIMA: Lluvias de 14:00 a 15:00
PERSONAL: Inspector de obra (1), Operador de maquinaria (1), Maestros parilleros (2), Ayudantes de obra (2), Auxiliares de tráfico (2), Conductores de volqueta (2), Topógrafo (1)
EQUIPOS: Retrocargador CAT 428F (1), Volquetas (2)
ACTIVIDAD: El contratista terminó la construcción del gavión No. 2 con la instalación de 30 mallas distribuidas en dos niveles. Cabe aclarar que el talud por detrás del gavión ha presentado deslizamiento en masa. Se inició con la excavación del gavión del PR08+048 al PR08+085, costado izquierdo. Se observa con esta excavación el comportamiento previsible de la remoción en masa.

A. Civil Co
Residente técnico
Consorcio Vasca CAV

RESIDENTE INTERVENTORIA

FRENTE DE OBRA No. 4.
CLIMA: Lluviar de 14:00 a 15:00
PERSONAL: Inspector de obra (1), Maestro de obra (1), Ayudantes de obra (4), Auxiliares de tráfico (2), Operador de maquinaria (1)
EQUIPOS: Minicargador CAT 262D (1), ~~Vibrocompactador~~ manual, tipo rana (1)
ACTIVIDAD: El contratista realizó el mejoramiento y cerco de la subbase por el carril derecho del PR10+080 al PR10+150.


A. Civil Co
Consorcio Vasca CAV
Residente técnico

RESIDENTE INTERVENTORIA

FRENTE DE OBRA No. 7
CLIMA: Seco.
PERSONAL: Maestro de obra (1), Ayudantes de obra (4)
EQUIPOS: Retrocargador CAT 428F (1), Herramienta menor.
ACTIVIDAD: El contratista realizó corte y excavación del pavimento y demolición de la cuneta existente del PR08+041 al PR08+768, costado izquierdo y realizaron el corte del pavimento para dilatar


el concreto del PRO7+690 al PRO7+723 ——

A. Civil Bs
Consorcio Pasca CNJ
Residente Tecnico




FRENTE DE OBRA PASCA (PASO MALO)
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), Topógrafo (1), Operador de maquinaria (2), Conductor de carrotanque de agua (1) Ayudantes de obra (4), Auxiliares de trafico (2) ——
EQUIPOS: Minicargador NEW HOLLAND L218 (1), Excavadora sobre orugas 575C SANY (1), Vibrocompactador DYNA PAC (1), Carrotanque con agua 3000 galones (1), Estación y nivel de topografía (1) ——
ACTIVIDAD: El contratista realizó la cosida del filtro que reinstaló del PRO8+138 al PRO8+155. Realizó el cercado del carril derecho del PRO8+135 al PRO8+200 y realizó el replanteo del descole ubicado en el PRO8+195 y la excavación del área correspondiente para la construcción del descole. ——

A. Civil Bs
Consorcio Pasca CNJ
Residente Tecnico



20-03-2024 Miércoles


FRENTE DE OBRA No. 3
CLIMA: Seco ——
PERSONAL: Inspector de obra (1), Operador de maquinaria (2), Maestros gavioneros (2), Ayudantes de obra (2), Auxiliares de tráfico (2), Conductores de volqueta (2), Topógrafo (1) ——
EQUIPOS: Retrocargador CAT 428F (1), Minicargador CAT 262D (1), Volquetas (2), Nivel de topografía (1).
ACTIVIDAD: El contratista ~~contr~~ realizó la instalación de la manguera de Ø4" forrada en geotextil del gavión terminado y la instalación del geotextil por la espalda del gavión construido. Se continuó con la excavación del gavión No. 3 y se adecuaron los primeros 15 mts con el mejoramiento del suelo de apoyo del gavión. ——



Powered by CamScanner


FRENTE DE OBRA No.4
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra(1), Maestro de obra(1), Ayudantes de obra(4), Auxiliares de tráfico(2), Operador de maquinaria(1)
EQUIPOS: Minicargador CAT 462 D(1), Vibrocompactador manual tipo rana(1)
ACTIVIDAD: El contratista inició la instalación del adoquín por el carril derecho del PR10+080 al PR10+150

A. Cruz B.
Consorcio Pasca Cruz
Residente Técnico




FRENTE DE OBRA No.5
CLIMA: Seco
PERSONAL: Maestro de obra(1), Ayudantes de obra(3).
EQUIPOS: Mixer(1)
ACTIVIDAD: El contratista realizó la programación de una mixer para fundir la cuneta reforzada con malla electrosoldada del PR10+500 al PR10+~~548~~ 532, con un espesor de concreto 0,12mts. (Existe registro fotográfico). Del PR10+548 al PR10+582 el contratista no tenía adecuado el suelo de fundación de la cuneta, por lo tanto, se presentó una fundida perdida y hubo la necesidad de retirar parte del concreto depositado en este sector.

A. Cruz B.
Residente Técnico
Consorcio Pasca Cruz



FRENTE DE OBRA No.7
CLIMA: Seco
PERSONAL: Maestro de obra(1), Ayudantes de obra(4),
EQUIPOS: Retrocargador CAT 428F(1), Herramienta menor.
ACTIVIDAD: El contratista realizó la adecuación del suelo de fundación mediante adición de material para la fundición de las cunetas del PR08+041 al PR08+111, costado izquierdo



Powered by CamScanner

FRENTE DE OBRA PASCA (PASO MALO)
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), Topógrafo (1), Ayudantes de obra (3), Operadores de maquinaria (2), Auxiliares de tráfico (2)
EQUIPOS: Excavadora sobreorugas 5475 C SANY (1), Nivel topográfico (1), Minicargador NEW HOLLAND L218 (1), Vibrocompactador D'YNA PAC (1)
ACTIVIDAD: El contratista realizó la recompactación de todo el tramo en subbase granular y realizó la adecuación del área por fuera del sardinel del PR08+140 al PR08+190, costado derecho.

A. Cmil Bo
Residente Tecnico

RESIDENTE INTERVENTORIA

21-03-2024 Jueves

FRENTE DE OBRA No. 3.
CLIMA: Seco.
PERSONAL: Inspector de obra (1), Operador de maquinaria (2), Maestros gavioneros (2), Ayudantes de obra (2), Auxiliares de tráfico (2), Conductores de volqueta (2), Topógrafo (1).
EQUIPOS: Retrocargador 428F (1), Minicargador CAT262D (1), Volquetas (2), Nivel de topografía (1).
ACTIVIDAD: El contratista continuó la construcción del gavión No. 3. del PR08+038 al PR08+075, mediante el mejoramiento del suelo de soporte del gavión y el amarre llenado de mallas. Solamente se adecuaron 10mts. lineales del suelo de apoyo. El talud hacia adelante, ya excavado, continúa presentando deslizamiento.

A. Cmil Bo
Residente Tecnico
Consorcio Para


RESIDENTE INTERVENTORIA

FRENTE DE OBRA No. 4
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), Operador de maquinaria (1), Maestro de obra (1), Ayudantes de obra (6), Auxiliares de tráfico (2).
EQUIPOS: Minicargador CAT262D (1)
ACTIVIDAD: El contratista continuó la construcción del adoquín por el carril derecho del PR10+080 al PR10+150. Esta labor, el

Powered by CamScanner


contratista la ha generado sin realizar paro de actividades, es decir, jornada continua, con el fin de realizar la instalación total del tramo.

A. Civil Bs
Consorcio Pasca CNJ
Residente técnico




FRENTE DE OBRA No. 7
CLIMA: Seco
PERSONAL: Maestro de obra (1), Ayudantes de obra (4).
EQUIPOS: Mixer (1)
ACTIVIDAD: El contratista realizó la fundida de la bermacuneta reforzada del PR07+758 al PR07+790 y realizó el mejoramiento del suelo de la cuneta del PR08+041 al PR08+111, debido a las lluvias de la noche anterior. Debido a las lluvias se está observando sectores de cuneta en los cuales el agua queda almacenada.

A. Civil Bs
Residente técnico
Consorcio Pasca CNJ



FRENTE DE OBRA PASCA (PASO MALO)
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra (1), Topógrafo (1), Ayudantes de obra (3), Operadores de maquinaria (2), Auxiliares de tráfico (2).
EQUIPOS: Excavadora sobre orugas 5475C SANY (1), Nivel topográfico (1), Minicargador NEW HOLLAND L218 (1), Vibrocompactador DYNA PAC (1),
ACTIVIDAD: El contratista realizó la fundida de la losa de cuneta con malla electrosoldada como refuerzo del PR08+156 al PR08+190, costado izquierdo.

A. Civil Bs
Residente técnico
Consorcio Pasca CNJ




22-03-2024 Viernes

FRENTE DE OBRA No. 3.
CLIMA: Seco.
PERSONAL: Inspector de obra (1), Operador de maquinaria (2), Maestros gavioneros (2), Ayudantes de obra (2), Auxiliares de trafico (2) Conductores de volqueta (2), Topografo (1).

EQUIPOS: Retrocargador CAT 428F(1), Minicargador CAT 262D(1), Volqueta (2), Nivel topográfico (1) ——

ACTIVIDAD: El contratista continuó con la construcción del gavión, a la fecha ha realizado el llenado de 14 mallas. Se está observando que en el sector que no se está interviniendo aun, está drenando agua del talud superior ——

A. Civil Bo
Residente Tecnico
Consorcio Pasca cvs



FRENTE DE OBRA No. 4


CLIMA: Seco

PERSONAL: Inspector de obra (1), Operador de maquinaria (1), Maestro de obra (1), Ayudantes de obra (6), Auxiliares de tráfico (2).

EQUIPO: Minicargador CAT 262D (1).

ACTIVIDAD: El contratista continuó con la instalación del adoquín por el carril izquierdo del PR10+08 al PR10+150. El contratista deja instalado la totalidad del adoquín. ——

A. Civil Bo
Residente Tecnico
Consorcio Pasca cvs



FRENTE DE OBRA No. 7


CLIMA: Seco

PERSONAL: Maestro de obra (1), Ayudantes de obra (4) ——

EQUIPO: Mixer (1) ——

ACTIVIDAD: El contratista realizó la fundida de la bermaconeta del PR08+041 al PR08+076, costado izquierdo. ——

A. Civil Bo
Residente Tecnico
Consorcio Pasca cvs



FRENTE DE OBRA PASCA (PASO MALO)

CLIMA: Seco


PERSONAL: Inspector de obra (1), Maestro de obra (1), Ayudantes de obra (7), Auxiliares de tráfico (2), Operador de maquinaria (1), Topógrafo (1) ——

EQUIPOS: Minicargador NEW HOLLAND L218 (1), Estación topográfica ——

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD: El contratista realizó la fundida de la cuneta del PR08+145 al 08+159 y del PR08+200 al PR08+207, costado izquierdo.

f. A. Civil Bs
Residente Técnico
Consorcio pasca ENJ




FRENTE DE OBRA DEMARCACIÓN TRAMO PASCA
CLIMA: Seco
EQUIPOS: Vehículo demarcador de pintura
PERSONAL: Subcontratista
ACTIVIDAD: El contratista realizó la demarcación horizontal desde el PR10+000 al PR08+800 abcisado según los PR de la vía, sector este donde se encuentra el bacheo realizado del 01 al 08.

f. A. Civil Bs
Residente Técnico
Consorcio pasca ENJ

23-03-2024 Sábado

NOTA: El contrato se suspendió a partir del 23 de marzo hasta el 31 de marzo, reiniciando actividades el 1 de abril al 9 de abril.

f. A. Civil Bs
Residente Técnico
Consorcio pasca ENJ




26-03-2024 Martes

FRENTE DE OBRA No.7
CLIMA: Seco
PERSONAL: Inspector de obra(1), Maestro de obra(1), Ayudantes de obra(3)
EQUIPOS: Mixer(1))
ACTIVIDAD: El contratista realizó la fundida de la bermacuneta del PR08+076 al PR08+111, costado izquierdo. Bermacuneta con doble parrilla.

f. A. Civil Bs.

27-03-2024 SOSPENSION DE CTO ICCU-708 e ICCU-815 DEL 2023
28-03-2024 Suspensión de Cto ICCU-708 e ICCU-815 del 2023.
29-03-2024 Suspensión de Cto. ICCU-708 e ICCU-815 del 2023
30-03-2024 Suspensión de Cto ICCU-708 e ICCU-815 del 2023
31-03-2024 Suspensión de Cto. ICCU-708 e ICCU-815 del 2023


Powered by CamScanner

01-03-24	Clima: Seco Personal: Inspector (1), Maestro (1), Ayudantes (8), Aux Trafico (2) HSQ (1) Maquinaria: Retro (1) Aguadita fundida de cuneta K12+940 a K13+010, instalación de loseta rampa iglesia K13+070 costado derecho, instalación marcos y tapas, Amarre Acero Aguabonita: Inspector (1) maestro (1) ayudantes (8), Tráficos (2) Amarre de acero, instalacion, fierro y compactacion de base estabilizada K6+180 a K6+165, excavación K6+130 a K6+120, corte y demolición de pavimento K6+150 a K6+155, instalación Sardinel K6+150 a K6+140 Consorcio Pasca ENJ. Residente Tecnico 
02-03-24	Clima: Seco Personal: Inspector (1), maestro (1), Ayudantes (8), Aux. tráfico (2), HSQ (1) Maquinaria: Retro. (1) Aguadita: fundida Cuneta K13+010 a K13+022, instalación marcos y tapas, remate de bordillo, Construcción rampa Iglesia. y escalon Aguabonita: Inspector (1) maestro (1) Ayudantes (8) Aux. Trafico (2) Instalación Geotextil, Geoceldo y lleno K6+150 a K6+140, Amarre de acero compactación base estabilizada, continua excavacion K6+120 a K6+110, nivelación de caja de inspección, corte y demolición de pavimento K6+150 a K6+140 y compactación base estabilizada del mismo abs. Residente Tecnico 
3-03-24	Domingo: Sin actividades.
04-03-24	Clima: Personal: Inspector (1), maestro (2), Ayudantes (8) Aux. Tráfico (2) HSQ (1) Maquinaria: Retro. Aguadito: Instalacion llero de arcilenes Geoceldo y estabilizado K12+975 a K13+010 Aguabonita: Inspector (1), maestro (1), Ayudantes (8), Aux. trafico (2) Instalación Concreto acelerado a 3días, estampado K6+170 a K6+150

Powered by CamScanner

Continua excavación Espacio Público K6+110 a K6+090, Instalación de geoceldo, geotextil y lleno con material Seleccionado K6+120 a K6+090

A. Cruz B.
Residente Técnico
Consorcio Pasca CNJ



05-03-24 Clima: Seco

Personal: Inspector(1), Maestro(2), Ayudantes(8), Aux. trafico(2) HSQ(1)


Maquinaria: Retro

Aguadita. Fundida de andenes K12+980 a K13+010

Agualonita: fundida de cunetas K6+195, K6+150 a K6+140, K6+090 a K6+095, Estampado acelerado a 3 días. Corte y demolición de pavimento K6+090.

Se realiza cuneta pronunciada en K6+090 a K6+095 por solicitud de la interventoria.

A. Cruz B.
Residente Técnico
Consorcio Pasca CNJ



06-03-24. Clima: Seco

Personal Inspector (1) maestro (2) Ayudantes (4) Auxiliares Tráfico (2), HSQ (1)


Maquinaria: Retro (1) volqueta (1)

Aguadita: Excavación bocacalle K12+930, Finalizan actividades de Espacio Público Andenes y Cunetas en Aguadita. Lleros de estructura bocacalle, fundida de escalon plaza de toros, Instalación marcos y tapas.

Agualonita: Inspector (1), maestro (1), Ayudantes (6), Traficos (2) Retro y Volgueta

Amarre de parrillas para espacio público, Instalación de Sardinel K6+130 a K6+090 corte y demolición de pavimento, nivelación y compactación de base estabilizada K6+100 a K6+110

A. Cruz B.
Residente Técnico
Consorcio Pasca CNJ.



7/03/24 Clima: Seco

Personal: Inspector (1), maestro (2), Ayudantes (4)

Maquinaria: Ninguna. - Trompo

Aguadita: Remates.

Fundida de bocacalle K12+930

Aguabonita: Inspector (1), maestro (1), Aguadantes (6), Aux. trafico (2) HSQ (1)
Fundida de Cuneta K6+095 a K6+110, Inicio excavación K6+040 A K6+060
Se realiza acercamiento con el propietario del predio Alvaro Nucus para explicarle porque no se puede realizar la intervencion de la totalidad del predio ya que el porpecadero colinda con la ronda de la quebrada y no es permitido realizar construcciones proximas a esta. Adicionalmente existen unos guaduales con vigas que no podemos desestabilizar con la excavación del espacio Público

A. Civil Bo
Residente tecnico
Consorcio pasca CNJ

8/03/24 Clima:
Personal: Inspector(1) maestro (2) Aguadantes (4)
Maquinaria: Trompo
Aguadita. Inicio Señalización con boarde de vía blanco

A. Civil Bo
Residente tecnico
Consorcio pasca CNJ

Aguabonita: Inspector (1) Maestro (1) Aguadantes (6), Traficos (2)
Instalación Concreto K6+110 a K6+130 concreto acelerado a 3días estampado
Instalación de Geotextil, Geoceldo y llenos en K6+040 a K6+060

A. Civil Bo
Residente tecnico
Consorcio pasca CNJ.

9/09/24 Clima: Seco
Maquinaria:
Personal: Inspector (1) Maestro (2), Aguadantes (2)
Aguadita Instalación loseta, mordes y tapas.

A. Civil Bo
Residente tecnico


Aguabonita: Inspector (1) Maestro (1) Aguadantes (6) Trafico (2)
Instalación Sardinel K6+040 a K6+060 y estabilizacion del mismo tramo
Armare de parrillas. Compactación de material.

A. Civil Bo
Residente tecnico
Consorcio Pasca CNJ.


Powered by CamScanner

10/03/24	Domingo Sin Actividades
11/03/24	Clima: Seco Personal. Inspector (1), Maestro (2) Ayudantes (4) Maquinaria: Trompo Aguadita: Instalación de loseta en , Instalación de marcos y tapas, construcción de rampas para cierre de actas de vecindad. Aguabonita: Inspector (1), Maestro (1) Ayudantes (5), Retro (1), Volqueta (1) Excavación KG1251 a KG1256. Instalacion KG1052, Instalacion de base estabilizada KG1052 A. Civil Residente tecnico
12/03/24	Clima: Seco Personal. Inspector (1), Maestro (1) Ayudantes (4) Maquinaria. Trompo , mixer (2) Aguabonita: Fundida de Cunetas KG1042 a KG1062 y KG1066 Excavación Cunetas KG1256 a KG1260 A. Civil Residente tecnico Consorcio pasca ENJ.
13/03/24	Clima: Seco Personal. Inspector (1) Maestro (1) Ayudantes (5) Excavación Cuneta. KG1260 a KG1270, Instalación de Geotextil KG1251 a KG1262 y Geoceldа. KG1251. Demolicion de Pozos para reinvertir Aguadita: Construcion Cintas de ajuste A. Civil Residente tecnico
14/03/24 Aguabonita	Clima: Seco Personal: Inspector (1) Maestro (1) Ayudantes (5), Maquina (1) Volqueta (1) Excavación KG1270 a KG1288, Instalación Geotextil y Geoceldа KG1262 a KG1280, Instalacion de Muros y Base estabilizado KG1251 a KG1260 corte de pavimento, Demolición KG1251 a KG1280, Amarre de parrillas Instalación Sardinel. KG1251 a KG1260, Instalación Aro-Tapas A. Civil Residente tecnico Consorcio pasca ENJ

15/08/24 Clima: Seco
Personal: Inspector (1), Maestro (1), Ayudantes (4) Maquinaria (1) Volqueta
Aguabonita: Fundida de pozos, Fundida de Cuneta K61251 a K61257
Corte y demolición de Pavimento, Instalación Geotextil y Geoceldo
K61280 a K61288
Aguadita: Personal en remates, Señalización horizontal, Lineas amarilla
y blanca.
A. Cuil Bo
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CVJ




16/08/24. Clima Seco
Personal: Inspector (1) Maestro (1), Ayudantes (5) Maquina (1) Retro y
Volqueta (1). Aguabonita: Instalación Sardinel K61260 a K61276, realce
cajas de inspección, Instalación base estabilizada K61260 a K61270
A. Cuil Bo
Residente Tecnico



17/08/24. Domingo. Sin Actividades


18/08/24 Clima: Seco
Personal: Inspector (1) Maestro (1), Ayudantes (5) Maquinaria (1) Volqueta 1
Aguabonita: Instalación base estabilizada, Realce de cajas de inspección
Instalacion de Sardinel K61276, Amarre de parrillas K61275
Aguadita: Remates
A. Cuil Bo
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CVJ



19/08/24. Clima: Seco
Personal: Inspector (1), Maestro (1), Ayudantes (5), Maquina Retro (1) Volqueta
Aguabonita: Fundida de Cuneta K61157 a K61165, Realce de Cajas
Aguadita: Remates.
A. Cuil Bo
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CVJ



20/08/24. Clima: Seco
Personal: Inspector (1) Maestro (1) Ayudantes (5) Maquina:
Aguabonita: Amarre de parrillas, K61251 a 257, Instalacion marcos y Tapas
Aguadita: Remates.
A. Cuil Bo
Residente Tecnico
Consorcio Pasca CVJ



Powered by CamScanner

21/03/24.	Clima: Seco. Personal Inspector (1), Maestro (1) Ayudantes (4). Maquina Aguabonita: Fundida de Cuneta K61251 a K61257., Amarre de parrillas. Aguadita: Remates. Residente Tecnico Consorcio pasca cms
22/03/24.	Clima: Seco Personal. Inspector (1) Maestro (1), Ayudante (4) Mixer Aguabonita: Fundida de Cunetas K61297 a K61277, Amarre de Parrillas, Instalacion base estabilizado K6 + 280 a K61285.
23/03/24	al 1 de Abril. 2024. Se realiza la suspencion del Contrato. Residente Tecnico Consorcio pasca
01/04/24	Clima. Seco. Personal.

Powered by CamScanner

8.5. Certificación componente ambiental y social

Se remite certificación del componente social y del componente ambiental, para el mes de octubre de 2023.

EL SUSCRITO GESTOR SOCIAL DE INTERVENTORIA

CERTIFICA QUE;

COPEBA S.A.S, con NIT. 830.011.122-9 en calidad de Interventoría del Contrato de Obra N° ICCU-708 DE 2023, cuyo objeto es el MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500, ejecutado por EL CONSORCIO PASCA CNJ con NIT. 901.715.912-1, realizó la supervisión de las actividades del Componente Social del PAGA para el mes No.8 del contrato, comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024.

Avances en la ejecución del PAGA:
Se verificaron gestiones, avances en el desarrollo de los proyectos de la Gestión Social en la elaboración y formulación de cada uno de los proyectos del PAGA.

Respuesta de PQRS:
Se encontró que *no se cumple* con la respuesta oportuna incluyendo los respectivos cierres.

Debido a las deficiencias encontradas en la respuesta a las PQRS, **la presente es una certificación de no aprobación** de las actividades del componente social para el mes de febrero de 2024.

Dado en Bogotá D.C., el 7 de abril de 2024.

Atentamente,

NURY JAZMÍN GARCÍA LÓPEZ
Profesional en Gestión Social
Contrato ICCU-815 DE 2023
COPEBA S.A.S
Interventoría

EL SUSCRITO ESPECIALISTA AMBIENTAL DE INTERVENTORIA

CERTIFICA QUE:

COPEBA S.A.S, con NIT. 830.011.122-9 en calidad de Interventoría del Contrato de Obra N° ICCU-708 DE 2023, que tiene por objeto realizar el: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500, el cual está en ejecución por EL CONSORCIO PASCA CNJ con NIT. 901.715.912-1, verificó el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como consta en los soportes que se adjuntan en el informe mensual ambiental No. 8 para el periodo del 01 al 31 de marzo de 2024 presentado por el contratista para el Contrato de Obra ICCU 708 DE 2023.

Por lo anterior, se expide paz y salvo en lo referente al componente ambiental; certificando, que no quedaron pendientes ambientales que puedan generar demandas y/o reclamaciones al ICCU como consecuencia de la ejecución del contrato ICCU 708 DE 2023, "REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".

Por lo tanto, se garantiza que no hay procesos sancionatorios abiertos al contratista por el desarrollo del presente contrato de obra, para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2024 y el 31 de marzo de 2024.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de abril de 2024.

Atentamente,

JOHN OSWALDO CANO GARCÍA
Especialista Ambiental
Contrato ICCU-815 DE 2023
COPEBA S.A.S
Interventoría

8.6. Acta de costos de interventoría

Se anexa formato MS-GP-FR-033 FORMATO ACTAS DE COSTOS DE INTERVENTORÍA, correspondiente al acta de costos de interventoría No. 8, periodo del 01 al 22 de marzo de 2024.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ identificado(a) con CC 52253696

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS008	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$12,999,000	4%	$520,000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$12,999,000	16%	$2.079,900
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		$12,999,000		$65.000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		$12,999,000		$65.000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$12,999,000	6.96%	$904.700
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$12,999,000	4%	$520,000

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 03:15.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NICOLAS ORTEGA RESTREPO identificado(a) con CC 80199838

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$3,600,000	4%	$144,000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$3,600,000	16%	$576,000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		$3,600,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		$3,600,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$3,600,000	6.96%	$250,600
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$3,600,000	4%	$144,000

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 03:12.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHN OSWALDO CANO GARCIA identificado(a) con CC 79858440

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$1,800,000	4%	$72,000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,800,000	16%	$288,000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		$1,800,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		$1,800,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,800,000	6.96%	$125,300
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,800,000	4%	$72,000

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 03:14.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NURY JAZMIN GARCIA LOPEZ identificado(a) con CC 52880586

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22																		$1,965,334	4%	$78,700
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	8										X								$714,667	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$1,965,334	16%	$314,500
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$714,667	16%	$114,400
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22																		$1,965,334		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	8										X								$714,667		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22																		$1,965,334		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	8										X								$714,667		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$1,965,334	6.96%	$136,800
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$714,667	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$1,965,334	4%	$78,700
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$714,667	0%	$0

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 03:13.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JHON ALEXANDER PEÑA GUZMAN identificado(a) con CC 1110482624

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22																		$1,965,334	4%	$78,700
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	8										X								$714,667	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$1,965,334	16%	$314,500
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$714,667	16%	$114,400
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22																		$1,965,334		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	8										X								$714,667		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22																		$1,965,334		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	8										X								$714,667		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$1,965,334	6.96%	$136,800
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$714,667	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$1,965,334	4%	$78,700
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$714,667	0%	$0

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 03:10.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GIOVANNI ARIZA ARIAS identificado(a) con CC 88138476

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22																		$4,546,667	4%	$181,900
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	8										X								$1,653,334	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$4,546,667	16%	$727,500
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$1,653,334	16%	$264,600
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22																		$4,546,667		$22,800
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	8										X								$1,653,334		$8,300
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22																		$4,546,667		$22,800
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	8										X								$1,653,334		$8,300
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$4,546,667	6.96%	$316,500
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$1,653,334	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$4,546,667	4%	$181,900
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$1,653,334	0%	$0

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 03:14.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PAULA VALENTINA CARLOS MARTINEZ identificado(a) con CC 1070989207

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22																		$2,700,185	4%	$108,100
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	8										X								$981,886	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$2,700,185	16%	$432,100
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$981,886	16%	$157,200
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22																		$2,700,185		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	8										X								$981,886		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22																		$2,700,185		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	8										X								$981,886		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$2,700,185	0.522%	$14,100
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$981,886	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$2,700,185	4%	$108,100
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$981,886	0%	$0

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 03:11.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JUAN SEBASTIAN CARDENAS BECERRA identificado(a) con CC 1003174878

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22																		$2,163,334	4%	$86,600
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	8										X								$786,667	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$2,163,334	16%	$346,200
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$786,667	16%	$125,900
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22																		$2,163,334		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	8										X								$786,667		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22																		$2,163,334		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	8										X								$786,667		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$2,163,334	6.96%	$150,600
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$786,667	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$2,163,334	4%	$86,600
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$786,667	0%	$0

Este certificado se expide el día 2024-04-10 a las 12:00.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WIDMER ALEJANDRO CORREA SANTANA identificado(a) con CC 1032412944

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$4,070,000	4%	$162,800
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$4,070,000	16%	$651,200
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		$4,070,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		$4,070,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$4,070,000	6.96%	$283,300
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$4,070,000	4%	$162,800

Este certificado se expide el día 2024-05-09 a las 01:03.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SERGIO LUIS SUAREZ ZAMUDIO identificado(a) con CC 1069753283

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$2,950,000	4%	$118,000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$2,950,000	16%	$472,000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		$2,950,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		$2,950,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$2,950,000	6.96%	$205,400
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$2,950,000	4%	$118,000

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 03:16.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CRISTIAN MARIN identificado(a) con CC 1097994335

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22																		$2,163,334	4%	$86,600
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	8										X								$786,667	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$2,163,334	16%	$346,200
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$786,667	16%	$125,900
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22																		$2,163,334		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	8										X								$786,667		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22																		$2,163,334		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	8										X								$786,667		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$2,163,334	6.96%	$150,600
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$786,667	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$2,163,334	4%	$86,600
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$786,667	0%	$0

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 03:09.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULIAN CAMILO CASTIBLANCO OSPINA identificado(a) con CC 1007847413

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22																		$1,320,000	4%	$52,800
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	8										X								$480,000	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$1,320,000	16%	$211,200
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$480,000	16%	$76,800
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22																		$1,320,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	8										X								$480,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22																		$1,320,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	8										X								$480,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	8										X								$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$1,320,000	6.96%	$91,900
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$480,000	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22																		$1,320,000	4%	$52,800
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	8										X								$480,000	0%	$0

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 03:17.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CHRISTIAN JAVIER GUTIERREZ GUTIERREZ identificado(a) con CC 1105671099

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$2,500,000	4%	$100,000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$2,500,000	6.96%	$174,000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$2,500,000	4%	$100,000

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 02:55.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIANA MARIA GARCIA VALENCIA identificado(a) con CC 53015204

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip			
9465207998	547669177	E	2024-04-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$2,200,000	4%	$88,000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$2,200,000	16%	$352,000
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		$2,200,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		$2,200,000		$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465207998	547669177	E	2024-04-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$2,200,000	0.522%	$11,500
9465207998	547669177	E	2024-04-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$2,200,000	4%	$88,000

Este certificado se expide el día 2024-04-09 a las 03:06.
