ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 001 Fecha: Agosto de 2017

INFORME SUPERVISIÓN N° 4
NUMERO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: 2944
PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE PRESETANCION: 06 DE NOVIEMBRE DE 2023.

SUPERVISOR: MAYERLY ANDREA ESPINOSA

DESCRIPCION DEL CONVENIO No. 2944

OBJETO	**VALOR**
APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA DE ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ	$ 1.885.165.552,63

INFORMACION DEL CONVENIO	
TIPO DE CONTRATO	LICITACIÓN PUBLICA
OBJETO:	APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA DE ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ
VALOR:	$ 1.885.165.552,63
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE INICIACION:	06/07/2023
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACION:	31/12/2023
PRORROGA:	N/A
TIEMPO:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A

INFORMACION DEL SUPERVISOR			
CONTRATO			
OBJETO:		APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA DE ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ	
FECHA DE INICIACION		06/07/2023	
FECHA DE SUSPENSION		N/A	
FECHA DE REINICIO		N/A	
VALOR		CONTRATO	VALOR
			$ 1.885.165.552,63
VALOR ADICIONAL		CONTRATO	VALOR

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 001 Fecha: Agosto de 2017

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
01472	29/08/2023	2.3.22.2201.0700-18 BPIN 2020505730015 Construcción ampliación, optimización, adecuación, mantenimiento de la infraestructura educativa y comedores escolares	$1.885.165.552,63

REGISTRO PRESUPUESTAL


No.	FECHA	RUBRO	VALOR
N/A	N/A	N/A	$0.000.000,00

PAGOS REALIZADOS

Acta No.	% Ejecución	Egreso N°	Fecha	Valor Ajustado	Acumulado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL FINANCIERO: DEL (06 DE OCTUBRE DE 2023 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2023) Avance físico de contrato 0%, avance financiero ejecutado 0%

GRAFICO:

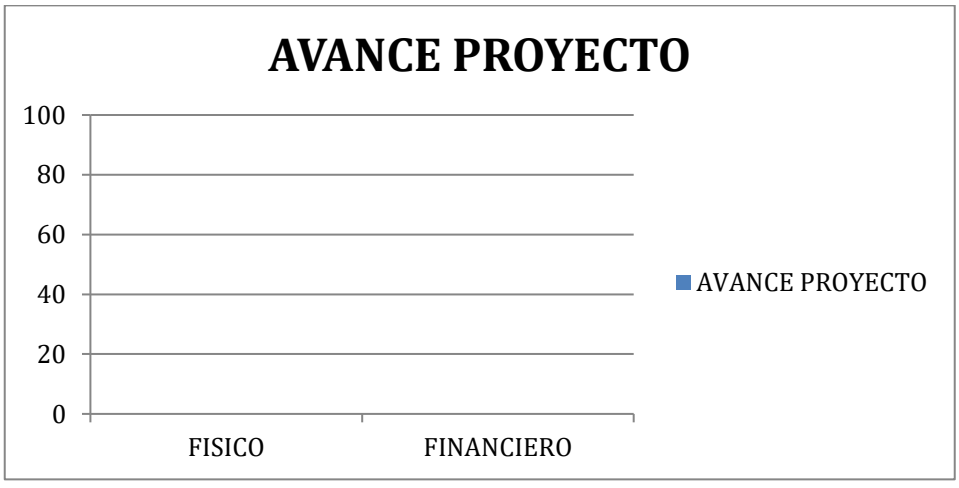

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 001 Fecha: Agosto de 2017

<table>
<tr><td>ITEMS</td><td>ACTIVIDAD</td><td colspan="2">CANTIDAD</td></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td>PRELIMINARES:</td><td>AVANCE FINANCIERO</td><td>AVANCE FÍSICO%</td></tr>
<tr><td>Actividades realizadas en el periodo mencionado.</td><td>$ 0.000.000</td><td>0 %</td></tr>
<tr><td colspan="3">El 06 de octubre se realizó la presentación del informe de evaluación de los oferentes del contrato INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.
El día 13 de octubre se realizó la publicación del acto de adjudicación del contrato de interventoría con objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META. Adjudicado al oferente UT INTERVENTORIAS I.E 2023.
El 04 de noviembre, se recibieron por medio de la proforma Colombia Compra Eficiente Secop II, las pólizas por parte del contratista UT INTERVENTORIAS I.E 2023, para su aprobación y posterior firma del acta de inicio.
El día 26 de octubre se realizó la audiencia de adjudicación del proceso CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META
El día 30 de octubre se realizó la publicación del acto administrativo de adjudicación del contrato CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META, adjudicado al contratista CONSORCIO MANTENIMIENTOS CSS ADIN</td></tr>
<tr><td colspan="3">OBSERVACIONES</td></tr>
</table>

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 001 Fecha: Agosto de 2017

INVERSION ANTICIPO

DATOS ESPECÍFICOS:

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA	DESCRIPCION	FECHA	VALOR	OBSERVACION
001	ACTA DE INICIO CONTRATO Y/O CONVENIO	06/07/2023	$0	SE SUSCRIBIÓ ACTA DE INICIO

MAYERLY ANDREA ESPINOSA
Supervisor
