ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 001 Fecha: Agosto de 2017

INFORME SUPERVISIÓN No. 7
NUMERO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: 2944
PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 05 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE PRESETANCION: 06 DE FEBRERO DE 2024.

SUPERVISOR: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ

DESCRIPCION DEL CONVENIO No. 2944

OBJETO	**VALOR**
APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA DE ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ.	$ 1.885.165.552,63

INFORMACION DEL CONVENIO	
TIPO DE CONTRATO	LICITACIÓN PUBLICA
OBJETO:	APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA DE ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ
VALOR:	$ 1.885.165.552,63
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE INICIACION:	06/07/2023
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACION:	31/12/2023
PRORROGA N°1:	5/10/2023
TIEMPO:	2 MESES Y 26 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA N°2:	31/12/2023
TIEMPO:	5 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	31 DE MAYO DE 2024

INFORMACION DEL SUPERVISOR	
CONTRATO	
OBJETO:	APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA DE ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ
FECHA DE INICIACION	06/07/2023
FECHA DE SUSPENSION	N/A

FECHA DE REINICIO	N/A

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
4493	27/06/2023	0302-2.3.22.2201.700.014.2.3.4.02.04.14-04 BPIN 2022005500257 APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA DE ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ	$1.885.165.552,63

REGISTRO PRESUPUESTAL


No.	FECHA	RUBRO	VALOR
8516	28/06/2023	0302-2.3.22.2201.700.014.2.3.4.02.04.14-04 BPIN 2022005500257 APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA DE ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ	$1.885.165.552,63

PAGOS REALIZADOS

Acta No.	% Ejecución	Egreso N°	Fecha	Valor Ajustado	Observaciones
N/A	N/A	18109	14-08-2023	1.885.165.552,63	UNICO PAGO CONVENIO 2944

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL FINANCIERO: DEL (01 DE ENERO DE 2024 AL 05 DE FEBRERO DE 2024) Avance físico de contrato de obra e interventoría 34.58%, avance financiero ejecutado 29.58%

GRAFICO:

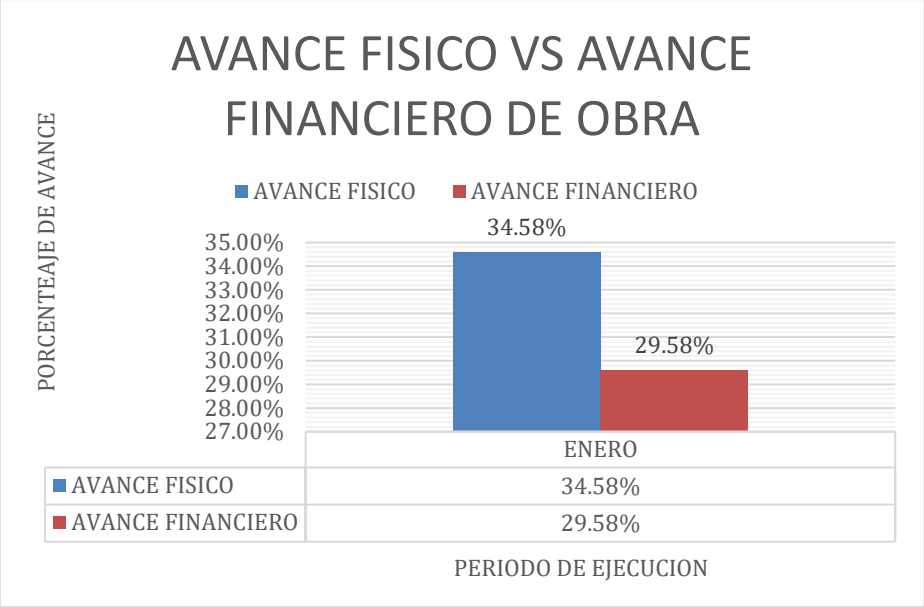

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1	**PRELIMINARES:**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FÍSICO%**
	Actividades realizadas en el periodo mencionado de los contratos de obra e interventoría.	$ 0.000.000	34.58%
	1. El 23 noviembre se realizó la firma del acta de inicio del contrato de interventoría con objeto **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.** 2. El 15 de noviembre se realizó la firma del contrato complementario por parte del contratista del contrato de obra con objeto **CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN**		

EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.

3. El 04 de noviembre, se recibieron por medio de la proforma Colombia Compra Eficiente Secop II, las pólizas por parte del contratista CONSORCIO MANTENIMIENTOS CSS ADIN, para su aprobación y posterior firma del acta de inicio.

4. El 11 noviembre de 2023 se realizó la firma del acta de inicio del contrato de obra con objeto **CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.**

5. El día 28 de diciembre de 2023 el contratista de obra y contratista de interventoría suscriben el acta de Prorroga N° 1 del contrato obra con objeto **CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.**

6. Que le día 28 de diciembre de 2023 se suscribe Otro si, acta de prorroga No. 01 del al contrato de obra **CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.** Entre el municipio de Puerto López – Meta y CONSORCIO MANTENIMIENTO CSS ADIN.

7. Que le día 28 de diciembre de 2023 se suscribe Otro si, acta de prorroga No. 01 del al contrato de **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.** Entre el municipio de Puerto López – Meta y la UNION TEMPORAL INTERVENTORIA I. E 2023.

8. Que el día 29 de diciembre de 2023 se realizó pago de FASE 1 al contrato de **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y**

AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META. Correspondiente al 12.40% del valor del contrato.

9. Que el día 29 de diciembre de 2023 se realizó pago de Acta parcial No. 1 al contrato de **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.** Correspondiente al 26.23% del valor del contrato.

10. Que el día 27 de diciembre de 2023 se realizó pago de Acta parcial No. 1 al contrato de **OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.** Correspondiente al 29.58% del valor del contrato.

11. A la fecha del 31 de diciembre de 2023 el contratista de obra cuenta con un avance físico del 29.58% y el contrato de interventoría presenta un avance del 38.63%

12. A la fecha del 31 de enero de 2024 el contratista de obra cuenta con un avance físico del 34.58%.

OBSERVACIONES

INVERSION ANTICIPO

DATOS ESPECÍFICOS:

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 001 Fecha: Agosto de 2017

ACTAS LEGALES TRAMITADAS AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2944

ACTA	DESCRIPCION	FECHA	VALOR	OBSERVACION
001	ACTA DE INICIO CONTRATO Y/O CONVENIO	06/07/2023	$0	SE SUSCRIBIÓ ACTA DE INICIO
002	ACTA PRORROGA No.1	05/10/2023	$0	TIEMPO 2 MESES Y 26 DIAS
003	ACTA PRORROGA No.2	31/12/2023	$0	TIEMPO 5 MESES

MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Supervisor
