ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 001 Fecha: Agosto de 2017

INFORME SUPERVISIÓN N° 3
NUMERO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: 2945
PERIODO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 05 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE PRESETANCION: 06 DE OCTUBRE DE 2023.

SUPERVISOR: MAYERLY ANDREA ESPINOSA

DESCRIPCION DEL CONVENIO No. 2945

OBJETO	**VALOR**
APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGOGICOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.	$ 1.106.719.631,16

INFORMACION DEL CONVENIO	
TIPO DE CONTRATO	LICITACIÓN PUBLICA
OBJETO:	APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGOGICOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.
VALOR:	$ 1.106.719.631,16
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE INICIACION:	06/07/2023
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACION:	31/12/2023
PRORROGA:	N/A
TIEMPO:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A

INFORMACION DEL SUPERVISOR			
CONTRATO			
OBJETO:		APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGOGICOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.	
FECHA DE INICIACION		06/07/2023	
FECHA DE SUSPENSION		N/A	
FECHA DE REINICIO		N/A	
VALOR		CONTRATO	VALOR
			$ 1.106.719.631,16
VALOR ADICIONAL		CONTRATO	VALOR

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 001 Fecha: Agosto de 2017

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
01472	29/08/2023	2.3.22.2201.0700-19 BPIN 2020505730015 Construcción ampliación, optimización, adecuación, mantenimiento de la infraestructura educativa y comedores escolares	$1.885.165.552,63

REGISTRO PRESUPUESTAL


No.	FECHA	RUBRO	VALOR
N/A	N/A	N/A	$0.000.000,00

PAGOS REALIZADOS

Acta No.	% Ejecución	Egreso N°	Fecha	Valor Ajustado	Acumulado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL FINANCIERO: DEL (06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 05 DE OCTUBRE DE 2023) Avance físico de contrato 0%, avance financiero ejecutado 0%

GRAFICO:

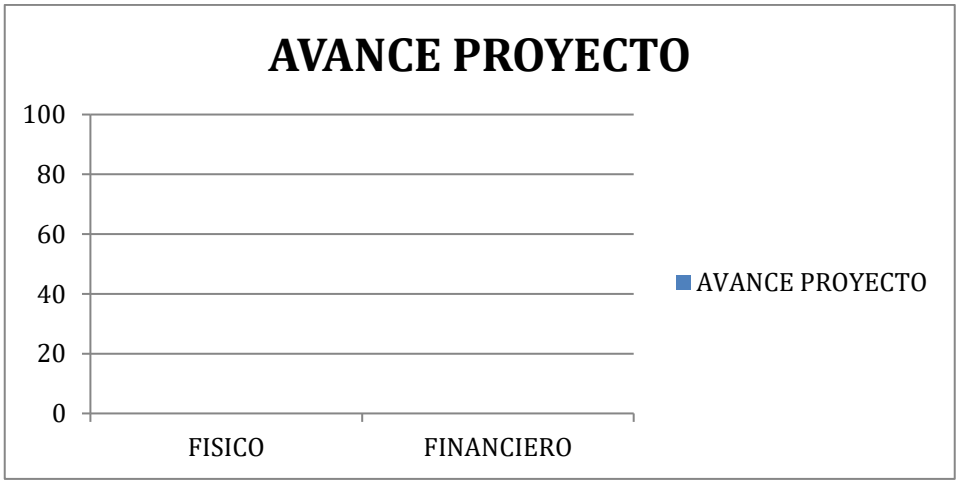

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 001 Fecha: Agosto de 2017

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1	**PRELIMINARES:**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FÍSICO%**
	Actividades realizadas en el periodo mencionado.	$ 0.000.000	0 %
	1. El 22 de septiembre se realizó la publicación del aviso y estudios previos del contrato de interventoría. 2. El 29 de septiembre se realizó la publicación de los pliegos definitivos del contrato de interventoría cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.** 3. El 15 de septiembre se realizó la publicación de los pliegos definitivos del contrato de obra con objeto **CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META** 4. El 22 de septiembre fue el plazo máximo para la presentación de ofertas del contrato de obra, la cual cerró con un total de 6 oferentes. 5. El 03 de octubre se realizó la presentación del informe de evaluación de los oferentes del contrato **CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META**		
	OBSERVACIONES		

INVERSION ANTICIPO

DATOS ESPECÍFICOS:

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 001 Fecha: Agosto de 2017

ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA	DESCRIPCION	FECHA	VALOR	OBSERVACION
001	ACTA DE INICIO CONTRATO Y/O CONVENIO	06/07/2023	$0	SE SUSCRIBIÓ ACTA DE INICIO

MAYERLY ANDREA ESPINOSA
Supervisor
