Villavicencio-Meta, 12 de diciembre de 2023.

Doctora
María Dayineth Duarte Sánchez.
Directora Departamento Administrativo de Planeación.
GOBERNACIÓN DEL META-PLANEACIÓN.

Asunto: Documento de Balance ejecución físico – financiera.

Proyecto: "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"- BPIN 2022005500071.

Por medio de la presente me permito presentar el balance de la ejecución física y financiera del proyecto denominado **"ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"**, con código BPIN 2022005500071, proyecto que ha requerido ser ajustado con sustento a lo previsto en los lineamientos para los ajustes y liberaciones de proyectos de inversión, publicados por el Departamento Nacional de Planeación en la página web del Sistema General de Regalías, de conformidad con el artículo 4.5.1.2.1. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, *para los ajustes a los proyectos de inversión aprobados que versen sobre modificación del valor total del proyecto, fuentes de financiación o cambio de ejecutor.* Dicho balance se certifica en concordancia con el reporte de información en plataforma GESPROY SGR con corte al 30/09/2023 (pantallazo adjunto).


RELACION AVANCE EJECUCION FISICA DEL PROYECTO SEGUN APLICATIVO GESPROY				
EJECUTADO CONTRATO DE OBRA	EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORIA	EJECUTADO APOYO A LA SUPERVISION	PAGOS LICENCIAS Y PERMISOS COMPLEMENTARIOS	TOTAL
$2.383.418.200,76	$ 620.946.887,39	$ 98.032.736,40	$272.146.761	$ 3.374.544.585,55

VALOR PROYECTO - OBRA	$25.493.479.868.45
VALOR PROYECTO - INTERVENTORIA	$1.380.532.218.08
VALOR PROYECTO - APOYO A LA SUPERVISION	$153.600.000,00
VALOR PROYECTO - LICENCIAS Y PERMISOS COMPLEMENTARIOS	$619.626.406.32
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$27.647.238.492,85**

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
12,21%	30,47%

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

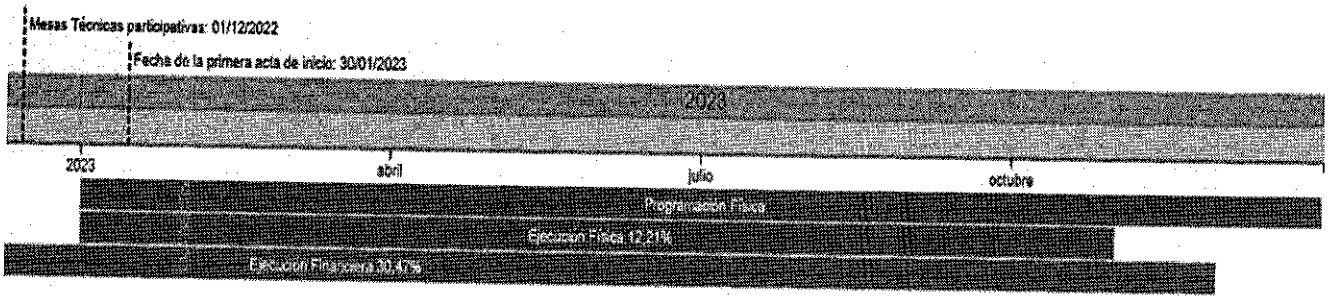

Fuente: Aplicativo Gesproy - corte al 11/12/2023

Dado en el municipio de Villavicencio, departamento del Meta, a los once (11) días del mes de diciembre de 2023.

Supervisión – MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN_____

Interventoría – R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES _____

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co

HACEMOS GRANDE AL META | GOBERNACIÓN DEL META
