Informe de avance físico, económico, financiero y legal

"ADECUACION JUEGOS PRIMERA INFANCIA, PARQUE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE OBANDO, VALLE DEL CAUCA"

CONTRATO No. OB-063-2023



INFORME No.2

20 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023

OBANDO – VALLE DEL CAUCA

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se pretende dar a conocer sobre el avance del periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2023 y el 30 de octubre de 2023, en el cual se encuentra la obra "ADECUACION JUEGOS PRIMERA INFANCIA, PARQUE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE OBANDO, VALLE DEL CAUCA"

Este proyecto consiste en la construcción completa de la zona de juegos para niños, de la cual se tienen proyectado la instalación de un parque metálico que consta de dos plataformas sencillas, un cerramiento, dos plataformas en alfajor, un techo flor en fibra de vidrio tipo americano, un deslizadero doble en fibra de vidrio tipo americano, un panel transparente, un trikie de plástico y una escalera, que permitan la integra funcionalidad del parque. Este proyecto se encuentra ubicado en el Parque Principal Pedro Heriberto Quintero costado Horizontal, perímetro urbano del municipio de Obando, Departamento de Valle del Cauca, y se construye de acuerdo con los planos arquitectónicos, estructurales, topográficos, sanitarios y eléctricos, además de tener como base las especificaciones técnicas determinadas.

INFORME TÉCNICO DE OBRA MENSUAL No.2

Fecha:	30 DE OCTUBRE DE 2023
Lugar:	OBANDO – VALLE DEL CAUCA
Asunto:	INFORME DE OBRA No. 2

2. DATOS GENERALES

Entidad Contratante:	Municipio de Obando NIT: 891.900.902-3
Contratista de Obra:	Vida Nueva Arquitectura e Ingeniería NIT: 805030308-1
Representante legal contratista:	Valeria Zapata Muñoz
Dirección:	Calle 10 #3-23 LC 108
Teléfono:	
Correo electrónico:	Fvidanueva1@gmail.com
Contrato de obra N°	OB-063-2023
Supervisor:	Sebastián Mafla
Objeto del contrato:	"ADECUACION JUEGOS PRIMERA INFANCIA, PARQUE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE OBANDO, VALLE DEL CAUCA"
Valor del Contrato de obra:	$304.385.999
Anticipo:	
Plazo:	Hasta el 4 de Diciembre de 2023
Fecha de inicio:	19 de Septiembre de 2023
Fecha de terminación:	4 de Diciembre de 2023

3. LOCALIZACIÓN

El lugar de ejecución del contrato.

- Municipio de Obando – Valle del Cauca

Obando es uno de los 42 municipios que conforman el Departamento del Valle del Cauca, localizado en la región norte del Departamento. Ubicado en la ribera oriental del río Cauca y entre la Cordillera Occidental y la Cordillera central. En la siguiente imagen se observa su ubicación geográfica:



4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El objeto del proyecto es “ADECUACION JUEGOS PRIMERA INFANCIA, PARQUE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE OBANDO, VALLE DEL CAUCA”.

En el cual se plantea inicialmente la construcción de un parque de juegos para niños, con materiales y juegos de calidad para que cumpla con su correcto funcionamiento.

El resumen de actividades para la ejecución del proyecto es el que se describe a continuación.

1- **PRELIMINARES**
2- **MOVIMIENTOS DE TIERRA**
3- **CORDON CONFINAMIENTO Y PEDESTALES**
4- **PISOS**
5- **JUEGOS Y DOTACIÓN**
6- **MATERAS**
7- **LIMPIEZA Y ASEO**
8- **PLUVIAL**
9- **EXCAVACIONES Y RELLENOS**
10- **TUBERIAS Y ACCESORIOS**
11- **REPOSICIÓN PAVIMENTO**
12- **FILTRO**
13- **COMPONENTE ELECTRICO**

5. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Se presenta el presupuesto oficial del contrato No. OB-063-2023, el cual es base para la presente acta de obra No.2

CAP						
	ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**VLR PARCIAL**	**VR TOTAL**
	1	**JUEGOS INFANTILES DE PRIMERA INFANCIA**				**$ 223.813.235**
	1,1	**PRELIMINARES**				
100119	1.1.1	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	147,39	$ 10.245	$ 1.510.011
010112	1.1.2	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z. VERDES	M2	299,49	$ 930	$ 278.526
600316	1.1.3	DESMONTE JUEGO	UND	4,00	$ 128.890	$ 515.560
300316	1.1.4	DESM. BANCA EN CONCRETO	UND	6,00	$ 129.980	$ 779.880
100314	1.1.5	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2	74,30	$ 5.050	$ 375.190

CAP						
	ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**VLR PARCIAL**	**VR TOTAL**
	1,2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**				
010203	1,2,1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	135,99	$ 3.000	$ 407.959
100601	1,2,2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	0,27	$ 18.060	$ 4.917
100626	1,2,3	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA BOTADERO OFICIAL<=20KM.	M3	146,36	$ 33.720	$ 4.935.258
080603	1,2,4	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	305,67	$ 2.550	$ 779.453
010215	1,2,5	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	305,67	$ 750	$ 229.251
NV1215	1,2,6	GEOTEXTIL NO TEJIDO 3000	M2	277,15	$ 8.660	$ 2.400.119
080206	1,2,7	RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA)	M3	95,09	$ 24.320	$ 2.312.570
080102	1,2,9	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	M3K	2263,12	$ 1.720	$ 3.892.573
	1,3	**CORDON CONFINAMIENTO Y PEDESTALES**				
120210	1.3.1	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	15,36	$ 24.380	$ 374.384
NV6229	1.3.2	CORDON EN CONCRETO 3100PSI	M3	5,43	$ 638.480	$ 3.468.862
NV1023	1.3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA	KLS	687,91	$ 6.210	$ 4.271.929
120401	1.3.4	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	1,44	$ 480.430	$ 690.378
NV1023-1	1.3.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA	KLS	120,50	$ 6.210	$ 748.280
NV6238	1.3.6	ANCLAJE BASTON VARILLA DE ½"X550MM	PTO	36,00	$ 12.050	$ 433.800
NV6242	1.3.7	ANCLAJE BASTON VARILLA DE ½"X400MM	PTO	40,00	$ 11.250	$ 450.000
	1,5	**PISOS**				
NV6196	1.4.1	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	1026,64	$ 7.450	$ 7.648.434
NV6235	1.4.2	LOSA MACIZA CONCRETO SOBRE PISO	M3	26,93	$ 584.930	$ 15.749.825
330127	1.4.3	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	ML	600,46	$ 5.360	$ 3.218.466
321005	1.4.4	SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO	ML	600,46	$ 32.370	$ 19.436.890
NV1123	1.4.5	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA 20 MM/GOMA 3 CM = 5 CM	M2	86,87	$ 353.080	$ 30.672.413

CAP						
	ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**VLR PARCIAL**	**VR TOTAL**
NV6180	1.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAMA SINTETICA PAISAJISMO DE 20MM DE ALTURA MONOFILAMENTO BICOLOR	M2	20,10	$ 106.980	$ 2.150.298
080405	1.4.7	IMPRIMACION	M2	106,96	$ 2.750	$ 294.140
131206	1.4.8	ESCALERA CONCRETO 3000 PSI	M3	2,08	$ 973.580	$ 2.020.179
	1,5	**JUEGOS Y DOTACION**				
NV6206	1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MÚLTIPLE SAL028/51	UND	1,00	$ 14.988.050	$ 14.988.050
NV6266	1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO JFS10 MUELLE (BURRO)	UND	1,00	$ 7.717.090	$ 7.717.090
NV6267	1.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL MUELLE METÁLICO JFS07	UND	1,00	$ 8.371.590	$ 8.371.590
NV6268	1.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL MUELLE METÁLICO JFS08	UND	1,00	$ 8.907.090	$ 8.907.090
600303	1.5.5	SEÑALETICA	UND	2,00	$ 568.840	$ 1.137.680
NV6195	1.5.6	BANCA CONCRETO PREF. L=100-140 A=56 H=78	UND	5,00	$ 496.010	$ 2.480.050
600304	1.5.7	CANECA DE BASURA ACERO INOXIDABLE	UND	3,00	$ 893.040	$ 2.679.120
300220	1.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	0,94	$ 64.490	$ 60.363
NV6197	1.5.9	PRADO TRENZA	M2	18,72	$ 8.920	$ 166.982
	1,6	**MATERAS**				
010112-2	1.6.1	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z. VERDES	M2	149,71	$ 930	$ 139.230
081001	1.6.2	DEMOL.ANDEN E=0.10	M2	44,20	$ 3.740	$ 165.308
100108	1.6.3	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS	M2	62,73	$ 4.210	$ 264.093
100601-3	1.6.4	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	12,55	$ 18.060	$ 226.581
100626-4	1.6.5	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA BOTADERO OFICIAL<=20KM.	M3	90,00	$ 33.720	$ 3.034.800
080603-5	1.6.6	CONFORM.COMPACT. SUBRASANTE CBR=95	M2	62,73	$ 2.550	$ 159.962
010215-6	1.6.7	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	62,73	$ 750	$ 47.048
120213	1.6.8	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	12,55	$ 427.970	$ 5.369.312

CAP						
	ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**VLR PARCIAL**	**VR TOTAL**
120205	1.6.9	MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=1.00MTS	M3	9,13	$ 580.150	$ 5.297.930
NV1023-7	1.6.10	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA	KLS	1550,81	$ 6.210	$ 9.630.535
190118	1.6.11	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M2	61,35	$ 29.710	$ 1.822.709
290619	1.6.12	KORAZA [3M]	M2	61,35	$ 9.260	$ 568.101
NV6269	1.6.13	REMATE EN LADRILLO ARAGÓN 10X20 CM	ML	122,08	$ 30.270	$ 3.695.362
NV6229-9	1.6.14	CORDON EN CONCRETO 3100PSI	M3	2,01	$ 638.480	$ 1.281.302
NV1023-10	1.6.15	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA	KLS	367,40	$ 6.210	$ 2.281.549
NV6196-11	1.6.16	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	103,16	$ 7.450	$ 768.566
080502	1.6.17	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	34,16	$ 58.260	$ 1.990.162
	1,7	**LIMPIEZA Y ASEO**				
310105	1.7.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	830,13	$ 1.780	$ 1.477.631
	2	**PLUVIAL**				
	2.1	**PRELIMINARES**				
010106	2.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	52,52	$ 1.870	$ 98.212
	2.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
100601	2.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	22,15	$ 18.060	$ 400.051
100608	2.2.2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	22,15	$ 16.870	$ 373.691
100616	2.2.3	RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO COMPACTAD	M3	2,45	$ 86.830	$ 212.430
080208	2.2.4	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	5,24	$ 84.100	$ 440.894
010206	2.2.5	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO CILIND	M3	1,40	$ 13.430	$ 18.775
010201	2.2.6	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	9,09	$ 1.720	$ 15.630
	2.3	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS**				
110105	2.3.1	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	1,00	$ 301.980	$ 301.980
020430	2.3.2	EMPALME TUB CONCR 8”-12” CAMARA CONCRETO	UND	1,00	$ 109.950	$ 109.950
020705	2.3.3	TUB PVC NOVAFORT 6”	ML	56,96	$ 55.420	$ 3.156.932
	2.4	**REPOSICIÓN PAVIMENTO EXISTENTE**				

CAP						
	ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**VLR PARCIAL**	**VR TOTAL**
100417	2.4.1	ROTURA PAVIMENTO	M2	31,80	$ 9.510	$ 302.418
081002	2.4.2	DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=15CM	M2	31,80	$ 9.630	$ 306.234
080301	2.4.3	PAV.CONCR MR=36 INC.JUNTA	M3	4,77	$ 424.520	$ 2.024.960
081001	2.4.4	DEMOL.ANDEN E=0.10	M2	31,73	$ 3.740	$ 118.685
080502	2.4.5	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	31,73	$ 58.260	$ 1.848.823
	2.5	**FILTRO**				
040602	2.5.1	MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1"	M3	8,77	$ 31.420	$ 275.428
110508	2.5.2	TUB.PVC 4 DREN.SF	ML	29,22	$ 21.460	$ 627.061
110903	2.5.3	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	36,38	$ 4.550	$ 165.547
	3	**COMPONENTE ELÉCTRICO**				
NV6062	3.1	ACOM. E. 2F (2#6 AWG AL SERIE 8000 AISLADO XLPE 600V) DUCTO PVC 2" + RESERVA	ML	26,00	$ 31.980	$ 831.480
NV6063	3.2	BAJANTE ALIMENTACION AP EN TUBERIA IMC 2". INCLUYE CINTA BANDIT, CAPACETE, ADAPTADOR TERMINAL	ML	7,00	$ 121.910	$ 853.370
NV6121	3.3	CABLES RHH/RHW/USE-2 AA8000 90°C 600V; Calibre 6 AWG	ML	26,00	$ 6.020	$ 156.520
061083	3.4	CONECTOR PERFORACION AMFRAU P/ACOMETI	UND	4,00	$ 23.540	$ 94.160
060810	3.5	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	3,36	$ 13.690	$ 45.998
NV1015	3.6	CAJA ELECTRICA NORMA EMCALI 0.4X0.4X0.75MT	UND	2,00	$ 443.510	$ 887.020
NV5011	3.7	KIT SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ACERO INOXIDABLE (SPT LAP)	UND	2,00	$ 264.710	$ 529.420
060633	3.8	POSTE LAMINA 1/ 8" X 9 MTS NORMA EPSA"	UND	2,00	$ 1.732.800	$ 3.465.600
NV6204	3.9	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL	UND	4,00	$ 44.950	$ 179.800
NV6064	3.10	CABLE COBRE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 600 V	ML	44,00	$ 13.210	$ 581.240
NV6230	3.11	LUMINARIA LED COMPLETA ACORDE AL DISEÑO ELÉCTRICO	UND	2,00	$ 2.745.040	$ 5.490.080
060701	3.12	FOTOCELDA CON BASE	UND	2,00	$ 31.790	$ 63.580

CAP						
	ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**VLR PARCIAL**	**VR TOTAL**
NV6270	3.13	PERCHA DE DOS PUESTOS Y AISLADOR CARRETE PARA RED AÉREA BAJA TENSIÓN	UND	1,00	$ 36.350	$ 36.350
061227	3.14	RETIRO DE POSTE	UND	2,00	$ 278.230	$ 556.460
061211	3.15	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	2,00	$ 29.100	$ 58.200
061205	3.16	DESCONEXION RED SECUNDARIA 1 O 2 HILOS	ML	13,00	$ 1.540	$ 20.020
	8	**INCREMENTO POR TRANSPORTE Y GRADO DE DIFICULTAD**		2,00%	$ 219.424.740	$ 4.388.495
STCAP					**SUBTOTAL CAP**	**$223.813.235**

SUBTTL	**VALOR COSTOS DIRECTOS**	**$223.813.235**

COSTIND	**COSTOS INDIRECTOS**		
TTLCD	**VALOR COSTOS DIRECTOS**		**$223.813.235**
ADM	ADMINISTRACION	29,00%	$64.905.839
IMPR	IMPREVISTOS	1,00%	$2.238.132
UTL	UTILIDAD	6,00%	$13.428.794
TTLAIU	**TOTAL AIU**	**36,00%**	**$80.572.765**
IVA	IVA SOBRE LA UTILIDAD	0,00%	**$ -**
TTLPPTO	**VALOR TOTAL PRESUPUESTO**		**$304.385.999**

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la ejecución del proyecto inicialmente fue de cincuenta y nueve (59) días contando a partir de la firma del acta de inicio la cual tiene como fecha el 19 de septiembre de 2023. Debido a suspensión de la obra por diecisiete (17) días entre las fechas del 31 de octubre de 2023 al 16 de noviembre del 2023 se aumentó el plazo de terminación de la obra al 4 de diciembre de 2023.

7. CONTRATO DE OBRA

Contrato de obra No. OB-063-2023, cuyo objeto es “ADECUACION JUEGOS PRIMERA INFANCIA, PARQUE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE OBANDO, VALLE DEL CAUCA”.

8. AVANCE EN LA INVERSIÓN DE LA OBRA

Informe de avance

ACTAS	V/R ACTAS
ACTA PARCIAL DE OBRA 1	$ 121.746.111,00
ACTA PARCIAL DE OBRA 2	$ 121.755.392,00
VALOR ACUMULADO DE OBRA	$ 243.501.503,00
% DE AVANCE ACUMULADO	80.00 %
VAROR TOTAL DEL CONTRATO	$ 304.385.999,00

% EJECUTADO DEL 20 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023
80.00%

9. CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADAS POR SUSPENSION.

GARANTIA	ASEGURADORA	N° POLIZA	DESDE	HASTA	VR. ASEGURADO
Predios labores y operaciones	Aseguradora solidaria de Colombia	430-47-994000062704	19/09/2023	04/04/2024	$ 232.000.000,00
Cumplimiento del contrato		430-47-994000062704	19/09/2023	04/04/2024	$ 60.877.200,00
Anticipo		430-47-994000062704	19/09/2023	04/04/2024	$ 121.754.400,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		430-47-994000062704	19/09/2023	4/12/2026	$ 30.438.600,00
Estabilidad y calidad de la obra		430-47-994000062704		5 AÑOS	$ 60.877.200,00

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4302891504

PÓLIZA No: 430 - 47 - 994000062704 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI SUR COD. AGENCIA: 430 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	30	11	2023
FECHA DE IMPRESIÓN	30	11	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: VIDA NUEVA , ARQUITECTURA E INGENIERIA IDENTIFICACIÓN: NIT 805.030.308-1

DIRECCIÓN: CL 10 110 ED COLOMBIA NRO. 3 23 LC CIUDAD: CALI, VALLE TELÉFONO: 6025546409

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL -FONPACIFICO IDENTIFICACIÓN: NIT 901.039.684-5

BENEFICIARIO: FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL -FONPACIFICO IDENTIFICACIÓN: NIT 901.039.684-5

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	19/09/2023	04/04/2024	60,877,200.00
ANTICIPO	19/09/2023	04/04/2024	121,754,400.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	19/09/2023	04/12/2026	30,438,600.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		60,877,200.00

BENEFICIARIOS
NIT 901039684 - FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL -FONPACIFICO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN SUSPENSION No.1 30 DE OCTUBRE DE 2023 Y REINICIO No. 1 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA No. OB-063-2023, DE FECHA 28/08/2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON LA ADECUACION JUEGOS PRIMERA INFANCIA, PARQUE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE OBANDO, VALLE DEL CAUCA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***273,947,400.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSUL	7631	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCION Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISION DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000430289150

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADB207A0609FD7C58

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI SUR COD. AGENCIA: 430 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000062704 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: VIDA NUEVA , ARQUITECTURA E INGENIERIA IDENTIFICACIÓN: NIT 805.030.308-1

ASEGURADO: FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL -FONPACIFICO IDENTIFICACIÓN: NIT 901.039.684-5

BENEFICIARIO: FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL -FONPACIFICO IDENTIFICACIÓN: NIT 901.039.684-5

TEXTO ITEM 1

ASEGURADO BENEFICIARIO: EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO con NIT 901039684-5, EL MUNICIPIO DE OBANDO, VALLE DEL CAUCA con NIT 891.900.902-3, la GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA con NIT 890.399.029-5 y el INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA-INDERVALLE con NIT 805.012.896-4

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4302891546

PÓLIZA No: 430 -74 - 994000023151 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI SUR — COD. AGE: 430 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA MES AÑO)	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE (DIA MES AÑO HORAS)	A LAS	VIGENCIA HASTA (DIA MES AÑO HORAS)	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA MES AÑO)
30 11 2023		19 11 2023	23:59	04 12 2023	23:59	15	30 11 2023

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE (DIA MES AÑO HORAS)	A LAS	VIGENCIA HASTA (DIA MES AÑO HORAS)	A LAS	DIAS
	19 11 2023	23:59	04 12 2023	23:59	15

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: VIDA NUEVA , ARQUITECTURA E INGENIERIA — IDENTIFICACIÓN: NIT 805.030.308-1
DIRECCION: CL 10 110 ED COLOMBIA NRO. 3 23 LC — CIUDAD: CALI, VALLE — TELÉFONO: 6025546409

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: VIDA NUEVA , ARQUITECTURA E INGENIERIA — IDENTIFICACIÓN: NIT 805.030.308-1
DIRECCIÓN: CL 10 110 ED COLOMBIA NRO. 3 23 LC — CIUDAD: CALI, VALLE — TELÉFONO: 6025546409
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: VIDA NUEVA , ARQUITECTURA E INGENIERIA NIT : 805030308

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: VALLE CIUDAD: OBANDO

DIRECCION: MUNICIPIO DE OBANDO, VALLE DEL CAUCA

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: SI APLICA TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 232,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232,000,000.00		
	RCE PATRONAL	232,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN SUSPENSION No.1 30 DE OCTUBRE DE 2023 Y REINICIO No. 1 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

DESDE: 19/09/2023 HASTA 04/12/2023.

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. OB-063-2023
ADECUACION JUEGOS PRIMERA INFANCIA, PARQUE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE OBANDO, VALLE DEL CAUCA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***232,000,000.00	$ *****************0	$*********0.00	$ ************0	$ *****************0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSUL	7631	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR — FIRMA TOMADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000430289154

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADB207A0609FD7D5F — CLIENTE — MSALAZARPATRI 0

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2599 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000023151 ANEXO: 2 TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA PAGINA: 3

TOMADOR: VIDA NUEVA , ARQUITECTURA E INGENIERIA IDENTIFICACION: 805.030.308-1

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	VIDA NUEVA , ARQUITECTURA E	805030308-1	MUNICIPIO DE OBANDO, VALLE DEL	OBANDO	232,000,000.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

10. ACTIVIDADES Y CANTIDADES REALIZADAS A LA FECHA

Actividades ejecutadas en el periodo de pago comprendido entre el 20 de octubre de 2023 al 30 de octubre de 2023.

1. JUEGOS INFANTILES DE PRIMERA INFANCIA

1.1 PRELIMINARES

1.1.1	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	+178,00
1.1.2	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z. VERDES	M2	+329.28
1.1.3	DESMONTE JUEGO	UND	+4.00
1.1.4	DESM. BANCA EN CONCRETO	UND	+5.00
1.1.5	DEMOL. MURO LAD. SOGA	M2	+72.38

1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1.2.1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	+267.31
1.2.3	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA	M3	+355.33
1.2.4	CONFORM.COMPACT. SUBRASANTE CBR=95	M2	+329.28
1.2.5	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	+329.28
1.2.6	GEOTEXTIL NO TEJIDO 3000	M2	+329.28
1.2.7	RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP	M3	+102.67
1.2.9	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	M3K	+4517.57

1.3 CORDON CONFINAMIENTO Y PEDESTALES

1.3.1	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	+106.58
1.3.2	CORDON EN CONCRETO 3100 PSI	M3	+5.22
1.3.3	ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 MPA	KLS	+587.41

1.4 PISOS

1.4.8	ESCALERA CONCRETO 3000 PSI	M3	+9.58

1.6 MATERAS

1.6.1	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z. VERDES	M2	+315.45
1.6.4	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO	M3	+12.04
1.6.5	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA BOT	M3	+90.00
1.6.8	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	+12.04
1.6.9	MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=1.00MTS	M3	+7.90
1.6.10	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA	KLS	+1500.28

2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

2.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	+17.70
2.2.2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM	M3	+22.23

2.4 REPOSICIÓN PAVIMENTO EXISTENTE

2.4.1	ROTURA PAVIMENTO	M2	+638.51

2.4.2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO CONCRETO E=15CM	M2	+638.51

2.5 FILTRO

2.5.1 MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1"	M3	+17.10
2.5.2 TUB.PVC 4 DREN.SF	ML	+57.01
2.5.3 GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	+68.41

3. COMPONENTE ELECTRICO

3.14 RETIRO POSTE	UND	+2.00
3.16 DESMONTE LUMINARIAS	UND	+2.00
3.16 DESCONEXION RED SECUNDARIA 1 O 2 HILOS	ML	+13.00

11. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS




INSTALACION GETEXTIL 3000



RELLENO



COMPACTACION SUBRASANTE

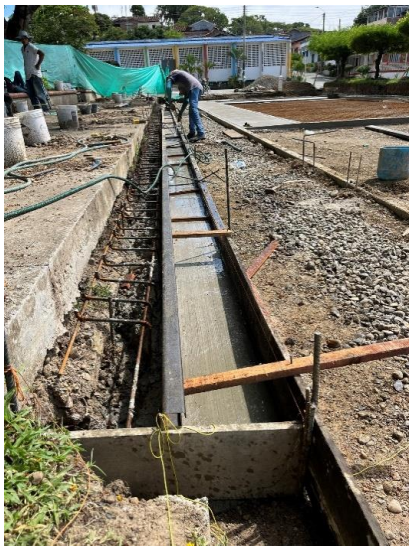

FUNDICIÓN ESCALERAS





PROCESO CONSTRUCCION DE FILTRO





FORMALETEO Y FUNDICIÓN MUROS CONTENCION PARA MATERAS





BORDILLOS E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA n.6



FUNDICIÓN LOSA EXTERNA, INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA




FUNDICION LOSA E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA




TOMA DE DENSIDADES EN MATERIAL COMPACTADO

HOMERO BEDOYA RUIZ
Supervisor
CC N° 6.361.545 Obando (V)
Secretario de Infraestructura
