
INFORME No. 13

PERIODO: 06 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 05 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO N° 0757-23 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA".

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LEONARDO MANTILLA NOGUERA	

UT. INTERCOMEDOR ITSI
901.683.399-1

BARRANCABERMEJA, SANTANDER
ABRIL 2024

INFORME No. 13 DE INTERVENTORÍA

CONTRATO N° 0757-23 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA".



ABRIL 2024

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN **5**
OBJETIVOS **6**
1. CAPITULO I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO **7**
1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
1.2. ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO 8
1.3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO 10
1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 10
1.5. INFORMACIÓN SOPORTE DEL PROYECTO 10
2. CAPÍTULO II. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA **11**
2.1. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO 11
2.2. ACTAS SUSCRITAS 12
2.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO SEMANAL 12
2.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 13
2.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS 15
2.6. CONTROL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 15
2.7. CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 16
2.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD 16
2.9. CONTROL DE GARANTÍAS 17
2.10. COMITÉ DE OBRA 17
3. CAPITULO III. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA **18**
3.1. ASPECTO LEGAL Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 18
3.2. ACTAS SUSCRITAS 19
3.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS 19
3.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 20
3.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS 21
3.6. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (SST) 22
3.7. ACTIVIDADES SOCIO AMBIENTALES 22
3.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD 23
3.9. CONTROL DE GARANTIAS 23
3.10. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO 23

4. CAPITULO IV. CONCLUSIONES 24

5. CAPITULO V. ANEXOS 25

5.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO 25

5.2. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 26

5.3. BITÁCORA DE OBRA 27

5.4. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE INTERVENTORÍA 28

5.5. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA 29

5.6. CERTIFICADO MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS 30

5.7. INFORME TÉCNICO DE OBRA 31

5.8. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA 32

5.9. INFORME HSE DE OBRA 33

5.10. INFORME SOCIO AMBIENTAL DE OBRA 34

INTRODUCCIÓN

La Institución educativa Instituto Técnico Superior Industrial - ITSI en el Distrito de Barrancabermeja, busca facilitar el desarrollo integral y el mejoramiento del impacto en el sistema educativo para los estudiantes de la sede principal de la institución, mediante la demolición de la actual cafetería y la construcción del área que cumpla las veces de cafetería y comedor escolar, cumpliendo con las condiciones básicas propuestas en la normativa sanitaria vigente: resolución 2674 de 2013, NTC 4595 y 4596, en las cuales se establece los requisitos y parámetros del diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo, analizando los diagnósticos de infraestructura frente a la existencia, calidad y acceso a los servicios públicos y condiciones de dotación de equipos y menaje en el comedor. Todo esto con el fin de dar inclusión a la promoción y ampliación de cobertura de programas de alimentación que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, para mantener sus niveles de atención, aumentar el porcentaje de permanencia escolar, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje.

Por lo anterior, se hace necesario iniciar proceso de selección de contratistas, para llevar a cabo CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

OBJETIVOS

GENERAL

- ✓ Presentar el estado técnico, administrativo, financiero y legal del contrato de obra ejecutado por el contratista WRUSSY INGENIEROS SAS durante el periodo comprendido entre el 6 de marzo de 2024 al 5 de abril de 2024.


ESPECÍFICOS

- ✓ Informar a la entidad contratante el avance físico y financiero de las actividades contractuales ejecutadas.
- ✓ Dar conocimiento de las diferentes actividades que desarrolló el contratista durante el presente periodo de ejecución del proyecto.
- ✓ Presentar informe de las obras ejecutadas durante el periodo.

1. CAPITULO I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA – SANTANDER

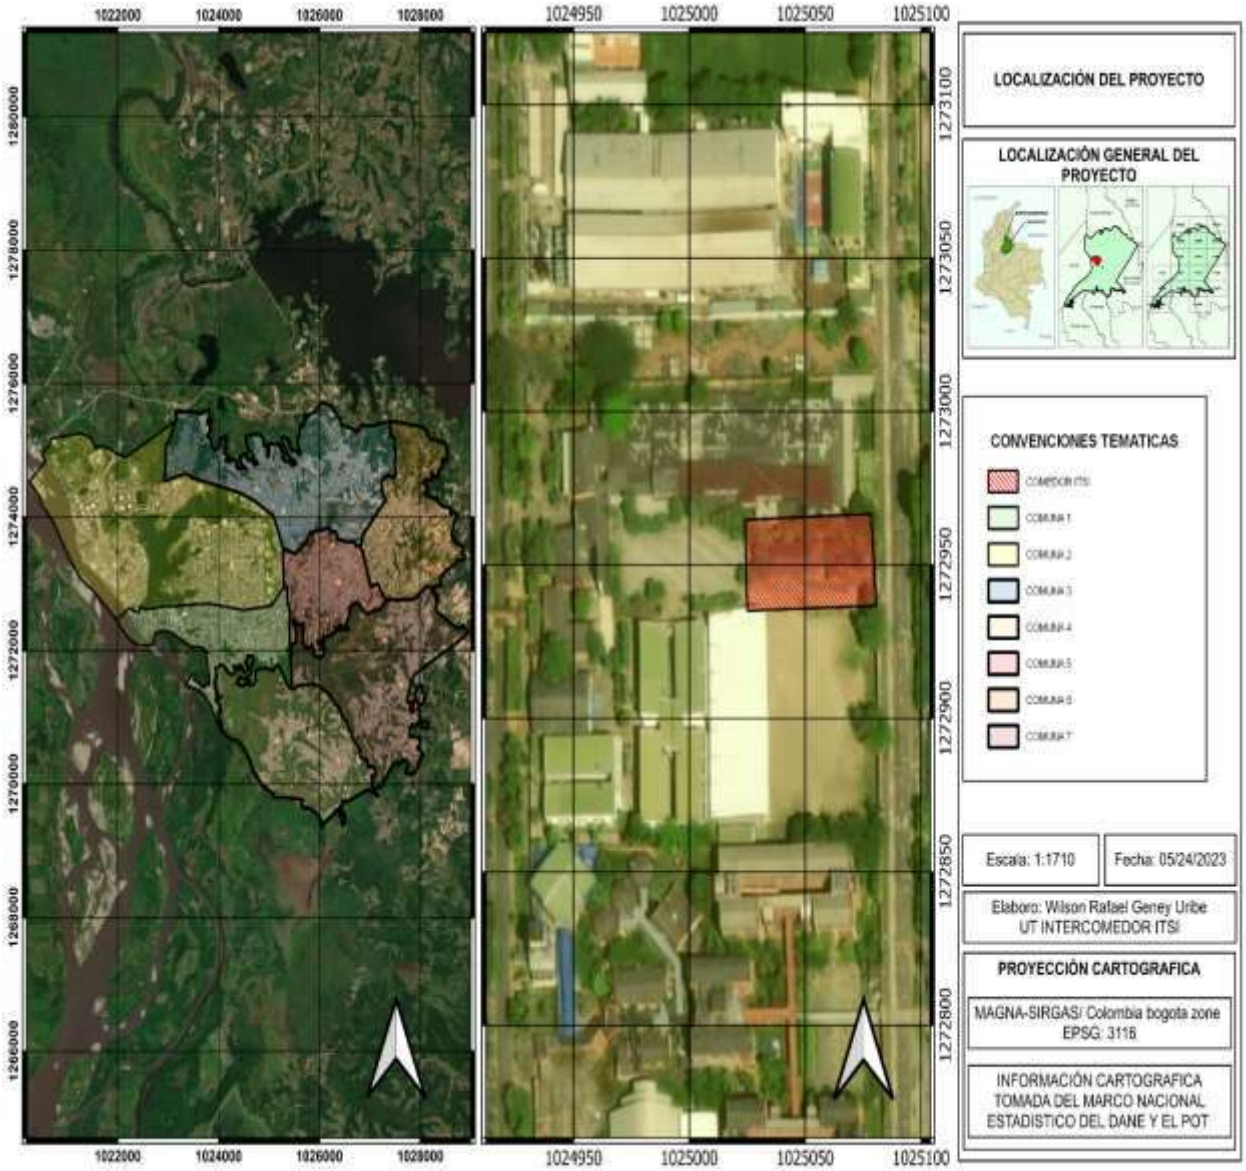


El proyecto de construcción del comedor escolar se encuentra ubicado en la carrera 28 No. 53-08 en el casco urbano del Distrito de Barrancabermeja, Santander, Dentro de las instalaciones del Instituto Técnico Superior Industrial – ITSI

Figura 1. Localización del proyecto.



Fuente: Interventoría.

Figura 2. Planta general cafetería.

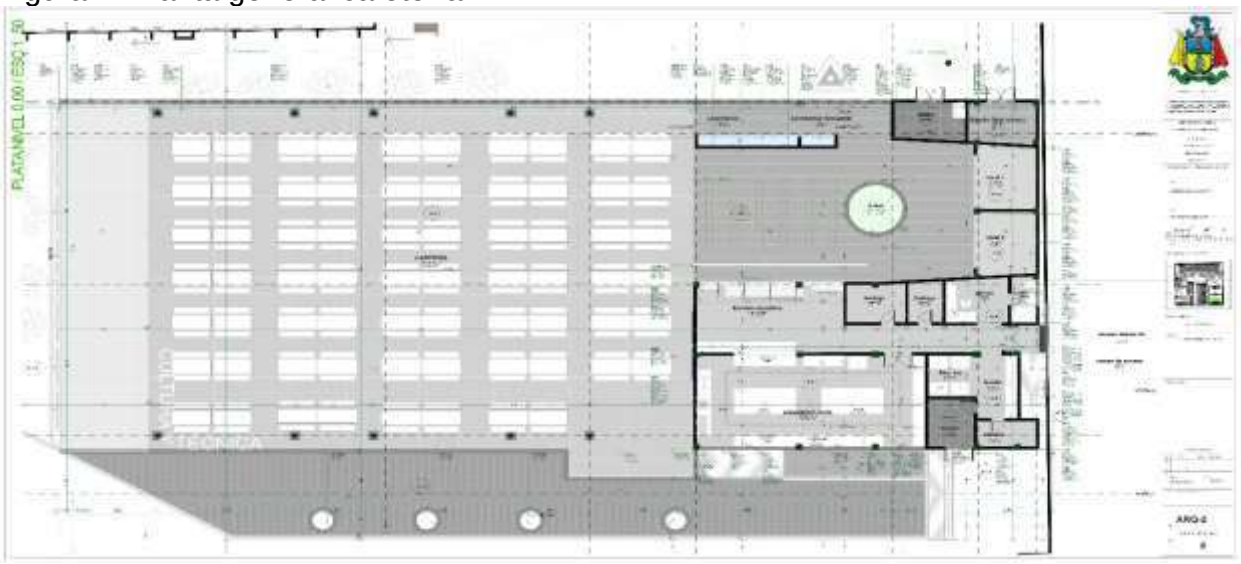

Fuente: secretaria distrital de infraestructura.

1.2. ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO

En este proyecto se indican de forma general las tareas encaminadas para la construcción del restaurante escolar del Instituto Técnico Superior Industrial, el cual será el comedor más grande de la ciudad, beneficiando cerca de 5000 estudiantes, que pasaran de tener comida industrializada a comida caliente preparada en sitio.
En general, las actividades a realizar serán:

- **ACTIVIDADES PRELIMINARES**, comprenden todas las actividades de localización, cerramiento, desmonte de estructuras, demoliciones y demás actividades necesarias para poder adecuar completamente el área disponible para el proyecto.

- **MOVIMIENTOS DE TIERRA**, comprenden las actividades de excavaciones, rellenos de acuerdo a la ubicación definida en planos y bajo estricto control topográfico y el cargue y retiro del material sobrante y de escombros generados durante el proyecto.

- **ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y ACERO ESTRUCTURAL**, corresponde a las actividades de elaboración y vaciados de concretos de sus diferentes resistencias de acuerdo a las especificaciones del elemento, y al suministro de acero estructural para cubiertas, y el suministro y figurado de acero de refuerzo.

- **MAMPOSTERÍA Y FRISOS**, corresponde a la construcción de muros de mampostería y pañete de los mismos.

- **ARQUITECTURA Y ACABADOS**, comprenden actividades de instalación de puertas y ventanas, pasamanos, mesón en granito, acabados de pisos y muros para acabado final. También incluye la cubierta, así como el cielo raso, bajantes y canal metálico, los elementos sanitarios y de cocina y los acabados exteriores finales de la obra.
- **INSTALACIONES HIDRÁULICAS**, comprende actividades de instalación de tuberías de agua fría, cajas de registro, entre otros, para el abastecimiento de agua potable y la construcción del cuarto de bombas para el suministro de agua.

- **INSTALACIONES SANITARIAS**, comprende actividades de instalación de tuberías de desagües, ventilaciones, cajas de registro, entre otros para la eliminación de residuos a través de desagües.

- **ACTIVIDADES DE ALCANTARILLADO**, comprende actividades de instalación de tuberías para la entrega final de aguas lluvias y aguas negras, cajas de inspección y construcción de pozos.

- **INSTALACIONES DE GAS**, comprende actividades de instalación de tubería de gas y conexión para abastecimiento de la infraestructura.

- **INSTALACIONES ELÉCTRICAS**, comprenden todas las actividades de circuitos eléctricos y/o sistemas fotovoltaicos para dotar de energía eléctrica la infraestructura construida.

- **EQUIPOS DE COCINA**, hace referencia a las actividades de suministro e instalación de los equipos y elementos de primera necesidad para la cocina.

1.3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las condiciones técnicas del proyecto se encuentran establecidas en los estudios previos y los diseños propuestos (estudios de conveniencia y oportunidad, planos, especificaciones técnicas), por lo tanto, son inmodificables. El presente contrato de obra pública se realizará de acuerdo al siguiente alcance: **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0756-23 - CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".**

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución inicial del proyecto tiene una duración de 12 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

El día 04 de marzo se suscribieron las actas de adicional en plazo N° 2 al contrato de obra N° 0756-23 y al contrato de interventoría N° 0757-23, para un plazo de ejecución total de 14 meses.

1.5. INFORMACIÓN SOPORTE DEL PROYECTO

El proyecto cuenta con el siguiente soporte técnico:

- Estudios Previos.
- Especificaciones Técnicas de construcción.
- Presupuesto Detallado.
- Análisis de Precios Unitarios.
- Planos y diseños.
- Pliegos de Condiciones.
- Propuesta económica de proponente.
- Acta de adjudicación del contrato.
- Minuta de contrato de Obra Pública.
- Aprobación de Póliza de Garantías.

2. CAPÍTULO II. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

2.1. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO

2.1.1 Información General del Contrato

CUADRO GENERAL DE LA INTERVENTORÍA	
CONTRATO N°:	0757-23
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL:	$ 272.766.458 (DOSIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUANTROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE)
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA
INTERVENTOR CONTRATO:	UT INTERCOMEDOR ITSI
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE MAYO DE 2024
MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

2.2. ACTAS SUSCRITAS

A la fecha se han suscrito las siguientes actas por parte de la interventoría.

ACTAS	FECHA
Contrato de interventoría 0757-23	22 de febrero de 2023
Acta de Inicio de interventoría	6 de marzo de 2023
Acta de recibo parcial N° 1	8 de septiembre de 2023
Acta aclaratoria N°1 al Acta de recibo parcial N° 1	13 de septiembre de 2023
Acta aclaratoria N°2 al Acta de recibo parcial N° 1	21 de septiembre de 2023
Acta de recibo parcial N° 2	25 de octubre de 2023
Acta aclaratoria N°1 al Acta de recibo parcial N° 2	27 de octubre de 2023
Acta de recibo parcial N° 3	19 de diciembre de 2023
Acta aclaratoria N°1 al acta de recibo parcial N°3	20 de diciembre de 2023
Acta aclaratoria N°2 al acta de recibo parcial N°3	21 de diciembre de 2023
Acta adicional N° 1 en plazo	28 de febrero de 2024
Acta parcial N°4	15 de marzo de 2024
Acta adicional N° 2 en plazo	04 de abril de 2024

2.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO SEMANAL

En el presente periodo se observa el siguiente avance de obra y presupuestal del proyecto. Y se hace un comparativo con el porcentaje proyectado según PDT. Esta gráfica se toma como referencia del informe semanal.

Figura 3. Información general avance de la obra.

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	88,31%	99,71%	-11,40%
Durante el periodo	0,61%	-14,37%	14,98%
Acumulado Actual	88,92%	85,34%	3,58%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	-14,37%	85,34%
Valor de la Obra Programada	-$ 377.173.034,75	$ 2.239.993.200,17

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,61%	88,92%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 16.010.824,72	$ 2.333.860.710,87

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

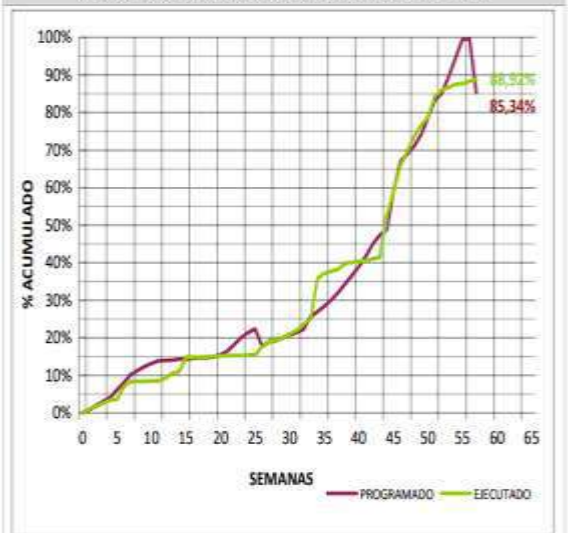

A continuación, se relacionan las actividades técnicas ejecutadas por la interventoría en el periodo:

- La interventoría realiza recorridos diarios de obra, revisando la correcta ejecución de las actividades, verificando que sean construidos en orden y eficiencia y siguiendo las especificaciones técnicas.

- La interventoría verifica que la ejecución del ítem SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN RH COCINA se realice de acuerdo a las especificaciones técnicas.

- Se verifico que la instalación de ESTUCO PARA MURO EXTERIORES se realice teniendo en cuenta los materiales exigidos por las especificaciones técnicas.

- La interventoría verifico la correcta construcción de la MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADOS 1:3 en la zona de placa de entre piso.

- Se verifica la correcta ejecución del ítem ENCHAPE DE MURO EN LAVAMANOS EN CERAMICO ESTRUCTURADA AIRES HORIZONTAL, FORMATO 60X30, BRECHA COLOR BLANCO H=3.00m.

- Se verifica la correcta instalación de la tubería 3 Ductos PVC 4"+3 Ductos PVC 2 para la conexión eléctrica.

- La interventoría verifica la correcta ejecución del ítem ENCHAPE DE PISO EN CERAMICO COLOR SEGÚN ARQUITECTURA FORMATO 33.8X33.8, BRECHA COLOR GRIS.

- Con el fin de llevar un control de la programación para evaluar el avance o atraso del proyecto, se diligencia un formato de informe semanal; esto con el fin de determinar los planes de contingencia necesarios en el caso de presentarse atrasos. **Ver anexo 5.2.**

2.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Por parte de interventoría se verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades.

- La interventoría cumple y exige al contratista el estricto cumplimiento al desarrollo del objeto contractual establecido en los pliegos de condiciones y las especificaciones técnicas.

- La interventoría realiza la presentación de informes mensuales donde se destaca el avance físico y presupuestal del proyecto, y posteriormente informa del cumplimiento o no de las obligaciones del contratista acorde con la realidad del proyecto.

- La interventoría verifica las afiliaciones al sistema de salud y parafiscales del personal que ingresó durante el periodo. Posteriormente se verifica que los pagos de las planillas se hagan oportunamente y se anexe su comprobante de pago en cada informe.

- La interventoría realiza y lleva el registro fotográfico diario de obra, donde se ilustra el avance de las actividades ejecutadas por el contratista.

- La interventoría reviso y aprobó el acta de modificación de ajuste en mayor y menor cantidad de obra y actividades no previstas N°3.

2.4.1 Registro Diario de Obra

Durante el periodo de este informe se diligenció por parte de la interventoría, en equipo con el contratista, la bitácora de obra. En este libro se plasman todas las actividades realizadas día a día con sus respectivas cantidades, visitas técnicas, actividades no previstas, toma de decisiones y cualquier tema relevante para la obra. También se especifica si hay lluvias o climas desfavorables que ameriten suspender labores. **Ver anexo 5.3.**

2.4.2 Plan Detallado de Trabajo – PDT

El proyecto cuenta con un Plan de trabajo detallado (PDT) en Project y un control de programación, donde se discrimina el flujo de inversión programado semanalmente en pesos y en porcentaje, esto con el fin de evaluar periódicamente la ejecución del proyecto y determinar avances o atrasos respectivamente.

2.4.3 Personal de interventoría

A continuación, se relaciona el personal de la interventoría que laboró en este periodo Se anexa planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales. **Ver anexo 5.4.**

PERSONAL	DEDICACIÓN
Director de Interventoría	20%
Residente de Interventoría	100%
Topógrafo	100%
Profesional SST	100%
Auxiliar de Interventoría	100%

2.4.4 Control de equipos de interventoría

A continuación, se presenta la relación de equipos usados por la interventoría durante el periodo de este informe.

EQUIPO	CANTIDAD
Equipo de cómputo portátil	5
Impresora multifuncional	1
Camioneta	1

2.4.5 Licencias

Dentro del periodo de este informe, no se solicita al contratista ningún tipo de licencia para los trabajos a realizar.

2.4.6 Correspondencia

A la fecha de este informe por parte de la interventoría se enviaron las siguientes comunicaciones. **Ver anexo 5.5.**

N°	ASUNTO	FECHA	DESTINATARIO
0022	No Aprobación de Ficha Técnica del Material SIKAMANTO APP 4.2 POLIESTER	06/03/2024	WRUSSY
0023	APROBACIÓN DE FICHA TECNICA MANTO REAL ATV 30 COD. 10132801.	20/03/2024	WRUSSY
0024	APROBACIÓN DE FICHA TECNICA “GRIFERÍA LAVAMANOS DE PARED TIPO PUSH”	22/03/2024	WRUSSY
0025	SOLICITUD ADICIÓN EN PLAZO N°2 AL CONTRATO DE OBRA 0756-23 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA 0757-23	03/04/2024	SEC. DE INFRAESTRUCTURA

2.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Durante el periodo no se suscribieron actas parciales. A continuación, se presenta el resumen financiero del contrato.

ACTA	VALOR	PORCENTAJE
ACTA PARCIAL 1	$ 48.280.624,69	17,7%
ACTA PARCIAL 2	$ 46.832.034,00	17,2%
ACTA PARCIAL 3	$ 16.993.350,33	6,2%
ACTA PARCIAL 4	$112.106.006,34	45,38%
VALOR PARCIAL TOTAL	**$235.887.424,66**	**86,48%**

2.6. CONTROL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Por parte de interventoría se realiza el control estricto de los equipos usados en obra, verificando que su documentación este al día y que su funcionamiento y uso sea el correcto.

- La interventoría verifica diariamente la realización de las charlas de SST antes de iniciar las actividades de obra.

- La interventoría lleva control y verificación de orden y aseo de todas las áreas de trabajo diariamente.

- Por parte de interventoría se verifica constantemente que el señalizador vial o paletero se encuentre en sitio cada vez que ingresan o salen vehículos de carga pesada de obra.

- La interventoría verifica que el contratista realiza recambio continuo de EPP´s que se encuentran en mal estado y no están actos para realizar trabajos. Esto con el fin de proteger la integridad de los trabajadores.

- La interventoría realiza la verificación del certificado de trabajo en altura del personal y a su vez verifica el estado de los equipos y herramientas para realizar dichos trabajos.

2.7. CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

2.7.1 Socializaciones y seguimiento al contrato

La interventoría en compañía con el contratista y el supervisor, realizan semanalmente el comité de obra. Donde se revisan temas de avances de obra, actividades realizadas y se despejan dudas surgidas en la semana de ejecución, al igual que surgen compromisos para mejorar el desarrollo de la obra.

2.7.2 Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental

- La interventoría verifica el mantenimiento periódico de las baterías sanitarias suministradas por la empresa contratista y la disposición de los residuos surgidos en la obra. **Ver anexo 5.6.**

- La interventoría verifica el manejo y buen estado del punto ecológico para la disposición de basuras generadas por el proyecto.

2.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD

2.8.1 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

La interventoría verificó que el contratista a la fecha ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. En lo concerniente al recurso humano se inspeccionó el buen estado de los elementos de protección personal al igual que la

dotación suministrada por el contratista. En el periodo transcurrido toda actividad realizada por el contratista ha tenido el aval de la interventoría y se ha realizado de manera segura y eficiente.

2.9. CONTROL DE GARANTÍAS

La interventoría cuenta actualmente con la póliza N° 400-47-994000090491 Anexo 2 de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA para amparar los riesgos de Cumplimiento del Contrato, Pago de Salarios y prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales.

POLIZA	ASEGURADORA	VIGENCIA		MONTO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	06/03/2023	10/06/2024	$ 54.553.291,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	06/03/2023	04/06/2027	$ 27.276.645,80
CALIDAD DEL SERVICIO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	06/03/2024	04/03/2025	$ 54.553.291,60

2.10. COMITÉ DE OBRA

A la fecha de este informe por parte de la interventoría, contratista y supervisión no se han realizado los siguientes comités de obra.

3. CAPITULO III. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

3.1. ASPECTO LEGAL Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

3.1.1 Información General del Contrato

CUADRO GENERAL DEL CONTRATISTA	
CONTRATO N°:	0756-23
OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL:	$3.684.062.560,88 (TRES MIL SEISIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE)
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
SUPERVISOR:	ING. JUAN CARLOS SILVA RINCON
INTERVENTOR CONTRATO:	UT INTERCOMEDOR ITSI
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	05 DE MAYO DE 2024
MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

3.2. ACTAS SUSCRITAS

A la fecha se han suscrito las siguientes actas por parte del contratista.

TIPO DE CONTRATO	FECHA
Contrato 0756-23	23 de febrero de 2023
Acta de inicio	06 de febrero de 2023
Acta de pactación de precios no previstos #1	28 de agosto de 2023
Acta de modificación de ajuste en mayor y menor cantidad de obra y actividades no previstas #1	29 de agosto de 2023
Acta parcial no.1	11 de septiembre de 2023
Acta aclaratoria n°1 al acta de recibo parcial no.1	13 de septiembre del 2023
Acta aclaratoria n°2 al acta de recibo parcial no.1	21 de septiembre del 2023
Acta parcial no.2	24 de octubre del 2023
Acta aclaratoria n°1 al acta de recibo parcial no.2	27 de octubre del 2023
Acta parcial no.3	19 de diciembre del 2023
Acta aclaratoria n°1 al acta de recibo parcial no.3	20 de diciembre del 2023
Acta de pactación de precios no previstos no.02	26 de diciembre del 2022
Acta de modificación de ajuste en mayor y menor cantidad de obra y actividades no previstas #2	27 de diciembre del 2023
Acta de modificación de ajuste en mayor y menor cantidad de obra y actividades no previstas #3	15 de febrero de 2024
Adicional no.01 en plazo en plazo al contrato de obra pública no.0756-23	28 de febrero de 2024
Acta parcial N°4	15 de marzo de 2024
Acta adicional N° 2 en plazo al contrato de obra publica no. 0756-23	04 de abril de 2024

3.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS

A continuación, se relaciona un resumen de las actividades ejecutadas en el periodo, y se anexa el informe técnico mensual del contratista para ver a detalle las actividades ejecutadas. **Ver anexo 5.7.**

- Se realiza instalación de enchape en muros de mampostería.
- Construcción de muro perimetral placa entrepiso.
- Se realiza la instalación de frisos de mampostería del muro de lavamanos y muro perimetral placa entrepiso.
- Instalación de acero de refuerzo, encofrado y fundida de viga cinta muro perimetral placa entrepiso.
- Se realiza destronque o pulida del piso en granito blanco huila.

- Instalación de acero de refuerzo, encofrado y fundida de alfajía muro perimetral placa entrepiso.
- Fundida de mortero de nivelación en locales 1 y 2.
- Fundida mortero de nivelación impermeabilizado en la placa de entrepiso.
- Construcción de media caña placa de entrepiso.
- Se realiza instalación ducterìa y cableado eléctrico en el área del comedor.
- Se realiza instalación de estructura y cielo raso en PVC.
- Se inicia aplicación de estuco exterior para muros de mampostería.
- Se realiza instalación de enchape gris mikonos en los locales.

3.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3.4.1 Personal de obra del contratista

A continuación, se relaciona el personal de obra del contratista que laboró en este periodo. Se anexa planilla de pago de seguridad social y parafiscales. **Ver anexo 5.8.**

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO DEL TRABAJADOR
Wilver Franciny Russy Ladino	Director de Obra
Cesar Orlando Narváez Quiñonez	Residente de Obra
Carlos Alberto Oviedo Chavarro	Profesional eléctrico
Yesenia Álvarez Acosta	Profesional Social
Sandra Milena Santiago Camacho	Apoyo SST
Antonio José Carvallido Carpio	Ayudante de obra
Elvis Carpio Peñaloza	Ayudante de obra
Elkin Reyes Serrano	Ayudante de obra
Yerson Martínez Carrasquilla	Guarda de seguridad

Durante el periodo comprendido del presente informe se registro el ingreso del personal relacionado a las actividades de montaje de estrcutra de soporte del cortasol y pergolas, el personal se relaciona en el siguiente cuadro.

PERSONAL INSTALACIÓN CIELO RASO EN PVC		FECHA	
NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO DEL TRABAJADOR	INGRESO	SALIDA
Javier Cano Jiménez	Instalador	20/03/2024	
Luis Carlos Mosquera Rueda	Instalador	20/03/2024	

A continuación, se presenta la relación de herramientas y equipos usados por el contratista durante el periodo de este informe.

EQUIPO/HERRAMIENTA	CANTIDAD
Herramienta menor	12
Pulidora 7"	2
Martillo demoledor mediano	1
Vibrador de concreto	1

3.4.2 Correspondencia

En el periodo correspondiente de este informe el contratista envió los siguientes comunicados a la interventoría. **Ver anexo 5.5.**

FECHA	OFICIO N°	ASUNTO	ENVÍA	RECÍBE
06/03/2024	0064-0756	RADICACION FICHA TECNICA MANTO	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
08/03/2024	0066-0756	RADICACION FICHA TECNICA LAVAMANOS	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
08/03/2024	0067-0756	RADICACION FICHA TECNICA MANTO	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
13/03/2024	0070-0756	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE PAGO – SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
19/03/2024	0072-0756	RADICACIÓN FICHA TÉCNICA MANTO	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
22/03/2024	0073-0756	RADICACIÓN FICHA TÉCNICA GRIFERÍA PARED	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
22/03/2024	0074-0756	RADICACION INFORME PRORROGA AL CONTRATO	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI

3.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Durante el periodo no se suscribieron actas parciales. A continuación, se presenta el resumen financiero del contrato.

ACTA	VALOR	PORCENTAJE
ACTA PARCIAL 1	$ 652.092.013,92	17,7%
ACTA PARCIAL 2	$ 468.320.345,00	12,7%
ACTA PARCIAL 3	$ 393.584.241,12	10,7%
ACTA PARCIAL 4	$ 1.671.827.231,59	45,38%
VALOR PARCIAL TOTAL	**$ 3.185.823.831,63**	**86,48%**

3.6. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (SST)

A continuación, se relacionan las actividades principales del área SST, ejecutadas por el contratista. Y se incluye el informe HSE para ver a detalle el trabajo realizado por el equipo de trabajo. **Ver anexo 5.9.**

- Se realizaron las respectivas charlas diarias de seguridad y salud en el trabajo antes de iniciar la jornada laboral.
- Se realizó constantemente la reposición de EPP's por daños a los trabajadores.
- Con ayuda del formato que se implementó de ENCUESTA DE AUTOCUIDADO se pudo determinar que ningún trabajador presentó sintomatología y/o posible contagio de COVID19 en el periodo de este informe.
- Se realizaron inspecciones de herramientas y equipos usados en el periodo.
- Se realizaron inspecciones diarias de áreas verificando el orden y aseo continuo.
- Se realizaron las charlas de seguridad, pausas activas, COPASST, CCL, capacitaciones e inducciones a todo el personal que laboró en el periodo de este informe.
- Se diligenciaron los permisos de trabajo necesarios para las actividades realizadas en el periodo.

3.7. ACTIVIDADES SOCIO AMBIENTALES

A continuación, se relacionan algunas de las actividades principales del área ambiental, ejecutadas por el contratista. Y se incluye el informe Socio Ambiental para ver a detalle el trabajo realizado. **Ver anexo 5.10.**

- Atención a PQRS por parte de representantes del colegio ITSI y comunidad en general y se realiza reunión con los padres de familia del colegio, para presentar el avance y seguimiento actual de obra.
- Se realiza limpieza continua de baños portátiles por parte de la empresa ASSEAR y se aporta el certificado emitido por disposición final de residuos.
- Se realizan las respectivas capacitaciones al personal de obra donde se tratan temas relacionados con la parte ambiental.

3.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD

- Las actividades de obra se han realizado siguiendo y respetando las especificaciones técnicas entregadas por la entidad contratante y con aval de la interventoría.


3.9. CONTROL DE GARANTIAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que ampara el contrato de obra, actualizadas por acta de inicio.

Póliza de cumplimiento	11-44-101198726		
Póliza de Resp. civil Extracontractual	11-40-101051776		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO		
Fecha de expedición:	30 de marzo de 2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha inicial	fecha final	
Cumplimiento de Contrato	*06/03/2023*	*05/11/2024*	$736.812.513,00
Salarios y prestaciones sociales	*06/03/2023*	*05/05/2027*	$368.406.257,00
Estabilidad de la obra	*Si ampara 5 años, o meses y 1 días*		$736.812.513,00
Responsabilidad civil extracontractual	*06/03/2023*	*05/05/2024*	$520.000.000,00

3.10. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el décimo mes de obra, se presentó en general un buen estado del clima dentro de la jornada laboral, lo cual permitió la continuidad a los trabajos de obra.

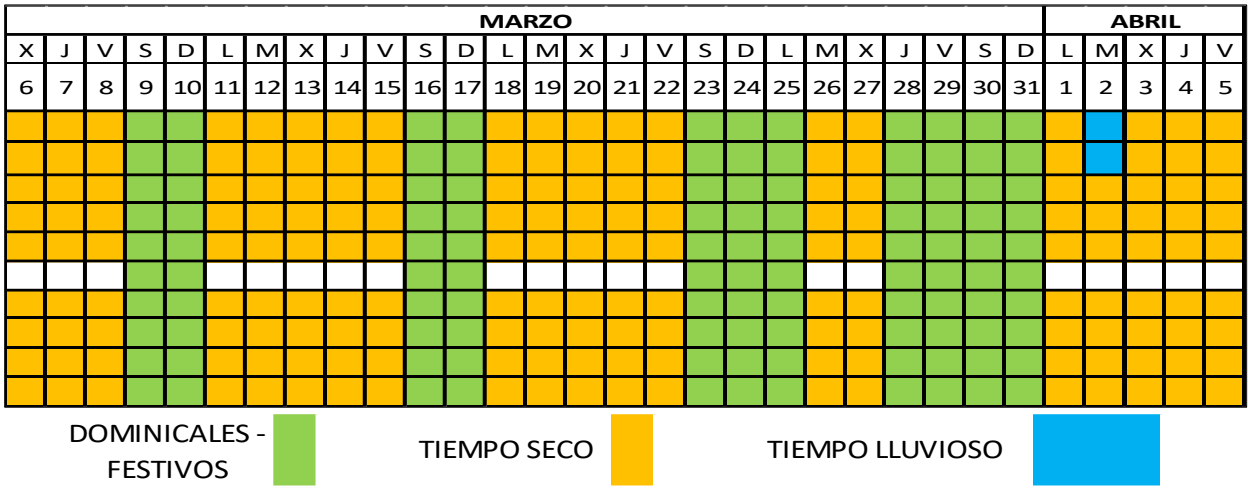

4. CAPITULO IV. CONCLUSIONES

- En el periodo correspondiente a este informe, el contratista cumplió con las actividades realizadas de manera correcta y segura, siguiendo las especificaciones técnicas y las recomendaciones de la interventoría.

- Con la implementación del protocolo y la limpieza y desinfección de manos, herramientas y áreas, se tuvo control con los empleados en cuanto a la prevención y mitigación del contagio de COVID19.

- Los trabajadores contaron con los elementos de protección personal y dotaciones de acuerdo a las exigencias de la obra en mención.

- Durante el periodo correspondiente al siguiente informe no se realizaron modificaciones al contrato de obra e interventoría.

- Durante el periodo de ejecución de presente informe se evidencio un porcentaje de avance físico del 88,92%.

5. CAPITULO V. ANEXOS

5.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
INTERVENTOR:	UT INTERCOMEDOR ITSI
SUPERVISOR:	ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-03-2024 AL 05-04-2024
DIRECCIÓN Y SECTOR:	INTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL

FOTOGRAFIA No.1 – INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN MUROS DE MAMPOSTERÍA.











FOTOGRAFÍA No.2 – CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL PLACA ENTREPISO.









FOTOGRAFÍA No.3 – INSTALACIÓN DE FRISOS DE MAMPOSTERÍA DEL MURO DE LAVAMANOS Y MURO PERIMETRAL PLACA ENTREPISO.









FOTOGRAFÍA No.4 – INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, ENCONFRE Y FUNDIDA DE VIGA CINTA MURO PERIMETRAL PLACA ENTREPISO.









FOTOGRAFÍA No.5 – DESTRONQUE O PULIDA DEL PISO EN GRANITO BLANCO HUILA.





FOTOGRAFÍA No.6 – INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, ENCONFRE Y FUNDIDA DE ALFAJÍA MURO PERIMETRAL PLACA ENTREPISO.











FOTOGRAFÍA No.7 – FUNDIDA DE MORTERO DE NIVELACIÓN EN LOCALES 1 Y 2.





FOTOGRAFÍA No.8 – FUNDIDA MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO EN LA PLACA DE ENTREPISO.





FOTOGRAFÍA No.9 – CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA PLACA DE ENTREPISO.








RUSSY

FOTOGRAFIA No.10 - INSTALACIÓN DUCTERIA Y CABLEADO ELÉCTRICO EN EL ÁREA DEL COMEDOR.





FOTOGRAFIA No.11 - APLICACIÓN DE ESTUCO EXTERIOR PARA MUROS DE MAMPOSTERÍA.









FOTOGRAFIA No.12 - INSTALACIÓN DE ENCHAPE GRIS MIKONOS EN LOS LOCALES.





5.2. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

1. FECHA ELABORACIÓN:	11	3	2024	2. No. INFORME	53	3. SEMANA No.	53
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	04/03/2024 AL 10/03/2024			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	4	2024	11. PLAZO:	12	Meses	
12. PRORROGAS:	30 DIAS			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:			
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA										
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	4	2024	22. PLAZO:	12	Meses	
23. PRORROGAS:	30 DIAS			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:			
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI										
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 63.902.909,26	2,43%	100,00%	2,43%	100,00%	2,43%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 198.285.611,99	7,55%	96,00%	7,25%	100,00%	7,55%	4,00%	0,30%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 1.022.163.601,56	38,94%	97,00%	37,78%	98,49%	38,35%	1,49%	0,58%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 40.195.916,12	1,53%	100,00%	1,53%	99,36%	1,52%	-0,64%	-0,01%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 386.108.835,10	14,71%	82,00%	12,06%	79,07%	11,63%	-2,93%	-0,43%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 22.534.579,16	0,86%	84,00%	0,72%	23,43%	0,20%	-60,57%	-0,52%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 22.432.417,72	0,85%	100,00%	0,85%	74,77%	0,64%	-25,23%	-0,22%
ALCANTARILLADO	$ 36.154.407,39	1,38%	100,00%	1,38%	96,47%	1,33%	-3,53%	-0,05%
INSTALACIONES DE GAS	$ 15.865.988,14	0,60%	95,00%	0,57%	39,32%	0,24%	-55,68%	-0,34%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 172.267.547,40	6,56%	85,00%	5,58%	78,01%	5,12%	-6,99%	-0,46%
EQUIPOS COCINA	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 60.148.795,56	2,29%	7,00%	0,16%	0,00%	0,00%	-7,00%	-0,16%
DOTACIÓN	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 584.664.754,21	22,28%	85,00%	18,93%	79,36%	17,68%	-5,64%	-1,26%
TOTAL	**$ 2.624.725.363,61**	**100,00%**		**89,26%**		**86,70%**		**-2,56%**

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	86,06%	85,32%	0,74%
Durante el periodo	0,64%	4,30%	-3,66%
Acumulado Actual	86,70%	89,62%	-2,92%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	4,30%	89,26%
Valor de la Obra Programada	$ 112.863.190,64	$ 2.342.752.383,58

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,64%	86,70%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 16.798.242,33	$ 2.275.667.767,52

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

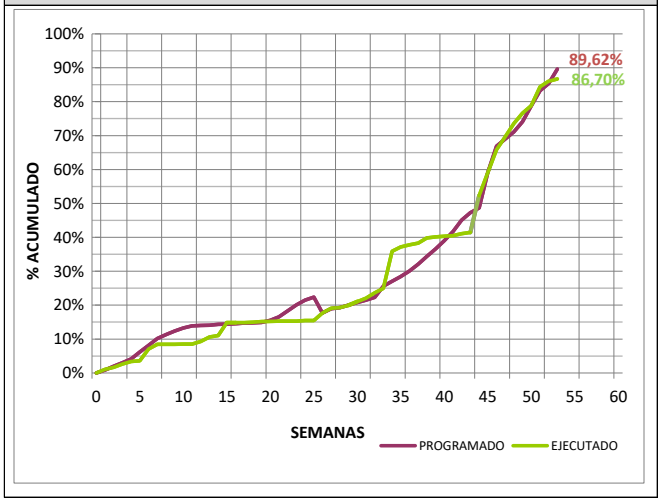

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	11	DEMOLEDOR	0	LUNES	S
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	15	MARTES	S
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	0	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	S
OFICIAL	2	MOTOBOMBA	0	VIERNES	S
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	S
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	**LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)**	

D. TECNICO

1. Se inicia con la contrucción de media caña en mortero impemeabilziado sobre placa de entre piso.
2. Se inicia el emcofrado para la porterior fundida de concreto para viga cinta de muro perimetral.
3. Se realiza Instalación de enchape de pared color blanco.
4. Se instala la alfajia sobre muro perimetal de la placa de entre piso.
5. Se inicia con la pulida preliminar del piso en granito blanco huila.
6. Se realiza verificación por parte de interventoria en la ejecución de cada una de las actividades con el fin de comprobar la correcta ejecución de las mismas.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra y bodega.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión de basura.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo no se han realizado modificaciones a los contratos de obra e interventoria.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e item no previstos N°1, acta de pactación de precios e item no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e item no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e item no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FECHA ELABORACIÓN:	**11**	**3**	**2024**	No. INFORME	53	SEMANA No.	53

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 4 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Construcción de media caña en mortero impemeabilizado



FECHA FOTO: 5 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Construcción de media caña en mortero impemeabilizado



FECHA FOTO: 5 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Aplicación de sello flexible en juntas de dilatación.



FECHA FOTO: 5 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Instalación de pañete sobre muro de lavamos.



FECHA FOTO: 6 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Construcción de Viga cinta de muro perimetral de placa de entre piso



FECHA FOTO: 7 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Construcción de Viga cinta de muro perimetral de placa de entre piso

FECHA ELABORACIÓN:	11	3	2024	No. INFORME	53	SEMANA No.	53

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 7 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Construcción de viga cinta.



FECHA FOTO: 8 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Desencofrado de la viga cinta



FECHA FOTO: 9 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Construcción de pañete sobre muro perimetral



FECHA FOTO: 9 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Construcción de pañete sobre muro perimetral



FECHA FOTO: 10 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Construcción de alfajia sobre muro perimetral



FECHA FOTO: 10 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Pulida preliminar de piso en granito

1. FECHA ELABORACIÓN:	18	3	2024	2. No. INFORME	54	3. SEMANA No.	54
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	11/03/2024 AL 17/03/2024			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	4	2024	11. PLAZO:	12	Meses	
12. PRORROGAS:	30 DIAS			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:			
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA										
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	4	2024	22. PLAZO:	12	Meses	
23. PRORROGAS:	30 DIAS			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:			
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI										
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 63.902.909,26	2,43%	100,00%	2,43%	100,00%	2,43%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 198.285.611,99	7,55%	99,00%	7,48%	100,00%	7,55%	1,00%	0,08%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 1.022.163.601,56	38,94%	99,00%	38,55%	98,76%	38,46%	-0,24%	-0,09%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 40.195.916,12	1,53%	100,00%	1,53%	100,00%	1,53%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 386.108.835,10	14,71%	90,00%	13,24%	81,73%	12,02%	-8,27%	-1,22%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 22.534.579,16	0,86%	95,00%	0,82%	23,43%	0,20%	-71,57%	-0,61%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 22.432.417,72	0,85%	100,00%	0,85%	90,45%	0,77%	-9,55%	-0,08%
ALCANTARILLADO	$ 36.154.407,39	1,38%	100,00%	1,38%	100,00%	1,38%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 15.865.988,14	0,60%	95,00%	0,57%	39,32%	0,24%	-55,68%	-0,34%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 172.267.547,40	6,56%	90,00%	5,91%	78,01%	5,12%	-11,99%	-0,79%
EQUIPOS COCINA	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 60.148.795,56	2,29%	80,00%	1,83%	0,00%	0,00%	-80,00%	-1,83%
DOTACIÓN	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 584.664.754,21	22,28%	90,00%	20,05%	80,01%	17,82%	-9,99%	-2,23%
TOTAL	**$ 2.624.725.363,61**	**100,00%**		**94,65%**		**87,54%**		**-7,11%**

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	86,70%	89,62%	-2,92%
Durante el periodo	0,84%	5,03%	-4,19%
Acumulado Actual	87,54%	94,65%	-7,11%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5,03%	94,65%
Valor de la Obra Programada	$ 132.023.685,79	$ 2.484.266.970,33

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,84%	87,54%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 22.047.693,05	$ 2.297.579.837,37

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

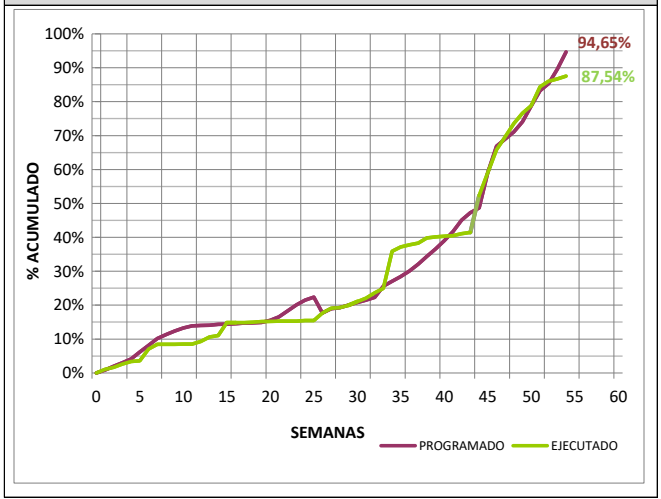

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	11	DEMOLEDOR	0	LUNES	S
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	15	MARTES	S
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	0	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	S
OFICIAL	2	MOTOBOMBA	0	VIERNES	S
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	S
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	**LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)**	

D. TECNICO

1. El contratista continua con las construcción de la alfajía para muro perimetral de placa de entre piso (Instalación de acero de refuerzo, encofrado y fundida de concreto).
2. El contratista realiza la instalación total del muro perimetral de la placa de entre piso.
3. Se da continuidad a la construcción de la media caña en mortero impermeabilizado y la instalación de friso en el muro perimetral de la placa de entre piso.
4. Se da inicio a las actividades de instalaciones eléctricas en el área de la cubierta del comedor.
5. El contratista finaliza la instalación de enchapes en los muros de cocina, alacenas, cuarto frio, cuarto de basuras, cuarto de aseo y cuarto de bombas.
6. La interventoría verifica que las actividades realizadas estén acordes a las especificaciones técnicas y que los materiales utilizados sean los establecidos en la línea base.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.
3. La interventoría junto con el contratista realizaron el acta parcial N°4.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra y bodega.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión de basura.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo no se han realizado modificaciones a los contratos de obra e interventoría.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactaciòn de precios e ítem no previstos N°1, acta de pactaciòn de precios e ítem no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FECHA ELABORACIÓN:	**18**	**3**	**2024**	No. INFORME	54	SEMANA No.	54

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO:11 de marzo de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de enchape en muros .



FECHA FOTO: 11 de marzo de 2024.
DESCRIPCIÓN: Construcción de alfajia en muro perimetral.



FECHA FOTO: 12 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Construcción de alfajia en muro perimetral.



FECHA FOTO: 12 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Instalación de frisos en muro perimetral de placa de entre piso.



FECHA FOTO: 13 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Construcción de media caña de muro perimetral de placa de entre piso



FECHA FOTO: 13 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Construcción de media caña de muro perimetral de placa de entre piso

FECHA ELABORACIÓN:	**18**	**3**	**2024**	No. INFORME	54	SEMANA No.	54

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 14 de marzo de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de enchapes en muros.



FECHA FOTO: 14 de marzo de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de enchapes en muros.



FECHA FOTO: 15 de marzo de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de enchapes en muros.



FECHA FOTO: 16 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Instalación de toma corrientes.



FECHA FOTO: 17 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Construcción de mortero de nivelación en locales.



FECHA FOTO: 17 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Construcción de mortero de nivelación en locales.

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	3	2024	2. No. INFORME	55	3. SEMANA No.	55
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	18/03/2024 AL 24/03/2024			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	4	2024	11. PLAZO:	12	Meses	
12. PRORROGAS:	30 DIAS			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:			
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA										
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	4	2024	22. PLAZO:	12	Meses	
23. PRORROGAS:	30 DIAS			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:			
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI										
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 63.902.909,26	2,43%	100,00%	2,43%	100,00%	2,43%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 198.285.611,99	7,55%	100,00%	7,55%	100,00%	7,55%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 1.022.163.601,56	38,94%	100,00%	38,94%	98,76%	38,46%	-1,24%	-0,48%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 40.195.916,12	1,53%	100,00%	1,53%	100,00%	1,53%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 386.108.835,10	14,71%	97,00%	14,27%	82,11%	12,08%	-14,89%	-2,19%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 22.534.579,16	0,86%	100,00%	0,86%	23,43%	0,20%	-76,57%	-0,66%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 22.432.417,72	0,85%	100,00%	0,85%	90,45%	0,77%	-9,55%	-0,08%
ALCANTARILLADO	$ 36.154.407,39	1,38%	100,00%	1,38%	100,00%	1,38%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 15.865.988,14	0,60%	100,00%	0,60%	39,32%	0,24%	-60,68%	-0,37%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 172.267.547,40	6,56%	100,00%	6,56%	78,94%	5,18%	-21,06%	-1,38%
EQUIPOS COCINA	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 60.148.795,56	2,29%	100,00%	2,29%	0,00%	0,00%	-100,00%	-2,29%
DOTACIÓN	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 584.664.754,21	22,28%	100,00%	22,28%	80,01%	17,82%	-19,99%	-4,45%
TOTAL	**$ 2.624.725.363,61**	**100,00%**		**99,56%**		**87,65%**		**-11,90%**

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	87,54%	94,65%	-7,11%
Durante el periodo	0,11%	4,91%	-4,80%
Acumulado Actual	87,65%	99,56%	-11,91%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	4,91%	99,56%
Valor de la Obra Programada	$ 128.874.015,35	$ 2.613.142.098,56

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,11%	87,65%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.887.197,90	$ 2.300.672.975,15

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

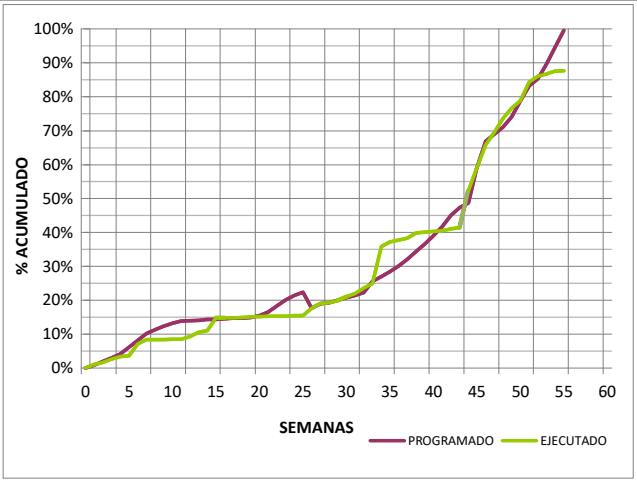

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	8	DEMOLEDOR	0	LUNES	S
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	15	MARTES	S
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	0	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	S
OFICIAL	2	MOTOBOMBA	0	VIERNES	S
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	S
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	**LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)**	

D. TECNICO

1. El contratista inicia con la aplicación en muros exteriores.
2. El contratista realiza la instalación de estructura de soporte para cieloraso en PVC.
3. Se da inicio la excavación para la instalación d la trama de grasas de 1000L.
4. El contratista continua con la instalación de la red electrica en la zona de comedor.
5. El contratista inicia con la instalación de enchapes en el area de los locales.
6. La interventoría verifica que las actividades realizadas estén acordes a las especificaciones técnicas y que los materiales utilizados sean los establecidos en la línea base.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.
3. La interventoria verifica las afiliaciones al sistema de seguridad social del todo el personal presente en la obra.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra y bodega.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión de basura.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo no se han realizado modificaciones a los contratos de obra e interventoría.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactaciòn de precios e ítem no previstos N°1, acta de pactaciòn de precios e ítem no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FECHA ELABORACIÓN:	24 / 3 / 2024		No. INFORME	55	SEMANA No. 55
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA				
CONTRATO OBRA No:	0756-23		CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23		INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI	

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 18 de marzo de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de estuco en muros exteriores.



FECHA FOTO: 18 de marzo de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura de soporte para cielorraso en PVC.



FECHA FOTO: 19 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura de soporte para cielorraso en PVC.



FECHA FOTO: 19 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Excavación para la trampa de grasas.



FECHA FOTO: 20 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Instalación de enchapes en zona de locales.



FECHA FOTO: 20 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Instalación de enchapes en zona de locales.

FECHA ELABORACIÓN:	24	3	2024	No. INFORME	55	SEMANA No.	55

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 21 de marzo de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de estuco en muros exteriores.



FECHA FOTO: 21 de marzo de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de enchapes en muros.



FECHA FOTO: 22 de marzo de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de estuco en muros exteriores.



FECHA FOTO: 22 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Instalación de redes electricas.



FECHA FOTO: 23 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Instalación de redes electricas-



FECHA FOTO: 23 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Construcción de mortero de nivelación en locales.

1. FECHA ELABORACIÓN:	31	3	2024	2. No. INFORME	56	3. SEMANA No.	56
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	25/03/2024 AL 31/03/2024			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	4	2024	11. PLAZO:	12	Meses	
12. PRORROGAS:	30 DIAS			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:			
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA										
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	4	2024	22. PLAZO:	12	Meses	
23. PRORROGAS:	30 DIAS			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:			
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI										
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 63.902.909,26	2,43%	100,00%	2,43%	100,00%	2,43%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 198.285.611,99	7,55%	100,00%	7,55%	100,00%	7,55%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 1.022.163.601,56	38,94%	100,00%	38,94%	98,76%	38,46%	-1,24%	-0,48%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 40.195.916,12	1,53%	100,00%	1,53%	100,00%	1,53%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 386.108.835,10	14,71%	98,00%	14,42%	84,66%	12,45%	-13,34%	-1,96%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 22.534.579,16	0,86%	100,00%	0,86%	23,43%	0,20%	-76,57%	-0,66%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 22.432.417,72	0,85%	100,00%	0,85%	90,45%	0,77%	-9,55%	-0,08%
ALCANTARILLADO	$ 36.154.407,39	1,38%	100,00%	1,38%	100,00%	1,38%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 15.865.988,14	0,60%	100,00%	0,60%	39,32%	0,24%	-60,68%	-0,37%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 172.267.547,40	6,56%	100,00%	6,56%	83,18%	5,46%	-16,82%	-1,10%
EQUIPOS COCINA	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 60.148.795,56	2,29%	100,00%	2,29%	0,00%	0,00%	-100,00%	-2,29%
DOTACIÓN	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 584.664.754,21	22,28%	100,00%	22,28%	80,01%	17,82%	-19,99%	-4,45%
TOTAL	**$ 2.624.725.363,61**	**100,00%**		**99,71%**		**88,31%**		**-11,40%**

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	87,65%	99,56%	-11,91%
Durante el periodo	0,66%	0,15%	0,51%
Acumulado Actual	88,31%	99,71%	-11,40%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,15%	99,71%
Valor de la Obra Programada	$ 3.937.088,05	$ 2.617.003.186,91

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,66%	88,31%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 17.323.187,40	$ 2.317.793.907,59

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

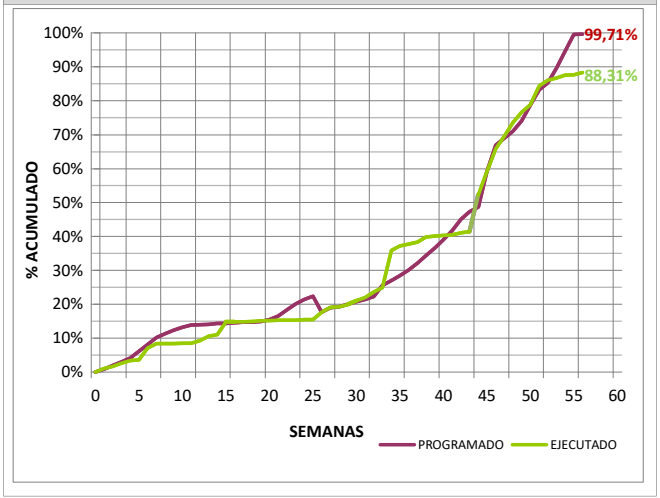

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	8	DEMOLEDOR	0	LUNES	S
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	15	MARTES	S
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	0	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	S
OFICIAL	2	MOTOBOMBA	0	VIERNES	S
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	S
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	**LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)**	

D. TECNICO

1. El contratista inicia con la instalación de cielorraso en PVC (color blanco).
2. El contratista inicia con la contrucción de alfajias en la zona exterior de la ventanas de la zona de preparación mixta.
3. El contratista inicia con la instalación de enchapes en el muro de la zona de lavamanos.
4. La interventoría verifica que las actividades realizadas estén acordes a las especificaciones técnicas y que los materiales utilizados sean los establecidos en la línea base.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.
3. La interventoria verifica las afiliaciones al sistema de seguridad social del todo el personal presente en la obra.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra y bodega.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión de basura.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo no se han realizado modificaciones a los contratos de obra e interventoría.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactaciòn de precios e ítem no previstos N°1, acta de pactaciòn de precios e ítem no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FECHA ELABORACIÓN:	**24**	**3**	**2024**	No. INFORME	56	SEMANA No.	56

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 26 de marzo de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de cielorraso en PVC.



FECHA FOTO: 26 de marzo de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de cielorraso en PVC.



FECHA FOTO: 27 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Construcción de alfajia.



FECHA FOTO: 27 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Construcción de alfajia.



FECHA FOTO: 30 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Instalación de enchape en muro de lavamanos



FECHA FOTO: 30 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN: Instalación de enchape en muro de lavamanos

1. FECHA ELABORACIÓN:	8	4	2024	2. No. INFORME	57	3. SEMANA No.	57
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	01/04/2024 AL 08/04/2024			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	5	2024	11. PLAZO:	14	Meses	
12. PRORROGAS:	60 DIAS			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:			
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA										
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	5	2024	22. PLAZO:	14	Meses	
23. PRORROGAS:	60 DIAS			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:			
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI										
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 63.902.909,26	2,43%	100,00%	2,43%	100,00%	2,43%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 198.285.611,99	7,55%	96,00%	7,25%	100,00%	7,55%	4,00%	0,30%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 1.022.163.601,56	38,94%	93,00%	36,22%	98,76%	38,46%	5,76%	2,24%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 40.195.916,12	1,53%	100,00%	1,53%	100,00%	1,53%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 386.108.835,10	14,71%	71,00%	10,44%	88,26%	12,98%	17,26%	2,54%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 22.534.579,16	0,86%	84,00%	0,72%	23,43%	0,20%	-60,57%	-0,52%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 22.432.417,72	0,85%	97,00%	0,83%	100,00%	0,85%	3,00%	0,03%
ALCANTARILLADO	$ 36.154.407,39	1,38%	100,00%	1,38%	100,00%	1,38%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 15.865.988,14	0,60%	88,00%	0,53%	39,32%	0,24%	-48,68%	-0,29%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 172.267.547,40	6,56%	88,00%	5,78%	83,18%	5,46%	-4,82%	-0,32%
EQUIPOS COCINA	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 60.148.795,56	2,29%	8,00%	0,18%	0,00%	0,00%	-8,00%	-0,18%
DOTACIÓN	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 584.664.754,21	22,28%	81,00%	18,04%	80,01%	17,82%	-0,99%	-0,22%
TOTAL	**$ 2.624.725.363,61**	**100,00%**		**85,34%**		**88,92%**		**3,58%**

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	88,31%	99,71%	-11,40%
Durante el periodo	0,61%	-14,37%	14,98%
Acumulado Actual	88,92%	85,34%	3,58%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	-14,37%	85,34%
Valor de la Obra Programada	-$ 377.173.034,75	$ 2.239.993.200,17

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,61%	88,92%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 16.010.824,72	$ 2.333.860.710,87

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

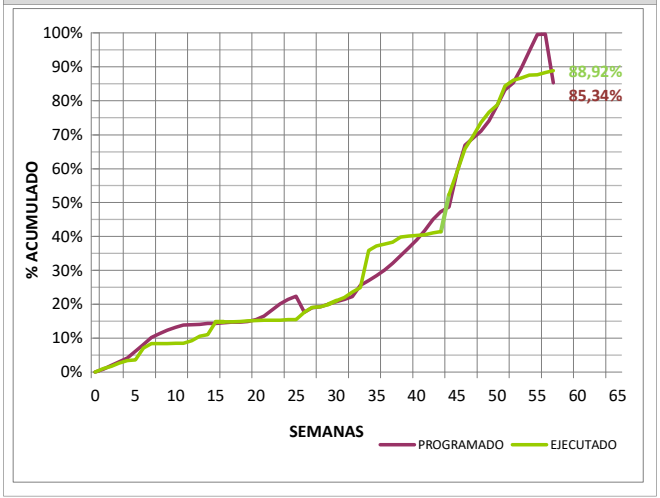

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	8	DEMOLEDOR	0	LUNES	S
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	15	MARTES	L
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	0	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	L
OFICIAL	2	MOTOBOMBA	0	VIERNES	S
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	S
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	**LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)**	

D. TECNICO

1. El contratista continua con la instalación de cielorraso en PVC (color blanco) en la zona de preparación mixta, alacenas y oficina de admon.
2. El contratista continua con la instalación de enchapes en el muro de la zona de lavamanos.
3. El contratsta finaliza la instalación de enchape para piso en el baño de la oficin a de admon.
4. El contratista continua con la aplicación de boquilla en las juntas del enchape de pared.
5. La interventoría verifica que las actividades realizadas estén acordes a las especificaciones técnicas y que los materiales utilizados sean los establecidos en la línea base.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.
3. La interventoria verifica las afiliaciones al sistema de seguridad social del todo el personal presente en la obra.
4. Se realiza el adicional en plazo N°2 por TREINTA (30) DIAS a los contratos de obra e interventoria.
5. Interventoria verifica y aprueba la reprogramación de las atividades según la nueva fecha de terminación de contrato.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra y bodega.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión recolector de residups solidos.
3. Los RCD generados por las actividades constructivas son debidamente acopiados y dispuestos en la escombrera debidamente autorizada por la autoridad ambiental competente.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo no se han realizado modificaciones a los contratos de obra e interventoría.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactaciòn de precios e ítem no previstos N°1, acta de pactaciòn de precios e ítem no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FECHA ELABORACIÓN:	8	4	2024	No. INFORME	57	SEMANA No.	57

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 01 de abril de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalaión de enchape en muro de lavamanos.



FECHA FOTO: 01 de abril de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalaión de enchape en muro de lavamanos.



FECHA FOTO: 02 de abril de 2024
DESCRIPCIÓN: Instalación de cieloraso en PVC (preparación mixta).



FECHA FOTO: 02 de abril de 2024
DESCRIPCIÓN: Instalación de cieloraso en PVC



FECHA FOTO: 02 de abril de 2024
DESCRIPCIÓN: Instalación de boquilla en juntas de enchapes



FECHA FOTO: 02 de abril de 2024
DESCRIPCIÓN: Instalación de boquilla en juntas de enchapes

FECHA ELABORACIÓN:	8	4	2024	No. INFORME	57	SEMANA No.	57

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 03 de abril de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de perimietral en PVC.



FECHA FOTO: 03 de abril de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de perimietral en PVC.



FECHA FOTO: 04 de abril de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de de cieloraso en PVC.



FECHA FOTO: 04 de abril de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de de cieloraso en PVC.



FECHA FOTO: 06 de abril de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de enchape en muro de lavamanos..



FECHA FOTO: 07 de abril de 2024.
DESCRIPCIÓN: Instalación de enchape de piso en baño.

5.3. BITÁCORA DE OBRA

Fecha: 06 - marzo 2024 - Miercoles

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST
- Se continua con la instalación de enchapes de muros de mampostería
- Se continua la instalación de Frisos sobre muro
- Se continua la instalacion de poliuretano de juntas de dilatación de placas de piso en el area del Comedor
- Se radicaron polizas en la alcaldia.
- la interventoria verifica la ejecucion de las actividades.

Residente de interventoria

CONTRATISTA
Residente obra

Fecha. 07 de marzo 2024. / jueves.

- El contratista inicia labores a las 7am con charla SST
- Se continua la instalación de enchapes de muros de mamposteria.
- Se continua la instalacion de Frisos en muros en mamposteria.
- Se inician la instalacion de acero de refuerzo para la viga cinta del muro perimetral placa entrepiso, de igual manera el encofrado de la misma
- Se inicia el destronque o patida del piso de granito de la cocina.
- llegada de material.
- la interventoria verifica la ejecucion de todas las actividades.

Residente interventoria

Residente obra

Fecha: 08 de marzo 2024 - viernes

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua la instalación de frisos en muro de mamposteria.
- Se continua el destronque o pulida del piso de granito y media caña granito
- Se continua la instalación de acero de refuerzo para la viga cinta del muro perimetral placa entrepiso, de igual manera el encofrado de la misma y fundida.
- Llegada de perfileria aluminio
- La interventoria verifica la ejecucion de todas las actividades.

Residente interventoria

Residente obra

Fecha: 09 de marzo 2024 - Sabado

- El contratista inicia labores a las 7am con charla SST.
- Se inicia la instalacion de acero y encofrado de la altejus de muro perimetral placa entrepiso de igual manera fundida.
- Se continua el destronque y pulida de piso de granito y media cuña.
- Se continua la instalacion de frisos en muros en mamposteria
- Llegada de cemento Blanco y gris.
- La interventoria verifica la ejecucion de todas las actividades.

070

Residente interventoría

César Q
R.S. Residente obra

Fecha: 11 de marzo 2024 / Lunes.

- El contratista inicia labores a las 7am con charla SST
- se continua armado de acero de refuerzo, encofrado y fundida de altojia muro perimetral placa de entrepiso
- Se continua los frisos del muro perimetral de la placa de entrepiso
- se continua los enchapes interiores muro
- se continua la instalación y pulida de media caña en granito.
- la interventoria verifica la ejecución de todas las actividades.

Residente interventoría

César Q
Residente obra.

Fecha: 12 de marzo 2024 / Martes.

- El contratista inicia labores a las 7am con charla SST.
- Se continua los frisos del muro perimetral de la placa de entrepiso
- Se inicia mampostería de muro perimetral placa entrepiso
- Se continua instalación de enchapes en muros de cocina
- Se continua pulida de media caña en granito.
- Instalacion caja metalica y rejilla del medidor del gas.

- la interventoria verifica todas las ejecuciones a las actividades.

Residente interventoria — Residente obra

Fecha: 13 de marzo 2024 / miercoles

- El contratista inicia labores a las 7am con charla SST.
- Se continua armado de acero de refuerzo, encofrado y fundida para la viga cinta del muro perimetral placa entrepiso
- se continua la instalación de enchapes de muro mamposteria.
- Fundida de mortero de nivelación en mamposteria de locales 1 y 2.
- Fundida de columneta de placa entrepiso
- instalacion de frisos en muro perimetral placa entrepiso.
- la interventoria verifica la ejecucion de las actividades.

Residente interventoria — Residente obra.

Fecha: 14 de marzo. 2024 / jueves

- El contratista inicia labores a las 7am con charla SST
- Se continua armado de acero de refuerzo, encofrado y fundido de alfajia
- Se continua la instalación de enchapes de muros de mamposteria
- Se continua con la aplicación de frisos en muros altos pasillo trasero de la obra.
- Se continua instalación de red electrica interna de la cocina.

- la interventoria verifica la ejecución de todas las actividades.

Residente obra

Residente interventoria

Fecha: 15 - de marzo 2024 / viernes

- el contratista inicia labores a las 7am con charla SST
- Se continua armado de acero de refuerzo y anclado y fundida para la viga perimetral placa entrepiso.
- Se continua la instalación de anclajes de muros de mampostería
- Fundida de mortero de nivelación en mampostería placa entrepiso
- Se continua la aplicación de frisos en muros altos Pasillo trasero de la obra.
- Llegada de material (Arena gruesa) 7m²
- Llegada de Bultos Cemento gris.
- la interventoria verifica la ejecución de todas las actividades.

Residente interventoria

Residente obra.

Fecha. 16-03-2024 - Sabado

- el contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua la instalación de la medida Caseta en mampostería placa entrepiso
- Se continua la aplicación de friso en muros altos pasillo de ahos de la obra.
- Se continua retiro de Hierro, encofrado y

Estado de la altajias
• La interventoria verifica la ejecucion de todas las actividades

Residente interventoria

Residente obra

Fecha 18-03-2024 / lunes

• El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST
• Se continua con la instalación de pases en los muros altos de otras de la obra y muro perimetral placa entrepiso
• Se continua instalaciones electricas en el area del comedor
• La interventoria verifica todas las actividades ejecutadas

Residente interventoria

Residente obra.

Fecha: 19-03-2024 / martes

• El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
• Se continua la aplicación de pricos en muros altos pasillo de otras de la obra
• Se continua la instalación electricas en el area del comedor
• Se evidencia ingreso a la obra (caminos de pre y estructuras).
• Se continua fundido de las HOA muro perimetral placa.
• La interventoria verifica todo las ejecuciones de las actividades

074

CEGROMP

Residente obra.

Residente interventoria.

Fecha: 20 de marzo 2024 / Miercoles.

- El contratista inicia labores a las 7am con charla SST.
- Se inicia la aplicación de estuco exterior para los muros en mamposteria
- Se inicia la instalación de estructura para aligerado en puc.
- Se continua con la instalación de frisos en muros perimetrales placa entrepiso.
- Se continua la instalación electrica en el area del comedor.
- La interventoria verifica la ejecución de todas las actividades.

CEGROMP

Residente interventoria

Residente obra

Fecha: 21 de marzo - 2024 / Jueves.

- El contratista inicia labores a las 7am con charla SST.
- Se continua la aplicación de estuco exterior para los muros de mamposteria
- Se continua la instalacion de estructura para aligerado en puc.
- Se continua la instalación de frisos en muros perimetral placa entrepiso.
- Se continua la instalación electrica en el area del comedor.
- Llegada de material a la obra (el camion se entierra, terreno inestable por lluvias

Horas de la noche anterior.

- La interventoría controla toda la ejecución de las actividades.

Residente interventoría

CESARONE
Residente obra.

Fecha: 22 de marzo 2024 / viernes

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua la aplicación de estuco exterior para los muros de mampostería.
- Se continua la instalación de estructura para cielo raso en PVC.
- Se inicia la instalación de enchape de piso gres milenas en el area de los locales.
- Se inicia excavación para la instalación de trampa de grasas.
- La interventoría controla la ejecución de todas las actividades.

Residente interventoría

CESARONE
Residente obra.

Fecha: 23 de marzo 2024 / sabado.

- El contratista inicia labores a las 7 am con la charla SST.
- Se continua la aplicación de estuco exterior para los muros en mampostería.
- Se continua la instalación de estructura de cielorraso en pvc.
- Se continua la instalación de enchape de piso gres milenas en el area locales.

- la interventoria verifica todas las actividades

Residente interventoria

ESTRADO
presidente obra

Fecha: 26 de marzo 2024 / martes.

- El contratista inicio labores a las 7am con charla SST.
- se realiza instalacion de guardoscobo (enchape lineal) color gris en el area de los locales.
- se continua instalacion de enchape de muros (lavamanos)
- se inicia instalacion de lamina de PVC. en el area de servicio al cliente.
- se construccion de alfajias de muertanos de la cocina
- la interventoria verifica la ejecucion de todas las actividades.

Res. Sepia. interventoria

ESTRADO
Pres. dente obra.

Fecha: 27 de marzo 2024 / miercoles

- El contratista inicio labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua instalacion de enchape de muro (lavamanos)
- Se continua instalacion de lamina de pvc en el area de cocina
- Se continua construccion de alfajias de la cantara de la cocina,
- Se instala muertano de nivelacion en el

baño de administración
• la interventoria verifica la ejecución de todas las actividades.

CESARONP
Residente obra

Residente interventoria

Fecha: 30 de marzo 2024 / sabado

• El contratista inicia labores a las 7 am con charla SST.
• Se continua instalación de enchape de muro (lavamanos)
• Se continua la instalación de tuberia de pvc en el area de la cocina.
• la interventoria verifica la ejecución de todas las actividades.

CESARONP
Residente obra.

Residente interventoria

Fecha: 01 - de abril 2024 / lunes.

• El contratista inicia labores a las 7am con charla SST.
• Se continua instalación de enchapes en el muro del lavamanos.
• Se realiza reunion con contratistas para programación y ajustes en la obra.
• instalación de estructura de cubierta en pvc.
• la interventoria verifica todas la ejecución de las actividades

Residente / interventoria.

Residente obra.

Fecha: 02 abril 2024 / martes

- El contratista inicia labores a las 7am con charla SST.
- Se presenta lluvias leves de (7am - 9am)
- Se continua la desbroncada de media caña y cenefas en piso de granito
- Se continua instalación de enchape en el muro del lavamanos
- Se continua instalación de cielo raso y estructura.
- Llegada de laminas de fibro cemento (7).
- La interventoría verifica la ejecución de todas las actividades.

Residente interventoría

CESAR DUQUE
Residente obra

Fecha: 03 de abril 2024 / miercoles

- El contratista inicia labores a las 7am con charla SST
- Se continua con la instalación de cielo raso en pvc en el area de cocina
- Se instala enchape gris en el area del baño administrativo
- La interventoría verifica todas ejecución de las actividades.

Residente interventoría

CESAR DUQUE
Residente obra

Fecha: 04 de abril 2024 / jueves

- El contratista inicia labores a las 7 am con la charla SST.
- Fuertes lluvias de 9 a 11 am
- Se continua con la instalación de cielo raso de pvc en el area de la cocina
- Se continua instalación de enchapes metros lineales.
- La interventoría verifica la ejecución de todas las actividades

Residente interventoría

CESNACONP
Residente obra.

Fecha: 05 de abril. 2024 / viernes.

- El contratista inicia labores a las 7 am con charla SST.
- Se continua con la instalación de cielo raso de pvc en el area de la cocina.
- Se continua instalación de enchapes metros lineales y embaquillado.
- Se resive visita del contratista PCI para la instalación del sistema de bombeo.
- La interventoría verifica toda la ejecución de las actividades.

Residente interventoría

CESNACONP
Residente obra.

5.4. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE INTERVENTORÍA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901683399	1	UT. INTERCOMEDOR ITSI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CR 22 52 B 60 AP 101	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	596011359	9465456487	E	2024/04/22	2024/04/25	BANCO DE BOGOTA	3	$1,024,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1096241286	GENEY WILSON																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	13749852	MACIAS FABIO	X																	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total	**Afiliados(2)**																						$3,300,000	$528,000			$3,300,000	$132,000			$3,300,000	$132,000			$3,300,000	$229,700		$0	$0		$1,021,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901683399	1	UT. INTERCOMEDOR ITSI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CR 22 52 B 60 AP 101	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	596011359	9465456487	E	2024/04/22	2024/04/25	BANCO DE BOGOTA	3	$1,024,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$528,000	$1,500	$0	$529,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$600	$0	$208,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$900	$0	$320,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$229,700	$600	$0	$230,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$229,700	$600	$0	$230,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$132,000	$400	$0	$132,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$132,000	$400	$0	$132,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$132,000	$500	$0	$132,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$200	$0	$52,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$80,000	$300	$0	$80,300
TOTAL				**2**	**$1,021,700**	**$3,000**	**$0**	**$1,024,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568048	6	FMC CONSTRUCTORES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FMC CONSTRUCTORES	CALLE 47 23 36 BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6566600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	565638127	9465524106	E	2024/04/10	2024/04/09	BANCO DE BOGOTA	0	$6,719,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSULTORIA 023 AGUAS BCA (6 Afiliados)																							$20,492,697	$3,352,000			$22,292,697	$891,900			$23,090,753	$923,800			$22,292,697		$1,551,800		$0	$0		$6,719,500
Centro de Trabajo: CONSULTORIA 023 AGUAS BCA (6 Afiliados)																							$20,492,697	$3,352,000			$22,292,697	$891,900			$23,090,753	$923,800			$22,292,697		$1,551,800		$0	$0		$6,719,500
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (6 Afiliados)																							$20,492,697	$3,352,000			$22,292,697	$891,900			$23,090,753	$923,800			$22,292,697		$1,551,800		$0	$0		$6,719,500
1	CC	1096242581	ACOSTA RAMIREZ YULEINY TATIANA																		23030 1	30	$4,427,653	$708,500	EPS037	30	$4,427,653	$177,200	CCF40	30	$4,427,653	$177,200	14-4	30	$4,427,653	6.960%	$308,200	30	$0	$0	Si	$1,371,100
2	CC	1096800274	AMAYA NARVAEZ CAMILA ANDREA		X															X	23020 1	5	$283,334	$45,400	EPS037	5	$283,334	$11,400	CCF40	5	$1,081,390	$43,300	14-4	5	$283,334	6.960%	$19,800	5	$0	$0	Si	$119,900
3	CC	1096225986	GALVIS FORERO ANGIE JHULIETH																		23030 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
4	CC	1102370870	GARZON MARTINEZ ANDRES CAMILO																		23030 1	30	$7,281,710	$1,238,100	EPS005	30	$7,281,710	$291,300	CCF40	30	$7,281,710	$291,300	14-4	30	$7,281,710	6.960%	$506,900	30	$0	$0	Si	$2,327,600
5	CC	13884628	GOMEZ OCHOA JORGE																			0	$0	$0	EPS041	30	$1,800,000	$72,000	CCF40	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$269,300
6	CC	91509837	ZAPATA QUINTANA MAURICIO																		23030 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF40	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
Total			**Afiliados(6)**																				$20,492,697	$3,352,000			$22,292,697	$891,900			$23,090,753	$923,800			$22,292,697		$1,551,800		$0	$0		$6,719,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568048	6	FMC CONSTRUCTORES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FMC CONSTRUCTORES	CALLE 47 23 36 BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6566600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	565638127	9465524106	E	2024/04/10	2024/04/09	BANCO DE BOGOTA	0	$6,719,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$3,352,000	$0	$0	$3,352,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$3,306,600	$0	$0	$3,306,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$45,400	$0	$0	$45,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,551,800	$0	$0	$1,551,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	$1,551,800	$0	$0	$1,551,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$923,800	$0	$0	$923,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	6	$923,800	$0	$0	$923,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$891,900	$0	$0	$891,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$528,600	$0	$0	$528,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$291,300	$0	$0	$291,300
TOTAL				6	$6,719,500	$0	$0	$6,719,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568048	6	FMC CONSTRUCTORES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FMC CONSTRUCTORES	CALLE 47 23 36 BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6566600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	565652970	9465524411	Y	2024/04/10	2024/04/09	BANCO DE BOGOTA	0	$2,434,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSULTORIA 023 AGUAS BCA (3 Afiliados)																							$6,864,428	$1,098,400			$6,864,428	$858,200			$0	$0			$6,864,428		$477,900		$0	$0		$2,434,500
Centro de Trabajo: CONSULTORIA 023 AGUAS BCA (3 Afiliados)																							$6,864,428	$1,098,400			$6,864,428	$858,200			$0	$0			$6,864,428		$477,900		$0	$0		$2,434,500
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																							$6,864,428	$1,098,400			$6,864,428	$858,200			$0	$0			$6,864,428		$477,900		$0	$0		$2,434,500
1	CC	80031704	CARREÑO GUEVARA SERGIO ALEXANDER																		25-14	30	$1,545,828	$247,400	EPS037	30	$1,545,828	$193,300		0	$0	$0	14-4	30	$1,545,828	6.960%	$107,600	0	$0	$0	No	$548,300
2	CC	1096182161	LOZANO CASTRILLON GEOVANI																		25-14	30	$3,198,600	$511,800	EPS017	30	$3,198,600	$399,900		0	$0	$0	14-4	30	$3,198,600	6.960%	$222,700	0	$0	$0	No	$1,134,400
3	CC	77193923	MEJIA ALVAREZ LUIS ADOLFO																		25-14	30	$2,120,000	$339,200	EPS005	30	$2,120,000	$265,000		0	$0	$0	14-4	30	$2,120,000	6.960%	$147,600	0	$0	$0	No	$751,800
Total	**Afiliados(3)**																						$6,864,428	$1,098,400			$6,864,428	$858,200			$0	$0			$6,864,428		$477,900		$0	$0		$2,434,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568048	6	FMC CONSTRUCTORES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FMC CONSTRUCTORES	CALLE 47 23 36 BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6566600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	565652970	9465524411	Y	2024/04/10	2024/04/09	BANCO DE BOGOTA	0	$2,434,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,098,400	$0	$0	$1,098,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,098,400	$0	$0	$1,098,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$477,900	$0	$0	$477,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$477,900	$0	$0	$477,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$858,200	$0	$0	$858,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$399,900	$0	$0	$399,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$193,300	$0	$0	$193,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$265,000	$0	$0	$265,000
TOTAL				3	$2,434,500	$0	$0	$2,434,500

5.5. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA

UT. INTERCOMEDOR ITSI

Barrancabermeja, 06 de marzo de 2024 **OFICIO Nª 022**

Señor:
WRUSSY INGENIEROS S.A.S.
ATN. ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
REPRESENTANTE LEGAL

Ref: Contrato de interventoría N. 0757-23 “INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE **CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA”**

Asunto:	**No Aprobación de Ficha Técnica del Material SIKAMANTO APP 4.2 POLIESTER**

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en referencia al contrato mencionado, recibimos su comunicación bajo el número 0064-0756 BARRANCA, en la que radican la ficha técnica del material SIKAMANTO APP 4.2 POLIESTER para revisión y aprobación.

Tras un análisis detallado y en concordancia con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lamentamos informarle que la ficha técnica del material propuesto no cumple con los requisitos exigidos. En específico, el manto SIKAMANTO APP 4.2 POLIESTER no se ajusta a las especificaciones técnicas del contrato.

Además, es importante destacar que conforme al Análisis de Precios Unitarios (APU) del ítem 5.4.7 "Suministro e Instalación de Manto Asfáltico en Fibra de Vidrio para Impermeabilización de Placa Cubierta", se especifica el uso del "**MANTO ASFÁLTICO EN FIBRA DE VIDRIO 2.8MM (1M X 10M)**". Por lo tanto, el material propuesto no coincide con lo ofertado en el APU entregado por Uds. a ésta interventoría. Ver imagen:


CAP:	5	ARQUITECTURA Y ACABADOS					UNIDAD:
ITEM:	5,4,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO EN FIBRA DE VIDRIO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA CUBIERTA					M2
E	*EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS*						
Codigo	DESCRIPCION	UNID.	REND.			VR. UN.	VR. PARCIAL
EHM	HERRAMIENTA MENOR	%MO	10%			$ 3.190,44	$ 319,04
						SUB-TOTAL E	$ 319,00
I	*INSUMOS Y/O MATERIALES*						
Codigo	DESCRIPCION	UNID.	CANT	DESPERDICIO		VR. UN.	VR. PARCIAL
IC005	EMULSION ASFALTICA ECO X 1 KILO	UND	1,60	3%		$ 11.295	$ 18.614,95
IC006	RLL MANTO ASFALTICO EN FIBRA DE VIDRIO 2.8mm (1m x 10 m)	RLL	0,10	3%		$ 319.414	$ 32.899,60
						SUB-TOTAL I	$ 51.515,00
T	*TRANSPORTE*						
Codigo	DESCRIPCION	UNID.	CANT			VR. UN.	VR. PARCIAL
						SUB-TOTAL T	$ 0,00
M	*MANO DE OBRA*						
Codigo	DESCRIPCION	UNID.	CANT	REND.		VR. DIA INTEGRAL	VR. PARCIAL
MOF	Oficial	DIA	1,00	58		$ 100.548	$ 1.723,84
MAY	Ayudante civil	DIA	1,00	58		$ 85.544	$ 1.466,60
						SUB-TOTAL M	$ 3.190,44
COSTO DIRECTO						E+I+T+M	$ 55.024,44

Carrera 22 No.52B-60 EDIFICIO GLAYA APTO 101 Barrio Torcoroma
Celular 314 412 1030, E-mail: fmcconstructoresltda@gmail.com
Barrancabermeja - Santander

UT. INTERCOMEDOR ITSI

En virtud de lo anterior, la ficha técnica del material SIKAMANTO APP 4.2 POLIESTER no es aprobada por esta interventoría.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración adicional que pueda requerir.



LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R/L UT. INTERCOMEDOR ITSI

UT. INTERCOMEDOR ITSI

Barrancabermeja, 20 de marzo de 2024 **OFICIO Nª 0023**

Señor:
WRUSSY INGENIEROS S.A.S.
ATN. ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
REPRESENTANTE LEGAL

Ref: Contrato de interventoría N. 0757-23 "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE **CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA"**

Asunto:	**APROBACIÓN DE FICHA TECNICA MANTO REAL ATV 30 COD. 10132801.**

Cordial saludo,

En relación con el contrato de obra No. 0756-23, concerniente a la construcción y dotación del comedor y cocina del Instituto Técnico Superior Industrial en el Distrito de Barrancabermeja.

Una vez revisada la ficha técnica que se anexó mediante comunicado 072-0756, me permito informarle que el **MANTO REAL ATV 30 COD. 10132801** cumple con las especificaciones técnicas requeridas y los ítems ofertados en el Análisis de Precio Unitario (APU).

Por lo tanto, se aprueba la instalación de este elemento conforme a lo presentado en la ficha técnica adjuntada.

Agradezco su diligencia en este proceso y quedo a disposición para cualquier consulta adicional que pueda surgir.

Cordialmente,

LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R/L UT. INTERCOMEDOR ITSI

Carrera 22 No.52B-60 EDIFICIO GLAYA APTO 101 Barrio Torcoroma
Celular 314 412 1030, E-mail: fmcconstructoresltda@gmail.com
Barrancabermeja - Santander

UT. INTERCOMEDOR ITSI

Barrancabermeja, 22 de marzo de 2024 **OFICIO Nª 0024**

Señor:
WRUSSY INGENIEROS S.A.S.
ATN. ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
REPRESENTANTE LEGAL

Ref: Contrato de interventoría N. 0757-23 "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE **CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA"**

Asunto:	**APROBACIÓN DE FICHA TECNICA "GRIFERÍA LAVAMANOS DE PARED TIPO PUSH"**

Cordial saludo,

En relación con la ficha técnica de la grifería adjunta al comunicado 073-0756 (**GRIFERÍA LAVAMANOS DE PARED TIPO PUSH Ref. 947110001)** y dentro del marco que hoy nos ocupa, la interventoría avala este insumo y/o material para la ejecución de la respectiva actividad como quiera que esta cumple con las especificaciones técnicas y es acorde a lo finalmente ofertado dentro del Análisis de Precio Unitario (APU) presentado.

Por lo tanto, se aprueba la instalación de este elemento para la ejecución del ítem 5.5.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDÁLICA A PARED (Incluye todos los accesorios de conexión e instalación).

Agradezco su diligencia en este proceso y quedo a disposición para cualquier consulta adicional que pueda surgir.

Cordialmente,

LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R/L UT. INTERCOMEDOR ITSI

UT. INTERCOMEDOR ITSI

Barrancabermeja, 03 de abril de 2024 **OFICIO N° 0025**

Señor:
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
SEC. DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DE
BARRANCABERMEJA.

Ref: Contrato de interventoría N. 0757-23 "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE **CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA"**

Asunto:	**SOLICITUD DE ADICION EN PLAZO N°2 AL CONTRATO DE OBRA 0756-23 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA 0757-23**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me dirijo a usted en calidad de Interventoría del contrato de obra N° 0756-23, con el propósito de solicitar formalmente una prórroga para los contratos de obra e interventoría, conforme a lo establecido en los términos y condiciones estipulados en los contratos respectivos.

Dada la complejidad y alcance del proyecto de construcción y supervisión que estamos llevando a cabo, hemos evaluado detenidamente el avance de las obras y los plazos originalmente establecidos. En virtud de lo anterior, consideramos necesario solicitar una extensión del plazo para garantizar la calidad y eficiencia en la ejecución de las obras, así como para cumplir cabalmente con los objetivos y especificaciones técnicas establecidas en los contratos correspondientes.

Las razones fundamentales que sustentan nuestra solicitud de prórroga son las siguientes:

Modificaciones y Ampliaciones: Se han presentado modificaciones y ampliaciones en el alcance del proyecto original, las cuales han requerido ajustes en la planificación y ejecución de las actividades, impactando en los plazos establecidos inicialmente.

Considerando lo expuesto, solicitamos respetuosamente una prórroga de **TREINTA (30) DIAS** para los contratos de obra e interventoría en mención.

Adjuntamos a la presente solicitud la documentación pertinente que respalda los argumentos expuestos.

Atentamente,

LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R/L UT. INTERCOMEDOR ITSI

Anexos:
INFORME TECNICO SOLICITUD ADICIONAL PLAZO N°2

0247-WR-2024

Bogotá, 06 de marzo de 2023

0064-0756BARRANCA
Señora
Dra. LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R.L UT INTERCOMEDOR ITSI
Interventoría

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

ASUNTO: RADICACION FICHA TECNICA MANTO

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia, nos permitimos radicar la siguiente ficha técnica para revisión y aprobación:

Anexo:

- SIKAMANTO APP 4.2 POLIESTER DOS (2) FOLIOS

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0267-WR-2024

Bogotá, 08 de marzo de 2023

0066-0756BARRANCA
Señora
Dra. LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R.L UT INTERCOMEDOR ITSI
Interventoría

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

ASUNTO: RADICACION FICHA TECNICA LAVAMANOS

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia, nos permitimos radicar la siguiente ficha técnica para revisión y aprobación:

Nota: el lavamanos a instalar no incluye pedestal

Anexo:

- LAVAMANOS MILANO (2) FOLIOS
- SANITARIO LAGUNA RD (2) FOLIOS

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0271-WR-2024

Bogotá, 08 de marzo de 2024

0067-0756BARRANCA
Señora
Dra. LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R.L UT INTERCOMEDOR ITSI
Interventoría

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

ASUNTO: RADICACION FICHA TECNICA MANTO

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia, nos permitimos radicar la siguiente ficha técnica para revisión y aprobación:

Anexo:

- MANTO ROOFER 3500 UN (1) FOLIO

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0283-WR-2024

Bogotá,13 de marzo de 2024

0070-0756-BARRANCA

Señora
Dra. LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R.L UT INTERCOMEDOR ITSI
Interventoría

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE PAGO – SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO, identificado con C.C. No. 80.212.380, actuando en calidad de representante legal de WRUSSY INGENIEROS SAS, persona jurídica legalmente constituida identificada con NIT 901.109.885-1; Por medio del presente escrito y de forma respetuosa, solicito su amable colaboración respecto de la siguiente información:

1. Solicito se me informe el estado o trámite que se ha dado al pago de la factura No. WRU 162.
2. En caso de no haberse surtido trámite alguno respecto del pago anteriormente referido, solicito amablemente se proceda a realizar el pago de la misma.

Lo anterior se solicita como quiera que la fecha de vencimiento de la factura objeto de esta solicitud posee fecha de vencimiento del 19 de diciembre de 2023 y a la fecha (07 de marzo de 2024) aún no se realiza este pago a pesar de haber acreditado los diferentes requisitos para proceder con este, esto de conformidad con la cláusula octava del contrato suscrito con la entidad y en concordancia con la cláusula doceava del mismo.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0299-WR-2024

Bogotá, 19 de marzo de 2024

0072-0756BARRANCA
Señora
Dra. LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R.L UT INTERCOMEDOR ITSI
Interventoría

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

ASUNTO: RADICACIÓN FICHA TÉCNICA MANTO

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia, nos permitimos remitir la ficha técnica del manto asfaltico "MANTO REAL ATV 30 COD. 10132801", este manto cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas para la ejecución de la actividad.

Se adjunta nueva ficha técnica debido a que la anterior de manto asfaltico “MANTO ROOFER 3500 - 1 COD. 10112835” que se radico y aprobó anteriormente es susceptible a las condiciones climáticas del proyecto (no cuenta con una hoja de aluminio o foil de aluminio, lo anterior es de suma importancia para repeler los rayos del sol y tener mayor resistencia a la temperatura bajo la cual estará expuesto).

por lo anterior, adjuntamos la ficha técnica para su revisión y aprobación, quedamos atentos a cualquier requerimiento.

Anexo:

- "MANTO REAL ATV 30 COD. 10132801”. UN (1) FOLIO

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0308-WR-2024

Bogotá, 22 de marzo de 2024

0073-0756BARRANCA
Señora
Dra. LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R.L UT INTERCOMEDOR ITSI
Interventoría

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

ASUNTO: RADICACIÓN FICHA TÉCNICA GRIFERÍA PARED

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia, nos permitimos remitir la ficha técnica del Grifería de pared " GRIFERÍA LAVAMANOS DE PARED TIPO PUSH Ref. 947110001", esta grifería cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas para la ejecución de la actividad.

Anexo:

- "GRIFERÍA LAVAMANOS DE PARED TIPO PUSH Ref. 947110001”. UN (1) FOLIO

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0332-WR-2024

Bogotá, 01 de abril de 2024

0074-0756-BARRANCA

Señora
LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R.L UT INTERCOMEDOR ITSI
Interventoría

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

ASUNTO: RADICACION INFORME PRORROGA AL CONTRATO

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia nos permitimos radicar el informe con el cual solicitamos una prórroga al contrato de treinta (30) días para dar continuidad con la ejecución de las actividades:

Anexo:

- INFORME DE SOLICITUD DE ADICIÓN EN TIEMPO (31) folio(s)

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

5.6. CERTIFICADO MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS

ASEOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA ASSEAR S.A.S
NIT. 900.346.265-5

CERTIFICA

Que prestamos el servicio de aseo y mantenimiento de baños portátiles a la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** identificada con el NIT **901109885-1**, según el siguiente detalle:

Periodo de Servicio	Detalle	Cantidad de USP's	Litros vertidos
ENERO 2024	**BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y ZONAS ALEDAÑAS**	**2**	**360**

Las aguas residuales fueron el resultado del mantenimiento a **2** unidad(es) sanitaria(s) portátil(es) (USP) ubicada(s) en **INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL** , a la(s) que se le realizaron **18** aseos durante el periodo informado, los residuos obtenidos fueron vertidos y tratados en la planta de tratamiento de la empresa **PURIFICACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES SAS PURIFIC**, quienes cuentan con autorización de la CAS según Resolución DGL No. 000588 de julio de 2023. Adjunto encontraran el certificado de tratamiento de residuos, la certificación emitida por **PURIFIC SAS**

Dada en Barrancabermeja a los 05 días del mes de abril de 2024.

DIANA CAROLINA CAMACHO GUZMÁN
Coordinador de Operaciones
ASSEAR S.A.S

La información consignada en el presente documento puede ser confirmada al teléfono 3138849291 – 3017870248 o al correo electrónico: operaciones@assear.com

OFICINA BARRANCABERMEJA
Km 1.8 Vía Retén - Aereopuerto Yariguies
Tel: 607 6 02 04 20 - 313 884 92 91

5.7. INFORME TÉCNICO DE OBRA

INFORME DE OBRA Nro.13

“CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA."



CONTRATO DE OBRA No. 0756-23

INFORME DE OBRA Nro.13

PERIODO DE EJECUCIÓN

06 DE MARZO DE 2024 – 05 DE ABRIL DE 2024

VERSIÓN 1

VOLUMEN 1-1

ORIGINAL

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. INFORMACION DEL PROYECTO 4
2.1. Localización del proyecto 4
2.2. Características técnicas del proyecto y alcance 5
2.3. CONTRATO SUSCRITO 6
2.3.1. Contrato de Obra No. 0756-23 6
2.3.2. Objeto del Contrato 6
2.3.3. Contratista 6
2.4. Plazo del Contrato 6
2.5. Valor de la inversión 6
3. CONTROL DE POLIZAS 7
3.1. Pólizas WRUSSY INGENIEROS SAS 7
4. CONTROL DE RECUSOS 7
4.1. Personal involucrado en el proyecto 7
4.2. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 8
5. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO CONTRATISTA 9
5.1. Actividades realizadas en el periodo mantenimiento 9
6. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINSTRATIVO 10
6.1. Contrato o modificaciones Suscritas 10
6.2. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 11
6.2.1. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 11
6.3. ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO. 11
6.3.1. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 11
6.3.2. OTRAS ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO 11
7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 11

1. INTRODUCCIÓN

La Institución educativa Instituto Técnico Superior Industrial - ITSI en el Distrito de Barrancabermeja, busca facilitar el desarrollo integral y el mejoramiento del impacto en el sistema educativo para los estudiantes de la sede principal de la institución, mediante la demolición de la actual cafetería y la construcción del área que cumpla las veces de cafetería y comedor escolar, cumpliendo con las condiciones básicas propuestas en la normativa sanitaria vigente: resolución 2674 de 2013, NTC 4595 y 4596, en las cuales se establece los requisitos y parámetros del diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo, analizando los diagnósticos de infraestructura frente a la existencia, calidad y acceso a los servicios públicos y condiciones de dotación de equipos y menaje en el comedor. Todo esto con el fin de dar inclusión a la promoción y ampliación de cobertura de programas de alimentación que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, para mantener sus niveles de atención, aumentar el porcentaje de permanencia escolar, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje.

Por lo anterior, se hace necesario iniciar proceso de selección de contratistas, para llevar a cabo la CONTRUCCION Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

Es por eso por lo que se decide abrir el proceso de contratación Licitación pública LPO-015-2022, para la construcción anteriormente mencionada.

De esta rigurosa selección de proponentes, se adjudicó el contrato; a la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** identificado con **NIT:901.109.885-1,** para celebrar el contrato el día 23 de febrero de 2023.

Así las cosas; y siguiendo con las exigencias de la interventoría del contrato, presentamos el informe de obra Nro.13 correspondiente con fecha desde el 06 DE MARZO DE 2024 – 05 DE ABRIL DE 2024, el presente informe contiene el resumen de las actividades realizadas para el desarrollo de la obra de “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.", cuya oferta comercial es por valor de $3.684.062.560,88 y su culminación está prevista para el 5 de marzo de 2024

2. INFORMACION DEL PROYECTO


2.1. Localización del proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en Cra. 28 # 55-10, Barrancabermeja, Santander, en el INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL (ITSI)

MICROLOCALIZACIÓN



MACROLOCALIZACIÓN

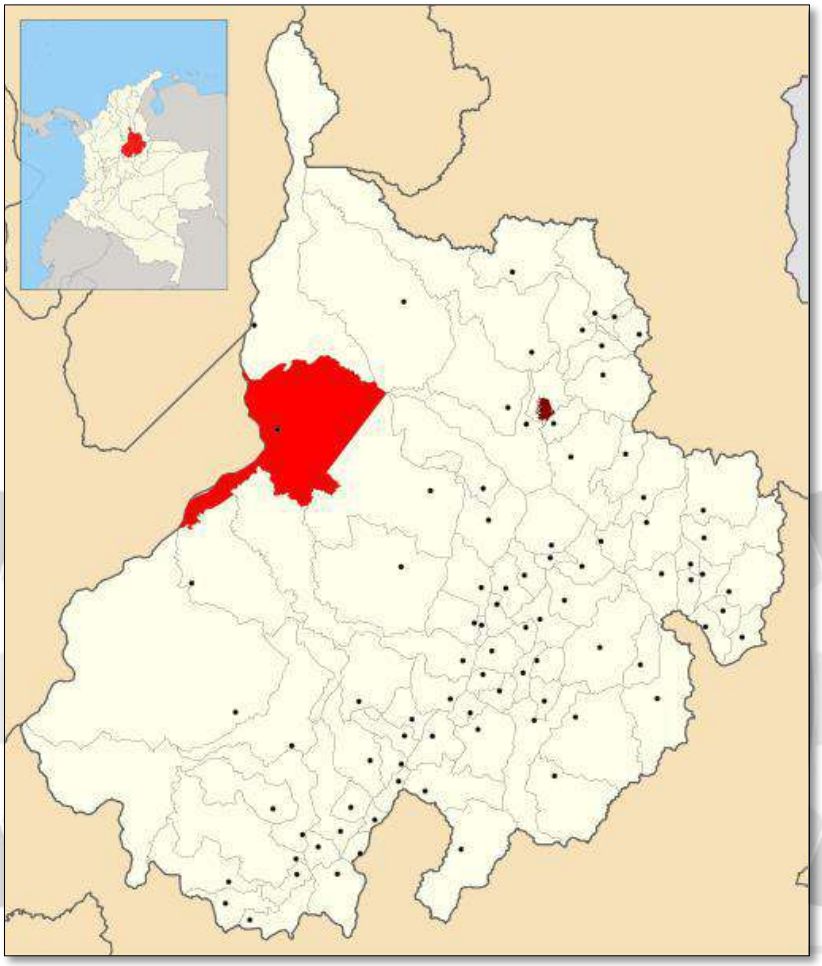

2.2. Características técnicas del proyecto y alcance

Para la ejecución del contrato 0756-23, cuyo objeto es "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" se contempló construir un comedor escolar que garantice la promoción y ampliación de la cobertura de programas de alimentación escolar que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes pertenecientes a la sede principal del Instituto Técnico Superior Industrial – ITSI, para que, por medio del suministro de un complemento alimentario diario puedan mantener sus niveles de atención, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje. Fomentando así el derecho a la educación y asegurando las condiciones necesarias para su acceso,

permanencia y culminación del proceso educativo construir un comedor escolar que garantice la promoción y ampliación de la cobertura de programas de alimentación escolar que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes pertenecientes a la sede principal del Instituto Técnico Superior Industrial – ITSI para que, por medio del suministro de un complemento alimentario diario puedan mantener sus niveles de atención, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje. Fomentando así el derecho a la educación y asegurando las condiciones necesarias para su acceso, permanencia y culminación del proceso educativo.

2.3. CONTRATO SUSCRITO

2.3.1. Contrato de Obra No. 0756-23

2.3.2. Objeto del Contrato

El objeto del Contrato de Obra es: "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.**"**

2.3.3. Contratista

El contratista es WRUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT: 901.109.885-1

2.4. Plazo del Contrato

El plazo inicial para la realización del objeto del Contrato de Obra es de doce (12) meses, teniendo una fecha de inicio de 6 de marzo de 2023 y una fecha de finalización de 5 de marzo de 2024.Se tramito ante la secretaria de infraestructura una solicitud de adición en tiempo #2 por 30 días, la cual fue aprobada el día 04 de abril del 2024 y empezó a regir a partir del día 5 de abril del 2024.

2.5. Valor de la inversión

El valor para invertir es de: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE **($ 3.684.062.560,88)**

3. CONTROL DE POLIZAS

3.1. Pólizas WRUSSY INGENIEROS SAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato

CONTRATO 0756-23

TABLA 6. POLIZAS SEGÚN FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA

Póliza de cumplimiento	11-44-101198726		
Póliza de Resp. civil Extracontractual	11-40-101051776		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO		
Fecha de expedición:	30 de marzo de 2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha inicial	fecha final	
Cumplimiento de Contrato	*06/03/2023*	*05/11/2024*	$736.812.513,00
Salarios y prestaciones sociales	*06/03/2023*	*05/05/2027*	$368.406.257,00
Estabilidad de la obra	*Si ampara 5 años, o meses y 1 días*		$736.812.513,00
Responsabilidad civil extracontractual	*06/03/2023*	*05/05/2024*	$520.000.000,00

4. CONTROL DE RECUSOS

4.1. Personal involucrado en el proyecto

Para el desarrollo del compromiso contractual, la empresa WRUSSY INGENIEROS SAS cuenta con el siguiente personal de apoyo profesional y operativo de obra:

TABLA No.2. PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL Y OPERATIVO

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO DEL TRABAJADOR
Wilver Franciny Russy Ladino	Director de Obra
Cesar Orlando Narvaez Quiñonez	Residente de Obra
Carlos Alberto Oviedo Chavarro	Profesional eléctrico
Yesenia Alvarez Acosta	Profesional Social
Sandra Milena Santiago Camacho	Apoyo SST
Antonio Jose Carvallido Carpio	Ayudante de obra
Elvis Carpio Peñaloza	Ayudante de obra
Elkin Reyes Serrano	Ayudante de obra
Yerson Martinez Carrasquilla	Guarda de seguridad

Durante el periodo de tiempo comprendido en este informe, se realiza la terminación del contrato el día 23 de marzo del 2024 al señor Antonio Jose Carvallido Carpio, y el 27 de marzo del 2024 al señor Elvis Carpio Peñaloza quienes tenían el cargo de Ayudante de Obra.

PERSONAL INSTALACIÒN CIELO RASO EN PVC Y ESTUCO		FECHA	
NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO DEL TRABAJADOR	INGRESO	SALIDA
Javier Cano Jimenez	Oficial	20/03/2024	-
Luis Carlos Moaquera Rueda	Oficial	20/03/2024	-

El personal relacionado en el cuadro anterior se encuentra realizando la actividad de instalación de cielo raso en pvc y aplicación de estuco exterior en muros de mampostería.

4.2. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

Para el desarrollo del compromiso contractual, se cuenta con la siguiente maquinaria y/o equipos:

TABLA No.3. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

EQUIPO/HERRAMIENTA	CANTIDAD
Herramienta menor	12
Pulidora 7"	2
Martillo demoledor mediano	1
Vibrador de concreto	2
Motobomba	1
Compactador tipo canguro	2
Cortadora de concreto	1
Autobomba de concreto	1
Camión tipo mixer	10
Minicargador	1
Volquetas	1
Allanadora de concreto	4

5. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO CONTRATISTA

5.1. Actividades realizadas en el periodo mantenimiento

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo:

- Se realiza instalación de enchape en muros de mampostería.
- Construcción de muro perimetral placa entrepiso.
- Se realiza la instalación de frisos de mampostería del muro de lavamanos y muro perimetral placa entrepiso.
- Instalación de acero de refuerzo, enconfre y fundida de viga cinta muro perimetral placa entrepiso.
- Se realiza destronque o pulida del piso en granito blanco huila.
- Instalación de acero de refuerzo, enconfre y fundida de alfajía muro perimetral placa entrepiso.
- Fundida de mortero de nivelación en locales 1 y 2.
- Fundida mortero de nivelación impermeablizado en la placa de entrepiso.
- Construcción de media caña placa de entrepiso.
- Se realiza instalación ducteria y cableado eléctrico en el área del comedor.
- Se realiza instalación de estructura y cielo raso en pvc
- Se inicia aplicación de estuco exterior para muros de mampostería.
- Se realiza instalación de enchape gris mikonos en los locales.

6. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINSTRATIVO

6.1. Contrato o modificaciones Suscritas

FECHA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA
23 de febrero de 2023	CONTRATO 0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
06 de febrero de 2023	ACTA DE INICIO	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
28 de Agosto de 2023	ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS #1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
29 de Agosto de 2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS #1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
11 de Septiembre de 2023	ACTA PARCIAL No.1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
13 de Septiembre del 2023	ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
21 de Septiembre del 2023	ACTA ACLARATORIA N°2 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
24 de Octubre del 2023	ACTA PARCIAL No.2	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
27 de Octubre del 2023	ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
19 de Diciembre del 2023	ACTA PARCIAL No.3	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
20 de Diciembre del 2023	ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
26 de Diciembre del 2022	ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No.02	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
27 de Diciembre del 2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS #2	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
15 de Febrero del 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS #3	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
28 de Febrero del 2024	ADICIONAL No.01 EN PLAZO EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
04 de Abril del 2024	ADICIONAL No.02 EN PLAZO EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S

6.2. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

6.2.1. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

A la fecha del presente informe se tramitó el Actas de recibo parcial #4 el dia 15 de marzo del 2024.

6.3. ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO.

6.3.1. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.

En el periodo de tiempo que comprende este informe, se tramitaron actas de modificación al contrato.

6.3.2. OTRAS ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO

En el periodo de tiempo que comprende este informe, se realizo un adicional en plazo #2 al contrato por 30 días calendario, de igual manera se modificaron las pólizas por el tiempo adicionado.

7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- Para el periodo comprendido en este informe se realizó la instalación del cielo raso en PVC en toda el área interna de la cocina.
- Se realizaron los respectivos trabajos de la placa de entrepiso, mortero de nivelación, muro perimetral con su respectiva viga dintel y alfajía
- Se realizaron las respectivas pruebas de compresión de las muestras del concreto de la placa de contrapiso del área del comedor, a los 28 días de realizadas las probetas, cumpliendo con la resistencia de 3000 psi del diseño de mezcla.
- Se realiza la instalación de enchapes de área del muro de lavamanos y de la cocina.

.

ING.WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal
WRUSSY INGENIEROS SAS NIT:901.109.885-1

5.8. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	INDEPENDIENTE	15	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	Y	18/04/2024	76122338	$194.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	194.900				194.900	0	0	194.900			1.949	194.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	194.900	194.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	194.900	194.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	INDEPENDIENTE	15	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	Y	18/04/2024	76122338	$194.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80212380	RUSSY LADINO WILVER FRANCINY	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.800.000	5	194.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
IDENTIFICACIÓN:	CC-80212380
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-17
FECHA DE PAGO:	2024-04-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29298911
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29298911
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.000	$ 350.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000	$ 448.000
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	$ 2.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.000	$ 56.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 854.000	$ 854.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/05/2024

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	18/04/2024	76159224	$2.092.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	131.200	0		0		0	0	0	0	131.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	87.200	0		0		0	0	0	0	87.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	524.700	0	0	0	0	0	0		524.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	556.800	0	0	0	0	0	0		556.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	470.600				470.600	0	0	470.600			4.706	470.600	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	270.400	0	0	270.400	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	270.400	270.400
Pensión	2	1.081.500	1.081.500
Riesgos Laborales	1	470.600	470.600
CCF	1	270.400	270.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.092.900	2.092.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	18/04/2024	76159224	$2.092.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096226349	ALVAREZ MORALES YESENIA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF38	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1098754093	NARVAEZ QUIÑONEZ CESAR ORLANDO	1	0			S																	230201	3.279.000	524.700	0	0	0	0	EPS010	3.279.000	131.200	14-11	3.279.000	5	228.300	CCF38	3.279.000	131.200	0	0	0	0	0
3	CC	37712004	SANTIAGO CAMACHO SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	2.180.000	348.800	0	0	0	0	EPS017	2.180.000	87.200	14-11	2.180.000	5	151.800	CCF38	2.180.000	87.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca / Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	15/04/2024	76180845	$2.305.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	97.600	0		0		0	0	0	0	97.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	193.800	0		0		0	0	0	0	193.800	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	390.400	0	0	0	0	0	0		390.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	346.700	0	0	0	0	0	0		346.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	428.100	0	0	0	0	0	0		428.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	507.000				507.000	0	0	507.000			5.070	507.000	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	341.400	0	0	341.400	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	291.400	291.400
Pensión	3	1.165.200	1.165.200
Riesgos Laborales	1	507.000	507.000
CCF	1	341.400	341.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.305.000	2.305.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO		Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	15/04/2024	76180845	$2.305.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096242479	CARVALLIDO CARPIO ANTONIO JOSE	1	0			S		X															230301	996.667	159.500	0	0	0	0	EPS037	996.667	39.900	14-11	996.667	5	69.400	CCF38	1.618.090	64.800	0	0	0	0	0
2	CC	1096212001	CARPIO PEÑALOZA ELVIS	1	0			S		X															230301	1.170.000	187.200	0	0	0	0	EPS037	1.170.000	46.800	14-11	1.170.000	5	81.500	CCF38	1.796.587	71.900	0	0	0	0	0
3	CC	1096218748	REYES SERRANO ELKIN FERNANDO	1	0			S								X									230201	2.439.922	390.400	0	0	0	0	EPS005	2.439.922	97.600	14-11	2.439.922	5	169.900	CCF38	2.439.922	97.600	0	0	0	0	0
4	CC	88217901	MARTINEZ CARRASQUILLA YERSON	1	0			S								X									25-14	2.675.266	428.100	0	0	0	0	EPS037	2.675.266	107.100	14-11	2.675.266	5	186.200	CCF38	2.675.266	107.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79650148
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO OVIEDO CHAVARRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 8F #79-94	TELÉFONO:	4111513
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7917782371**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/04/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	554832754

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 79650148	OVIEDO CHAVARRO CARLOS ALBERTO	INDEPEND		$ 1.300.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 370.500**

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	RIESGO 5	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	18/04/2024	76159219	$2.303.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	177.600	0		0		0	0	0	0	177.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	710.100	0	0	0	0	0	0		710.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	517.700				517.700	0	0	517.700			5.177	517.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	297.600	0	0	297.600	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	297.600	297.600
Pensión	2	1.190.100	1.190.100
Riesgos Laborales	1	517.700	517.700
CCF	1	297.600	297.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.303.000	2.303.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	RIESGO 5	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	18/04/2024	76159219	$2.303.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1057588784	SALAMANCA ROJAS KAREN LISSETH	1	0			S																	230301	4.437.580	710.100	0	0	0	0	EPS005	4.437.580	177.600	14-11	4.437.580	5	308.900	CCF24	4.437.580	177.600	0	0	0	0	0
2	CC	1049650740	ROMERO SUESCA DANIEL SANTIAGO	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

5.9. INFORME HSE DE OBRA


INFORME SST 13

PERIODO: 06 MARZO 2024 - 05 ABRIL 2024

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

Elaboró:



KAREN SALAMANCA ROJAS
WRUSSY INGENIEROS SAS

Revisó y Aprobó:



WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
WRUSSY INGENIEROS SAS

Contenido

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 3
1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 4
2. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE CONTINGENCIAS. 4
2.1. PROGRAMA D1: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 4
2.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 5
2.1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7
2.2. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 11
2.2.1. PROCEDIMIENTOS DE ALTO RIESGO 11
2.2.2. INSPECCIONES 11
2.2.3. ACCIDENTALIDAD 11
2.2.4. BRIGADAS DE EMERGENCIAS 12
2.2.5. INDICADORES 12
3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID-19 17
4. CONCLUSIONES 17

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Personal 5
Tabla 2.Charlas de seguridad 8
Tabla 3. Pausas activas 9
Tabla 4. COPASST 10
Tabla 5. CCL 10
Tabla 6. Permisos de trabajo 11
Tabla 7. Programación inspecciones 11
Tabla 8. Brigada de emergencias 12

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación del proyecto Google maps. 4

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se ejecuta en la ciudad de Barrancabermeja en la dirección Cra. 28 # 55-10, como se evidencia en la ilustración N 1.

Ilustración 1. Ubicación del proyecto Google maps.



Fuente: https://www.google.com/maps/

1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CORREO ELECTRÓNICO: proyectos@wrussyingenieros.com
OFICINA: DIRECCIÓN: Calle 8f # 79- 94 Bogotá D.C.
Contrato de Obra No. 0756-23
Objeto: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

2. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE CONTINGENCIAS.

2.1. PROGRAMA D1: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Este capítulo, está enmarcado al contexto del contrato **No. 0756-23** evidenciando las actividades ejecutadas de Seguridad y Salud en el Trabajo, derivados del desarrollo de los trabajos en obra, de igual forma, dando cumplimiento a los parámetros de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el contrato. La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** realizó todas las actividades que se establecieron en el cronograma en el periodo comprendido del **06 de marzo 2024 al**

05 abril de 2024, entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes: (identificación de riesgos en el centro de trabajo mediante la matriz de identificación de peligros, inspecciones de seguridad, inspección de orden y aseo, entrega de elementos de protección personal, charlas, pausas activas, capacitaciones, entre otras).

Dando cumplimiento al contrato en mención a continuación se relacionan todas las actividades que se han realizado en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2.1.1.1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL PERSONAL MÍNIMO

Personal para la ejecución del contrato No. 0756-23

En la tabla 1, se relaciona el personal que ejecutó actividades durante el periodo **06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024,** del cual hicieron parte: técnicos, profesionales, tecnólogos, ayudantes que realizaron labores dentro del contrato No. 0756-23.

Tabla 1. Personal

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	ESTADO
WILVER RUSSY LADINO	80.212380	DIRECTOR DE OBRA	06/03/2023		ACTIVO
KAREN SALAMANCA ROJAS	1.057.588.784	RESIDENTE HSEQ	06/03/2023		ACTIVO
CESAR ORLANDO NARVAEZ QUIÑONES	1.098.754.093	RESIDENTE DE OBRA	09/03/2023		ACTIVO
SANDRA MILENA SANTIAAGO CAMACHO	37.712.004	INSPECTOR HSEQ	15/03/2023		ACTIVO
YESENIA ALVAREZ MORALES	1.096.226.349	PROFESIONAL SOCIAL	09/03/2023		ACTIVO
ANTONIO JOSE CARVALLIDO CARPIO	1.096.242.479	AYUDANTE DE OBRA	06/03/2024	23/03/2024	INACTIVO
HECTOR JULIO ESCOBAR SAAVEDRA	91,425,553	AYUDANTE DE OBRA	06/03/2023	31/01/2024	INACTIVO
ALVEIRO CARPIO PEÑALOZA	1,042,211,689	AYUDANTE DE OBRA	06/03/2023	31/01/2024	INACTIVO
ELVIS CARPIO PEÑALOZA	1.096.212.001	AYUDANTE DE OBRA	07/03/2023	27/03/2024	INACTIVO
ALEXANDER JIMENEZ SANTAMARIA	13.565.252	AYUDANTE DE OBRA	07/03/2023	30/11/2023	INACTIVO

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1

INFORME MENSUAL

ALFONSO VERGARA	78.323.568	MAESTRO DE OBRA	23/05/2023	30/11/2023	INACTIVO
BRAYAN COSSIO	1.042.214.936	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023	30/12/2023	INACTIVO
CARLOS RODRIGUEZ	1.096.204.338	AYUDANTE DE OBRA	26/05/2023	26/11/2023	INACTIVO
DOMINGO MORA	13.568.501	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023	31/01/2024	INACTIVO
ELKIN REYES	1.096.218.748	AYUDANTE DE OBRA	26/05/2023		ACTIVO
GUSTAVO BUITRAGO	1.005.179.912	AYUDANTE DE OBRA	26/05/2023	01/07/2023	INACTIVO
ISNARDO DE JESUS MORENO	1.096.248.874	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023	15/09/2023	INACTIVO
JAIR CARPIO	1.096.253.724	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023	30/12/2023	INACTIVO
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023	30/12/2023	INACTIVO
SIGILFREDO MENDEZ	13.569.557	OFICIAL DE OBRA	26/05/2023	09/12/2023	INACTIVO
ABELINO HOMERO MUÑOZ LOPEZ	94.265.684	OFICIAL DE OBRA	27/06/2023	29/02/2024	INACTIVO
MARIO FONTALVO PEREZ	8.572.679	AYUDANTE DE OBRA	05/07/2023	30/11/2023	INACTIVO
DEIBY CARPIO AGUDELO	1.001.814.868	AYUDANTE DE OBRA	16/08/2023	29/02/2024	INACTIVO
JOSE ANGEL PEÑALOZA LARIOS	1.050.918.199	AYUDANTE DE OBRA	16/08/2023	30/12/2024	INACTIVO
WILMAR ORTIZ MENDOZA	79.392.925	OFICIAL DE OBRA	16/08/2023	30/09/2023	INACTIVO
MANUEL ARTURO BANDERA	12.400.740	AYUDANTE DE OBRA	19/09/2023	30/11/2023	INACTIVO
JUAN MIGUEL PEREZ FERRER	8.572.227	AYUDANTE DE OBRA	19/09/2023	30/11/2023	INACTIVO
ANDRES APONTE BERGAÑO	1.016.093.871	INSTALADOR	26/09/2023	25/11/2023	INACTIVO
EDILBERTO LERMA SOTO	1.014.265.807	INSTALADOR	26/09/2023	25/11/2023	INACTIVO
RONNY REYES CISNEROS	1.235.891	INSTALADOR	26/09/2023	25/11/2023	INACTIVO
ALEXANDE ESCOBAR GUEVARA	77.159.168	INSTALADOR	21/10/2023	25/11/2023	INACTIVO
JUAN MANUEL HERAS DE LA HOZ	1.083.435.187	INSTALADOR	20/10/2023	25/11/2023	INACTIVO
YERSON MARTINEZ	88.217.901	VIGILANTE	20/11/2023		ACTIVO
ANGEL GOMEZ	1.002.322.043	INSTALADOR	02/01/2024		ACTIVO
CESAR CASTILLO	1.096.250.390	MAMPOSTERO	18/12/2023	31/12/2023	INACTIVO
EDGAR POLO	1.126.255.189	INSTALADOR	02/01/2024		ACTIVO
JAVIER ESPITIA	80.282.429	ARQUITECTO	02/01/2024		ACTIVO
JHON ZAMORA	1.096.228.666	MAMPOSTERO	18/12/2023	31/12/2023	INACTIVO

LUIS LIZCANO	3.132.569	INSTALADOR	02/01/2024		ACTIVO
WILLINTON ORTIZ	91.443.547	MAMPOSTERO	18/12/2023	31/12/2023	INACTIVO
YEISON NAVARRO	1.128.047.356	MAMPOSTERO	18/12/2023	31/12/2023	INACTIVO
ANTONIO GUIO	80.770.814	DISPROARQ	24/01/2024	06/02/2024	INACTIVO
DANILO NOVA FORERO	1.005.179.957	GAS LOGISTICA DE LA NACIÓN	19/01/2024		ACTIVO
DAVID ZAMBRANO	9.142.543	ENCHAPES	31/01/2024		ACTIVO
DIOMEDES GARCIA	7.997.109	ENCHAPES	01/02/2024		ACTIVO
EDWARD SARMIENTO	1.018.498.751	DISPROARQ	24/01/2024	06/02/2024	INACTIVO
EDWIN TILANO	91.443.072	ENCHAPES	31/01/2024		ACTIVO
HECTOR ACOSTA	8.695.125	SOLDADOR	11/01/2024	20/01/2024	INACTIVO

2.1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, presentamos la gestión de seguridad y salud en el trabajo que se llevó a cabo en la ejecución del contrato entre el periodo del 06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024.

2.1.2.1. INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizó inducción de seguridad y salud en el trabajo donde se explicó al personal los siguientes temas:

- Entrega de la funciones y responsabilidades del cargo a desempeñar
- Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
- AFP-EPS-ARL-CCF
- Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG SST)
- Se da a conocer a los trabajadores, los riesgos a los cuales están expuestos en sus labores diarias.
- Riesgo Biomecánico: manipulación de cargas, esfuerzo, movimiento repetitivo.
- Riesgo físico: ruido, vibración, iluminación.
- Riesgo químico: líquidos (nieblas y humos) polvos orgánicos e inorgánicos.
- Riesgo mecánico: peligro de Izaje y cargas suspendidas, peligro de proyección de partículas.
- Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
- Procedimiento reporte de accidente de trabajo.
- RIT (Reglamento Interno de Trabajo) o Son obligaciones especiales del trabajador o Son obligaciones de los trabajadores con el uso de EPP del SG SST o Prohibiciones de los trabajadores
- Política de Seguridad y salud en el trabajo y reglamento de higiene y seguridad industrial.
- PTS (procedimientos seguros) para tareas de alto riesgo.
- Que es el comité de convivencia laboral

- Que el COPASST

Para constancia de la inducción se anexan los siguientes registros:

ANEXO 1: Inducción SGSST
ANEXO 2: Entrega individual EPP

2.1.2.2. DOCUMENTACION Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

La documentación del personal que ejecuto actividades dentro del 06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024 y las planillas de seguridad social se encuentran en el **ANEXO 3.**

2.1.2.3. CHARLAS DE SEGURIDAD

Las charlas de 5 minutos se realizaron antes de iniciar la jornada laboral, estas se realizan el objetivo de informar y sensibilizar a los trabajadores sobre su seguridad y salud en las actividades que ejecutan diariamente. En el periodo del 06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024 se programaron 24 charlas y se ejecutaron 24, cumpliendo con un porcentaje del **100 %.**

Tabla 2.Charlas de seguridad

PROGRAMACIÓN CHARLAS DE SEGURIDAD					
Fecha Programada	**Fecha Ejecutada**	**Cumple/No cumple**	**TEMA**	**Ejecutadas**	**% Cumplimiento**
06/03/2024	06/03/2024	CUMPLE	Primeros auxilios	1	100%
07/03/2024	07/03/2024	CUMPLE	Golpe de calor	1	100%
08/03/2024	08/03/2024	CUMPLE	El cambio climático	1	100%
09/03/2024	09/03/2024	CUMPLE	Prevención de las lesiones de columna	1	100%
11/03/2024	11/03/2024	CUMPLE	Intoxicación por alimentos	1	100%
12/03/2024	12/03/2024	CUMPLE	Manejo a la defensiva	1	100%
13/03/2024	13/03/2024	CUMPLE	La unión hace la fuerza	1	100%
14/03/2024	14/03/2024	CUMPLE	Conservemos lo que tenemos	1	100%
15/03/2024	15/03/2024	CUMPLE	Los veteranos también necesitan ser entrenados	1	100%
16/03/2024	16/03/2024	CUMPLE	La puntualidad en el trabajo	1	100%
18/03/2024	18/03/2024	CUMPLE	Como prevenir el estrés por calor	1	100%
19/03/2024	19/03/2024	CUMPLE	Por qué tenemos un programa de seguridad	1	100%

20/03/2024	20/03/2024	CUMPLE	Los accidentes no son casuales	1	100%
21/03/2024	21/03/2024	CUMPLE	Inspecciones	1	100%
22/03/2024	22/03/2024	CUMPLE	La seguridad durante los trabajos de alturas	1	100%
23/03/2024	23/03/2024	CUMPLE	La seguridad en trabajos eléctricos	1	100%
26/03/2024	26/03/2024	CUMPLE	Orden y aseo	1	100%
27/03/2024	27/03/2024	CUMPLE	Cuidado de las manos	1	100%
30/03/2024	30/03/2024	CUMPLE	Cuidar el agua potable	1	100%
01/04/2024	01/04/2024	CUMPLE	Cuidemos el medio ambiente	1	100%
02/04/2024	02/04/2024	CUMPLE	Ambiente laboral saludable	1	100%
03/04/2024	03/04/2024	CUMPLE	Puntualidad	1	100%
04/04/2024	04/04/2024	CUMPLE	Qué es una plática de seguridad	1	100%
05/04/2024	05/04/2024	CUMPLE	Fomentar una cultura de seguridad positiva	1	100%
				24	**100 %**

ANEXO 4: Asistencia charlas de seguridad

2.1.2.4. PAUSAS ACTIVAS

Se realizaron las pausas activas durante la jornada laboral con el fin de revitalizar la energía corporal y refrescar la mente de los trabajadores. De acuerdo con el plan de trabajo se tiene programado que las pausas activas se deben realizar todos los días laborales, donde en periodo se ejecutaron 25 pausas activas teniendo un porcentaje de cumplimiento del **100%.**

Tabla 3. Pausas activas

PROGRAMACIÓN CHARLAS DE SEGURIDAD					
Fecha Programada	**Fecha Ejecutada**	**Cumple/No cumple**	**Programadas**	**Ejecutadas**	**% Cumplimiento**
06/03/2024	06/03/2024	CUMPLE	1	1	100%
07/03/2024	07/03/2024	CUMPLE	1	1	100%
08/03/2024	08/03/2024	CUMPLE	1	1	100%
09/03/2024	09/03/2024	CUMPLE	1	1	100%
11/03/2024	11/03/2024	CUMPLE	1	1	100%
12/03/2024	12/03/2024	CUMPLE	1	1	100%
13/03/2024	13/03/2024	CUMPLE	1	1	100%
14/03/2024	14/03/2024	CUMPLE	1	1	100%
15/03/2024	15/03/2024	CUMPLE	1	1	100%

16/03/2024	16/03/2024	CUMPLE	1	1	100%
18/03/2024	18/03/2024	CUMPLE	1	1	100%
19/03/2024	19/03/2024	CUMPLE	1	1	100%
20/03/2024	20/03/2024	CUMPLE	1	1	100%
21/03/2024	21/03/2024	CUMPLE	1	1	100%
22/03/2024	22/03/2024	CUMPLE	1	1	100%
23/03/2024	23/03/2024	CUMPLE	1	1	100%
26/03/2024	26/03/2024	CUMPLE	1	1	100%
27/03/2024	27/03/2024	CUMPLE	1	1	100%
30/03/2024	30/03/2024	CUMPLE	1	1	100%
01/04/2024	01/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
02/04/2024	02/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
03/04/2024	03/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
04/04/2024	04/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
05/04/2024	05/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
			24	24	**100%**

ANEXO 5. Pausas activas

2.1.2.5. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizó reunión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, se adjunta acta de reunión del vigía de seguridad y salud en el trabajo.

Tabla 4. COPASST

FECHA	TEMAS TRATADOS
18/03/2024	1. Peligros en excavación

ANEXO 6: Acta de reunión Vigía seguridad y salud en el trabajo

2.1.2.6. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Se realizó la reunión del comité de convivencia laboral, cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, se adjunta acta de reunión del comité de convivencia laboral.

Tabla 5. CCL

FECHA	TEMAS TRATADOS
13/03/2024	1. Fraternidad en el trabajo

ANEXO 7: Acta de reunión Comité de convivencia Laboral.

2.2. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.2.1. PROCEDIMIENTOS DE ALTO RIESGO

El análisis seguro de trabajo (AST), es un proceso por el cual se identifican incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea y se elaboran procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de este. El Análisis de Seguridad en la Tarea (AST) tiene como finalidad realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de sus tareas dentro de la empresa.

Tabla 6. Permisos de trabajo

DOCUMENTO	CANTIDAD
ATS	2
Permiso en caliente	2

ANEXO 8 ATS-Permisos de trabajo.

2.2.2. INSPECCIONES

Las inspecciones de seguridad son una técnica analítica de seguridad que consiste en el análisis realizado mediante la observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos para identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos en las áreas de trabajo. Para el periodo de **06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024**, teniendo en cuenta las actividades ejecutadas en el mes.

Tabla 7. Programación inspecciones

INSPECCIÓN REALIZADA	CANTIDAD
Inspección botiquín	2
Inspección andamio estructural	1
Inspección herramientas manuales	3
Inspección pulidora	1

ANEXO 9: Inspecciones

2.2.3. ACCIDENTALIDAD

Durante el periodo del 06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024, se presentaron dos accidentes laborales.

ANEXO 10: HSE-FOR-65 Accidentalidad.

2.2.4. BRIGADAS DE EMERGENCIAS

Se realiza reunión de la brigada de emergencias del proyecto.

Tabla 8. Brigada de emergencias

FECHA	TEMAS TRATADOS
21/03/2024	• Protocolos de seguridad.

ANEXO 11: Reunión Brigada de Emergencias

2.2.5. INDICADORES

Se establecen los indicadores para dar cumplimiento a lo establecido en el plan de seguridad y salud en el trabajo.

- **FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD**

$$R = \frac{No\ accidentes\ de\ trabajo\ en\ el\ mes}{No\ de\ trabajadores\ en\ el\ mes} * 100$$

$$R = \frac{0}{10} * 100 = 0\%$$

- **ÍNDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD**

$$R = \frac{Nodíasincapacidad\ ATmes + \#días\ cargados\ en\ el\ mes}{No\ de\ trabajadores\ en\ el\ mes} * 100$$

$$R = \frac{0}{10} * 100 = 0\%$$

En el periodo de **06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024** no se tuvo accidentes laborales.

- **ÍNDICE DE PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES**

$$R = \frac{No\ AT\ mortales\ en\ el\ año}{No\ AT\ en\ el\ año} * 100$$

$$R = \frac{0}{0} * 100 = 0\%$$

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún accidente mortal.

- **INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL**

$$R = \frac{Nocasos\ nuevos\ de\ EL}{Promedio\ de\ trabajadores} * 100$$

$$R = \frac{0}{0} * 100 = 0\%$$

Durante la ejecución del proyecto no se ha presentado enfermedades laborales en los trabajadores.

- **ÍNDICE FRECUENCIA AUSENTISMO**

$$R = \frac{Nodías\ ausencia\ por\ incapacidad\ laboral}{No\ días\ programados\ de\ trabajo\ en\ el\ mes} * 100$$


$$R = \frac{0}{30} * 100 = 0\%$$

En el periodo de 06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024 no se presentó ausentismo laboral, debido a incapacidades medicas por accidente de trabajo.

- **PAUSAS ACTIVAS**

$$R = \frac{No\ pausas\ activas\ ejecutadas}{No\ pausas\ activas\ programadas} * 100$$

$$R = \frac{24}{24} * 100 = 100\%$$

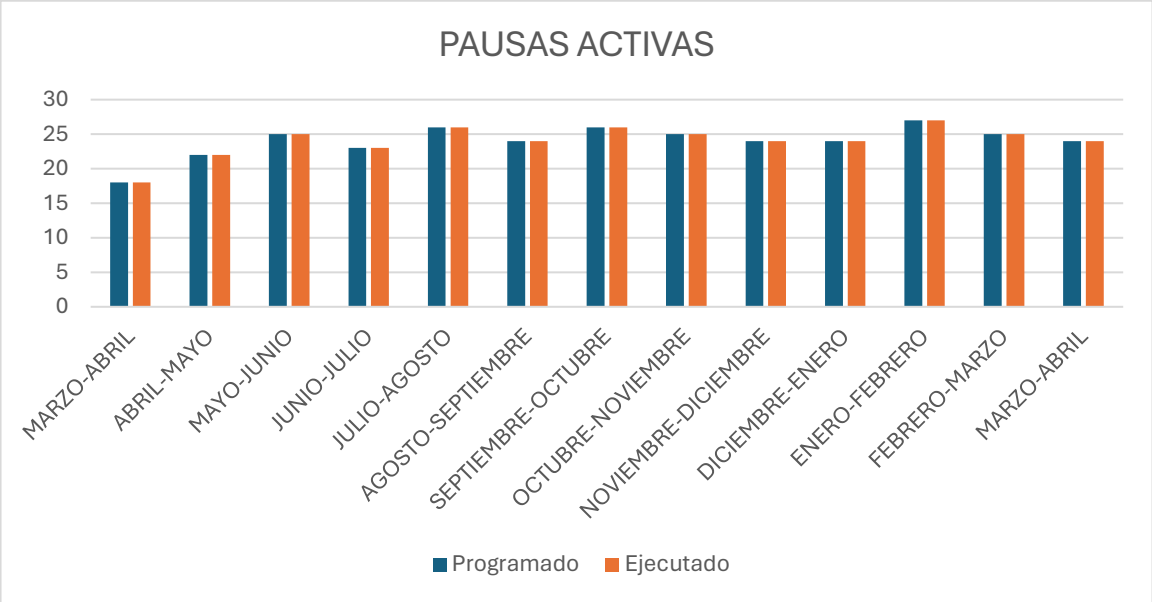


Se cumplió con el 100 % de las Pausas Activas Programadas para el periodo del 06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024.

- **CHARLAS DE SEGURIDAD.**

$$R = \frac{No\ charlas\ de\ seguridad\ ejecutadas}{No\ charlas\ de\ seguridad\ programadas} * 100$$

$$R = \frac{24}{24} * 100 = 100\%$$

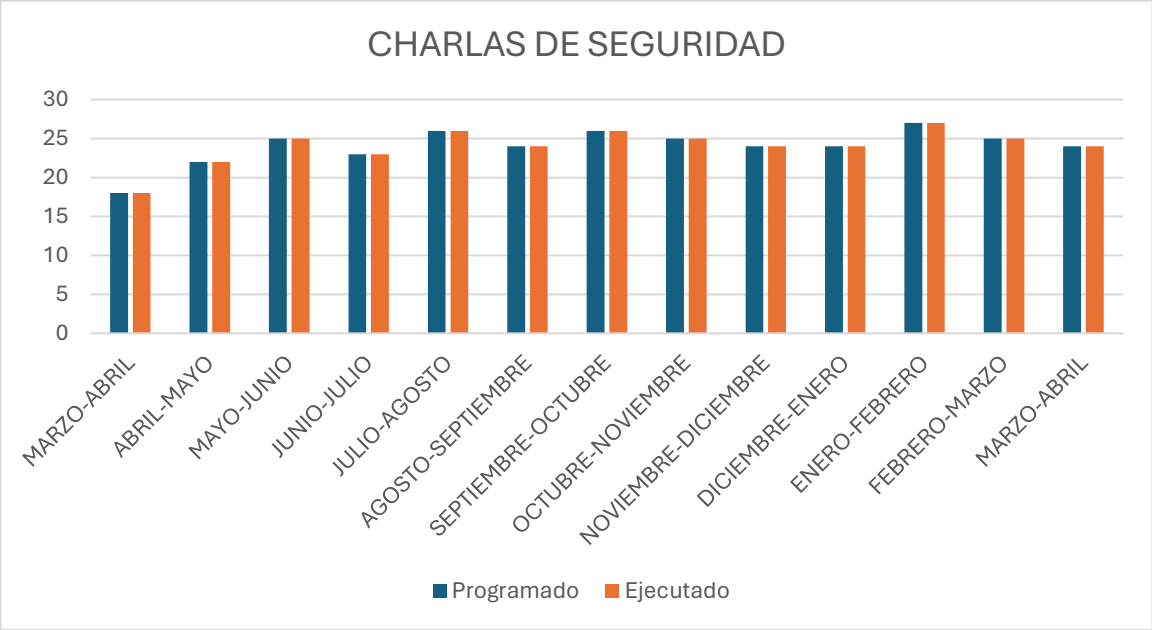


Se cumplió con el 100% de las Charlas de seguridad programadas para el periodo del 06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024.

- **CCL.**

$$R = \frac{No\ reuniones\ ejecutadas}{No\ reuniones\ ejecutadas} * 100$$


$$R = \frac{1}{1} * 100 = 100\%$$

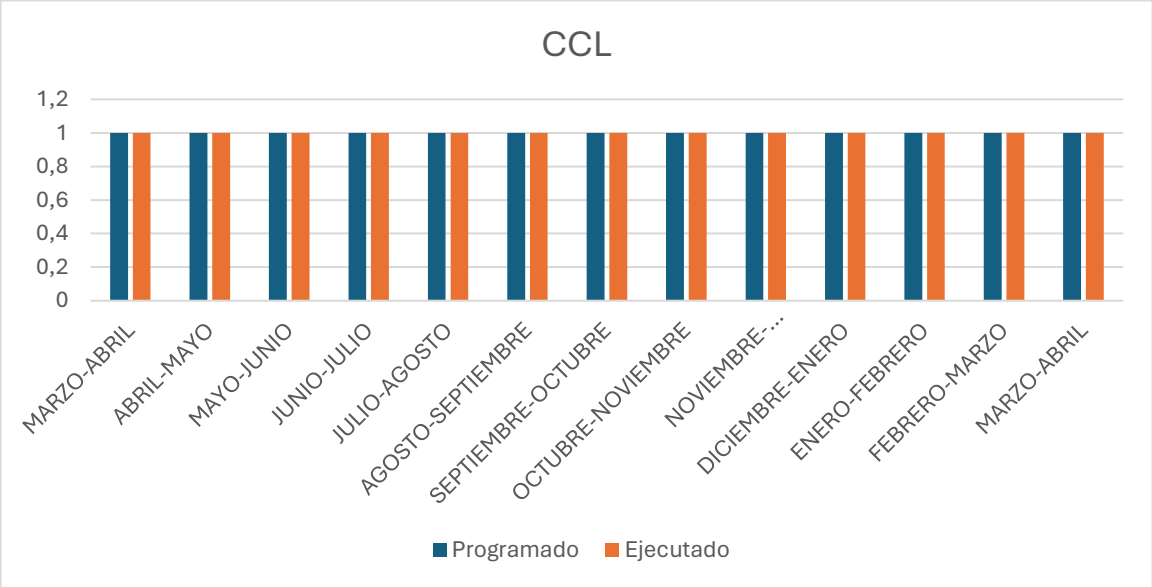

- **REUNIONES COPASST**

$$R = \frac{No\ reuniones\ ejecutadas}{No\ reuniones\ ejecutadas} * 100$$


$$R = \frac{1}{1} * 100 = 100\%$$

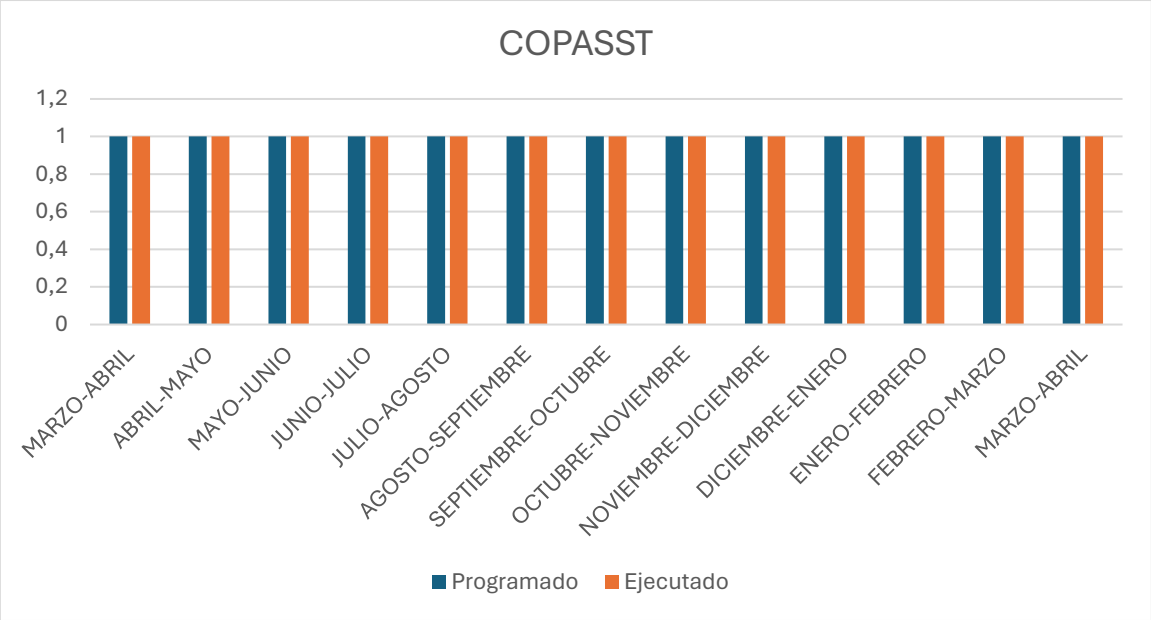

- **REUNIONES COE**

$$R = \frac{No\ reuniones\ ejecutadas}{No\ reuniones\ ejecutadas} * 100$$

$$R = \frac{1}{1} * 100 = 100\%$$

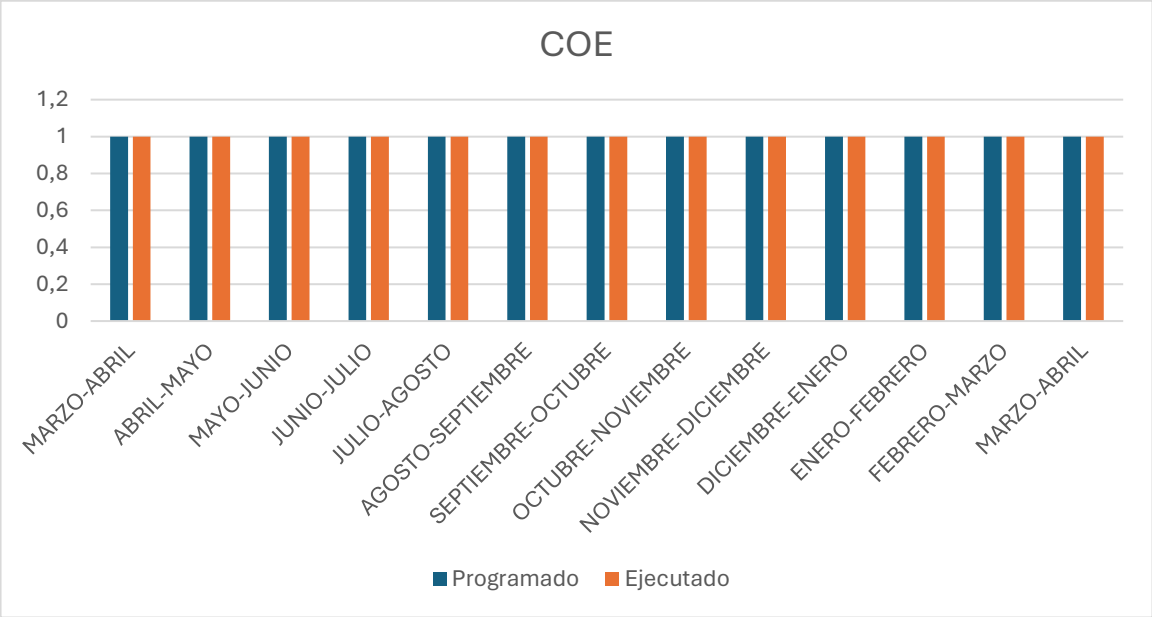

3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID-19

Debido a la pandemia que se presenta actualmente por el coronavirus COVID-19 y en cumplimiento a la circular conjunta 001 del 11 de mayo de 2020 expedida por Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio De Salud y Protección Social Y Ministerio Del Trabajo; a la circular conjunta 0000003 del 8 de mayo de 2020 expedida por el Ministerio De Salud y Protección Social, Ministerio De Trabajo y Ministerio De Transporte, al decreto 593 de 24 mayo de 2020, a la resolución 666 de 24 de mayo de 2020, al decreto 121 de 2020, a la Resolución 223 de 2021 y a la resolución 777 de 2021, entre otros, diariamente se realiza control a los trabajadores de su estado de salud mediante una encuesta para autorizar su ingreso a las instalaciones y se implementa el protocolo de bioseguridad a los trabajadores. En el **ANEXO 12** se encuentra los registros de la implementación del protocolo de bioseguridad PAPSO.

4. CONCLUSIONES

- Durante el periodo de **06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024** se realizó la reunión de comité de Convivencia laboral.

- Durante el periodo de **06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024** no se presentaron accidentes laborales.

- Se cumplió con los compromisos contractuales del contrato en el periodo del **06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024.**

- Los trabajadores contaron con los elementos de protección personal y dotaciones de acuerdo con las exigencias de la obra en mención.

- Con la implementación del protocolo y la limpieza y desinfección de manos, herramientas y áreas, se tuvo control con los empleados en cuanto a la prevención y mitigación del contagio de COVID19.

ANEXO 1. INDUCCIÓN SIG

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Nombre: Jover Cano	Fecha: 20 03 2024	Cargo: Oficial	Nota: 5.0

1. **¿Qué es un accidente de Trabajo?**
   - (a.) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
   - b. Aquel que se produce cuando el trabajador se traslada del trabajo a su vivienda en transporte público.
   - c. Aquel que se produce en cumplimiento de las tareas asignadas por mis amigos del trabajo.
   - d. Todas las anteriores.
2. **Complete el nombre de cada una de las canecas para recolección de residuos**

		
contaminados	organicos.	reciclable.

3. **Cuál es el significado de punto ecológico**
   - (a) Es una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores.
   - b. es un sitio que tiene la empresa para disponer de los residuos
   - c. es un sitio de recolección de basuras.

4. **Seleccione con una X las condiciones inseguras, con un círculo los actos inseguros.**



( )



( )



(X)



(X)

5. **Que es el comité de convivencia laboral**

   a. Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.
   b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.
   c. elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

6. **Que es el COPASST**

   a. Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.
   b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.
   c. Elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

7. **¿Cuál es el procedimiento que debo seguir en caso de accidente de trabajo?**

   a. Conservar la calma.
   b. Informar de manera inmediata al supervisor, jefe inmediato o encargado de seguridad y salud en el trabajo de la empresa usuaria.
   c. Recibir los primeros auxilios, según se requiera.
   d. La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS**, de acuerdo con el evento, llamará a la línea de atención ARL SURA, con el fin de direccionar al accidentado al centro de atención médica en convenio con ARL SURA; usted deberá dirigirse al centro de atención designado por la línea de atención ARL SURA, en caso de requerirse.

8. Mencione un compromiso de la política integrada del sistema:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

9. Mencione el objetivo de la política de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción

No llegar bajo el efecto del alcohol y sustancias psicoactivas.

10. Identifique los residuos y una con una flecha de acuerdo a la caneca que corresponda.



FIRMA

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Nombre: Luis Carlos M.	Fecha: 20-03-2024	Cargo: Ayudante.	Nota: 5.0

1. **¿Qué es un accidente de Trabajo?**
   - a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
   - b. Aquel que se produce cuando el trabajador se traslada del trabajo a su vivienda en transporte público.
   - c. Aquel que se produce en cumplimiento de las tareas asignadas por mis amigos del trabajo.
   - d. Todas las anteriores.
2. **Complete el nombre de cada una de las canecas para recolección de residuos**

		
Contaminados	Organicos	Reciclables

3. **Cuál es el significado de punto ecológico**
   - a. Es una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores.
   - b. es un sitio que tiene la empresa para disponer de los residuos
   - c. es un sitio de recolección de basuras.
4. **Seleccione con una X las condiciones inseguras, con un círculo los actos inseguros.**



O

O





X

X



5. **Que es el comité de convivencia laboral**

   a. Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.
   b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.
   c. elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

6. **Que es el COPASST**

   a. Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.
   b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.
   c. Elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

7. **¿Cuál es el procedimiento que debo seguir en caso de accidente de trabajo?**

   a. Conservar la calma.
   b. Informar de manera inmediata al supervisor, jefe inmediato o encargado de seguridad y salud en el trabajo de la empresa usuaria.
   c. Recibir los primeros auxilios, según se requiera.
   d. La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS**, de acuerdo con el evento, llamará a la línea de atención ARL SURA, con el fin de direccionar al accidentado al centro de atención médica en convenio con ARL SURA; usted deberá dirigirse al centro de atención designado por la línea de atención ARL SURA, en caso de requerirse.


8. **Mencione un compromiso de la política integrada del sistema:**

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

9. Mencione el objetivo de la política de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción

No llegar al laborar en estado alcoholicos

10. Identifique los residuos y una con una flecha de acuerdo a la caneca que corresponda.

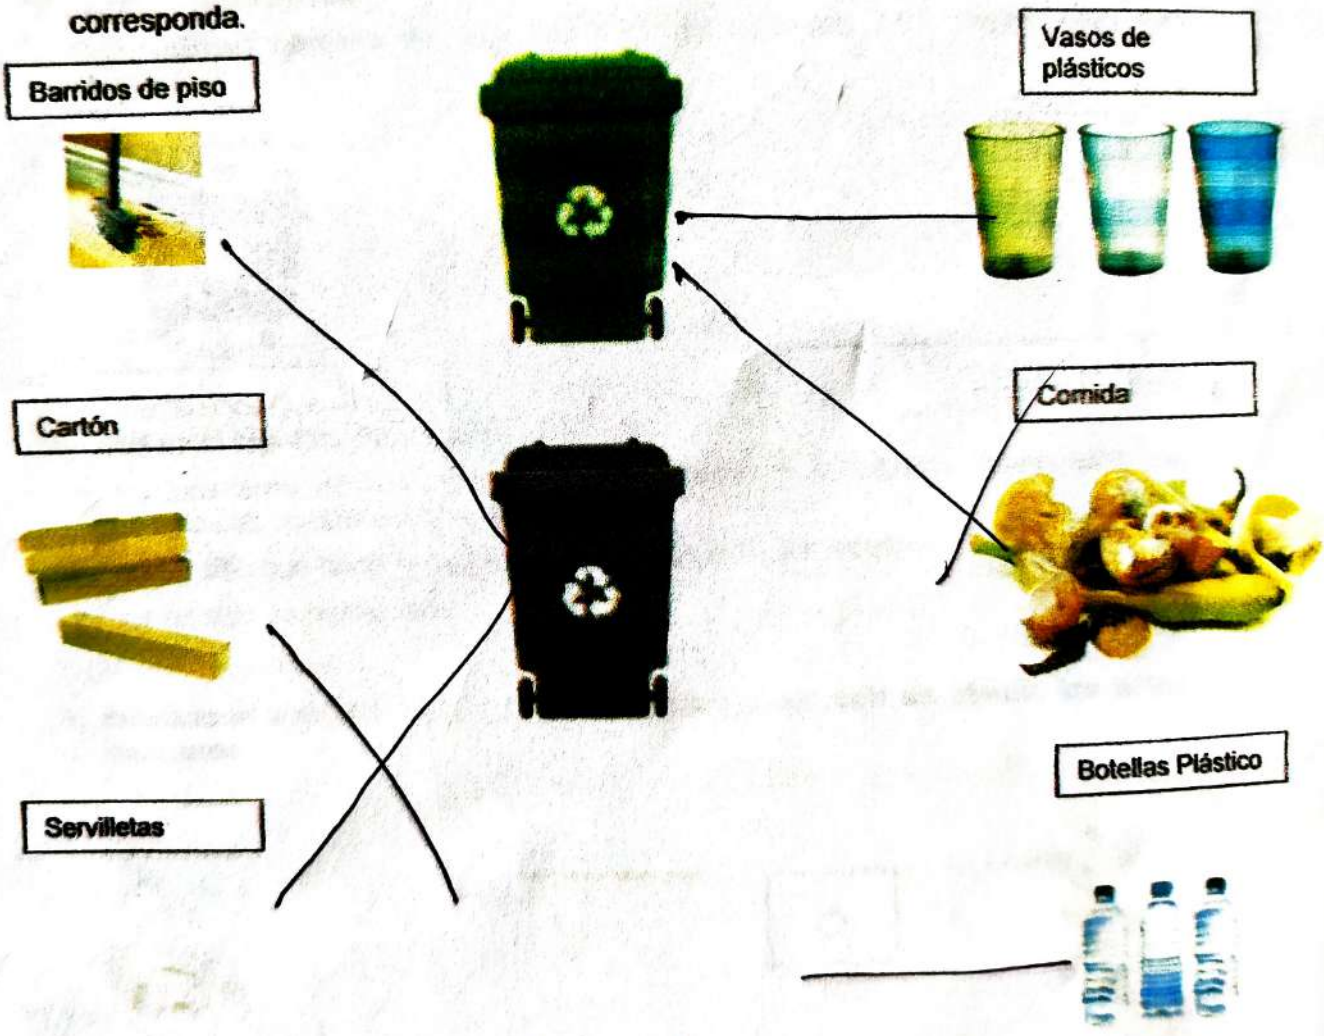

FIRMA

ANEXO 2. ENTREGA DE EPP

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	ELKIN REYES	CARGO: AYUDANTE

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes Vaqueta	Elkin Reyes	21-03-24.		
2	Guantes Nitrilo	Elkin Reyes	10-04-24.		
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR: Elkin Reyes	CEDULA: 1096218743

RESPONSABLE

NOMBRE	Sandra Santiago	CEDULA No.	37712004
CARGO	Jefe SST	FIRMA	

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Ellen F. Reyes Serrano	CARGO: Aydante.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes Vaqueta.	Ellen R	1	29-02-24.	
2	Gafas Negras	Ellen Reyes	1	05-03-24	
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la VRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR: Ellen Reyes	CEDULA: 1096218743

RESPONSABLE

NOMBRE	Sandra Santoyo	CEDULA No.	37712004
CARGO	Insp SST	FIRMA	

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Elvis Carpio	CARGO:	Ayudante.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes Paquete	Elvis Carp.	1	21-03-24.	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR: Elvis Carp.	CEDULA: 1096212001

RESPONSABLE

NOMBRE	Sandra Santiago	CEDULA No.	37712004
CARGO	Insp SST	FIRMA	

ANEXO 3. DOCUMENTACIÓN Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	INDEPENDIENTE	15	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	Y	18/04/2024	76122338	$194.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	194.900				194.900	0	0	194.900			1.949	194.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	194.900	194.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	194.900	194.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	INDEPENDIENTE	15	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	Y	18/04/2024	76122338	$194.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80212380	RUSSY LADINO WILVER FRANCINY	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.800.000	5	194.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
IDENTIFICACIÓN:	CC-80212380
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-17
FECHA DE PAGO:	2024-04-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29298911
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29298911
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.000	$ 350.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000	$ 448.000
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	$ 2.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.000	$ 56.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 854.000	$ 854.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/05/2024

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	18/04/2024	76159224	$2.092.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	131.200	0		0		0	0	0	0	131.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	87.200	0		0		0	0	0	0	87.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	524.700	0	0	0	0	0	0		524.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	556.800	0	0	0	0	0	0		556.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	470.600				470.600	0	0	470.600			4.706	470.600	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	270.400	0	0	270.400	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	270.400	270.400
Pensión	2	1.081.500	1.081.500
Riesgos Laborales	1	470.600	470.600
CCF	1	270.400	270.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.092.900	2.092.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	18/04/2024	76159224	$2.092.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096226349	ALVAREZ MORALES YESENIA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF38	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1098754093	NARVAEZ QUIÑONEZ CESAR ORLANDO	1	0			S																	230201	3.279.000	524.700	0	0	0	0	EPS010	3.279.000	131.200	14-11	3.279.000	5	228.300	CCF38	3.279.000	131.200	0	0	0	0	0
3	CC	37712004	SANTIAGO CAMACHO SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	2.180.000	348.800	0	0	0	0	EPS017	2.180.000	87.200	14-11	2.180.000	5	151.800	CCF38	2.180.000	87.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca / Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	15/04/2024	76180845	$2.305.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	97.600	0		0		0	0	0	0	97.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	193.800	0		0		0	0	0	0	193.800	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	390.400	0	0	0	0	0	0		390.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	346.700	0	0	0	0	0	0		346.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	428.100	0	0	0	0	0	0		428.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	507.000				507.000	0	0	507.000			5.070	507.000	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	341.400	0	0	341.400	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	291.400	291.400
Pensión	3	1.165.200	1.165.200
Riesgos Laborales	1	507.000	507.000
CCF	1	341.400	341.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.305.000	2.305.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO		Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	15/04/2024	76180845	$2.305.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096242479	CARVALLIDO CARPIO ANTONIO JOSE	1	0			S		X															230301	996.667	159.500	0	0	0	0	EPS037	996.667	39.900	14-11	996.667	5	69.400	CCF38	1.618.090	64.800	0	0	0	0	0
2	CC	1096212001	CARPIO PEÑALOZA ELVIS	1	0			S		X															230301	1.170.000	187.200	0	0	0	0	EPS037	1.170.000	46.800	14-11	1.170.000	5	81.500	CCF38	1.796.587	71.900	0	0	0	0	0
3	CC	1096218748	REYES SERRANO ELKIN FERNANDO	1	0			S								X									230201	2.439.922	390.400	0	0	0	0	EPS005	2.439.922	97.600	14-11	2.439.922	5	169.900	CCF38	2.439.922	97.600	0	0	0	0	0
4	CC	88217901	MARTINEZ CARRASQUILLA YERSON	1	0			S								X									25-14	2.675.266	428.100	0	0	0	0	EPS037	2.675.266	107.100	14-11	2.675.266	5	186.200	CCF38	2.675.266	107.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79650148
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO OVIEDO CHAVARRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 8F #79-94	TELÉFONO:	4111513
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7917782371**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/04/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	554832754

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 79650148	OVIEDO CHAVARRO CARLOS ALBERTO	INDEPEND		$ 1.300.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 370.500**

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	RIESGO 5	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	18/04/2024	76159219	$2.303.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	177.600	0		0		0	0	0	0	177.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	710.100	0	0	0	0	0	0		710.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	517.700				517.700	0	0	517.700			5.177	517.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	297.600	0	0	297.600	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	297.600	297.600
Pensión	2	1.190.100	1.190.100
Riesgos Laborales	1	517.700	517.700
CCF	1	297.600	297.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.303.000	2.303.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	RIESGO 5	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	18/04/2024	76159219	$2.303.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1057588784	SALAMANCA ROJAS KAREN LISSETH	1	0			S																	230301	4.437.580	710.100	0	0	0	0	EPS005	4.437.580	177.600	14-11	4.437.580	5	308.900	CCF24	4.437.580	177.600	0	0	0	0	0
2	CC	1049650740	ROMERO SUESCA DANIEL SANTIAGO	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 4. CHARLAS DE SEGURIDAD

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	06-03-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Primeros auxilios
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE		WRUSSY
6	Elvis Carpio P.	Ayudante		
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	07-03-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Golpe de Calor.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	
No.	NOMBRE		CARGO		FIRMA		EMPRESA		
1	ELKIN REYES		AYUDANTE				WRUSSY		
2	YESENIA ALVAREZ		TRABAJO SOCIAL				WRUSSY		
3	CESAR NARVAEZ		ING. RESIDENTE				WRUSSY		
4	YERSON MARTINEZ		GUARDA DE SEGURIDAD				WRUSSY		
5	ANTONIO CARVALLIDO		AYUDANTE				WRUSSY		
6									
7									
8									

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	08-03-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	El cambio climatico.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria: X | Entrenamiento: | Inducción: | Capacitación: | Otro:

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	—	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	Cesar	WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	Yerson	WRUSSY
5	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	WRUSSY
6	Elvis Cantillo	Ayudante	Elvis	
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78
	CASINO	VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	09-03-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Prevención de las lesiones de columna
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	YERSON	WRUSSY
5	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C.	WRUSSY
6	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Ct.	WRUSSY
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	11- 03- 2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Intoxicación con alimentos
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria: X | Entrenamiento: | Inducción: | Capacitación: | Otro:

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	—	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	Cesar N	WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	—	WRUSSY
5	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	WRUSSY
6	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis CP.	WRUSSY
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
	VERSION 1
	FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	12-03-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	manejo a la defensiva
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria: X | Entrenamiento: | Inducción: | Capacitación: | Otro:

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE		WRUSSY
6	ELVIS CARPIO	AYUDANTE		WRUSSY
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSIÓN 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	13-03-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a.m.	Tema:	La unión hace la fuerza.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausa activa)

Charla Diaria: X | Entrenamiento: | Inducción: | Capacitación: | Otro:

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	———	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	CESAR	WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	YERSON	WRUSSY
5	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	WRUSSY
6	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis CP	WRUSSY
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	14-03-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Conversemos lo que tenemos
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (para actuar)

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	
No.	NOMBRE			CARGO		FIRMA		EMPRESA	
1	ELKIN REYES			AYUDANTE		Elkin Reyes		WRUSSY	
2	YESENIA ALVAREZ			TRABAJO SOCIAL		Yesenia Alvarez		WRUSSY	
3	CESAR NARVAEZ			ING. RESIDENTE				WRUSSY	
4	YERSON MARTINEZ			GUARDA DE SEGURIDAD		Yerson		WRUSSY	
5	ANTONIO CARVALLIDO			AYUDANTE		Antonio C		WRUSSY	
6	ELVIS CARPIO			AYUDANTE		Elvis Carpio		WRUSSY	
7									
8									

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	15-03-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	los veteranos tambien necesitan ser entrenados
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausa activa)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE		WRUSSY
6	ELVIS CARPIO	AYUDANTE		WRUSSY
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

SABADO.

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	16-03-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	la puntualidad en el trabajo
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria: X | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE		WRUSSY
6	ELVIS CARPIO	AYUDANTE		WRUSSY
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	18-03-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Como prevenir el estres x calor
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
Y				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	Cesar	WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	———	WRUSSY
5	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio.c	WRUSSY
6	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	WRUSSY
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	19-03-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	porque tenemos un programa de seguridad
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activa))

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
	p			

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE		WRUSSY
6	ELVIS CARPIO	AYUDANTE		WRUSSY
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	20-03-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	los accidentes no son casuales
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE		WRUSSY
6	ELVIS CARPIO	AYUDANTE		WRUSSY
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	21-03-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	inspecciones
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE		WRUSSY
6	ELVIS CARPIO	AYUDANTE		WRUSSY
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CODIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	22- 03- 2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	la seguridad durante los trabajos de altura.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST

Charla Diaria: X | Entrenamiento: | Inducción: | Capacitación: | Otro:

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	Cesar	WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	YERSON	WRUSSY
5	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C.	WRUSSY
6	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	WRUSSY
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-75
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	23-02-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	la Seguridad en trabajos electricos.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST

Charla Diaria: X | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	CESAR N.	WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	YERSON	WRUSSY
5	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C.	WRUSSY
6	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	WRUSSY
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-19

VERSIÓN: 1

FECHA APROBACIÓN: 01/08/2019

Fecha	26-03-2024	Lugar	ITSI
Hora	7:00 a. m.	Tema	Orden y aseo
Responsable	SANDRA SANTIAGO	Cargo	INPS SST
Charla Diaria		Entrenamiento	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	— — —	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	CESAR N	WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	YERSON	WRUSSY
5	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	— — —	WRUSSY
6	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis	WRUSSY
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
	VERSION 1
	FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	27-03-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Cuidado de los manos
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST

Charla Diaria | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	CESAR N	WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	YERSON	WRUSSY
5	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE		WRUSSY
6	ELVIS CARPIO	AYUDANTE		WRUSSY
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	30-03-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Cuidar el agua potable.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	01-04-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Cuidemos el Medio Ambiente.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pasos activos).

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	~~ANTONIO CARVALLIDO~~	~~AYUDANTE~~		WRUSSY
6	ELVIS CARPIO	AYUDANTE		WRUSSY
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CODIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	02- 04 2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Ambiente laboral "saludable"
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).
Charla Diaria	Y	Entrenamiento	
Inducción		Capacitación	Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	CESAR ON	WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	Yerson	WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACIÓN 01/06/2019

Fecha:	03-04-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Rantualidad
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pasar actual)

Charla Diaria | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	CESAR	WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	YERSON	WRUSSY
5	~~ANTONIO CARVALLIDO~~	~~AYUDANTE~~		WRUSSY
6	ELVIS CARPIO	AYUDANTE		WRUSSY
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	04-04-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Que es una plática de seguridad
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	CESAR N	WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	YERSON	WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	05-04-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Fomentar una cultura de seguridad positiva
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	
No.	NOMBRE			CARGO		FIRMA		EMPRESA	
1	ELKIN REYES			AYUDANTE		Elkin Reyes		WRUSSY	
2	YESENIA ALVAREZ			TRABAJO SOCIAL				WRUSSY	
3	CESAR NARVAEZ			ING. RESIDENTE		CESAR		WRUSSY	
4	YERSON MARTINEZ			GUARDA DE SEGURIDAD		YERSON		WRUSSY	
5									
6									
7									
8									

ANEXO 6. COPASST

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	**ACTA DE REUNIÓN**	**CÓDIGO DE-FOR-01**
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNION: 18/03/2024 **HORA: 9:00 AM** **LUGAR: I.T.S.I BARRANCABERMEJA** **ACTA NO. 13**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Sandra Milena Santiago Camacho
TIPO DE REUNIÓN	REUNIÓN N° 13- GESTION HSE
CONTRATO N°	**No. 0756-23**
OBJETO DE LA REUNION	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
ORGANIZADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
APUNTADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
ASISTENTES	Sandra Milena Santiago Camacho

TEMAS DE DISCUSIÓN

1. Peligros en Excavación
2. Riesgos Importantes en Excavaciones

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. En las actividades relacionadas con el movimiento de tierras y obras de infraestructura (saneamiento, abastecimiento, etc.) los trabajos de excavación representan un alto porcentaje de los accidentes graves o mortales, siendo una de las principales causas el sepultamiento o enterramiento provocado por los desplomes, hundimientos y corrimientos de tierra.

2. Los riesgos más importantes en la realización de trabajos en excavaciones son:

- Caídas de personal al mismo nivel.
- Caídas de personal al interior de la excavación.
- Desprendimientos de materiales, tierras, rocas.
- Derrumbamiento del terreno o de edificios colindantes.
- Atrapamientos.
- Inundaciones.
- Golpes con objetos y herramientas.
- Colisiones de vehículos.
- Vuelco de maquinaria.
- Atropellos con vehículos.
- Ruido.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

CONCLUSIONES
- En este tipo de trabajos deben de utilizarse los EPP´S adecuados a los riesgos existentes y especialmente, casco, calzado de seguridad, gafas, guantes de protección, chaleco reflectante.
COMPROMISOS
- Se solicita verificar el cronograma de capacitaciones se incluyen temas sobre el peligro en excavaciones.

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C
ELUIS CARPIO	AYUDANTE	Eluis Carpio

ANEXO 7. CCL

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	**ACTA DE REUNIÓN**	**CÓDIGO DE-FOR-01** **VERSIÓN 2** **FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019**

FECHA REUNION: 13/03/2024 **HORA: 9:00 AM** **LUGAR: I.T.S.I BARRANCABERMEJA** **ACTA NO. 13**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Sandra Milena Santiago Camacho
TIPO DE REUNIÓN	REUNIÓN N° 13- GESTION HSE
CONTRATO N°	**No. 0756-23**
OBJETO DE LA REUNION	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
ORGANIZADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
APUNTADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
ASISTENTES	Sandra Milena Santiago Camacho

TEMAS DE DISCUSIÓN
1. Fraternidad en el trabajo.
2. Características de la Fraternidad
3. Tipos de Fraternidad
4. Valores que conforman la Fraternidad

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. La fraternidad es el afecto y el vínculo entre hermanos o entre quienes se tratan como tales. La fraternidad también puede sentirse muchas veces con personas con las que no se comparte necesariamente un lazo de sangre si no que se comparten numerosas y emotivas experiencias de vida.

2. La fraternidad puede ser el vínculo que une a dos hermanos y que presupone un lazo de sangre, uniones emocionales y psicológicas que tienen su origen en la crianza, en las experiencias vividas.

    - La característica de la fraternidad es que son organizaciones formadas y dirigidas por personas unidas por lazos de sanguíneos o no, que tienen un objetivo que establece todo un sistema de símbolos, rituales, formas de pensamiento y ceremonias.

3. En el mundo existe diversos tipos de fraternidades que esta unidas por el acompañamiento y respeto mutuo, así como por sus corrientes filosóficas e históricas y que van desde:
    - Las sociedades estudiantiles.
    - Fraternidades y sororidades
    - Sociedades de honor

- Grupos generacionales
- Sociedades literarias
- Fraternidades de profesionales
- Diversas corporaciones de estudiantes
- Sociedades de Beneficencia

4. Valores de la Fraternidad
   - Amistad
   - Lealtad
   - Honestidad
   - Amor
   - Respeto

CONCLUSIONES

- La fraternidad es un valor muy importante en nuestras vidas que nos ayuda a ser mejores personas.
- La fraternidad no es estar a un lado de una persona sino ayudarla, ser solidarios, cooperativos.

COMPROMISOS

- Se solicita verificar si dentro del cronograma de capacitaciones se incluyen charlas sobre la Fraternidad.

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C
ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carp.

ANEXO 8. ATS-PERMISOS

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-18
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACION: 09/09/2019

Empresa: WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Lugar de Trabajo: ITST BARRANCABERMEJA

Fecha de inicio 01- 03- 2024

Fecha de finalizacion 08- 03- 2024.

*instalación de enchapes, muros, pisos y media caña en granito pulida.

Descripción de la tarea a realizar:

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA		ESPACIO CONFINADO		CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS		ELECTRICO		OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	
1096212001	Elvis Carpio
1096218748	Elkin Reyes
1096242479	Antonio Carvallido
13.565.252	Alexander Jimenez
1001814868	Deibi Carpio
1098754093	Cesar Narvaez.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Palas, picos, Carretillas, Martillos, Serrucho, flexometro, llanas, pulst
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	Nivel de piso
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	puerta trasera del colegio ITSI.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	EPP
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, guantes, botas, con puntera
¿Cuántos trabajadores se requieren?	13
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	baldosas, Cemento, pega perfecto, Granito
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	SI

Pasos detallados de la tarea	Riesgos/Consecuencias	CONTROLES	RESPONSABLE
*PELIGROS COMUNES A LAS ACTIVIDADES DEL TRABAJO	* particulas en suspensión pinchazos, laseraciones, posturas incomodas. del trabajo	* Inspeccion previamente a la zona de trabajo	Ing Residente Insp SST
	* Despejar el area de trabajo caidas al mismo nivel, golpes por manipulación de htas y materiales	* inspección de area, uso de EPP, capacitación del personal sobre el uso de htas.	Ing Residente Insp SST
	* Atrapamiento riesgo ergonomico por sobre esfuerzo.	* Preparación de la totalidad de material y equipos a utilizar	Ing Residente Insp SST
Instalación de enchapes.	* Caidas al mismo nivel Caidas de objetos	totalidad de material. * verificar las conexión	Insp Residente Ing Residente
	* Desconocimiento de peligro de las actividades	* limpieza en la zona de trabajo	Insp SST Insp Residente
pegado de baldosas.	* Posturas y levantamiento manual de cargas	* Caminar con precaución dependiendo	Insp SST Ing Residente
	* Material particulado en el ambiente.	de las condiciones del terreno, revisar	Insp SST Ing Residente
	* Contusiones Esguince y fracturas	y atras * Divulgación de PTO	Insp SST
Granito pulido.	* Caidas. al mismo nivel y a distintos niveles de objetos.	Cedimientos ATS a Diario y a sus respectivas acciones y	
	* Golpes lesiones y Cortes en manos y pies	Controles * Htas materiales y	
	* Dejar el area antes y despues de cada actividad	equipos deberian usarse de forma	
	Limpia y Ordenada.	Ordenada.	

FIRMA INSPECTOR HSEQ	
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	CESAR ROA

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACION: 09/09/2019

Empresa: WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Lugar de Trabajo: ITST BARRANCABERMEJA

Fecha de inicio 11-03-2024

Fecha de finalizacion 16-03-2024

* Instalación de enchapes, muros, pisos y media cara en Granito pulida. Muro en mampostería.

Descripción de la tarea a realizar:

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☒
ENERGIA PELIGROSAS	☐	ELECTRICO	☐	OTRO, CUAL?	☐

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	
1096212001 Elvis Carpio	
1096218748 Elkin Reyes	
1096242479 Antonio Carvallido	
13 565 252 Alexander Jimenez	
1001814868 Deibi Carpio	
1098754093 Cesar Navaez	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Palas, barras, Carretillas, Serrucho, Flexometro, llanas, Palustre, Cortadora
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	Nivel de piso
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Puerta trasera del edificio ITST
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	EPP
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, guantes, botas con punteras, Gafas
¿Cuántos trabajadores se requieren?	13
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Baldosas, cemento, pegaperfecta, Granito
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	SI

Pasos detallados de la tarea	Riesgos/Consecuencias	CONTROLES	RESPONSABLE
* PELIGROS CONEXOS A LAS ACTIVIDADES DEL TRABAJO * INSTALACIÓN DE BALDOSAS. * PEGADO DE BALDOSAS * GRANITO PULIDO * ORDEN Y ASEO.	* Particulas en suspensión * Anchazos, lesiones, posturas incomodas del trabajo * Desplazar el area de trabajo caidas al mismo nivel, golpes x manipulación de herramientas y materiales * Atrapamiento riesgo ergonomico por sobre esfuerzo * Caidas al mismo nivel * caidas de objetos * Desconocimiento de peligros de las actividades * Posturas y levantamiento manual de cargas * Material particulado en el Ambiente * Contusiones esguince y fracturas * Caidas al mismo nivel y a distintos niveles de objetos * Golpes lesiones y Cortes en manos y pies * Dejar el area antes y despues de cada actividad * limpia y Ordenada.	* Inspección previamente a la zona de trabajo * Inspección del area uso de EPP, capacitación del personal sobre el uso de herramientas. * Preparación de la totalidad de material y equipos a utilizar. *Verificar las conexiones * limpieza en la zona de trabajo. * Caminar con precaución dependiendo de las condiciones del terreno revisar arriba, abajo, adelante y otras * Divulgación de procedimiento, ATS * Orden y sus respectivas acciones y controles * Herramientas materiales y equipos deberían ubicarse de Forma Ordenada. * limpiar antes y despues de cada actividad.	Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST

FIRMA INSPECTOR HSEQ	
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

CODIGO: HSE-FOR-103
VERSION 1
FECHA APROBACION 08/01/2019

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 01 (DIA dd) 03 (MES mm) 2024 (AÑO aa)
PERMISO VALIDO HASTA: 08 (DIA dd) 03 (MES mm) 2024 (AÑO aa)
EMPRESA EJECUTORA: RUSSY
ÁREA O LUGAR: Colegio ITSI de bachata.
Nº CONTRATO:
ACTIVIDAD A REALIZAR: Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio ITSI – Enchape de muros, instalación de mortero de nivelación para placa entre piso
Nº PERSONAS EJECUTORAS:
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Mini menores pala, pona, flexometro, pulidor, llanas. Cortadora manual, carretillas, andamios.

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [X] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)

	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	X		
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	X		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	X		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	X		
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?			X
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?			X
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			X
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			X
¿Se observe bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			X
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos

	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura			X
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.			X
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.			X

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)

	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	X	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	X	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	X	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [X] NO [ ]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [X]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [X]

¿Cuales? _____

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante)

Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [X] NO [ ]
¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [ ] NO [X]
¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.
01-03-2024	7:00 AM - 5:00 PM.	1096241286	ESNEYDER 1098784093
02-03-2024	7:00 AM - 5:00 PM.	1096241286	ESNEYDER 1098784093
04-03-2024	7:00 AM - 5:00 PM.	1096241286	ESNEYDER 1098784093
05-03-2024	7:00 AM - 5:00 PM	1096241286	ESNEYDER 1098784093
06-03-2024	7:00 AM - 5:00 PM.	1096241286	ESNEYDER 1098784093
07-03-2024	7:00 AM - 5:00 PM	1096241286	ESNEYDER 1098784093
08-03-2024	7:00 AM - 5:00 PM	1096241286	ESNEYDER 1098784093

8. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:
- [NO] El trabajo ha sido terminado
- [SI] El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- [SI] Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

ESNEYDER 1098784093
NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

EMISOR: Personalmente he verificado que:
- [ ] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [ ] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [ ] El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):

OBSERVACIONES:

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	CODIGO: HSE-FOR-168
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 08/01/2019

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 11 (DIA dd) 03 (MES mm) 2024 (AÑO aa) — PERMISO VALIDO HASTA: 16 (DIA dd) 03 (MES mm) 2024 (AÑO aa)

EMPRESA EJECUTORA: Russy — Nº CONTRATO:

ÁREA O LUGAR: Colegio IEST de buenavista — Nº PERSONAS EJECUTORAS:

ACTIVIDAD A REALIZAR: Construccion y dotacion de cocina y comedor del colegio, Enchape de muros, instalacion de mortero de nivelacion para placa entrepiso, Pañado de muros

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Hta menores, pala, pica, palustre, llana, Cortadora manual, Careta, electrodos

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [X] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)

	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	X		
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	X		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	X		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	X		
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?			X
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?			X
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			X
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			X
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			X
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos

	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura			X
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.			X
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.			X

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)

	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	X	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	X	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	X	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [X] NO [ ]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [X]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [X]

¿Cuales? _____

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [X] NO [ ]

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [X] NO [ ]

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO D.C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO D.C.C.
11-03-2024	7:00 AM - 5:00 PM	1094624186	1098754093

8. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

- [ ] El trabajo ha sido terminado
- [ ] El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- [ ] Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

EMISOR: Personalmente he verificado que:

- [ ] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [ ] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [ ] El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):

OBSERVACIONES:

ANEXO 9. INSPECCIONES

RUSSY INGENIERIA S.A.S

INSPECCION PREOPERACIONAL
ANDAMIO ESTRUCTURAL

CODIGO: HSE-FOR-113-24
VERSION: 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO:	Construcción y dotación de comedor y cocina del Colegio ITSI de bca-bja.
Nº CONTRATO	0756-23
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia
EMPRESA CONTRATISTA	Wevssy Ingenieros SAS

FECHA: 04-03-2024
09-03-2024.

	ASPECTO EVALUADO (SI/NO)	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	El andamio es (metálico y tubular	✓			
2	Los componentes están libres de oxidaciones [illegible]	✓			
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas	✓			
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓			
5	La estructura es adecuadamente armada y	✓			
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓			
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓			
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	✓			
9	Las plataformas están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓			
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓			
11	Cuenta con baranda superior	✓			
12	Cuenta con baranda intermedia	✓			
13	Cuenta con rodapiés	✓			
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓			
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	✓			
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	✓			

FIRMA		
	FIRMA OPERADOR/AYUDANTE	Elkin Reyes.
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	
	COPASST	Elda Cortes
	FIRMA ASESOR HSEQ	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO

RUSSY INGENIEROS S.A.S

INSPECCION PREOPERACIONAL ANDAMIO ESTRUCTURAL

CODIGO: HSE FOR 113 24
VERSION: 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO.	Construcción y dotación de comedor y cocina del Colegio ITSI de 6la-6/9.
Nº CONTRATO	0756-23
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldía. FECHA: 11-03-2024
EMPRESA CONTRATISTA	Wessy Ingenieros SAS. 16-03-2024.

	ASPECTO EVALUADO (SI/NO)	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	El andamio es metálico y tubular	✓			
2	Los componentes están libres de oxidaciones	✓			
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rigidas	✓			
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓			
5	La estructura es adecuadamente armada y	✓			
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓			
7	Los componentes son compatibles y se encuentran	✓			
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	✓			
9	Las plataformas están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓			
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓			
11	Cuenta con baranda superior	✓			
12	Cuenta con baranda intermedia	✓			
13	Cuenta con rodapiés	✓			
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓			
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	✓			
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	✓			

FIRMA		
	FIRMA OPERADOR / AYUDANTE	Stiven Reyes.
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	Antonio C.
	COPASST	
	FIRMA ASESOR HSEQ	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO

WRUSSY INGENIEROS S.A.S	**INSPECCION PREOPERACIONAL ANDAMIO ESTRUCTURAL**	**CODIGO: HSE-FOR-113-24** **VERSION: 1** **FECHA DE APROBACION: 08/01/2019**

OBJETO:	Construcción y dotación de comedor y cocina del colegio ITSI de buga-bla.
N° CONTRATO	0756-23
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia Fecha: 26-02-2024.
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY Ingenieros SAS 02-05-2024.

	ASPECTO EVALUADO (SI/NO)	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	El andamio es metálico y tubular	✓			
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	✓			
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas	✓			
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓			
5	La estructura es adecuadamente armada y	✓			
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓			
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓			
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	✓			
9	Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓			
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓			
11	Cuenta con baranda superior	✓			
12	Cuenta con baranda intermedia	✓			
13	Cuenta con rodapiés	✓			
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓			
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	✓			
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	✓			

FIRMA		
FIRMA	**FIRMA OPERADOR (AYUDANTE**	Elkin Reyes
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	
	COPASST	Edwin Campiño
	FIRMA ASESOR HSEQ	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	CODIGO: HSE-FOR-05
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construcción y dotación de comedor y cocina en el colegio ITSI del distrito de bga-b/g.		
N° contrato	0756-23		
Entidad Contratante:	Alcaldía.	**NIT:**	
Empresa Contratista:	Wessy Ingenieros S.A.S.	**NIT:**	901.109885-1

Ubicación del botiquin:

Tipo de botiquin: Móvil [X] Fijo [ ] **Señalización:** [ ] Tiene [ ] No tiene

	ELEMENTO	Cantidad mínima	Cumple SI = √ No=X	Fecha de Vencimiento	OBSERVACIONES
	Antiséptico				
1	Solución salina o suero fisiológico en bolsa	500ml	✓	JUN 2025	
2	Alcohol antiséptico 70% (botella plástica) Limpieza instrumental	120ml	✓	NOV 2025	
3	Yodopovidona- Isodine Espuma	60ml	✓	JUN 2025	
4	Jabón Liquido Antibacterial	60ml	✓		
	Elementos de Protección Personal				
5	Guantes látex desechables (empaque individual)	6 pares	✓	04-11-25.	
6	Tapabocas desechables (empaque individual)	4	✓		
7	Monogafas (empaque individual)	1	✓		
8	Mascarilla Facial de Bolsillo para RCCP (reanimación cerebrocardiopulmonar)	1	X		
	Instrumental				
9	Tijera universal	1	✓		
10	Linterna Pequeña	1	X		
11	Termómetro digital o de mercurio	1	X		
12	Gotero y/o Jeringa	1	✓		
13	Inmovilizador cervical multitalla (adulto)	1	✓		
14	Inmovilizadores Maleables (para brazos y piernas)	4	✓		

Curación					
15	Algodón	Bolsa 50g	✓		
16	Gasa en paquetes individual	4 paquetes	X		no hay.
17	Vendas elástica con gancho	1	✓		
18	Vendas elásticas de 5 Yardas x 4Pulg	3	✓		
19	Curitas	40	✓		
20	Toalla higiénica (Apósitos)	4	✓		
21	Venda triangular	6	✓		
22	Esparadrapo de Micropore	1 rollo	✓		
23	Esparadrapo de Tela tamaño Grande	1 rollo	✓		
24	Aplicadores (Copitos)	50	✓		
25	Bajalenguas	20	✓		
26	Compresas	4	✓		
Hidratación					
27	Suero oral de rehidratación (Hidraplus)	6 sachets	✓		
Varios					
28	Bolsas de plástico (Roja)	2	✓		
29	Camilla	1	✓		

INSPECCIONO: Insp SST — **FECHA DE INSPECCION:** 26-03-2024. 01-03-2024.

NOMBRE: Sandra Santiago — CARGO: Insp SST — FIRMA

COPASST

INSPECCIONO: Antonio Carvallido — **FECHA DE INSPECCION:** 26-03-2024

NOMBRE: Antonio C. — CARGO: Ayudante — FIRMA Antonio C.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	CODIGO: HSE-FOR-05
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construcción y dotación de comedor y cocina en el Colegio ITSI del distrito de Buenaventura.		
N° contrato	0756-23		
Entidad Contratante:	Alcaldía	**NIT:**	
Empresa Contratista:	Wressy Ingeniero S.A.S	**NIT:**	901109885-1
Ubicación del botiquin:			
Tipo de botiquin:	Móvil X	Fijo	**Señalización:** Tiene No tiene

	ELEMENTO	Cantidad mínima	Cumple SI = √ No=X	Fecha de Vencimiento	OBSERVACIONES
	Antiséptico				
1	Solución salina o suero fisiológico en bolsa	500ml	✓	Jun 2025	
2	Alcohol antiséptico 70% (botella plástica) Limpieza instrumental	120ml	✓	NOV 2025	
3	Yodopovidona- Isodine Espuma	60ml	✓	JUN 2025	
4	Jabón Liquido Antibacterial	60ml	✓		
	Elementos de Protección Personal				
5	Guantes látex desechables (empaque individual)	6 pares	✓	04-11-25	
6	Tapabocas desechables (empaque individual)	4	✓		
7	Monogafas (empaque individual)	1	✓		
8	Mascarilla Facial de Bolsillo para RCCP (reanimación cerebrocardiopulmonar)	1	X		
	Instrumental				
9	Tijera universal	1	✓		
10	Linterna Pequeña	1	X		
11	Termómetro digital o de mercurio	1	X		
12	Gotero y/o Jeringa	1	✓		
13	Inmovilizador cervical multitalla (adulto)	1	✓		
14	Inmovilizadores Maleables (para brazos y piernas)	4	✓		

Curación					
15	Algodón	Bolsa 50g	✓		
16	Gasa en paquetes individual	4 paquetes	X		no hay
17	Vendas elástica con gancho	1	✓		
18	Vendas elásticas de 5 Yardas x 4Pulg	3	✓		
19	Curitas	40	✓		
20	Toalla higiénica (Apósitos)	4	✓		
21	Venda triangular	6	✓		
22	Esparadrapo de Micropore	1 rollo	✓		
23	Esparadrapo de Tela tamaño Grande	1 rollo	✓		
24	Aplicadores (Copitos)	50	✓		
25	Bajalenguas	20	✓		
26	Compresas	4	✓		
Hidratación					
27	Suero oral de rehidratación (Hidraplus)	6 sachets	✓		
Varios					
28	Bolsas de plástico (Roja)	2	✓		
29	Camilla	1	✓		

INSPECCIONO: Insp SST — **FECHA DE INSPECCION:** 02-03-2024. 09-03-2024.

NOMBRE: Sandra Santiago — CARGO: Insp SST — FIRMA: [signature]

COPASST

INSPECCIONO: Antonio Corvallido — **FECHA DE INSPECCION:** 02-03-2024.

NOMBRE: Antonio C. — CARGO: Ayudante — FIRMA: Antonio C.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	CODIGO: HSE-FOR-05
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construcción y dotación de cocina y comedor en el colegio ITSI de bocabija.		
N° contrato	0756-23		
Entidad Contratante:	Alcaldía	**NIT:**	
Empresa Contratista:	Russy Ingenieros SAS.	**NIT:**	901109885-1
Ubicación del botiquin:			
Tipo de botiquin:	Móvil X	Fijo	**Señalización:** Tiene No tiene

	ELEMENTO	Cantidad minima	Cumple SI = √ No=X	Fecha de Vencimiento	OBSERVACIONES
	Antiséptico				
1	Solución salina o suero fisiológico en bolsa	500ml	✓	JUN 2025	
2	Alcohol antiséptico 70% (botella plástica) Limpieza instrumental	120ml	✓	NOV 2025	
3	Yodopovidona- Isodine Espuma	60ml	✓	JUN 2025	
4	Jabón Liquido Antibacterial	60ml	✓		
	Elementos de Protección Personal				
5	Guantes látex desechables (empaque individual)	6 pares	✓	04-11-25	
6	Tapabocas desechables (empaque individual)	4	✓		
7	Monogafas (empaque individual)	1	✓		
8	Mascarilla Facial de Bolsillo para RCCP (reanimación cerebrocardiopulmonar)	1	X		
	Instrumental				
9	Tijera universal	1	✓		
10	Linterna Pequeña	1	X		
11	Termómetro digital o de mercurio	1	X		
12	Gotero y/o Jeringa	1	✓		
13	Inmovilizador cervical multitalla (adulto)	1	✓		
14	Inmovilizadores Maleables (para brazos y piernas)	4	✓		

Curación					
15	Algodón	Bolsa 50g	✓		
16	Gasa en paquetes individual	4 paquetes	X		No hay
17	Vendas elástica con gancho	1	✓		
18	Vendas elásticas de 5 Yardas x 4Pulg	3	✓		
19	Curitas	40	✓		
20	Toalla higiénica (Apósitos)	4	✓		
21	Venda triangular	6	✓		
22	Esparadrapo de Micropore	1 rollo	✓		
23	Esparadrapo de Tela tamaño Grande	1 rollo	✓		
24	Aplicadores (Copitos)	50	✓		
25	Bajalenguas	20	✓		
26	Compresas	4	✓		
Hidratación					
27	Suero oral de rehidratación (Hidraplus)	6 sachets	✓		
Varios					
28	Bolsas de plástico (Roja)	2	✓		
29	Camilla	1	✓		

INSPECCIONO: Insp SST	**FECHA DE INSPECCION:** 11-03-2024 16-03-2024.	
NOMBRE: Sandra Santiago	CARGO: Insp SST	FIRMA
COPASST		
INSPECCIONO: Antonio Carvallo.	**FECHA DE INSPECCION:** 11-03-2024.	
NOMBRE: Antonio C.	CARGO: Ayudante.	FIRMA Antonio C.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	CODIGO: HSE-FOR-05
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construcción y dotación de comedor y cocina en el Colegio ITSI del distrito de bca-bja.		
N° contrato	0756-23		
Entidad Contratante:	Alcaldia	**NIT:**	
Empresa Contratista:	Wrussy Ingenieros S.A.S	**NIT:**	901.109.885-1
Ubicación del botiquin:			
Tipo de botiquin:	Móvil	Fijo	**Señalización:** Tiene / No tiene

	ELEMENTO	Cantidad mínima	Cumple SI = √ No=X	Fecha de Vencimiento	OBSERVACIONES
	Antiséptico				
1	Solución salina o suero fisiológico en bolsa	500ml	✓	JUN 2025	
2	Alcohol antiséptico 70% (botella plástica) Limpieza instrumental	120ml	✓	NOV 2025	
3	Yodopovidona- Isodine Espuma	60ml	✓	JUN 2025	
4	Jabón Liquido Antibacterial	60ml	✓		
	Elementos de Protección Personal				
5	Guantes látex desechables (empaque individual)	6 pares	✓	04-11-25	
6	Tapabocas desechables (empaque individual)	4	✓		
7	Monogafas (empaque individual)	1	✓		
8	Mascarilla Facial de Bolsillo para RCCP (reanimación cerebrocardiopulmonar)	1	X		
	Instrumental				
9	Tijera universal	1	✓		
10	Linterna Pequeña	1	X		
11	Termómetro digital o de mercurio	1	X		
12	Gotero y/o Jeringa	1	✓		
13	Inmovilizador cervical multitalla (adulto)	1	✓		
14	Inmovilizadores Maleables (para brazos y piernas)	4	✓		

Curación					
15	Algodón	Bolsa 50g	✓		
16	Gasa en paquetes individual	4 paquetes	X		no hay
17	Vendas elástica con gancho	1	✓		
18	Vendas elásticas de 5 Yardas x 4Pulg	3	✓		
19	Curitas	40	✓		
20	Toalla higiénica (Apósitos)	4	✓		
21	Venda triangular	6	✓		
22	Esparadrapo de Micropore	1 rollo	✓		
23	Esparadrapo de Tela tamaño Grande	1 rollo	✓		
24	Aplicadores (Copitos)	50	✓		
25	Bajalenguas	20	✓		
26	Compresas	4	✓		
Hidratación					
27	Suero oral de rehidratación (Hidraplus)	6 sachets	✓		
Varios					
28	Bolsas de plástico (Roja)	2	✓		
29	Camilla	1	✓		

INSPECCIONO: Insp SST		**FECHA DE INSPECCION:** 20-03-2024 24-03-2024.	
NOMBRE: Sandra Santiago	CARGO: Insp SST	FIRMA	
COPASST			
INSPECCIONO: Ayudante.		**FECHA DE INSPECCION:**	
NOMBRE: Elvis Carpio.	CARGO: ayudante.	FIRMA	Elvis Carpio

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construcción y dotación comedor y cocina del Cdegio ITSI bua-bja.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldía.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wessy Ingenieros SAS.	NIT	901109885-1

HERRAMIENTAS N° OPERADOR Elkin Reyes.

MES 04 al 09 Marzo 2024. TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓		✓	
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓		✓	
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓		✓	
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓	
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Elkin Rey		Elkin Rey		Elkin Rey		Elkin Rey	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST	Elvis		Elvis		Elvis		Elvis.	
	FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construcción y dotacion comedor y cocina del Codego ITSI de boca-ta.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldía	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy Ingenieros	NIT	901098835-1

HERRAMIENTAS N° OPERADOR Elvis Cabrera.

MES 11 al 16 Marzo 2024. TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓		✓	
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓		✓	
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓		✓	
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓	
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Elvis C -		Elvis Cap		Elvis Cap		Elvis Cap.	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST	Antonio C		Antonio		Antonio		Antonio C	
	FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construcción y dotación cocina y comedor del Colegio ITSI bca-b/g.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wussy Ingenieros SAS.	NIT	901098885-1.

HERRAMIENTAS N° OPERADOR Antonio Corrallido.

MES 26 al. 02- Marzo. 2024. TAMAÑO: G P

	ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL		Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓		✓	
		Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓		✓	
		Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓		✓	
		Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
		Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓		✓	
		Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓		✓	
		Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓		✓	
		Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓		✓	
		Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓		✓	
		Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓		✓	
		Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓	
		Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓		✓	
FIRMA		FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Antonio C		Antonio C		Antonio C.		Antonio C	
		FIRMA INSPECTOR HSEQ								
		COPASST	Elvis		Elvis		Elvis		Elvis. C.	
		FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotacion de comedor y cocina. del Colegio ITSI de Sca-Sja.		
N° CONTRATO	0786-22		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Crussy Ingenieros SAS	NIT	901109885-1.

PULIDORA No. OPERADOR Elkin Reyes.

MES 9 al 16 Marzo TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓					
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓					
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓					
	Estado del mango	✓		✓					
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓					
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓					
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓					
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓					
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓					
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓					
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓					
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓					
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓					
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓					
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓					
	Escobillas funcionando	✓		✓					
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓					
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓					
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Elkin R.		Elkin R.					
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST	Santiago C.		Santiago C.					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

ANEXO 10. ACCIDENTALIDAD

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	**ACCIDENTALIDAD**	**CÓDIGO: HSE-FOR-65** **VERSIÓN: 1** **FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019**

FECHA 06 de Marzo al 05 de Abril del 2024

UBICACIÓN: COLEGIO INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA

OBSERVACIÓN: En el mes del 06 de Marzo al 05 de Abril del 2024 no se presentaron accidentes laborales.


	EMPRESA	IDENTIFICACION	Accidentes personales según gravedad				Nº de accidentes personales	Lista de accidentes con daños personales a colaboradores directos	Nº de accidentes con daño material	Lista de accidentes con daño material	Nº de accidentes con daño ambiental	Lista de accidentes con daño ambiental	Accidentes a terceros según gravedad				Nº de accidentes a terceros	Lista de accidentes con daños personales a terceros	Días perdidos totales en el mes	Horas hombre trabajadas	Monto gastado o perdido por accidentes	Indices norma colombiana			Indices norma colombiana	
			Leve	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)							Leve	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)						Indice de Frecuencia	Indice de Severidad	Indice de Accidentabilidad	Indice de Accidentabilidad	Indice de Severidad
1	WRUSSY INGENIEROS SAS	901,109,665-1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ninguno	0	0	$/ 0,00	0	0	0	0,0	0,0
2			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ninguno	0	0	$/ 0,00	0	0	0	0,0	0,0
3			0	0	0	0	0									0	0					0	0	0	0,0	0,0

Consolidado Mensual	EMPRESA	Nº de colaboradores	Tipo de accidentes				Total de accidentes personales
			Leve (L)	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)	
EMPRESA	WRUSSY INGENIEROS SAS	10	0	0	0	0	0
Total		10	0	0	0	0	0


Total de accidentes con daño material
0
0


Nº de accidentes con daño ambiental	Total de accidentes con daño ambiental	Tipo de accidentes				Total de accidentes a terceros
		Leve (L)	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Total de días perdidos	Total de horas hombre trabajadas	Monto gastado o perdido por accidentes	Norma colombiana			Norma colombiana	
			Indice de Frecuencia	Indice de Severidad	Indice de Accidentabilidad	Indice de Accidentabilidad	Indice de Severidad
0	0	$/ 0,00	0,0	0	0	0,0	0,0
0	0	0	0	0	0	0,0	0,0

























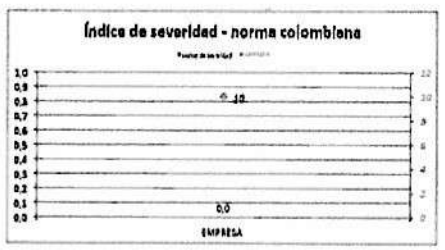

Fecha Elaboro:	Revisó y Aprobo:	VoBo:
Karen Lisseth Salamanca Rojas	Karen Lisseth Salamanca Rojas	Wilver Franciny Russy Ladino
1,067,686,764	1,067,686,764	90,212,380
Directora HSEQ	Directora HSEQ	Gerente General

ANEXO 11. COE

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	**ACTA DE REUNIÓN**	**CÓDIGO DE-FOR-01** **VERSIÓN 2** **FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019**

FECHA REUNION: 21/03/2024 **HORA: 9:00 AM** **LUGAR: I.T.S.I BARRANCABERMEJA** **ACTA NO. 13**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Sandra Milena Santiago Camacho
TIPO DE REUNIÓN	REUNIÓN N° 13- GESTION HSE
CONTRATO N°	**No. 0756-23**
OBJETO DE LA REUNION	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
ORGANIZADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
APUNTADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
ASISTENTES	Sandra Milena Santiago Camacho

TEMAS DE DISCUSIÓN

1. Protocolos de seguridad
2. Tipos de protocolos de seguridad.

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. Un protocolo de seguridad es un documento donde se consigna estrategias con los pasos que se deben seguir para ejecutar medidas de protección y acciones seguras dentro de un área, ciudad, etc. En otras palabras, estas medidas te enseñan una serie de puntos que se deben ejercer para estar preparado y actuar en caso de que se presente alguna situación que pongan en riesgo a ti, a tu familia, amigos, compañeros de trabajo y otros.

2. Existen diferentes tipos de Protocolos de Seguridad, dependiendo de las afectaciones provocadas por fenómenos naturales o por el hombre.

   - Sismo o Terremoto
   - Lluvias e inundaciones
   - Caída de ceniza del volcán
   - Incendio
   - Vientos o ráfagas fuertes
   - Protocolo de seguridad con discapacidad

CONCLUSIONES

- Los protocolos se convierten no solo en acciones reactivas, se convierten en un elemento primordial para la calidad de los procedimientos.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

COMPROMISOS

- Se solicita verificar si dentro del cronograma de capacitaciones se incluyen temas de protocolos de seguridad.

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio
ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C

ANEXO 13. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Actividades de Pañete
Fecha	06 de Marzo de 2024



Descripcion	Señalizacion de Areas
Fecha	06 de Marzo de 2024



Descripcion	Actividades de Sellamiento
Fecha	06 de Marzo de 2024



Descripcion	Actividades de Mezcla
Fecha	06 de Marzo de 2024



Descripcion	Actividades de Pañete
Fecha	06 de Marzo de 2024



Descripcion	Actividades de Pañete
Fecha	06 de Marzo de 2024



Descripcion	Actividades de Mezcla
Fecha	06 de Marzo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Actividades de Pulida de Pisos
Fecha	07 de Marzo de 2024



Descripcion	Toma de Medidas
Fecha	07 de Marzo de 2024



Descripcion	Actividades de Pulida de Pisos
Fecha	07 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	07 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	07 de Marzo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Actividades de Pañete
Fecha	09 de Marzo de 2024



Descripcion	Toma de Medidas
Fecha	09 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	09 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	09 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	09 de Marzo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Orden y Aseo en Obra
Fecha	13 de Marzo de 2024



Descripcion	Actividades de Amarre de Acero Figurado
Fecha	13 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	13 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	13 de Marzo de 2024



Descripcion	Orden y Aseo en Obra
Fecha	13 de Marzo de 2024



Descripcion	Actividades de Amarre de Acero Figurado
Fecha	13 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	13 de Marzo de 2024



Descripcion	Actividades de Instalacion de Tuberia
Fecha	13 de Marzo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Actividades de Pañete
Fecha	15 de Marzo de 2024



Descripcion	Actividades de Pañete
Fecha	15 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	15 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	15 de Marzo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	16 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	16 de Marzo de 2024



Descripcion	Actividades de Pañete
Fecha	16 de Marzo de 2024



Descripcion	Actividades de Pañete
Fecha	16 de Marzo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Actividades de Instalacion de Cubierta
Fecha	18 de Marzo de 2024



Descripcion	Actividades de Instalacion de Cubierta
Fecha	18 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	18 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	18 de Marzo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Ingreso de Materiales a la obra
Fecha	19 de Marzo de 2024



Descripcion	Ingreso de Materiales a la obra
Fecha	19 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	19 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	19 de Marzo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Actividad Instalacion de Tablero Electrico
Fecha	20 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	20 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	20 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	20 de Marzo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Ingreso de Materiales
Fecha	21 de Marzo de 2024



Descripcion	Bodega de Materiales
Fecha	21 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	21 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	21 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	21 de Marzo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Actividades de Instalacion de enchape
Fecha	22 de Marzo de 2024



Descripcion	Actividades de Excavacion
Fecha	22 de Marzo de 2024



Descripcion	Actividades de Excavacion
Fecha	22 de Marzo de 2024



Descripcion	Actividades de Instalacion de enchape
Fecha	22 de Marzo de 2024



Descripcion	Actividades de Instalacion de enchape
Fecha	22 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	22 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	22 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	22 de Marzo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	23 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	23 de Marzo de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	23 de Marzo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Bodega de Materiales
Fecha	02 de Abril de 2024



Descripcion	Bodega de Materiales
Fecha	02 de Abril de 2024



Descripcion	Inspeccion de Botiquin
Fecha	02 de Abril de 2024



Descripcion	Actividades de Pulida de Pisos
Fecha	02 de Abril de 2024



Descripcion	Ingreso de Materiales
Fecha	02 de Abril de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	02 de Abril de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	02 de Abril de 2024



Descripcion	Acopio de Materiales
Fecha	02 de Abril de 2024



Descripcion	Acopio de Materiales
Fecha	02 de Abril de 2024



Descripcion	Actividades de Inventario de materiales
Fecha	02 de Abril de 2024



Descripcion	Actividades de Inventario de materiales
Fecha	02 de Abril de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	04 de Abril de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	04 de Abril de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	04 de Abril de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Actividades de Instalacion de Perfileria
Fecha	05 de Abril de 2024



Descripcion	Actividades de Instalacion de Perfileria
Fecha	05 de Abril de 2024



Descripcion	Actividades de Instalacion de Perfileria
Fecha	05 de Abril de 2024



Descripcion	Actividades de Instalacion de Enchape
Fecha	05 de Abril de 2024



Descripcion	Recorrido de Obra
Fecha	05 de Abril de 2024



Descripcion	Actividades de Instalacion de Enchape
Fecha	05 de Abril de 2024



Descripcion	Actividades de Inspeccion Pozo
Fecha	05 de Abril de 2024



Descripcion	Actividades de Inspeccion Pozo
Fecha	05 de Abril de 2024



Descripcion	Recorrido de Obra
Fecha	05 de Abril de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	05 de Abril de 2024



Descripcion	Charla Seguridad-Pausas Activas
Fecha	05 de Abril de 2024

ANEXO 14. ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

NOMBRE COMPLETO	Javier Mauricio Jimenez
CARGO	OFICIAL OBRA BLANCA
FECHA	20 03 2024
LUGARA DE RESIDENCIA	Barrio Laberinto
INGRESOS	
ESTRATO	1
JORNADA LABORAL	

Señor trabajador responda marcando con una (x), se le recuerda que solo debe marcar una vez, no tachones, no enmendaduras.

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 – 27 años
c. 28 – 37 años —
d. 38 _ 47 años
e. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
b. Casado (a) /Unión libre —
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
a. Hombre —
b. Mujer

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
b. 1 – 3 personas
c. 4 – 6 personas —
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria —
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista/ Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada —
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE

a. Labores domésticas
b. Recreación y deporte
c. Estudio
e. Ninguno
f. Otro _____

8. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA

a. De 3 a 5 años
b. De 3 a 6 meses
c. De 6 meses a 1 año
d. De 1 a 3 años

9. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL

a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. TIENE VEHÍCULO PROPIO

a. Si
b. No cuál es su medio de transporte

_____

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. Contrato a Término indefinido
b. Contrato a Término Fijo
c. Contrato por obra / labor

12. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA

a. Vacunación
b. Salud Oral
c. Exámenes de laboratorio y otros
d. Exámenes médicos anuales
e. Ninguna

13. CUÁNTO TIEMPO ESTIMADO DE SU CASA AL TRABAJO.

a. Media hora
b. Una hora
c. Hora y media
d. Dos horas
e. Otro _____

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

En los s últimos seis (6) meses

SINTOMA	SI	NO	EXPLIQUE
Dolor de cabeza		X	
Dolor de cuello, espalda y cintura		X	
Dolores musculares		X	
Dificultad para algún movimiento		X	
Tos frecuente		X	
Dificultad respiratoria		X	
Gastritis, ulcera		X	
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo		X	
Alteraciones del suefio (insomnio, somnolencia)		X	
Dificultad para concentrarse		X	
Mal genio		X	
Nerviosismo		X	
Cansancio mental		X	
Palpitaciones		X	
Dolor en el pecho (angina)		X	
Cambios visuales		X	
Cansancio, fatiga, ardor o disconfort visual		X	
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos		X	
Dificultad para oír		X	
Sensación permanente de cansancio		X	
Alteraciones en la piel		X	
Otras alteraciones no anotadas		X	

18. En el desarrollo de su labor encuentra las siguientes condiciones: Nivel Administrativo

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL/ OBSERVACIONES
Conoce bien los riesgos a los que está sometido en su puesto de trabajo y las consecuencias que pueden acarrear para su salud?	X		
Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?	X		
Considera que la iluminación de su puesto de trabajo es adecuada?	X		
La temperatura de su sitio de trabajo le ocasiona molestias?		X	
El ruido ambiental le permite mantener una conversación con los compañeros sin elevar el tono de voz?	X		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?		X	
En el sitio de trabajo manipula o está en contacto con productos químicos?		X	
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?		X	
Está en contacto con pacientes contaminados, fluidos o secreciones?		X	
Existe en su sitio de trabajo riesgos de incendio o explosión?		X	
Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras, presentan riesgo para su salud?		X	
Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas eléctricos sobrecargados, trasformadores defectuosos?		X	
Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes, poseen despacio adecuado y los insumos y productos se encuentran bien apilados?	X		
Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos repetitivos?	X		
Su labor genera riesgos de seguridad personal (sociales, naturales y/o riesgos públicos por desplazamiento?		X	

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Permanece en una misma posición (sentado o de pie) durante más del 60% de la jornada de trabajo?	X		
La altura de la superficie de trabajo es la adecuada a su estatura, la silla y la labor que realiza?	X		
Tiene espacio suficiente para variar la posición de las piernas y rodillas?	X		
La silla es cómoda y permite ajustarlo a su medida?			
En general dispone de espacio suficiente para realizar el trabajo con holgura?	X		
Su trabajo le exige mantenerse frente a la pantalla del computador más del 50% de la jornada?			
Cree que la ubicación de su pantalla evita la presencia de reflejos?			
El computador está dotado de filtro que favorezca el manejo de los contrastes, disminuyendo la fatiga visual?			
Cuenta con atril para ubicar los documentos que manipula mientras trabaja en el computador?			
Al finalizar la jornada laboral, el cansancio que se siente podría calificarse de "normal"?	X		
Considera adecuada la distribución del horario de trabajo, de los turnos, de las horas de descanso, horas extras y pausas?	X		
Considera que el tiempo asignado a la tarea que realiza es adecuado?	X		
Puede abandonar el trabajo por unos minutos sin necesidad que lo sustituyan?	X		
Puede variar el ritmo de trabajo sin perturbar la producción a lo largo de la jornada	X		
Las tareas que realiza le producen "sensación de peligrosidad"?		X	
El trabajo que desempeña le permite aplicar sus habilidades y conocimientos?	X		
Considera que su trabajo es variado?	X		

Su jefe le pide opinión sobre asuntos relacionados con su trabajo?	X		
En su puesto de trabajo necesita utilizar elementos de protección personal?	X		
Existen baños suficientes en número y se les realiza un adecuado mantenimiento, dotación y aseo?	X		
Cuenta con cocina, cafetería, comedor o sitio de descanso adecuadamente mantenidos, dotados y aseados?			
La empresa cuenta con agua potable?	X		
Existe buen manejo de basuras y desechos?	X		

19. Escriba a continuación los temas prioritarios de capacitación que podrían contribuir en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y salud:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

NOMBRE COMPLETO	Luis Carlos Mosquera Pueda
CARGO	Oficial
FECHA	20-03-2024
LUGARA DE RESIDENCIA	Cra 41 6 # 50 A31 Barrio Barranca.
INGRESOS	
ESTRATO	1
JORNADA LABORAL	Completa.

Señor trabajador responda marcando con una (x), se le recuerda que solo debe marcar una vez, no tachones, no enmendaduras.

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 – 27 años
x. 28 – 37 años
d. 38 _ 47 años
e. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL
x. Soltero (a)
b. Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
a. Hombre
b. Mujer

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
x. 1 – 3 personas
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
x. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista/ Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30 VERSIÓN 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Labores domésticas
x. Recreación y deporte
c. Estudio
e. Ninguno
f. Otro _____

8. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
a. De 3 a 5 años
b. De 3 a 6 meses
c. De 6 meses a 1 año
d. De 1 a 3 años

9. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
x. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. TIENE VEHÍCULO PROPIO
x. Si
b. No cuál es su medio de transporte
_____

11. TIPO DE CONTRATACIÓN
a. Contrato a Término indefinido
b. Contrato a Término Fijo
c. Contrato por obra / labor

12. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
a. Vacunación
b. Salud Oral
c. Exámenes de laboratorio y otros
d. Exámenes médicos anuales
x. Ninguna

13. CUÁNTO TIEMPO ESTIMADO DE SU CASA AL TRABAJO.
x. Media hora
b. Una hora
c. Hora y media
d. Dos horas
e. Otro _____

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

En los s últimos seis (6) meses

SINTOMA	SI	NO	EXPLIQUE
Dolor de cabeza		X	
Dolor de cuello, espalda y cintura		X	
Dolores musculares		X	
Dificultad para algún movimiento		X	
Tos frecuente		X	
Dificultad respiratoria		X	
Gastritis, ulcera		X	
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo		X	
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)		X	
Dificultad para concentrarse		X	
Mal genio		X	
Nerviosismo		X	
Cansancio mental		X	
Palpitaciones		X	
Dolor en el pecho (angina)		X	
Cambios visuales		X	
Cansancio, fatiga, ardor o disconfort visual		X	
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos		X	
Dificultad para oír		X	
Sensación permanente de cansancio		X	
Alteraciones en la piel		X	
Otras alteraciones no anotadas		X	

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30 VERSIÓN 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

18. En el desarrollo de su labor encuentra las siguientes condiciones: Nivel Administrativo

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL/ OBSERVACIONES
Conoce bien los riesgos a los que está sometido en su puesto de trabajo y las consecuencias que pueden acarrear para su salud?	X		
Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?	X		
Considera que la iluminación de su puesto de trabajo es adecuada?	X		
La temperatura de su sitio de trabajo le ocasiona molestias?		X	
El ruido ambiental le permite mantener una conversación con los compañeros sin elevar el tono de voz?	X		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
En el sitio de trabajo manipula o está en contacto con productos químicos?	X		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
Está en contacto con pacientes contaminados, fluidos o secreciones?	X		
Existe en su sitio de trabajo riesgos de incendio o explosión?		X	
Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras, presentan riesgo para su salud?		X	
Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas eléctricos sobrecargados, trasformadores defectuosos?		X	
Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes, poseen despacio adecuado y los insumos y productos se encuentran bien apilados?	X		
Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos repetitivos?	X		
Su labor genera riesgos de seguridad personal (sociales, naturales y/o riesgos públicos por desplazamiento?		X	

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Permanece en una misma posición (sentado o de pie) durante más del 60% de la jornada de trabajo?	X		
La altura de la superficie de trabajo es la adecuada a su estatura, la silla y la labor que realiza?	X		
Tiene espacio suficiente para variar la posición de las piernas y rodillas?	X		
La silla es cómoda y permite ajustarlo a su medida?			No aplica
En general dispone de espacio suficiente para realizar el trabajo con holgura?	X		
Su trabajo le exige mantenerse frente a la pantalla del computador más del 50% de la jornada?			No aplica
Cree que la ubicación de su pantalla evita la presencia de reflejos?			No aplica
El computador está dotado de filtro que favorezca el manejo de los contrastes, disminuyendo la fatiga visual?			No aplica
Cuenta con atril para ubicar los documentos que manipula mientras trabaja en el computador?			No aplica
Al finalizar la jornada laboral, el cansancio que se siente podría calificarse de "normal"?	X		
Considera adecuada la distribución del horario de trabajo, de los turnos, de las horas de descanso, horas extras y pausas?	X		
Considera que el tiempo asignado a la tarea que realiza es adecuado?	X		
Puede abandonar el trabajo por unos minutos sin necesidad que lo sustituyan?	X		
Puede variar el ritmo de trabajo sin perturbar la producción a lo largo de la jornada	X		
Las tareas que realiza le producen "sensación de peligrosidad"?	X		
El trabajo que desempeña le permite aplicar sus habilidades y conocimientos?	X		
Considera que su trabajo es variado?	X		

Su jefe le pide opinión sobre asuntos relacionados con su trabajo?	X		
En su puesto de trabajo necesita utilizar elementos de protección personal?	X		
Existen baños suficientes en número y se les realiza un adecuado mantenimiento, dotación y aseo?	X		
Cuenta con cocina, cafetería, comedor o sitio de descanso adecuadamente mantenidos, dotados y aseados?		X	
La empresa cuenta con agua potable?	X		
Existe buen manejo de basuras y desechos?	X		

19. Escriba a continuación los temas prioritarios de capacitación que podrían contribuir en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y salud:

ANEXO 15. PAZ Y SALVO

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

23 de Marzo de 2024

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO** identificado con **NIT 80.212.380-5,** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con el Sr **ANTONIO JOSE CARVALLIDO CARPIO** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.096.242.479 de Barrancabermeja** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, entrega de dotación y elementos de protección personal EPP, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador en el proyecto de Construcción y dotación del comedor y cocina del instituto técnico superior industrial en el distrito de Barrancabermeja, con el contrato de obra No. 0756-23.

Se expide a los 23 días del mes de marzo del 2024.

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.

ANTONIO JOSE CARVALLIDO CARPIO
CC. 1.096.242.479 de Barrancabermeja

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

27 de Marzo de 2024

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO** identificado con **NIT 80.212.380-5,** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con el Sr **ELVIS CARPIO PEÑALOZA** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.096.212.001 de Barrancabermeja** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, entrega de dotación y elementos de protección personal EPP, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador en el proyecto de Construcción y dotación del comedor y cocina del instituto técnico superior industrial en el distrito de Barrancabermeja, con el contrato de obra No. 0756-23.

Se expide a los 27 días del mes de marzo del 2024.

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.

ELVIS CARPIO PEÑALOZA
CC. 1.096.212.001 de Barrancabermeja

ANEXO 16. EXAMENES DE EGRESO

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80.212.380-5

Bogotá D.C., 23 de Marzo de 2024

Señor:
ANTONIO JOSE CARVALLIDO CARPIO
CC. 1.096.242.479 de Barrancabermeja

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a)

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la **MILENH IPS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** calle 49 # 21-58 barrio Colombia de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**.

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO.** Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometria.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.

ANTONIO JOSE CARVALLIDO CARPIO
CC. 1.096.242.479 de Barrancabermeja

C.C. – ARCHIVO

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

Bogotá D.C., 27 de Marzo de 2024

Señor:
ELVIS CARPIO PEÑALOZA
CC. 1.096.212.001 de Barrancabermeja

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a)

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la **MILENH IPS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** calle 49 # 21-58 barrio Colombia de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**.

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometria.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.

ELVIS CARPIO PEÑALOZA
CC. 1.096.212.001 de Barrancabermeja

C.C. – ARCHIVO

5.10. INFORME SOCIO AMBIENTAL DE OBRA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**


INFORME SST 13

PERIODO: 06 MARZO 2024 - 05 ABRIL 2024

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

Elaboró:



KAREN SALAMANCA ROJAS
WRUSSY INGENIEROS SAS

Revisó y Aprobó:



WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
WRUSSY INGENIEROS SAS

CONTENIDO

INTRODUCCION 4

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 5

2.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 5

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS APLICABLES 5

4. COMPONENTE AMBIENTAL 6

4.1. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 6

4.2. TRATAMIENTO Y MANEJO DE COBERTURA VEGETAL 8

4.3. DESCAPOTE Y REMOCIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA 8

4.4. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 8

4.5. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS 8

4.6. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 10

4.7. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CONVENCIONALES 10

4.8. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 10

4.9. REGISTRO DE MATERIALES 10

5. COMPONENTE SOCIAL 10

5.1. ACTAS DE REUNIÓN 10

5.2. INFORME SOCIAL 10

6. CONCLUSIONES 11

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación del proyecto. 5

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1.Registro fotográfico 6

Tabla 2. Acumulado de volúmenes de RCD Mes 9

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**


INTRODUCCION

El diseño de las estrategias y medidas de prevención, mitigación y control de los impactos ambientales identificados en los proyectos de tipo constructivo están enmarcadas en la legislación ambiental colombiana de orden local, regional y nacional; donde se orienta la prospectiva ambiental nacional para la conservación del ambiente y los recursos naturales. De igual manera la protección del trabajador, la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son reglamentadas a través de los requisitos dispuestos en la normatividad del país.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se ejecuta en la ciudad de Barrancabermeja en la dirección Cra. 28 # 55-10, como se evidencia en la ilustración N 1.

Ilustración 1. Ubicación del proyecto.

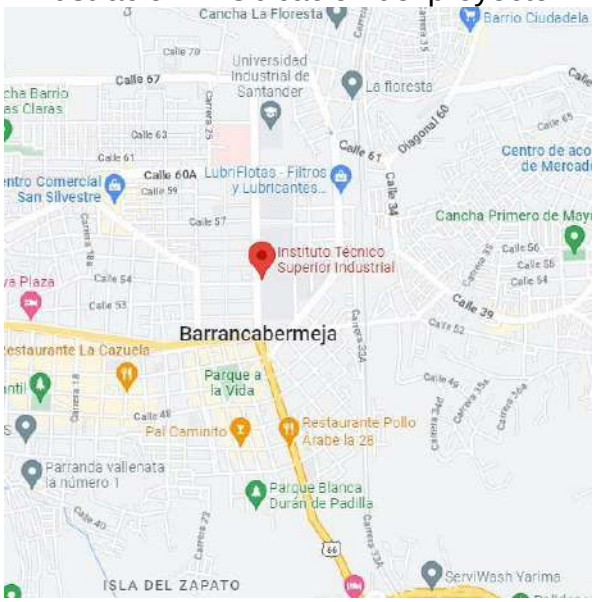

Fuente: https://www.google.com/maps

2.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CORREO ELECTRÓNICO: proyectos@wrussyingenieros.com
OFICINA: DIRECCIÓN: Calle 8f # 79- 94 Bogotá D.C.
Contrato de Obra No. 0756-23
Objeto: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS APLICABLES

Durante el periodo del 06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024 se ejecutaron actividades que requerían permisos y/o licencias ambientales.

4. COMPONENTE AMBIENTAL

A continuación, se describen las actividades de implementación del PMA en el periodo del 06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024; para la interpretación de los programas que demuestran la ejecución de las medidas de manejo y sus anexos.

4.1. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

Se realizó señalización preventiva e informativa, además se realiza cerramiento de las áreas de intervención.

Tabla 1.Registro fotográfico

Limpieza de baños	Señalización escombros
	
Punto ecológico	Señalización escombros
	
Limpieza de baños	Señalización materiales

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

	
Señalización	Señalización escombros
	
Limpieza de baños	Punto ecológico
	
Señalización escombros	



4.2. TRATAMIENTO Y MANEJO DE COBERTURA VEGETAL

Durante el periodo del 06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024, no se realizaron actividades con referencia a este programa.

4.3. DESCAPOTE Y REMOCIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA

Durante el periodo del 06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024, no se realizaron actividades con referencia a este programa.

4.4. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Durante periodo del 06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024, no se realizaron actividades con referencia a este programa.


4.5. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

Durante periodo del 06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024, no se realizaron retiros de escombro.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
$$\%\text{RCD} = \frac{Vol.\ \text{De material dispuesto en sitio autorizado}}{Vol.\ \text{De material generado para disposición final}} * 100$$
$$RCD = \frac{0\ \text{m}^3}{0\ \text{m}^3} * 100 = 100\%$$

Tabla 2. Acumulado de volúmenes de RCD Mes

Mes	Material de excavación (m^3)	Demolición (m^3)	Cantidad Total (m^3)
MARZO-ABRIL	0	68	68
ABRIL-MAYO	0	224	224
MAYO-JUNIO	0	248	248
JUNIO-JULIO	0	64	64
JULIO-AGOSTO	0	56	56
AGOSTO-SEPTIEMBRE	0	16	16
SEPTIEMBRE-OCTUBRE	0	416	416
OCTUBRE-NOVIEMBRE	0	0	0
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	0	105	105
DICIEMBRE-ENERO	0	0	0
ENERO-FEBRERO	0	0	0
FEBRERO-MARZO	0	0	0
MARZO-ABRIL	0	0	0
TOTAL	**0**	**1197**	**1197**

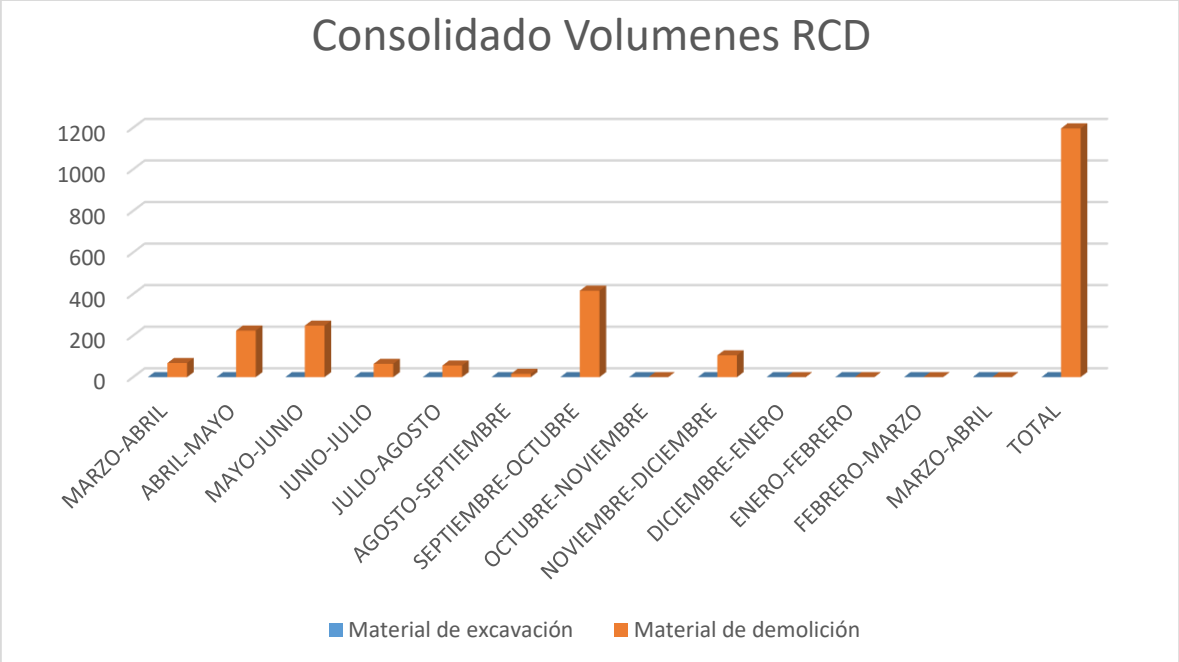

4.6. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Durante el periodo comprendido del 06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024 no se presentaron quejas por ruido de las actividades que se ejecutaron.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
$Quejas\ de\ ruido = No.\ quejas\ por\ ruido\ en\ el\ mes$
$Quejas\ de\ ruido = 0$

4.7. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CONVENCIONALES

Para el periodo del 06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024, se generaron residuos sólidos, los cuales fueron dispuestos en los puntos ecológicos presentes en el frente de obra, y posterior a ello la recolección la realizó la empresa de servicios públicos de aseo de Barrancabermeja, VEOLIA S.A ESP.

4.8. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Durante el periodo del 06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024 no se realizaron actividades con referencia a este programa. Se adjunta el certificado del manejo de los residuos líquidos de los baños **ANEXO 1.**

4.9. REGISTRO DE MATERIALES

Durante el periodo del 06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024, se realizaron actividades con referencia a este programa. **ANEXO 2.**

5. COMPONENTE SOCIAL

A continuación, se describen las actividades de la gestión social que se realizó en el periodo del 06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024.

5.1. ACTAS DE REUNIÓN

Durante el periodo comprendido del 06 de marzo 2024 al 05 abril de 2024, no se realizaron actividades con referencia a este programa

5.2. INFORME SOCIAL

Se realiza informe mensual social, el cual se encuentra en el **ANEXO 3.**

6. CONCLUSIONES

- Se cumplió con los compromisos contractuales del contrato en el periodo del 06 de febrero 2024 al 05 marzo de 2024.

- Se realizaron actividades de supervisión de los trabajos desarrollados con apoyo del residente e inspector HSE, de esta manera se garantizó el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente en el contrato y en la normatividad legal vigente colombiana.

- Todas las áreas intervenida se dejaron con su respectivo orden y aseo.

ANEXO 1. CERTIFICADO MANEJO DE VERTIMIENTOS

Aseos y Servicios de Colombia S.A.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2024/03/07) - Fecha Servidor: (2024/03/07)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehículo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		Auxiliar 1	
Jhonatan Ricardo Fontecha Villarreal		Melvin Mantilla Roa	
1096212725		1096196276	

Resumen

Hora: 09:16:21

Encuesta

Foto



UBICACIÓN



7.06410494 -73.8505448

Servicio realizado

Ok

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2024/03/11) - Fecha Servidor: (2024/03/11)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 085.255 **Nombre Activo:** USP ARMAL AZUL
Extras: USP : USP - **Marca :** ARMAL - **Color :** AZUL - **Tipo :** 2021

Vehículo

CAMION NPR TAR684	TAR684

Operadores

Conductor		Auxiliar 1	
Jhon Jairo Arango Matta		Jhon Jairo Moya Suarez	
91445133		91446417	

Resumen

Hora: 13:59:43

Encuesta

Foto



UBICACIÓN



7.06411903, -73.8505085

Servicio realizado

Ok

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2024/03/14) - Fecha Servidor: (2024/03/14)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS

Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehículo

CAMION NPR TAR684	TAR684

Operadores

Conductor		Auxiliar 1	
Jhon Jairo Arango Matta		Anyelo Vitola Cuello	
91445133		109625508 1	

Resumen

Hora: 14:22:10

Encuesta

Foto



UBICACIÓN

Ver Ubicación

7.06409999 -73.85051956

Servicio realizado

Ok

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2024/03/18) - Fecha Servidor: (2024/03/18)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehículo

CAMION NPR TAR684	TAR684

Operadores

Conductor		Auxiliar 1	
Jhon Jairo Moya Suarez		Jhon Jairo Arango Matta	
91446417		91445133	

Resumen

Hora: 12:48:21

Encuesta

Foto



UBICACIÓN



7.06413813 -73.85055593

Servicio realizado

Ok

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.

assear
www.assear.com

CERTIFICACION DE VISITA
(2024/03/21) - Fecha Servidor: (2024/03/21)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehículo

CAMION NPR TAR685	TAR685

Operadores

Conductor		Auxiliar 1	
Denilson Carcamo Garcia		Yolby Alexander Tellez Rincón	
1104126326		1096210869	

Resumen

Hora: 14:56:08

Encuesta

CERTIFICACION

FOTO CERTIFICACION VISITA



NOMBRE QUIEN RECIBE
Sandra Santiago

CARGO QUIEN RECIBE
HSE



UBICACIÓN



Ver Ubicación

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2024/03/27) - Fecha Servidor: (2024/03/27)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehículo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		Auxiliar 1	
Jhonatan Ricardo Fontecha Villarreal		Yolby Alexander Tellez Rincón	
1096212725		1096210869	

Resumen

Hora: 07:37:56

Encuesta

Foto



UBICACIÓN

Ver Ubicación

7.06408892 -73.85055577

Servicio realizado

Ok

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2024/04/01) - Fecha Servidor: (2024/04/01)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehículo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		Auxiliar 1	
Jhonatan Ricardo Fontecha Villarreal		Melvin Mantilla Roa	
1096212725		1096196276	

Resumen

Hora: 11:02:56

Encuesta

Foto



UBICACIÓN



7.06410175, -73.85054737

Servicio realizado

Ok

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2024/04/03) - Fecha Servidor: (2024/04/03)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 085.255 **Nombre Activo:** USP ARMAL AZUL
Extras: USP : USP - **Marca :** ARMAL - **Color :** AZUL - **Tipo :** 2021

Vehículo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		Auxiliar 1	
Jhonatan Ricardo Fontecha Villarreal		Melvin Mantilla Roa	
1096212725		1096196276	

Resumen

Hora: 09:08:46

Encuesta

Foto



UBICACIÓN



7.06411811, -73.85054952

Servicio realizado

Ok

Purific
PURIFICACION DE RESIDUOS ESPECIALES

GC.511 GA.487 GS.1228

CERTIFICADO No

2288

DEL 9/01/2024

PURIFIC S.A.S
NIT. 900.380.440-1

A Través del Permiso de vertimiento para el tratamiento de aguas Residuales, otorgado por la CAS, según Resolución DGL No 000799 del 17 de octubre de 2018.

CERTIFICA QUE PRESTÓ EL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y VERTIMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA A:

ASEOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA ASSEAR SAS
NIT: 900.346.265-5

SEGÚN RELACIÓN

MES: MARZO DE 2024

ITEM	UBICACIÓN	VERTIMIENTO (LITROS)
1	BARRANCABERMEJA, PUERTO WILCHES, SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SABANA DE TORRES, PUERTO PARRA, RIONEGRO, BUCARAMANGA, GIRON, PIEDECUESTA (SANTADER), YONDÓ (ANTIOQUIA)	171.500

Daiver Baldovino Nuñez.
Gerente

CCS Consejo Colombiano de Seguridad | RUC® Registro Uniforme para Contratistas

Oficina Barrancabermeja:
Lote 30 Vereda Campo Gala
Móvil: (+57) 320 2347971 - 312 4790920
Email: daiverb@purific.co ; gerentegeneral@purific.co ; administracion@purific.co
Barrancabermeja – Santander - Colombia. https://www.purific.co/

ASEOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA ASSEAR S.A.S
NIT. 900.346.265-5

CERTIFICA

Que prestamos el servicio de aseo y mantenimiento de baños portátiles a la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** identificada con el NIT **901109885-1**, según el siguiente detalle:

Periodo de Servicio	Detalle	Cantidad de USP's	Litros vertidos
ENERO 2024	**BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y ZONAS ALEDAÑAS**	**2**	**360**

Las aguas residuales fueron el resultado del mantenimiento a **2** unidad(es) sanitaria(s) portátil(es) (USP) ubicada(s) en **INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL** , a la(s) que se le realizaron **18** aseos durante el periodo informado, los residuos obtenidos fueron vertidos y tratados en la planta de tratamiento de la empresa **PURIFICACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES SAS PURIFIC**, quienes cuentan con autorización de la CAS según Resolución DGL No. 000588 de julio de 2023. Adjunto encontraran el certificado de tratamiento de residuos, la certificación emitida por **PURIFIC SAS**

Dada en Barrancabermeja a los 05 días del mes de abril de 2024.

DIANA CAROLINA CAMACHO GUZMÁN
Coordinador de Operaciones
ASSEAR S.A.S

La información consignada en el presente documento puede ser confirmada al teléfono 3138849291 – 3017870248 o al correo electrónico: operaciones@assear.com

OFICINA BARRANCABERMEJA
Km 1.8 Vía Retén - Aereopuerto Yariguies
Tel: 607 6 02 04 20 - 313 884 92 91

ANEXO 2. REGISTRO DE MATERIALES

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	PLANILLA DE CONTROL DE MATERIALES	CODIGO	HSE-FOR-119
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACION	8/01/2019

FECHA	PLACA DE LA VOLQUETA	MATERIAL	VOLUMEN TRANSPORTADO M3	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	FIRMA DEL RESPONSABLE DE OBRA	DOCUMENTACION DEL VEHICULO	FIRMA DEL RESPONSABLE DE OBRA
07/03/24	ARYSAN	Cemento	15 bultos	ARYSAN	ESARCON	—	ESARCON
07/03/24	ARYSAN	Varilla 1/4"	42 und	ARYSAN	ESARCON	—	ESARCON
07/03/24	ARYSAN	Varilla 3/8"	24 und	ARYSAN	ESARCON	—	ESARCON
07/03/24	ARYSAN	Tubos PVC	56ml	ARYSAN	ESARCON	—	ESARCON
09/03/24	ARYSAN	Cemento	30 bultos	ARYSAN	ESARCON	—	ESARCON
09/03/24	ARYSAN	Cemento blanco	1 bultos	ARYSAN	ESARCON	—	ESARCON
15/03/24	UAD483	Arena	$7m^3$	Luis Palomino	ESARCON	Si	ESARCON
15/03/24	ARYSAN	Cemento	20 bultos	ARYSAN	ESARCON	—	ESARCON
19/03/24	TTV738	lámina PVC	105 und.	Dinastia del yeso	ESARCON	Si	ESARCON
19/03/24	TTV738	Perimetral blanco	33 und.	Dinastia del yeso	ESARCON	Si	ESARCON
19/03/24	TTV738	Omega	82 und	Dinastia del yeso	ESARCON	Si	ESARCON
19/03/24	TTV738	Angulos	107 und	Dinastia del yeso	ESARCON	Si	ESARCON
19/03/24	TTV738	Tornillos	4000 und.	Dinastia del yeso	ESARCON	Si	ESARCON
19/03/24	TTV738	Masilla	5 canecas	Dinastia del yeso	ESARCON	Si	ESARCON
21/03/24	FSB542	Estuco	13 canecas	Fabian	ESARCON	Si	ESARCON
21/03/24	FSB542	Pintura koraza	3 canecas	Fabian	ESARCON	Si	ESARCON
21/03/24	FSB542	Sikafill	2 canecas	Fabian	ESARCON	Si	ESARCON
21/03/24	FSB542	Enchape 30x30.	23 cajas.	Fabian	ESARCON	Si	ESARCON
21/03/24	FSB542	Enchape 30x60	24 cajas.	Fabian	ESARCON	Si	ESARCON
21/03/24	FSB542	Manto asfaltico	26 rollos	Fabian	ESARCON	Si	ESARCON
21/03/24	FSB542	Emulsion asfaltica	7 canecas	Fabian.	ESARCON	Si	ESARCON

Firma Inspector HSEQ

ESARCON

Firma Residente de obra

ANEXO 3. INFORME SOCIAL

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INFORME SOCIAL

Objeto: Construcción y Dotación del comedor y cocina del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito de Barrancabermeja.	
Actividades ejecutadas en el periodo: 06 de marzo de 2023 a 05 de abril de 2023	No. Contrato: 0756-23

Actividades Ejecutadas

- **Actas de entorno y de vecindad:**

Actividad ejecutada durante el primer mes de ejecución de la obra.

- **Accesibilidad a viviendas y establecimientos**

La zona por intervenir en un diámetro de 30 metros no contempla alrededor con casas y/o establecimientos que puedan ser afectados por el proyecto.

- **Caracterización social**

Actividad ejecutada durante el primer y segundo mes de ejecución del proyecto.

- **Punto de atención a la comunidad.**

El punto de atención se encuentra ubicado en las adecuaciones del proyecto.

PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes)

Comunidad I.T.S.I
En el periodo entre el 6 de marzo al 5 de abril por parte de la comunidad del I.T.S.I no se presentan PQRS.

Personal en Obra.
Por parte de los empleados de la contratista no se presentan PQRS.

Reuniones.

Reunión de seguimiento.

- En el periodo comprendido no se realizan reuniones de seguimiento.

Capacitación Comunidad

Se realizo jornada de compensación forestal con la comunidad del I.T.S.I

Objetivo.
Brindar a la comunidad del I.T.S.I 10 árboles forestales.

Desarrollo:

Se realizo actividad de compensación forestal; esta actividad se llevó a cabo en compañía del docente encargado del área de las zonas verdes de la Institución Educativa I.T.S.I, donde se les proporciono 10 arboles de tipo forestal y abono que se plantaron en diferentes áreas del colegio.

Anexos Fotográficos.













ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Desinfeccion Unidades Sanitarias
Fecha	07 de Marzo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Instalacion de Señalizacion
Fecha	12 de Marzo de 2024



Descripcion	Acopio de Residuos
Fecha	12 de Marzo de 2024



Descripcion	Acopio de Residuos Solidos
Fecha	12 de Marzo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Desinfeccion Unidades Sanitarias
Fecha	14 de Marzo de 2024



Descripcion	Desinfeccion Unidades Sanitarias
Fecha	14 de Marzo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Acopio de Residuos Solidos
Fecha	20 de Marzo de 2024



Descripcion	Instalacion de Señalizacion
Fecha	20 de Marzo de 2024



Descripcion	Orden y Aseo en Obra
Fecha	20 de Marzo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Desinfeccion Unidades Sanitarias
Fecha	21 de Marzo de 2024



Descripcion	Desinfeccion Unidades Sanitarias
Fecha	21 de Marzo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Desinfeccion Unidades Sanitarias
Fecha	01 de Abril de 2024



Descripcion	Desinfeccion Unidades Sanitarias
Fecha	01 de Abril de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Acopio de Residuos
Fecha	02 de Abril de 2024



Descripcion	Acopio de materiales
Fecha	02 de Abril de 2024
