Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - PORTADA**	Código.: SIVEYC.FTO.35-1 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

CONVENIO No.3253-2023:

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS 25NR19 (CRUCE TRAMO 2501A) ROSA FLORIDA – BERRUECOS – SAN LORENZO – (CRUCE TAMINANGO) – LA HONDA, 25NR19-1 SAN LORENZO – LA LAGUNA Y 25NR05 PANOYA (CRUCE RUTA 2502) – TAMINANGO – SANTA CECILIA – LA UNIÓN. EN LOS TRAMOS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

INFORME DE SUPERVISION No.9:

PERIODO: 01/04/2024 AL 30/04/2024

San Juan de Pasto, mayo de 2024

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO.35-2 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESETACION:	3/05/2024	CON CORTE :	30/04/2024

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO CONTRACTUAL:	GN3253-2023		
CDP No.:	2023050069	FECHA:	4/05/2023
REGISTRO No:	2023061065	FECHA:	26/06/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS 25NR19 (CRUCE TRAMO 2501A) ROSA FLORIDA – BERRUECOS – SAN LORENZO – (CRUCE TAMINANGO) – LA HONDA, 25NR19-1 SAN LORENZO – LA LAGUNA Y 25NR05 PANOYA (CRUCE RUTA 2502) – TAMINANGO – SANTA CECILIA – LA UNIÓN. EN LOS TRAMOS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		
MODIFICACION No.:	1 DEL 8 de agosto de 2023	detalle: ajuste de clausulas, sin afectar alcance,valor o plazo de ejecucion.	
MODIFICACION No.:	2 DEL 28 de noviembre de 2023	prorroga hasta el 31 de julio de 2024	
CONTRATISTA DE OBRA:	CAMINAR INGENIERIA S.A.S		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	AMANDA ISABEL PANTOJA QUIROZ		
SUPERVISOR	Secretari@ de Infraestructura y Minas		
APOYO A LA SUPERVISION	Juan Fernando Nuñez Moncayo		
META FISICA	22 alcantarillas		
VALOR DEL CONVENIO:	657,016,814.72		
APORTTE DEPARTAMENTO	655,016,814.72		
APORTE MUNICIPIO	2,000,000.00		
FECHA DE INICIACION:	miércoles, 19 de julio de 2023		
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (6) MESES		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	jueves, 18 de enero de 2024		
SUSPENSION	N/A		
REINICIO	N/A		
MODIFICACION 2	martes, 28 de noviembre de 2023		
FECHA DE TERMINACION SEGUN MOD 2:	miércoles, 31 de julio de 2024		
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	miércoles, 31 de julio de 2024		
PORCENTEJE ANTICIPO	40%		
TOTAL ANTICIPO	$		262,006,725.89
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	262,006,725.89		
GARANTIAS:	CUMPLIMIENTO Y MANEJO DE ANTICIPO		
Póliza No.:	436-47-994000059011		
% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO	71.00%	% EJECUTADO: 73%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	82.60%	% EJECUTADO 40.00%
META FISICA A LA FECHA	ALCANTARILLAS	0	

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO.35-3 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS: el convenio se suscribe con el municipio de San Lorenzo (N), quien es de acuerdo al anexo contractual son el ente encargado de contratar tanto obra como interventoría.
el mismo tiene como meta la construcción de 22 alcantarillas en las vías jurisdicción del Departamento de Nariño que atraviesan el municipio de San Lorenzo y presentan deficiencias en su sistema de drenaje.
el convenio inicia su ejecución desde el día 19 de julio de 2023,teniendo un plazo inicial de ejecución hasta el día 18 de enero de 2024.
el día 8 de agosto se suscribe el modificatorio 1, el cual realiza un ajuste a las clausulas contractuales, sin que el mismo afecte el alcance, plazo o valor del presente convenio.
actualmente el municipio cuenta con contratos de obra e interventoría adjudicados.
el contrato de obra por medio de la LP003-2023 es adjudicada el dia 24 de noviembre de 2023.
eñ contrato de interventoria por medio del CMA003-2023 es adjudicada el dia 28 de noviembre de 2023.
de acuerdo a solicitud del municipio, el cual manifiesta requerir el plazo para la ejecucion fisica de la obra una vez se establesca orden de incio. el día 28 de noviembre de se suscribe modificatorio 2, el cual prorroga el plazo de ejecución hasta el día 31 de julio de 2024.
el contrato de obra actualmente ha sesado su ejecucion fisica a espera de aprovacion del balance de cantidades contractuales, teniendo en cuenta la variacion de cantidades contractuales como actividades no previstas correspondientes a disipadores de energia y mejoramiento de cimentacion en concreto ciclopeo.
el proyecto cuenta de acuerdo a ultimo reporte con una ejecucion fisica del 73%, a la espera de la aprobacion del balance para su culminacion.
el convenio tiene actualmente fecha de ejecucion hasta el dia 31 de julio de 2024.

ASPECTOS FINANCIEROS : no se han remitido soporte de los requisitos contractuales para el cobro de anticipo o pagos parciales.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS :
fecha de suscripción convenio: 23 de junio de 2023.
fecha de inicio del convenio 19 de julio de 2023.
fecha de suscrición modificatorio 1: 8 de agosto de 2023.
fecha de suscrición modificatorio 2: 28 de noviembre de 2023.

ASPECTOS LEGALES :
convenio inicial legalizado 24 de julio de 2023.
modificatorio 1 legalizado 7 de septiembre de 2023.
modificatorio 2 legalizado 19 de febrero de 2024.

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

el convenio inicia su ejecución y actualmente el municipio cuenta con contratos vigentes de obra e interventoría, se encuentra actualmente en tramite de balance de cantidades para la posterior culminaciond el proyecto.

Proyecto: Juan Fernando Nuñez Moncayo
contratista de apoyo a la Supervisión- SIMD

Revisó: Luis Alberto Castillo Jojoa
Subsecretario de Infraestructura y Vías
Gobernación de Nariño

Revisó: Gabriel Fernando Osejo Aguirre
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernación de Nariño

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

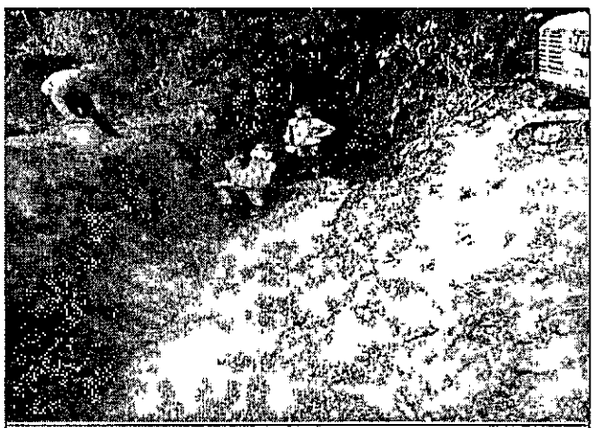


Foto1: suministro e instalacion de concreto de solado

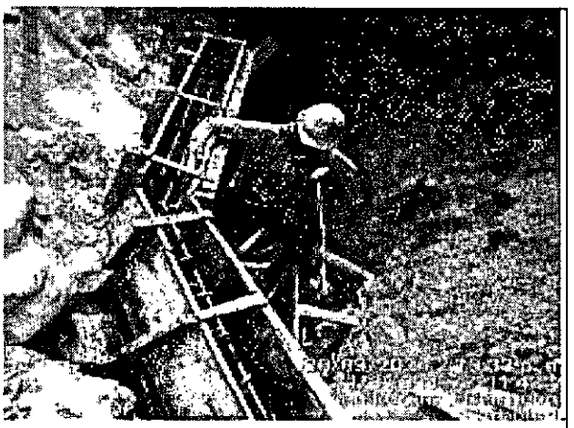


Foto2: armado de refuerzo

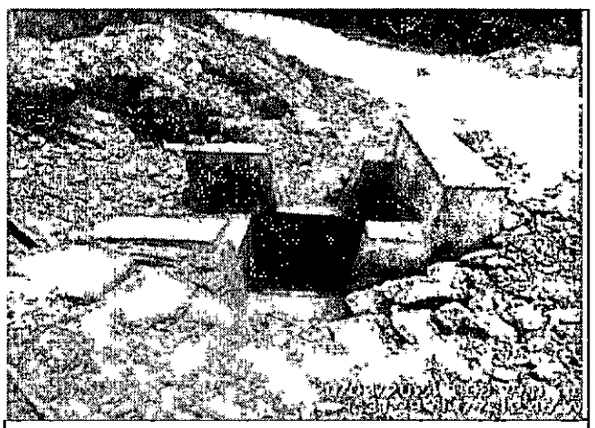


Foto3: fundicion de encoles

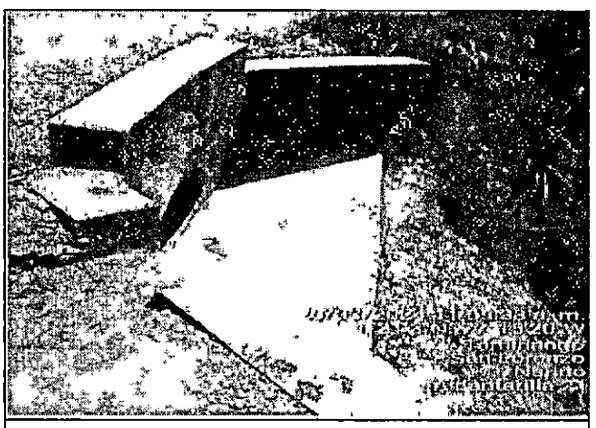


Foto4: fundicion de descoles

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO	Código.: SIVEYC.FTO.35-5 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONVENIO No.:	3253-2023

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO	15/04/2024	$ 262,006,725.89	**$ 262,006,725.89**	0	$ 262,006,725.89	$ 262,006,725.89	$ 0.00	2024001841	15/04/2024
TOTAL		**$ 262,006,725.89**		**$ 0.00**	**$ 262,006,725.89**		**$ 0.00**		

AVANCE FISICO	73%
AVANCE FINANCIERO	40%

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS**	Código.: SIVEYC.FTO.35-6 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONTRATO No 3253-2023

GARANTIAS:	aseguradora solidaria
Póliza No.:	436-47-994000059011

ANEXO 0			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	7/07/2023
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento	$ 196,505,044	30%	25-jun-23	25-jun-24		53
Buen manejo de Anticipado	$ 262,806,726	40%	25-jun-23	25-jun-24		53

ACTULIZACION POLIZAS - ANEXO 1 - ACTA DE INICIO			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	26/07/2023
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento	$ 196,505,044	30%	19-jul-23	19-jul-24	Incio	77
Buen manejo de Anticipado	$ 262,806,726	40%	19-jul-23	19-jul-24	Incio	77

ACTULIZACION POLIZAS - ANEXO 2 - MODIFICATORIO 2			FECHA APROBACION	22/01/2024	FECHA EXPEDICION	28/12/2023
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento	$ 197,105,044.20	30%	19-jul-23	31-ene-25	de acuerdo a modificatorio 2	273
Buen manejo de Anticipado	$ 262,806,726.00	40%	19-jul-23	31-ene-25	de acuerdo a modificatorio 2	273
