ASOCONSTRUCCIONES RJ
Nit: 900557482-2

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER."



INFORME MESUAL No.2 DE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIM 2023681470059 DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO"

(PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 24 DE FEBERO AL 23 DE MARZO DEL 2024)

CONTRATISTA
ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.
CONTRATO No. MC-PS-046-2023

Teléfono: 6607058 - 3124350737
Dirección: Cra10 n10-82 Málaga Santander
Nuestro correo: Gerenciasoconstrucciones@gmail.com

Contenido

INTRODUCION 3
1. TIPO DE CONTRATO 3
2. AVANCE FISICO DEL PROYECTO 5
3. CONTRATOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE OBRA 5
4. REGISTRO FOTOGRAFICO 6
5. PROGRAMACIÓN DE OBRA 11
6. PROYECCION DE OBRA 12
7. ACTIVIDADES MAS REPRESENTATIVAS 12
8. OFICIOS CRUZADOS 13
9. ACTAS DE PAGO 13
10. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO 14
11. RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 14
12. RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 14
13. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO 15
14. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 15
15. MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (Ver Anexo) 15
ROQUE JULIO SUAREZ GONZALES 15
R.L. ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S 15
CONTRATISTA ADMINISTADOR DE OBRA 15

INTRODUCION

El proyecto MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER, se encuentra localizado en el municipio de Capitanejo Santander y dista de Bucaramanga a 185 km aproximadamente a su cabecera Municipal. Desde esta, el frente de la Vereda Aguachica está a 14 km, el frente de la Vereda Ovejeras a 11 km y a la intervención de la vereda Molinos a 7 km aproximadamente, siendo estos los sitios de intervención con el proyecto

El proyecto consiste en la construcción de placa huella con sección tipo de placa huella, piedra pegada central sobre anchos en piedra pegada, cuneta y bordillo y rampas de acceso, disipador para aguas lluvias en la vereda Aguachica, en este sector 160 m de placa huellas, dos alcantarillas en la vereda Ovejeras en este sector 140 m de placa huella y una Alcantarilla en la vereda molinos con intervención de 200 m de placa huellas.

El presente informe es requisito dentro de la ejecución del contrato de Administración delegada No. MC-PS-046-2023, suscrito entre la REGIÓN DE PLAN EACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA siglas RPG-BC y ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S. informa el periodo comprendido entre el 24 de febrero al 23 de marzo del 2024
.

ASOCONSTRUCCIONES RJ

1. TIPO DE CONTRATO

ADMINISTRACION DE OBRA MC-PS-046-2023 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

1.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO	X	**ORDEN**		**CONVENIO**
Contrato número:	MC-PS-046-2023		**Certificado de Disponibilidad Presupuestal:**	**CDP: 361**
			Certificado de Registro Presupuestal	**RP: 377**
Imputación Presupuestal:	50.2.3.2.01.01.001.03.02.08 - Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huellas en el área rural del municipio deCapitanejo Santander – SSF.			
Objeto del contrato:	ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIM 2023681470063 DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO”			
Contratante:	REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA (RPG-BC)			
Documento	NIT: 901.500.213-6			
Supervisor:	MARYARIS NAUDITH TORREGLOSA COTERA SUBDIRECTORA DE PROYECTOS DE LA REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DELBAJO CAUCA			
Contratista:	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.			
Documento	NIT: 900.557.482-2			
Valor contrato administración delegada:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/L ($4.300.000)			
Valor recursos en administración	MIL TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS D			
Plazo	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DELACTA DE INICIO			

Fecha de inicio	11 DE ENERO DE 2024
Fecha de terminación	11 DE ABRIL DE 2024

2. AVANCE FISICO DEL PROYECTO

En el periodo del este informe, el proyecto ha tenido intervención de las actividades: en el tramo de Aguachica: terminación de Suministro e instalación de concreto de 3.000 PSI para un total de 160 m de placa huella, Acero de refuerzo de 4200 Mpa para huella cunetas y bordillos, Concreto tipo ciclópeo de 3.000 PSI de piedra pegada. A la fecha intervine el frente de ovejeras con la localización, excavaciones, suministro e instalación de material de base, conformación de la subrasante, suministro e instalación de concreto de 3.000 PSI de placa huella, Acero de refuerzo de 4200 Mpa para huella cunetas y bordillos, Concreto tipo ciclópeo de 3.000 PSI para piedra pegada.

3. CONTRATOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE OBRA

Como administrador delegado, se determinó realizar un solo sub contrato de obra a todo costo para le ejecución total de las actividades con la siguiente información:

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	001 DEL 2024 DEL 15 DE ENERO DE 2024
CONTRATANTE	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S
NIT:	900.557482 – 2
REPRESENTANTE LEGAL	ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN	13.930.350
CONTRATISTA	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S.
NIT:	900.715.134-2
R.L. CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO SALINAS CARVAJAL
IDENTIFICACIÓN	13.870.726 DE BUCARAMANGA
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	MIL TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE ($1.033.210.401,00).

VALOR ADICION DE CONTRATO	($0,00)
VALOR DEL ANTICIPO (40%)	CUATROCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTAICUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE (413.284.160,00).
SUPERVISOR	MAURICIO ECHEVERRIA RODRIGUEZ
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONADO No.1	N.A.
FECHA DE INICIO	23 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 DE ABRIL DE 2024
MUNICIPIO:	CAPITANEJO SANTANDER

Se solicitaron pólizas para el contrato anterior y estas se actualizaron con respecto al acta de inicio suscrita del 23 de enero del 2024

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Nit: 860.009.578-6

No. DE LA POLIZA	**CONCEPTO DEL AMPARO**	**VIGENCIA**	
		Desde (día, mes, año)	**Hasta (día, mes, año)**
51-45-101007881 Anexo 2	Cumplimiento	23/01/2024	02/11/2024
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/01/2024	03/05/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	23/01/2024	03/05/2029
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	23/01/2024	02/011/2024
51-40-101008833 Anexo 2	Responsabilidad Civil extracontractual (Predios, labores y ope)	23/01/2024	23/05/2024

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

Avance de obra Sector Aguachica





Teléfono: 6607058 - 3124350737
Dirección: Cra10 n10-82 Málaga Santander
Nuestro correo: Gerenciasoconstrucciones@gmail.com





Avance de obra sector Ovejeras

Teléfono: 6607058 - 3124350737
Dirección: Cra10 n10-82 Málaga Santander
Nuestro correo: Gerenciasoconstrucciones@gmail.com





Teléfono: 6607058 - 3124350737
Dirección: Cra10 n10-82 Málaga Santander
Nuestro correo: Gerenciasoconstrucciones@gmail.com





Teléfono: 6607058 - 3124350737
Dirección: Cra10 n10-82 Málaga Santander
Nuestro correo: Gerenciasoconstrucciones@gmail.com

5. PROGRAMACIÓN DE OBRA

La programación de obra cuenta con un tiempo de ejecución de tres (3) meses, a la fecha del presente informe, se tiene un tiempo transcurrido de dos meses, equivalentes con un porcentaje de avance estimado del 57,78% del tiempo contractual, y un avance de obra del 57,79%, la, sin embargo, para el segundo mes no se generaron atrasos en el avance de la obra con respecto al tiempo trascurrido.

Para presente informe el avance de obra equivale a un 57,79%

ASOCONSTRUCCIONES RJ

6. PROYECCION DE OBRA

Se proyecta para el siguiente mes, la terminación de las obras solicitando un adición en tiempo para la administración delegada de obra ya que la ejecución del proyecto se inició el 23 de enero del 2024.

7. ACTIVIDADES MAS REPRESENTATIVAS

Las actividades realizadas por el subcontratista de obra son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	CONDICIÓN INICIAL		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE INFORME	
				VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CAP.1	**PRELIMINARES**				**$ 14.801.103,00**		**$ 14.801.103,00**
1,10	Localización y Replanteo	M2	2398,00	$6.172,27	$14.801.103,00	2398,00	$14.801.103,00
CAP.2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$ 64.043.767,00**		**$ 55.167.105,00**
2,1	Excavación mecánica en material común a nivel de subrasante (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	M3	1066,24	$22.661,62	$24.162.726,00	719,17	$16.297.512,00
2,2	Conformación de la subrasante	M3	196,39	$48.575,90	$9.539.821,00	196,39	$9.539.933,00
2,3	Retiro de material sobrante producto de las excavaciones incluye transporte	M3	869,84	$34.881,38	$30.341.220,00	840,84	$29.329.660,00
CAP.3	**COMPONENTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA (500 M) Y OBRAS HIDRAULICAS**				**$ 639.837.613,00**		**$ 348.158.235,00**
3,1	Material tipo sub-base, incluye transporte.	M3	460,93	$184.060,46	$84.838.988,00	281,25	$51.767.004,00
3,2	Suministro e instalación de concreto de 3.000 PSI	M3	318,99	$862.949,84	$275.272.369,00	181,57	$156.685.802,00
3,3	Acero de refuerzo de 4200 Mpa	KG	20919,93	$10.001,46	$209.229.843,00	9153,51	$91.548.464,00
3,4	Concreto tipo ciclópeo de 3.000 PSI. porcentaje de piedra pegada de 40% y de concreto 60%	M3	77,02	$504.377,08	$38.847.123,00	75,33	$37.994.725,00
3,5	Suministro e instalación de concreto de 2.000 PSI	M3	2,58	$690.744,61	$1.782.121,00	1,72	$1.188.081,00
3,6	Suministro e instalación de tubería en concreto, diámetro de 36"	ML	15,60	$846.618,77	$13.207.253,00	10,60	$8.974.159,00
3,7	Construcción de canal escalonado de entrega en concreto reforzado, incluye excavacion y relleno	M3	12,45	$1.202.495,13	$14.971.064,00	0,00	$-
3,8	Construcción de entrega mediante enrocado, incluye excavacion y relleno	M3	2,19	$771.165,13	$1.688.852,00	0,00	$-
				COSTO TOTAL DIRECTO	**$718.682.483,00**		**$418.126.443,00**

ADMINISTRACCION		29,0%	$208.417.920,00	$121.256.668,00	
IMPREVISTOS		1,0%	$7.186.824,83	$4.181.264,00	
UTILIDAD		5,0%	$35.934.124,15	$20.906.322,00	
COSTO TOTAL INDIRECTO (A.I.U.)			**$251.538.868,98**	**$146.344.254,00**	
COSTO TOTAL OBRA			**$970.221.351,98**	**$564.470.697,00**	
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSTO (P.M.T.)			**$40.231.800,00**	**$26.821.200,00**	
PRESUPUESTO PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL (P.A.G.A.)			**$8.730.000,00**	**$5.820.000,00**	
CARACTERIZACION VIAL CASABLANCA - MOLINOS, RODEO - OVEJERAS, AGUACHICA	**14,31**	**$ 977.750,03**	**$13.991.602,93**	**$-**	
COSTO TOTAL PROYECTO			**$1.033.210.401,00**	**VALOR EJECUTADO EN EL SEGUNDO MES**	**$597.111.897,00**
				PORCENTAJE DE AVANCE	**57,79%**

8. OFICIOS CRUZADOS

De parte de la administración delegada de obra, se han generado las siguientes comunicaciones

Fecha	Dirigido a	Asunto
marzo	Consoltec Group	Documentos informe mensual No.1

9. ACTAS DE PAGO

Durante el periodo de ejecución del presente informe, no se han generado ningún acta de avance o pago parcial, se contempló el pago de un anticipo equivalente al 40%, el cual ya se realizó el respectivo desembolso.

Se refleja balance financiero, en donde se evidencia el valor de anticipo.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALORES	VALORES AMORTIZACIONES
Valor Adicionado	$0,00	
Valor Anticipo		$ 413.284.160,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.033.210.401,00	
VALOR EJECUTADO A LA FECHA		$ 597.111.897,00
SALDO POR EJECUTAR		**$ 436.098.504,00**

10. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

A la fecha del presente, no se han generado cambios al proyecto, no se han generado actas de modificación o de mayores y menores cantidades.

11. RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro:

Lista	Cédula	Apellidos	Nombres	Cargo u oficio
01	13.870.726	Salinas Carvajal	Carlos Alberto	Director de obra
02	1.098.101.596	Goyeneche	Lino	Residente de obra
03	5.607.980	Palencia Mayorga	José Miguel	Maestro general
04	1.005.299.690	Silva Manrique	Pedro Jesús	Oficial
05	1.098.101.883	Suarez	Yair	Oficial
06	1.098.100.256	Silva	Junior	Ayudante
07	1.098.102.649	Oviedo	Jhonatan	Ayudante
08	5.607.217	Melgarejo Triana	Roberto	Ayudante
09	1.005.299.842	Colmenares Palencia	Daniel Fernando	Ayudante
10	1.056.592.840	Paipa Martinez	Fredy Jose	Oficial
11	5.679.518	Patiño	Alejandro	Oficial
12	1.098.101.360	Vega	Edwin	Ayudante

12. RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
Vibro compactador	1	DYNAPAC CA-15
Retrocargador tipo pajarita	1	CAT 420D
Motoniveladora	1	CATERPILLAR 120G
Herramienta menor por frente de trabajo	5	Manuales mecánicas y

		eléctricas como sierras, taladros y pulidoras
Mezcladora de concreto	1	1 bulto 10 Hp
Vibrador de concreto	1	Gasolina
Plancha vibratoria (Rana)	1	6 Hp

13. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el periodo del informe se presentó clima seco, con presencia de lluvias en las horas de la noche, que no perjudica el avance de la obra.

14. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- A la fecha de corte del presente informa, la ejecución de obra tiene un avance del 57,79% del valor de lo contratado.

- La ejecución real de la obra se inició el 14 de febrero del 2024, se perdieron tres semanas del tiempo de ejecución por que no se otorgó el permiso por el municipio para el cierre e intervención de las vías, hasta tanto no se realizara la socialización del proyecto.

15. MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (Ver Anexo)

ROQUE JULIO SUAREZ GONZALES
R.L. ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S
CONTRATISTA ADMINISTADOR DE OBRA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Proyectos TIPO — Soluciones ágiles para un nuevo país

PROYECTO TIPO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 3 Tramos 0,50 KM

PRESUPUESTO

AVAL Transporte

ANEXO 1 ACTA DE RECIBO PARCIAL 1

OBRA E INTERVENTORIA:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER

LOCALIZACIÓN: CAPITANEJO, SANTANDER — FECHA: **23/02/2024**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	CONDICIÓN INICIAL		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE INFORME	
				VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CAP.1	**PRELIMINARES**				**$ 14.801.103,00**		**$ 14.801.103,00**
1,10	Localización y Replanteo	M2	2398,00	$6.172,27	$14.801.103,00	2398,00	$14.801.103,00
CAP.2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$ 64.043.767,00**		**$ 55.167.105,00**
2,1	Excavación mecánica en material común a nivel de subrasante (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	M3	1066,24	$22.661,62	$24.162.726,00	719,17	$16.297.512,00
2,2	Conformación de la subrasante	M3	196,39	$48.575,90	$9.539.821,00	196,39	$9.539.933,00
2,3	Retiro de material sobrante producto de las excavaciones incluye transporte	M3	869,84	$34.881,38	$30.341.220,00	840,84	$29.329.660,00
CAP.3	**COMPONENTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA (500 M) Y OBRAS HIDRAULICAS**				**$ 639.837.613,00**		**$ 348.158.235,00**
3,1	Material tipo sub-base, incluye transporte.	M3	460,93	$184.060,46	$84.838.988,00	281,25	$51.767.004,00
3,2	Suministro e instalación de concreto de 3.000 PSI	M3	318,99	$862.949,84	$275.272.369,00	181,57	$156.685.802,00
3,3	Acero de refuerzo de 4200 Mpa	KG	20919,93	$10.001,46	$209.229.843,00	9153,51	$91.548.464,00
3,4	Concreto tipo ciclópeo de 3.000 PSI. porcentaje de piedra pegada de 40% y de concreto 60%	M3	77,02	$504.377,08	$38.847.123,00	75,33	$37.994.725,00
3,5	Suministro e instalación de concreto de 2.000 PSI	M3	2,58	$690.744,61	$1.782.121,00	1,72	$1.188.081,00
3,6	Suministro e instalación de tubería en concreto, diámetro de 36"	ML	15,60	$846.618,77	$13.207.253,00	10,60	$8.974.159,00
3,7	Construcción de canal escalonado de entrega en concreto reforzado, incluye excavacion y relleno	M3	12,45	$1.202.495,13	$14.971.064,00	0,00	$-
3,8	Construcción de entrega mediante enrocado, incluye excavacion y relleno	M3	2,19	$771.165,13	$1.688.852,00	0,00	$-
				COSTO TOTAL DIRECTO	**$718.682.483,00**		**$418.126.443,00**
				ADMINISTRACCION 29,0%	$208.417.920,00		$121.256.668,00
				IMPREVISTOS 1,0%	$7.186.824,83		$4.181.264,00
				UTILIDAD 5,0%	$35.934.124,15		$20.906.322,00
				COSTO TOTAL INDIRECTO (A.I.U.)	**$251.538.868,98**		**$146.344.254,00**
				COSTO TOTAL OBRA	**$970.221.351,98**		**$564.470.697,00**
				PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSTO (P.M.T.)	**$40.231.800,00**		**$26.821.200,00**
				PRESUPUESTO PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL (P.A.G.A.)	**$8.730.000,00**		**$5.820.000,00**
				CARACTERIZACION VIAL CASABLANCA - MOLINOS, RODEO - OVEJERAS, AGUACHICA 14,31 $ 977.750,03	**$13.991.602,93**		**$-**
				COSTO TOTAL PROYECTO	**$1.033.210.401,00**	**VALOR EJECUTADO EN EL SEGUNDO MES**	**$597.111.897,00**
						PORCENTAJE DE AVANCE	**57,79%**

MEMORIAS DE CANTIDADES


ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATISTA OBRA	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S.	**No. CONTRATO**	**001**	**DE**	**2024**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER				
CONTRATANTE	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.	**FECHA**	23/03/24		
CAPÍTULO	**CAP.1**	**PRELIMINARES**			

ITEM No.	**Descripción**	**Unidad**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**
1,10	Localización y Replanteo	M2		**N.A.**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	Longitud (m)	**Ancho (m)**	**Alto(m)**	**No de elementos**	
VEREDA AGUA CHICA					
K0+000 - K0+160	160,00	4,70			752,00
				Subtotal	**752,00**
VEREDA OVEJERAS					
K0+000 - K0+140	140,00	4,90			686,00
				Subtotal	**686,00**
VEREDA MOLINOS					
K0+000 - K0+200	200,00	4,80			960,00
				Subtotal	**960,00**
				Pasa....	
				T O T A L	**2398,00**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO

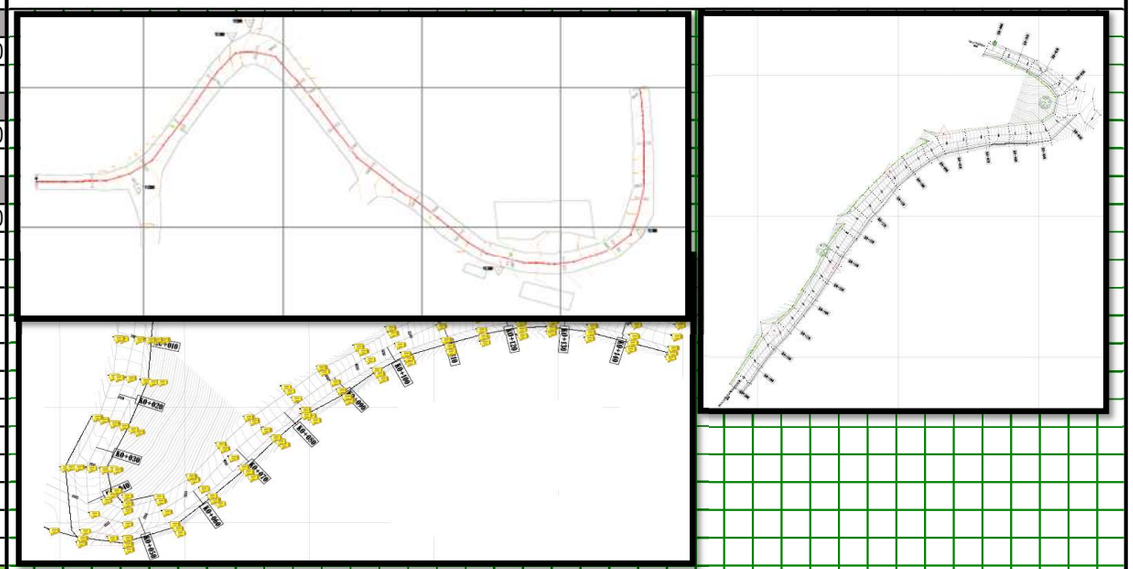

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO SALINAS CARVAJAL
C.C 13.870.726
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO SC S.A.S

INTERVENTOR

WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
C.C. 13.929.695
INTERVENTORIA

ADMINISTRADOR DE OBRA

ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
C.C 13.930.350
REPRESENTANTE LEGAL ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S

SUPERVISOR RPG BAJO CAUCA

MARYARIS NAUDITH TORREGLOSA COTERA
C.C 1.001.532.503
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR DE INTERVENTORÍA

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
C.C. 13.520.955
REPRESENTANTE LEGAL CONSOLTEC GROUP S.A.S.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATISTA OBRA	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S.	**No. CONTRATO**	**001**	**DE**	**2024**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER				
CONTRATANTE	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.	**FECHA**	23/03/24		
CAPÍTULO	**CAP.2**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			

ITEM No.	**Descripción**	**Unidad**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**
2,1	Excavación mecánica en material común a nivel de subrasante (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	M3		**N.A.**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**Dimensiones**			**No. Elementos**	**MEDIDA TOTAL**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
VEREDA AGUA CHICA					
PLACA HUELLAS AGUA CHICA	5,00	0,15	160,00	1,00	120,00
			Subtotal		**120,00**
VEREDA OVEJERAS					
PLACA HUELLAS OVEJERAS	5,00	0,15	140,00	1,00	105,00
POCETA - OVEJERAS	1,80	2,75	1,80	2,00	17,82
ALETAS (Rectangulo) - OVEJERAS	1,27	1,80	0,20	4,00	1,83
ALETAS (Triangulo) - OVEJERAS	1,27	0,75	0,20	4,00	0,38
MURO CABEZAL - OVEJERAS	1,80	2,75	0,20	2,00	1,98
ALCANTARILLAS - OVEJERAS	1,80	2,75	5,30	2,00	52,47
			Subtotal		**179,48**
VEREDA MOLINOS					
PLACA HUELLAS MOLINOS	5,00	0,15	200,00	1,00	150,00
			Subtotal		**150,00**
			Subtotal		**449,48**
			Factor de expansión		**1,60**
			T O T A L		**719,17**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO SALINAS CARVAJAL
C.C 13.870.726
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO SC S.A.S

INTERVENTOR

WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
C.C. 13.929.695
INTERVENTORIA

ADMINISTRADOR DE OBRA

ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
C.C 13.930.350
REPRESENTANTE LEGAL ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S

SUPERVISOR RPG BAJO CAUCA

MARYARIS NAUDITH TORREGLOSA COTERA
C.C 1.001.532.503
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR DE INTERVENTORÍA

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
C.C. 13.520.955
REPRESENTANTE LEGAL CONSOLTEC GROUP S.A.S.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATISTA OBRA	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S.	**No. CONTRATO**	**001**	**DE**	**2024**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER				
CONTRATANTE	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.	**FECHA**	23/03/24		
CAPÍTULO	**CAP.2**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			

ITEM No.	**Descripción**	**Unidad**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**
2,2	Conformación de la subrasante	m3		**N.A.**

ABSCISADO	**DIMENSIONES**			**V. CORTE**	**V. RELLENO**
	CORTE	**RELLENO**	**LONGITUD**		
VEREDA AGUA CHICA					
0	0,142	0,076			
10	0,892	0,000	10,00	4,63	0,25
20	0,393	0,033	10,00	6,26	0,11
30	0,132	0,136	10,00	2,51	0,79
40	0,323	0,145	10,00	2,20	1,40
50	2,072	0,000	10,00	10,71	0,48
60	0,438	0,000	10,00	12,55	0,00
70	0,219	0,000	10,00	3,29	0,00
80	0,144	0,000	10,00	1,82	0,00
90	0,336	0,000	10,00	2,40	0,00
100	0,178	0,000	10,00	2,57	0,00
110	0,291	0,158	10,00	2,32	0,53
120	0,241	0,025	10,00	2,66	0,82
130	0,510	0,039	10,00	3,67	0,32
140	0,274	0,056	10,00	3,86	0,47
150	0,111	0,163	10,00	1,86	1,05
160	0,129	0,096	10,00	1,20	1,28
			Subtotal	64,51	7,50
	Sub total corte + factor expansión (1.6)			**103,21**	
	Sub total relleno + factor (40%)				**10,50**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO SALINAS CARVAJAL
C.C 13.870.726
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO SC S.A.S

INTERVENTOR

WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
C.C. 13.929.695
INTERVENTORIA

ADMINISTRADOR DE OBRA

ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
C.C 13.930.350
REPRESENTANTE LEGAL ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S

SUPERVISOR RPG BAJO CAUCA

MARYARIS NAUDITH TORREGLOSA COTERA
C.C 1.001.532.503
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR DE INTERVENTORÍA

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
C.C. 13.520.955
REPRESENTANTE LEGAL CONSOLTEC GROUP S.A.S.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATISTA OBRA	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S.	**No. CONTRATO**	**001**	**DE**	**2024**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER				
CONTRATANTE	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.	**FECHA**	23/03/24		
CAPÍTULO	**CAP.2**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			

ITEM No.	**Descripción**	**Unidad**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**
2,2	Conformación de la subrasante	m3		**N.A.**

ABSCISADO	**DIMENSIONES**			**V. CORTE**	**V. RELLENO**
	CORTE	**RELLENO**	**LONGITUD**		
VEREDA OVEJERAS					
0	0,054	0,200			
10	0,145	0,144	10,00	0,96	1,71
20	0,143	0,292	10,00	1,44	2,14
30	0,911	0,145	10,00	4,72	2,14
40	1,438	0,543	10,00	11,65	3,23
50	0,620	0,335	10,00	10,01	4,35
60	0,126	0,358	10,00	3,42	3,46
70	0,090	0,229	10,00	1,07	2,91
80	0,193	0,164	10,00	1,38	1,96
90	0,204	0,043	10,00	1,98	0,97
100	0,206	0,094	10,00	2,05	0,67
110	0,073	0,391	10,00	1,34	2,26
120	0,103	0,081	10,00	0,88	2,17
130	0,129	0,064	10,00	1,16	0,72
140	0,082	0,361	10,00	1,05	1,92
			Subtotal	43,10	30,61
	Sub total corte + factor expansión (1.6)			**68,95**	
	Sub total relleno + factor (40%)				**42,85**
			Pasan…	103,21	10,50
			TOTAL	**172,17**	**53,35**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO SALINAS CARVAJAL
C.C 13.870.726
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO SC S.A.S

INTERVENTOR

WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
C.C. 13.929.695
INTERVENTORIA

ADMINISTRADOR DE OBRA

ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
C.C 13.930.350
REPRESENTANTE LEGAL ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S

SUPERVISOR RPG BAJO CAUCA

MARYARIS NAUDITH TORREGLOSA COTERA
C.C 1.001.532.503
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR DE INTERVENTORÍA

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
C.C. 13.520.955
REPRESENTANTE LEGAL CONSOLTEC GROUP S.A.S.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATISTA OBRA	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S.	**No. CONTRATO**	**001**	**DE**	**2024**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER				
CONTRATANTE	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.	**FECHA**	23/03/24		
CAPÍTULO	**CAP.2**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			

ITEM No.	**Descripción**	**Unidad**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**
2,2	Conformación de la subrasante	m3		**N.A.**

ABSCISADO	**DIMENSIONES**			**V. CORTE**	**V. RELLENO**
	CORTE	**RELLENO**	**LONGITUD**		
VEREDA MOLINOS					
0	0,431	0,192			
10	0,426	0,000	10,00	4,28	0,64
20	0,215	0,145	10,00	3,15	0,48
30	0,618	0,024	10,00	3,99	0,76
40	0,660	0,000	10,00	6,39	0,08
50	0,659	0,000	10,00	6,60	0,00
60	0,132	0,666	10,00	3,62	2,22
70	0,114	0,467	10,00	1,23	5,64
80	0,167	0,424	10,00	1,40	4,45
90	0,189	0,071	10,00	1,78	2,23
100	0,090	0,320	10,00	1,36	1,81
110	0,074	0,133	10,00	0,82	2,20
120	0,123	0,113	10,00	0,97	1,23
130	0,180	0,337	10,00	1,51	2,15
140	0,381	0,067	10,00	2,74	1,85
150	0,509	0,184	10,00	4,43	1,21
160	0,319	0,000	10,00	4,10	0,61
170	0,321	0,235	10,00	3,20	0,78
180	0,423	0,264	10,00	3,71	2,49
190	0,300	0,196	10,00	3,60	2,29
200	0,149	0,245	10,00	2,20	2,20
			Subtotal	61,08	35,32
	Sub total corte + factor expansión (1.6)			**97,73**	
	Sub total relleno + factor (40%)				**49,45**
			Pasan…	172,17	53,35
			TOTAL	**269,90**	**102,80**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO SALINAS CARVAJAL
C.C 13.870.726
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO SC S.A.S

INTERVENTOR

WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
C.C. 13.929.695
INTERVENTORIA

ADMINISTRADOR DE OBRA

ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
C.C 13.930.950
REPRESENTANTE LEGAL ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S

SUPERVISOR RPG BAJO CAUCA

MARYARIS NAUDITH TORREGLOSA COTERA
C.C 1.001.532.503
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR DE INTERVENTORÍA

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
C.C. 13.520.955
REPRESENTANTE LEGAL CONSOLTEC GROUP S.A.S.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATISTA OBRA	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S.	**No. CONTRATO**	**001**	**DE**	**2024**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER				
CONTRATANTE	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.	**FECHA**	23/03/24		
CAPÍTULO	**CAP.2**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			

ITEM No.	Descripción	Unidad	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.
2,2	Conformación de la subrasante	m3		N.A.

DESCRIPCIÓN

	Ancho	Alto	Longitud	No. Elementos	V. RELLENO
ALCANTARILLAS OVEJERAS	1,80	2,75	5,30	2,00	52,47
DESCUENTO DE TUBERÍA ALCANTARILLAS OVEJERAS	0,92	0,92	5,30	2,00	-7,05
			Subtotal		45,42
	Sub total relleno + factor (40%)				63,59

	Ancho	Alto	Longitud	No. Elementos	V. RELLENO
ALCANTARILLAS OVEJERAS	1,80	2,75	5,00	1,00	24,75
DESCUENTO DE TUBERÍA ALCANTARILLAS OVEJERAS	0,92	0,92	5,00	1,00	-3,32
			Subtotal		21,43
	Sub total relleno + factor (40%)				30,00

	V. CORTE	V. RELLENO
Subtotal	**0,00**	**93,59**
Pasan…	**269,90**	**102,80**
TOTAL	**269,90**	**196,39**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO SALINAS CARVAJAL
C.C 13.870.726
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO SC S.A.S

INTERVENTOR

WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
C.C. 13.929.695
INTERVENTORIA

ADMINISTRADOR DE OBRA

ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
C.C 13.930.350
REPRESENTANTE LEGAL ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S

SUPERVISOR RPG BAJO CAUCA

MARYARIS NAUDITH TORREGLOSA COTERA
C.C 1.001.532.503
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR DE INTERVENTORÍA

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
C.C. 13.520.955
REPRESENTANTE LEGAL CONSOLTEC GROUP S.A.S.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATISTA OBRA	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S.	**No. CONTRATO**	**001**	**DE**	**2024**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER				
CONTRATANTE	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.	**FECHA**	23/03/24		
CAPÍTULO	**CAP.2**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			

ITEM No.	Descripción	Unidad	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.
2,3	Retiro de material sobrante producto de las excavaciones incluye transporte	M3		N.A.

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	Dimensiones			MEDIDA TOTAL
	Excavación	Relleno	Diferencia	
VEREDA AGUA CHICA				
Excavación subrasante tramo Agua Chica K0 + 00 a K0+ 160,00	103,21	10,50	92,71	92,71
Placa huellas aguachica K0 + 00 a K0+ 160,00	192,00	0,00	192,00	192,00
			Subtotal	**284,71**
VEREDA OVEJERAS				
Excavación subrasante tramo Ovejeras K0 + 00 a K0+ 140,00	68,95	42,85	26,10	26,10
Placa huellas Ovejeras K0 + 00 a k0+140,00	168,00	0,00	168,00	168,00
Alcantarillas Ovejeras	119,17	45,42	73,75	73,75
			Subtotal	**267,85**
VEREDA MOLINOS				
Excavación subrasante tramo Molinos K0 + 00 a K0+ 200,00	97,73	49,45	48,28	48,28
Placa huellas Molinos K0 + 00 a k0+140,00	240,00	0,00	240,00	240,00
			Subtotal	**288,28**
		Subtotal		**840,84**
		Ajuste o desperdicio		**0,00**
		T O T A L		**840,84**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO SALINAS CARVAJAL
C.C 13.870.726
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO SC S.A.S

INTERVENTOR

WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
C.C. 13.929.695
INTERVENTORIA

ADMINISTRADOR DE OBRA

ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
C.C 13.930.350
REPRESENTANTE LEGAL ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S

SUPERVISOR RPG BAJO CAUCA

MARYARIS NAUDITH TORREGLOSA COTERA
C.C 1.001.532.503
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR DE INTERVENTORÍA

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
C.C. 13.520.955
REPRESENTANTE LEGAL CONSOLTEC GROUP S.A.S.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATISTA OBRA	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S.	**No. CONTRATO**	**001**	**DE**	**2024**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER				
CONTRATANTE	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.	**FECHA**	23/03/24		
CAPÍTULO	**CAP.3**	**COMPONENTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA (500 M) Y OBRAS HIDRAULICAS**			

ITEM No.	**Descripción**	**Unidad**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**
3,1	Material tipo sub-base, incluye transporte.	M3		**N.A.**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	Longitud (m)	**Ancho (m)**	**Espesor de capa (m)**	**Volumen (m³)**	
VEREDA AGUA CHICA					
Corredor vial K0+000 - K0+160	160,00	5,00	0,15	120,00	120,00
Sobreancho de la Abscisa 0+030-0+070	41,00	2,50	0,30	30,75	30,75
Sobreancho de la Abscisa 0+120-0+140	14,00	2,50	0,30	10,50	10,50
	Longitud (m)	**Ancho (m)**	**Alto (m)**	**Cantidad**	
Descuento riostra	5,00	0,20	0,15	53	-8
				Subtotal	**153,25**
VEREDA OVEJERAS					
Corredor vial K0+000 - K0+140	140,00	5,00	0,15	105,00	105,00
Sobreancho de la Abscisa 0+020-0+060	40,00	2,50	0,30	30,00	30,00
	Longitud (m)	**Ancho (m)**	**Alto (m)**	**Cantidad**	
Descuento riostra	5,00	0,20	0,15	47	-7
				Subtotal	**128,00**
				Subtotal	**281,25**
				Pasa....	
				TOTAL	**281,25**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO SALINAS CARVAJAL
C.C 13.870.726
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO SC S.A.S

INTERVENTOR

WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
C.C. 13.929.695
INTERVENTORIA

ADMINISTRADOR DE OBRA

ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
C.C 13.930.650
REPRESENTANTE LEGAL ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S

SUPERVISOR RPG BAJO CAUCA

MARYARIS NAUDITH TORREGLOSA COTERA
C.C 1.001.532.503
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR DE INTERVENTORÍA

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
C.C. 13.520.955
REPRESENTANTE LEGAL CONSOLTEC GROUP S.A.S.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATISTA OBRA	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S.	**No. CONTRATO**	**001**	**DE**	**2024**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER				
CONTRATANTE	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.	**FECHA**	23/03/24		
CAPÍTULO	**CAP.3**	**COMPONENTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA (500 M) Y OBRAS HIDRAULICAS**			

ITEM No.	Descripción	Unidad	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.
3,2	Suministro e instalación de concreto de 3.000 PSI	M3		N.A.

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL (m3)
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad elementos	
VEREDA AGUA CHICA					
K0+000 - K0+160 (Placa Huella)	160,00	1,80	0,15	53	43,20
Sobreancho de la Abscisa 0+030-0+070	41,00	2,50	0,20	1,00	10,89
Sobreancho de la Abscisa 0+120-0+140	14,00	2,50	0,20	1,00	7,00
K0+000 (Losa de transición)	5,00	2,70	0,15	1,00	2,03
Losa de transición intermedia	5,00	1,20	0,15	1,00	0,90
Losa de transición intermedia	5,50	2,00	0,15	1,00	1,65
Losa de transición intermedia	5,50	2,00	0,15	1,00	1,65
K0+160 (Losa de transición)	5,00	2,70	0,15	1,00	2,03
Cunetas Abcisa K0+000 - K0+160	160,00	0,55	0,15	2,00	26,40
	Longitud (m)	**Ancho (m)**	**Alto (m)**	**Cantidad**	
Descuento riostra	1,80	0,20	0,15	53	-2,88
				Subtotal	92,87
				Pasa....	
				TOTAL	**92,87**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO



OBSERVACIONES

El primer sobre ancho de la vereda aguachica tuvo que reducirse debido a la falta de espacio, su cantidad se estimó como el área medida en planta por su espesor correspondiente, la imagen anexa presenta las medidas reales de dicho sobre ancho.

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO SALINAS CARVAJAL
C.C 13.870.726
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO SC S.A.S

INTERVENTOR

WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
C.C. 13.929.695
INTERVENTORIA

ADMINISTRADOR DE OBRA

ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
C.C 13.930.350
REPRESENTANTE LEGAL ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S

SUPERVISOR RPG BAJO CAUCA

MARYARIS NAUDITH TORREGLOSA COTERA
C.C 1.001.532.503
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR DE INTERVENTORÍA

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
C.C. 13.520.955
REPRESENTANTE LEGAL CONSOLTEC GROUP S.A.S.

MEMORIAS DE CANTIDADES


ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATISTA OBRA	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S.	**No. CONTRATO**	**001**	**DE**	**2024**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER				
CONTRATANTE	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.	**FECHA**	23/03/24		
CAPÍTULO	**CAP.3**	**COMPONENTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA (500 M) Y OBRAS HIDRAULICAS**			

ITEM No.	Descripción	Unidad	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.
3,2	Suministro e instalación de concreto de 3.000 PSI	M3		N.A.

VEREDA OVEJERAS

K0+000 - K0+120 (Placa Huella)	120,00	1,80	0,15	40	32,40
Sobreancho de la Abscisa 0+020-0+060	40,00	2,50	0,20	1,00	20,00
K0+000 (Losa de transición)	5,00	2,70	0,15	1,00	2,03
Cunetas Abcisa K0+000 - K0+070	70,00	0,55	0,15	2,00	11,55
	Longitud (m)	**Ancho (m)**	**Alto (m)**	**Cantidad**	
Descuento riostra	1,80	0,20	0,15	40	-2,16
				Subtotal	63,82
				Subtotal	**63,82**
				Pasa....	**92,87**
				T O T A L	**156,69**

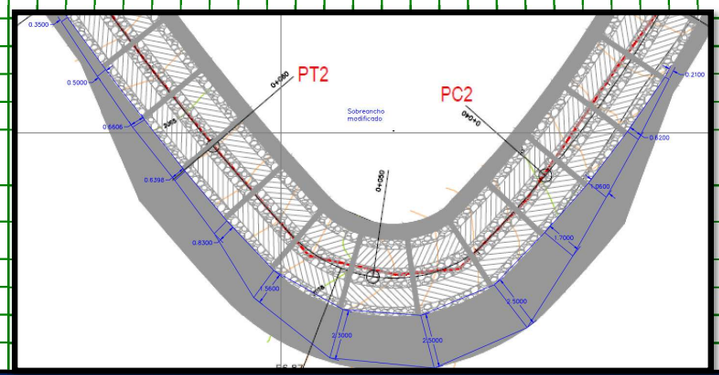

OBSERVACIONES

El primer sobre ancho de la vereda aguachica tuvo que reducirse debido a la falta de espacio, su cantidad se estimó como el área medida en planta por su espesor correspondiente, la imagen anexa presenta las medidas reales de dicho sobre ancho.

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO SALINAS CARVAJAL
C.C 13.870.726
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO SC S.A.S

INTERVENTOR

WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
C.C. 13.929.695
INTERVENTORIA

ADMINISTRADOR DE OBRA

ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
C.C 13.930.350
REPRESENTANTE LEGAL ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S

SUPERVISOR RPG BAJO CAUCA

MARYARIS NAUDITH TORREGLOSA COTERA
C.C 1.001.532.503
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR DE INTERVENTORÍA

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
C.C. 13.520.955
REPRESENTANTE LEGAL CONSOLTEC GROUP S.A.S.


MEMORIAS DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATISTA OBRA	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S.	**No. CONTRATO**	**001**	**DE**	**2024**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER				
CONTRATANTE	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.	**FECHA**	23/03/24		
CAPÍTULO	**CAP.3**	**COMPONENTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA (500 M) Y OBRAS HIDRAULICAS**			

ITEM No.	**Descripción**	**Unidad**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**
3,2	Suministro e instalación de concreto de 3.000 PSI	M3		**N.A.**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**					**MEDIDA TOTAL (m3)**	**PLANO O REGISTRO GRÁFICO**
	Longitud (m)	**Ancho (m)**	**Alto transversal (m)**	**Ancho transversal (m)**	**Cantidad elementos**		
VEREDA AGUA CHICA							
K0+000 - K0+160 (Riostras)	160,00	5,00	0,25	0,20	41	10,33	
Riostras pertenecientes al Sobreancho de la Abscisa 0+030-0+070	41,00	0,64	0,25	0,20	1,00	0,03	
		0,83	0,25	0,20	1,00	0,04	
		1,56	0,25	0,20	1,00	0,08	
		2,30	0,25	0,20	1,00	0,12	
		2,50	0,25	0,20	1,00	0,13	
		2,50	0,25	0,20	1,00	0,13	
		1,70	0,25	0,20	1,00	0,09	
		1,06	0,25	0,20	1,00	0,05	
		0,62	0,25	0,20	1,00	0,03	
		0,21	0,25	0,20	1,00	0,01	
		0,65	0,25	0,20	1,00	0,03	
		0,50	0,25	0,20	1,00	0,03	
		0,35	0,25	0,20	1,00	0,02	
Sobreancho de la Abscisa 0+120-0+140	14,00	2,50	0,25	0,20	4,67	0,58	
Riostras para las losas de transición	3,60	3,60	0,15	0,20	5,00	0,54	
					Subtotal	**12,24**	
					Pasa…	**156,69**	
					TOTAL	**168,93**	

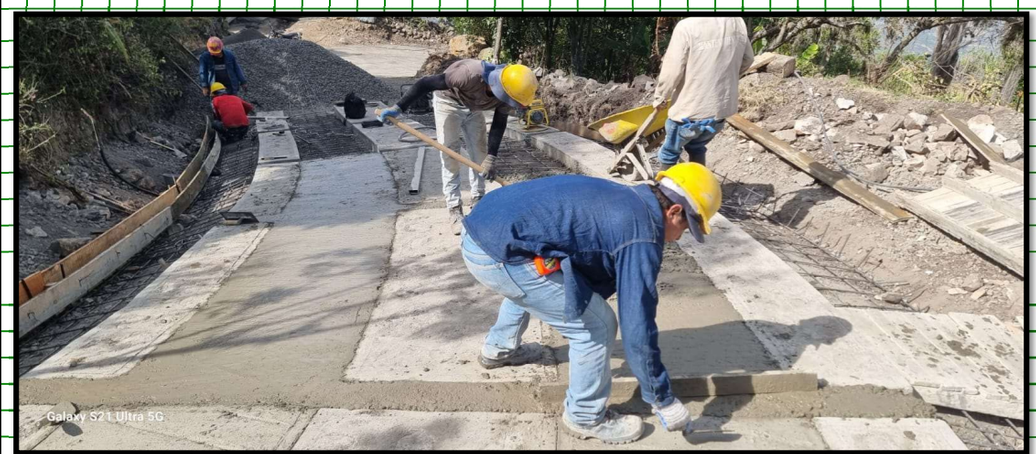

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO SALINAS CARVAJAL

C.C 13.870.726
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO SC S.A.S

INTERVENTOR

WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO

C.C. 13.929.695
INTERVENTORIA

ADMINISTRADOR DE OBRA

ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
C.C 13.930.350
REPRESENTANTE LEGAL ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S

SUPERVISOR RPG BAJO CAUCA

MARYARIS NAUDITH TORREGLOSA COTERA
C.C 1.001.532.503
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR DE INTERVENTORÍA

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
C.C. 13.520.955
REPRESENTANTE LEGAL CONSOLTEC GROUP S.A.S.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATISTA OBRA	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S.	**No. CONTRATO**	**001**	**DE**	**2024**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER				
CONTRATANTE	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.	**FECHA**	23/03/24		
CAPÍTULO	**CAP.3**	**COMPONENTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA (500 M) Y OBRAS HIDRAULICAS**			

ITEM No.	**Descripción**	**Unidad**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**
3,2	Suministro e instalación de concreto de 3.000 PSI	M3		**N.A.**

VEREDA AGUA CHICA

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**					**MEDIDA TOTAL (m3)**
	Longitud (m)	**Ancho (m)**	**Alto transversal (m)**	**Ancho transversal (m)**	**Cantidad elementos**	
Riostras dentro del tramo vial del sobreancho de la Abscisa 0+030-0+070	41,00	3,80	0,25	0,20	1,00	0,19
		3,68	0,25	0,20	1,00	0,18
		4,60	0,25	0,20	1,00	0,23
		6,13	0,25	0,20	1,00	0,31
		6,10	0,25	0,20	1,00	0,31
		6,14	0,25	0,20	1,00	0,31
		5,40	0,25	0,20	1,00	0,27
		4,60	0,25	0,20	1,00	0,23
		4,27	0,25	0,20	1,00	0,21
		4,10	0,25	0,20	1,00	0,21
		3,73	0,25	0,20	1,00	0,19
					Subtotal	2,64
VEREDA OVEJERAS						
K0+000 - K0+120 (Riostras)	120,00	5,00	0,25	0,20	40	10,00
					Subtotal	10,00
					Subtotal	**12,64**
					Pasa....	**168,93**
					TOTAL	**181,57**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO



OBSERVACIONES

Por la existencia del primer sobre ancho del tramo de aguachica hubo riostras con longitudes distintas, las cuales se mencionan una a una en la presente tabla

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO SALINAS CARVAJAL
C.C 13.870.726
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO SC S.A.S

INTERVENTOR

WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
C.C. 13.929.695
INTERVENTORIA

ADMINISTRADOR DE OBRA

ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
C.C 13.930.350
REPRESENTANTE LEGAL ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S

SUPERVISOR RPG BAJO CAUCA

MARYARIS NAUDITH TORREGLOSA COTERA
C.C 1.001.532.503
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR DE INTERVENTORÍA

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
C.C. 13.520.955
REPRESENTANTE LEGAL CONSOLTEC GROUP S.A.S.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATISTA OBRA	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S.	**Contrato No.**	**001**	**DE 2024**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER			
CONTRATANTE	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.	**FECHA**	23/03/24	
CAPÍTULO	**CAP.3**	**COMPONENTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA (500 M) Y OBRAS HIDRAULICAS**		

ITEM No.	**Descripción**	**Unidad**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**
3,3	Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 Berma Cunetas	KG		**N.A.**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**Dimensiones**			**Cantidad**	**Peso**	**MEDIDA TOTAL (kg)**
	Long. Tramo	**# de Estribos por Metro**	**Longitud**			
VEREDA AGUA CHICA						
BORDILLO						
ACERO TRANSVERSAL	160,00	4,00	0,60	2,00	0,564	433,15
ACERO LONG	1,00	2,00	160,00	2,00	0,564	360,96
CUNETA						
ACERO LONGITUDINAL	160,00	3,00	1,00	2,00	0,564	541,44
ACERO TRANSVERSAL	160,00	5,00	0,55	2,00	0,564	496,32
RIOSTRAS 5m						
ACERO TRANSVERSAL	1,00	20,00	1,00	53,33	0,564	601,60
ACERO LONGITUDINAL	5,00	4,00	1,00	53,33	0,564	601,60
SOBREANCHO RIOSTRAS	54,00					
ACERO TRANSVERSAL	1,00	10,00	1,00	18,00	0,996	179,28
ACERO LONGITUDINAL	2,50	4,00	1,00	18,00	0,996	179,28
LOSA DE TRANSICIÓN						
ACERO TRANSVERSAL RIOSTRA	1,00	20,00	1,00	5,00	0,564	56,40
ACERO LONGITUDINAL RIOSTRA	5,00	4,00	1,00	5,00	0,564	56,40
ACERO LONGITUDINAL CUNETA	2,70	3,00	1,00	10,00	0,564	45,68
ACERO TRANSVERSAL CUNETA	2,70	5,00	0,55	10,00	0,564	41,88
					Subtotal	**3593,99**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO SALINAS CARVAJAL
C.C 13.870.726
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO SC S.A.S

INTERVENTOR

WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
C.C. 13.929.695
INTERVENTORIA

ADMINISTRADOR DE OBRA

ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
C.C 13.930.350
REPRESENTANTE LEGAL ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S

SUPERVISOR RPG BAJO CAUCA

MARYARIS NAUDITH TORREGLOSA COTERA
C.C 1.001.532.503
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR DE INTERVENTORÍA

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
C.C. 13.520.955
REPRESENTANTE LEGAL CONSOLTEC GROUP S.A.S.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATISTA OBRA	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S.	**Contrato No.**	**001**	**DE**	**2024**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER				
CONTRATANTE	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.	**FECHA**	23/03/24		
CAPÍTULO	**CAP.3**	**COMPONENTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA (500 M) Y OBRAS HIDRAULICAS**			

ITEM No.	**Descripción**	**Unidad**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**
3,3	Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 Berma Cunetas	KG		**N.A.**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**Dimensiones**			**Cantidad**	**Peso**	**MEDIDA TOTAL (kg)**
	Long. Tramo	**# de Estribos por Metro**	**Longitud**			
VEREDA OVEJERAS						
BORDILLO						
ACERO TRANSVERSAL	70,00	4,00	0,60	2,00	0,564	189,50
ACERO LONG	1,00	2,00	140,00	2,00	0,564	315,84
CUNETA						
ACERO LONGITUDINAL	70,00	3,00	1,00	2,00	0,564	236,88
ACERO TRANSVERSAL	70,00	5,00	0,55	2,00	0,564	217,14
RIOSTRAS 5m						
ACERO TRANSVERSAL	1,00	20,00	1,00	40,00	0,564	451,20
ACERO LONGITUDINAL	5,00	4,00	1,00	40,00	0,564	451,20
					Subtotal	**1861,76**
					Pasa….	**3593,99**
					T O T A L	**5455,75**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO SALINAS CARVAJAL
C.C 13.870.726
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO SC S.A.S

INTERVENTOR

WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
C.C. 13.929.695
INTERVENTORIA

ADMINISTRADOR DE OBRA

ROOVE JULIO SUAREZ GONZALEZ
C.C 13.930.350
REPRESENTANTE LEGAL ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S

SUPERVISOR RPG BAJO CAUCA

MARYARIS NAUDITH TORREGLOSA COTERA
C.C 1.001.532.503
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR DE INTERVENTORÍA

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
C.C. 13.520.955
REPRESENTANTE LEGAL CONSOLTEC GROUP S.A.S.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATISTA OBRA	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S.	**Contrato No.**	**001**	**DE**	**2024**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER				
CONTRATANTE	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.	**FECHA**	23/02/24		
CAPÍTULO	**CAP.3**	**COMPONENTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA (500 M) Y OBRAS HIDRAULICAS**			

ITEM No.	**Descripción**	**Unidad**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**
3,3	Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 Alcantarilla	KG		**N.A.**

Localización	**Dimensiones**					
	Diametro	**Longitud**	**Peso/m**	**Cantidad**	**No. Alcantarillas**	**Medida Total**
DESPIECE POCETA						
TIPO A Y B	4/8"	2,85	0,994	52,00	2,00	294,62
TIPO C	4/8"	2,15	0,994	18,00	2,00	76,94
TIPO D	4/8"	2,15	0,994	18,00	2,00	76,94
TIPO E	4/8"	2,05	0,994	64,00	2,00	260,83
MURO CABEZAL						
TIPO F1	4/8"	2,92	0,994	18,00	2,00	104,49
TIPO F2	4/8"	2,79	0,994	4,00	2,00	22,19
TIPO F3	4/8"	2,71	0,994	4,00	2,00	21,55
TIPO F4	4/8"	2,60	0,994	4,00	2,00	20,68
TIPO F5	4/8"	2,49	0,994	4,00	2,00	19,80
TIPO F6	4/8"	2,38	0,994	4,00	2,00	18,93
TIPO F7	4/8"	2,27	0,994	4,00	2,00	18,05
TIPO F8	4/8"	2,19	0,994	4,00	2,00	17,41
TIPO F9	4/8"	2,05	0,994	4,00	2,00	16,30
TIPO I1	4/8"	5,60	0,994	8,00	2,00	89,06
TIPO I2	4/8"	5,84	0,994	8,00	2,00	92,88
					SUBTOTAL	**1150,65**
					Pasa....	**5455,75**
					TOTAL	**6606,40**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO SALINAS CARVAJAL
C.C 13.870.726
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO SC S.A.S

INTERVENTOR

WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
C.C. 13.929.695
INTERVENTORIA

ADMINISTRADOR DE OBRA

ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
C.C 13.930.360
REPRESENTANTE LEGAL ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S

SUPERVISOR RPG BAJO CAUCA

MARYARIS NAUDITH TORREGLOSA COTERA
C.C 1.001.532.503
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR DE INTERVENTORÍA

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
C.C. 13.520.955
REPRESENTANTE LEGAL CONSOLTEC GROUP S.A.S.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATISTA OBRA	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S.	**Contrato No.**	**001**	**DE**	**2024**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER				
CONTRATANTE	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.	**FECHA**	23/02/24		
CAPÍTULO	**CAP.3**	**COMPONENTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA (500 M) Y OBRAS HIDRAULICAS**			

ITEM No.	Descripción	Unidad	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.
3,3	Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 Alcantarilla	KG		N.A.

Localización	Diametro	Longitud	Peso/m	Cantidad	No. Alcantarillas	Medida Total
PLACAS DE FONDO (DESCOLE)						
TIPO G1	4/8"	1,35	0,994	4,00	2,00	10,74
TIPO G2	4/8"	1,62	0,994	4,00	2,00	12,88
TIPO G3	4/8"	1,89	0,994	4,00	2,00	15,03
TIPO G4	4/8"	2,16	0,994	4,00	2,00	17,18
TIPO G5	4/8"	2,44	0,994	4,00	2,00	19,40
TIPO G6	4/8"	2,55	0,994	24,00	2,00	121,67
TIPO H1	4/8"	2,92	0,994	2,00	2,00	11,61
TIPO H2	4/8"	3,24	0,994	2,00	2,00	12,88
TIPO H3	4/8"	3,57	0,994	2,00	2,00	14,19
TIPO H4	4/8"	3,89	0,994	2,00	2,00	15,47
TIPO H5	4/8"	4,22	0,994	2,00	2,00	16,78
TIPO H6	4/8"	4,54	0,994	2,00	2,00	18,05
TIPO H7	4/8"	4,87	0,994	2,00	2,00	19,36
TIPO H8	4/8"	5,19	0,994	2,00	2,00	20,64
TIPO H9	4/8"	5,52	0,994	2,00	2,00	21,95
TIPO H10	4/8"	5,12	0,994	2,00	2,00	20,36
TIPO H11	4/8"	4,72	0,994	2,00	2,00	18,77
					SUBTOTAL	**386,94**
					Pasa....	**6606,40**
					TOTAL	**6993,34**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO SALINAS CARVAJAL
C.C 13.870.726
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO SC S.A.S

INTERVENTOR

WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
C.C. 13.929.695
INTERVENTORIA

ADMINISTRADOR DE OBRA

ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
C.C 13.930.350
REPRESENTANTE LEGAL ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S

SUPERVISOR RPG BAJO CAUCA

MARYARIS NAUDITH TORREGLOSA COTERA
C.C 1.001.532.503
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR DE INTERVENTORÍA

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
C.C. 13.520.955
REPRESENTANTE LEGAL CONSOLTEC GROUP S.A.S.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATISTA OBRA	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S.	**Contrato No.**	**001**	**DE**	**2024**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER				
CONTRATANTE	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.	**FECHA**	23/03/24		
CAPÍTULO	**CAP.3**	**COMPONENTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA (500 M) Y OBRAS HIDRAULICAS**			

ITEM No.	**Descripción**	**Unidad**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**
3,3	Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 Placa huellas	KG		**N.A.**

Descripción	Longitud (m)	Ancho	Cant Varillas dispuestas transversalmen	Cant Varillas dispuestas longitudinalment	Peso (Kg/m)	No. Modulos a lo largo del tramo	Transversal	Longitudinal
VEREDA AGUA CHICA								
Acero placa huellas K0+000 - K0+160	160,00	1,80	15,00	8,00	0,564	53,33	812,16	721,92
Sobreancho de la Abscisa 0+030-0+070	41,00	2,50	15,00	12,50	0,996	13,67	510,45	510,45
Sobreancho de la Abscisa 0+120-0+140	14,00	2,50	15,00	12,50	0,996	4,67	174,30	174,30
Losa de transición 0+000	5,50	2,00	27,50	10,00	0,564	2,00	62,04	62,04
Losa de transición 0+160	5,50	2,00	27,50	10,00	0,564	2,00	62,04	62,04
Losa de transición 1 (Área Central)	2,00	2,00	10,00	10,00	0,564	3,00	33,84	33,84
Losa de transición 2 (Área Central)	2,00	2,00	10,00	10,00	0,564	3,00	33,84	33,84
Losa de transición 3 (Área Central)	1,20	2,00	6,00	10,00	0,564	3,00	20,30	20,30
							Subtotal	**1618,73**
VEREDA OVEJERAS								
Acero placa huellas K0+000 - K0+120	120,00	1,80	15,00	8,00	0,564	40,00	609,12	541,44
							Subtotal	**541,44**
							Subtotal	**2160,17**
							Pasa….	**6993,34**
							TOTAL	**9153,51**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO SALINAS CARVAJAL
C.C 13.870.726
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO SC S.A.S

INTERVENTOR

WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
C.C. 13.929.695
INTERVENTORIA

ADMINISTRADOR DE OBRA

ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
C.C 13.930.350
REPRESENTANTE LEGAL ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S

SUPERVISOR RPG BAJO CAUCA

MARYARIS NAUDITH TORREGLOSA COTERA
C.C 1.001.532.503
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR DE INTERVENTORÍA

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
C.C. 13.520.955
REPRESENTANTE LEGAL CONSOLTEC GROUP S.A.S.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATISTA OBRA	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S.	**No. CONTRATO**	**001**	**DE**	**2024**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER				
CONTRATANTE	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.	**FECHA**	23/03/24		
CAPÍTULO	**CAP.3**	**COMPONENTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA (500 M) Y OBRAS HIDRAULICAS**			

ITEM No.	Descripción	Unidad	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.
3,4	Concreto tipo ciclópeo de 3.000 PSI. porcentaje de piedra pegada de 40% y de concreto 60%	M3		N.A.

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				No. Elementos	MEDIDA TOTAL
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor de capa (m)	Volumen (m³)		
VEREDA AGUA CHICA						
K0+000 - K0+160	3,00	1,80	0,15	0,81	50,33	40,77
K0+060 - K0+170	3,00	1,60	0,15	0,72	3,00	2,16
					Subtotal	**42,93**
VEREDA OVEJERAS						
K0+000 - K0+120	3,00	1,80	0,15	0,81	40,00	32,40
					Subtotal	**32,40**
				Subtotal		**75,33**
				Pasa….		
				T O T A L		**75,33**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO



OBSERVACIONES

En la vereda aguachica entre las abscas 0+060 y 0+070 existen tres módulos que cuentan con un ancho de concreto ciclópeo inferior.

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO SALINAS CARVAJAL
C.C 13.870.726
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO SC S.A.S

INTERVENTOR

WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
C.C. 13.929.695
INTERVENTORIA

ADMINISTRADOR DE OBRA

ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
C.C 13.930.350
REPRESENTANTE LEGAL ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S

SUPERVISOR RPG BAJO CAUCA

MARYARIS NAUDITH TORREGLOSA COTERA
C.C 1.001.532.503
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR DE INTERVENTORÍA

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
C.C. 13.520.955
REPRESENTANTE LEGAL CONSOLTEC GROUP S.A.S.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATISTA OBRA	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S.	**No. CONTRATO**	**001**	**DE**	**2024**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER				
CONTRATANTE	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.	**FECHA**	23/03/24		
CAPÍTULO	**CAP.3**	**COMPONENTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA (500 M) Y OBRAS HIDRAULICAS**			

ITEM No.	**Descripción**	**Unidad**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**
3,5	Concreto Resistencia 14 (Mpa) Solera de alcantarilla			**N.A.**

DESCRIPCIÓN	**Dimensiones**			**Volumen (m3)**	**No. Elementos**	**Medida Total**
	Ancho (m)	**Espesor (m)**	**Longitud (m)**			
VEREDA OVEJERAS						
Solera enconle / descole alcantarilla entre K0+020 y K0+030	1,30	0,20	1,80	0,47	2,00	0,94
	1,40	0,20	1,40	0,39	2,00	0,78
					Subtotal	**1,72**
					Pasa....	
					TOTAL	**1,72**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO SALINAS CARVAJAL
C.C 13.870.726
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO SC S.A.S

INTERVENTOR

WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
C.C. 13.929.695
INTERVENTORIA

ADMINISTRADOR DE OBRA

ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
C.C 13.960.350
REPRESENTANTE LEGAL ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S

SUPERVISOR RPG BAJO CAUCA

MARYARIS NAUDITH TORREGLOSA COTERA
C.C 1.001.532.503
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR DE INTERVENTORÍA

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
C.C. 13.520.955
REPRESENTANTE LEGAL CONSOLTEC GROUP S.A.S.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATISTA OBRA	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S.	**No. CONTRATO**	**001**	**DE**	**2024**
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER				
CONTRATANTE	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.	**FECHA**	23/03/24		
CAPÍTULO	**CAP.3**	**COMPONENTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA (500 M) Y OBRAS HIDRAULICAS**			

ITEM No.	**Descripción**	**Unidad**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**
3,6	Suministro e instalación de tubería en concreto, diámetro de 36"	ML		**N.A.**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	Longitud (m)				
VEREDA OVEJERAS					
Entre K0+020 y K0+030	5,30				5,30
Entre K0+060 y K0+070	5,30				5,30
					-
					-
					-
					-
				Subtotal	**10,60**
				Pasa....	
				TOTAL	**10,60**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO SALINAS CARVAJAL
C.C 13.870.726
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO SC S.A.S

INTERVENTOR

WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
C.C. 13.929.695
INTERVENTORIA

ADMINISTRADOR DE OBRA

ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
C.C 13.930.350
REPRESENTANTE LEGAL ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S

SUPERVISOR RPG BAJO CAUCA

MARYARIS NAUDITH TORREGLOSA COTERA
C.C 1.001.532.503
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR DE INTERVENTORÍA

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
C.C. 13.520.955
REPRESENTANTE LEGAL CONSOLTEC GROUP S.A.S.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900557482
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASOCONSTRUCCIONES RJ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 16A N 5-39	TELÉFONO:	6603012
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7919532925**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	marzo
	AÑO:	2024		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/03/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		514164054

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 52.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 52.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 52.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 52.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 90.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 90.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 402.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 402.500**

ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.
NIT 900.557.482-2
Carrera 10 # 10 - 82
Tel: (57) 3124350737
Málaga - Colombia
julistam.01@gmail.com

Factura Electrónica
No. 262

Señores	REGION DE PLANEACION Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA		
NIT	901.500.213-6	**Teléfono**	(607) 6018390903 - Ext. 000
Dirección	cra 21 14 04 piso 3 ofic 302B	**Ciudad**	Caucasia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2024, 16:21
Expedición	02/04/2024, 16:51
Vencimiento	02/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 01 SEGÚN MC-PS-046-2023 DEL 21 de diciembre de 2023, SUSCRITO ENTRE ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S. Y LA REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA RPG-BC. en sus CLÁUSULAS -VALOR DEL CONTRATO, VALOR A ADMINISTRAR Y FORMA DE PAGO.	1.00	597,111,897.00	0.00	597,111,897.00
2	PAGO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS, según CONTRATO MC-PS-046-2023 DEL 21 de diciembre de 2023, SUSCRITO ENTRE ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S. Y LA REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA RPG-BC.	1.00	2,866,666.00	0.00	2,866,666.00

Total items: 2

Total Bruto	599,978,563.00
Total a Pagar	599,978,563.00

Valor en Letras:
Quinientos noventa y nueve millones novecientos setenta y ocho mil quinientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 599,978,563.00

Observaciones:
Para consignaciones por favor consignar a la cuenta de Ahorros Nº. 31288596231

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048509003 aprobado en 20230504 prefijo desde el número 242 al 400 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUFE: 466042a780e6b22772f6002b269abc18881c460208360dd5e68f90d6808058a96b12276a1216fe50b0d01e23838dc219

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML
