INFORME No. 14

PERIODO: 06 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 03 DE MAYO DE 2024

CONTRATO N° 0757-23 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA".

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LEONARDO MANTILLA NOGUERA	

UT. INTERCOMEDOR ITSI
901.683.399-1

BARRANCABERMEJA, SANTANDER
MAYO 2024

INFORME No. 14 DE INTERVENTORÍA

CONTRATO N° 0757-23 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA".



MAYO 2024

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN **5**
OBJETIVOS **6**
1. CAPITULO I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO **7**
1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
1.2. ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO 8
1.3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO 10
1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 10
1.5. INFORMACIÓN SOPORTE DEL PROYECTO 10
2. CAPÍTULO II. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA **11**
2.1. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO 11
2.2. ACTAS SUSCRITAS 12
2.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO SEMANAL 12
2.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 13
2.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS 15
2.6. CONTROL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 15
2.7. CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 16
2.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD 16
2.9. CONTROL DE GARANTÍAS 17
2.10. COMITÉ DE OBRA 17
3. CAPITULO III. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA **18**
3.1. ASPECTO LEGAL Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 18
3.2. ACTAS SUSCRITAS 19
3.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS 19
3.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 20
3.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS 21
3.6. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (SST) 21
3.7. ACTIVIDADES SOCIO AMBIENTALES 22
3.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD 22
3.9. CONTROL DE GARANTIAS 22
3.10. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO 23

4. CAPITULO IV. CONCLUSIONES **24**

5. CAPITULO V. ANEXOS **25**

5.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO 25

5.2. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 26

5.3. BITÁCORA DE OBRA 27

5.4. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE INTERVENTORÍA 29

5.5. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA 30

5.6. CERTIFICADO MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS 31

5.7. INFORME TÉCNICO DE OBRA 32

5.8. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA 33

5.9. INFORME HSE DE OBRA 34

5.10. INFORME SOCIO AMBIENTAL DE OBRA 35

INTRODUCCIÓN

La Institución educativa Instituto Técnico Superior Industrial - ITSI en el Distrito de Barrancabermeja, busca facilitar el desarrollo integral y el mejoramiento del impacto en el sistema educativo para los estudiantes de la sede principal de la institución, mediante la demolición de la actual cafetería y la construcción del área que cumpla las veces de cafetería y comedor escolar, cumpliendo con las condiciones básicas propuestas en la normativa sanitaria vigente: resolución 2674 de 2013, NTC 4595 y 4596, en las cuales se establece los requisitos y parámetros del diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo, analizando los diagnósticos de infraestructura frente a la existencia, calidad y acceso a los servicios públicos y condiciones de dotación de equipos y menaje en el comedor. Todo esto con el fin de dar inclusión a la promoción y ampliación de cobertura de programas de alimentación que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, para mantener sus niveles de atención, aumentar el porcentaje de permanencia escolar, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje.

Por lo anterior, se hace necesario iniciar proceso de selección de contratistas, para llevar a cabo CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

OBJETIVOS

GENERAL

- ✓ Presentar el estado técnico, administrativo, financiero y legal del contrato de obra ejecutado por el contratista WRUSSY INGENIEROS SAS durante el periodo comprendido entre el 6 de abril de 2024 al 3 de mayo de 2024.


ESPECÍFICOS

- ✓ Informar a la entidad contratante el avance físico y financiero de las actividades contractuales ejecutadas.
- ✓ Dar conocimiento de las diferentes actividades que desarrolló el contratista durante el presente periodo de ejecución del proyecto.
- ✓ Presentar informe de las obras ejecutadas durante el periodo.

1. CAPITULO I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA – SANTANDER

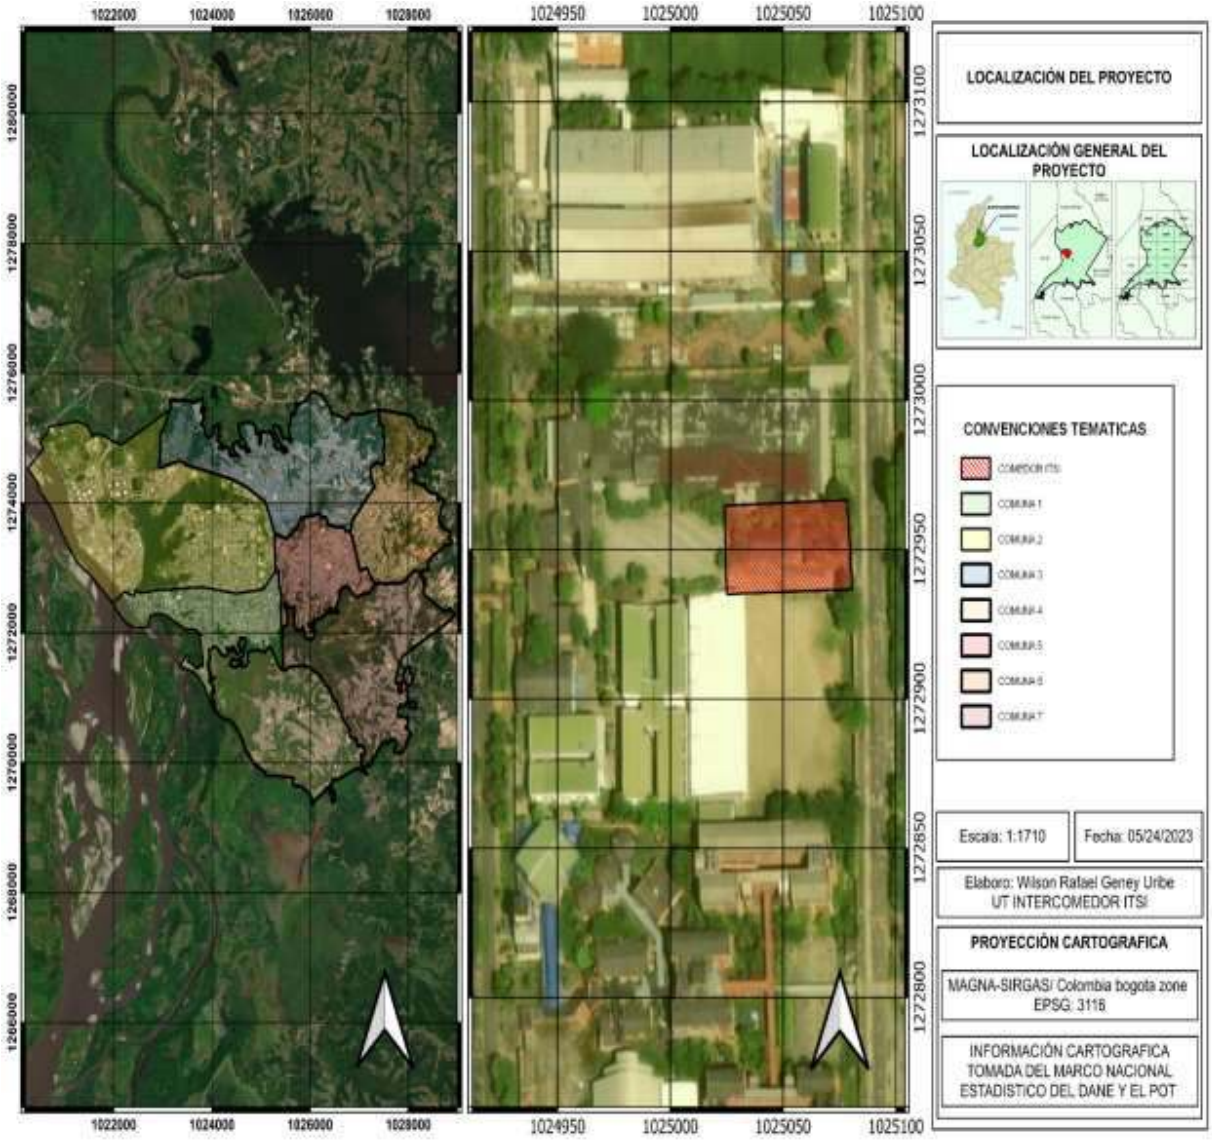


El proyecto de construcción del comedor escolar se encuentra ubicado en la carrera 28 No. 53-08 en el casco urbano del Distrito de Barrancabermeja, Santander, Dentro de las instalaciones del Instituto Técnico Superior Industrial – ITSI

Figura 1. Localización del proyecto.



Fuente: Interventoría.

Figura 2. Planta general cafetería.

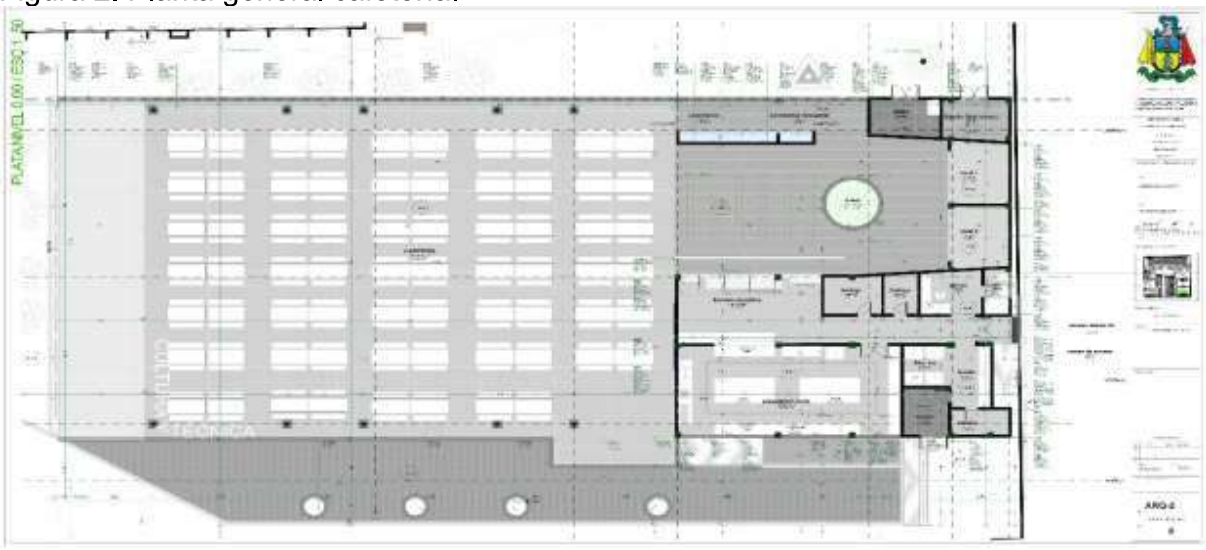

Fuente: secretaria distrital de infraestructura.

1.2. ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO

En este proyecto se indican de forma general las tareas encaminadas para la construcción del restaurante escolar del Instituto Técnico Superior Industrial, el cual será el comedor más grande de la ciudad, beneficiando cerca de 5000 estudiantes, que pasaran de tener comida industrializada a comida caliente preparada en sitio.
En general, las actividades a realizar serán:

- **ACTIVIDADES PRELIMINARES**, comprenden todas las actividades de localización, cerramiento, desmonte de estructuras, demoliciones y demás actividades necesarias para poder adecuar completamente el área disponible para el proyecto.

- **MOVIMIENTOS DE TIERRA**, comprenden las actividades de excavaciones, rellenos de acuerdo a la ubicación definida en planos y bajo estricto control topográfico y el cargue y retiro del material sobrante y de escombros generados durante el proyecto.

- **ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y ACERO ESTRUCTURAL**, corresponde a las actividades de elaboración y vaciados de concretos de sus diferentes resistencias de acuerdo a las especificaciones del elemento, y al suministro de acero estructural para cubiertas, y el suministro y figurado de acero de refuerzo.

- **MAMPOSTERÍA Y FRISOS**, corresponde a la construcción de muros de mampostería y pañete de los mismos.

- **ARQUITECTURA Y ACABADOS**, comprenden actividades de instalación de puertas y ventanas, pasamanos, mesón en granito, acabados de pisos y muros para acabado final. También incluye la cubierta, así como el cielo raso, bajantes y canal metálico, los elementos sanitarios y de cocina y los acabados exteriores finales de la obra.
- **INSTALACIONES HIDRÁULICAS**, comprende actividades de instalación de tuberías de agua fría, cajas de registro, entre otros, para el abastecimiento de agua potable y la construcción del cuarto de bombas para el suministro de agua.

- **INSTALACIONES SANITARIAS**, comprende actividades de instalación de tuberías de desagües, ventilaciones, cajas de registro, entre otros para la eliminación de residuos a través de desagües.

- **ACTIVIDADES DE ALCANTARILLADO**, comprende actividades de instalación de tuberías para la entrega final de aguas lluvias y aguas negras, cajas de inspección y construcción de pozos.

- **INSTALACIONES DE GAS**, comprende actividades de instalación de tubería de gas y conexión para abastecimiento de la infraestructura.

- **INSTALACIONES ELÉCTRICAS**, comprenden todas las actividades de circuitos eléctricos y/o sistemas fotovoltaicos para dotar de energía eléctrica la infraestructura construida.

- **EQUIPOS DE COCINA**, hace referencia a las actividades de suministro e instalación de los equipos y elementos de primera necesidad para la cocina.

1.3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las condiciones técnicas del proyecto se encuentran establecidas en los estudios previos y los diseños propuestos (estudios de conveniencia y oportunidad, planos, especificaciones técnicas), por lo tanto, son inmodificables. El presente contrato de obra pública se realizará de acuerdo al siguiente alcance: **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0756-23 - CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".**

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución inicial del proyecto tiene una duración de 12 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

El día 04 de marzo se suscribieron las actas de adicional en plazo N° 2 al contrato de obra N° 0756-23 y al contrato de interventoría N° 0757-23, para un plazo de ejecución total de 14 meses.

1.5. INFORMACIÓN SOPORTE DEL PROYECTO

El proyecto cuenta con el siguiente soporte técnico:

- Estudios Previos.
- Especificaciones Técnicas de construcción.
- Presupuesto Detallado.
- Análisis de Precios Unitarios.
- Planos y diseños.
- Pliegos de Condiciones.
- Propuesta económica de proponente.
- Acta de adjudicación del contrato.
- Minuta de contrato de Obra Pública.
- Aprobación de Póliza de Garantías.

2. CAPÍTULO II. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

2.1. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO

2.1.1 Información General del Contrato

CUADRO GENERAL DE LA INTERVENTORÍA	
CONTRATO N°:	0757-23
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL:	$ 272.766.458 (DOSIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUANTROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE)
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA
INTERVENTOR CONTRATO:	UT INTERCOMEDOR ITSI
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE MAYO DE 2024
MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

2.2. ACTAS SUSCRITAS

A la fecha se han suscrito las siguientes actas por parte de la interventoría.

ACTAS	FECHA
Contrato de interventoría 0757-23	22 de febrero de 2023
Acta de Inicio de interventoría	6 de marzo de 2023
Acta de recibo parcial N° 1	8 de septiembre de 2023
Acta aclaratoria N°1 al Acta de recibo parcial N° 1	13 de septiembre de 2023
Acta aclaratoria N°2 al Acta de recibo parcial N° 1	21 de septiembre de 2023
Acta de recibo parcial N° 2	25 de octubre de 2023
Acta aclaratoria N°1 al Acta de recibo parcial N° 2	27 de octubre de 2023
Acta de recibo parcial N° 3	19 de diciembre de 2023
Acta aclaratoria N°1 al acta de recibo parcial N°3	20 de diciembre de 2023
Acta aclaratoria N°2 al acta de recibo parcial N°3	21 de diciembre de 2023
Acta adicional N° 1 en plazo	28 de febrero de 2024
Acta parcial N°4	15 de marzo de 2024
Acta adicional N° 2 en plazo	04 de abril de 2024
Acta de suspensión N°1	03 de mayo de 2024

2.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO SEMANAL

En el presente periodo se observa el siguiente avance de obra y presupuestal del proyecto. Y se hace un comparativo con el porcentaje proyectado según PDT. Esta gráfica se toma como referencia del informe semanal.

Figura 3. Información general avance de la obra.

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	89,80%	91,79%	-1,99%
Durante el periodo	0,36%	4,90%	-4,54%
Acumulado Actual	90,16%	96,69%	-6,53%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	4,90%	96,69%
Valor de la Obra Programada	$ 128.611.542,82	$ 2.537.774.701,71

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,36%	90,16%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 9.449.011,31	$ 2.366.576.609,51

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

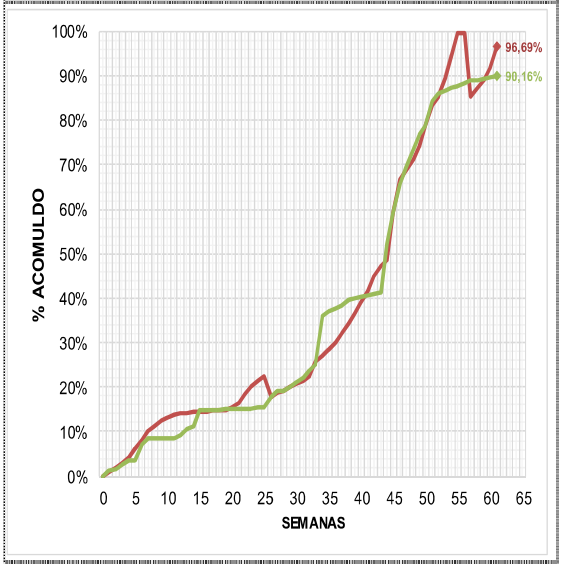

A continuación, se relacionan las actividades técnicas ejecutadas por la interventoría en el periodo:

- La interventoría realiza recorridos diarios de obra, revisando la correcta ejecución de las actividades, verificando que sean construidos en orden y eficiencia y siguiendo las especificaciones técnicas.

- La interventoría verifica que la ejecución del ítem SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN RH COCINA se realice de acuerdo a las especificaciones técnicas.

- Se verifico que la instalación de ESTUCO PARA MURO EXTERIORES se realice teniendo en cuenta los materiales exigidos por las especificaciones técnicas.

- La interventoría verifico la correcta construcción de la MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADOS 1:3 en la zona de placa de entre piso.

- Se verifica la correcta ejecución del ítem ENCHAPE DE MURO EN LAVAMANOS EN CERAMICO ESTRUCTURADA AIRES HORIZONTAL, FORMATO 60X30, BRECHA COLOR BLANCO H=3.00m.

- Se verifica la correcta instalación de la tubería 3 Ductos PVC 4"+3 Ductos PVC 2 para la conexión eléctrica.

- Con el fin de llevar un control de la programación para evaluar el avance o atraso del proyecto, se diligencia un formato de informe semanal; esto con el fin de determinar los planes de contingencia necesarios en el caso de presentarse atrasos. **(Ver anexo 5.2)**

2.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Por parte de interventoría se verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades.

- La interventoría cumple y exige al contratista el estricto cumplimiento al desarrollo del objeto contractual establecido en los pliegos de condiciones y las especificaciones técnicas.

- La interventoría realiza la presentación de informes mensuales donde se destaca el avance físico y presupuestal del proyecto, y posteriormente informa del cumplimiento o no de las obligaciones del contratista acorde con la realidad del proyecto.

- La interventoría verifica las afiliaciones al sistema de salud y parafiscales del personal que ingresó durante el periodo. Posteriormente se verifica que los pagos de las

planillas se hagan oportunamente y se anexe su comprobante de pago en cada informe.

- La interventoría realiza y lleva el registro fotográfico diario de obra, donde se ilustra el avance de las actividades ejecutadas por el contratista.

2.4.1 Registro Diario de Obra

Durante el periodo de este informe se diligenció por parte de la interventoría, en equipo con el contratista, la bitácora de obra. En este libro se plasman todas las actividades realizadas día a día con sus respectivas cantidades, visitas técnicas, actividades no previstas, toma de decisiones y cualquier tema relevante para la obra. También se especifica si hay lluvias o climas desfavorables que ameriten suspender labores. **(Ver anexo 5.3)**

2.4.2 Plan Detallado de Trabajo – PDT

El proyecto cuenta con un Plan de trabajo detallado (PDT) en Project y un control de programación, donde se discrimina el flujo de inversión programado semanalmente en pesos y en porcentaje, esto con el fin de evaluar periódicamente la ejecución del proyecto y determinar avances o atrasos respectivamente.

2.4.3 Personal de interventoría

A continuación, se relaciona el personal de la interventoría que laboró en este periodo Se anexa planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales. **(Ver anexo 5.5)**

PERSONAL	DEDICACIÓN
Director de Interventoría	20%
Residente de Interventoría	100%
Topógrafo	100%
Profesional SST	100%
Auxiliar de Interventoría	100%

2.4.4 Control de equipos de interventoría

A continuación, se presenta la relación de equipos usados por la interventoría durante el periodo de este informe.

EQUIPO	CANTIDAD
Equipo de cómputo portátil	5
Impresora multifuncional	1
Camioneta	1

2.4.5 Licencias

Dentro del periodo de este informe, no se solicita al contratista ningún tipo de licencia para los trabajos a realizar.

2.4.6 Correspondencia

A la fecha de este informe por parte de la interventoría se enviaron las siguientes comunicaciones. **(Ver anexo 5.6)**

N°	ASUNTO	FECHA	DESTINATARIO
0026	APROBACIÓN DE FICHA TECNICA "FICHA TÉCNICA EQUIPO PREENSAMBLADO NO. 400-0381"	16/04/2024	WRUSSY
0027	SOLICITUD DE INFORME SST Y AMBIENTAL N°13 CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024.	20/03/2024	WRUSSY

2.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Durante el periodo no se suscribieron actas parciales. A continuación, se presenta el resumen financiero del contrato.

ACTA	VALOR	PORCENTAJE
ACTA PARCIAL 1	$ 48.280.624,69	17,7%
ACTA PARCIAL 2	$ 46.832.034,00	17,2%
ACTA PARCIAL 3	$ 16.993.350,33	6,2%
ACTA PARCIAL 4	$112.106.006,34	45,38%
VALOR PARCIAL TOTAL	**$235.887.424,66**	**86,48%**

2.6. CONTROL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Por parte de interventoría se realiza el control estricto de los equipos usados en obra, verificando que su documentación este al día y que su funcionamiento y uso sea el correcto.

- La interventoría verifica diariamente la realización de las charlas de SST antes de iniciar las actividades de obra.

- La interventoría lleva control y verificación de orden y aseo de todas las áreas de trabajo diariamente.

- Por parte de interventoría se verifica constantemente que el señalizador vial o paletero se encuentre en sitio cada vez que ingresan o salen vehículos de carga pesada de obra.

- La interventoría verifica que el contratista realiza recambio continuo de EPP´s que se encuentran en mal estado y no están actos para realizar trabajos. Esto con el fin de proteger la integridad de los trabajadores.

- La interventoría realiza la verificación del certificado de trabajo en altura del personal y a su vez verifica el estado de los equipos y herramientas para realizar dichos trabajos.

2.7. CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

2.7.1 Socializaciones y seguimiento al contrato

La interventoría en compañía con el contratista y el supervisor, realizan semanalmente el comité de obra. Donde se revisan temas de avances de obra, actividades realizadas y se despejan dudas surgidas en la semana de ejecución, al igual que surgen compromisos para mejorar el desarrollo de la obra.

2.7.2 Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental

- La interventoría verifica el mantenimiento periódico de las baterías sanitarias suministradas por la empresa contratista y la disposición de los residuos surgidos en la obra. **Ver anexo 5.7.**

- La interventoría verifica el manejo y buen estado del punto ecológico para la disposición de basuras generadas por el proyecto.

2.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD

2.8.1 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

La interventoría verificó que el contratista a la fecha ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. En lo concerniente al recurso humano se inspeccionó el buen estado de los elementos de protección personal al igual que la dotación suministrada por el contratista. En el periodo transcurrido toda actividad realizada por el contratista ha tenido el aval de la interventoría y se ha realizado de manera segura y eficiente.

2.9. CONTROL DE GARANTÍAS

La interventoría cuenta actualmente con la póliza N° 400-47-994000090491 Anexo 3 de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA para amparar los riesgos de Cumplimiento del Contrato, Pago de Salarios y prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales.

POLIZA	ASEGURADORA	VIGENCIA		MONTO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	06/03/2023	6/11/2024	$ 54.553.291,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	06/03/2023	06/05/2027	$ 27.276.645,80
CALIDAD DEL SERVICIO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	06/03/2024	06/05/2025	$ 54.553.291,60

2.10. COMITÉ DE OBRA

A la fecha de este informe por parte de la interventoría, contratista y supervisión se han realizado los siguientes comités. **(ver anexo 5.4)**

FECHA DE COMITE	TEMA	PARTICIPANTES
02-Mayo-2024	Avance de obra, suspensión del contrato y posible fecha de reinicio.	Alejandro enriques mora (Supervisión)
		Cesar Narváez Quiñonez (Ing. residente de obra)
		Fabio Macias Rodríguez (Interventoría)
		Wilson Geney Uribe (Interventoría)

3. CAPITULO III. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

3.1. ASPECTO LEGAL Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

3.1.1 Información General del Contrato

CUADRO GENERAL DEL CONTRATISTA	
CONTRATO N°:	0756-23
OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL:	$3.684.062.560,88 (TRES MIL SEISIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE)
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
SUPERVISOR:	ING. JUAN CARLOS SILVA RINCON
INTERVENTOR CONTRATO:	UT INTERCOMEDOR ITSI
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	05 DE MAYO DE 2024
MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

3.2. ACTAS SUSCRITAS

A la fecha se han suscrito las siguientes actas por parte del contratista.

TIPO DE CONTRATO	FECHA
Contrato 0756-23	23 de febrero de 2023
Acta de inicio	06 de febrero de 2023
Acta de pactación de precios no previstos #1	28 de agosto de 2023
Acta de modificación de ajuste en mayor y menor cantidad de obra y actividades no previstas #1	29 de agosto de 2023
Acta parcial no.1	11 de septiembre de 2023
Acta aclaratoria n°1 al acta de recibo parcial no.1	13 de septiembre del 2023
Acta aclaratoria n°2 al acta de recibo parcial no.1	21 de septiembre del 2023
Acta parcial no.2	24 de octubre del 2023
Acta aclaratoria n°1 al acta de recibo parcial no.2	27 de octubre del 2023
Acta parcial no.3	19 de diciembre del 2023
Acta aclaratoria n°1 al acta de recibo parcial no.3	20 de diciembre del 2023
Acta de pactación de precios no previstos no.02	26 de diciembre del 2022
Acta de modificación de ajuste en mayor y menor cantidad de obra y actividades no previstas #2	27 de diciembre del 2023
Acta de modificación de ajuste en mayor y menor cantidad de obra y actividades no previstas #3	15 de febrero de 2024
Adicional no.01 en plazo en plazo al contrato de obra pública no.0756-23	28 de febrero de 2024
Acta parcial N°4	15 de marzo de 2024
Acta adicional N° 2 en plazo al contrato de obra publica no. 0756-23	04 de abril de 2024
Acta de suspensión N°1 al contrato 0756-23	03 de mayo de 2024

3.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS

A continuación, se relaciona un resumen de las actividades ejecutadas en el periodo, y se anexa el informe técnico mensual del contratista para ver a detalle las actividades ejecutadas. **(Ver anexo 5.8)**

- Instalación de cielo raso en PVC en el área de la cocina y locales.
- Aplicación de boquilla en los enchapes de muro.
- Aplicación de estuco en muros de mampostería externo y locales.
- Aplicación de primera mano de pintura en muros de mampostería exterior.
- Cambio de tubería en el área de cuarto de aseo y cuarto de bombas.
- Construcción de buitrones para los bajantes de agua lluvia.
- Construcción de dinteles para cielo raso.

- Se realiza corte y demolición de anden en concreto para instalación de ductos y cableado eléctrico.

3.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3.4.1 Personal de obra del contratista

A continuación, se relaciona el personal de obra del contratista que laboró en este periodo. Se anexa planilla de pago de seguridad social y parafiscales. **(Ver anexo 5.9).**

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO DEL TRABAJADOR
Wilver Franciny Russy Ladino	Director de Obra
Cesar Orlando Narváez Quiñonez	Residente de Obra
Carlos Alberto Oviedo Chavarro	Profesional eléctrico
Yesenia Álvarez Acosta	Profesional Social
Sandra Milena Santiago Camacho	Apoyo SST
Elkin Reyes Serrano	Ayudante de obra
Yerson Martínez Carrasquilla	Guarda de seguridad

Durante el periodo comprendido del presente informe se registro el ingreso del personal relacionado a las actividades de montaje de estrcutra de soporte del cortasol y pergolas, el personal se relaciona en el siguiente cuadro.

PERSONAL INSTALACIÓN CIELO RASO EN PVC		FECHA	
NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO DEL TRABAJADOR	INGRESO	SALIDA
Javier Cano Jiménez	Instalador	20/03/2024	20/04/2024
Luis Carlos Mosquera Rueda	Instalador	20/03/2024	20/04/2024

A continuación, se presenta la relación de herramientas y equipos usados por el contratista durante el periodo de este informe.

EQUIPO/HERRAMIENTA	CANTIDAD
Herramienta menor	12
Pulidora 7"	2
Martillo demoledor mediano	1
Vibrador de concreto	1

3.4.2 Correspondencia

En el periodo correspondiente de este informe el contratista envió los siguientes comunicados a la interventoría. **(Ver anexo 5.6).**

FECHA	OFICIO N°	ASUNTO	ENVÍA	RECÍBE
08/04/2024	0076-0756	RADICACIÓN POLIZAS PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
08/04/2024	0077-0756	RADICACIÓN FICHA TÉCNICA EQUIPO RCI	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
16/04/2024	0078-0756	RADICACIÓN FICHA TÉCNICA LUMINARIAS PROPUESTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
23/04/2024	0080-0756	PROGRAMACIÓN TRABAJOS ELÉCTRICOS EN EL AREA DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI

3.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Durante el periodo no se suscribieron actas parciales. A continuación, se presenta el resumen financiero del contrato.

ACTA	VALOR	PORCENTAJE
ACTA PARCIAL 1	$ 652.092.013,92	17,7%
ACTA PARCIAL 2	$ 468.320.345,00	12,7%
ACTA PARCIAL 3	$ 393.584.241,12	10,7%
ACTA PARCIAL 4	$ 1.671.827.231,59	45,38%
VALOR PARCIAL TOTAL	**$ 3.185.823.831,63**	**86,48%**

3.6. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (SST)

A continuación, se relacionan las actividades principales del área SST, ejecutadas por el contratista. Y se incluye el informe HSE para ver a detalle el trabajo realizado por el equipo de trabajo. **(Ver anexo 5.10).**

- Se realizaron las respectivas charlas diarias de seguridad y salud en el trabajo antes de iniciar la jornada laboral.

- Se realizó constantemente la reposición de EPP’s por daños a los trabajadores.

- Con ayuda del formato que se implementó de ENCUESTA DE AUTOCUIDADO se pudo determinar que ningún trabajador presentó sintomatología y/o posible contagio de COVID19 en el periodo de este informe.

- Se realizaron inspecciones de herramientas y equipos usados en el periodo.

- Se realizaron inspecciones diarias de áreas verificando el orden y aseo continuo.

- Se realizaron las charlas de seguridad, pausas activas, COPASST, CCL, capacitaciones e inducciones a todo el personal que laboró en el periodo de este informe.

- Se diligenciaron los permisos de trabajo necesarios para las actividades realizadas en el periodo.

3.7. ACTIVIDADES SOCIO AMBIENTALES

A continuación, se relacionan algunas de las actividades principales del área ambiental, ejecutadas por el contratista. Y se incluye el informe Socio Ambiental para ver a detalle el trabajo realizado. **(Ver anexo 5.11).**

- Atención a PQRS por parte de representantes del colegio ITSI y comunidad en general y se realiza reunión con los padres de familia del colegio, para presentar el avance y seguimiento actual de obra.

- Se realiza limpieza continua de baños portátiles por parte de la empresa ASSEAR y se aporta el certificado emitido por disposición final de residuos.

- Se realizan las respectivas capacitaciones al personal de obra donde se tratan temas relacionados con la parte ambiental.

3.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD

- Las actividades de obra se han realizado siguiendo y respetando las especificaciones técnicas entregadas por la entidad contratante y con aval de la interventoría.

3.9. CONTROL DE GARANTIAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que ampara el contrato de obra, actualizadas por acta de inicio.

INFORMACIÓN POLIZAS			
Póliza de cumplimiento:	11-44-101198726		
Póliza de Reps. Civil extracontractual:	11-40-101051776		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO		
Fecha de expedición	30 DE MARZO DE 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha inicial	**Fecha final**	
Cumplimiento de contrato	06/03/2023	05/08/2024	$736.812.513,00
Salarios y prestaciones sociales	06/03/2023	05/04/2027	$368.406.257,00
Estabilidad de la obra	Se ampara 5 años, 0 meses y 1 días		$736.812.513,00
Responsabilidad civil extracontractual	06/03/2023	05/04/2027	$520.000.000,00

3.10. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el décimo mes de obra, se presentó en general un buen estado del clima dentro de la jornada laboral, lo cual permitió la continuidad a los trabajos de obra.

	ABRIL																									MAYO		
HORA DEL DÍA	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
7:00-8:00																												
8:00-9:00																												
9:00-10:00																												
10:00-11:00																												
11:00-12:00																												
DESCANSO																												
13:30:-14:00																												
14:00-15:00																												
15:00-16:00																												
16:00-17:00																												

DOMINICALES - FESTIVOS

TIEMPO SECO

TIEMPO LLUVIOSO

4. CAPITULO IV. CONCLUSIONES

- En el periodo correspondiente a este informe, el contratista cumplió con las actividades realizadas de manera correcta y segura, siguiendo las especificaciones técnicas y las recomendaciones de la interventoría.

- Con la implementación del protocolo y la limpieza y desinfección de manos, herramientas y áreas, se tuvo control con los empleados en cuanto a la prevención y mitigación del contagio de COVID19.

- Los trabajadores contaron con los elementos de protección personal y dotaciones de acuerdo a las exigencias de la obra en mención.

- Durante el periodo correspondiente al siguiente informe no se realizaron modificaciones al contrato de obra e interventoría.

- Durante el periodo de ejecución de presente informe se evidencio un porcentaje de avance físico del 90,16%.

5. CAPITULO V. ANEXOS

5.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
INTERVENTOR:	UT INTERCOMEDOR ITSI
SUPERVISOR:	ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-04-2024 AL 03-05-2024
DIRECCIÓN Y SECTOR:	INTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL

FOTOGRAFIA No.1 – INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC EN COCINA Y LOCALES.











FOTOGRAFÍA No.2 – APLICACIÓN DE BOQUILLA EN LOS ENCHAPES DE MURO.





FOTOGRAFÍA No.3 – APLICACIÓN DE ESTUCO EN MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERNO Y LOCALES.













FOTOGRAFÍA No.5 – APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR.


















FOTOGRAFÍA No.6 – CAMBIO DE TUBERÍA EN CUARTO DE ASEO Y CUARTO DE BOMBAS.



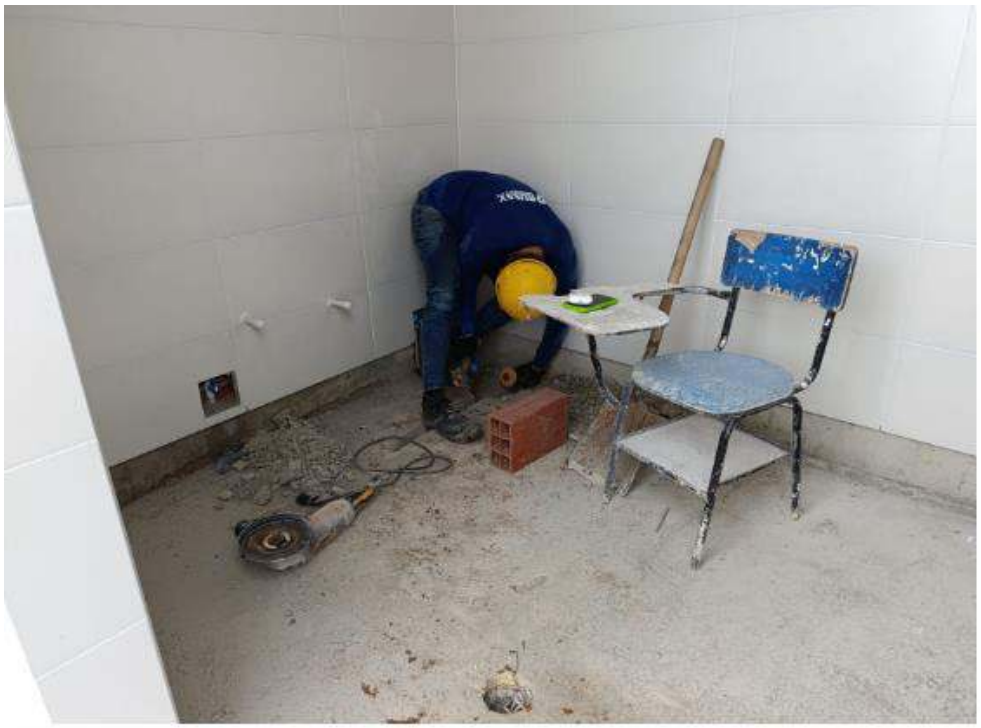

FOTOGRAFÍA No.7 – CONSTRUCCIÓN DE BUITRONES PARA BAJANTES DE AGUA LLUVIA.









FOTOGRAFÍA No.8 – CONSTRUCCIÓN DE DINTELES CIELO RASO.













FOTOGRAFÍA No.9 – CORTE Y DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO PARA ACOMETICA ELÉCTRICA.









FOTOGRAFÍA No.10 – APLICACIÓN DE SIKAFILL PARA ALFAJIAS Y MURO PERIMETRAL PLACA ENTREPISO.
















RUSSY

5.2. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

1. FECHA ELABORACIÓN:	15	4	2024	2. No. INFORME	58	3. SEMANA No.	58
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	08/04/2024 AL 14/04/2024			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23	7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	5	2024
11. PLAZO:	14	Meses					
12. PRORROGAS:	60 DIAS	13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días	14. ADICIONES:		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23	18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	5	2024
22. PLAZO:	14	Meses					
23. PRORROGAS:	60 DIAS	24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días	25. ADICIONES:		
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI						
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 63.902.909,26	2,43%	100,00%	2,43%	100,00%	2,43%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 198.285.611,99	7,55%	96,00%	7,25%	100,00%	7,55%	4,00%	0,30%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 1.022.163.601,56	38,94%	95,00%	37,00%	98,76%	38,46%	3,76%	1,47%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 40.195.916,12	1,53%	100,00%	1,53%	100,00%	1,53%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 386.108.835,10	14,71%	78,00%	11,47%	89,02%	13,09%	11,02%	1,62%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 22.534.579,16	0,86%	86,00%	0,74%	23,43%	0,20%	-62,57%	-0,54%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 22.432.417,72	0,85%	98,00%	0,84%	100,00%	0,85%	2,00%	0,02%
ALCANTARILLADO	$ 36.154.407,39	1,38%	100,00%	1,38%	100,00%	1,38%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 15.865.988,14	0,60%	88,00%	0,53%	39,32%	0,24%	-48,68%	-0,29%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 172.267.547,40	6,56%	88,00%	5,78%	83,18%	5,46%	-4,82%	-0,32%
EQUIPOS COCINA	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 60.148.795,56	2,29%	8,00%	0,18%	0,00%	0,00%	-8,00%	-0,18%
DOTACIÓN	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 584.664.754,21	22,28%	82,00%	18,27%	80,01%	17,82%	-1,99%	-0,44%
TOTAL	**$ 2.624.725.363,61**	**100,00%**		**87,40%**		**89,03%**		**1,63%**

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	88,92%	85,34%	3,58%
Durante el periodo	0,11%	2,06%	-1,95%
Acumulado Actual	89,03%	87,40%	1,63%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	2,06%	87,40%
Valor de la Obra Programada	$ 54.069.342,49	$ 2.293.985.753,96

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,11%	89,03%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.887.197,90	$ 2.336.778.310,27

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

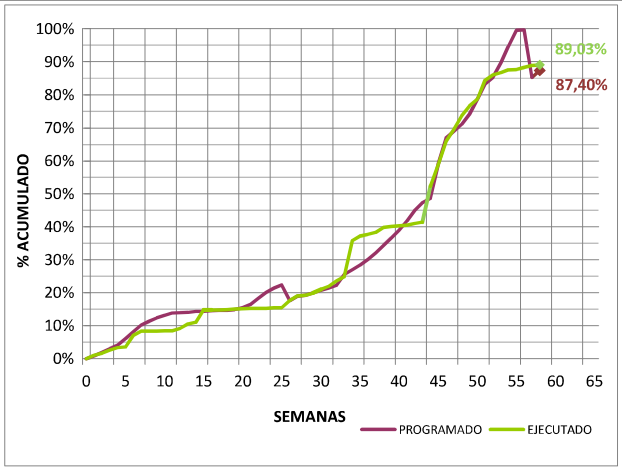

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	8	DEMOLEDOR	0	LUNES	S
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	15	MARTES	L
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	0	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	L
OFICIAL	2	MOTOBOMBA	0	VIERNES	S
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	S
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	**LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)**	

D. TECNICO

1. El contratista finaliza la instalación de cielo raso en PVC (blanco) en la zona de preparación mixta y locales.
2. El contratista inicia la instación de estuco para muros exteriores.
3. El contratista finaliza la aplicación de boquilla para juntas estrechas en enchape de muros de zonas humedas y cocina.
4. El contratista inicia con la verificación del cuarto de bombas e intalaciones hidraulicas para la posterior instalación del equipo de bombeo.
5. La interventoría verifica que las actividades realizadas estén acordes a las especificaciones técnicas y que los materiales utilizados sean los establecidos en la línea base.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.
3. La interventoria verifica las afiliaciones al sistema de seguridad social del todo el personal presente en la obra.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión recolector de residups solidos.
3. Los RCD generados por las actividades constructivas son debidamente acopiados y dispuestos en la escombrera debidamente autorizada por la autoridad ambiental competente.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo no se han realizado modificaciones a los contratos de obra e interventoría.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactaciòn de precios e ítem no previstos N°1, acta de pactaciòn de precios e ítem no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FECHA ELABORACIÓN:	15	4	2024	No. INFORME	58	SEMANA No.	58
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
CONTRATO OBRA No:	0756-23			CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23			INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Instalación de estuco para muros exteriores.



DESCRIPCIÓN: Instalación de estuco para muros exteriores.



DESCRIPCIÓN: Instalación de estuco para muros exteriores.



DESCRIPCIÓN: Instalación de estuco para muros exteriores.



DESCRIPCIÓN: Instalación de estuco para muros exteriores.



DESCRIPCIÓN: Instalación de estuco para muros exteriores.

FECHA ELABORACIÓN:	15	4	2024	No. INFORME	58	SEMANA No.	58
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
CONTRATO OBRA No:	0756-23			CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23			INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Instalación PVC en locales.



DESCRIPCIÓN: Instalación PVC en locales.



DESCRIPCIÓN: Verificación e instalación de trampa de grasas.



DESCRIPCIÓN: Verificación de instalaciones hidraulicas.



DESCRIPCIÓN: Verificación del tanque de alamcenamiento para instalación del equipo de bombeo.



DESCRIPCIÓN: Instalación de boquilla en enchape de muro.

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Pág 1 de 3

1. FECHA ELABORACIÓN:	22	4	2024	2. No. INFORME	59	3. SEMANA No.	59
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	08/04/2024 AL 14/04/2024			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	5	2024	11. PLAZO:	14 Meses
12. PRORROGAS:	60 DIAS			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA								
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	5	2024	22. PLAZO:	14 Meses
23. PRORROGAS:	60 DIAS			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:	
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI								
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA								

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 63.902.909,26	2,43%	100,00%	2,43%	100,00%	2,43%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 198.285.611,99	7,55%	96,00%	7,25%	100,00%	7,55%	4,00%	0,30%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 1.022.163.601,56	38,94%	96,00%	37,39%	98,76%	38,46%	2,76%	1,08%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 40.195.916,12	1,53%	100,00%	1,53%	100,00%	1,53%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 386.108.835,10	14,71%	85,00%	12,50%	89,77%	13,21%	4,77%	0,70%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 22.534.579,16	0,86%	88,00%	0,76%	23,43%	0,20%	-64,57%	-0,55%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 22.432.417,72	0,85%	99,00%	0,85%	100,00%	0,85%	1,00%	0,01%
ALCANTARILLADO	$ 36.154.407,39	1,38%	100,00%	1,38%	100,00%	1,38%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 15.865.988,14	0,60%	88,00%	0,53%	39,32%	0,24%	-48,68%	-0,29%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 172.267.547,40	6,56%	88,00%	5,78%	87,00%	5,71%	-1,00%	-0,07%
EQUIPOS COCINA	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 60.148.795,56	2,29%	8,00%	0,18%	0,00%	0,00%	-8,00%	-0,18%
DOTACIÓN	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 584.664.754,21	22,28%	83,00%	18,49%	80,01%	17,82%	-2,99%	-0,67%
TOTAL	**$ 2.624.725.363,61**	**100,00%**		**89,07%**		**89,39%**		**0,32%**

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	89,03%	87,40%	1,63%
Durante el periodo	0,36%	1,67%	-1,31%
Acumulado Actual	89,39%	89,07%	0,32%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	1,67%	89,07%
Valor de la Obra Programada	$ 43.832.913,57	$ 2.337.756.671,73

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,36%	89,39%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 9.449.011,31	$ 2.346.275.799,90

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

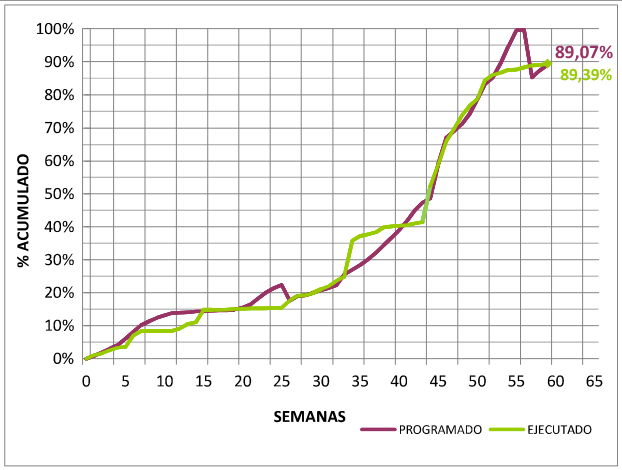

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	3	DEMOLEDOR	0	LUNES	S
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	15	MARTES	S
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	L
MAESTRO	0	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	S
OFICIAL	1	MOTOBOMBA	0	VIERNES	L
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	S
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	**LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)**	

D. TECNICO

1. El contratista continua con la instalación de estuco sobre muros exteriores de mamposteria.
2. El contratista inicia la aplicación de pintura en muros exteriores.
3. La interventoria verifica que los materiales utilizados complan con las especificaciones tecnicas contractuales.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.
3. La interventoria verifica las afiliaciones al sistema de seguridad social del todo el personal presente en la obra.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión recolector de residups solidos.
3. Los RCD generados por las actividades constructivas son debidamente acopiados y dispuestos en la escombrera debidamente autorizada por la autoridad ambiental competente.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo no se han realizado modificaciones a los contratos de obra e interventoría.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactaciòn de precios e ítem no previstos N°1, acta de pactaciòn de precios e ítem no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FECHA ELABORACIÓN:	15	4	2024	No. INFORME	59	SEMANA No.	59
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
CONTRATO OBRA No:	0756-23			CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23			INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Instalación de estuco para muros exteriores.

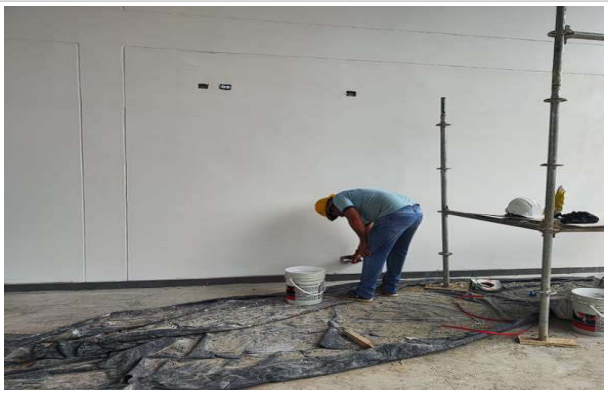

DESCRIPCIÓN: Instalación de estuco para muros exteriores.



DESCRIPCIÓN: Apliación de pintura sobre muros exteriores.



DESCRIPCIÓN: Apliación de pintura sobre muros exteriores.



DESCRIPCIÓN: Apliación de pintura sobre muros exteriores.



DESCRIPCIÓN: Orden y aseo.

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Pág 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	29	4	2024	2. No. INFORME	60	3. SEMANA No.	60
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	22/04/2024 AL 28/04/2024			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	5	2024	11. PLAZO:	14 Meses
12. PRORROGAS:	60 DIAS			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA								
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	5	2024	22. PLAZO:	14 Meses
23. PRORROGAS:	60 DIAS			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:	
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI								
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA								

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 63.902.909,26	2,43%	100,00%	2,43%	100,00%	2,43%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 198.285.611,99	7,55%	97,00%	7,33%	100,00%	7,55%	3,00%	0,23%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 1.022.163.601,56	38,94%	98,00%	38,16%	99,05%	38,57%	1,05%	0,41%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 40.195.916,12	1,53%	100,00%	1,53%	100,00%	1,53%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 386.108.835,10	14,71%	92,00%	13,53%	89,77%	13,21%	-2,23%	-0,33%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 22.534.579,16	0,86%	91,00%	0,78%	23,43%	0,20%	-67,57%	-0,58%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 22.432.417,72	0,85%	100,00%	0,85%	100,00%	0,85%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	$ 36.154.407,39	1,38%	100,00%	1,38%	100,00%	1,38%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 15.865.988,14	0,60%	88,00%	0,53%	39,32%	0,24%	-48,68%	-0,29%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 172.267.547,40	6,56%	90,00%	5,91%	89,54%	5,88%	-0,46%	-0,03%
EQUIPOS COCINA	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 60.148.795,56	2,29%	8,00%	0,18%	0,00%	0,00%	-8,00%	-0,18%
DOTACIÓN	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 584.664.754,21	22,28%	86,00%	19,16%	80,57%	17,95%	-5,43%	-1,21%
TOTAL	**$ 2.624.725.363,61**	**100,00%**		**91,78%**		**89,80%**		**-1,99%**

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	89,39%	89,07%	0,32%
Durante el periodo	0,41%	2,72%	-2,31%
Acumulado Actual	89,80%	91,78%	-1,99%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	2,72%	91,78%
Valor de la Obra Programada	$ 71.392.529,89	$ 2.409.096.073,47

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,41%	89,80%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 10.761.373,99	$ 2.356.874.151,40

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

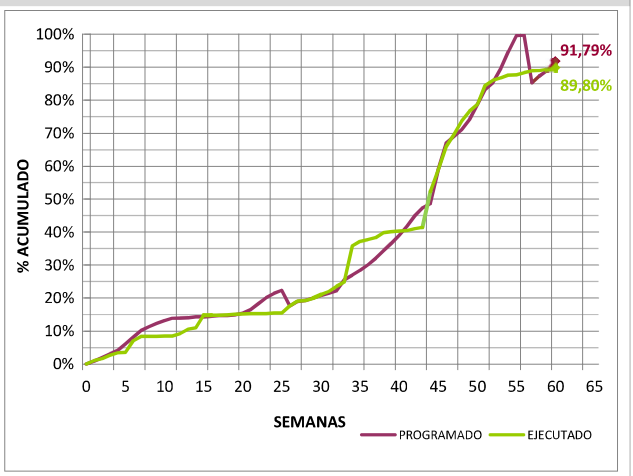

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	6	DEMOLEDOR	1	LUNES	S
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	15	MARTES	S
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	L
MAESTRO	0	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	L
OFICIAL	2	MOTOBOMBA	0	VIERNES	L
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	S
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	**LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)**	

D. TECNICO

1. El contratista continua con la aplicación de pintura en vinilo acrilico sobre estuco para en muros exteriores.
2. El contratista realiza la impermeabilziación acrilica en muro perimetral de placa de entre piso.
3. El contratista realiza la demolición, excavación y posterior instalación de tuberia a 3 Ductos PVC 4"+3 Ductos PVC 2 para acometida electrica.
4. La interventoría verifica que las actividades realizadas estén acordes a las especificaciones técnicas y que los materiales utilizados sean los establecidos en la línea base.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.
3. La interventoria verifica las afiliaciones al sistema de seguridad social del todo el personal presente en la obra.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión recolector de residups solidos.
3. Los RCD generados por las actividades constructivas son debidamente acopiados y dispuestos en la escombrera debidamente autorizada por la autoridad ambiental competente.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo no se han realizado modificaciones a los contratos de obra e interventoría.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactaciòn de precios e ítem no previstos N°1, acta de pactaciòn de precios e ítem no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FECHA ELABORACIÓN:	29	4	2024	No. INFORME	60	SEMANA No.	60
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
CONTRATO OBRA No:	0756-23			CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23			INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Aplicación de pintura sobre muros exteriores..



DESCRIPCIÓN: Aplicación de pintura sobre muros exteriores..



DESCRIPCIÓN: Aplicación de pintura sobre muros exteriores..



DESCRIPCIÓN: Impermeabilización acrilica de muro perimetral.



DESCRIPCIÓN: Impermeabilización acrilica de muro perimetral.



DESCRIPCION: Demolición de placa para instalación de ducteria..

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	5	2024	2. No. INFORME	61	3. SEMANA No.	61
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	29/04/2024 AL 03/05/2024			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23	7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	5	2024
11. PLAZO:	14	Meses					
12. PRORROGAS:	60 DIAS	13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días	14. ADICIONES:		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23	18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	5	2024
22. PLAZO:	14	Meses					
23. PRORROGAS:	60 DIAS	24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días	25. ADICIONES:		
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI						
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 63.902.909,26	2,43%	100,00%	2,43%	100,00%	2,43%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 198.285.611,99	7,55%	99,00%	7,48%	100,00%	7,55%	1,00%	0,08%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 1.022.163.601,56	38,94%	99,00%	38,55%	100,00%	38,94%	1,00%	0,39%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 40.195.916,12	1,53%	100,00%	1,53%	100,00%	1,53%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 386.108.835,10	14,71%	97,00%	14,27%	89,77%	13,21%	-7,23%	-1,06%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 22.534.579,16	0,86%	96,00%	0,82%	23,43%	0,20%	-72,57%	-0,62%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 22.432.417,72	0,85%	100,00%	0,85%	100,00%	0,85%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	$ 36.154.407,39	1,38%	100,00%	1,38%	100,00%	1,38%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 15.865.988,14	0,60%	95,00%	0,57%	39,32%	0,24%	-55,68%	-0,34%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 172.267.547,40	6,56%	97,00%	6,37%	89,54%	5,88%	-7,46%	-0,49%
EQUIPOS COCINA	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 60.148.795,56	2,29%	55,00%	1,26%	0,00%	0,00%	-55,00%	-1,26%
DOTACIÓN	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 584.664.754,21	22,28%	95,00%	21,16%	80,57%	17,95%	-14,43%	-3,21%
TOTAL	**$ 2.624.725.363,61**	**100,00%**		**96,69%**		**90,16%**		**-6,52%**

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	89,80%	91,79%	-1,99%
Durante el periodo	0,36%	4,90%	-4,54%
Acumulado Actual	90,16%	96,69%	-6,53%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	4,90%	96,69%
Valor de la Obra Programada	$ 128.611.542,82	$ 2.537.774.701,71

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,36%	90,16%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 9.449.011,31	$ 2.366.576.609,51

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

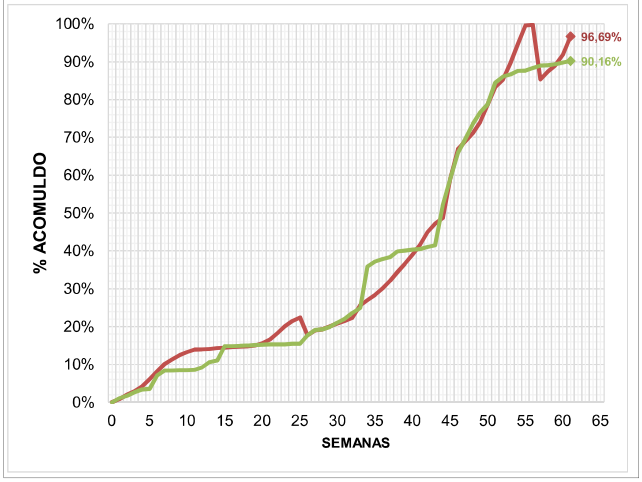

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	4	DEMOLEDOR	1	LUNES	S
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	15	MARTES	S
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	0	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	L
OFICIAL	1	MOTOBOMBA	0	VIERNES	S
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	S
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	**LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)**	

D. TECNICO

1. El contratista continua con la demolición, excavación y posterior instalación de tuberia a 3 Ductos PVC 4"+3 Ductos PVC 2 para acometida electrica.
2. El contratista comtinua con la impermeabilziación acrilica en muro perimetral de placa de entre piso.
3. El contratista realiza el replanteo, excavación e instalación de bordillos en concreto terminado.
4. La interventoría verifica que las actividades realizadas estén acordes a las especificaciones técnicas y que los materiales utilizados sean los establecidos en la línea base.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.
3. La interventoria verifica las afiliaciones al sistema de seguridad social del todo el personal presente en la obra.
4. Interventoria, supervición y contratista suscriben las actas de suspensión N°1 a los contratos el dia 3 de mayo de 2024 por un periodo de 25 dias calendario.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión recolector de residups solidos.
3. Los RCD generados por las actividades constructivas son debidamente acopiados.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo no se han realizado modificaciones a los contratos de obra e interventoría.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactaciòn de precios e ítem no previstos N°1, acta de pactaciòn de precios e ítem no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO


UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	

FECHA ELABORACIÓN:	3	5	2024	No. INFORME	61	SEMANA No.	61

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO

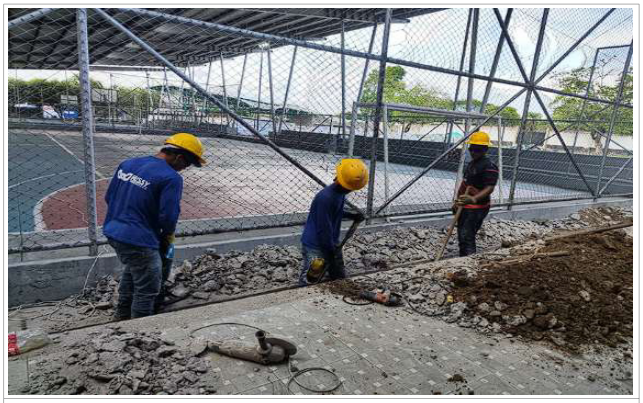

DESCRIPCIÓN: Demolición de placa en concreto.



DESCRIPCIÓN: nstalación de tuberia a 3 Ductos PVC 4"+3 Ductos PVC 2.



DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: nstalación de tuberia a 3 Ductos PVC 4"+3 Ductos PVC 2.



DESCRIPCIÓN: Impermeabilización acrilica de muro perimetral.



DESCRIPCIÓN: Impermeabilización acrilica de muro perimetral.



DESCRIPCIÓN: Replanteo e instalación de bordillo en concreto.

5.3. BITÁCORA DE OBRA

Fecha: 6 de abril 2024 / sabado.

- El contratista inicia labores a las 7 am con la charla SST.
- Se continua con la instalación de cielo raso en pvc en el area de la cocina.
- Se continua con la instalación del embozallado a los pantallas enchapadas.
- La interventoria verifica todas las ejecuciones de las actividades.

Residente interventoria

CESARONP
Presidente obra

Fecha: 08 de abril 2024 / lunes.

- El contratista inicia labores a las 7 am con la charla SST.
- Se continua aplicación de estuco exterior en muros de mampostería
- Se continua con la instalacion de enchape del area de cocina y Brechada de la misma.
- Se realizan detalles cielo raso pvc.
- La interventoria verifica todas las ejecuciones y de las actividades.

Residente interventoria

CESARONP
Presidente obra.

Fecha: 09 de abril 2024 / martes

- El contratista inicia labores a las 7 am con charla SST.
- Se continua con la aplicación de estuco exterior en los muros de mampostería

- Se inicia instalación de estructura de cielo raso en local 1
- Se continua brechado en enchape en los muros de mampostería.
- La interventoría verifica toda la ejecución de las actividades

(Residente int)

Residente interventoría

(ESPACIO)
Residente obra.

Fecha: 10 de abril 2024 / Miercoles

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- terreno colmatado por fuertes lluvias de la noche anterior.
- Se continua aplicación de estuco exterior en muros de mampostería
- Se realizan detalle en el cielo raso PVC.
- se continua brechado enchape en los muros de mampostería.
- La interventoría verifica todas la ejecución de las actividades.

Residente interventoría

(ESPACIO)
Residente obra.

Fecha: 11 de abril 2024 / Jueves.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST
- Se continua con la aplicación de estuco exterior en los muros de mampostería

- Se continua con la instalación de la estructura y lamina de pvc en el cielo raso de los locales.
- la interventoria verifica todas las ejecuciones de las actividades.

Residente interventoria

CÉSAR ONSP
Residente obra.

Fecha: 12 de abril 2024 / viernes.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua instalaciones cielo raso en pvc.
- Se continua aplicación de estuco en muros de mamposteria.
- la interventoria verifica todo la ejecucion de las actividades.

Residente interventoria.

CÉSAR ONSP
Residente obra.

Fecha 13 de abril 2024 / sabado.

- El contratista inicio labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua con la aplicacion de estuco exteriores en muros de mamposteria
- instalacion de trampa de grasas.
- la interventoria verifica la ejecucion de todas las actividades.

Residente interventoria

CÉSAR ONSP
Residente obra.

Fecha: 15 de abril 2024 / Lunes

- El contratista inicio labores a las 7am con la charla SST
- Se continua con la aplicacion de estuco en muros de mamposteria exterior.
- Se inicia lijado de estuco en muros de mamposteria.
- La interventoria verifica toda ejecucion de todas las actividades.

Residente interventoria

Residente obra

Fecha 16 de abril 2024 / martes.

- El contratista inicio labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua con la aplicacion de estuco exterior en los muros de mamposteria
- Se inicia la aplicacion gris basalto en los muros estucados.
- Se continua lijado de estuco en muros de mamposteria.
- La interventoria verifica toda la ejecucion de todas las actividades.

Residente interventoria

Residente obra.

084

Fecha: 17 de abril 2024 / Miercoles.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se presentan fuertes lluvias desde las 6 am hasta las 9:00 am
- Se inicia aplicacion de estuco en muros de mamposteria del area a los locales 1 y 2
- Se continua con la aplicación de pintura en muros de mamposteria exterior.
- la interventoria verifica toda la ejecucion de todas las actividades.

Residente interventoria

CESADON
Residente obra

Fecha: 18 de abril 2024 / jueves

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se realiza lijado de estuco en muros de mamposteria en areas de locales
- Se continua con la aplicacion de pintura en muros de mamposteria exterior
- Llegada de material (laminas de superboard, canales y rodillos)
- la interventoria verifica toda la ejecucion de todas la actividades.

Residente interventoria

CESADON
Residente obra

Fecha 19 de abril 2024 / viernes.

- El contratista inicia labores a las 7 am con charla SST.
- Se presenta lluvias desde las 7 am hasta 11 am
- Se continua la instalacion de los witrones en el area de la cocina.
- por cuestiones de lluvias no se continua con la aplicacion de pintura en los muros de mamposteria
- la interventoria verifica todas la ejecuciones de las actividades

Residente interventoria

CECHRONP
Residente obra.

Fecha 20 de abril 2024 / sabado.

- El contratista inicia labores a las 7 am con la charla SST.
- Se inicia el cambio de tuberia en el area del cuarto de bomba y aseo
- Se continua la pegada de estuco en los muros de mamposteria en el area de los baños-
- la interventoria verifica todo las ejecuciones de las actividades

Residente interventoria

CECHRONP
Residente obra.

Fecha 22 - de abril 2024 / lunes

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se presentan fuertes lluvias desde 6:00am hasta 11:00am terreno calmado de agua.
- Contratista del estuco no puede realizar labores ya que los muros de mampostería se encuentran humedos.
- continuan lluvias en horas de la tarde.
- La interventoría verifica todas las ejecuciones de las actividades.

Residente interventoría

ESTRECONP
Residente obra

Fecha 23 de abril 2024 / Martes.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua con la aplicación de pintura en muros de mampostería
- Se continua con el reemplazo de tubería agua potable en cuartos de bombeo y cuarto de aseo
- Se inicia corte de anden en concreto para la instalación de los ductos y cableado electrico.
- La interventoria verifica toda la ejecucion de las actividades.

Residente interventoría

ESTRECONP
Residente obra

Fecha: 24 de abril 2024 / Miercoles

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST
- Se continua con la aplicación de pintura en muros de mampostería exteriores.
- Se realiza jornada de limpieza y corte de maleza.
- La interventoría verifica la ejecución de todas las actividades.

Residente interventoría

Residente obra

Fecha: 25 de abril 2024 / Jueves.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua aplicación de pintura en muros de mampostería.
- Se continua con la instalación de dinteles en el area de servicio al Cliente y los locales
- Se realiza aplicación de sikafill en las altojinas y muro perimetral placa de entrepisos.
- Se presentan fuertes lluvias de 4:00 pm a 5:00 pm
- Se realiza limpieza y corte de maleza.
- La interventoria verifica la ejecución de todas las actividades.

Residente interventoría

Residente obra

088

Fecha: 26 de abril 2024 / viernes

- el contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- se reparan deflexiones de las mesas de manipuleo
- se continua rectura de anden en concreto para la continuación de instalación tuberia acometida electrica.
- la interventoria verifica la ejecucion de todas las actividades

Residente interventoria

CÉSAR O P
Residente obra

Fecha 27 de abril 2024 / sabado.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST
- Se continua con la rectura de anden en concreto para instalación electrica y cableado electrico
- llega de equipo de bombeo, anclajes de mesas y material electrico.
- la interventoria verifica la ejecucion de todas las actividades

Residente interventoria

CÉSAR O P
Residente obra

Fecha 29 de abril 2024 / Lunes.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST
- Se presenta terreno colmatado por fuertes lluvias de la noche anterior
- Se continua con la notura de piso en concreto reforzado para instalación de ductería y cableado electrico
- La interventoria verifica la ejecucion de todas las actividades

Residente interventoria

CESARONP
Residente obra

Fecha 30 de abril 2024 / Martes.

- El contratista inicio labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua con la notura de piso en concreto reforzado para la instalación de ductoras y cableado electrico
- Llegada de bordillo prefabricados en concreto 110 unidades
- Se inicia traslado de materiales de la bodega provicional para el areas de los locales
- Llegada de rejillas para canaletas y angulos de cajas de inspección.
- La interventoria verifica la ejecucion de todas las actividades.

Residente interventoria

CESARONP
Residente obra

Fecha: 01 de Mayo 2024 / Miercoles.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua con la retira de piso en concreto reforzado para la instalación de ductería y cableado electrico
- Se inicia instalación de cableado electrico para la conexion de acometida al tablero principal de la institucion
- la interventoria verifica la ejecucion de todas las actividades.

Residente interventoria

CESARONP
Residente obra

Fecha: 02 de mayo 2024 / Jueves

- (el) Se presentan fuertes lluvias la noche anterior y continuan hasta las 11 am, razon por la cual el contratista no pudo realizar actividades
- Se realiza ubicación de bordillos para posterior instalación
- Llegada de material 22 bultos de cemento.
- la interventoria verifica la ejecucion de todas las actividades.

Residente interventoria

CESARONP
Residente obra

Fecha: 03 - de mayo 2024 / viernes

- El contratista inicia labores a las 7am con charla SST.
- Se inicia la instalación de Ladrillo prefabricado
- Mediante el comité realizado por la supervisión, (de) interventoría y contratista, se llega a la decisión de realizar la suspensión temporal a los contrato de obra e interventoría por un periodo de 25 días calendarios. todo esto a la espera de los tramites pertinente para la aprobación de adicional en valor.

Residente interventoría

CESAR OVIP
Residente obra

5.4. COMITÉ DE OBRA

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNION	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 02-5-2024 **HORA:** 02:00 PM **LUGAR:** I.T.S.I **ACTA NO.**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Secretaria de infraestructura al contrato 0756-23
TIPO DE REUNIÓN	Comité de reunión seguimiento.
CONTRATO N°	0956-23.
OBJETO DEL CONTRATO	Contruccion y dotacion del comedor y cocina del intituto Tecnico Superior Industrial de Barrancabermeja.
ORGANIZADOR	Alejandro Enriquez.
APUNTADOR	César Narvaez.
ASISTENTES	Alejandro Enriquez, Cesar Narvaez, Wilson Geney

TEMAS DE DISCUSIÓN
* Avance de la obra.
* Continuidad del contrato.
x SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
x POSIBLE FECHA DE REINICIO.

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

* Porcentaje de ejecución: 89,80%
* Porcentaje Programado: 91,78 %.

Dada la inminente expiración de la segunda prorroga de los contratos de obra e interventoría, es imperativo solicitar la suspención de los mismos debido a la ausencia de resultados efectivos en -

términos de tiempo y valor, a pesar de haber solicitado un adicional. Las actividades pactadas contractualmente ya llegaron a cabalidad por lo tanto es necesario el adicional en tiempo y en valor para poder continuar el contrato de obra y cumplir el objeto, teniendo en cuenta que estas actividades son necesarias para continuar con el proceso constructivo.

EN RESUMEN LA SUSPENSIÓN PROCEDE A FALTA DE LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS QUE HACEN PARTE DEL DESARROLLO CONSECUENTE DE UN PROYECTO TOTALMENTE FUNCIONAL. Y DONDE EL OBJETO CELEBRADO POR TAL RAZÓN LAS PARTE EN COMÚN ACUERDO COINCIDEN EN SUSPENDER EL CONTRATO DE OBRA EL INTERVENTORÍA

UNA VEZ LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOLICITE Y POSTERIORMENTE LA SEC. DE HACIENDA EXPIDA LOS RESPECTIVOS CDP. SE RETOMARÁN LOS LABORES CONTRACTUALES

SE ACUERDO SUSPENDER EL CONTRATO EL DÍA 02 DE MAYO DE 2024. Y SE PROROGA SU REINICIO EL DIA 22 DE MAYO DE 2024.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNION	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FIRMA ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alejandro Enriquez.	Supervisor.	
Edwin A. Mosquera	Interventoria ITSI	
Wilson Cesar Uribe	Interventoria ITSI	
César Narváez	Ing. Residente CIVRUSSY	

5.5. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE INTERVENTORÍA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901683399	1	UT. INTERCOMEDOR ITSI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CR 22 52 B 60 AP 101	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	653152116	9466865021	E	2024/05/24	2024/05/21	BANCO DE BOGOTA	0	$1,021,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1096241286	GENEY URIBE WILSON RAFAEL																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	13749852	MACIAS RODRIGUEZ FABIO ANDRES																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total	**Afiliados(2)**																						$3,300,000	$528,000			$3,300,000	$132,000			$3,300,000	$132,000			$3,300,000	$229,700		$0	$0		$1,021,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901683399	1	UT. INTERCOMEDOR ITSI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CR 22 52 B 60 AP 101	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	653152116	9466865021	E	2024/05/24	2024/05/21	BANCO DE BOGOTA	0	$1,021,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$528,000	$0	$0	$528,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$229,700	$0	$0	$229,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$229,700	$0	$0	$229,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$132,000	$0	$0	$132,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$132,000	$0	$0	$132,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$132,000	$0	$0	$132,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				2	$1,021,700	$0	$0	$1,021,700

5.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA

UT. INTERCOMEDOR ITSI

Barrancabermeja, 16 de abril de 2024 **OFICIO N° 0026**

Señor:
WRUSSY INGENIEROS S.A.S.
ATN. ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
REPRESENTANTE LEGAL

Ref: Contrato de interventoría N. 0757-23 "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE **CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA"**

Asunto:	**APROBACIÓN DE FICHA TECNICA "FICHA TÉCNICA EQUIPO PREENSAMBLADO NO. 400-0381"**

Cordial saludo,

En relación con la ficha técnica del sistema de bombeo adjunta al comunicado 077-0756 **(RADICACIÓN FICHA TÉCNICA EQUIPO RCI)** y dentro del marco que hoy nos ocupa, la interventoría avala este insumo y/o material para la ejecución de la respectiva actividad como quiera que este cumple con las especificaciones técnicas y es acorde a lo finalmente ofertado dentro del Análisis de Precio Unitario (APU) presentado.

Por lo tanto, se aprueba la instalación de este elemento para la ejecución del ítem SISTEMA DE BOMBEO (2 BOMBAS 1 HP; Q=1.59 LPS; PRESION=28 m.c.a.; HIDONEUMATICO 200 LTS (INCLUYE VALVULAS, ACCESORIOS).

Agradezco su diligencia en este proceso y quedo a disposición para cualquier consulta adicional que pueda surgir.

Atentamente,

LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R/L UT. INTERCOMEDOR ITSI

Carrera 22 No.52B-60 EDIFICIO GLAYA APTO 101 Barrio Torcoroma
Celular 314 412 1030, E-mail: fmcconstructoresltda@gmail.com
Barrancabermeja - Santander

UT. INTERCOMEDOR ITSI

Barrancabermeja, 22 de abril de 2024 **OFICIO N° 0027**

Señor:
WRUSSY INGENIEROS S.A.S.
ATN. ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
REPRESENTANTE LEGAL

Ref: Contrato de interventoría N. 0757-23 "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE **CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA"**

Asunto:	**SOLICITUD DE INFORME SST Y AMBIENTAL N°13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2024.**

Cordial saludo,

En relación con el contrato de obra No. 0756-23, concerniente a la construcción y dotación del comedor y cocina del Instituto Técnico Superior Industrial en el Distrito de Barrancabermeja. Me dirijo a usted en calidad de INTERVENTOR, con el fin de expresar mi preocupación por la demora en la entrega del Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Ambiental N°13, el cual debía ser entregado a la Interventoría el 5 de abril de 2024.

Dado que esta fecha límite ha pasado y aún no hemos recibido el informe mencionado, se solicita formalmente su pronta entrega. Como es de su conocimiento, estos informes son fundamentales para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y ambientales pertinentes.

La demora en la entrega de este informe no solo afecta la relación con la Interventoría, sino que también puede tener consecuencias en términos de cumplimiento normativo y seguridad de nuestros colaboradores. Por lo tanto, le insto a que tome las medidas necesarias para finalizar y entregar el Informe SST y Ambiental N°13 en la mayor brevedad posible.

Cordialmente.

LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R/L UT. INTERCOMEDOR ITSI

Carrera 22 No.52B-60 EDIFICIO GLAYA APTO 101 Barrio Torcoroma
Celular 314 412 1030, E-mail: fmcconstructoresltda@gmail.com
Barrancabermeja - Santander

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

0354-WR-2024

Bogotá, 08 de abril de 2024

0076-0756-BARRANCA

Señores
Alcaldía de Barrancabermeja
Área jurídica

Interventoría

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

ASUNTO: RADICACION POLIZAS PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia nos permitimos radicar las pólizas actualizadas a la prorroga al contrato de obra

Anexo:

- POLIZA RCE ANEXO 5
- POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 6

Quedamos atentos a la respuesta.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

0355-WR-2024

Bogotá, 08 de abril de 2024

0077-0756-BARRANCA

Señores
Alcaldía de Barrancabermeja
Área jurídica

Interventoría

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

ASUNTO: RADICACIÓN FICHA TÉCNICA EQUIPO RCI

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia nos permitimos radicar la ficha técnica equipo RCI para revisión y aprobación, quedamos atentos a cualquier requerimiento.

ANEXO

- Ficha tecnica Equipo Preensamblado No. 400-0381

Quedamos atentos a la respuesta.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

0410-WR-2024

Bogotá, 23 de abril de 2024

0080-0756-BARRANCA

COMUNIDAD
INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL
RECTORIA

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

ASUNTO: PROGRAMACIÒN TRABAJOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS

De acuerdo en la reunión realizada el día 22 de abril del 2024 y dando cumplimiento al contrato en referencia, se socializaron las actividades de conexión al tablero eléctrico principal de la institución para poder energizar el comedor escolar. Para dicha actividad es necesario que el área de las canchas polideportivas no estén en funcionamiento ya que se va a hacer rotura y demolición del andén en concreto para instalación de ductos y cableado eléctrico.
Dichos trabajos se realizarán desde el viernes 26 de abril al 29 de abril del 2024. Por favor hacer la debida gestión y divulgación con el personal de seguridad de la institución.

Área por intervenir:



Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

5.7. CERTIFICADO MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS

ASEOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA ASSEAR S.A.S
NIT. 900.346.265-5

CERTIFICA

Que prestamos el servicio de aseo y mantenimiento de baños portátiles a la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** identificada con el NIT **901109885-1**, según el siguiente detalle:

Periodo de Servicio	Detalle	Cantidad de USP's	Litros vertidos
ABRIL 2024	**BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y ZONAS ALEDAÑAS**	**2**	**360**

Las aguas residuales fueron el resultado del mantenimiento a **2** unidad(es) sanitaria(s) portátil(es) (USP) ubicada(s) en **INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL** , a la(s) que se le realizaron **18** aseos durante el periodo informado, los residuos obtenidos fueron vertidos y tratados en la planta de tratamiento de la empresa **PURIFICACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES SAS PURIFIC**, quienes cuentan con autorización de la CAS según Resolución DGL No. 000588 de julio de 2023. Adjunto encontraran el certificado de tratamiento de residuos, la certificación emitida por **PURIFIC SAS**

Dada en Barrancabermeja a los 05 días del mes de mayo de 2024.

DIANA CAROLINA CAMACHO GUZMÁN
Coordinador de Operaciones
ASSEAR S.A.S

La información consignada en el presente documento puede ser confirmada al teléfono 3138849291 – 3017870248 o al correo electrónico: operaciones@assear.com

OFICINA BARRANCABERMEJA
Km 1. 8 Vía Retén - Aereopuerto Yariguies
Tel: 607 6 02 04 20 - 313 884 92 91

5.8. INFORME TÉCNICO DE OBRA

INFORME DE OBRA Nro.14

"CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA."



CONTRATO DE OBRA No. 0756-23

INFORME DE OBRA Nro.14

PERIODO DE EJECUCIÓN

06 DE ABRIL DE 2024 – 03 DE MAYO DE 2024

VERSIÓN 1

VOLUMEN 1-1

ORIGINAL

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. INFORMACION DEL PROYECTO 4
2.1. Localización del proyecto 4
2.2. Características técnicas del proyecto y alcance 5
2.3. CONTRATO SUSCRITO 6
2.3.1. Contrato de Obra No. 0756-23 6
2.3.2. Objeto del Contrato 6
2.3.3. Contratista 6
2.4. Plazo del Contrato 6
2.5. Valor de la inversión 6
3. CONTROL DE POLIZAS 7
3.1. Pólizas WRUSSY INGENIEROS SAS 7
4. CONTROL DE RECUSOS 7
4.1. Personal involucrado en el proyecto 7
4.2. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 8
5. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO CONTRATISTA 8
5.1. Actividades realizadas en el periodo mantenimiento 8
6. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINSTRATIVO 9
6.1. Contrato o modificaciones Suscritas 9
6.2. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 10
6.2.1. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 10
6.3. ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO. 10
6.3.1. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA. 10
6.3.2. OTRAS ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO 10
7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 10

1. INTRODUCCIÓN

La Institución educativa Instituto Técnico Superior Industrial - ITSI en el Distrito de Barrancabermeja, busca facilitar el desarrollo integral y el mejoramiento del impacto en el sistema educativo para los estudiantes de la sede principal de la institución, mediante la demolición de la actual cafetería y la construcción del área que cumpla las veces de cafetería y comedor escolar, cumpliendo con las condiciones básicas propuestas en la normativa sanitaria vigente: resolución 2674 de 2013, NTC 4595 y 4596, en las cuales se establece los requisitos y parámetros del diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo, analizando los diagnósticos de infraestructura frente a la existencia, calidad y acceso a los servicios públicos y condiciones de dotación de equipos y menaje en el comedor. Todo esto con el fin de dar inclusión a la promoción y ampliación de cobertura de programas de alimentación que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, para mantener sus niveles de atención, aumentar el porcentaje de permanencia escolar, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje.

Por lo anterior, se hace necesario iniciar proceso de selección de contratistas, para llevar a cabo la CONTRUCCION Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

Es por eso por lo que se decide abrir el proceso de contratación Licitación pública LPO-015-2022, para la construcción anteriormente mencionada.

De esta rigurosa selección de proponentes, se adjudicó el contrato; a la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** identificado con **NIT:901.109.885-1,** para celebrar el contrato el día 23 de febrero de 2023.

Así las cosas; y siguiendo con las exigencias de la interventoría del contrato, presentamos el informe de obra Nro.14 correspondiente con fecha desde el 06 DE ABRIL DE 2024 – 03 DE MAYO DE 2024, el presente informe contiene el resumen de las actividades realizadas para el desarrollo de la obra de “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.", cuya oferta comercial es por valor de $3.684.062.560,88 y su culminación está prevista para el 5 de marzo de 2024

2. INFORMACION DEL PROYECTO


2.1. Localización del proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en Cra. 28 # 55-10, Barrancabermeja, Santander, en el INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL (ITSI)

MICROLOCALIZACIÓN



MACROLOCALIZACIÓN

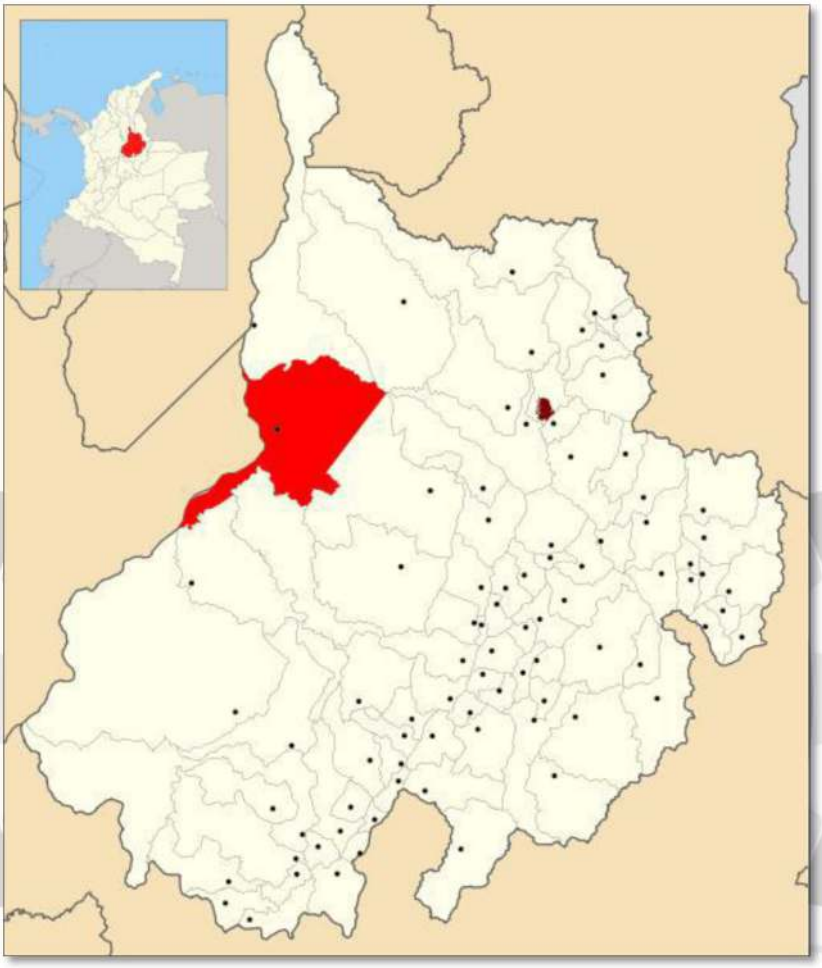

2.2. Características técnicas del proyecto y alcance

Para la ejecución del contrato 0756-23, cuyo objeto es "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" se contempló construir un comedor escolar que garantice la promoción y ampliación de la cobertura de programas de alimentación escolar que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes pertenecientes a la sede principal del Instituto Técnico Superior Industrial – ITSI, para que, por medio del suministro de un complemento alimentario diario puedan mantener sus niveles de atención, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje. Fomentando así el derecho a la educación y asegurando las condiciones necesarias para su acceso,

permanencia y culminación del proceso educativo construir un comedor escolar que garantice la promoción y ampliación de la cobertura de programas de alimentación escolar que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes pertenecientes a la sede principal del Instituto Técnico Superior Industrial – ITSI para que, por medio del suministro de un complemento alimentario diario puedan mantener sus niveles de atención, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje. Fomentando así el derecho a la educación y asegurando las condiciones necesarias para su acceso, permanencia y culminación del proceso educativo.

2.3. CONTRATO SUSCRITO

2.3.1. Contrato de Obra No. 0756-23

2.3.2. Objeto del Contrato

El objeto del Contrato de Obra es: "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA."

2.3.3. Contratista

El contratista es WRUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT: 901.109.885-1

2.4. Plazo del Contrato

El plazo inicial para la realización del objeto del Contrato de Obra es de doce (12) meses, teniendo una fecha de inicio de 6 de marzo de 2023 y una fecha de finalización de 5 de marzo de 2024.Se tramito ante la secretaria de infraestructura una solicitud de adición en tiempo por 30 días, la cual fue aprobada el día 28 de febrero del 2024 y empezó a regir a partir del día 5 de marzo del 2024.

2.5. Valor de la inversión

El valor para invertir es de: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE **($ 3.684.062.560,88)**

3. CONTROL DE POLIZAS

3.1. Pólizas WRUSSY INGENIEROS SAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato

CONTRATO 0756-23

TABLA 6. POLIZAS SEGÚN FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA

Póliza de cumplimiento	11-44-101198726		
Póliza de Resp. civil Extracontractual	11-40-101051776		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO		
Fecha de expedición:	30 de marzo de 2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha inicial	fecha final	
Cumplimiento de Contrato	*06/03/2023*	*05/08/2024*	$736.812.513,00
Salarios y prestaciones sociales	*06/03/2023*	*05/04/2027*	$368.406.257,00
Estabilidad de la obra	*Si ampara 5 años, o meses y 1 días*		$736.812.513,00
Responsabilidad civil extracontractual	*06/03/2023*	*05/04/2024*	$520.000.000,00

4. CONTROL DE RECUSOS

4.1. Personal involucrado en el proyecto

Para el desarrollo del compromiso contractual, la empresa WRUSSY INGENIEROS SAS cuenta con el siguiente personal de apoyo profesional y operativo de obra:

TABLA No.2. PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL Y OPERATIVO

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO DEL TRABAJADOR
Wilver Franciny Russy Ladino	Director de Obra
Cesar Orlando Narvaez Quiñonez	Residente de Obra
Carlos Alberto Oviedo Chavarro	Profesional eléctrico
Yesenia Alvarez Acosta	Profesional Social
Sandra Milena Santiago Camacho	Apoyo SST
Antonio Jose Carvallido Carpio	Ayudante de obra
Elvis Carpio Peñaloza	Ayudante de obra
Elkin Reyes Serrano	Ayudante de obra
Yerson Martinez Carrasquilla	Guarda de seguridad

4.2. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

Para el desarrollo del compromiso contractual, se cuenta con la siguiente maquinaria y/o equipos:

TABLA No.3. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

EQUIPO/HERRAMIENTA	CANTIDAD
Herramienta menor	12
Pulidora 7"	2
Vibrador de concreto	2
Motobomba	1

5. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO CONTRATISTA

5.1. Actividades realizadas en el periodo mantenimiento

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo:

- Instalación de cielo raso en PVC en el área de la cocina y locales.
- Aplicación de boquilla en los enchapes de muro.
- Aplicación de estuco en muros de mampostería externo y locales.
- Aplicación de primera mano de pintura en muros de mampostería exterior.
- Cambio de tubería en el área de cuarto de aseo y cuarto de bombas.
- Construcción de buitrones para los bajantes de agua lluvia.
- Construcción de dinteles para cielo raso.
- Se realiza corte y demolición de anden en concreto para instalación de ductos y cableado eléctrico.

- Aplicación de SIKAFILL para alfajías y muro perimetral de la placa de entrepiso.

6. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINSTRATIVO

6.1. Contrato o modificaciones Suscritas

CONTRATOS Y/O MODIFICACIONES

FECHA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA
23 de febrero de 2023	CONTRATO 0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
06 de febrero de 2023	ACTA DE INICIO	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
28 de Agosto de 2023	ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS #1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
29 de Agosto de 2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS #1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
11 de Septiembre de 2023	ACTA PARCIAL No.1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
13 de Septiembre del 2023	ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
21 de Septiembre del 2023	ACTA ACLARATORIA N°2 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
24 de Octubre del 2023	ACTA PARCIAL No.2	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
27 de Octubre del 2023	ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
19 de Diciembre del 2023	ACTA PARCIAL No.3	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
20 de Diciembre del 2023	ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
26 de Diciembre del 2022	ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No.02	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
27 de Diciembre del 2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS #2	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
15 de Febrero del 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS #3	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
28 de Febrero del 2024	ADICIONAL No.01 EN PLAZO EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
04 de Abril del 2024	ADICIONAL No.02 EN PLAZO EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
03 de Mayo del 2024	ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S

6.2. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

6.2.1. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

A la fecha del presente informe no se tramitaron actas de recibo parcial.

6.3. ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO.

6.3.1. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.

En el periodo de tiempo que comprende este informe, no se tramitaron actas de modificación de ajuste en mayor y menor cantidad de obra.

6.3.2. OTRAS ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO

En el periodo de tiempo que comprende este informe, se realizó suspensión del contrato de obra desde el día 3 de mayo del 2024 por un periodo de 25 días calendario.

7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- Para el periodo comprendido en este informe se realizó la rotura de anden en concreto para terminar la conexión de la acometida eléctrica del proyecto.
- Se termina la instalación del cielo raso en pvc en el área de preparación mixta, servicio al cliente, bodegas, oficina administración y locales 1 y 2.
- Durante el periodo de tiempo que comprende este informe, se realiza suspensión al contrato de obra e interventoría el dia 3 de mayo del 2024 por 25 días calendario, dado a que el adicional en tiempo y en dinero solicitado no ha sido aprobado y por ende las actividades que se deben ejecutar dependen de dicho adicional.



ING.WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal
WRUSSY INGENIEROS SAS NIT:901.109.885-1

5.9. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS	CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	INDEPENDIENTE	15	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	Y	18/04/2024	76122338	$194.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	194.900				194.900	0	0	194.900			1.949	194.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	194.900	194.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	194.900	194.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	INDEPENDIENTE	15	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	Y	18/04/2024	76122338	$194.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80212380	RUSSY LADINO WILVER FRANCINY	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.800.000	5	194.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-04-12, 03:26:05 p. m. **Tipo Planilla** **Número Planilla** 69748152

Periodo Cotización 202403 **Periodo Servicio** 202404

PAGADA 2024-04-12 10:15:53.0

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GESTIONAR SEGUROS DPT SAS				
Documento	NI 901430089	**Dirección**	CR 14 #49 - 62		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6019376		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	13
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	PENALOZA TRESPALACIOS DENISE	**Identificación**	CC 63470474		

. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 91443072		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					TILANO NAVARRO EDWIN FERNEY	68001000 - 68		SANTANDER

I. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | |

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS	CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	18/04/2024	76159224	$2.092.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	131.200	0		0		0	0	0	0	131.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	87.200	0		0		0	0	0	0	87.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	524.700	0	0	0	0	0	0		524.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	556.800	0	0	0	0	0	0		556.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	470.600				470.600	0	0	470.600			4.706	470.600	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	270.400	0	0	270.400	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	270.400	270.400
Pensión	2	1.081.500	1.081.500
Riesgos Laborales	1	470.600	470.600
CCF	1	270.400	270.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.092.900	2.092.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	18/04/2024	76159224	$2.092.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096226349	ALVAREZ MORALES YESENIA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF38	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1098754093	NARVAEZ QUIÑONEZ CESAR ORLANDO	1	0			S																	230201	3.279.000	524.700	0	0	0	0	EPS010	3.279.000	131.200	14-11	3.279.000	5	228.300	CCF38	3.279.000	131.200	0	0	0	0	0
3	CC	37712004	SANTIAGO CAMACHO SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	2.180.000	348.800	0	0	0	0	EPS017	2.180.000	87.200	14-11	2.180.000	5	151.800	CCF38	2.180.000	87.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO		Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	15/04/2024	76180845	$2.305.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	97.600	0		0		0	0	0	0	97.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	193.800	0		0		0	0	0	0	193.800	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	390.400	0	0	0	0	0	0		390.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	346.700	0	0	0	0	0	0		346.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	428.100	0	0	0	0	0	0		428.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	507.000				507.000	0	0	507.000			5.070	507.000	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	341.400	0	0	341.400	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	291.400	291.400
Pensión	3	1.165.200	1.165.200
Riesgos Laborales	1	507.000	507.000
CCF	1	341.400	341.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.305.000	2.305.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO		Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	15/04/2024	76180845	$2.305.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096212001	CARPIO PEÑALOZA ELVIS	1	0			S		X															230301	1.170.000	187.200	0	0	0	0	EPS037	1.170.000	46.800	14-11	1.170.000	5	81.500	CCF38	1.796.587	71.900	0	0	0	0	0
2	CC	1096218748	REYES SERRANO ELKIN FERNANDO	1	0			S								X									230201	2.439.922	390.400	0	0	0	0	EPS005	2.439.922	97.600	14-11	2.439.922	5	169.900	CCF38	2.439.922	97.600	0	0	0	0	0
3	CC	1096242479	CARVALLIDO CARPIO ANTONIO JOSE	1	0			S		X															230301	996.667	159.500	0	0	0	0	EPS037	996.667	39.900	14-11	996.667	5	69.400	CCF38	1.618.090	64.800	0	0	0	0	0
4	CC	88217901	MARTINEZ CARRASQUILLA YERSON	1	0			S								X									25-14	2.675.266	428.100	0	0	0	0	EPS037	2.675.266	107.100	14-11	2.675.266	5	186.200	CCF38	2.675.266	107.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79650148
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO OVIEDO CHAVARRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 8F #79-94	TELÉFONO:	4111513
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7921735914**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril	AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/05/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	624974351

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES											
																												PENSIÓN									SALUD								ARP																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 79650148	OVIEDO CHAVARRO CARLOS ALBERTO	INDEPEND		$ 1.300.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 370.500**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	RIESGO 5	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	18/04/2024	76159219	$2.303.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	177.600	0		0		0	0	0	0	177.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	710.100	0	0	0	0	0	0		710.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	517.700				517.700	0	0	517.700			5.177	517.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	297.600	0	0	297.600	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	297.600	297.600
Pensión	2	1.190.100	1.190.100
Riesgos Laborales	1	517.700	517.700
CCF	1	297.600	297.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.303.000	2.303.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	RIESGO 5	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	18/04/2024	76159219	$2.303.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1049650740	ROMERO SUESCA DANIEL SANTIAGO	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
2	CC	1057588784	SALAMANCA ROJAS KAREN LISSETH	1	0			S																	230301	4.437.580	710.100	0	0	0	0	EPS005	4.437.580	177.600	14-11	4.437.580	5	308.900	CCF24	4.437.580	177.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

5.10. INFORME HSE DE OBRA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**


INFORME SST 14

PERIODO: 06 ABRIL 2024 - 05 MAYO 2024

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

Elaboró:



KAREN SALAMANCA ROJAS
WRUSSY INGENIEROS SAS

Revisó y Aprobó:



WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
WRUSSY INGENIEROS SAS

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 4

1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 4

2. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE CONTINGENCIAS. 4

2.1. PROGRAMA D1: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 4

2.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 5

2.1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7

2.2. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 11

2.2.1. PROCEDIMIENTOS DE ALTO RIESGO 11

2.2.2. INSPECCIONES 11

2.2.3. ACCIDENTALIDAD 12

2.2.4. BRIGADAS DE EMERGENCIAS 12

2.2.5. INDICADORES 12

3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID-19 17

4. CONCLUSIONES 18

LISTA DE ILUSTRACIONES

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps. 4

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Personal 5
Tabla 2. Programación Charlas 9
Tabla 3. Programación Pausas activas 10
Tabla 4. COPASST 11
Tabla 5. CCL 11
Tabla 6. Permisos de trabajo 11
Tabla 7. Programación inspecciones 12
Tabla 8. Brigada de emergencias 12

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se ejecutará en la ciudad de Barrancabermeja en la dirección Cra. 28 # 55-10, como se evidencia en la ilustración N 1.

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps.



Fuente: https://www.google.com/maps/

1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CORREO ELECTRÓNICO: proyectos@wrussyingenieros.com
OFICINA: DIRECCIÓN: Calle 8f # 79- 94 Bogotá D.C.
Contrato de Obra No. 0756-23
Objeto: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

2. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE CONTINGENCIAS.

2.1. PROGRAMA D1: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Este capítulo, está enmarcado al contexto del contrato **No. 0756-23** evidenciando las actividades ejecutadas de Seguridad y Salud en el Trabajo, derivados del desarrollo de los trabajos en obra, de igual forma, dando cumplimiento a los parámetros de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el contrato.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** realizó todas las actividades que se establecieron en el cronograma en el periodo comprendido del **06 de abril 2024 al 05 mayo de 2024**, entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes: (identificación de riesgos en el centro de trabajo mediante la matriz de identificación de peligros, inspecciones de seguridad, inspección de orden y aseo, entrega de elementos de protección personal, charlas, pausas activas, capacitaciones, entre otras).

Dando cumplimiento al contrato en mención a continuación se relacionan todas las actividades que se han realizado en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2.1.1.1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL PERSONAL MÍNIMO

Personal para la ejecución del contrato No. 0756-23

En la tabla 1, se relaciona el personal que ejecutó actividades durante el periodo **06 de abril 2024 al 05 mayo de 2024,** del cual hicieron parte: técnicos, profesionales, tecnólogos, ayudantes que realizaron labores dentro del contrato No. 0756-23.

Tabla 1. Personal

DATOS PERSONALES					
NOMBRE Y APELLIDOS	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE EGRESO**	**ESTADO**
WILVER RUSSY LADINO	80.212.380	DIRECTOR DE OBRA	6/03/2023		**ACTIVO**
KAREN SALAMANCA ROJAS	1.057.588.784	RESIDENTE HSEQ	06/03/2023		**ACTIVO**
CESAR ORLANDO NARVAEZ QUIÑONEZ	1,098,754,093	RESIDENTE DE OBRA	09/03/2023		**ACTIVO**
SANDRA MILENA SANTIAGO CAMACHO	37,712,004	INSPECTOR HSE	15/03/2023		**ACTIVO**
YESENIA ALVAREZ MORALES	1,096,226,349	PROFESIONAL SOCIAL	09/03/2023		**ACTIVO**
ANTONIO JOSE CARVALLIDO CARPIO	1,096,242,479	AYUDANTE DE OBRA	6/03/2023	23/03/2024	**INACTIVO**
HECTOR JULIO ESCOBAR SAAVEDRA	91,425,553	AYUDANTE DE OBRA	6/03/2023	31/01/2024	**INACTIVO**

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1

INFORME MENSUAL

ALVEIRO CARPIO PEÑALOZA	1,042,211,689	AYUDANTE DE OBRA	6/03/2023	31/01/2024	**INACTIVO**
ELVIS CARPIO PEÑALOZA	1,096,212,001	AYUDANTE DE OBRA	7/03/2023	27/032024	**INACTIVO**
ALEXANDER JIMENEZ SANTAMARIA	13,565,252	AYUDANTE DE OBRA	7/03/2023	29/02/2024	**INACTIVO**
ALFONSO VERGARA	78.323.568	MAESTRO DE OBRA	23/05/2023	30/11/2023	**INACTIVO**
BRAYAN COSSIO	1.042.214.936	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023	30/12/2023	**INACTIVO**
CARLOS RODRIGUEZ	1.096.204.338	AYUDANTE DE OBRA	26/05/2023	26/11/2023	**INACTIVO**
DOMINGO MORA	13.568.501	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023	31/01/2024	**INACTIVO**
ELKIN REYES	1.096.218.748	AYUDANTE DE OBRA	26/05/2023		**ACTIVO**
GUSTAVO BUITRAGO	1.005.179.912	AYUDANTE DE OBRA	26/05/2023	01/07/2023	**INACTIVO**
ISNARDO DE JESUS MORENO	1.096.248.874	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023	15/09/2023	**INACTIVO**
JAIR CARPIO	1.096.253.724	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023	30/12/2023	**INACTIVO**
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023	30/12/2023	**INACTIVO**
SIGILFREDO MENDEZ	13.569.557	OFICIAL DE OBRA	26/05/2023	09/12/2023	**INACTIVO**
ABELINO HOMERO MUÑOZ LOPEZ	94.265.684	OFICIAL DE OBRA	27/06/2023	29/02/2024	**INACTIVO**
MARIO FONTALVO PEREZ	8.572.679	AYUDANTE DE OBRA	05/07/2023	30/11/2023	**INACTIVO**
DEIBY CARPIO AGUDELO	1.001.814.868	AYUDANTE DE OBRA	16/08/2023	29/02/2024	**INACTIVO**
JOSE ANGEL PEÑALOZA LARIOS	1.050.918.199	AYUDANTE DE OBRA	16/08/2023	30/12/2023	**INACTIVO**
WILMAR ORTIZ MENDOZA	79.392.925	OFICIAL DE OBRA	16/08/2023	30/09/2023	**INACTIVO**
MANUEL ARTURO BANDERA	12.400.740	AYUDANTE DE OBRA	19/09/2023	30/11/2023	**INACTIVO**
JUAN MIGUEL PEREZ FERRER	8.572.227	AYUDANTE DE OBRA	19/09/2023	30/11/2023	**INACTIVO**
ANDRES APONTE BERGAÑO	1.016.093.871	INSTALADOR	26/09/2023	25/11/2023	**INACTIVO**
EDILBERTO LERMA SOTO	1.014.265.807	INSTALADOR	26/09/2023	25/11/2023	**INACTIVO**

RONNY REYES CISNEROS	1.235.891	INSTALADOR	26/09/2023	25/11/2023	INACTIVO
ALEXANDE ESCOBAR GUEVARA	77.159.168	INSTALADOR	21/10/2023	25/11/2023	INACTIVO
JUAN MANUEL HERAS DE LA HOZ	1.083.435.187	INSTALADOR	20/10/2023	25/11/2023	INACTIVO
YERSON MARTINEZ	88.217.901	VIGILANTE	20/11/2023		ACTIVO
ANGEL GOMEZ	1.002.322.043	INSTALADOR	02/01/2024		ACTIVO
CESAR CASTILLO	1.096.250.390	MAMPOSTERO	18/12/2023	31/12/2023	INACTIVO
EDGAR POLO	1.126.255.189	INSTALADOR	02/01/2024		ACTIVO
JAVIER ESPITIA	80.282.429	ARQUITECTO	02/01/2024		ACTIVO
JHON ZAMORA	1.096.228.666	MAMPOSTERO	18/12/2023	31/12/2023	INACTIVO
LUIS LIZCANO	3.132.569	INSTALADOR	02/01/2024		ACTIVO
WILLINTON ORTIZ	91.443.547	MAMPOSTERO	18/12/2023	31/12/2023	INACTIVO
YEISON NAVARRO	1.128.047.356	MAMPOSTERO	18/12/2023	31/12/2023	INACTIVO
ANTONIO GUIO	80.770.814	DISPROARQ	24/01/2024	06/02/2024	INACTIVO
DANILO NOVA FORERO	1.005.179.957	GAS LOGISTICA DE LA NACIÓN	19/01/2024		ACTIVO
DAVID ZAMBRANO	9.142.543	ENCHAPES	31/01/2024		ACTIVO
DIOMEDES GARCIA	7.997.109	ENCHAPES	01/02/2024		ACTIVO
EDWARD SARMIENTO	1.018.498.751	DISPROARQ	24/01/2024	06/02/2024	INACTIVO
EDWIN TILANO	91.443.072	ENCHAPES	31/01/2024		ACTIVO
HECTOR ACOSTA	8.695.125	SOLDADOR	11/01/2024	20/01/2024	INACTIVO

2.1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, presentamos la gestión de seguridad y salud en el trabajo que se llevó a cabo en la ejecución del contrato entre el periodo del 06 de abril 2024 al 05 mayo de 2024.

2.1.2.1. INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizó inducción de seguridad y salud en el trabajo donde se explicó al personal los siguientes temas:

- ✓ Entrega de la funciones y responsabilidades del cargo a desempeñar
- ✓ Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
- ✓ AFP-EPS-ARL-CCF
- ✓ Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG SST)
- ✓ Se da a conocer a los trabajadores, los riesgos a los cuales están expuestos en sus labores diarias.

- ✓ Riesgo Biomecánico: manipulación de cargas, esfuerzo, movimiento repetitivo.
- ✓ Riesgo físico: ruido, vibración, iluminación.
- ✓ Riesgo químico: líquidos (nieblas y humos) polvos orgánicos e inorgánicos.
- ✓ Riesgo mecánico: peligro de Izaje y cargas suspendidas, peligro de proyección de partículas.
- ✓ Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
- ✓ Procedimiento reporte de accidente de trabajo.
- ✓ RIT (Reglamento Interno de Trabajo)
  - Son obligaciones especiales del trabajador
  - Son obligaciones de los trabajadores con el uso de EPP del SG SST
  - Prohibiciones de los trabajadores
- ✓ Política de Seguridad y salud en el trabajo y reglamento de higiene y seguridad industrial.
- ✓ PTS (procedimientos seguros) para tareas de alto riesgo.
- ✓ Que es el comité de convivencia laboral
- ✓ Que el COPASST

Para constancia de la inducción se anexan los siguientes registros:

ANEXO 1: Entrega individual EPP

2.1.2.2. DOCUMENTACION Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

La documentación del personal que ejecuto actividades dentro del 06 de abril 2024 al 05 mayo de 2024 y las planillas de seguridad social se encuentran en el **ANEXO 2.**

2.1.2.3. CHARLAS DE SEGURIDAD

Las charlas de 5 minutos se realizaron antes de iniciar la jornada laboral, estas se realizan el objetivo de informar y sensibilizar a los trabajadores sobre su seguridad y salud en las actividades que ejecutan diariamente. En el periodo del 06 de abril 2024 al 05 mayo de 2024 se programaron 24 charlas y se ejecutaron 24, cumpliendo con un porcentaje del **100 %.**

Tabla 2. Programación Charlas

PROGRAMACIÓN CHARLAS DE SEGURIDAD					
Fecha Programada	**Fecha Ejecutada**	**Cumple/No cumple**	**TEMA**	**Ejecutadas**	**% Cumplimiento**
06/04/2024	06/04/2024	CUMPLE	Mantener alerta a los trabajadores	1	100%
08/04/2024	08/04/2024	CUMPLE	Golpe de calor	1	100%
09/04/2024	09/04/2024	CUMPLE	Seguridad eléctrica	1	100%
10/04/2024	10/04/2024	CUMPLE	Seguridad con los EPP	1	100%
11/04/2024	11/04/2024	CUMPLE	La unión hace la fuerza	1	100%
12/04/2024	12/04/2024	CUMPLE	Conservemos lo que tenemos	1	100%
13/04/2024	13/04/2024	CUMPLE	Como prevenir el estrés por calor	1	100%
15/04/2024	15/04/2024	CUMPLE	Los accidentes no son casuales	1	100%
16/04/2024	16/04/2024	CUMPLE	Trabaje correctamente	1	100%
17/04/2024	17/04/2024	CUMPLE	Por qué tenemos un programa de seguridad	1	100%
18/04/2024	18/04/2024	CUMPLE	Los accidentes son casuales	1	100%
19/04/2024	19/04/2024	CUMPLE	Inspecciones	1	100%
20/04/2024	20/04/2024	CUMPLE	Cuidado de la piel	1	100%
22/04/2024	22/04/2024	CUMPLE	Las manos	1	100%
23/04/2024	23/04/2024	CUMPLE	Objetos que caen	1	100%
24/04/2024	24/04/2024	CUMPLE	Todo es cuestión de actitud	1	100%
25/04/2024	25/04/2024	CUMPLE	Los colores hablan	1	100%
26/04/2024	26/04/2024	CUMPLE	Inspecciones	1	100%
27/04/2024	27/04/2024	CUMPLE	Trabajos eléctricos	1	100%
29/04/2024	29/04/2024	CUMPLE	Medio ambiente	1	100%
30/04/2024	30/04/2024	CUMPLE	Las 10 reglas que salvan vidas	1	100%
01/05/2024	01/05/2024	CUMPLE	Excavaciones	1	100%
02/05/2024	02/05/2024	CUMPLE	Caídas a nivel de suelo	1	100%
03/05/2024	03/05/2024	CUMPLE	Riesgo eléctrico	1	100%
				24	**100 %**

ANEXO 3: Asistencia charlas de seguridad

2.1.2.4. PAUSAS ACTIVAS

Se realizaron las pausas activas durante la jornada laboral con el fin de revitalizar la energía corporal y refrescar la mente de los trabajadores. De acuerdo con el plan de trabajo se tiene programado que las pausas activas se deben realizar todos los

días laborales, donde en periodo se ejecutaron 24 pausas activas teniendo un porcentaje de cumplimiento del **100%.**

Tabla 3. Programación Pausas activas

PROGRAMACIÓN CHARLAS DE SEGURIDAD					
Fecha Programada	**Fecha Ejecutada**	**Cumple/No cumple**	**Programadas**	**Ejecutadas**	**% Cumplimiento**
06/04/2024	06/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
08/04/2024	08/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
09/04/2024	09/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
10/04/2024	10/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
11/04/2024	11/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
12/04/2024	12/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
13/04/2024	13/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
15/04/2024	15/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
16/04/2024	16/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
17/04/2024	17/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
18/04/2024	18/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
19/04/2024	19/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
20/04/2024	20/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
22/04/2024	22/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
23/04/2024	23/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
24/04/2024	24/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
25/04/2024	25/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
26/04/2024	26/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
27/04/2024	27/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
29/04/2024	29/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
30/04/2024	30/04/2024	CUMPLE	1	1	100%
01/05/2024	01/05/2024	CUMPLE	1	1	100%
02/05/2024	02/05/2024	CUMPLE	1	1	100%
03/05/2024	03/05/2024	CUMPLE	1	1	100%
			24	24	**100%**

ANEXO 4: Asistencia Pausas Activas

2.1.2.5. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizó reunión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, se adjunta acta de reunión del vigía de seguridad y salud en el trabajo.

Tabla 4. COPASST

FECHA	TEMAS TRATADOS
30/04/2024	1. Qué es la electricidad

ANEXO 5: Acta de reunión Vigía seguridad y salud en el trabajo

2.1.2.6. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Se realizó la reunión del comité de convivencia laboral, cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, se adjunta acta de reunión del comité de convivencia laboral.

Tabla 5. CCL

FECHA	TEMAS TRATADOS
10/04/2022	1. El entorno empresarial

ANEXO 6: Acta de reunión Comité de convivencia Laboral.

2.2. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.2.1. PROCEDIMIENTOS DE ALTO RIESGO

El análisis seguro de trabajo (AST), es un proceso por el cual se identifican incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea y se elaboran procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de este. El Análisis de Seguridad en la Tarea (AST) tiene como finalidad realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de sus tareas dentro de la empresa.

Tabla 6. Permisos de trabajo

DOCUMENTO	CANTIDAD
ATS	3
Permiso en caliente	4

ANEXO 7 ATS-Permisos de trabajo.

2.2.2. INSPECCIONES

Las inspecciones de seguridad son una técnica analítica de seguridad que consiste en el análisis realizado mediante la observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos para identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos

en las áreas de trabajo. Para el periodo de **06 de abril 2024 al 05 mayo de 2024**, teniendo en cuenta las actividades ejecutadas en el mes.

Tabla 7. Programación inspecciones

INSPECCIÓN REALIZADA	CANTIDAD
Inspección botiquín	3
Inspección martillo eléctrico	1
Inspección herramientas manuales	5
Inspección pulidora	2

ANEXO 8: Inspecciones

2.2.3. ACCIDENTALIDAD

Durante el periodo del 06 de abril 2024 al 05 mayo de 2024, se presentaron dos accidentes laborales.

ANEXO 9: HSE-FOR-65 Accidentalidad.

2.2.4. BRIGADAS DE EMERGENCIAS

Se realiza reunión de la brigada de emergencias del proyecto.

Tabla 8. Brigada de emergencias

FECHA	TEMAS TRATADOS
19/04/2024	• Protocolo de evacuación

ANEXO 10: Reunión Brigada de Emergencias

2.2.5. INDICADORES

Se establecen los indicadores para dar cumplimiento a lo establecido en el plan de seguridad y salud en el trabajo.

- **FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD**

$$\mathrm{R} = \frac{\mathrm{No}\ Accidentes\ de\ trabajo\ en\ el\ mes}{\mathrm{No}\ \ de\ trabajadores\ en\ el\ mes} * 100$$

$$\mathrm{R} = \frac{0}{8} = 0\ \%$$

- **ÍNDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ dias\ incapacidad\ AT\ mes + \#\ días\ cargados\ en\ el\ mes}}{\boldsymbol{\#\ trabajadores\ en\ el\ mes}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{8}} = \mathbf{69}\ \%$$

En el periodo de **06 de abril 2024 al 05 mayo de 2024** se tuvo dos accidentes laborales.

- **ÍNDICE DE PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ ATmortalesen\ el\ año}}{\boldsymbol{\#\ AT\ en\ el\ año}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} = \mathbf{0}\ \%$$

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún accidente mortal.

- **INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ de\ casos\ nuevos\ de\ EL}}{\mathbf{Promedio\ de\ trabajadores}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} = \mathbf{0}\ \%$$

Durante la ejecución del proyecto no se ha presentado enfermedades laborales en los trabajadores.

- **ÍNDICE FRECUENCIA AUSENTISMO**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{días\ ausencia\ por\ incapacidad\ laboral}}{\mathbf{No\ días\ programados\ de\ trabajo\ en\ el\ mes}} * \mathbf{100}$$


$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{30}} = \mathbf{0}\ \%$$

En el periodo de 06 de abril 2024 al 05 mayo de 2024 no se presentó ausentismo laboral.

- **PAUSAS ACTIVAS**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{pausas\ activas\ Ejecutadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{pausas\ activas\ \ programadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{24}}{\mathbf{24}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

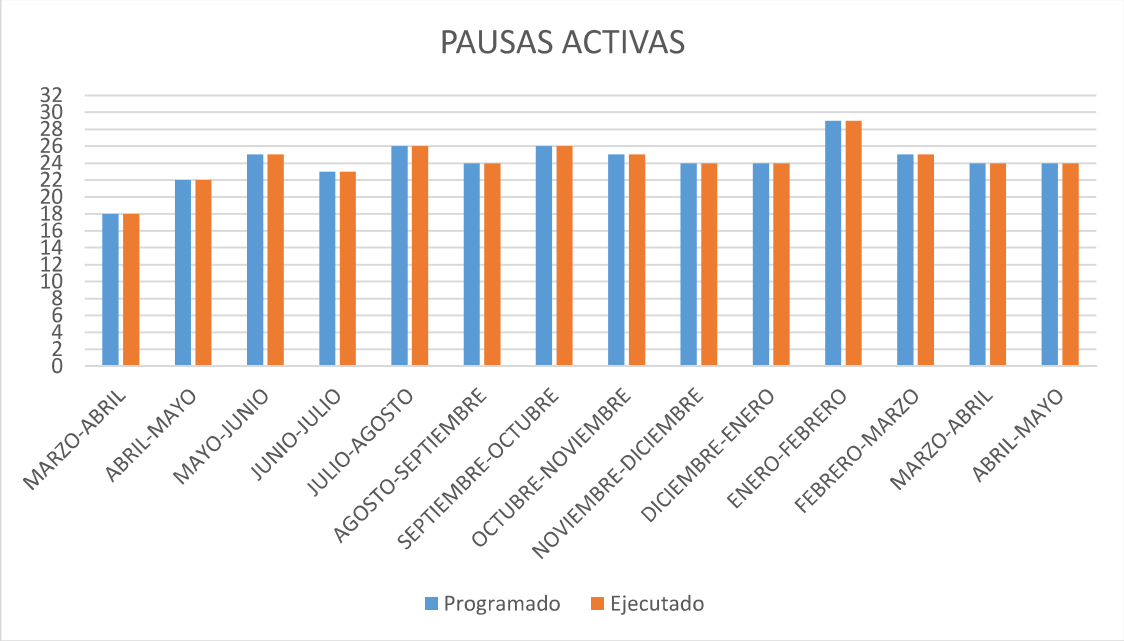


Se cumplió con el 100 % de las Pausas Activas Programadas para el periodo del 06 de abril 2024 al 05 mayo de 2024.

- **CHARLAS DE SEGURIDAD.**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Charlas\ de\ seguridad\ \ programadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Charlas\ de\ seguridad\ \ Ejecutadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{24}}{\mathbf{24}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

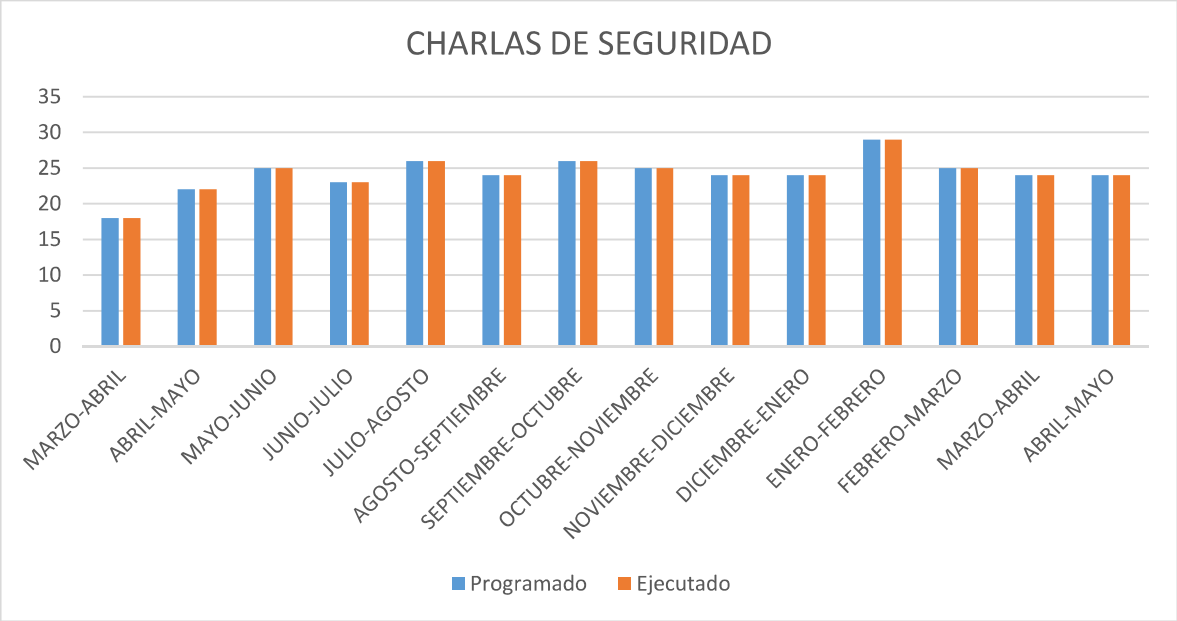


Se cumplió con el 100% de las Charlas de seguridad programadas para el periodo del 06 de abril 2024 al 05 mayo de 2024.

- **CCL.**

$$\mathbf{CCL} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ \ programadas}}{\mathbf{No}\ \ \boldsymbol{Reuniones\ \ ejeutadas}}$$


$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

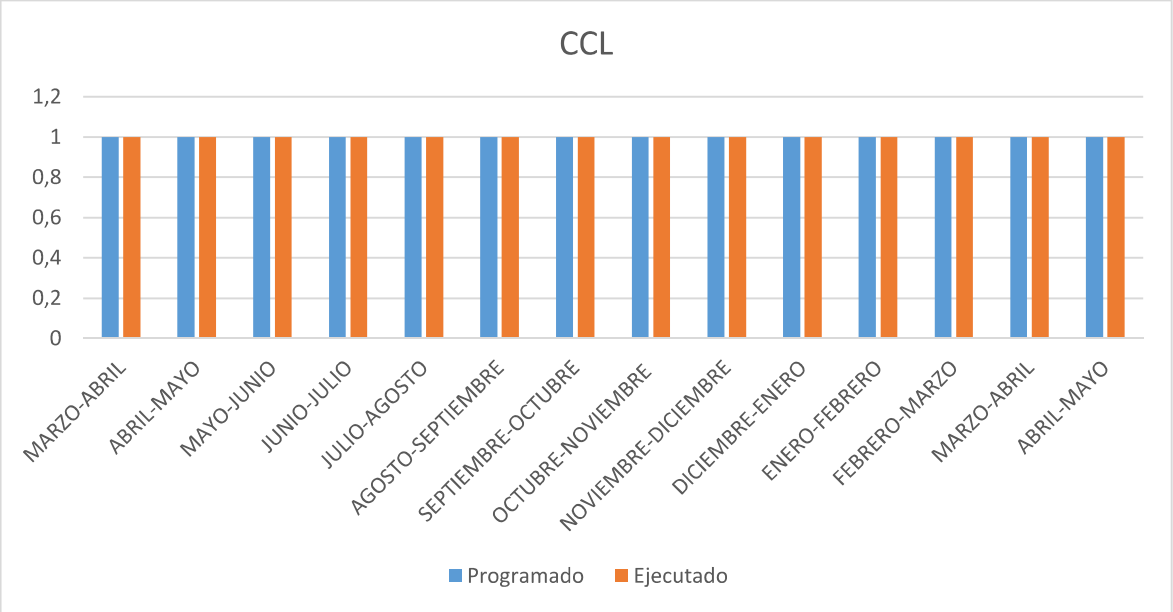

- **REUNIONES COPASST**

$$\textbf{COPASST} = \frac{\textbf{No } \boldsymbol{Reuniones\ programadas}}{\textbf{No } \boldsymbol{Reuniones\ ejeutadas}}$$


$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

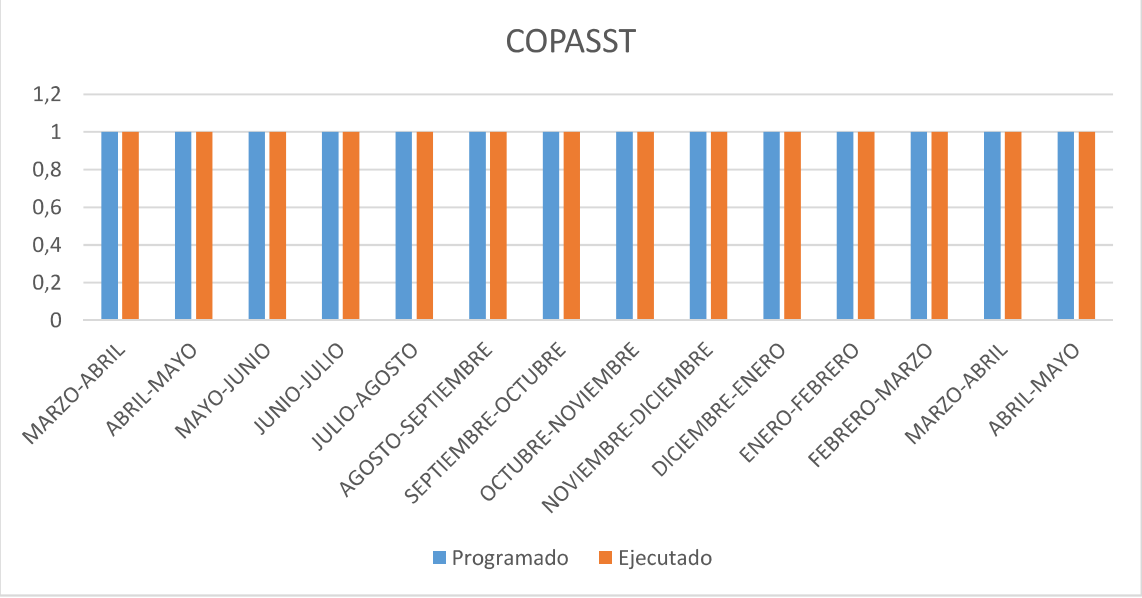

- **REUNIONES COE**

$$\mathbf{COE} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ programadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ ejeutadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

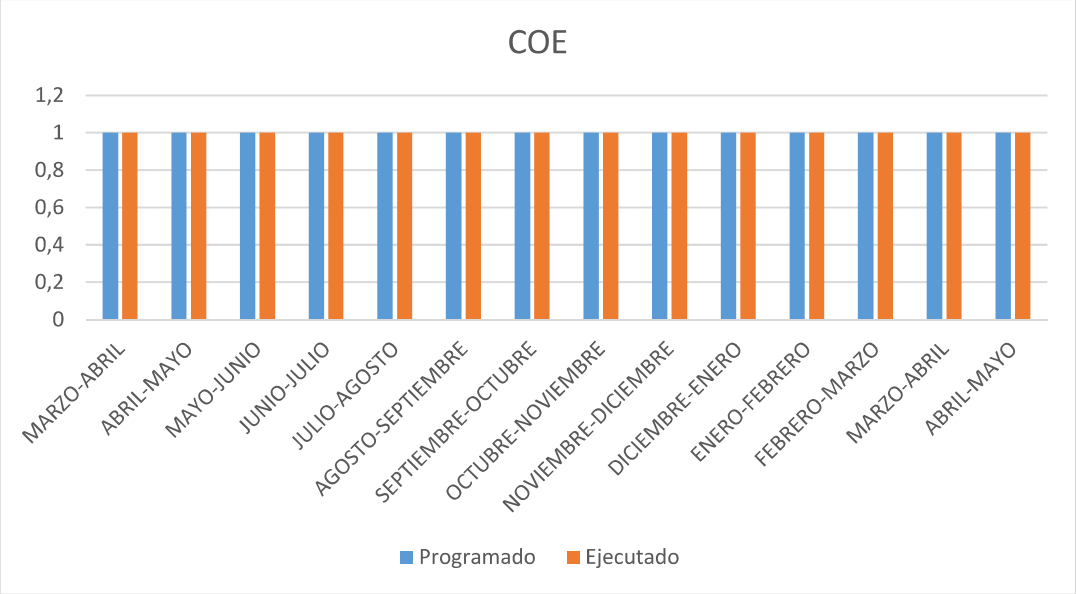

3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID-19

Debido a la pandemia que se presenta actualmente por el coronavirus COVID-19 y en cumplimiento a la circular conjunta 001 del 11 de mayo de 2020 expedida por Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio De Salud y Protección Social Y Ministerio Del Trabajo; a la circular conjunta 0000003 del 8 de mayo de 2020 expedida por el Ministerio De Salud y Protección Social, Ministerio De Trabajo y Ministerio De Transporte, al decreto 593 de 24 mayo de 2020, a la resolución 666 de 24 de mayo de 2020, al decreto 121 de 2020, a la Resolución 223 de 2021 y a la resolución 777 de 2021, entre otros, diariamente se realiza control a los trabajadores de su estado de salud mediante una encuesta para autorizar su ingreso a las instalaciones y se implementa el protocolo de bioseguridad a los trabajadores. En el **ANEXO 11** se encuentra los registros de la implementación del protocolo de bioseguridad PAPSO.

4. CONCLUSIONES

- Durante el periodo de **06 de abril 2024 al 05 mayo de 2024** se realizó la reunión de comité de Convivencia laboral.

- Durante el periodo de **06 de abril 2024 al 05 mayo de 2024** no se presentaron accidentes laborales.

- Se cumplió con los compromisos contractuales del contrato en el periodo del **06 de abril 2024 al 05 mayo de 2024.**

- Los trabajadores contaron con los elementos de protección personal y dotaciones de acuerdo con las exigencias de la obra en mención.

- Con la implementación del protocolo y la limpieza y desinfección de manos, herramientas y áreas, se tuvo control con los empleados en cuanto a la prevención y mitigación del contagio de COVID19.

ANEXO 1. ENTREGA DE EPP

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Elkin Reyes	CARGO: Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes Vaqueta	Elkin Reyes	21-03-24.		
2	Guantes Nitrilo	Elkin Reyes	10-04-24.		
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR: Elkin Reyes	CEDULA: 1096218743

RESPONSABLE

NOMBRE	Sandra Santiago	CEDULA No.	37712004
CARGO	Jefe SST	FIRMA	

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Elkin Reyes	CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes Vaqueta		1	24-04-24	
2	Gafas Oscuras.		1		
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	CEDULA:

RESPONSABLE

NOMBRE	Sandra Milena Santiago	CEDULA No.	37712004.
CARGO	Insp SST	FIRMA	

ANEXO 2. DOCUMENTACIÓN Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS	CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	INDEPENDIENTE	15	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	Y	18/04/2024	76122338	$194.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	194.900				194.900	0	0	194.900			1.949	194.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	194.900	194.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	194.900	194.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	INDEPENDIENTE	15	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	Y	18/04/2024	76122338	$194.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80212380	RUSSY LADINO WILVER FRANCINY	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.800.000	5	194.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-04-12, 03:26:05 p. m. **Tipo Planilla** **Número Planilla** 69748152

Periodo Cotización 202403 **Periodo Servicio** 202404

PAGADA 2024-04-12 10:15:53.0

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GESTIONAR SEGUROS DPT SAS				
Documento	NI 901430089	**Dirección**	CR 14 #49 - 62		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6019376		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	13
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	PENALOZA TRESPALACIOS DENISE	**Identificación**	CC 63470474		

. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 91443072		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					TILANO NAVARRO EDWIN FERNEY	68001000 - 68		SANTANDER

I. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | |

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS	CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	18/04/2024	76159224	$2.092.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	131.200	0		0		0	0	0	0	131.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	87.200	0		0		0	0	0	0	87.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	524.700	0	0	0	0	0	0		524.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	556.800	0	0	0	0	0	0		556.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	470.600				470.600	0	0	470.600			4.706	470.600	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	270.400	0	0	270.400	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	270.400	270.400
Pensión	2	1.081.500	1.081.500
Riesgos Laborales	1	470.600	470.600
CCF	1	270.400	270.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.092.900	2.092.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	18/04/2024	76159224	$2.092.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096226349	ALVAREZ MORALES YESENIA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF38	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1098754093	NARVAEZ QUIÑONEZ CESAR ORLANDO	1	0			S																	230201	3.279.000	524.700	0	0	0	0	EPS010	3.279.000	131.200	14-11	3.279.000	5	228.300	CCF38	3.279.000	131.200	0	0	0	0	0
3	CC	37712004	SANTIAGO CAMACHO SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	2.180.000	348.800	0	0	0	0	EPS017	2.180.000	87.200	14-11	2.180.000	5	151.800	CCF38	2.180.000	87.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO		Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	15/04/2024	76180845	$2.305.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	97.600	0		0		0	0	0	0	97.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	193.800	0		0		0	0	0	0	193.800	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	390.400	0	0	0	0	0	0		390.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	346.700	0	0	0	0	0	0		346.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	428.100	0	0	0	0	0	0		428.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	507.000				507.000	0	0	507.000			5.070	507.000	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	341.400	0	0	341.400	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	291.400	291.400
Pensión	3	1.165.200	1.165.200
Riesgos Laborales	1	507.000	507.000
CCF	1	341.400	341.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.305.000	2.305.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO		Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	15/04/2024	76180845	$2.305.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096212001	CARPIO PEÑALOZA ELVIS	1	0			S		X															230301	1.170.000	187.200	0	0	0	0	EPS037	1.170.000	46.800	14-11	1.170.000	5	81.500	CCF38	1.796.587	71.900	0	0	0	0	0
2	CC	1096218748	REYES SERRANO ELKIN FERNANDO	1	0			S								X									230201	2.439.922	390.400	0	0	0	0	EPS005	2.439.922	97.600	14-11	2.439.922	5	169.900	CCF38	2.439.922	97.600	0	0	0	0	0
3	CC	1096242479	CARVALLIDO CARPIO ANTONIO JOSE	1	0			S		X															230301	996.667	159.500	0	0	0	0	EPS037	996.667	39.900	14-11	996.667	5	69.400	CCF38	1.618.090	64.800	0	0	0	0	0
4	CC	88217901	MARTINEZ CARRASQUILLA YERSON	1	0			S								X									25-14	2.675.266	428.100	0	0	0	0	EPS037	2.675.266	107.100	14-11	2.675.266	5	186.200	CCF38	2.675.266	107.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79650148
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO OVIEDO CHAVARRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 8F #79-94	TELÉFONO:	4111513
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7921735914**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril	AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/05/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	624974351

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES											
																												PENSIÓN									SALUD								ARP																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 79650148	OVIEDO CHAVARRO CARLOS ALBERTO	INDEPEND		$ 1.300.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 370.500**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	RIESGO 5	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	18/04/2024	76159219	$2.303.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	177.600	0		0		0	0	0	0	177.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	710.100	0	0	0	0	0	0		710.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	517.700				517.700	0	0	517.700			5.177	517.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	297.600	0	0	297.600	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	297.600	297.600
Pensión	2	1.190.100	1.190.100
Riesgos Laborales	1	517.700	517.700
CCF	1	297.600	297.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.303.000	2.303.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	RIESGO 5	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	18/04/2024	76159219	$2.303.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1049650740	ROMERO SUESCA DANIEL SANTIAGO	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
2	CC	1057588784	SALAMANCA ROJAS KAREN LISSETH	1	0			S																	230301	4.437.580	710.100	0	0	0	0	EPS005	4.437.580	177.600	14-11	4.437.580	5	308.900	CCF24	4.437.580	177.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 3. CHARLAS DE SEGURIDAD

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

SABADO

CÓDIGO: FOR-HSE-76

VERSION 1

FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	06-04-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Mantener alerta a los trabajadores
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria: X | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	———	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	Cesar	WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	YERSON	WRUSSY
5	REYNALDO ALFONSO	OFICIAL	OFICIAL	Reynaldo Alfonso
6	FERNANDO		Fernando.	
7	ALBEIRO CARPIO	AYUDANTE	Albeiro	
8	JAVIER CANO	OFICIAL.	Javier Cano.	
9	Edwin Tilano	Edwin.		

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/06/2018

Fecha:	08-04-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Golpe de calor
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	Reynaldo	OFICIAL	Reynaldo	
6	Alvaro	Alvaro Corpio		
7	JAVIER CANO	OFICIAL		
8	FAUSTO FONSECA	OFICIAL.		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	09-04-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Seguridad electrica.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas electricas.

Charla Diaria ☐ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Capacitación ☐ Otro ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alv	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	Cesar N	WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	YERSON	WRUSSY
5	Fausto Fonseca OFI		Fausto F.	
6	Javier Lemo OFi			
	Reynoldo Alvarado OFi		Reynoldo Alvarado	
8	Alvaro C	Ayudante	Alvaro C	

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSIÓN 1
FECHA APROBACIÓN 01/08/2019

Fecha:	10-04-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Seguridad con los EPI
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (apoyo actual)

Charla Diaria: X | Entrenamiento: | Inducción: | Capacitación: | Otro:

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	CESAR	WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	YERSON	WRUSSY
5	Jairo Cano	OFI		
6	Fausto Fonseca	OF.		
7	Estevan Llano.	oficial		
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	11-04-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	la unión hace la fuerza.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria: X | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	12-04-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Conservemos lo que tenemos
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria: X | Entrenamiento: | Inducción: | Capacitación: | Otro:

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	(ESNARON)	WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	YERSON	WRUSSY
5	Javier Cano	OTI		
6	Fausto Fons.	OTI		
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S. SABADO.

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	13-04-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Como prevenir el estres x calor
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	YERSON	WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	15-04-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	los accidentes no son casuales
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausa activa)

Charla Diaria | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	16-04-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Trabaje correctamente
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	Jenifer Cano	Ofi		
6	Tenisto Fon.	Ofi		
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	17-04-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	porque tenemos un programa de seguridad (pausas activas)
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	Fausto Fonseca	Oficial		
6	Javier F Cano	OFI		
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	18-04-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	los accidentes no son casuales
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	Javier F Cano	OFI		
6	Fausto Fonseca	OFi		
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	19-04-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Inspecciones
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	20-04-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Cuidado de la piel
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	X	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	Javier Cano	OFI		
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	22-04-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Las manos
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
	b			

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	23-04-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Objetos que caen
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
	X			

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	Cesar Narvaez	WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	YERSON	WRUSSY
5	Javier Cano	OFI		
6				
7				
8				
