Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 02

"Contrato De Obra Pública No. 403 De 2023 – Pavimentación y embellecimiento de la diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte- Cundinamarca"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 413 DE 2023

"INTERVENTORÌA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ

17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023

RICAURTE – CUNDINAMARCA

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN 4

CAPITULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5

1.2 ALCANCE DEL PROYECTO 6

1.3 ASPECTOS TÉCNICOS 10

CAPITULO 2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 413-2023 11

2.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 11

2.1.1 GENERALIDADES 11

2.1.2 PERSONAL DE INTERVENTORÍA 12

2.1.3 EQUIPO DE INTERVENTORÍA 12

2.2 INFORMACIÓN FISICO FINANCIERA 12

2.2.1 BALANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA 12

2.2.2 GRAFICOS DEL VALOR PORCENTAJE DE LA INTERVENTORÍA 13

2.2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS Y CONTROL DE CALIDAD 14

CAPITULO 3. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 403-2023 15

3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 403-2023 15

3.1.1 GENERALIDADES 15

3.1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA 15

3.1.3 PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA 16

3.1.4 EQUIPO Y/O MAQUINARIA EN OBRA 16

3.2 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA 16

3.2.1 CANTIDADES DE TRABAJO REALIZADO Y CONTROL DE CALIDAD 16

3.2.2 ACTIVIDADES DE OBRA 17

3.3 INFORMACIÒN FISICO FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 23

3.3.1 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 23

3.3.2 VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA POR CAPITULOS 24

3.3.3 GRAFICAS DE VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA POR CAPITULOS 26

CAPITULO 4. AVANCE Y SEGUIMIENTO DE OBRA 27

4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 27

4.2 GRAFICOS EN VALOR Y PORCENTAJE DEL PROYECTO 29

CAPITULO 5. PÓLIZAS Y GARANTÍAS VIGENTES 30

5.1 PÓLIZAS Y GARANTÌAS VIGENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÌA No. 413 – 2023 30

5.2 PÒLIZAS Y GARANTÌAS VIGENTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 403 – 2023 30

CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 32

CAPITULO 7. ANEXOS 33

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SÉPTIMA

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene información relacionada con el seguimiento, control, revisión y ejecución del contrato de obra pública No. 403 de 2023 **"PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Se describe los aspectos más importantes relacionados con la obra como: descripción del proyecto, localización, cantidades de obra, revisiones técnicas y oficios con medidas preventivas conducentes al cumplimiento del objeto contractual y acatamiento de las especificaciones del mismo, actividades ejecutadas por parte de la interventoría durante el periodo comprendido desde **17 de noviembre de 2023 al 16 de diciembre de 2023.**

En este informe esta recopilado el estado actual de obra del contrato en referencia, muestra el avance económico, físico y real del contrato de obra pública, todo esto supervisado por la interventoría garantizando la calidad y demás condiciones presentes del contrato de interventoría No. 413 de 2023.

Actualmente, el municipio de Ricaurte se caracteriza como centro turístico de la provincia del Alto Magdalena del departamento de Cundinamarca, y ante las 12.000 viviendas nuevas que tiene el municipio se ha presentado mayor congestión vehicular, accidentes y demoras para movilizarse y acceder a zonas residenciales, educativas, hoteleras, administrativas y bienes de servicios que se encuentran ubicadas en el casco urbano de este municipio.

Por lo cual, ante las condiciones no aptas para transitar y el deterioro vial de la diagonal séptima, una de las vías urbanas de acceso directo al centro del municipio y en aras de resolver la dificultad que tiene la población ricaurteña, desde la alcaldía municipal de Ricaurte, llevan a cabo la contratación para la PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA, desde el programa – Infraestructura de transporte y movilidad, línea estratégica: "Ricaurte con obras de infraestructura que construyen sociedad", programa: " Infraestructura de transporte y movilidad" del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, estableciendo como meta la vía urbana diagonal séptima mejorada, con el fin de brindarle a la comunidad, una malla vía con calidad y mejorar el desarrollo del municipio garantizando el fácil acceso a los centros de bienes y servicios.

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

CAPITULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en la diagonal 7 entre la vía principal ingresando por la calle 10 hasta la carrera 16 dentro del área urbana del municipio de Ricaurte en la provincia del Alto Magdalena del Departamento de Cundinamarca.

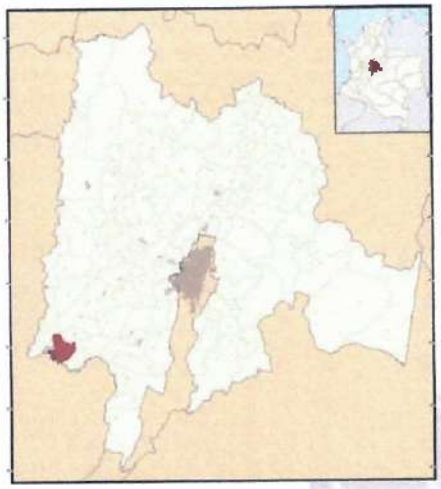


Imagen 1. Localización municipio de Ricaurte

La longitud del proyecto es aproximadamente de 840 metros lineales, el estado actual de la vía presenta deficiencias en su estructura debido a que en determinados tramos han realizado mantenimientos superficiales, pero no se han generado la rehabilitación del pavimento o construcción total de la estructura.



Imagen 2. Localización del área a intervenir – vía diagonal 7 desde calle 10 hasta carrera 16

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

1.2 ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance de la obra de **PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA**, contempla una vía en pavimento rígido de 840 metros de longitud conformada por dos carriles de ingreso sentido (calle 10- carrera 16) y un carril de salida sentido (carrera 16 – calle 10) y la demarcación de la ciclovía con un ancho de calzada de 11 metros aproximadamente.



Imagen 3. Diseño propuesto para la pavimentación y embellecimiento de la vía diagonal séptima.

La propuesta de urbanismo prioriza la recuperación del espacio público, la movilidad para el peatón y el uso energía renovable (Energía solar) en la iluminación y el ancho de los andenes será un ancho variable dependiente del paramento de los predios.

Descripción	Longitud (ml)	Descripción	Longitud (ml)
Primer tramo en Pavimento Flexible desde calle 10 hasta carrera 15	760	Pavimento Rígido desde la calle 10 hasta la carrera 16	840
Segundo tramo en pavimento Articulado Carrera 15 hasta Carrera 16	80		

Tabla 1. Diagnóstico actual Vs vía proyectada

El desarrollo del proyecto beneficiará directamente a la población de la zona urbana del sector (centro) donde habitan 1917 personas, de igual manera, en esta zona del casco urbana del municipio se encuentran centros educativos, hoteles, restaurantes y zonas administrativas prestadoras de bienes y servicios para la población, por lo cual, el proyecto brindará mejor movilidad y mejor calidad de vida para todos los habitantes y visitantes del municipio.

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SÉPTIMA



Imagen 4. Diseño de concreto estampado para intersecciones y espacio público

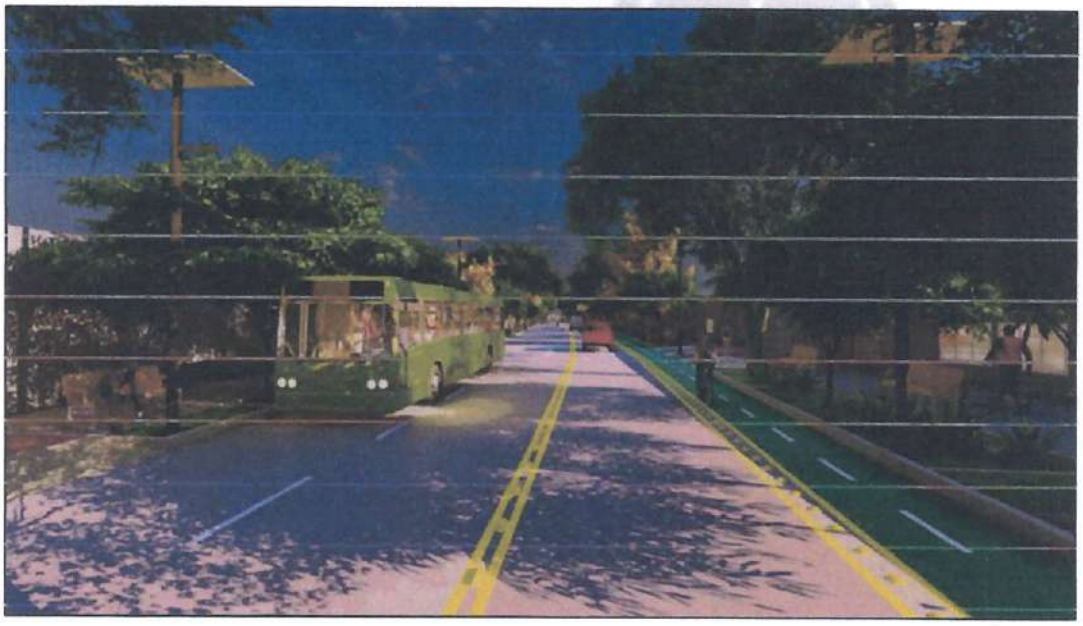


Imagen 5. Diseño de pavimentación y embellecimiento diagonal séptima

Cr 5 #11-24 Of.302 Edificio Torre Empresarial (602) 260-7436 - 3123065921
diagonalseptima.interventoria@gmail.com



Imagen 6. Diseño de urbanismo y espacios urbanos

El alcance del proyecto, será descrito a continuación, de acuerdo a lo contratado por la Alcaldía del municipio de Ricaurte del departamento de Cundinamarca, describiendo la construcción de una vía en pavimento rígido, con sus respectiva localización y tramos de intervención, uso y área para entender mejor los beneficios para la comunidad que generará este proyecto.

En el proyecto descrito encontramos como **primer capítulo** los preliminares que se comprende ejecutar y contine actividades como localización y replanteo con equipos de precisión, se refiere a ubicar y marcar en el terreno o superficie de construcción los ejes principales, verificar longitudes reales con respecto al plano de diseño, establecer sistemas de referencia planimétrico y altimétrico, cerca en tela verde como medida de prevención y aislamiento entre la obra a construir y la comunidad, con el fin de evitar accidentes y traumatismo con la comunidad que rodea el proyecto, fresado de concreto asfáltico (E= 5-12 cm) pavimento que debe ser retirado para la construcción de la nueva estructura de la vía, encontramos diferentes tipos de demoliciones para diferentes elementos existentes en mal estado y que se encuentran dentro del área a intervenir del proyecto, retiro de aro tapas de pozos existentes y nivelación, nivelación de pozos, desmonte de postes de alumbrado público y desmantelamiento de redes de alumbrado público, demolición de cárcamo, desmonte de señales verticales de tránsito y demolición de reductor de velocidad.

En el **segundo capítulo** se tienen actividades de explanación y excavación, las cuales hacen parte esencial para la previa construcción de la estructura del pavimento, dado que estas actividades refieren al corte y nivelación del terreno relacionadas a los movimientos de tierra, necesarios para adecuar el área de intervención a los niveles para la construcción de vías, dentro del capítulo se encuentran actividades como: excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km), excavación manual en material común h=0,0-2,0m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km),excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) ,transporte de materiales prov.

de explanación, canales, prestamos, sobre acarreos y derrumbes y derechos de disposición final en escombrera certificada.

El **tercer capítulo** corresponde a la estructura de pavimento, actividades esenciales para la construcción de la estructura de pavimento, se realiza compactación de la subrasante con el fin de mejorar la capacidad de soporte del material sobre el que se va a construir el pavimento, cualquier material inapropiado que se encuentre debe ser removido, control topográfico de niveles de excavación y de la estructura de pavimento garantizando el cumplimiento de las condiciones de diseño, conformación de la estructura del pavimento mediante la extensión y conformación, compactación y terminado de material granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicadas en los planos y demás documentos del proyecto o establecidos en el desarrollo del proyecto, losas en concreto para el pavimento rígido en concreto MR40, esta actividad consiste en la elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto hidráulico como estructura de pavimento, una vez nivelado, compactado y curado el material granular, se procede a ubicar las formaletas en tramos de varias placas en forma lineal nivelándolas con la estación topográfica, luego se instalan el acero de refuerzo de 60000 PSI, sellado de juntas en pavimento de concreto rígido incluido limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante, en las zonas de intersección se llevará a cabo estampado, endurecido y sellado de superficie en concreto, dentro de este capítulo se contempla también suministro e instalación de geotextil T2400 incluye estabilización, filtro y separación, corte de pavimento en concreto con disco diamantado, suministro e instalación color concreto verde pino C-144 para ciclovía, dosificación 6kg/m2 de incorporación manual acabado concreto rustico, incluye sellador de concreto ECO.

En el **cuarto capítulo** contempla las actividades de andenes y sardineles que hacen parte del embellecimiento de la vía garantizando uniformidad, en el cual se establece el desarrollo de actividades como relleno tipo 7 arena de peña para conformar el área a instalar loseta de cemento (textura, sin textura y toperol), adoquín de arcilla, instalación de gramoquin peatonal, andén en concreto de 3000 psi en sitio en los casos que sea necesario, bordillo prefabricado A-80 para limitar la zona de andén espacio público y sardinel prefabricado A-10 para delimitar la calzada de la vía.

Como **quinto capítulo** se encuentra las actividades de alcantarillado, sumideros y pozos correspondientes a la red pluvial, como primera actividad tenemos localización y replanteo de redes, en la cual se hace necesaria la utilización de topografía para localizar cada red, excavaciones varias a máquina sin clasificar incluido el retiro de sobrantes a una distancia menor de 5km utilizado para el tendido de redes, entibado tipo 2 ante como medida de contención ante los espacios confinados y profundidad de excavación para la instalación de red, relleno en materiales tipo 2 recebo, tipo 5 triturado grueso y tipo 7 arena de peña, suministro e instalación de tuberías PVC de 10", 12",16",24",36" y 42"; suministro e instalación de accesorios silla yee y codos, construcción de placa fondo, cilindros de pozos en ladrillo tolete, cubiertas de pozo, aro en acero y tapa de polipropileno de alto impacto, marco tapas de caja de inspección, cajas de inspección, cajas de contador de agua, sumideros fundidos en sitio reforzados, construcción de sumidero tipo cárcamo y cámaras de inspección para el funcionamiento de la red de distribución de aguas lluvias y sistema de drenaje de agua escorrentía que comprende la vía.

El **sexto capítulo** corresponde a objetos y equipamientos instalados en la vía pública y espacio urbano conocido como mobiliario urbano, se encuentran actividades como: suministro e instalación de banca urbana, banca en concreto M-40, bolardo M-3, suministro e instalación de caneca urbana,

suministro e instalación de paradero de bus, suministro e instalación de caseta de ventas, suministro e instalación de Mogador informativo, ciclo parqueadero M100 tipo 1.

El **séptimo capítulo** refiere a las actividades que modifican las características visibles, físicas y anímicas de los espacios utilizando plantas y recursos naturales y generando embellecimiento a la vía, en este capítulo se encuentran actividades como: contenedor de raíces en tubería corrugada PVC 36" y 24", suministro e instalación de árboles, poda de mantenimiento, poda radicular y conflicto con redes, apeo de árboles (tala, remoción y transporte de material descartado), relleno en tierra negra y grama en zonas verdes.

En el **octavo capítulo** con el fin de dar visibilidad al espacio se contempla el alumbrado público mediante el suministro e instalación de poste metálico de 8.5 metros de altura, troncocónico, diámetro cima: 127mm y diámetro base: 170mm certificado con retilap, incluye cimentación en concreto reforzado, sistema de puesta a tierra y doble propósito (para dos luminarias) y suministro e instalación de sistema solar para dos luminarias de 30 y 60w. incluye paneles solares con soporte, una luminaria de 60w y una luminaria de 30w, cofre, controlador de carga, baterías, protecciones de dc, conectores mc4 y cableado de conexión, ofreciendo mayor visibilidad para peatones y conductores y generando embellecimiento al espacio público.

Finalmente, se encuentra el **noveno capítulo** correspondiente a señalización, se contemplan actividades de demarcación con pintura en frío, señal de tránsito grupo I, suministro e instalación de tachas reflectivas unidireccionales y suministro e instalación de separador de carril tipo B, con el fin de informar, regular y canalizar el tránsito de vehículos y peatones.

1.3 ASPECTOS TÉCNICOS

El presente proyecto tenía como meta la pavimentación en concreto rígido con una longitud total de 840 metros lineales de la vía urbana diagonal séptima del municipio de Ricaurte. Sin embargo, ante la intervención del proyecto Glorieta Manueles por parte de la Concesión Bogotá- Girardot, se reduce la longitud total de pavimentación a 570 metros lineales aproximadamente.

Los tramos a intervenir se encuentran detallados a continuación:

TRAMO	UBICACIÓN	SECTOR
1	Puente peatonal puerta amarilla (Pozo 1) a la portería de Conconcreto (Pozo 8 - existente)	DIAGONAL SEPTIMA

Tabla 2. Tramo de intervención red pluvial

Ante la reducción de longitud, se expone el área de intervención con ajuste a las abscisas iniciales.

TRAMO	UBICACIÓN	SECTOR
1	K0+000 – K0+245	DIAGONAL SEPTIMA
2	K0+245 – K0+360	
3	K0+360 – K0+465	
4	K0+465 – K0+563	

Tabla 3. Tramos de intervención pavimentación

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

CAPITULO 2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 413-2023

2.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1.1 GENERALIDADES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 413 - 2023	
SECRETARIA EJECUTORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
CONTRATISTA	PAOLA RODRIGUEZ ALCALÀ CC. 28.548.736 de Ibagué
OBJETO	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"*
VALOR INTERVENTORIA	SEISCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($626.317.157)
PLAZO	SIETE (07) MESES, contados a partir cumplimiento de la firma del acta de inicio.
FECHA DE LEGALIZACIÓN	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. I-100026598
FECHA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÒN	16 DE MAYO DE 2024

DOCUMENTOS GENERADOS	
ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
INFORME No. 01	17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023
INFORME No. 02	17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

2.1.2 PERSONAL DE INTERVENTORÍA

PERFIL / CARGO	NOMBRE	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN
Director de Interventoría	Paola Andrea Rodriguez Alcalá	15%
Residente de Interventoría	Jeily Katherine Motta Tafur	100%
Asesor especialista en Pavimentos	Josue Guillermo Tibocha Granados	30%
Asesor especialista en Geotecnia	Dairo Dueñas Morales	30%
Asesor especialista en Hidráulica	Henry Julian Rodriguez Arana	30%
Asesor especialista eléctrico	Fredy Alexander Carranza Sanchez	30%
Ingeniero Forestal	Fredy Giovani Vargas Ramirez	30%
Profesional en seguridad y salud en el trabajo	Dennis Hortencia Barrero	50%
Trabajadora Social	Daniela Alejandra Cifuentes Murillo	60%
Profesional en Topografía	Jorge Fernando Morales Oliveros	50%
Auxiliar en Topografía	Carlos Fernando Sanchez Arias	50%
Inspector de Interventoría	Luis Felipe Guzmán Serrano	100%
Auxiliar Forestal	Juan Pablo Quintero Alférez	30%

2.1.3 EQUIPO DE INTERVENTORÍA

No.	DESCRIPCIÒN
1	Equipo de topografía
2	Equipo de comunicaciones
3	Computadores portátiles
4	Cinta métrica – flexo metro
5	Cámara de fotografía
6	Impresora

2.2 INFORMACIÓN FISICO FINANCIERA

2.2.1 BALANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO – La entidad pagará al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la ejecución del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95%) de su monto.


Parágrafo 1. La entidad realizará al contratista el ultimo pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad y con la suscripción del acta de liquidación por las partes.


Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

AVANCE DE LA INTERVENTORÍA No. 413-2023 (VALOR TOTAL DEL CONTRATO)			
	DINERO	DINERO	%
VALOR DEL CONTRATO	$626.317.157,00		
VALOR EJECUTADO MES No. 1		$101.018.896,30	16.13%
VALOR EJECUTADO MES No. 2		$80.815.117,04	12.90%
ACUMULADO		$ 181.834.013,34	29.03%
VALOR POR EJECUTAR		$444.483.143,66	70.97%
SUMAS IGUALES	$626.317.157,00	$626.317.157,00	100,00%

2.2.2 GRAFICOS DEL VALOR PORCENTAJE DE LA INTERVENTORÍA

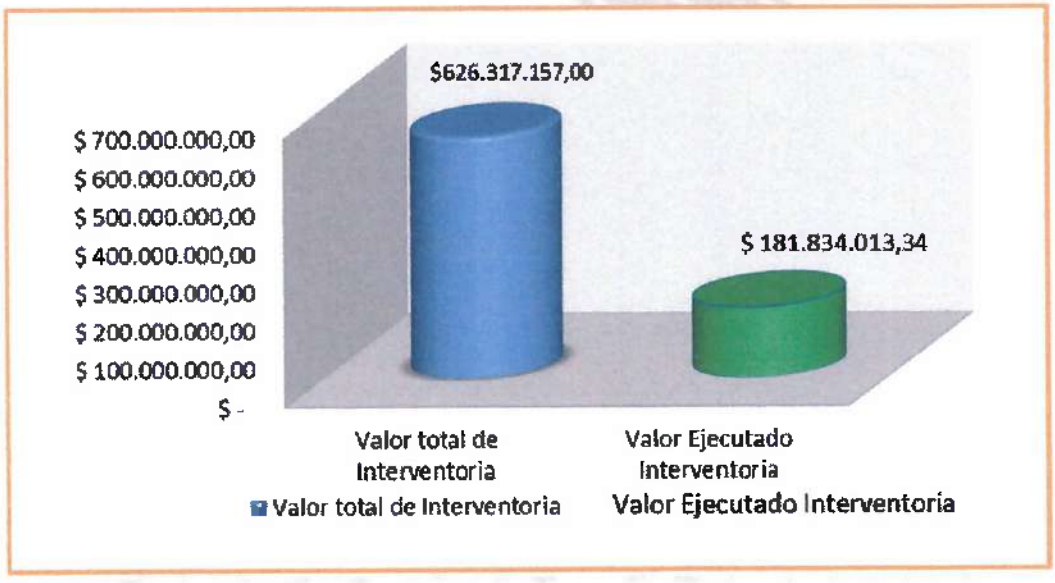

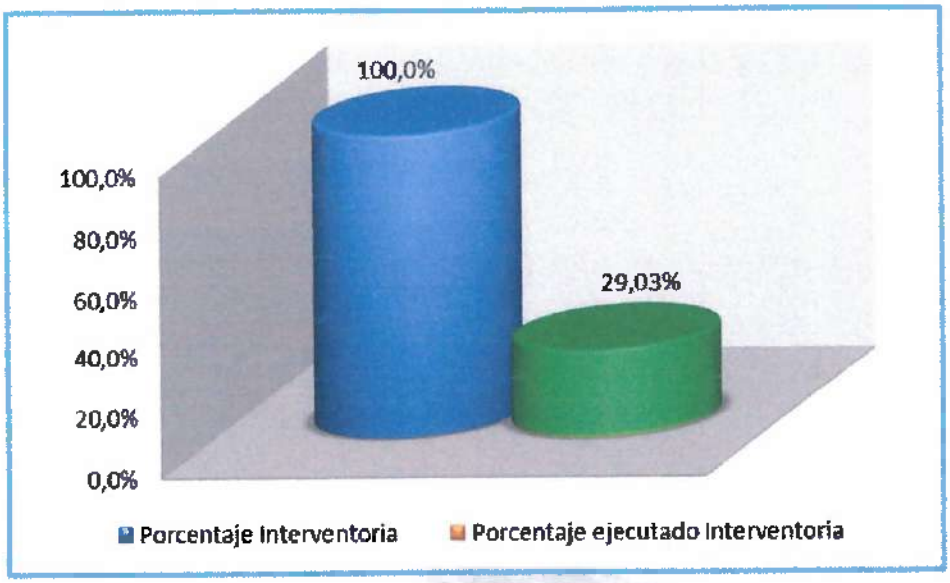

2.2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Vigilar, controlar y concepiuar sobre las siguientes labores realizadas por el contratista de obra.
- Coordinación y seguimiento conjunto en procesos constructivos y diferentes actividades del alcance del proyecto.
- Observaciones a las actividades realizadas por el contratista de obra y estado del tiempo.
- Seguimiento al cumplimiento de obligaciones técnicas y administrativas al contratista de obra, sin que tal comprobación interfiera con la autonomía de decisiones que tiene el contratista de obra y/o traumaticen el normal desarrollo de los trabajos.
- Seguimiento al componente de seguridad y salud en el trabajo por parte del profesional de interventoría.
- Seguimiento al componente social del contratista de obra por parte del profesional social de interventoría.
- Comités virtuales y presenciales, con el fin de dar a conocer el estado actual del proyecto, verificar los compromisos adquiridos, dar a conocer los inconvenientes presentados y dar oportuna solución, en dichos comités participan supervisión, contratista de obra e interventoría y demás entidades que sean requeridas según el tema a tratar.
- Control a las cantidades de las actividades desarrolladas en obra.
- Verificación de bitácora de obra.
- Registro fotográfico.
- Atención a la comunidad del área de influencia del proyecto.
- Constante acompañamiento a la supervisión y contratista de obra en reuniones y/o socializaciones del proyecto.
- Solicitud de requerimientos y atención al contratista de obra.

CAPITULO 3. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 403-2023

3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 403-2023

3.1.1 GENERALIDADES

CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 403 - 2023	
SECRETARIA EJECUTORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
CONTRATISTA	CONSORCIO DIAGONAL RC NIT. 901746184-7
OBJETO	*"PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"*
VALOR INTERVENTORIA	ONCE MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($11.302.197.879)
PLAZO	SIETE (07) MESES, contados a partir cumplimiento de la firma del acta de inicio.
FECHA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÒN	16 DE MAYO DE 2024

DOCUMENTOS GENERADOS	
MINUTA DE MODIFICACIÓN No. 001	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
INFORME No. 01	17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023
INFORME No. 02	17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA PARCIAL No. 01	16 DE DICIEMBRE DE 2023

3.1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

De acuerdo a lo establecido en el contrato de obra pública No. 403-2023, el CONSORCIO DIAGONAL RC, debe garantizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, las cuales se encuentran contenidas en la **CLÁUSULA 9, LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE OBRA** y LA **CLÁUSULA 10, LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA.**

3.1.3 PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA

De acuerdo anexo técnico del proyecto, el CONSORCIO DIAGONAL RC garantizó la participación y disponibilidad con el siguiente personal:

PERFIL / CARGO	NOMBRE	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN
Director de Obra	Aitor Mirena de Laurrari Echevarria	20%
Asesor en Pavimentos	Carlos Andres Nieto Laguna	30%
Residente de Obra	Sergio Mauricio Leal Tovar	100%
Asesor SISO	Jorge Edwin Faber Sanchez Marroquín	100%
Tecnólogo en Topografía	Oscar Rodriguez Vasquez	50%
Trabajador Social	Rosa Inés Pulecio Guzmán	50%
Profesional Programa de Gerencia de Proyectos	Álvaro Ángel Ballestas Robinson	100%

3.1.4 EQUIPO Y/O MAQUINARIA EN OBRA

El contratista de obra ha tenido disponible el desarrollo de las actividades del proyecto, el siguiente equipo:

No.	DESCRIPCIÒN
1	Herramienta menor
2	Retroexcavadora de oruga
3	Equipo Topográfico
4	Vibro compactador
5	Cámara Fotográfica

3.2 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

3.2.1 CANTIDADES DE TRABAJO REALIZADO Y CONTROL DE CALIDAD

Durante el periodo se ha implementado control de calidad respectivo a las actividades y materiales utilizados en obra, los cuales se incluyen en los anexos, correspondientes a certificados de calidad de materiales y cumplimiento del laboratorio.

En el **ANEXO 7.1** del presente informe, se relacionan las cantidades de trabajo realizado durante el periodo en el proyecto ***"PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"***.

3.2.2 ACTIVIDADES DE OBRA

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas por el CONSORCIO DIAGONAL RC durante el periodo del 17 de noviembre de 2023 al 16 de diciembre de 2023:

CAPITULO 2. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES

- **DERECHOS DE DISPOSICIÓN FINAL EN ESCOMBRERA CERTIFICADA**

Esta actividad hace referencia a los derechos de disposición del lugar autorizado y certificado por la autoridad ambiental donde se depositan los residuos o materiales de desechos provenientes de las actividades de construcción.

Cantidad ejecutada: 300,00 M3



ESCOMBRERA San Thomas
MEIGAR - TOLIMA

CERTIFICACION DE DEPOSITO RESPONSABLE

Con el objetivo de velar con[illegible] ambiental, LA ESCOMBRERA SAN THOMAS S.A.S. identificada con número de Nit. 900875297-1, certifica que la empresa CONSORCIO DIAGONAL RC, identificada con número de Nit. 901746184-7 Régimen Común, deposito responsablemente residuos de demoliciones y excavaciones provenientes de la ***"PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA"***. Esto debidamente aprobado con la siguiente Consignación Banco Davivienda con fecha 20/10/2023.

El total de metros cubicos depositados son [illegible] que corresponden a [illegible] que estan soportados con sus respectivos recibos (anexos)

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Expedido en la Ciudad de Meigar Tolima a los veintinueve (29) días del mes de NOVIEMBRE de 2023

LA ESCOMBRERA DE SAN THOMAS
Oficina Carrera 25 N° 7-62 meigar - Tolima
Celular 315 8077707

RES.0000000002216
06 10 2013
HABILITADO 013-1000

[illegible] Carrera 25 N° 7-62 Meigar – Tolima Cel. 315[illegible]

CAPITULO 5. ALCANTARILLADO, SUMIDEROS Y POZOS

- **EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)**

Se refiere a la excavación necesaria para la instalación de la red pluvial y estructura a las cuales se refiere el capítulo en presente, de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos u ordenados por el interventor y/o supervisión, de acuerdo al desarrollo del proyecto. Incluye también la remoción, transporte y disposición de todo el material que se encuentre dentro de

los límites de las excavaciones y la limpieza final que sea necesaria para la terminación de la actividad.

Cantidad ejecutada: 4.133,37 M3



- **ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)**

El entibado y acodalamiento hace referencia a la contención de las paredes en las zanjas de excavaciones de terrenos inestables a través de tableros metálicos trabados horizontalmente, con el objetivo de evitar hundimiento o desplomes de paredes laterales y brindar protección al personal de obra en el desarrollo de sus actividades.

Cantidad ejecutada: 1.574,58 M2



- **TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS Y DERRUMBES**

Esta actividad consiste única y exclusivamente en el transporte de los materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, y el transporte proveniente de derrumbes. De acuerdo a lo establecido en el artículo 900-13 de las normas y especificaciones 2012 INVIAS.

Cantidad ejecutada: 36.902,23 M3-KM



- **RELLENO EN TIPO 2 RECEBO**

Se refiere a los trabajos de colocación en capas, conformación de recebo proveniente de fuentes aprobadas para rellenos a lo largo de las estructuras, previa a la ejecución de obras de drenaje y subdrenaje y/o otras obras contempladas en el proyecto.

Cantidad ejecutada: 2.396,80 M3



Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

- **RELLENO TIPO 7 ARENA DE PEÑA**

Se refiere al material que se utiliza como base y atraque de tuberías de PVC o en las estructuras de acuerdo a lo indicado en planos, el cual es obtenido de fuentes aprobadas, debe ser limpio, no plástico y cumplir con las especificaciones técnicas.

Cantidad ejecutada: 1.390,56 M3



- **TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO DE 10"**

Se refiere al suministro e instalación de tubería PVC de alcantarillado de diámetro de 10 pulgadas, para la captación y evacuación de aguas residuales y/o pluviales dirigida a las redes según los diseños y planos.

Cantidad ejecutada: 13.20 ML



- **TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO DE 12"**

Se refiere al suministro e instalación de tubería PVC de alcantarillado de diámetro de 12 pulgadas, para la captación y evacuación de aguas residuales y/o pluviales dirigida a las redes según los diseños y planos.

Cantidad ejecutada: 8.00 ML



- **TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"**

Se refiere al suministro e instalación de tubería PVC de alcantarillado de diámetro de 36 pulgadas, para la captación y evacuación de aguas residuales y/o pluviales dirigida a las redes según los diseños y planos.

Cantidad ejecutada: 147.10 ML



Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

- **TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 42"**

Se refiere al suministro e instalación de tubería PVC de alcantarillado de diámetro de 42 pulgadas, para la captación y evacuación de aguas residuales y/o pluviales dirigida a las redes según los diseños y planos.

Cantidad ejecutada: 68.20 ML



- **CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80**

Se refiere a una cámara construida en bloques y hormigón armado que se coloca en las intersecciones de las líneas colectoras de las diferentes tuberías que le son conectadas como también en los cambios de direcciones, con el objetivo de inspeccionar y limpiar las líneas colectoras de las conexiones pluviales y/o sanitarias.

Cantidad ejecutada: 2.00 UND



CAPITULO 7. PAISAJISMO

- **APEO DE ÁRBOLES (TALA, REMOCIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL DESCARTADO, DE 3 A 12 MTS DE ALTURA)**

Esta actividad consiste en la operación de ir cortando poco a poco las extremidades de los árboles hasta eliminarlos de la tierra. Sin embargo, incluye también remoción y transporte del material descartado, este proceso busca desmantelar de manera segura y eficiente la estructura arbórea para liberar el espacio sin causar daños innecesarios al entorno.

Cantidad ejecutada: 39.00 UND



3.3 INFORMACIÒN FISICO FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

3.3.1 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo al contrato de obra pública No. 403-2023 y al suscrito modificatorio No.001 se modifica la **Cláusula sexta. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO:** la entidad entregará bajo la figura del anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato bajo las siguientes condiciones: a) El anticipo se tramitará previa solicitud del contratista y aceptación de las condiciones de la entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). b) La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. c) La entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el municipio de Ricaurte Cundinamarca con NIT No. 890.680.059-1, el cual será vigilado por el interventor del contrato.

Cláusula octava. FORMA DE PAGO: la entidad entregará un anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula sexta y posteriormente hará pagos parciales según avance de obra con su respectiva amortización.

3.3.1.1 BALANCE E INVERSIÓN DEL ANTICIPO

BALANCE FINANCIERO AL ANTICIPO			
	DINERO	DINERO	%
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$5.651.098.939,50		100.00%
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 01		$759.665.361,50	13.44%
VALOR POR AMORTIZAR		$4.891.433.578,00	86.56%
SUMAS IGUALES	$5.651.098.939,50	$5.651.098.939,50	100,00%

INVERSIÓN AL ANTICIPO			
	DINERO	DINERO	%
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$5.651.098.939,50		100.00%
INFORME No.1 DE ANTICIPO		$1.455.000.000,00	25.75%
VALOR POR EJECUTAR		$4.196.098.939,50	74.25%
SUMAS IGUALES	$5.651.098.939,50	$5.651.098.939,50	100,00%

3.3.1.2 BALANCE E INVERSIÓN DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO AL CONTRATO DE OBRA No. 403-2023			
	DINERO	DINERO	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 11.302.197.879,00		100.00%
VALOR EJECUTADO INFORME No. 1		$ 299.256.378,00	2.65%
VALOR EJECUTADO INFORME No. 2		$1.228.906.394,00	10.87%
ACUMULADO		$ 1.528.162.772,00	13.52%
VALOR POR EJECUTAR		$ 9.774.035.107,00	86.48%
SUMAS IGUALES	$ 11.302.197.879,00	$ 11.302.197.879,00	100,00%

3.3.2 VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA POR CAPITULOS

A continuación, se presenta el balance del contrato de obra definiendo el valor ejecutado acumulado a la fecha de cada capítulo en valor y porcentaje de avance.


De acuerdo a lo expuesto, es importante aclarar que el seguimiento y control de la programación de obra por parte de interventoría incluye el plan de gestión integral de obra, teniendo en cuenta que, el valor presupuestado para el PGIO corresponde al 1.20% del costo directo del proyecto.


Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 413 DE 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA "	VALOR TOTAL DE CADA CAPITULO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO DE CADA CAPITULO	PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO POR CAPITULO
PRESUPUESTO GENERAL (CAPITULOS)			
CAPITULO 1			
PRELIMINARES	$450.964.583,00	$ 14.400.637,00	3,19%
CAPITULO 2			
EXPLANACION Y EXCAVACIONES	$687.986.300,00	$12.983.250,00	1,89%
CAPITULO 3			
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$2.603.740.346,00	$0,00	0,00%
CAPITULO 4			
ANDENES Y SARDINELES	$1.602.450.761,00	$0,00	0,00%
CAPITULO 5			
ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS	$1.674.325.810,00	$1.405.416.490,00	83,94%
CAPITULO 6			
MOBILIARIO URBANO	$274.601.763,00	$0,00	0,00%
CAPITULO 7			
PAISAJISMO	$286.448.651,00	$68.520.231,00	23,92%
CAPITULO 8			
ALUMBRADO PUBLICO	$3.550.367.376,00	$0,00	0,00%
CAPITULO 9			
SEÑALIZACION	$229.794.037,00	$0,00	0,00%
PGIO			
	$107.368.656,00	$26.842.164,00	25,00%
INSPECCION RETIE Y RETILAP			
	$34.150.000,00		0,00%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	$ 11.302.198.272,00	$1.528.162.772,00	13,52%
AJUSTE AL PESO	$393,00		
	$ 11.302.197.879,00		

3.3.3 GRAFICAS DE VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA POR CAPITULOS

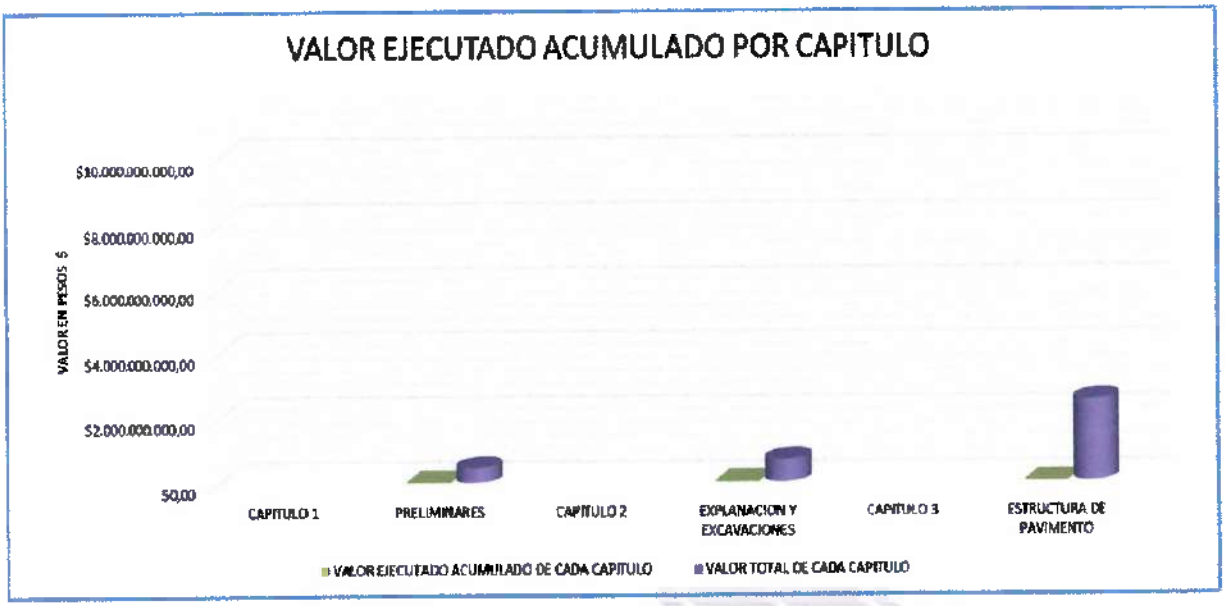

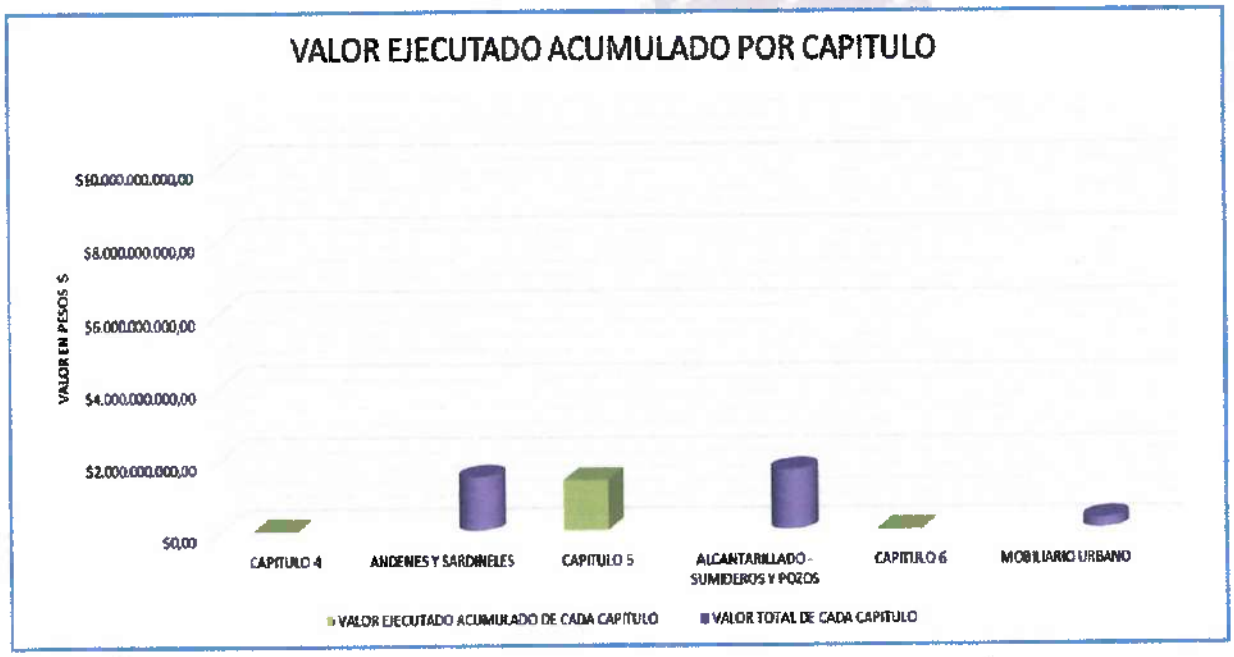


Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes



CAPITULO 4. AVANCE Y SEGUIMIENTO DE OBRA

4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

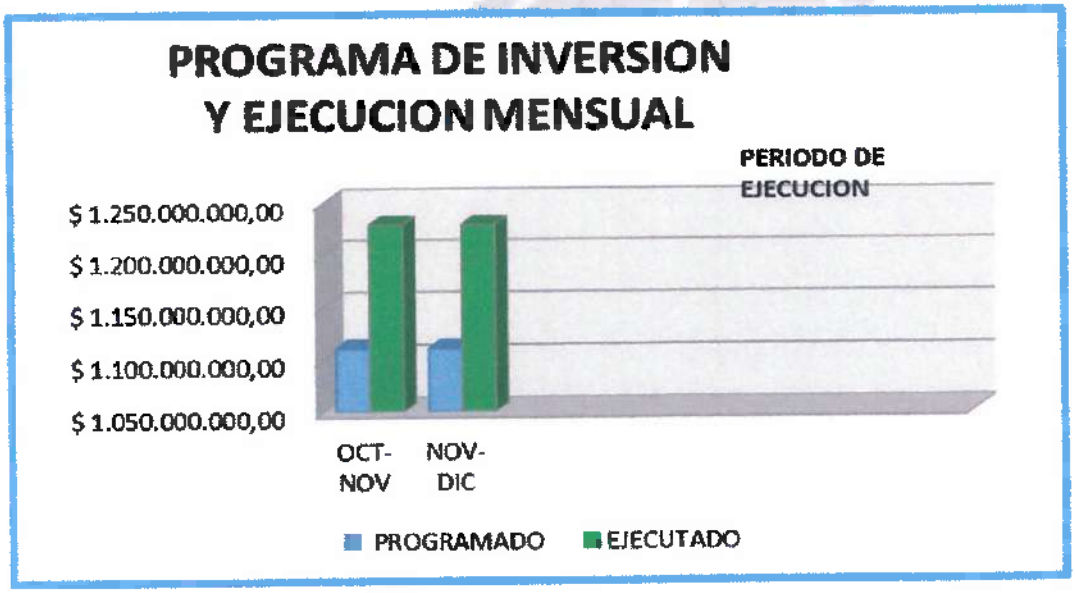

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

ESTADO ACTUAL PERIODO 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023


ALCANCE FISICO DESCRIPCIÓN OBRAS CAPITULO	CONTRATADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE DE CADA CAPITULO
CAPITULO 1 PRELIMINARES	**$ 450.964.583,00**	**$ 118.763.587,75**	**$ 0,00**	
DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	$450.964.583,00	$ 118.763.587,75	$ 0,00	0,00%
CAPITULO 2	**$ 667.986.300,00**	**$ 103.779.886,67**	**$ 3.709.500,00**	
EXPLANACION Y EXCAVACIONES	$667.986.300,00	$ 103.779.886,67	$ 3.709.500,00	0,54%
CAPITULO 3	$ 2.503.740.345,00	**$ 14.383.890,44**	**$ 0,00**	
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$2.503.740.345,00	$ 14.383.890,44	$ 0,00	0,00%
CAPITULO 4	**$ 1.502.450.751,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	
ANDENES Y SARDINELES	$1.502.450.751,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
CAPITULO 5	**$ 1.674.325.810,00**	**$ 777.108.496,08**	**$ 1.143.255.581,00**	
ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS	$1.674.325.810,00	$ 777.108.496,08	$ 1.143.255.581,00	68,28%
CAPITULO 6	$ 274.601.763,00	$ 0,00	**$ 0,00**	
MOBILIARIO URBANO	$274.601.763,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
CAPITULO 7	**$ 286.448.651,00**	**$ 63.097.164,50**	**$ 68.520.231,00**	
PAISAJISMO	$286.448.651,00	$ 63.097.164,50	$ 68.520.231,00	23,92%
CAPITULO 8	$ 3.550.367.376,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**	
ALUMBRADO PUBLICO	$3.550.367.376,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
CAPITULO 9	**$ 229.794.037,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	
SEÑALIZACION	$229.794.037,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
PGIO	**$ 107.368.656,00**	**$ 13.421.082,00**	**$ 13.421.082,00**	
	$107.368.656,00	$ 13.421.082,00	$ 13.421.082,00	12,50%
INSPECCION RETIE Y RETILAP	**$ 34.150.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	
	$34.150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
TOTAL % EJECUTADO	**$ 11.302.198.272,00**	**$ 1.110.664.107,44**	**$ 1.228.906.394,00**	10,87%


AVANCES DE CONTRATOS ACUMULADO			
DESCRIPCIÓN DE CONTRATOS	VALOR PROYECTO	EJECUTADO	AVANCE CANTIDADES DE OBRA %
CONTRATO DE OBRA N° 403 DE 2023	$ 11.302.198.272,00	$ 1.228.906.394,00	10,87%
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 43 DE 2023	$ 626.317.157,00	$ 181.834.013,34	29,03%

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniería Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

4.2 GRAFICOS EN VALOR Y PORCENTAJE ACUMULADO DEL PROYECTO

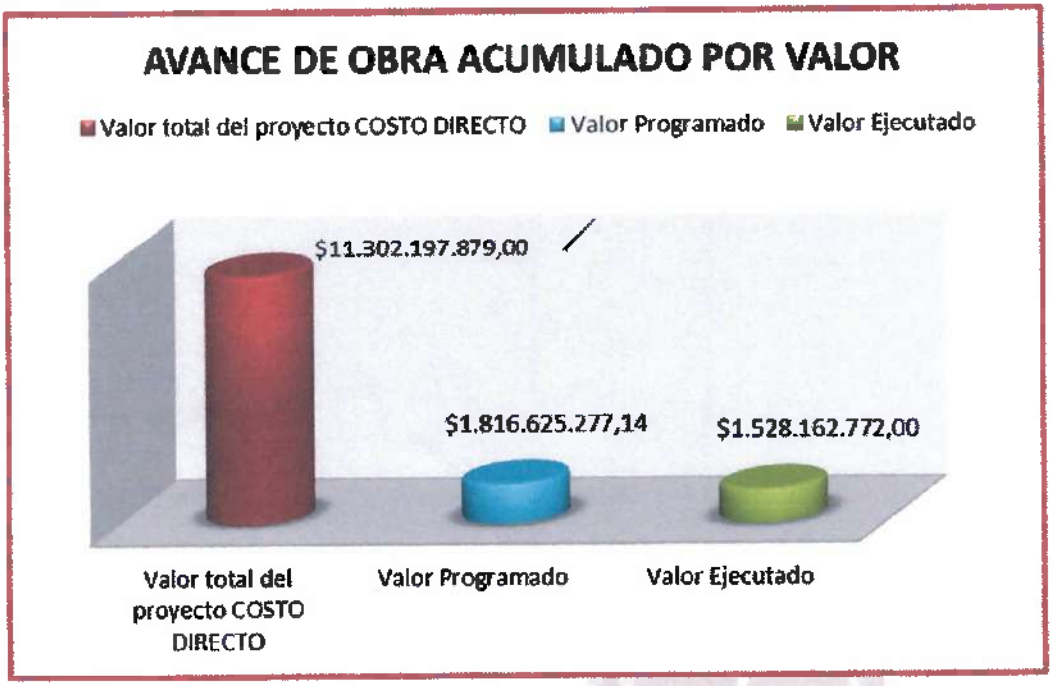

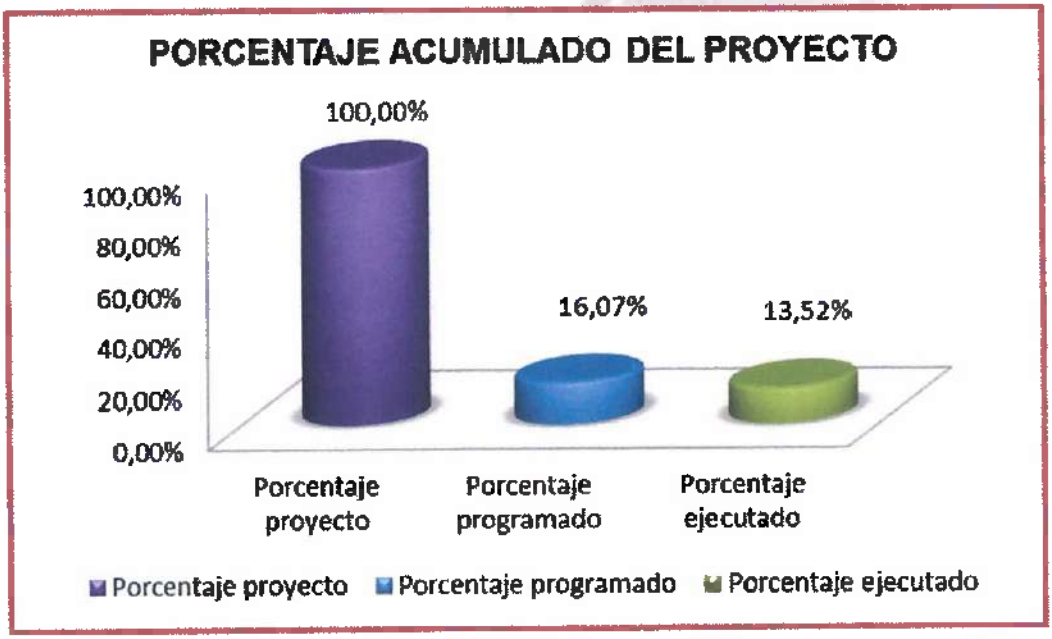

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Vías Terrestres y Gestión del Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

CAPITULO 5. PÓLIZAS Y GARANTÍAS VIGENTES

5.1 PÓLIZAS Y GARANTÌAS VIGENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÌA No. 413 – 2023

PÓLIZA DE SEGURO SERIEDAD DE LA OFERTA

Seguros Mundial
Póliza No. I-100025857
Anexo: 0 Fecha de expedición: 04/09/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 413-2023			
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
SERIEDAD DE LA OFERTA	05/09/2023	20/12/2023	$62.631.715,70

PÓLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Seguros Mundial
Póliza No. I-100026598
Anexo: 0 Fecha de expedición: 28/09/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 413-2023			
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	27/09/2023	27/12/2024	$62.631.715,70
PRESTACIONES SOCIALES	27/09/2023	27/04/2027	$31.315.857,85
CALIDAD DEL SERVICIO	27/04/2024	27/04/2029	$125.263.431,40

Seguros Mundial
Póliza No. I-100026598
Anexo: 2 Fecha de expedición: 18/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 413-2023			
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	17/10/2023	16/01/2025	$62.631.715,70
PRESTACIONES SOCIALES	17/10/2023	17/05/2027	$31.315.857,85
CALIDAD DEL SERVICIO	17/05/2024	17/05/2029	$125.263.431,40

Actualización de vigencia según acta de inicio del 17/10/2023.

5.2 PÒLIZAS Y GARANTÍAS VIGENTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 403 – 2023

PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Berkley International Seguros Colombia S.A
Póliza No. 20569
Anexo: 1 Fecha de expedición: 05/10/2023

CONTRATO DE OBRA No. 403-2023			
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
BASICO	31/08/2023	31/03/2024	$565.109.894,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	31/08/2023	31/03/2024	$565.109.894,00

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	31/08/2023	31/03/2024	$565.109.894,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	31/08/2023	31/03/2024	$565.109.894,00

Berkley International Seguros Colombia S.A
Póliza No. 20569
Anexo: 2 Fecha de expedición: 19/10/2023

CONTRATO DE OBRA No. 403-2023			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
BASICO	17/10/2023	17/05/2024	$565.109.894,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	17/10/2023	17/05/2024	$565.109.894,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	17/10/2023	17/05/2024	$565.109.894,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	17/10/2023	17/05/2024	$565.109.894,00

Actualización de vigencias según acta de inicio del 17/10/2023.

PÓLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Berkley International Seguros Colombia S.A
Póliza No. 70433
Anexo: 1 Fecha de expedición: 05/10/2023

CONTRATO DE OBRA No. 403-2023			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/08/2023	31/07/2024	$1.130.219.788,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/08/2023	31/03/2027	$565.109.894,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	31/03/2024	31/03/2029	$2.260.439.576,00

Berkley International Seguros Colombia S.A
Póliza No. 70433
Anexo: 2 Fecha de expedición: 06/10/2023

CONTRATO DE OBRA No. 403-2023			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	31/08/2023	31/07/2024	$5.651.098.940,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/08/2023	31/07/2024	$1.130.219.788,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/08/2023	31/03/2027	$565.109.894,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	31/03/2024	31/03/2029	$2.260.439.576,00

Actualización de vigencias según otro sí modificatorio No. 001 incluye cobertura de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

Berkley International Seguros Colombia S.A
Póliza No. 70433
Anexo: 3 Fecha de expedición: 19/10/2023

CONTRATO DE OBRA No. 403-2023			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17/10/2023	17/09/2024	$5.651.098.940,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/10/2023	17/09/2024	$1.130.219.788,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/10/2023	17/05/2027	$565.109.894,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	17/05/2024	17/05/2029	$2.260.439.576,00

Actualización de vigencias según acta de inicio 17/10/2023.

CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha del presente informe se presenta un avance acumulado de 13.52 % frente a un programado de 16.07% por lo cual, se presenta un atraso de -2.55% según la programación de obra V2 remitida por el contratista de obra ante la suscrita acta de mayores y menores cantidades. Se aclara que, el seguimiento a la programación de obra V2 incluye la ejecución del plan de gestión integral de obra.

Esta interventoría informa que durante el presente periodo se llevó a cabo balance de mayores y menores cantidades durante el desarrollo de las actividades contempladas dentro del alcance del proyecto.

Se realizo entrega del tramo de intervención de red pluvial comprometido en el área de intervención del proyecto Glorieta Manueles, para que el Consorcio Ruta 40 diera continuidad a las actividades de pavimentación por el carril derecho desde el sector de Puerta Amarilla hasta el Centro Vacacional de ETB.

Se informa a la supervisión municipal que ante las condiciones del suelo de excavación, se evidencia inestabilidad de las paredes verticales de las zanjas de la red pluvial y es así que esta interventoría evidencia que se presentan sobreanchos en el área de intervención. Así mismo, durante el desarrollo de actividades de excavación para la instalación de la red pluvial entre el Centro Vacacional de ETB hasta el Pozo 8 Conconcreto (Pozo existente), se encuentran redes de telecomunicaciones sobre el carril izquierdo, las cuales ante las condiciones del suelo presentan afectación, Por lo cual, se espera

concepto técnico por parte del asesor de geotecnia para tener claridad de la conformación del suelo presente.

Durante el presente periodo, el CONSORCIO DIAGONAL RC presentó ACTA PARCIAL No. 01 por un valor de $1.519.330.723,00 MCTE y amortización al anticipo por un valor de $759.665.361,50 MCTE.

Finalmente, esta interventoría informa que durante el presente periodo no se registraron incidentes en el desarrollo de las actividades de obra, se brindó seguimiento y control al contratista de obra. Sin embargo, se reiteró al CONSORCIO DIAGONAL RC, la importancia de dar cumplimiento en los tiempos de entrega de documentación y atención a los requerimientos en atención a las obligaciones contractuales contenidas en su contrato de obra pública No. 403-2023.

CAPITULO 7. ANEXOS

7.1 RELACIÒN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

7.2 INFORMES SEMANALES

7.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.4 ESTADO DEL CLIMA

7.5 CONTROL DE EQUIPO Y MAQUINARIA

7.6 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7.7 SOPORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÌA

7.8 INFORME SOCIAL

7.9 BITÀCORA DE OBRA

7.10 CORRESPONDENCIA ENVIADA

7.11 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

7.12 RESULTADOS DE LABORATORIO

7.13 CONCEPTO TÉCNICO GEOTECNISTA

7.14 INFORME TÉCNICO ESPECIES ARBOREAS

Paola A. Rodriguez A.

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
REPRESENTANTE LEGAL

INFORME DE INTERVENTORIA 02
SEGUIMIENTO AL COMPONENTE AMBIENTAL.

Contrato de Obra No. 403 de 2023 - pavimentación y embellecimiento de la diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte – Cundinamarca.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 413 DE 2023

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCERA Y AMBIENTAL PARA "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA

PERIODO DE 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2023
RICAURTE – CÚNDINAMARCA

1.INTRODUCCIÓN

Esta interventoria en el presente informe incluye la relación de la gestión ambiental ejecutada por el Contratista CONSORCIO DIAGONAL RC, en ejecución del Contrato de obra 403 DE 2023 y su seguimiento de Interventoría, aunque no cuenta con ingeniero ambiental en su marco técnico, realiza seguimiento como lo indica en las obligaciones de interventoría.

2. OBJETIVOS

2.1. General

Describir las actividades ambientales ejecutadas durante el periodo de ejecución. de obra, en cumplimiento a las obligaciones contractuales, anexo técnico y pliegos de condiciones del Contrato de Interventoría.

2.2. Específicos

- Hacer seguimiento al cumplimiento de las condiciones del Contrato de obra, en especial las obligaciones ambientales, con la finalidad de determinar el cumplimiento del contratista.

- Dar a conocer el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales relacionados con los aspectos Ambientales.

- Proporcionar información de avance respecto a las obligaciones de la gestión ambiental a través del seguimiento del Plan de Manejo Ambiental, como instrumento ambiental para la ejecución del Contrato de obra.

- Presentar el informe mensual ambiental de Interventoría durante cada período correspondiente.

3. GESTIÓN AMBIENTAL

La Interventoría en cumplimiento de sus funciones realiza el seguimiento de la gestión ambiental por parte del Contratista de obra y ejecuta las siguientes actividades:

• Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales del Contrato de obra, con la finalidad de determinar el cumplimiento de la firma contratista.

• Se realiza seguimiento a las actividades incluidas en el Plan de Manejo Ambiental, como son:

- ❖ Ejecución de capacitación ambiental al personal.
- ❖ Demarcación de la obra.
- ❖ Señalización de áreas internas.
- ❖ Seguimiento al suministro del recurso agua.
- ❖ Seguimiento al manejo de residuos sólidos y líquidos.
- ❖ Seguimiento al manejo del área del campamento y acopio de materiales.

1. Conclusiones

Positivos:

Cumplimiento a las capacitaciones relacionadas con el medio ambiente.
En este periodo se realizo la elaboración del campamento.
Señalizan en todas las áreas a intervenir.
Se evidencia punto de almacenamiento de los materiales.

Negativos:

El campamento no cuenta con los servicios básicos (agua, energía).
Se continua sin puntos ecológicos en la obra.

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

EVIDENCIA FOROGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

ELABORACIÓN CAMPAMENTO



ROTULACIÓN DE ENVASES CON SUSTANCIAS QUIMICAS



TALA DE ESPECIES ARBOREAS





Nota: Todos los anexos ambientales reposan en los periodos de PGIO en el expediente del contrato de obra pública No.403 -2023

Atentamente.

Dennis Barrero
Profesional en Seguridad y Salud Ocupacional
Lic. SO. Res. No. 7624 de 01-07-2016

"PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"					
	DESCRIPCIÓN	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
	PRELIMINARES				
1,1	Localización y Replanteo Con Equipos de Precisión	M2	18.298,00		-
1,2	Cerca En Tela Verde H = 2.10 M	ML	1.949,00		297,50
1,3	Fresado de Concreto Asfáltico (E= 5- 12 cm)	M2	13.946,00		33,04
1,4	Demolición Adoquín Sobre Arena, H=0.15 M	M2	609,50		-
1,5	Demolición Placa Piso E= 0.10 M	M2	3.076,10		-
1,60	Demolición De Sardinel En Concreto	ML	2.408,00		-
1,70	Demolición de Sumideros	UND	45,00		-
1,80	Retiro de Aro Tapas De Pozos Existentes.	UND	41,00		-
1,9	Nivelación De Pozos De Inspección Di=1.20m, E=0.25m, H=0,21m (Incluye Pañete Interno Y Demolición)	UND	41,00		7,00
1,10	Retiro de Cajillas Medidor Acueducto Existentes.	UND	46,00		-
1,11	Desmonte De Poste Alumbrado Publico	UND	10,00		-
1,12	Desmantelamiento De Redes En Postes De Alumbrado Publico	UND	10,00		-
1,13	Demolición de Cercamo	ML	41,00		-
1,14	Desmonte De Señales Verticales De Transito	UND	44,00		21,00
1,15	Demolición Reductor de Velocidad E=0.15 A=1.0	ML	17,60		-
	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
2,1	Excavación Manual En Conglomerado H=0.0-2.0 M (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)		141,5		-
2,2	Excavacion Manual en Material Comun H=0,0-2,0M (Incluye Retiro de Sobrantes a una Distancia Menor de 5 km)	M3	1.273,50		-
2,3	Excavaciones Varias a Maquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)	M3	5.610,00		-
2,4	Transporte De Materiales Prov. De Explanación, Canales, Prestamos, Sobre acarreos Y Derrumbes	M3-KM	224.022,00		-
2,5	Derechos de disposicion final en escombrera certificada	M3	7.400,00	300,00	1.050,00
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
3,1	Compactacion de la Subrasante	M2	9.348,00		-
3,2	Control Topografico de Niveles de Excavacion y de la Estructura de Pavimento	M2	18.298,00		-

3.3	Sub-Base Granular (Norma INVIAS 320) para nivelacion y fallos (E=0,15m)	M3	1.402,00		-
3.4	Base Granular (Norma INVIAS 330) (E=0,15m)	M3	1.011,47		-
3.5	Pavimento Rígido En Concreto MR 40 (40 KG/CM2) (E=0,20m)	M3	1.434,47		-
3.6	Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 PSI	KG	19.699,00		-
3.7	Sellado De Juntas En Pavimento De Concreto Rígido (Incluye Limpieza, Suministro E Instalación De Fondo Y Sellante)	ML	2.383,00		-
3.8	Estampado, Endurecido Y Sellado De Superficie en Concreto	M2	528,00		-
3.9	Suministro E Instalación De Geotextil T 2400 (Estabilización, Filtro Y Separación)	M2	5.454,12		-
3.10	Corte de Pavimento En Concreto Con Disco Diamantado	ML	6.602,00		-
3.11	Suministro e instalacion COLOR CONCRETO VERDE PINO C-144 PARA CICLOVIA, dosificacion 6kg/m2 de incorporacion manual acabado concreto rustico, incluye sellador de concreto ECO.	M2	1.202,00		-
	ANDENES Y SARDINELES	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
4.1	Relleno Tipo 7 "Arena De Peña"	M3	248,00		-
4,2	Suministro e instalacion loseta de cemento 40 x 40 textura color tipo alfa	M2	1.878,00		-
4,3	Suministro e instalacion loseta de cemento 40 x 40 sin textura color tipo alfa	M2	1.555,00		-
4,4	Suministro e instalacion loseta de cemento 40 x 40 toperol color tipo alfa	ML	1.332,00		-
4,5	Adoquín De Arcilla 20x10x8cm	M2	1.812,00		-
4,6	Suministro e instalacion de gramoquín peatonal	M2	70,00		-
4,7	Andén Concreto 3000 Psi En Sitio E=0.1m	M2	177,00		-
4,8	Bordillo Prefabricado A-80	ML	3.289,00		-
4,9	Sardinel Prefabricado A-10	ML	2.204,80		-
	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
5.1	Localizacion y replanteo de redes	ML	407,15		407,15
5,2	Excavaciones Varias a Maquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)	M3	5.083,70	4.133,37	5.083,70
5,3	Entibado Tipo 2 (1/7 Utilizaciones)	M2	2.636,94	1.574,58	2.636,94
5,4	Transporte De Materiales Prov. De Explanación, Canales, Prestamos, Sobre acarreos Y Derrumbes	M3-KM	55.509,74	38.902,23	66.352,23
5,5	Relleno en Tipo 2 "Recebo"	M3	2.843,31	2.396,80	2.843,31
5,6	Relleno Tipo 5 "triturado grueso"	M3	370,00		-

5,7	Relleno Tipo 7 "Arena De Peña"	M3	1.603,43	1.390,56	1.603,43
5,8	Tuberia PVC Alcantarillado 10"	ML	13,20	13,20	13,20
5,9	Tuberia PVC Alcantarillado 12"	ML	51,00	6,00	51,00
5,1	Tuberia PVC Alcantarillado 16"	ML	23,20		23,20
5,11	Tuberia PVC Alcantarillado Reforzado 24"	ML	117,80		117,80
5,12	Tuberia PVC Alcantarillado Reforzado 36"	ML	147,10	147,10	147,10
5,13	Tuberia PVC Alcantarillado 42"	ML	68,20	68,20	68,20
5,14	Suministro e instelación silla Yee PVC de 6X12"	UND	32,00		-
5,15	Suministro e instalación de Codo 45° PVC 6"	UND	32,00		-
5,16	Placa de Fondo Pozo d=1.7m, e=0.25m (concreto 3000psi con refuerzo)	UND	5,00		-
5,17	Cilindro pozo en ladrillo tolete, dI=1.20m e=0.25m (inc. Pañete interno e=1.5cm y cañuela)	ML	12,96		-
5,18	Cubierta Pozo D= 1.7m, E=0.20m Concreto 3000 Psi Con Refuerzo (No Incluye Aro Y Tapa Hf)	UND	7,00		-
5,19	Aro en acero y Tapa en Polipropileno de alto impacto, para pozos de inspeccion.	UND	7,00		-
5,20	Marco Tapa Caja De Inspección	UND	32,00		-
5,21	Caja De Inspección De 80x80	UND	6,00	2,00	2,00
5,22	Caja Contador De Agua	UND	32,00		-
5,23	Sumidero Fundido en Sitio Reforzado de una sola camara, incluye marco y rejilla en metalica	UND	32,00		-
5,24	Construccion de Sumidero tipo carcamo medidas 0.4 m x 0.7m (interno) y paredes de 0.15m en concreto 3000 PSI incluye rejilla metalica	ML	40,00		-
5,25	Concreto f'c=3500 PSI (bases) para Camara de Inspeccion	M3	2,21		-
5,26	Concreto f'c=3500 PSI (Elevaciones) para Camara de Inspeccion	M3	10,84		-
5,27	Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 PSI	KG	400,00		-
	MOBILIARIO URBANO	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
6.1	Suministro E Instalación De Banca Urbana Ver Detalle Incluye Dado De Soporte	UND	14,00		-
6.2	Banca En Concreto M-40	UND	20,00		-
6.3	Bolardo M-63 Alto/Hierro	UND	83,00		-
6.4	Suministro E Instalación Caneca Urbana Ver Detalle Incluye Dado De Soporte	UND	20,00		-
6,5	Suministro E Instalación De Paradero De Bus Ver Detalle	UND	1,00		-
6,6	Suministro E Instalación De Caseta De Ventas Ver Detalle	UND	1,00		-

6,7	Suministro E Instalación De Mogador Informativo	UND	1,00		-
6,8	Ciclo Parqueadero M100 Tipo 1	UND	5,00		-
	PASAJISMO	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
7,1	Contenedor de raices en tuberia corrugada PVC 36" x 1 metro de desarrollo	UND	20,00		-
7,2	Contenedor de raices en tuberia corrugada PVC 24" x 1 metro de desarrollo	UND	12,00		-
7,3	Suministro E Instalación De Arboles H=1.50 m	UND	110,00		-
7,4	Poda De Mantenimiento, Poda Radicular y Conflicto Con Redes. (De 2 a 14 mts de altura)	UND	29,00		-
7,5	Apeo de Árboles (Tala, Remoción y Transporte de Material Descartado, De 3 a 12 mts de altura)	UND	78,00	39,00	39,00
7,6	Relleno En Tierra Negra	M3	45,00		-
7,7	Grama zonas verdes	M2	1.130,00		-
	ALUMBRADO PUBLICO	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
8,1	Suministro e instalacion de poste metalico de 8.5 metros de altura, troncoconico, Diametro cima: 127mm y Diametro Base: 170mm certificado con retilap, incluye Cimentacion en concreto reforzado, sistema de puesta a tierra y doble proposito (para dos luminarias).	UND	72,00		-
8,2	Suministro e instalacion de sistema solar para dos luminarias de 30 y 60W. Incluye paneles solares con soporte, una luminaria de 60W y una luminaria de 30W, cofre, controlador de carga, baterias, protecciones de DC, conectores MC4 y cableado de conexión.	UND	72,00		-
	SEÑALIZACIÓN	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
9,1	Líneas De Demarcación Con Pintura En Frío	ML	2.781,00		-
9,2	Marca Vial Con Pintura En Frío	M2	97,00		-
9,3	Señal De Tránsito Grupo I 0.75x0.75m, Poste 3.5m	UND	40,00		-
9,4	Suministro e Instalación Separador de Carril Tipo B 0,78x0,20x0,15 Material: Polietileno de Alta densidad con estabilizador UV Resistencia: 50 toneladas. Reflectivos: 4 ojos por cara (Incluye: 4 Tornillos en Acero inoxidable de1/2" de Ancho y 5 Tornillos en Acero inoxidable de 1/2# de Largo)	UND	528,00		-
9,5	Suministro e Instalación de Taches Reflectivos Unidireccionales	UND	1.723,00		-
	PGIO				-

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

7.2 INFORMES SEMANALES

Ricaurte
CON EQUIDAD, SEGURIDAD Y COMPROMISO SOCIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Paola Rodriguez Alcala

REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA

El presente informe corresponde:	20 DE NOVIEMBRE DEL 2023	AL	26 DE NOVIEMBRE DE 2023	INFORME No:	6

CONTRATO:	Contrato No.403 de 2023	VALOR:	$ 11.302.197.879,00	PLAZO INCIAL:	SIETE (07) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO DIAGONAL RC	NIT:	901.746.184-7	PLAZO FINAL:	SIETE (07) MESES
OBJETO:	PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA			FECHA DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
SUPERVISOR:	DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ				

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	17/10/2023	SIETE (07) MESES	$ 11.302.197.879,00	
BALANCE DE MAYORES Y MENORES No.01	17/11/2023		$ 11.302.197.879,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO DIAGONAL RC	OBJETO:	PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA
REP. LEGAL:	LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO		
CONTRATO No:	Contrato No.403 de 2023		
VALOR COSTO DIRECTO:	$ 11.302.197.879,00	FECHA DEL CONTRATO	31 DE AGOSTO DEL 2023
VALOR ADICIONAL:		CONVENIO	
VALOR TOTAL:	$ 11.302.197.879,00		
EJECUTADO:		FECHA ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES		
PLAZO ADICIONAL 1:		FECHA ACTUAL DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
TOTAL PLAZO:	SIETE (07) MESES	ACTA MODIFICATORIA N°1	
		ACTA ADICIONAL N°1	
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	PRORROGA N°1	PRORROGA N°2
		REINICIO N°1	
Recurso Humano/Equipo/Materiales	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	SEÑALIZACION	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO,	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	17/10/2023	SIETE (07) MESES	$ 626.317.157,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA:	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ	OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"
REP. LEGAL:	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ		
CONTRATO No:	413-2023		
VALOR INCIAL :	$ 626.317.157,00	FECHA DE CONTRATO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR ADICIONAL:		CONVENIO	
VALOR TOTAL:	$ 626.317.157,00		
EJECUTADO:	$ -	FECHA ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES		
PLAZO ADICIONAL 1:		FECHA ACTUAL DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
TOTAL PLAZO:	SIETE (07) MESES	ACTA ADICIONAL N°2	
		SUSPENSIÓN N°1	
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	PRORROGA N°1	PRORROGA No-02
		REINICIO N°1	
Recurso Humano/Equipo/Materiales	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	SEÑALIZACION	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA



	VALORES	PORCENTAJES
VR. TOTAL DE LA INTERVENTORIA	$ 626.317.157,00	100,00%
VR. TOTAL EJECUTADO INTERVENTORIA	$ 121.222.675,56	19,35%



VALORES EJECUTADOS POR LA INTERVENTORIA

SEMANA	VR. EJECUTADO	PERIODO DE EJECUCION	% EJECUTADO
1	$ 20.203.779,26	17/10/2023 AL 22/10/2023	3,23%
2	$ 20.203.779,26	23/10/2023 AL 29/10/2023	3,23%
3	$ 20.203.779,26	29/10/2023 AL 05/11/2023	3,23%
4	$ 20.203.779,26	06/11/2023 AL 12/11/2023	3,23%
5	$ 20.203.779,26	13/11/2023 AL 19/11/2023	3,23%
6	$ 20.203.779,26	20/11/2023 AL 26/11/2023	3,23%
TOTAL ACUMULADO	$ 121.222.675,56		19,35%

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE OBRA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA

CONSORCIO DIAGONAL RC	Programado			Avance Real EJECUTADO		
MES: NOVIEMBRE	Programado Semanal	Programado Acumulado	(%)	Avance Ejecutado Semanal	Avance Real Acumulado	(%)
17/10/2023 AL 22/10/2023	$ 8.438.276,67	$ 8.438.276,67	0,07%	$ 2.252.208,00	$ 2.252.208,00	0,02%
23/10/2023 AL 29/10/2023	$ 127.464.832,17	$ 135.903.108,83	1,13%	$ 76.175.042,00	$ 78.427.250,00	0,67%
29/10/2023 AL 05/11/2023	$ 145.186.491,33	$ 281.089.600,17	1,28%	$ 98.276.735,00	$ 176.703.985,00	0,87%
06/11/2023 AL 12/11/2023	$ 134.838.304,46	$ 415.927.904,63	1,19%	$ 87.340.257,00	$ 264.044.242,00	0,77%
13/11/2023 AL 19/11/2023	$ 290.143.265,08	$ 706.071.169,71	2,57%	$ 35.206.424,00	$ 299.250.666,00	0,31%
20/11/2023 AL 26/11/2023	$ 333.699.741,00	$ 1.039.770.910,71	2,95%	$ 401.128.675,00	$ 700.379.341,00	3,55%
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO			9,20%	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		6,20%

TABLA VALORES ACUMULADOS

	COSTO DIRECTO	COSTO TOTAL	(%) PORCENTAJE
PROGRAMADO	$ 1.039.770.910,71	$ 1.039.770.910,71	9,20%
EJECUTADO	$ 700.379.341,00	$ 700.379.341,00	6,20%

PORCENTAJE CONTRACTUAL EJECUTADO COSTO DIRECTO



	VALORES COSTO DIRECTO	PORCENTAJES
VR. TOTAL DE OBRA	$ 11.302.197.879,00	100,00%
VR. TOTAL EJECUTADO DE OBRA	$ 700.379.341,00	6,20%



Actualmente se presenta un avance de obra de un 6,20%




PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
9,20%	6,20%	-3,00%

ACTUALMENTE SE PRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE 3,00%

ATRASO PRESUPUESTO :	-$ 339.391.569,71	ATRASO EN DIAS:	- 6,40	PORCENTAJE DE OBRA:	6,20%

VR. PROGRAMADO VS VR. EJECUTADO (COSTO DIRECTO)



VALOR TOTAL	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO
$ 11.302.197.879,00	$ 1.039.770.910,71	$ 700.379.341,00

ACTUALMENTE SE PRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE $339.385.857,71

CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD	VALOR	PORCENTAJE DE AVANCE ITEM SEMANAL — ESTADO DE ACTIVIDAD: CULMINADA	EJECUCION
EXPLANACION Y EXCAVACIONES					
Derechos de disposicion final en escombrera certificada	150,00	M3	$ 1.854.750,00		
ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS					
Excavaciones Varias a Maquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)	1025,77	M3	$ 26.321.258,00		X
Entibado Tipo 2 (1/7 Utilizaciones)	658,99	M2	$ 29.067.390,00		
Transporte De Materiales Prov. De Explanación, Canales, Prestamos, Sobre acarreos Y Derrumbes	9225,55	M3-KM	$ 14.760.880,00		X
[illegible]o en Tipo 2 "Recebo"	599,19	M3	$ 73.885.520,00		X
Relleno Tipo 7 "Arena De Peña"	347,64	M3	$ 36.853.664,00		X
Tuberia PVC Alcantarillado 12"	8,00	ML	$ 1.282.128,00		X
Tuberia PVC Alcantarillado Reforzado 36"	86,2	ML	$ 148.582.854,00		X
PAISAJISMO					
Apeo de Árboles (Tala, Remoción y Transporte de Material Descartado, De 3 a 12 mts de altura)	39,00	UND	$ 68.520.231,00		X
		TOTAL	**$ 401.128.675,00**		

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

SEÑALIZACIÓN (TIPO)	CANTIDAD	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	SI	NO
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS		CASCOS	X	
SENDERO PEATONAL		BOTAS	X	
PROHIBIDO FUMAR		GUANTES	X	
LUGAR EN ORDEN Y ASEO		GAFAS	X	
REGLAS DE SEGURIDAD	1 UN	TAPABOCAS	X	
UBICACIÓN DE LA CAMILLA				

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL








OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

PARA ESTA SEMANA EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ES DE 6,20% CON RESPECTO A UN PORCENTAJE PROGRAMADO DE 9,20%. POR TAL RAZON LA OBRA PRESENTA UN ATRASO DEL 3,00%.

CONTINUAN ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE RED PLUVIAL DESDE LA CALLE 10 HASTA EL POZO 8 (EXISTENTE) CONCONCRETO Y SE DA INICIO ACTIVIDADES DE APEO DE ARBOLES UBICADOS EN EL SEPARADOR EXISTENTE TENIENDO EN CUENTA QUE EL DISEÑO DEL PROYECTO NO CONTEMPLA SEPARADOR.

SE REALIZA LIBERACIÓN DEL TRAMO DE INTERVENCIÓN DE RED PLUVIAL AL CONSORCIO RUTA 40 PARA EL PROYECTO "GLORIETA MANUELES" LLEGANDO AL K0+00 FRENTE AL CLUB VACACIONAL DE ETB.

SE DESARROLLAN ACTIVIDADES SIN NOVEDADES, NI INCIDENTES LABORALES, SE CUENTA CON CONDICIONES CLIMATICAS FAVORABLES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION

ING. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
CONTRATISTA
INTERVENTORIA

Ricaurte
CON EQUIDAD, SEGURIDAD Y COMPROMISO SOCIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Paola Rodriguez Alcalá

REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA

El presente informe corresponde:	27 DE NOVIEMBRE DEL 2023	AL	03 DE DICIEMBRE DE 2023	INFORME No:	7

CONTRATO:	Contrato No.403 de 2023	VALOR:	$ 11.302.197.879,00	PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO DIAGONAL RC	NIT:	901.746.184-7	PLAZO FINAL:	SIETE (07) MESES
OBJETO:	PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA			FECHA DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
SUPERVISOR:	DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ				

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	17/10/2023	SIETE (07) MESES	$ 11.302.197.879,00	
BALANCE DE MAYORES Y MENORES No.01	17/11/2023		$ 11.302.197.879,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO DIAGONAL RC	OBJETO:	PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA
REP. LEGAL:	LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO		
CONTRATO No:	Contrato No.403 de 2023	FECHA DEL CONTRATO	31 DE AGOSTO DEL 2023
VALOR COSTO DIRECTO:	$ 11.302.197.879,00	CONVENIO	
VALOR ADICIONAL:			
VALOR TOTAL:	$ 11.302.197.879,00	FECHA ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
EJECUTADO:			
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES	FECHA ACTUAL DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
PLAZO ADICIONAL 1:		ACTA MODIFICATORIA N°1	
TOTAL PLAZO:	SIETE (07) MESES	ACTA ADICIONAL N°1	
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	PRORROGA N°1	PRORROGA N°2
		REINICIO N°1	
Recurso Humano/Equipo/Materiales	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	SEÑALIZACION	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO,	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:


ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	17/10/2023	SIETE 807) MESES	$ 626.317.157,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA:	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ	OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"
REP. LEGAL:	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ		
CONTRATO No:	413-2023	FECHA DE CONTRATO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL :	$ 626.317.157,00	CONVENIO	
VALOR ADICIONAL:			
VALOR TOTAL:	$ 626.317.157,00	FECHA ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
EJECUTADO:	$ -		
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES	FECHA ACTUAL DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
PLAZO ADICIONAL 1:		ACTA ADICIONAL N°2	
TOTAL PLAZO:	SIETE (07) MESES	SUSPENSIÓN N°1	
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	PRORROGA N°1	PRORROGA No-02
		REINICIO N°1	
Recurso Humano/Equipo/Materiales	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	SEÑALIZACION	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA

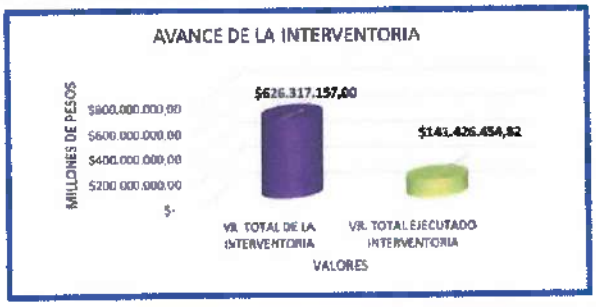

	VALORES	PORCENTAJES
VR. TOTAL DE LA INTERVENTORIA	$ 626.317.157,00	100,00%
VR. TOTAL EJECUTADO INTERVENTORIA	$ 141.426.454,82	22,58%



VALORES EJECUTADOS POR LA INTERVENTORIA

SEMANA	VR. EJECUTADO	PERIODO DE EJECUCION	% EJECUTADO
1	$ 20.203.779,26	17/10/2023 AL 22/10/2023	3,23%
2	$ 20.203.779,26	23/10/2023 AL 29/10/2023	3,23%
3	$ 20.203.779,26	29/10/2023 AL 05/11/2023	3,23%
4	$ 20.203.779,26	06/11/2023 AL 12/11/2023	3,23%
5	$ 20.203.779,26	13/11/2023 AL 19/11/2023	3,23%
6	$ 20.203.779,26	20/11/2023 AL 26/11/2023	3,23%
7	$ 20.203.779,26	27/11/2023 AL 03/12/2023	3,23%
TOTAL ACUMULADO	$ 141.426.454,82		22,58%

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE OBRA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA

CONSORCIO DIAGONAL RC	Programado			Avance Real EJECUTADO		
MES: NOVIEMBRE	Programado Semanal	Programado Acumulado	(%)	Avance Ejecutado Semanal	Avance Real Acumulado	(%)
17/10/2023 AL 22/10/2023	$ 8.438.276,67	$ 8.438.276,67	0,07%	$ 2.252.208,00	$ 2.252.208,00	0,02%
23/10/2023 AL 29/10/2023	$ 127.464.832,17	$ 135.903.108,83	1,13%	$ 76.175.042,00	$ 78.427.250,00	0,67%
29/10/2023 AL 05/11/2023	$ 145.186.491,33	$ 281.089.600,17	1,28%	$ 98.276.735,00	$ 176.703.985,00	0,87%
06/11/2023 AL 12/11/2023	$ 134.838.304,46	$ 415.927.904,63	1,19%	$ 87.340.257,00	$ 264.044.242,00	0,77%
13/11/2023 AL 19/11/2023	$ 290.143.265,08	$ 706.071.169,71	2,57%	$ 35.212.136,00	$ 299.256.378,00	0,31%
20/11/2023 AL 26/11/2023	$ 333.699.741,00	$ 1.039.770.910,71	2,95%	$ 401.128.675,00	$ 700.385.053,00	3,55%
27/11/2023 AL 03/12/2023	$ 308.543.629,10	$ 1.348.314.539,81	2,73%	$ 509.505.795,00	$ 1.209.890.848,00	4,51%
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO			11,93%	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		10,70%

TABLA VALORES ACUMULADOS

	COSTO DIRECTO	COSTO TOTAL	(%) PORCENTAJE
PROGRAMADO	$ 1.348.314.539,81	$ 1.348.314.539,81	11,93%
EJECUTADO	$ 1.209.890.848,00	$ 1.209.890.848,00	10,70%

PORCENTAJE CONTRACTUAL EJECUTADO COSTO DIRECTO



	VALORES COSTO DIRECTO	PORCENTAJES
VR. TOTAL DE OBRA	$ 11.302.197.879,00	100,00%
VR. TOTAL EJECUTADO DE OBRA	$ 1.209.890.848,00	10,70%



Actualmente se presenta un avance de obra de un 10,70%



PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
11,93%	10,70%	-1,22%

ACTUALMENTE SE PRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE 1,22%

ATRASO PRESUPUESTO :	-$ 138.423.691,81	ATRASO EN DIAS:	- 2,61	PORCENTAJE DE OBRA:	10,70%

VR. PROGRAMADO VS VR. EJECUTADO (COSTO DIRECTO)



VALOR TOTAL	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO
$ 11.302.197.879,00	$ 1.348.314.539,81	$ 1.209.890.848,00

ACTUALMENTE SE PRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE $138.423.691,81

CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD	VALOR	PORCENTAJE DE AVANCE ITEM SEMANAL — ESTADO DE ACTIVIDAD: CULMINADA	EJECUCION
Derechos de disposicion final en escombrera certificada	150,00	M3	$ 1.854.750,00		
ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS					
Excavaciones Varias a Maquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)	1025,77	M3	$ 26.321.258,00		X
Entibado Tipo 2 (1/7 Utilizaciones)	658,99	M2	$ 29.067.390,00		
Transporte De Materiales Prov. De Explanación, Canales, Prestamos, Sobre acarreos Y Derrumbes	9225,55	M3-KM	$ 14.760.880,00		X
Relleno en Tipo 2 "Recebo"	599,19	M3	$ 73.885.520,00		X
Relleno Tipo 7 "Arena De Peña"	347,64	M3	$ 36.853.664,00		X
Tuberia PVC Alcantarillado Reforzado 36"	60,9	ML	$ 104.973.269,00		
Tuberia PVC Alcantarillado 42"	68,20	ML	$ 208.367.982,00		X
PGIO			$ 13.421.082,00		
		TOTAL	$ 509.505.795,00		

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

SEÑALIZACIÓN (TIPO)	CANTIDAD	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	SI	NO
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS		CASCOS	X	
SENDERO PEATONAL		BOTAS	X	
PROHIBIDO FUMAR		GUANTES	X	
LUGAR EN ORDEN Y ASEO		GAFAS	X	
REGLAS DE SEGURIDAD	1 UN	TAPABOCAS	X	
UBICACIÓN DE LA CAMILLA				

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL









OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

PARA ESTA SEMANA EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ES DE 10,70% CON RESPECTO A UN PORCENTAJE PROGRAMADO DE 11,93%. POR TAL RAZON LA OBRA PRESENTA UN ATRASO DEL 1,22%.

CONTINUAN ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE RED PLUVIAL A PARTIR DEL CENTRO VACACIONAL DE ETB HACIA EL POZO 8 (EXISTENTE), FINALIZAN ACTIVIDADES DE APEO DE ARBOLES EN EL SEPARADOR EXISTENTE.

SE DESARROLLAN ACTIVIDADES SIN NOVEDADES, NI INCIDENTES LABORALES, SE CUENTA CON CONDICIONES CLIMATICAS FAVORABLES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA ATENDER LAS OBSERVACIONES EN EL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

ACUAGYR SAS ESP REALIZA INTERVENCIÓN A LA RED PRINCIPAL DE ACUEDUCTO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR RENOVACIÓN DE LA RED A PVC.

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION

P. A. Rodriguez A.

ING. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
CONTRATISTA
INTERVENTORIA

Ricaurte
CON EQUIDAD, SEGURIDAD Y COMPROMISO SOCIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Paola Rodriguez Alcalá — INTERVENTORIA

REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA

El presente informe corresponde:	04 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL	10 DE DICIEMBRE DE 2023	INFORME No:	8

CONTRATO:	Contrato No.403 de 2023	VALOR:	$ 11.302.197.879,00	PLAZO INCIAL:	SIETE (07) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO DIAGONAL RC	NIT:	901.746.184-7	PLAZO FINAL:	SIETE (07) MESES
OBJETO:	PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA			FECHA DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
SUPERVISOR:	DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ				

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	17/10/2023	SIETE (07) MESES	$ 11.302.197.879,00	
BALANCE DE MAYORES Y MENORES No.01	17/11/2023		$ 11.302.197.879,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO DIAGONAL RC	OBJETO:	PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA
REP. LEGAL:	LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO		
CONTRATO No:	Contrato No.403 de 2023	FECHA DEL CONTRATO	31 DE AGOSTO DEL 2023
VALOR COSTO DIRECTO:	$ 11.302.197.879,00	CONVENIO	
VALOR ADICIONAL:			
VALOR TOTAL:	$ 11.302.197.879,00	FECHA ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
EJECUTADO:			
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES	FECHA ACTUAL DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
PLAZO ADICIONAL 1:		ACTA MODIFICATORIA N°1	
TOTAL PLAZO:	SIETE (07) MESES	ACTA ADICIONAL N°1	
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	PRORROGA N°1	PRORROGA N°2
		REINICIO N°1	
Recurso Humano/Equipo/Materiales	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	SEÑALIZACION	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO,	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	17/10/2023	SIETE 807) MESES	$ 626.317.157,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA:	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ	OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"
REP. LEGAL:	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ		
CONTRATO No:	413-2023	FECHA DE CONTRATO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR INCIAL :	$ 626.317.157,00	CONVENIO	
VALOR ADICIONAL:			
VALOR TOTAL:	$ 626.317.157,00	FECHA ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
EJECUTADO:	$ -		
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES	FECHA ACTUAL DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
PLAZO ADICIONAL 1:		ACTA ADICIONAL N°2	
TOTAL PLAZO:	SIETE (07) MESES	SUSPENSIÓN N°1	
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	PRORROGA N°1	PRORROGA No-02
		REINICIO N°1	
Recurso Humano/Equipo/Materiales	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	SEÑALIZACION	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA



	VALORES	PORCENTAJES
VR. TOTAL DE LA INTERVENTORIA	$ 626.317.157,00	100,00%
VR. TOTAL EJECUTADO INTERVENTORIA	$ 161.630.234,08	25,81%



VALORES EJECUTADOS POR LA INTERVENTORIA

SEMANA	VR. EJECUTADO	PERIODO DE EJECUCION	% EJECUTADO
1	$ 20.203.779,26	17/10/2023 AL 22/10/2023	3,23%
2	$ 20.203.779,26	23/10/2023 AL 29/10/2023	3,23%
3	$ 20.203.779,26	29/10/2023 AL 05/11/2023	3,23%
4	$ 20.203.779,26	06/11/2023 AL 12/11/2023	3,23%
5	$ 20.203.779,26	13/11/2023 AL 19/11/2023	3,23%
6	$ 20.203.779,26	20/11/2023 AL 26/11/2023	3,23%
7	$ 20.203.779,26	27/11/2023 AL 03/12/2023	3,23%
8	$ 20.203.779,26	04/12/2023 AL 10/12/2023	3,23%
TOTAL ACUMULADO	$ 161.630.234,08		25,81%

1000

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE OBRA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA

CONSORCIO DIAGONAL RC	Programado			Avance Real EJECUTADO		
MES: DICIEMBRE	Programado Semanal	Programado Acumulado	(%)	Avance Ejecutado Semanal	Avance Real Acumulado	(%)
17/10/2023 AL 22/10/2023	$ 8.438.276,67	$ 8.438.276,67	0,07%	$ 2.252.208,00	$ 2.252.208,00	0,02%
23/10/2023 AL 29/10/2023	$ 127.464.832,17	$ 135.903.108,83	1,13%	$ 76.175.042,00	$ 78.427.250,00	0,67%
29/10/2023 AL 05/11/2023	$ 145.186.491,33	$ 281.089.600,17	1,28%	$ 98.276.735,00	$ 176.703.985,00	0,87%
06/11/2023 AL 12/11/2023	$ 134.838.304,46	$ 415.927.904,63	1,19%	$ 87.340.257,00	$ 264.044.242,00	0,77%
13/11/2023 AL 19/11/2023	$ 290.143.265,08	$ 706.071.169,71	2,57%	$ 35.212.136,00	$ 299.256.378,00	0,31%
20/11/2023 AL 26/11/2023	$ 333.699.741,00	$ 1.039.770.910,71	2,95%	$ 401.128.675,00	$ 700.385.053,00	3,55%
27/11/2023 AL 03/12/2023	$ 308.543.629,10	$ 1.348.314.539,81	2,73%	$ 509.505.795,00	$ 1.209.890.848,00	4,51%
04/12/2023 AL 10/12/2023	$ 276.787.252,93	$ 1.625.101.792,74	2,45%	$ 163.139.948,00	$ 1.373.030.796,00	1,44%
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO			14,38%	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		12,15%

TABLA VALORES ACUMULADOS

	COSTO DIRECTO	COSTO TOTAL	(%) PORCENTAJE
PROGRAMADO	$ 1.625.101.792,74	$ 1.625.101.792,74	14,38%
EJECUTADO	$ 1.373.030.796,00	$ 1.373.030.796,00	12,15%

PORCENTAJE CONTRACTUAL EJECUTADO COSTO DIRECTO



	VALORES COSTO DIRECTO	PORCENTAJES
VR. TOTAL DE OBRA	$ 11.302.197.879,00	100,00%
VR. TOTAL EJECUTADO DE OBRA	$ 1.373.030.796,00	12,15%



Actualmente se presenta un avance de obra de un 12,15%



PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
14,38%	12,15%	-2,23%

ACTUALMENTE SE PRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE 2,23%

ATRASO PRESUPUESTO :	-$ 252.070.996,74	ATRASO EN DIAS:	- 4,75	PORCENTAJE DE OBRA:	12,15%

VR. PROGRAMADO VS VR. EJECUTADO (COSTO DIRECTO)



VALOR TOTAL	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO
$ 11.302.197.879,00	$ 1.625.101.792,74	$ 1.373.030.796,00

ACTUALMENTE SE PRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE $252.070.996,74

CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD	VALOR	PORCENTAJE DE AVANCE ITEM SEMANAL	
				ESTADO DE ACTIVIDAD	
				CULMINADA	EJECUCION
ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS					
Excavaciones Varias a Maquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)	1025,77	M3	$ 26.321.515,00		X
Entibado Tipo 2 (1/7 Utilizaciones)	256,6	M2	$ 11.318.369,00		X
Transporte De Materiales Prov. De Explanación, Canales, Prestamos, Sobre acarreos Y Derrumbes	9225,55	M3-KM	$ 14.760.880,00		X
[illegible]o en Tipo 2 "Recebo"	599,19	M3	$ 73.885.520,00		X
Relleno Tipo 7 "Arena De Peña"	347,64	M3	$ 36.853.664,00		X
		TOTAL	$ 163.139.948,00		

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

SEÑALIZACIÓN (TIPO)	CANTIDAD	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	SI	NO
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS		CASCOS	X	
SENDERO PEATONAL		BOTAS	X	
PROHIBIDO FUMAR		GUANTES	X	
LUGAR EN ORDEN Y ASEO		GAFAS	X	
REGLAS DE SEGURIDAD	1 UN	TAPABOCAS	X	
UBICACIÓN DE LA CAMILLA				

7001

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL








OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

PARA ESTA SEMANA EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ES DE 12,15% CON RESPECTO A UN PORCENTAJE PROGRAMADO DE 14,38%. POR TAL RAZON LA OBRA PRESENTA UN ATRASO DEL 2,23%.

CONTINUAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA RED PLUVIAL, SE REALIZA RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL A PARTIR DEL CENTRO VACACIONAL DE ETB HACIA EL POZO 8 (EXISTENTE) A UN NIVEL 0,50 M CORRESPONDIENTE PARA LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.

SE DESARROLLAN ACTIVIDADES SIN NOVEDADES, NI INCIDENTES LABORALES, SE CUENTA CON CONDICIONES CLIMATICAS FAVORABLES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA ATENDER LAS OBSERVACIONES EN EL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

ACUAGYR SAS ESP CONTINUA CON ACTIVIDADES DE RENOVACIÓN DE TUBERÍA A PVC HACIA LA CARRERA 14B DE LA RED DE ACUEDUCTO EXISTENTE.

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION

ING. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
CONTRATISTA
INTERVENTORIA

Ricaurte
CON EQUIDAD, SEGURIDAD Y COMPROMISO SOCIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Paola Rodriguez Alcala

REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA

El presente informe corresponde:	11 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL	17 DE DICIEMBRE DE 2023	INFORME No:	9

CONTRATO:	Contrato No.403 de 2023	VALOR:	$ 11.302.197.879,00	PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO DIAGONAL RC	NIT:	901.746.184-7	PLAZO FINAL:	SIETE (07) MESES
OBJETO:	PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA			FECHA DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
SUPERVISOR:	DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ				

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	17/10/2023	SIETE (07) MESES	$ 11.302.197.879,00	
BALANCE DE MAYORES Y MENORES No.01	17/11/2023		$ 11.302.197.879,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO DIAGONAL RC	OBJETO:	PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA
REP. LEGAL:	LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO		
CONTRATO No:	Contrato No.403 de 2023	FECHA DEL CONTRATO	31 DE AGOSTO DEL 2023
VALOR COSTO DIRECTO:	$ 11.302.197.879,00	CONVENIO	
VALOR ADICIONAL:			
VALOR TOTAL:	$ 11.302.197.879,00	FECHA ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
EJECUTADO:			
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES	FECHA ACTUAL DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
PLAZO ADICIONAL 1:		ACTA MODIFICATORIA N°1	
TOTAL PLAZO:	SIETE (07) MESES	ACTA ADICIONAL N°1	
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	PRORROGA N°1	PRORROGA N°2
		REINICIO N°1	
Recurso Humano/Equipo/Materiales	CUMPLE__X__ NO CUMPLE_____	SEÑALIZACION	CUMPLE__X__ NO CUMPLE_____
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE__X__ NO CUMPLE_____	CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO,	CUMPLE__X__ NO CUMPLE_____

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	17/10/2023	SIETE 807) MESES	$ 626.317.157,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA:	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ	OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"
REP. LEGAL:	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ		
CONTRATO No:	413-2023	FECHA DE CONTRATO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL :	$ 626.317.157,00	CONVENIO	
VALOR ADICIONAL:			
VALOR TOTAL:	$ 626.317.157,00	FECHA ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
EJECUTADO:	$ -		
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES	FECHA ACTUAL DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
PLAZO ADICIONAL 1:		ACTA ADICIONAL N°2	
TOTAL PLAZO:	SIETE (07) MESES	SUSPENSIÓN N°1	
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	PRORROGA N°1	PRORROGA No-02
		REINICIO N°1	
Recurso	CUMPLE__X__ NO CUMPLE_____	SEÑALIZACION	CUMPLE__X__ NO CUMPLE_____
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE__X__ NO CUMPLE_____	CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL	CUMPLE__X__ NO CUMPLE_____

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA



	VALORES	PORCENTAJES
VR. TOTAL DE LA INTERVENTORIA	$ 626.317.157,00	100,00%
VR. TOTAL EJECUTADO INTERVENTORIA	$ 181.834.013,34	29,03%



VALORES EJECUTADOS POR LA INTERVENTORIA

SEMANA	VR. EJECUTADO	PERIODO DE EJECUCION	% EJECUTADO
1	$ 20.203.779,26	17/10/2023 AL 22/10/2023	3,23%
2	$ 20.203.779,26	23/10/2023 AL 29/10/2023	3,23%
3	$ 20.203.779,26	29/10/2023 AL 05/11/2023	3,23%
4	$ 20.203.779,26	06/11/2023 AL 12/11/2023	3,23%
5	$ 20.203.779,26	13/11/2023 AL 19/11/2023	3,23%
6	$ 20.203.779,26	20/11/2023 AL 26/11/2023	3,23%
7	$ 20.203.779,26	27/11/2023 AL 03/12/2023	3,23%
8	$ 20.203.779,26	04/12/2023 AL 10/12/2023	3,23%
9	$ 20.203.779,26	11/12/2023 AL 17/12/2023	3,23%
TOTAL ACUMULADO	$ 181.834.013,34		29,03%

				$	181.834.013,34	

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE OBRA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA

CONSORCIO DIAGONAL RC	Programado			Avance Real EJECUTADO		
MES: DICIEMBRE	Programado Semanal	Programado Acumulado	(%)	Avance Ejecutado Semanal	Avance Real Acumulado	(%)
17/10/2023 AL 22/10/2023	$ 8.438.276,67	$ 8.438.276,67	0,07%	$ 2.252.208,00	$ 2.252.208,00	0,02%
23/10/2023 AL 29/10/2023	$ 127.464.832,17	$ 135.903.108,83	1,13%	$ 76.175.042,00	$ 78.427.250,00	0,67%
29/10/2023 AL 05/11/2023	$ 145.186.491,33	$ 281.089.600,17	1,28%	$ 98.276.735,00	$ 176.703.985,00	0,87%
06/11/2023 AL 12/11/2023	$ 134.838.304,46	$ 415.927.904,63	1,19%	$ 87.340.257,00	$ 264.044.242,00	0,77%
13/11/2023 AL 19/11/2023	$ 290.143.265,08	$ 706.071.169,71	2,57%	$ 35.212.136,00	$ 299.256.378,00	0,31%
20/11/2023 AL 26/11/2023	$ 333.699.741,00	$ 1.039.770.910,71	2,95%	$ 401.128.675,00	$ 700.385.053,00	3,55%
27/11/2023 AL 03/12/2023	$ 308.543.629,10	$ 1.348.314.539,81	2,73%	$ 509.505.795,00	$ 1.209.890.848,00	4,51%
04/12/2023 AL 10/12/2024	$ 276.787.252,93	$ 1.625.101.792,74	2,45%	$ 163.139.948,00	$ 1.373.030.796,00	1,44%
11/12/2023 AL 17/12/2023	$ 191.523.484,41	$ 1.816.625.277,14	1,69%	$ 155.131.976,00	$ 1.528.162.772,00	1,37%
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO			16,07%	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		13,52%

TABLA VALORES ACUMULADOS

	COSTO DIRECTO	COSTO TOTAL	(%) PORCENTAJE
PROGRAMADO	$ 1.816.625.277,14	$ 1.816.625.277,14	16,07%
EJECUTADO	$ 1.528.162.772,00	$ 1.528.162.772,00	13,52%

PORCENTAJE CONTRACTUAL EJECUTADO COSTO DIRECTO



	VALORES COSTO DIRECTO	PORCENTAJES
VR. TOTAL DE OBRA	$ 11.302.197.879,00	100,00%
VR. TOTAL EJECUTADO DE OBRA	$ 1.528.162.772,00	13,52%



Actualmente se presenta un avance de obra de un 13,52%



PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
16,07%	13,52%	-2,55%

ACTUALMENTE SE PRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE 2,55%

ATRASO PRESUPUESTO :	-$	288.462.505,14	ATRASO EN DIAS:	-	5,44	PORCENTAJE DE OBRA:	13,52%

VR. PROGRAMADO VS VR. EJECUTADO (COSTO DIRECTO)



VALOR TOTAL	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO
$ 11.302.197.879,00	$ 1.816.625.277,14	$ 1.528.162.772,00

ACTUALMENTE SE PRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE $288.462.505,14

CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD	VALOR	PORCENTAJE DE AVANCE ITEM SEMANAL ESTADO DE ACTIVIDAD	
				CULMINADA	EJECUCION
ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS					
Excavaciones Varias a Maquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)	1056,05	M3	$ 27.098.243,00		X
Transporte De Materiales Prov. De Explanación, Canales, mos, Sobre acarreos Y Derrumbes	9225,55	M3-KM	$ 14.760.880,00		X
Relleno en Tipo 2 "Recebo"	599,22	M3	$ 73.889.219,00		X
Relleno Tipo 7 "Arena De Peña"	347,64	M3	$ 36.853.664,00		X
Tuberia PVC Alcantarillado 10"	13,2	ML	$ 1.471.496,00		X
Caja De Inspección De 80x80	2,00	UND	$ 1.058.474,00		X
		TOTAL	$ 155.131.976,00		

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

SEÑALIZACIÓN (TIPO)	CANTIDAD	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	SI	NO
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS		CASCOS	X	
SENDERO PEATONAL		BOTAS	X	
PROHIBIDO FUMAR		GUANTES	X	
LUGAR EN ORDEN Y ASEO		GAFAS	X	
REGLAS DE SEGURIDAD	1 UN	TAPABOCAS	X	
UBICACIÓN DE LA CAMILLA				

1004


REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL







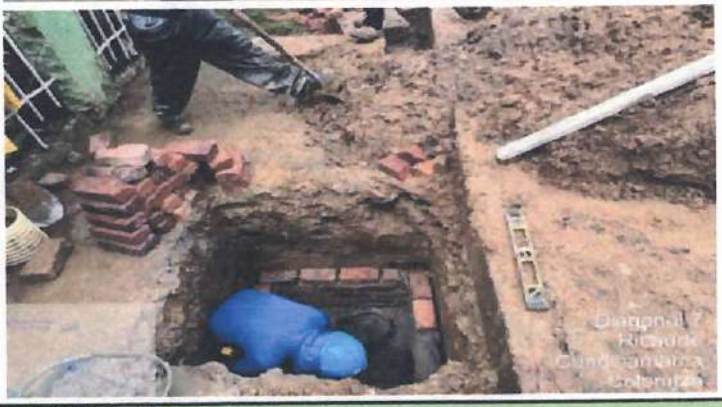

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

PARA ESTA SEMANA EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ES DE 13,52% CON RESPECTO A UN PORCENTAJE PROGRAMADO DE 16,07%. POR TAL RAZON LA OBRA PRESENTA UN ATRASO DEL 2,55%.

DURANTE LA PRESENTE SEMANA CONTINUARON ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN, ENTIBADO, RELLENOS, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN Y INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA RED PLUVIAL

SE DESARROLLAN ACTIVIDADES SIN NOVEDADES, NI INCIDENTES LABORALES, SE CUENTA CON CONDICIONES CLIMATICAS FAVORABLES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

A LA FECHA NO HAN SIDO ATENDIDAS LAS SOLICITUDES DE DEFINICIÓN DE ACOMETIDAS PLUVIAL/SANITARIA DE LOS PREDIOS EN DESARROLLO URBANISTICO FUTURO O SIN CONEXIÓN A LA REDES EXISTENTES PARA EVITAR AFECTACIONES AL PAVIMENTO.

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION

ING. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
CONTRATISTA
INTERVENTORIA

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

7.3 REGISTRO FOTOGRAFICO

Paola Rodriguez Alcalá	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 413-2023 REGISTRO FOTOGRÀFICO**	INTERVENTORIA DIAGONAL SEPTIMA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 403 DE 2023
" PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA".

FECHA: 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023

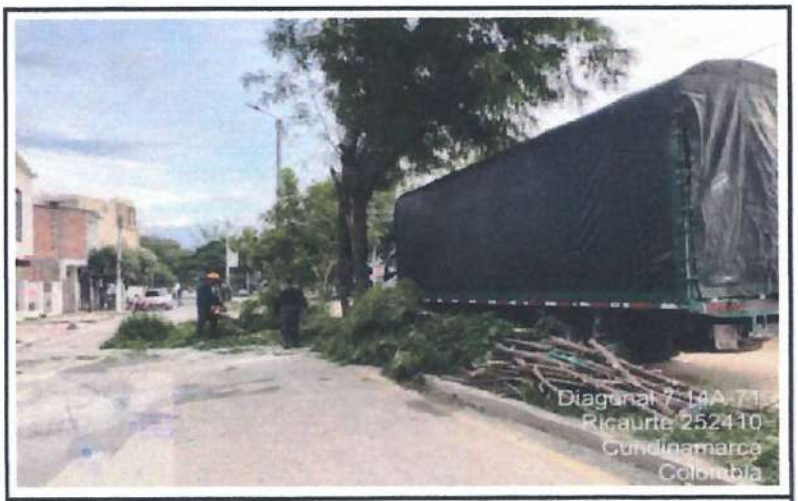


Foto 1. Apeo de Árboles (Tala, Remoción y Transporte de Material Descartado, De 3 a 12 mts de altura)



Foto 2. Actividades de instalación de red pluvial correspondiente al capitulo 5.

Paola Rodriguez Alcalá	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 413-2023 REGISTRO FOTOGRÀFICO**	INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 403 DE 2023

" PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA".

FECHA: 17 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023



Foto 3. Transporte de materiales provenientes de explanación, canales, derrumbes.



Foto 4. Relleno en recebo

Paola Rodriguez Alcalá	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 413-2023 REGISTRO FOTOGRÀFICO**	INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 403 DE 2023

" PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA".

FECHA: 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023



Foto 5. Entibado tipo 2 e instalación de tubería.



Foto 6. Apeo de Árboles (Tala, Remoción y Transporte de Material Descartado, De 3 a 12 mts de altura)

Paola Rodriguez Alcalá	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 413-2023 REGISTRO FOTOGRÀFICO**	INTERVENTORIA DIAGONAL SEPTIMA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 403 DE 2023

" PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA".

FECHA: 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023



Foto 7. Excavaciones varias a maquina sin clasificar.



Foto 8. Caja de inspección de 80x80

Paola Rodríguez Alcalá	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 413-2023 REGISTRO FOTOGRÀFICO**	INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 403 DE 2023
" PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA".

FECHA: 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023



Foto 9. Apeo de Árboles (Tala, Remoción y Transporte de Material Descartado, De 3 a 12 mts de altura)



Foto 10. Entibado tipo 2 e instalación de tubería.

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Estructuras Vías y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

7.4 ESTADO DEL CLIMA

Paola Rodriguez Alcalá

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 10 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA"

INTERVENTORIA

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA RICAURTE

SUPERVISOR: INGENIERA ELENA CORTES LOPEZ

PERIODO: NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONTRATO No: No. 413 de 2021

CONTRATISTA: PAOLA RODRIGUEZ ALCALÁ

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 10 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA"

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DIA	7:00 a 8:00	8:00 a 9:00	9:00 a 10:00	10:00 a 11:00	11:00 a 12:00	12:00 a 13:00	13:00 a 14:00	14:00 a 15:00	15:00 a 16:00	16:00 a 17:00
17	*	*	*	*	*	O	O	O	O	O
18	*	*	*	*	X	X	X	X	X	X
19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

SOLEADO	X
NUBLADO	O
LLUVIOSO	*
DIAS NO LABORADOS	-

PAOLA A. RODRIGUEZ ALCALÁ
INTERVENTORÍA

2101

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

7.5 CONTROL DE EQUIPO Y MAQUINARIA

Paola Rodríguez Alcalá

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
DEPARTAMENTO DEL CUNDINAMARCA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA"

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA

FECHA 16 DICIEMBRE 2023

ENTIDAD EJECUTORA ALCALDIA DE RICAURTE CUNDINAMARCA **SUPERVISOR** DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES 2 **CONTRATO No.** 413 DE 2023 **PROYECTO** "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA CONSORCIO DIAGONAL RC

DIA	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MAQUINA	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
RETRO EXCAVADORA ORUGA	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA 1	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA 2	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	A
VIBRADOR DE CONCRETO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MEZCLADOR DE CONCRETO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MOTONIVELADORA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VIBRO COMPACTADOR	NA	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	A
CARROTANQUE	NA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

CONVENCIONES

ACTIVO = A
REPARACION = R
INACTIVO = I
NO APLICA. NA

INTERVENTORÍA No. 413-2023
PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
REPRESENTANTE LEGAL

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

7.6 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SOPORTES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

INFORME DE INTERVENTORIA No. 02
SEGUIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Contrato de Obra No. 403 de 2023 - pavimentación y embellecimiento de la diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte – Cundinamarca.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 413 DE 2023

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCERA Y AMBIENTAL PARA "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA

PERIODO DE 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023
RICAURTE – CÚNDINAMARCA

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe pretendo dar a conocer las actividades y gestiones realizadas desde la interventoría de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo los parámetros establecidos y la normatividad vigente que garantice a los trabajadores el desarrollo de sus labores en condiciones óptimas y seguras con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para el buen desarrollo del proyecto

.

2. OBJETIVO

Dar a conocer la gestión realizada de interventoría en la Diagonal 7, en Seguridad y Salud en el Trabajo, en el desarrollo de las actividades laborales que tiene por objeto **"PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

2.1. OBJETIVOS GENERALES

- Continuar con el seguimiento de todas las actividades realizadas en la obra para que se efectúen cumpliendo todas las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Seguimiento continuo de las recomendaciones y los hallazgos encontrados.
- Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo.
- Verificación del pago de la panilla de la Seguridad social del personal obra.
- Seguimiento al PGIO SST (Lista de verificación- cumplimiento).

3. PERSONAL DE OBRA.

Durante el periodo se evidencia el siguiente personal:

- **Administrativo.**

ITEM	NOMBRE	CARGO
1	AITOR MIRENA LARRAURI ECHEVARRIA	DIRECTOR DE OBRA
2	CARLOS ANDRES NIETO LAGUNA	ASESOR DE PAVIMENTOS
3	SERGIO LEAL TOVAR	RESIDENTE DE OBRA
4	JORGE EDWIN FABER SANCHEZ MARROQUIN	ASESOR SISO
5	OSCAR RODRIGUEZ VASQUEZ	TÉCNICO EN TOPOGRAFIA
6	ROSA INES PULECIO GUZMÁN	TRABAJADORA SOCIAL
7	ALVARO ANGEL BALLESTAS ROBINSON	PROFESIONAL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

- **Personal Operativo de obra del consorcio.**

ITEM	NOMBRE	CARGO
1	YENIT YANETH QUINTERO SALGUERO	AUXILAR TRABAJADORA SOCIAL
2	SEBASTIAN RAMIREZ AVILA	ING AUXILIAR RESIDENTE
3	YULI NATALIA RODRIGUEZ SANTOS	AUXIIAR. INSP. SST
4	ALEXANDER GUZMAN BOCANEGRA	AUX DE OBRA
5	ANDRES ALFONSO AMAYA RODRIGUEZ	AUX DE OBRA
6	JOSE EDISON BUSTOS PRADA	AUX TOPOGRAFO

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

➢ **Personal del Subcontratista**

ITEM	NOMBRE	CARGO
1	JOSE ALEXANDER PULIDO	CONTRATISTA
2	ANDRESITO GUTIERREZ	OFICIAL DE OBRA
3	JHON ANTONIO RODRIGUEZ	MAESTRO DE OBRA
4	ERMIDES RUGELES	OP. RETROEXCAVADORA
5	FELIX ANDRES GUERRA	AUX OBRA
6	JOSE EDWIN ARIAS	OP. MNICARGADOR
7	ADELMO CELIS CAMPO	AUX OBRA
8	RAFAEL BLADIMIRO	AUX OBRA
9	CINDY LORENA NIETO	OP. RETROEXCAVADORA
10	JOSE ROLANDO BARRIOS	OFICIAL DE OBRA
11	EDNA MILENA MARTINEZ	TOPOGRAFIA
12	ALEXANDER GARCIA	CONDUCTOR DE VOLQUETA
13	JHON JAIRO LOZANO RUIZ	CONDUCTOR DE VOLQUETA
14	JUA CARLOS CASTAÑEDA	CONDUCTOR DE VOLQUETA
15	FABIAN GARCIA CARVAJAL	CONDUCTOR DE VOLQUETA
16	ARCESIO LOZANO	RADICACIÓN DE ESPECIES
17	RAFAEL LOZANO	RADICACIÓN DE ESPECIES

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

4. ACTIVIDADES DEL PROYECTO REALIZADAS EN EL PERIODO ALCANTARILLADO -SUMIDEROS Y POZOS

4.1. EXCAVACIONES



4.2. INSTALACIÓN RED DE AGUAS LLUVIAS




Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

4.3. RELLENO Y COMPACTACIÓN





4.5 TALA DE ESPECIES ARBÓREAS.

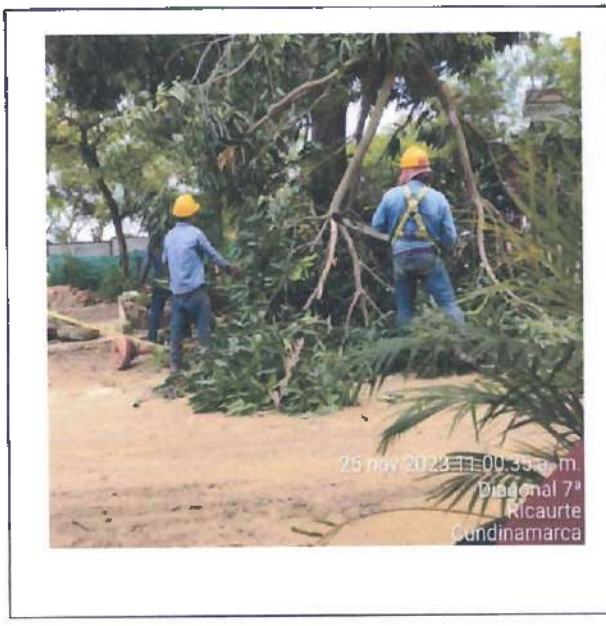



5. ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA

En el cual para esta asesoría se realizó una verificación de los siguientes aspectos:

- Requerimientos sobre señalización adecuada de paso peatonal, para los residentes y transeúntes de sector.
- Señalización de advertencia de restricción y paso vehicular.
- Orientar frente a dudas o inquietudes que surjan, durante el desarrollo de actividades planeadas por la profesional encargada de SST de la obra u otras situaciones qesurjan durante el desarrollo y ejecución del proyecto.
- Apoyo al seguimiento del PGIO SST

6. CONCLUSIONES

6.1 Positivos:

- Entrega oportuna de elementos de protección personal (EPP)
- Cumplimiento de charlas de Seguridad y Salud en el trabajo, inspecciones de seguridad.
- No se presentaron accidentes de trabajo (A.T)
- No se presentaron enfermedades laborales (E.L)
- Se cuenta con un campamento y baños para los trabajadores.
- Se evidencia señalizaciones de advertencia e informativas.

6.2. Negativos

- Falta de conexión de energía en los campamentos
- Falta de agua para el respectivo uso de los con baños para el personal.
- Se evidencia debilidad frente a los canales de comunicación por parte de la profesional de Seguridad y salud en el trabajo hacia la interventoría de SST, situación que dificulta la verificación de tareas y/o actividades a las cuales debe dar alcance durante el desarrollo de la obra. Sin embargo, se informa que desde esta interventoría se ha realizado invitación a la profesional para que facilite la información que se le solicita no solo de manera oportuna, sino que también receptiva y dispuesta.

- Debilidad frente a entrega oportuna de documentación correspondientes a los ingresos, planillas de pago se seguridad social. Lo anterior con el fin de poder verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y garantizar el buen desarrollo de la obra y bienestar de los trabajadores.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DE SST

SEÑALIZACION	DE VACIOS	SENDERO PEATONAL
		

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

CAMPAMENTO	SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA
	

Anexo: Soporte Planillas de pago de Seguridad Social del mes correspondiente.

Atentamente.

Dennis Barrero
Profesional en Seguridad y Salud Ocupacional
Lic. SO. Res. No. 7624 de 01-07-2016

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93118240		DELARRAURI ECHEVARRIA AITOR AIRENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 7 854	ESPINAL-TOLIMA	2390025	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	355204877	9460803142	N	2023/12/12	2023/12/22	BANCO DAVIVIENDA	10	$281,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre	ing ret TDE TAE TDP TAP VSP cor VST SLN IGE LMA VAC AVP VCT IRL VSP	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$278,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$278,400
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$278,400
1	CC 93118240	DE LARRAURI AITOR	A	0		$0	$0	EPS037	30	($4,000,000)	($560,000)		0	$0	$0	14-11	5	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	($560,000)
2	CC 93118240	DE LARRAURI AITOR	R C	0		$0	$0	EPS037	30	$4,000,000	$560,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	0	$0	$0	No	$778,400
Total Afiliados(1)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$278,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93118240		DELARRAURI ECHEVARRIA AITOR AIRENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 7 854	ESPINAL-TOLIMA	2390025	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	355204877	9460803142	N	2023/12/12	2023/12/22	BANCO DAVIVIENDA	10	$281,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$278,400	$2,800	$0	$281,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$278,400	$2,800	$0	$281,200
TOTAL				1	$278,400	$2,800	$0	$281,200

1023 121

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1128881	CARLOS ANDRES NIETO LAGUNA		CARRERA 8A N 32-111	3178282333	cdycons@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 - Independiente			CUNDINAMARCA	GIRARDOT		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	1	12/12/2023	73188841	$138.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	148.000	0		0		0	0	0	0	148.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23-801	Protección (INC + Protección)	800227939-3	185.000	0	0	0	0	0	0		185.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.100				6.100	0	0	6.100			61	6.100	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IDE, LNA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	148.000	148.000
Pensión	1	185.000	185.000
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	339.100	339.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

9201 1026

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1122[illegible]681	CARLOS ANDRES NIETO LAGUNA		CARRERA 8A N 32-111	3[illegible]2783	edyscar[illegible]@hotmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	GIRARDOT		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-11	1	12/12/2021	73[illegible]861	$ 338.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Estrato	Extranjero	Cotiza en Exterior	Pensionado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	INC	ELM	AVT	VCT	RET	RET	Cotiza Exterior	Cód. AFP	RPC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	RPC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	RPC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	RPC CCF	Aporte CCF	RPC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1122[illegible]681	NIETO LAGUNA CARLOS ANDRES	M	1			N																					23[illegible]	4.[illegible]	196.[illegible]	0	0	0	0	EPS037	1.158.200	845.808	14-3	1.[illegible]	1	6.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1221 1021

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5993413		SANCHEZ MARROQUIN JORGE EDWIN FABER	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av 13 #65-152	IBAGUE-TOLIMA	2721581	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	307331657	9459152789	I	2023/12/05	2023/11/30	BANCOLOMBIA	0	$182,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC 5993413	SANCHEZ JORGE	15-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF48	30	$1,160,000	$23,200	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$1,160,000**	**$23,200**			**$1,160,000**	**$28,300**		**$0**	**$0**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5913413		SANCHEZ MARROQUIN JORGE EDWIN FABER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV 12 #45-152	IBAGUE-TOLIMA	2731581	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	207333457	945952789	1	2023/12/05	2023/11/30	BANCOLOMBIA	0	$382,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
ARL SURA	14-11	830,903,790	5	1	$28,300	$0	$0	$28,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$23,200	$0	$0	$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$382,100	$0	$0	$382,100

6201 1029

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65694837		PULECIO GUZMAN ROSA INES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV 1 2 CS 16 BRR ARCABAL	ESPINAL-TOLIMA	2458861	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	255089133	9458001909	I	2023/12/12	2023/11/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$425,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$15,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,440,000**	**$230,400**			**$1,440,000**	**$180,000**			**$0**	**$0**			**$1,440,000**	**$15,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: ESPINAL Dpto: TOLIMA (1 Afiliados)					**$1,440,000**	**$230,400**			**$1,440,000**	**$180,000**			**$0**	**$0**			**$1,440,000**	**$15,100**		**$0**	**$0**
1	CC	65694837	PULECIO ROSA	2 MORI	30	$1,440,000	$230,400	EPS038	30	$1,440,000	$180,000		0	$0	$0	1414	30	$1,440,000	$15,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,440,000**	**$230,400**			**$1,440,000**	**$180,000**			**$0**	**$0**			**$1,440,000**	**$15,100**		**$0**	**$0**

1030

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65694837		PULECIO GUZMAN ROSA INES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 1-2 CS 16 BRR ARCABAL	ESPINAL-TOLIMA	2488863	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-11	335093135	9458001909	I	2023/12/12	2023/11/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$425,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,400	$0	$0	$230,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$230,400	$0	$0	$230,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,100	$0	$0	$15,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$15,100	$0	$0	$15,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$180,000	$0	$0	$180,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$180,000	$0	$0	$180,000
TOTAL				1	$425,500	$0	$0	$425,500

1037

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1031817	ALVARO ANGEL BALLESTAS ROBINSON	cra 55a #67-12 apto303	3002390025	mrbalorin@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 - Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	1	02/01/2024	73640936	$422.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS900	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	27	3.900	0	148.900	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.900	0	0	0	0	27	4.600	0	190.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830063790-5	80.600				80.600	27	2.380	83.000			864	83.000	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, INP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.800	148.900
Pensión	1	185.800	190.500
Riesgos Laborales	1	80.800	83.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	411.400	422.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1032

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	5851917	ALVARO ANGEL BALLESTAS ROBINSON	cra 85a #87-12 apto303	3002390825	mircaor0@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	03/01/2024	73840838	$422,400	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	IRL	Identificación	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor Aporte a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	5851917	BALLESTAS ROBINSON ALVARO ANGEL	57	0			N																25-14	1,100,000	165,000	0	0	0	0	EPS005	1,100,000	143,000	14-11	1,100,000	I	30,000		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1033 1C

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-14, 02:38:09 PM **Tipo Planilla:** I PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1059088683

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023 **Referencia pago (PIN):** 88100789945

PAGADO 14/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERGIO MAURICIO LEAL TOVAR		
Documento	CC11314477	**Dirección**	CL 0 #0 - 0 MZ 8 C 15 LOS CAMBULOS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3204106045
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Afiliado y Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CUN	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días ERP	Días ADC	Días TDP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	Días Cotiz.	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte SENA	Aporte Min Educación	Total
CC 11314477	SERGIO MAURICIO LEAL TOVAR	59	00																		0	30	0	0	23 PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	EPS051 EPS SANITAS	$ 1.600.000	$ 360.000	0,522	30	$ 0	54 CAJA COLOMBIANA COOP	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.000	$ 0	$ 456.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4440634 - Cali: 602 5548577 - Medellín: 604 51-00687 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3482582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 871 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protejer el medio ambiente está en nuestras manos.

1034

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	33126735	OSCAR RODRIGUEZ VASQUEZ		CALLE 7 65-1	2390125	marcos@miplanilla.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente			TOLIMA	ESPINAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2023-11	2023-11	1	11/12/2023	73185823	TOTAL A PAGAR	
					330 600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS302	Salud Total EPS	830113830-4	145.800	0		0		0	0	0	0	145.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230501	Proteccion (INC + Proteccion)	800229739-0	185.800	0	0	0	0	0	0		185 800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Ibc Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Solidaridad Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. A Siados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor Aportes de ICBE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.800	145.800
Pensión	1	185.800	185.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	330.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

COPIA

1035

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	93125735	OSCAR RODRIGUEZ VASQUEZ		CALLE 7 #51	2280025	[redacted]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente			TOLIMA	ESPINAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					SUPLENTES	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	1	11/12/2025	73185523	$320.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			ICCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos + Nombres	Extranjero	Colombiano en el exterior	Cotizante exterior	Cotizante Dependiente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Variación Tarifa	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días cot. / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotizantes	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte MEAP	Aporte MEO
1	CC	93125735	RODRIGUEZ VASQUEZ OSCAR	X	0		N																	230401	1.160.000	166.900	0	0	0	17302	1.160.000	145.010				0		0		0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1036

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-11 04:20:14 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numero Planilla: 1058872474

Periodo Cotización: noviembre de 2023 Periodo Servicio: noviembre de 2023 Referencia pago (PIN): 86 0068043

PAGADO 09/12/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YENIT YANETH QUINTERO SALGUERO		
Documento	CC1063174262	**Dirección**	MANZANA E CASA 10 B/VILLA CAROLINA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3144110756
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	RICAURTE	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Cód Ciu Cot/Pen	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	Días ADC	Días EFS	Días ADP	Días CEF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Mi Educación	Total
CC 1063 [illegible] 4262	YENIT YANETH QUINTERO SALGUERO	03	45																		0	30	30	0	230301 PORVENIR	$ 1.160.000	$ 165.600	EPS [illegible] SALUDVIDA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	0,00	$ 0	$ 0	[illegible] CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mir Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTA - SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 165.600	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.600	$ 0	$ 390.600

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4486634 - Cali: 602 8840577 - Medellín: 604 5148868 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3482582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 01 8010 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de Imprimir asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad - Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1069179194		RAMIREZ AVILA SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 16 N 5 - 48 CENTRO RICAURTE	RICAURTE - CUNDINAMARCA	3050967	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	69338521	9459743814	I	2023/12/26	2023/11/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$910,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,321,334	$211,500			$1,321,334	$165,200			$1,321,334	$26,500			$1,321,334	$6,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,321,334	$211,500			$1,321,334	$165,200			$1,321,334	$26,500			$1,321,334	$6,900		$0	$0
Ciudad: RICAURTE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,321,334	$211,500			$1,321,334	$165,200			$1,321,334	$26,500			$1,321,334	$6,900		$0	$0
1	CC	1069179194	RAMIREZ SEBASTIAN	232301	30	$1,321,334	$211,500	EPS002	30	$1,321,334	$165,200	CCF32	30	$1,321,334	$26,500	14-03	30	$1,321,334	$6,900	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,321,334	$211,500			$1,321,334	$165,200			$1,321,334	$26,500			$1,321,334	$6,900		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Tipo Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciu	Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1005179994		RAMIREZ AVILA SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 15 # 5 - 48 CENTRO UBALARTE	UBALARTE	CUNDINAMARCA	8350964	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	6938523	94547630I4	I	2023/12/26	2023/11/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$410,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$211,500	$0	$0	$211,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$211,500	$0	$0	$211,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$0	$0	$6,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,500	$0	$0	$26,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$26,500	$0	$0	$26,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$165,200	$0	$0	$165,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$165,200	$0	$0	$165,200
TOTAL				1	$410,100	$0	$0	$410,100

2023/11/14 01:11 PM

1039

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-07, 04:09:21 AM Tipo Planilla: E PLANILLA INDEPENDIENTES Numero Planilla: 1055668382

Periodo Cotización: noviembre de 2023 Periodo Servicio: noviembre de 2023 Referencia pago (PIN): 88' 0148753

PAGADO 06/12/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YULI NATALIA RODRIGUEZ SANTOS		
Documento	CC1070620389	Dirección	CL 0 #0 - 0 SAN MIGUEL
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3214734574
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOT	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																			Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	SMAP	Aporte Minsalud	Total
CC 1070620389	YULI NATALIA RODRIGUEZ SANTOS	03	00																			05-11 COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS005 EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	0,003	$ 0	$ 0	R.CAFAM COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTA . SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 145.000	$ 0	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.800	$ 0	$ 353.800

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4446834 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6439900 - Cartagena: 605 6645444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3619850 - Resto del País: 01 8000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protejer el medio ambiente está en nuestras manos

1 de 1

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-01-16, 11:57:54 AM **Tipo Planilla:** I PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1058573220

Periodo Cotización: diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8810149159

PAGADO 16/01/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALEXANDER GUZMAN BOCANEGRA		
Documento	CC1070608951	**Dirección**	CR 10 #7 - 47 ROSA BLANCA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3024881851
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																		Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1070608951	ALEXANDER GUZMAN BOCANEGRA	01	00																	0	230301 - PORVENIR	$ 1.160.000	$ 139.200	230902 - SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0.522	$ 0	$ 0	999 - CCF NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 139.200	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.000	$ 0	$ 284.000

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4446834 - Cali: 602 5548577 - Medellín: 604 5166660 - Bucaramanga: 607 6436660 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3619660 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos

Powered by CamScanner

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-22, 11:10:20 AM Tipo Planilla: E PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1059911369

Periodo Cotización: noviembre de 2023 Periodo Servicio: noviembre de 2023 Referencia pago (PIN): 8910195291

PAGADO 22/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANDRES ALFONSO AMAYA RODRIGUEZ		
Documento	CC1120738206	Dirección	CL 0 #0 - 0 VILLA CAROLINA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3144299347
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	RICAURTE	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	AST	INT P	TDE	TAE	TDP	TAP	VTP	CUR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	SMAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1120738206	ANDRES ALFONSO AMAYA RODRIGUEZ	00	00	X																	0	4	0	0	(230301) PORVENIR	$ 154,667	$ 24,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 154,667	$ 18,400	0.000	$ 0	$ 0	(NINGU) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44,200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 154,667	$ 154,667	$ 0	$ 0	$ 24,800	$ 18,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44,200	$ 900	$ 45,100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4440834 - Cali: 602 3840572 - Medellín: 604 5160868 - Bucaramanga: 607 6438808 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3818858 - Resto del País: 018000 571 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clasificación	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Depa[illegible]to	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93132880		MATOS PRADA JOSE EDINSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	URB VILLA CATALINA A 2 C1 CASA 4	ESPINAL-TOLIMA	2390015	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fechas		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	25 11743	945834663	I	2023/11/21	2023/11/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,500			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0			$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,500			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0			$0
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,500			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0			$0
1	CC	93132880	MATOS PRADA JOSE EDINSON	3	$1,160,000	$185,500	EPS017	30	$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0			$0
Total	Afiliados(1)				$1,160,000	$185,500			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0			$0

2023/11/07 04:[illegible]3 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clasificación	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Depto	Teléfono	Operado SENA e ICBF
CC 93133889		BUSTOS PRADA JOSE EDINSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	URB VILLA CATALINA M 2 C1 CASA 4	ESPINAL-TOLIMA	2390035	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-10	2023-10	25 12743	94838463*	1	2023/11/21	2023/11/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$330,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	23021	800,229,739	9	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1				1	$145,000	$0	$0	$145,000
FAMISANAR	EPS0 7	830,003,564	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$330,600	$0	$0	$330,600

2023/11/07 04:13 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901052421	9	TECO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	KR 42 CASA 9 BARRIO SANTA ISABEL	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	7895624	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	25878643	94553682186	E	2023/11/07	2023/11/07	BANCO CAJA SOCIA	0	$4,058,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF				RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	In	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	con	vst	sln	ige	lma	vac	vip	vlr	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO TOLIMA (18 Afiliados)																					$13,572,004	$1,171,900			$13,572,004	$543,400			$13,665,448	$547,100			$13,572,004		$786,100		$0	$0		$4,058,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																					$2,320,000	$37,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$92,800		$0	$0		$369,000
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)																					$2,320,000	$37,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$92,800		$0	$0		$369,000
1	CC	65774779	ACOSTA LIGIA																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS023	30	$1,160,000	$46,400	CCF50	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	$1	$284,500
2	CC	52477511	PINZON MIRIAN																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS023	30	$1,160,000	$46,400	CCF50	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	$1	$284,500
Centro de Trabajo: TAREFA 1 (16 Afiliados)																					$11,252,004	$1,800,700			$11,252,004	$450,600			$11,345,448	$454,300			$11,252,004		$783,900		$0	$0		$3,489,500
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (16 Afiliados)																					$11,252,004	$1,800,700			$11,252,004	$450,600			$11,345,448	$454,300			$11,252,004		$783,900		$0	$0		$3,489,500
3	CC	1010571089	ARIAS JOSE																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS023	30	$1,160,000	$46,400	CCF50	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	$1	$359,200
4	CC	10568850	BARRIOS JOSE	X																23030 1	8	$309,334	$49,500	EPS023	8	$309,334	$12,400	CCF50	8	$309,334	$12,400	14-23	8	$309,334	6.960%	$21,600	8	$0	$0	$1	$95,900
5	CC	80577155	CALERO JOSE	X	X														X	23030 1	13	$502,667	$80,500	EPS023	13	$502,667	$20,200	CCF50	13	$523,651	$21,000	14-23	13	$502,667	6.960%	$35,000	13	$0	$0	$1	$156,700
6	CC	93201260	CELIS ADELAO	X																23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS023	1	$38,667	$1,600	CCF50	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	$1	$12,100
7	CC	15315831	GARCIA ALEXANDER																	25 14	30	$1,160,000	$185,600	EPS023	30	$1,160,000	$46,400	CCF50	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	$1	$359,200
8	CC	1122006	GARCIA FABIAN	X																23030 1	5	$193,334	$31,000	EPS017	5	$193,334	$7,800	CCF50	5	$193,334	$7,800	14-23	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	$1	$60,100
9	CC	1077864970	GONZALEZ JHON		X														X	25 14	19	$734,667	$117,600	ESSC62	19	$734,667	$29,400	CCF50	19	$807,167	$32,300	14-23	19	$734,667	6.960%	$51,200	19	$0	$0	$1	$230,500
10	CC	10064957	GUEVARA FELIX																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS023	30	$1,160,000	$46,400	CCF50	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	$1	$359,200
11	CC	39966334	GUTIERREZ ANDREISITO	X																23030 1	13	$502,667	$80,500	EPS023	13	$502,667	$20,200	CCF50	13	$502,667	$20,200	14-23	13	$502,667	6.960%	$35,000	13	$0	$0	$1	$156,900
12	CC	1110453353	LOZANO JHON																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS023	30	$1,160,000	$46,400	CCF50	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	$1	$359,200
13	CC	51317432	MURCIA WILSON	X																23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS023	1	$38,667	$1,600	CCF50	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	$1	$12,100
14	CC	1110492182	NIETO CINDY																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS023	30	$1,160,000	$46,400	CCF50	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	$1	$359,200
15	CC	1038827?	OLAFTE ARLEY	X																23030 1	13	$502,667	$80,500	EPS023	13	$502,667	$20,200	CCF50	13	$502,667	$20,200	14-23	13	$502,667	6.960%	$35,000	13	$0	$0	$1	$156,900
16	CC	1132899?0	PULIDO JOSE																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS023	30	$1,160,000	$46,400	CCF50	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	$1	$359,200
17	CC	79975211	RODRIGUEZ JHON	X																23030 1	8	$309,334	$49,500	EPS023	8	$309,334	$12,400	CCF50	8	$309,334	$12,400	14-23	8	$309,334	6.960%	$21,600	8	$0	$0	$1	$95,900
18	CC	14298044	RUGELES ARMEDIS																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS023	30	$1,160,000	$46,400	CCF50	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	$1	$359,200
Total Afiliados(18)																					$13,572,004	$2,171,900			$13,572,004	$543,400			$13,665,448	$547,100			$13,572,004		$786,100		$0	$0		$4,058,500

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9[illegible]1421	9	TETCO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	MZ 40 CASA 9 BARRIO SANTA ISABEL	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	789624[illegible]	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	254786435	9459682386	E	2023/11/07	2023/11/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$4,058,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$2,171,900	$0	$0	$2,171,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$189,600	$0	$0	$189,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$303,200	$0	$0	$303,200
PORVENIR	230001	800,224,808	8	11	$1,225,200	$0	$0	$1,225,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$457,900	$0	$0	$457,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 8)				18	$796,100	$0	$0	$796,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	18	$796,100	$0	$0	$796,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				18	$547,100	$0	$0	$547,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	18	$547,100	$0	$0	$547,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 50)				18	$543,400	$0	$0	$543,400
ALIANZ SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$29,400	$0	$0	$29,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$7,800	$0	$0	$7,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$300,400	$0	$0	$300,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$159,400	$0	$0	$159,400
TOTAL				18	$4,058,500	$0	$0	$4,058,500

2023/11/04 10:05 AM

1046

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

7.7 SOPORTES DE SEGURIDAD Y SOCIAL INTERVENTORÍA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	28546736	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA	calle 12 no. 2 43	2623355	jack.0807@hotmail.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I -- Independiente			TOLIMA	IBAGUE	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	Y	29/01/2024	73508038	$606.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Depto	Extranjero	Cotiza exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días Ad Mesaje	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1065178487	CIFUENTES MURILLO DANIELA ALEJANDRA	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	60.800		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1065178217	MOTTA TAFUR JEILY KATHERINE	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.883.505	5	166.800		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1106099792	GUZMAN SERRANO LUIS FELIPE	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.656.100	5	115.500		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1110558992	QUINTERO ALFEREZ JUAN PABLO	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	60.800		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	39067522	BARRERO DENNIS HORTENCIA	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	60.800		0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	79854589	MORALES OLIVEROS JORGE FERNANDO	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	60.800		0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	93355314	DUEÑAS MORALES DAIRO	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	60.800		0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	93356531	CARRANZA SANCHEZ FREDY ALEXANDER	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	60.800		0	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	9869000	TIBOCHA GRANADOS JOSUE GUILLERMO	59	0			N																	0	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	5	60.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	28548738	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA		calle 12 no. 2 43	2623355	jack.0307@hotmail.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	Y	29/01/2024	73508028	$908.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	867.900				867.900	48	38.800	906.700			8.679	908.700	9

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, INP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	867.900	908.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	867.900	908.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1049

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	ECONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	28548736	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA	calle 12 no. 2 43	2623355	jadc.0307@hotmail.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente		TOLIMA	IBAGUE		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	Y	27/02/2024	74551849	$98 800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Dpto	Extranjero	Cotiz. exterior	Residente	IGE	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	13555892	VARGAS RAMIREZ FREDY GIOVANI	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-14	1.160.000	5	98.800		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1050

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	28548736	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA	calle 12 no. 2 45	2823355	jack.0307@hotmail.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	Y	27/02/2024	74551649	$88.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	80.800				80.800	77	5.800	86.600			808	86.600	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradoras	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, I.MA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	80.800	86.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	80.800	86.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28548736		RODRIGUEZ ALCALA PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 NO 3 31 APT 301 BRR BELEN	IBAGUE-TOLIMA	2732538	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fechas		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	419644335	9460950092	I	2024/01/11	2024/01/29	SCOTIABANK COLPATRIA	18	$663,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	28548736	RODRIGUEZ ALCALA PAOLA ANDREA	230201	30	$1,840,000	$294,400	EPS005	30	$1,840,000	$230,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,840,000	$128,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,840,000**	**$294,400**			**$1,840,000**	**$230,000**			**$0**	**$0**			**$1,840,000**	**$128,100**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,400	$4,800	$0	$299,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$294,400	$4,800	$0	$299,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,100	$2,100	$0	$130,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$128,100	$2,100	$0	$130,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$3,800	$0	$233,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$230,000	$3,800	$0	$233,800
TOTAL				1	$652,500	$10,700	$0	$663,200

2024/01/27 10:22 AM

1052

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28548736		RODRIGUEZ ALCALA PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 NO 3 61 APT 301 BRR BELEN	IBAGUE-TOLIMA	2732508	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	324003216	9459993083	I	2023/12/12	2023/12/07	HEQUI	0	$652,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	28548736	RODRIGUEZ ALCALA PAOLA ANDREA	230201	30	$1,840,000	$294,400	EPS005	30	$1,840,000	$230,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,840,000	$128,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$128,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,400	$0	$0	$294,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$294,400	$0	$0	$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,100	$0	$0	$128,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$128,100	$0	$0	$128,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$0	$0	$230,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$230,000	$0	$0	$230,000
TOTAL				1	$652,500	$0	$0	$652,500

2023/12/07 11:02 AM

1053

noviembre

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900497511-4	ANLAGENBAUER SAS		CARRERA 10 3 11	2607439	anlagenbauer@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	07/12/2023	72944685	$2.960.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Diferencial	IRP	SLN	IGE	LMA	VSP	VST	SLE	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de Mora	Cotización	Caja de CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1069178217	UCITTA TAPIA JEILY KATHERINE	1	0			S															230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	80.000	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF50	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
2	CC	1105682165	VERA DIAZ JURG NICOLAS	1	0			S															230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF50	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	28993008	ALCALA DUARTE NOHEMY	1	0			S															23-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	8.100	CCF50	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	1105683638	JONATHAN JAMIER RAMIREZ SEPULVEDA	1	0			S															230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF50	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	589812	DIAZ VARGAS JUAN CAMILO	1	0			S															23-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF50	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
6	CC	1110092675	CRISTIAN FERNANDO PRADO DAZA	1	0			S															230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.800	CCF50	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900487811-4	ANLAGENBAUER SAS		CARRERA 16 3 11	2607436	anlagenbauer@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					0	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	07/12/2023	72944865	$2.960.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	220.000	0		0		0	2	500	0	220.500	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	186.400	0		0		0	2	400	0	186.800	3

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	560.000	0	0	0	0	2	1.100	0	561.100	2
230301	Porvenir	800224808-8	560.000	0	0	0	0	2	1.100	0	561.100	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	505.600	0	0	0	0	2	1.000	0	506.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	536.000				536.000	2	1.100	537.100			5.360	537.100	6

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF50	Confamiliar	890700148-4	406.400	2	800	407.200	8

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradores	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	406.400	407.200
Pensión	3	1.525.600	1.526.600
Riesgos Laborales	1	536.000	537.100
CCF	1	406.400	407.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.874.400	2.960.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1055

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900497811-4	ANLAGENBAUER SAS	CARRERA 10 3 11	2607438	anlagenbauer@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	TOLIMA	IBAGUÉ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	07/12/2023	72943609	$3.074.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1068178217	MOTTA TAFUR JELY KATHERINE	1	0			S																230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	80.000	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF50	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
2	CC	1105582185	VERA DIAZ JURG NICOLAS	1	0			S																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF50	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	28963008	ALCALA DUARTE NOHEMY	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF50	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	1105642838	JONATHAN JAVIER RAMIREZ SEPULVEDA	1	0			S																230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF50	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	5829612	DIAZ VARGAS JUAN CAMILO	1	0			S																25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF50	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
6	CC	1110583875	CRISTIAN FERNANDO PRADO DAZA	1	0			S																230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.500	CCF50	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1056

compensar | mipanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900497811-4	ANLAGENBAUER SAS	CARRERA 10 3 11	2607436	anlagenbauer@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	TOLIMA	IBAGUE	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	07/12/2023	72943809	$3.074.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	220.000	0		0		0	34	7.400	0	227.400	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	186.400	0		0		0	34	6.300	0	192.700	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Protección)	800229739-0	560.000	0	0	0	0	34	18.800	0	578.800	2
230301	Porvenir	800224808-8	560.000	0	0	0	0	34	18.800	0	578.800	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	505.000	0	0	0	0	34	17.000	0	522.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	536.000				536.000	34	18.000	554.000			5.360	554.000	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF50	Comfenalco	890700148-4	406.400	34	13.700	420.100	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	406.400	420.100
Pensión	3	1.625.600	1.680.200
Riesgos Laborales	1	536.000	554.000
CCF	1	406.400	420.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.974.400	3.074.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1057

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9399000	JOSUE GUILLERMO TIBOCHA GRANADOS	KR 18 150-30	2570016	joguild@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	28/01/2024	73306969	$347.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Depend.	IGE	ITE	LAE	TDE	TAE	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor Mora Afiliado	Valor Mora Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días Cotizados	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	9399000	TIBOCHA GRANADOS JOSUE GUILLERMO	3	0			N																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1058

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9999000	JOSUE GUILLERMO TISOCHA GRANADOS		KR 18 150-30	2670016	joguill@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APE
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	26/01/2024	73508989	$347.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	145.000	0		0		0	53	7.300	0	152.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	53	9.300	0	194.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de RIE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	152.300
Pensión	1	185.600	194.900
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	347.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1059

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93385314		DUEÑAS MORALES DAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 53-53 APTO 201 TOSCANA	IBAGUE-TOLIMA	2657037	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	322272340	9459133318	I	2023/12/05	2023/12/06	NEQUI	1	$475,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	93385314	DUEÑAS MORALES DAIRO																		231001	30	$1,340,000	$214,400	EPS017	30	$1,340,000	$167,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,340,000	$93,300	0	$0	$0	No	$475,200
Total	Afiliados(1)																						$1,340,000	$214,400			$1,340,000	$167,500			$0	$0			$1,340,000	$93,300		$0	$0		$475,200

2023/12/06 03:27 PM

1060

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93365314		DUEÑAS MORALES DAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 53-53 APTO 205 TOSCANA	IBAGUE-TOLIMA	2657037	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-11	322272340	9459133318	I	2023/12/05	2023/12/06	BEQUE	1	$475,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$214,400	$300	$0	$214,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$214,400	$300	$0	$214,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$93,300	$100	$0	$93,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$93,300	$100	$0	$93,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$167,500	$200	$0	$167,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$167,500	$200	$0	$167,700
TOTAL				1	$475,200	$600	$0	$475,800

2023/12/06 03:27 PM

1901

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901111307	0	CYPH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 9 71 81 CAMPINA	IBAGUE-TOLIMA	5160213	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	326227834	9460179047	E	2023/12/04	2023/12/11	BANCO DAVIVIENDA	7	$1,308,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																														
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)																														
1	CC	1110283073	BASTIDAS PEÑA MARIA ALEJANDRA																		25-14	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	0.522%	30	SI
2	CC	1110547966	RODRIGUEZ ARANA HENRY JULIAN																		230201	30	EPS005	30	CCF50	30	14-11	30	0.522%	30	SI
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)																														
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)																														
3	CC	1110489860	CORDOBA FRANCO DIEGO FERNANDO																		230301	30	EPS005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
4	CC	1110472186	CRUZ CARDONA JOSE IVAN																		230201	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
Total Afiliados(4)																														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901111307	0	CYPH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 9 71 81 CAMPINA	IBAGUE-TOLIMA	5160213	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	326227834	9460179047	E	2023/12/04	2023/12/11	BANCO DAVIVIENDA	7	$1,308,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$761,600	$5,400	$0	$767,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$1,300	$0	$186,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$192,000	$1,400	$0	$193,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$384,000	$2,700	$0	$386,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$179,600	$1,300	$0	$180,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$179,600	$1,300	$0	$180,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$168,000	$1,200	$0	$169,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	4	$168,000	$1,200	$0	$169,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$190,400	$1,400	$0	$191,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$94,400	$700	$0	$95,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$96,000	$700	$0	$96,700
TOTAL				4	$1,299,600	$9,300	$0	$1,308,900

2024/04/12 09:58 AM

2901

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	28548736-0	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA		cr5 no 11-24	2907438	paolaandrearodriguezalcala@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLAVE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	Y	12/04/2024	76300436	89,700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830163780-5	80,800				80,800	122	8,900	89,700			800	89,700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IBE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	80,800	89,700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	80,800	89,700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	28548736-0	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA		cr5 no 11-24	2807438	paolaandrearodriguezalcala@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	Y	12/04/2024	76300430	$88.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Sueldo Integral	Servicios Colaborativos	Cotiza Pensión	Ingreso	Retiro	Traslado	Inicio SLN	Fin SLN	Inicio IGE	Fin IGE	Inicio LMA	Fin LMA	Inicio VAC	Fin VAC	Inicio VSP	Fin VSP	Variación Salario	Fin	Cambio Sueldo	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo beneficencia departamental	Días EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1118607918	RODRIGUEZ ARANA HENRY JULIAN	DE	0			N																	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.160.000	I	69.600		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93388631		CARRANZA SANCHEZ FREDY ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ B CS 11 BRR SANTA CRUZ	IBAGUE-TOLIMA	2733905	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	00266396	9459334895	I	2023/12/11	2023/12/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$358,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC 93388631	CARRANZA FREDY	230901	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

2023/12/11 11:38 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93388631		CARRANZA SANCHEZ FREDY ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ B CS 11 BRR SANTA CRUZ	IBAGUE-TOLIMA	2753905	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	00266396	94599134895	I	2023/12/11	2023/12/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$358,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,300	$0	$0	$28,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$358,900	$0	$0	$358,900

2023/12/11 11:38 AM

1065

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	12956992	FREDY GIOVANI VARGAS RAMIREZ	Cra 1A No. 14A-72	3212654630	fredyvargas1971@yahoo.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	RICAURTE		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	1	27/02/2024	74591795	$350,900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	145.000	0		0		0	67	8.900	0	153.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	67	11.400	0	197.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	153.900
Pensión	1	185.600	197.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	350.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGADA

9901

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	13955992	FREDY GIOVANI VARGAS RAMIREZ		Cra 1A No. 14A-72	3212554630	fredyvargas1971@yahoo.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
UNICA	1 – Independiente			CUNDINAMARCA	FACATATIVA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	1	27/02/2024	74591795	$350,900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Moroso	Extranjero	Colilla Solidaria	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	13955992	VARGAS RAMIREZ FREDY GIOVANI	0	0			N																	230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	145,000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1064

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	39587522	DENNIS HORTENCIA BARRERO	CR 5 #11-24 CFI 802 EDIF TORRE	2607436	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUE	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	15/12/2023	73309702	$333.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dep/ento	Salario	Extranjero	Cotiza exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	ING AFP	Cotización	Valor mes Afiliado	Valor aporte Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	ING EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	ING ARL	días de trabajo	Cotización	Código CCF	ING CCF	Aporte CCF	ING entes parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	39587522	BARRERO DENNIS HORTENCIA	3	0			N																	25-14	1.100.000	133.800	0	0	0	0	EPS017	1.100.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	38567522	DENNIS HORTENCIA BARRERO		CR 11-24 OF 802 EDIF TORRE [illegible]	2607436	anlagenbauer@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERÍODO SALUD	PERÍODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	15/12/2023	73309702	6393.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	146.000	0		0		0	5	1.200	0	146.200	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	8	1.500	0	187.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	146.200
Pensión	1	185.600	187.100
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	333.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1069

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1069175487	DANIELA ALEJANDRA CIFUENTES MURILLO	CRS #11-24	2607436	antegenbauer@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUE	EL

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	26/01/2024	73508857	$341.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Salario	Extranjero	Cotiz. exterior	Ausencia	IBC	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	ISC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1069175487	CIFUENTES MURILLO NATALIA ALEJANDRA	3	0			N																	23031	1,160,000	116,000	0	0	0	0	EPS017	1,160,000	145,000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1070

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1088175487	DANIELA ALEJANDRA CIFUENTES MURILLO		CRS #11-24	2607438	anlegenbauer@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2023-11	2023-11	I	26/01/2024	73509857	TOTAL A PAGAR	
					$341.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	145.000	0		0		0	36	4.900	0	149.900	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-6	185.600	0	0	0	0	36	6.200	0	191.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	149.900
Pensión	1	185.600	191.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	341.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1071

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: JORGE FERNANDO MORALES OLIVEROS
Identificación CC - 79855590
Sucursal 0
Período Pensión 2023-11
Período Salud 2023-11
Fecha Pago Planilla 2023-11-06

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	79855590
Nombre	JORGE FERNANDO MORALES OLIVEROS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar CAFAM
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Número Planilla	224584520
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	I
Período Pensión	2023-11-06
Período Salud	2023-11-06
Tipo Cotizante	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VACFin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.000.000	0,12500000	$ 125.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot.	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor de retiro
				Afiliado	Aportante				
30	1.000.000	0,1600000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.000.000	0,0696000	$ 69.600	522

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.000.000	0,0200000	$ 20.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

1072

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZON SOCIAL	CARLOS FERNANDO SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-80.768.926
SUCURSAL	2027
FECHA PAGO	2023-11-17
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-80.768.926
NOMBRE EMPLEADO	CARLOS FERNANDO SANCHEZ
EPS	FAMISANAR EPS.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Cundinamarca COMFACUNDI
ARL	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
NÚMERO PLANILLA	28348809
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2023-11
PERIODO SALUD	2023-11
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5411101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.160.000	0,1600000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.160.000	0,0696000	$ 80.800	996

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligat ori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1	0,0400000	$ 109	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 185.600	$ 46.400	$ 80.800	$ 100	$ 312.900

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1106869782	LUIS FELIPE GUZMAN SERRANO	CALLE 8 28 174 BR ACAPULCO	2807436	pipe11.maidan@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2023-11	2023-11	1	14/12/2023	73066970	TOTAL A PAGAR	
					$330.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	145.000	0		0		0	0	0	0	146.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	900224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	330.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1108899792	LUIS FELIPE GUZMAN SERRANO	CALLE 8 2B 174 BR ACAPULCO	2807436	pige11.maiden@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	14/12/2023	73058870	$330.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				DFF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Extranjero	Extranjero Cotiza Colombia	Extranjero Residente	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	COR	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	días cotizados	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte MSAP	Aporte MEN
1	CC	1108899792	GUZMAN SERRANO LUIS FELIPE	3	0		N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1025

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110559992		QUINTERO ALFEREZ JUAN PABLO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana 7 casa 15 Etapa 3 Villa Cafe	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2783087	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	300809073	9458499276	I	2023/12/22	2023/11/27	BANCOLOMBIA	0	$494,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1110559992	QUINTERO ALFEREZ JUAN PABLO																		230301	30	$1,594,666	$255,200	EPS005	30	$1,594,666	$199,400	CCF22	30	$1,594,666	$31,900	14-23	30	$1,594,666	$8,400	30	$0	$0	No	$494,900
Total	Afiliados(1)																						$1,594,666	$255,200			$1,594,666	$199,400			$1,594,666	$31,900			$1,594,666	$8,400		$0	$0		$494,900

2023/11/27 09:04 AM

2026

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110559992		QUINTERO ALFEREZ JUAN PABLO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana 7 casa 15 Etapa 3 Villa Cafe	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2783087	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	300009073	9458499276	I	2023/12/22	2023/11/27	BANCOLOMBIA	0	$494,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,200	$0	$0	$255,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$255,200	$0	$0	$255,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,400	$0	$0	$8,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,900	$0	$0	$31,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$31,900	$0	$0	$31,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$199,400	$0	$0	$199,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$199,400	$0	$0	$199,400
TOTAL				1	$494,900	$0	$0	$494,900

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y T. Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

7.8 INFORME SOCIAL

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

INFORME DE IINTERVENTORIA No. 02
SEGUIMIENTO A COMPONENTE SOCIAL DE OBRA

Contrato de Obra No. 403 de 2023 – pavimentación y embellecimiento de la diagonal 7 desde la calle10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte – Cundinamarca.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 413 DE 2023

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA "PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA.

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA

17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2023
RICAURTE - CUNDINAMARCA

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría Social y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

INTRODUCCIÓN

En el presente informe pretendo dar a conocer, las actividades y gestiones realizadas desde la interventoría social, como también las actividades que se encuentran en trámite por parte del componente social del consorcio RC.

Finalmente se registran los aspectos por mejorar junto con sus respectivas recomendaciones, mediante el acompañamiento y direccionamiento realizado desde la interventoría social.

OBJETIVO GENERAL

Asegurar el cumplimiento de actividades comunitarias, impactadas por el inicio y desarrollo de la obra, mediante acompañamiento, verificación, direccionamiento e intervención del componente social de interventoría, con el fin de mitigar problemáticas las cuales interfieran en el adecuado desarrollo y termino del proyecto.

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría y Gerencia de Proyectos de Infraestructura, Vías y Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Acompañar de manera presencial, durante el desarrollo de actividades comunitarias, realizadas por la profesional encargada del componente social de la obra.

- Orientar frente a dudas o inquietudes que surjan, durante el desarrollo de actividades planeadas por la profesional encargada del componente social de la obra u otras situaciones que surjan durante el desarrollo y ejecución del proyecto.

- Direccionar frente a la importancia del cumplimiento de metas plasmadas en el plan de trabajo del componente social y otras las cuales estipula el contrato.

- Verificar, mediante validación documental y visitas el cumplimiento de actividades realizadas proyectadas en el plan de acción social y otras estipuladas en el contrato

- Realizar recomendaciones generales, de acuerdo a lo evidenciado y según se evidencie necesidad.

INFORME DE INTERVENTORIA SOCIAL COMPRENDIDO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE

Desde el componente social de interventoría se da inicio detallando las actividades realizadas durante el mes comprendido de 17 de noviembre al 16 de diciembre del año en curso.

- Creación de correo electrónico para atención al usuario vía email, interventoriaatencionalusuario@gmail.com

- Afiche informativo donde muestra los días y horarios de atención presencial a los diferentes usuarios de la comunidad impactada por la obra.

- Acompañamiento en recorrido con el encargado de espacio público y trabajadora social de obra, con el fin de informar a los propietarios de las viviendas, la próxima actividad a realizar por el consorcio referente a levantamiento de andenes.

- Acompañamiento en recorrido al ingeniero forestal de interventoría, trabajadora social de obra, ingeniero civil de obra, agrónomo enviado por parte de la alcaldía, con el fin de conocer cuales especies continúan en su lugar y cuales se deben trasplantar, o eliminar teniendo en cuenta diagnostico profesional forestal y necesidades de la obra.

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría a Obras Viales y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

- Direccionamiento frente a elaboración del segundo informe a la trabajadora social de obra

- Observaciones y recomendaciones a tener en cuenta referentes al segundo informe remitido por la trabajadora social de obra, vía email.

- Se brinda acompañamiento a trabajadora social de obra a reunión, con el fin de sensibilizar a grupo de trabajadores acerca de la importancia de mitigar situaciones de dificultad con la comunidad

- Verificación, lectura y recomendaciones a la trabajadora social del consorcio, referentes al informe social número dos, comprendido del **17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE.**
- Direccionamiento a la trabajadora social de obra frente a la importancia de mantener activo el grupo creado en WhatsApp con veeduría.

- Se informa a veeduría que ya hay disponible correo electrónico de atención al usuario por parte de la interventoría, junto con atención presencial y sus horarios y días.

- Oficio al componente social de obra acerca de organización tema de recolección de residuos

- Oficio al componente social de obra acerca de soporte de aseguramiento de información correspondiente a entrega del total de actas de vecindad iniciales

- Oficio al componente social de obra acerca entrega de soportes donde asegure el cumplimiento de las actividades sociales contempladas en el contrato

- Oficio al componente social de obra acerca Soporte o gestión de actividad informativa a dueños de los predios inhabitados

Cabe resaltar que, si bien se remitieron oficios al componente social de obra, realizando solicitudes, para cada una de ellas se brindó apoyo por parte de la trabajadora social de interventoría con el fin de que se pudiera lograr el cumplimiento de cada requerimiento en mención. Sin embargo, se informa que se continúa realizando seguimiento frente a las respuestas formales de los mismo y el aseguramiento de las actividades en su totalidad.

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

ACTIVIDADES FALTANTES POR ASEGURAR POR PARTE DEL COMPONENTE SOCIAL DE OBRA

- **Entrega de carpeta con la documentación correspondiente a actas de vecindad iniciales.**
- **En el campamento dispuesto por el consorcio RC para realizar actividades administrativas no se evidencia archivo donde repose la documentación correspondiente a actas de vecindad iniciales, actas de reunión con veeduría y demás documentación correspondiente al componente social.**
- **Actas de vecindad iniciales faltantes por asegurar 5**
- **Respuesta a oficio correspondiente al cumplimiento o gestión para asegurar los ítems correspondientes al componente social estipulado en el contrato cláusula 9- clausula 10.**

Cabe resaltar que las actividades faltantes por asegurar las cuales se relacionan en el presente informe, son actividades las cuales a la fecha ya debieron haber estado garantizadas, desde la interventoría social se informa que para cada ítem aquí relacionados se ha brindado el apoyo correspondiente sin embargo es el componente social del consorcio el encargado de asegurar la actividad.

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría y Gerencia de Proyectos
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

RECOMENDACIONES GENERALES PARA IMPLEMENTAR

Con el fin de optimizar el tiempo y lograr el cumplimiento de actividades dirigidas a la comunidad, durante el desarrollo y fin de la obra se sugiere.

- Asegurar actas de vecindad faltantes
- Dejar registrado mediante levantamiento de acta, actividades las cuales apoye o resuelva, y que no se encuentren incluidas en el cronograma y plan de trabajo. lo anterior con el fin de evidenciar su gestión adicional.
- Enviar vía email en el momento que se requiera, información correspondiente al componente a la interventoría social, con el fin de verificar avances y brindar apoyo correspondiente.
- Informar de manera oportuna situaciones de dificultad, con el fin de brindar apoyo correspondiente y de esta manera lograr el cumplimiento de actividades.
- Asegurar el cumplimiento de actividades detalladas en el contrato y tenerlas en cuenta en su plan de acción.
- Enviar de manera oportuna informe de actividades futuros, con el fin de dar lectura y recomendaciones.
- Cumplimiento o gestión para asegurar los puntos estipulados en el contrato, tal como se solicitó mediante oficio

FRENTE AL TALENO HUMANO

Durante la verificación documental, correspondiente a las tareas realizas por parte de la trabajadora social se evidencia, avance notorio en las actividades plasmadas en su plan de trabajo, como también frente al aseguramiento de actividades orientadas por la interventoría, mejora en los canales de comunicación, por parte de la profesional hacia la comunidad, como también por parte de la trabajadora social hacia la interventoría, Se anima a continuar trabajando de manera pro activa.

Profesional receptiva frente a recomendaciones las cuales se brindan, dispuesta y con buen manejo de habilidades sociales.

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría Vial y Transporte
Universidad de Ibagué

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

REGISTRO FOOGRAFICO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL INFORME

SOCIALIZACIÓN, LEVANTAMIENTO DE ANDENES.



ACTIVIDAD DIRIGIDA POR PROFESIONALES DE OBRA



Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría y Gerencia Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

VERIFICACIÓN DE ESPECIES -INGENIERO FORESTAL.INGENIERO CIVIL OBRA. TRABAADOR SOCIAL DE OBRA- AGRONOMO DE ALCALDIA ,



REUNIÓN CON TRABAJADORES DE LA OBRA – BUEN TRATO A LA COMUNIDAD



Daniela

DANIELA ALEJANDRA CIFUENTES MURILLO
CÓDIGO.: 318461028-1

Cr 5 #11-24 Of.802 Edificio Torre Empresarial (608) 260-7486 - 3123065921

diagonalseptima.interventoria@gmail.com

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

7.9 BITÁCORA DE OBRA

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

de 10" correspondiente a esta acometida.

Ing. Sergio Leal
Residente

Interventoría.

Noviembre 17 de 2023 (Viernes)

Se instalaron 3 tubos de 36" en el tramo comprendido entre el pozo 4 y pozo 5, cumpliendo con el compromiso de cerrar el Ko+000 de la Carrera Vía 40.
Se instalaron las placas de cubierta para los pozos 3A, 3B y 4.
Se construyo la caja de 0,80 m x 0,80 m. con una profundidad de 1,50 m. de acometida de aguas lluvias frente al pozo 1

Ing. Sergio Leal
Residente

Interventoría.

Noviembre 18 de 2023 (Sabado)

Se registran lluvias intensas en horas de la madrugada. hasta las 10:00 a.m.
Se efectuo el retiro del recebo compactado del pozo 2 al pozo 3 y del pozo 3 al pozo 3A en una profundidad de 30 cms. para la instalacion y compactacion de base granular.

Ing. Sergio Leal
Residente

Interventoría.

Noviembre 20 de 2023 (Lunes)

Se adelantaron los rellenos en recebo compactado entre los pozos 3B al pozo 4 y del pozo 4 al pozo 5.
Se inicio la rotura de pozo 8, existente, para instalar el primer tubo de 42" hacia el pozo 7.
De acuerdo a la autorizacion otorgada por la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural del municipio de Ricaurte, en el Informe Técnico No. 33 del 15 de Noviembre de 2023, se inicia la intervencion de 76 intervenciones de los individuos arboreos ubicados en las separadores de la Diagonal 7 entre la calle 10 hasta la carrera 16, consistente en 66 talas y 10 traslados de los arboles mencionados anteriormente.

Ing. Sergio Leal
Residente

Interventoría

Powered by CamScanner

Noviembre 21 de 2023 (Martes)

Se funde la placa de fondo de pozo 5.
Continua la actividad de rotura del pozo 8 para la instalación del tubo de 42" hasta el pozo 7.
Se adelantan las excavaciones del tramo comprendido entre el pozo 8 y el pozo 7, adicionalmente se ejecutan las excavaciones del tramo pozo 5 al pozo 6.
Avanzan las podas de arboles ubicados en el separador de la Diagonal 7 entre el centro vacacional de E.T.B. y el Conjunto Residencial Terralonga. El Ing. Forestal de la Interventoría efectuó visita a la obra.

Ing. Sergio Loul
Residente

Interventoría

Noviembre 22 de 2023 (Miercoles)

Se instalaron 2 tubos de 36" en el tramo comprendido entre el pozo 5 y el pozo 6.
Se ejecuto la mampostería del cilindro del pozo 5.
Continua la actividad de rotura del cilindro en concreto del pozo 8 existente.

Ing. Sergio Loul
Residente

Interventoría

Noviembre 23 de 2023 (Jueves)

Terminada la rotura del pozo 8 se instalo 1 tubo de 42" en el tramo comprendido entre el pozo 8 y el pozo 7.
La firma EDICONS realizo la toma de densidades en el terreno, para los rellenos de base granular en los tramos del pozo 1 al pozo 1A (1 Toma), del pozo 2 al pozo 3 (1 Toma) y del pozo 3 al pozo 3A (1 Toma); para los rellenos en recebo en los tramos del pozo 4 al pozo 5 (2 Tomas).
Continua la actividad de tala de arboles ubicados en el separador de la Diagonal 7. El Ing. Geotecnista de la Interventoría efectuó visita a la obra.
Personal del contratista Juan Acosta inicia la terminación del campamento y la batería de baños, adicionalmente se conforma el piso del patio de la obra.

Ing. Sergio Loul
Residente

Interventoría

Powered by CamScanner

Noviembre 24 de 2023 (Viernes)


Se instalan 3 tubos de 42" en el tramo comprendido entre el pozo 8 y el pozo 7.

Continua la tala de arboles del separador de la Diagonal 7 entre el Conjunto Residencial Terralonga y la carrera 14 A.

Se registran lluvias en la madrugada sobre el municipio de Ricaurte



Ing. Sergio Laul
Residente



Interventoria


Noviembre 25 de 2023 (Sabado)

Se instalo 1 tubo de 42" en el tramo comprendido entre el pozo 8 y el pozo 7.


Se instalo la placa de cubierta del pozo 5.

Continuan los trabajos de adecuacion y terminacion del campamento y de la bateria de baños.

Avanzan las labores de tala de arboles en el sector del conjunto residencial Terralonga y la carrera 14 A.



Ing. Sergio Laul
Residente



Interventoria


Noviembre 27 de 2023 (Lunes)

Se instalaron 2 tubos de 42" en el tramo comprendido entre el pozo 8 y el pozo 7


Se revisaron los pozos, hablando de las tapas de cubierta, de los pozos 1 y 1A.

Se efectuo visita tecnica con la empresa Acuagyr S.A. para el retiro de la actividad de cambio de tuberia de acueducto del Conjunto residencial Terralonga a la porteria del Centro vacacional E.T.B.

Avanza la construccion de la bateria de baños en el campamento.



Ing. Sergio Laul
Residente



Interventoria

Noviembre 28 de 2023 (Martes)

Se instalaron 3 tubos de 42" en el tramo comprendido entre el pozo 8 y el pozo 7.

Se revisaron las tapas de cubierta de los pozos 2 y 3.

Powered by CamScanner

Continua la tala de arboles ubicados en el separador de la Diagonal 7 entre la carrera 14 A y la carrera 15

Ing. Sergio Leal
Residente

Interventoría.

Noviembre 29 de 2023 (Miercoles)

Se instalaron 1 tubo de 42" para terminar el tramo del pozo 8 al pozo 7, y 1 tubo de 36" para el inicio del tramo pozo 7 al pozo 6.
Se fundio la placa de la boteria de bordes del campamento.
Continua la tala de arboles ubicado en el separador de la Diagonal 7.

Ing. Sergio Leal
Residente

Interventoría.

Noviembre 30 de 2023 (Jueves)

Se instalaron 5 tubos de 36" en el tramo comprendido en el pozo 7 al pozo 6.
Se fundio la placa de fondo del pozo 7.
Se adelantaron los rellenos en recebo compactado del tramo pozo 8 a pozo 7.

Ing. Sergio Leal
Residente

Interventoría

Diciembre 1 de 2023 (Viernes)

Inicio la mamposteria del cilindro del pozo 7.
Se adelantaron los rellenos en recebo compactado del tramo pozo 8 a pozo 7

Ing. Sergio Leal
Residente

Interventoría.

Diciembre 2 de 2023 (Sábado)

Se registro lluvias copiosas en la mañana.
Se adelantaron rellenos en recebo compactado en los tramos pozo 8 a pozo 7 y pozo 7 a pozo 6
La empresa EDICONS tuvo 4 trabajadores en el terreno para el recebo instalado en el tramo pozo 8 al pozo 7.

Ing. Sergio Leal
Residente

Interventoría.

Powered by CamScanner

Diciembre 4 de 2023 (Lunes)

Se registran lluvias continuas en el transcurso de la mañana.
Se instalaron 7 tubos de 36" en el tramo comprendido entre el pozo 7 al pozo 6.
Continua la mampostería del cilindro del pozo 7.
Se repusieron dos domiciliarias de aguas negras con diametro 6".
Se llevo a cabo un comité de obra en la Alcaldía Municipal de Ricaurte la cual conto con la presencia de funcionarios de Alcari S.A.S., la Ing. Dennisse Cortes Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas y la Ing. Katherin Motta por parte de la Interventoria, cuyas conclusiones fueron que se oficiara a la Secretaria de Planeación Municipal para que informe a la mayor brevedad posible cuales son los proyectos urbanisticos que se van a desarrollar en el corto plazo, con el fin de poder determinar el numero de acometidas de aguas negras y lluvias que se deben construir antes de inicio de los tubores de cajeo de la vía, y oficiar a ALCARI

Ing. Sergio Leal
Residente

Interventoria.

Diciembre 5 de 2023 (Martes)

Se instalo 1 tubo de 36" de 4.50 M. para terminar el tramo comprendido entre el pozo 7 al pozo 6
Se fundio la placa de fondo del pozo 6.
Termina la mampostería del cilindro del pozo 7 e inicio la mampostería del cilindro del pozo 6.

Ing. Sergio Leal
Residente

Interventoria.

Diciembre 6 de 2023 (Miercoles)

Se afectuó la verificación de la planimetria y altimetria de la Diagonal 7 entre el KO+000 (porteria E.T.B.) y el KO+467 (Carrera 15), con el fin de iniciar el cajeo de la vía y las actividades consecuentes.

Ing. Sergio Leal
Residente

Interventoría

Powered by CamScanner

Diciembre 7 de 2023 (Jueves)

Se efectuo la nivelacion de los pozos 3A y el 3B.
Continua la revision de la planimetria y altimetria de la via Diagonal 7.

Ing. Sergio Leal
Residente

Interventoria

Diciembre 8 de 2023 (Viernes)

Se efectuo la nivelacion del pozo 4.

Ing. Sergio Leal
Residente

Interventoria

Diciembre 9 de 2023 (Sábado)

La firma EDYCONS tomo 4 densidades en el terreno para el recebo instalado en el tramo comprendido entre el pozo 7 y el pozo 6.

Ing. Sergio Leal
Residente

Interventoria

Diciembre 11 de 2023 (Lunes)

Continua la manipostería del cilindro del pozo 6.
Se desmontaron seis señales verticales de tránsito ubicadas sobre la Diagonal 7, para un total de 21 señales desmontadas.
La cuadrilla de Topografia inicio el replanteo en el terreno de la calzada de diseño de la nueva via Diagonal 7.

Ing. Sergio Leal
Residente

Interventoria

Diciembre 12 de 2023 (Martes)

Continua el replanteo en el terreno de la calzada de diseño de la nueva via Diagonal 7.
Se inicio el recorrido con un funcionario de la Secretaria de Gobierno, para la socializacion del inicio de la intervencion de andenes y el retiro de las cubiertas exteriores.

Ing. Sergio Leal
Residente

Interventoria.

Powered by CamScanner

Diciembre 13 de 2023 (Miercoles)

Continua la mampostería del cilindro del pozo 6.

Se notificó a la empresa ALCARI S.A.S. que personas externas al proyecto instalaron un tubo novafort de 12" en el pozo 6 y dirigido hacia el predio o lote ubicado frente a este pozo; teniendo en cuenta que no contaba con la aprobación o la factibilidad de la empresa ALCARI S.A.S. se procedio a retirarlo.

Finalizaron el recorrido con el encargado del espacio publico de la Secretaría de Gobierno municipal, señor Wilinton García, para la socialización del inicio de la intervención de andenes y retiro de cubiertas.

Ing. Sergio Leal
Residente

Interventoría

Diciembre 14 de 2023 (Jueves)

Terminó la mampostería del cilindro del pozo 6.

Se efectuó la reparación de tres (3) acometidas de aguas negras ubicadas entre el K0+000 al K0+060.

Inicio la excavación o cajeo de vía, incluyendo andenes, desde el K0+100 por el carril izquierdo.

Junto con la Secretaría de Agricultura, la Interventoría se realizo un recorrido por la Diagonal 7, desde el K0+000 ubicado en la portería del Centro Vacacional C.T.B. hasta la carrera 16, con el fin de evaluar las especies arbóreas ubicadas en los andenes, izquierdo y derecho, y determinar el estado actual y su disposición final.

Ing. Sergio Leal
Residente

Interventoría.

Powered by CamScanner

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

7.10 CORRESPONDENCIA ENVIADA

1092

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 16 de noviembre de 2023

ID7R-023

Ingeniera
DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ
Secretaria de Infraestructura y obras públicas
Alcaldía Municipal de Ricaurte
Cundinamarca
Ciudad

Referencia. **Contrato de Interventoría No. 413 de 2023 – "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"**

Asunto: **EN ATENCIÓN Y RESPUESTA AL COMUNICADO 190.19 No. 667-2023**

Cordial saludo,

Respetada Ingeniera

Mediante el presente y en atención al comunicado en asunto, esta interventoría informa que a través de los oficios ID7R-019 y ID7R-022, se notifico y reitero al CONSORCIO DIAGONAL RC en calidad de contratista de obra, dar estricto cumplimiento al compromiso de entrega pactado el día 14 de noviembre de 2023 con la concesión Vía 40 express y supervisión municipal.

A partir de la fecha se han adelantando las actividades correspondientes para dar cumplimiento a la entrega del tramo de intervención de la red de aguas lluvias del pozo 1 hasta el punto K0+00 del proyecto Glorieta Manueles de la concesión, sin embargo, esta interventoría hace claridad que de acuerdo a las directrices dadas en campo por Vía 40 express y el consorcio RUTA 40, se hará entrega del pozo 1 hasta el pozo 3A (sector club de la policía) en relleno con base granular, debido a que, en este tramo la concesión realizará rehabilitación de la carpeta asfáltica y a partir del pozo 3A hasta el tramo del pozo 5 se entregara a -46 cm en relleno con recebo de la rasante de diseño dada por el área de topografía de la concesión, ya que en este tramo llevarán a cabo la estructura de pavimento correspondiente (carpeta asfáltica, base granular y sub base granular).

Para concluir, se informa a la supervisión municipal que la concesión vía 40 express ya se encuentra ejecutando actividades de conexión de sumideros al pozo 3B de la red de aguas lluvias, por lo cual, se aclara que las afectaciones que se puedan generar en este sector serán responsabilidad del concesionario.

Sin otro particular,

Cordialmente,

Paola A. Rodriguez A.
PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Cra 3 #11-24 Of 202 Edificio Torre Empresarial (620) 260-7426 - 3123045801
diagonalseptima interventoria@gmail.com

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 17 de noviembre de 2023

ID7R-024

Señor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
Consorcio Diagonal RC
Representante Legal
Espinal, Tolima

Referencia. **Contrato de Obra No. 403 de 2023 – "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Asunto: **OBSERVACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (HIDRATACIÓN)**

Cordial saludo,

Mediante el presente, nos permitimos informa que, al realizar los recorridos diarios durante la jornada laboral, se observa que no se le está suministrando una adecuada hidratación a los trabajadores durante su jornada.

Según el artículo 184 del Código del Trabajo, dispone que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

Se debe tener en cuenta que, se están ejecutando actividades a la intemperie y si los trabajadores no cuentan con una hidratación adecuada y suficiente puede generar repercusiones en la salud tales como agotamiento y golpe de calor, por el aumento de la temperatura y esfuerzo físico que con lleva las actividades presentes y las altas temperaturas de estos días.

Finalmente, esta interventoría solicita amablemente adoptar INMEDIATAMENTE las medidas necesarias, en aras de garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Elaboró: Profesional SST

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 21 de noviembre de 2023

ID7R-026

Señor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
Consorcio Diagonal RC
Representante Legal
Espinal, Tolima

Referencia. **Contrato de Obra No. 403 de 2023 – "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Asunto: **REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN ATENCIÓN A DERECHO DE PETICIÓN POR PARTE DE VEEDOR A LA SUPERVISIÓN MUNICIPAL.**

Cordial saludo,

Mediante el presente, esta interventoría reitera al **CONSORCIO DIAGONAL RC**, dar atención inmediata a la solicitud de información detallada emitida por el veedor JOSE WILLIAM DAZA GOMEZ a la supervisión municipal, teniendo en cuenta que, a la fecha no ha sido remitida en su totalidad la información requerida, la cual fue solicitada en campo y se hizo entrega de copia del requerimiento del veedor al ingeniero residente del proyecto y trabajadora social.

Dentro de la solicitud, el veedor solicita hacer entrega de:

- Copia del cronograma de obra del contrato de obra pública No. 403-2023
- Copia del plan de manejo de tránsito PMT
- Informe detallado en el cual se relacione el mobiliario que hará parte de esta obra de pavimentación y embellecimiento.

De acuerdo a lo anterior, se le recuerda al contratista de obra que dicho requerimiento ha sido expuesto a través de los oficios ID7R-017 y ID7R-021, sin embargo, a la fecha no ha sido atendido el requerimiento con la totalidad de la información requerida para dar respuesta y atención a la supervisión municipal.

Finalmente, se solicita dar atención inmediata al requerimiento presente allegando plan de manejo de tránsito (PMT) e informe de relación del mobiliario.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

1095

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 21 de noviembre de 2023

ID7R-027

Señor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
Consorcio Diagonal RC
Representante Legal
Espinal, Tolima

Referencia. **Contrato de Obra No. 403 de 2023 – "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Asunto: **SOLICITUD DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.**

Cordial saludo,

Mediante el presente, esta interventoría solicita amablemente allegar plan de manejo de tránsito (PMT) y así, dar a conocer las estrategias de movilidad y mitigación de impacto a la comunidad que concurre el área de influencia del proyecto. Teniendo en cuenta que, a la fecha no se cuenta con la información correspondiente y se están adelantando actividades que generan afectación a la movilidad, así mismo, se le recuerda que se encuentra pendiente dar atención al requerimiento emitido por parte de la veeduría.

Finalmente, esta interventoría informa que hasta no contar con la información requerida, no será posible dar atención a las peticiones de la veeduría y supervisión.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Cr 8 #11-24 Of 402 Edificio Torre Empresarial (+608) 260-7486 - 3123065921
diagonalseptima interventoria@gmail.com

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 21 de noviembre 2023

ID7R-028

Señor
LUIS **EDUARDO ALVARADO PULECIO**
Consorcio Diagonal RC
Representante Legal
Espinal, Tolima

Referencia. **Contrato de Obra No. 403 de 2023 – "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Asunto: **OBSERVACIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

Cordial saludo,

Mediante el presente, desde el área de seguridad y salud en el trabajo de esta interventoría, se informa que una vez inspeccionado el área en intervención del proyecto en referencia y el inicio de actividades de red pluvial desde el centro vacacional ETB hacia la carrera 14, se evidencian los siguientes aspectos por atender y mejorar:

1. El tramo en intervención no cuenta con señalización y aislamiento del sendero peatonal requerido para los habitantes de la zona y transeúntes, como el acceso vehicular hasta el centro vacacional de la ETB.





2. Se recomienda al contratista de disponer de un espacio para el material debidamente señalizado garantizando la movilidad de la comunidad de forma segura, debido a que, se encuentran ejecutando almacenamiento de materiales en diferentes espacios, interrumpiendo el espacio establecido para tránsito de peatones y acceso vehicular de la comunidad del sector.





3. Para el debido desarrollo del proyecto, se debe garantizar orden y aseo en la zona de intervención con la maquinaria, equipos y almacenamiento de materiales.





4. Se evidencia que el personal que se encuentra realizando actividades de tala de árboles no cuentan con los elementos mínimos requeridos para iniciar la labor (Elementos de protección para trabajo en alturas como: línea de vida, eslinga, un acceso seguro y adecuado para acceder a los árboles, permiso de trabajo en alturas, etc.).





Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

Finalmente, se observa falta de programación para el desarrollo de las actividades, para requerir o garantizar los insumos y elementos necesarios para el desarrollo de las funciones, así mismo, el contratista de obra debe tener en cuenta que es solidario de las acciones del subcontratista y el desarrollo de las actividades y procedimientos; por tal motivo esta interventoría solicita amablemente adoptar las medidas necesarias y correctivas en el menor tiempo posible, en aras de garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Elaboró: Profesional SST

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 21 de noviembre de 2023

ID7R-029

Señor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
Consorcio Diagonal RC
Representante Legal
Espinal, Tolima

Referencia. **Contrato de obra No. 403 de 2023 – PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA.**

Asunto: **SOLICITUD DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE SOCIAL**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la verificación documental que se realizó al componente social del consorcio RC, se realiza solicitud de documentación correspondiente a.

- Soporte de Censo o herramienta la cual se implemento para el conocimiento del total de casas a intervenir, teniendo en cuenta el impacto de la obra
- Actas de vecindad realizadas a la fecha y numero de viviendas faltantes
- Actas de participación social ciudadana veeduría
- Soporte de gestión de predios sin habitantes
- Cronograma de actividades a ejecutar teniendo en cuenta el tiempo estimado de obra

La anterior solicitud se eleva, con el fin de conocer de manera formal el porcentaje de cumplimiento de actividades, desde la fecha de inicio, a la fecha actual, conocer las actividades que se deberán asegurar durante el desarrollo del proyecto y así poder garantizar apoyo para el cumplimiento de las metas.

Cabe destacar que, durante el encuentro por parte de la trabajadora social de interventoría, se realizan recomendaciones generales al componente social de la obra, con el fin de optimizar el tiempo y mejorar el proceso.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
Representante Legal

Elaboró: Profesional SOCIAL

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 23 de noviembre de 2023

ID7R-030

Señor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
Consorcio Diagonal RC
Representante Legal
Espinal, Tolima

Referencia. **Contrato de Obra No. 403 de 2023 – "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Asunto: **OBSERVACIONES Y HALLAZGOS VISITA DE SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES SILVICULTURALES.**

Cordial saludo,

Mediante el presente, esta interventoría informa que El día 21 de noviembre de 2023, se realiza seguimiento a las actividades silviculturales de tala efectuadas bajo el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 413 DE 2023 – "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"**, donde se encuentran las siguientes observaciones:

1. El contratista ejecuta las intervenciones de radicación bajo la autorización del "Informe Técnico N°33 del 15 de noviembre de 2023.

   El permiso fue expedido por la Alcaldía Municipal de Ricaurte – Cundinamarca, la cual se guio bajo el Plan de Aprovechamiento Forestal presentado por la interventoría.

2. A la fecha el Consorcio Diagonal RC **NO HA PRESENTADO** la certificación del lugar autorizado por la Autoridad Ambiental CAR para la correcta disposición de residuos vegetales, donde ya se tiene un avance de aproximadamente 30 talas ejecutadas.



   Según el permiso otorgado por la alcaldía municipal, en el punto VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES Pag 44, las cuales debe acoger el Consorcio Diagonal RC, se menciona la disposición de los residuos vegetales generados a causa de las talas se deben disponer en sitios certificados por la entidad ambiental competente "CAR".

3. El personal operativo encargado de llevar a cabo las actividades de tala NO cuenta con las herramientas ni los equipos de protección personal EPP adecuados para el correcto desarrollo de dichas actividades, poniendo en riesgo la integridad y salud de ellos mismos.

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

Se adjuntan imágenes fotográficas donde se evidencian los anteriores hallazgos:

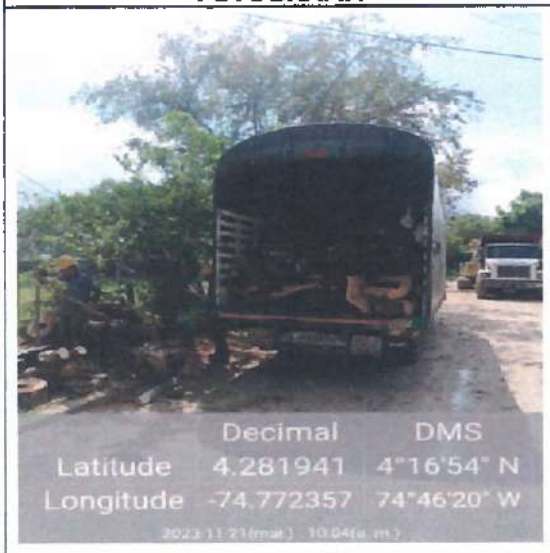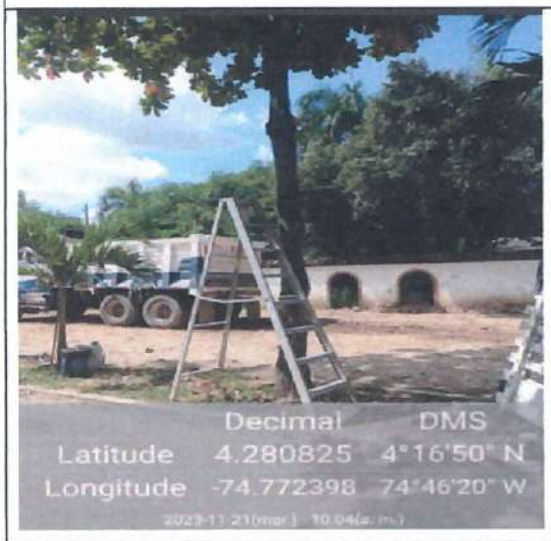FOTOGRAFIA	OBSERVACION
	Se está llevando a cabo la recolección de residuos vegetales y el mismo día 21/11 se movilizaron a desocupar el vehículo sin informar claramente el lugar y la certificación del mismo para dichas disposiciones de residuos.
	El personal operativo, asciende por medio de una escalera inadecuada, sin presencia de líneas de vida que aseguren su integridad física, adicionalmente portan unos lazos para asegurarse al árbol los cuales no son líneas de posicionamiento ni de vida. Tampoco se observa un coordinador de alturas por parte del Consorcio Diagonal RC, que haga presencia en el sitio de la actividad con el respectivo Permiso de Trabajo en Alturas.

4. Solicitudes:

- Presentar evidencia de los residuos vegetales ya trasladados al lugar de disposición final.
- Presentar la certificación y/o autorización del sitio de disposición de residuos el cual se evidencia el aval por la autoridad ambiental.
- Modificar las herramientas, métodos de ascenso y EPP, los cuales sean adecuados y certificados para el correcto y seguro desarrollo de la actividad.

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

La anterior solicitud se realiza, con el fin de hacer llegar de manera formal dicha información referenciada y así poder desarrollar las actividades sin ningún inconveniente en cumplimiento a los lineamientos establecidos en el permiso expedido por la secretaria de ambiente, agricultura y desarrollo rural.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Elaboró: Juan Pablo Quintero Alferez
Ingeniero Forestal.

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Administración Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 24 de noviembre de 2023

ID7R-031

Señor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
Consorcio Diagonal RC
Representante Legal
Espinal, Tolima

Referencia. **Contrato de Obra No. 403 de 2023 – "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Asunto: **SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 403-2023**

Cordial saludo,

Mediante el presente, esta interventoría solicita amablemente al CONSORCIO DIAGONAL RC, allegar en el menor tiempo posible, la siguiente información:

- Informe Mensual No. 01 con sus respectivos anexos, teniendo en cuenta el oficio ID7R-005 remitido el día 19 de octubre de 2023.
- Cronograma de ejecución del proyecto (ajustado a la fecha de terminación contractual).
- Plan de manejo de tránsito (PMT).
- Entrega de Diseño de Mezclas.
- Certificado de calidad de los materiales

Finalmente, se le recuerda al contratista de obra que la información requerida hace parte de sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato en referencia.

Cordialmente,

Paola A. Rodriguez A.

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría Estatal y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 28 de noviembre de 2023

ID7R-032

Señor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
Consorcio Diagonal RC
Representante Legal
Espinal, Tolima

Referencia. **Contrato de Obra No. 403 de 2023 – "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"**

Asunto: **SOLICITUD ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el impacto social generado por el inicio y ejecución de la obra desarrollada por el consorcio RC, se realiza solicitud al componente social de

- Punto de atención presencial de atención al usuario
- Horarios de atención
- De no contar con disponibilidad de atención presencial, asegurar otros canales de registro de PQRS y atención al usuario (whatssap, correo electrónico) u otro el cual se encuentre al alcance del CONSORCIO DIAGONAL RC.
- Acta o soporte donde se evidencie la divulgación a la comunidad implicada sobre el punto de atención al ciudadano junto con sus horarios.
- Acta o soporte donde se evidencie divulgación a la comunidad implicada acerca de medios de atención al ciudadano para registro de PQRS o información general del proyecto, lo anterior de No contar con punto físico de atención.
- Formato de registro de PQRS
- Formato de respuesta, con logos del consorcio y demás donde el lector identifique, quien responde su manifestación.

Teniendo en cuenta la importancia de adelantar actividades correspondientes de atención al usuario, se realiza apoyo de proyección de formato de registro de PQRS, por parte de la trabajadora social de interventoría, el cual se envía a la trabajadora social del consorcio vía email.

Nota. El formato que se envía como apoyo al componente social, se encuentra sujeto a cambios según consideración de consorcio RC y demás involucrados.

Cordialmente,

Paola A. Rodriguez A.
PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Elaboro: Trabajadora Social

1104

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 28 de noviembre de 2023

ID7R-033

Señor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
Consorcio Diagonal RC
Representante Legal
Espinal, Tolima

Referencia. **Contrato de Obra No. 403 de 2023 – "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"**

Asunto: **SOLICITUD COMPONENTE SOCIAL – CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.**

Cordial saludo,

Por medio del presente, en atención a las obligaciones contractuales establecidas en el contrato en referencia, se solicita de manera atenta al CONSORCIO DIAGONAL RC remitir a esta interventoría, los soportes correspondientes que acrediten el cumplimiento de las siguientes obligaciones o en efecto dar inicio al cumplimiento de las mismas.

De acuerdo a lo anterior, se expone a continuación las obligaciones contractuales establecidas:

(..) CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje, no inferior al 30 % de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo el caso, el cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del ciento (5%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

Finalmente reiteramos el compromiso que tenemos frente al apoyo durante cada seguimiento realizado por parte de la interventoría, hacia el componente social, por ende, quedamos atentos ante cualquier inquietud que se presente durante el desarrollo del ejercicio.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Elaboró: Trabajadora Social

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 28 de noviembre de 2023

ID7R-034

Ingeniera
DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ
Secretaria de Infraestructura y obras públicas
Alcaldía Municipal de Ricaurte
Cundinamarca
Ciudad

Referencia. **Contrato de Interventoría No. 413 de 2023 – "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"**

Asunto: **EN ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE VEEDOR CIUDADANO.**

Cordial saludo,

Respetada Ingeniera

Mediante el presente y en atención a la solicitud de información del proyecto en referencia por parte de un participante de la veeduría del proyecto y de acuerdo a la petición emitida, esta interventoría remite la siguiente información:

1. Cronograma de Obra remitida por el contratista de obra V1.
2. Plan de manejo de tránsito (PMT) del Consorcio Diagonal RC
3. En atención a la petición de informe de mobiliario, se informa que de acuerdo al capítulo 6. MOBILIARIO URBANO del presupuesto del proyecto, se encuentra contemplado:

MOBILIARIO URBANO		
Suministro E Instalación De Banca Urbana Ver Detalle Incluye Dado De Soporte	UND	14,00
Banca En Concreto M-40	UND	20,00
Bolardo M-63 Alto/Hierro	UND	83,00
Suministro E Instalación Caneca Urbana Ver Detalle Incluye Dado De Soporte	UND	20,00
Suministro E Instalación De Paradero De Bus Ver Detalle	UND	1,00
Suministro E Instalación De Caseta De Ventas Ver Detalle	UND	1,00
Suministro E Instalación De Mogador Informativo	UND	1,00
Ciclo Parqueadero M100 Tipo 1	UND	5,00

Tabla 1. Mobiliario Urbano

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría Estructural y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

	
Casetas de Ventas	Mogador

Finalmente, esta interventoría informa que la información remitida en el momento, se encuentra en proceso de revisión y aclara que se encuentra sujeto a modificación de acuerdo a las necesidades que surjan en el desarrollo del proyecto, en pro de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, así mismo, cabe resaltar que desde el área social de interventoría y contratista de obra se ha brindado acompañamiento y atención a la veeduría, comerciantes y comunidad del sector.

Cordialmente,

Paola A. Rodriguez A.

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
Representante Legal

Anexos. Plan de manejo de tránsito PMT
Cronograma de obra

Cr 5 #11-24 Of 802 Edificio Torre Empresarial (608) 260-7486 - 3123065921
diagonalseptima.interventoria@gmail.com

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SÉPTIMA

Ricaurte, 01 de diciembre de 2023

ID7R-035

Ingeniera
DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ
Secretaria de Infraestructura y obras públicas
Alcaldía Municipal de Ricaurte
Cundinamarca
Ciudad

Referencia. **Contrato de Interventoría No. 413 de 2023 – "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Asunto: **SOLICITUD COMITÉ TÉCNICO – DEFINICIÓN ACOMETIDAS SANITARIAS Y PLUVIALES.**

Cordial saludo,

Respetada Ingeniera

Mediante el presente, esta interventoría solicita amablemente a la supervisión municipal llevar a cabo **COMITÉ TÉCNICO** en el área de intervención del proyecto, el **día lunes 04 de diciembre de 2023 a las 10:00 am,** con presencia de Yeimi Paulina Mendoza Perdomo en calidad de Gerente de ALCARI SAS ESP y el Arquitecto Fernelly Charry en calidad de secretario de Planeación.

Con el propósito de que sean definidas las acometidas sanitarias y pluviales de los predios que aún no cuentan con la conexión del servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial y/o predios con proyectos de desarrollo urbanístico o en trámite de licencias de construcción ubicados sobre la Diagonal Séptima a partir del Centro Vacacional de la ETB hasta la Carrera 16.

Teniendo en cuenta que en los próximos días se dará inicio a las actividades de excavación y conformación de estructura del pavimento correspondiente al alcance del **contrato de obra No. 403 de 2023 – "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Lo anterior, en atención a la solicitud emitida a través del oficio CDRC7-2023-010 por parte del CONSORCIO DIAGONAL RC en calidad de contratista de obra y en aras de evitar afectaciones futuras a la pavimentación.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
Representante Legal

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Ingeniería Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 4 de diciembre de 2023

ID7R-036

Señor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
Consorcio Diagonal RC
Representante Legal
Espinal, Tolima

Referencia. **Contrato de OBRA No 403 de 2023 — "PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"**

Asunto: **SOLICITUD ACTIVIDAD COMPONENTE SOCIAL – ORGANIZACIÓN TEMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el desarrollo y avance de la obra, es importante conocer la manera en la que se va a garantizar la recolección adecuada de residuos, a la comunidad la cual se encuentra involucrada alrededor del proyecto.

Lo anterior con el fin de informar a los involucrados, respecto al tema en mención, pues esto ya es motivo de preocupación, para algunas personas del sector y motivo de afectación para otros, como lo manifestó la directora de la ETB la señora OLGA LUCIA quien se quejó de manera verbal ,con la trabajadora social del consorcio porque el camión de recolección no pudo ingresar al hotel el día jueves 23 de noviembre del año en curso , dejando 30 canecas de residuos ,dado que el carro no pudo ingresar en su totalidad por la estreches del campo .

Amablemente y por lo anterior se solicita al componente social del consorcio la siguiente información.

- Estrategia o plan para el aseguramiento de recolección de residuos en el sector el cual se encuentra siendo intervenido en este momento. por personal del consorcio RC.
- Mecanismo de divulgación a la comunidad involucrada acerca de esta actividad.
- Acta o soporte el cual corrobore la socialización de dicha actividad a la comunidad involucrada.

Finalmente teniendo en cuenta la situación expuesta en este oficio y la importancia de avanzar frente al tema en mención, se informa que, desde el componente social de interventoría, se realiza gestión con el fin de ubicar al supervisor de operaciones de ser ambiental de la zona de Ricaurte, gestión que se logró de manera favorable. Dicha información se comparte a la trabajadora social del consorcio, con el fin de que se pueda asegurar todo lo correspondiente.

Cordialmente,

Paola A. Rodriguez A.
PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SÉPTIMA

Ricaurte, 07 de diciembre de 2023

ID7R-037

Ingeniera
DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ
Secretaria de Infraestructura y obras públicas
Alcaldía Municipal de Ricaurte
Cundinamarca
Ciudad

Referencia. **Contrato de Interventoría No. 413 de 2023 – "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Asunto: **DEFINICIÓN ACOMETIDAS PLUVIALES Y SANITARIAS.**

Cordial saludo, Respetada Ingeniera

Mediante el presente, esta Interventoría solicita definición de las acometidas pluviales a desarrollar en los predios ubicados sobre la Diagonal Séptima a partir del Centro Vacacional de la ETB hasta la carrera 16, de acuerdo al alcance del **contrato de obra No. 403 de 2023 – "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Teniendo en cuenta, la solicitud emitida a través del oficio ID7R-035 del día 01 de diciembre de 2023 y el comité técnico del día 04 de diciembre de 2023 con presencia de profesionales del área técnica y operativa de la empresa ALCARI SAS ESP.

Sin embargo, a la fecha no se cuenta con la definición de los puntos de acometida del área a intervenir, generando retrasos en las actividades programadas. Por lo cual, es necesario reiterar la solicitud presente, con el propósito de que sean definidas las acometidas pluviales de los predios que aún no cuentan con la conexión del servicio de Alcantarillado Pluvial y/o predios con proyectos de desarrollo urbanístico o en trámite de licencias de construcción ubicados sobre el área de intervención. Así mismo, que la empresa prestadora del servicio de la red de alcantarillado sanitario, establezca como llevara a cabo el desarrollo de las acometidas sanitarias de estos predios, teniendo en cuenta que, el alcance del contrato en referencia solo contempla red pluvial.

Lo anterior, en atención a la solicitud emitida a través del oficio CDRC7-2023-010 por parte del CONSORCIO DIAGONAL RC en calidad de contratista de obra y que se iniciaran las actividades de excavación y conformación de estructura del pavimento correspondiente al alcance.

Finalmente, en aras de evitar afectaciones futuras a la pavimentación y atrasos en la programación es indispensable contar la información requerida en la menor brevedad posible.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 11 de diciembre de 2023

ID7R-038

Ingeniera
DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ
Secretaria de Infraestructura y obras públicas
Alcaldía Municipal de Ricaurte
Cundinamarca
Ciudad

Referencia. **Contrato de Interventoria No. 413 de 2023 – "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Asunto: **EN ATENCIÓN AL COMUNICADO 190.19 No. 708-2023**

Cordial saludo,

Respetada Ingeniera

Mediante el presente y en atención al comunicado en asunto, esta interventoría informa que realizo contacto directo vía telefónica con el ingeniero Juan Fernando Jimenez Tarazona del equipo de construcción y gestión de convenios VP de infraestructura ETB, con el propósito de definir visita de inspección en el proyecto en compañía del CONSORCIO DIAGONAL RC en calidad de contratista de obra, para determinar las afectaciones y llevar a cabo las medidas correctivas que haya lugar. Sin embargo, no fue posible definir la fecha y hora para la visita, por lo cual, se informó sobre el horario de jornada laboral de la obra y se esta a la espera de la confirmación de disponibilidad del equipo de construcción de ETB.

Finalmente, esta interventoría se encuentra en disposición junto al contratista de obra para llevar a cabo el recorrido, una vez concretada la fecha y hora de la visita de inspección dentro de los horarios de la jornada laboral.

Lunes a viernes de 07:00 am – 12:00 m / 1:00 pm – 05:00 pm
Sábado 07:00 am – 12:00 m

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 12 de diciembre de 2023

ID7R- 039

Señor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
Consorcio Diagonal RC
Representante Legal
Espinal, Tolima

Referencia. **Contrato de OBRA No 403 de 2023 — "PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"**

Asunto: **ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FORMAL ACTAS DE VECINDAD**

Cordial saludo,

Se solicita de manera atenta allegar en la mayor brevedad la siguiente información para conocimiento y trámites pertinentes.

- Entrega de carpeta con acta de vecindad inicial y demás actas elaboradas durante el primer informe y hasta la fecha.
- Oficio el cual deberá ir en la primera página, el cual servirá como carta de presentación de la información contenida en la carpeta, de manera detallada.
- CD o archivo digital con el total de información relacionada en los ítems anteriores.

Cabe resaltar que se deben asegurar dos carpetas y archivo digital, una que será para entrega y radicacióna la supervisión y otra la cual deberá reposar en el campamento o punto destinado por el Consorcio Diagonal RC, para recibir a la interventoría y supervisión.

Finalmente se informa que, de manera presencial, se brindan indicaciones y recomendaciones a la profesional social del Consorcio Diagonal RC, con el fin de que pueda asegurar dicha solicitud de manera adecuada. Se aclaran dudas e inquietudes en su momento, sin embargo, se recalca la disposición por parte de la profesional social de interventoría en aclarar dudas, inquietudes o información adicional que se requiera en el momento de la elaboración de lo solicitado en este oficio

Sin otro motivo en particular, en espera de su atención al presente.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 12 de diciembre de 2023

ID7R-040

Señor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
Consorcio Diagonal RC
Representante Legal
Espinal, Tolima

Referencia. **Contrato de Obra No. 403 de 2023 – "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Asunto: **SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 403-2023**

Cordial saludo,

Mediante el presente, esta interventoría solicita amablemente al CONSORCIO DIAGONAL RC, allegar la siguiente información:

- Informe Mensual No. 01 con sus respectivos anexos, teniendo en cuenta el oficio ID7R-005 remitido el día 19 de octubre de 2023.
- Entrega de Diseño de Mezclas.
- Certificado de calidad de los materiales.

De igual manera, se solicita dar estricto cumpliendo a los tiempos establecidos para la entrega de los informes mensuales, de acuerdo al acta de inicio del contrato en referencia, el CONSORCIO DIAGONAL RC debe hacer entrega del informe de obra, los primeros tres (03) días hábiles de cada mes a esta interventoría, para su respectiva revisión, aprobación y posterior radicación de manera física en la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas. Por lo cual, el informe mensual No. 02 deberá ser entregado a más tardar el día 20 de diciembre de 2023.

Finalmente, se le recuerda al contratista de obra que la información requerida hace parte de sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato en referencia.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

7.11 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Consorcio Diagonal RC

RICAURTE –Cundinamarca
Noviembre 17 de 2023

OFC: 009

Señor:
Interventoría Diagonal 7
Paola Rodríguez Alcalá
Representante Legal

Mediante la siguiente, nos permitimos informarles que el día 17 de Noviembre del 2023 se radica el oficio 008 a la alcaldía municipal con el fin de solicitar apoyo a planeación sobre información de los propietarios de las viviendas ubicadas en el sector de la diagonal 7 ya que no se encuentran habitadas y no se ha logrado realizar el acta inicial correspondiente.

Se debe tener en cuenta que es de importancia realizar las actas de vecindad a todos los predios antes de inicio de obra para así tener verificación del estado de este como se encuentra. A su vez sensibilizar sobre el desarrollo, ejecución de avances, proceso correspondiente al ejecutar el cumplimiento del objeto: **PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA. Contrato de obra N. 403- 2023.**

Finalmente procedo a Anexar radicado recibido por alcaldía municipal; Agradezco la atención prestada.



FIRMA:

ELABORO: Profesional Trabajo Social
Consorcio diagonal RC.

Ricaurte
CON EQUIDAD, SEGURIDAD
Y COMPROMISO SOCIAL

110.19.2462

Ricaurte - Cundinamarca, 22 de noviembre de 2023.

Señora
DANIELA ALEJANDRA CIFUENTES
Trabajadora Social
Interventoría Diagonal Séptima
Celular 312 3065921
diagonalseptima.interventoria@gmail.com
Ricaurte

Asunto: Respuesta al oficio No.5555 de fecha 20 de noviembre de 2023.

Ref.: Solicitud de información- Levantamiento actas de vecindad.

Cordial saludo Sra. Daniela:

En atención a su oficio No. 5555 de fecha 20 de noviembre de 2023, en el cual solicita información respecto a la ubicación de los propietarios sobre la Diagonal 7 con el fin de realizar el levantamiento de las actas de vecindad del proyecto intervención sobre la Diagonal 7, por lo tanto, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

- Hugo Pulido Pulido, el cual puede comunicarse al número de celular 3183117845, quien es propietario del predio de las imágenes 1, 2, 4 y 6, según en el oficio aportado.

- Empresa de Telefonía de Bogotá- ETB, deberá comunicarse a los canales de atención o al Club Vacacional ETB, quien les podría suministrar un contacto directo con la empresa en mención.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

ARQ. JOSÉ FERNELLY **CHARRY PRADA**
Secretario de Planeación

Elaborado por: Leidy Avila, Auxiliar Administrativo

CONSORCIO DIAGONAL R.C

Ricaurte 23 de noviembre de 2023 ID7R-028

Señora
PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
Representante legal
Ricaurte-Cundinamarca

Referencia **Contrato de obra No. 403 de 2023 –"PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA".**

Asunto: **RESPUESTA OFICIO ID7R-028-INTERVENTORIA "OBSERVACIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"**

Cordial saludo,

Mediante el presente, me permito dar respuesta a las siguientes observaciones recibidas por parte del área de SST de interventoría.

1. El tramo en intervención cuenta con la señalización adecuada y sendero peatonal limpio y despejado para los habitantes de la zona y transeúntes, se garantizó habilitar la mitad del carril para el paso vehicular liviano.



2. Avances de acopio y lugar de almacenamiento de herramientas y materiales



CONSORCIO DIAGONAL R.C

3. Se garantiza orden y aseo de material y obra en la zona de intervención





4. El personal que se encuentra realizando tala de árboles cuentan con los elementos de protección personal adecuados que se requiere para dicha actividad, junto con los equipos y permiso de alturas suministrados.





Finalmente se da respuesta y solución ante las observaciones sugeridas por parte de interventoría, para poder continuar con las intervenciones de dichas actividades de obra.

Cordialmente,

YULI NATALIA RODRIGUEZ SANTOS
AUX SST- DIAGONAL 7

Elaboro: auxiliar SST

Consorcio Diagonal RC

Ricaurte, noviembre 30 de 2023

CDRC7-2023-010

Señores
Interventoría Diagonal Séptima
Atn. Ing. **PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA**
Representante Legal
Ricaurte - Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de obra pública 403-2023 el cual tiene por objeto la "PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16..."

ASUNTO: Definición acometidas sanitarias y pluviales.

Cordial saludo.

La presente tiene por objeto solicitar un comité técnico en la obra en el cual se defina al contratista de manera oficial una a una las acometidas pluviales y sanitarias, en especial para los predios no construidos a los cuales se debe proyectar estas conexiones antes de la pavimentación. En nuestra programación se tiene previsto iniciar con cajeo de vía la próxima semana, pero técnicamente se deben hacer antes las acometidas para evitar afectar o dañar la subrasante del cajeo, es por esto nuestra urgencia de que esto se defina cuanto antes para iniciar con esta actividad lo mas pronto.

Teniendo en cuenta que nuestro canal de comunicación es a través de la interventoría solicitamos se haga extensiva esta invitación a operador de la red y la supervisión si es el caso.

Cordialmente,

SERGIO MAURICIO LEAL TOVAR
Ingeniero Residente

Calle 7 No. 8-54 - Teléfono: 2390025 - 2480155 Espinal - Tolima
e-mail: correspondenciadiagonal7rte@gmail.com

Ricaurte
CON EQUIDAD, SEGURIDAD
Y COMPROMISO SOCIAL

190.19. No. 708 - 2023

Ricaurte, 07 de Diciembre de 2023

Ingeniera
PAOLA RODRÍGUEZ ALCALÁ
R.L. Interventoría
Ibagué - Tolima

Referencia: Contrato de Obra N° 403-2023 y de Interventoría N° 413-2023. Obras de Pavimentación Diagonal 7 desde la Calle 10 hasta la Cra. 16 Municipio de Ricaurte.

Asunto: Solicitud de reparación de daños sobre infraestructura ETB en la Diagonal 7 # 13-297 Ricaurte.

Cordial saludo,

En atención al comunicado recibido vía correo electrónico el día de ayer 06 de diciembre 2023 por parte del Profesional Juan Fernando Jimenez Tarazona del equipo de construcción y gestión convenio VP de Infraestructura de la empresa ETB, nos permitimos remitir a ustedes como Interventoría para que realicen la respectiva revisión en sitio y tomen las medidas correctivas.

Solicitamos de su comunicación con el profesional de la ETB y requerimiento al contratista de obra, para de esta manera subsanen lo solicitado.

Atentamente,

Ing. DENNISSE ELENA CORTÉS LÓPEZ
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas

Anexo: Cinco (05) folios de solicitud Juan Fernando Jiménez – Etb.

Proyectado por: Ing. Mónica A. Malagón C.
Profesional Universitario de Apoyo SIOP

Gmail

Monaleja Malagon <monicamalagon81@gmail.com>

Fwd: Solicitud de reparación de daños sobre infraestructura ETB en la diagonal 7 # 13-297 del municipio de Ricaurte Cundinamarca

1 mensaje

Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas <obras@ricaurte-cundinamarca.gov.co> 6 de diciembre de 2023, 4:27 p.m.
Para: monicamalagon81 <monicamalagon81@gmail.com>

ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas
Alcaldía de Ricaurte, Cundinamarca

Ricaurte
CON EQUIDAD, SEGURIDAD, Y COMPROMISO SOCIAL

De: "contactenos" <contactenos@ricaurte-cundinamarca.gov.co>
Para: "obras" <obras@ricaurte-cundinamarca.gov.co>
Enviados: Miércoles, 6 de Diciembre 2023 15:51:19
Asunto: Fwd: Solicitud de reparación de daños sobre infraestructura ETB en la diagonal 7 # 13-297 del municipio de Ricaurte Cundinamarca

Cordial saludo,

Se envía por competencia a Secretaría de Obras e Infraestructura Publica.

Agradecemos enviar copia de la respuesta al correo contáctenos.

NOTA: De conformidad con el artículo 21 de la ley 1755 de 2015, si la información requerida no es de su competencia, se solicita que la reenvíen dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción a la secretaría y/o dependencia e informen inmediatamente a esta dependencia.

De conformidad con el **artículo 31 de la ley 1755 de 2015**, el no responder un derecho de petición constituye ***Falta disciplinaria.*** *"La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Código, constituirán falta para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario".*

Atentamente,

SANDRA YANETH MEDINA RAMIREZ
Dirección de Atención al Usuario y PQRSD
Alcaldía de Ricaurte – Cundinamarca

Proyectó: Martha Vera
Auxiliar Administrativo

De: "JUAN FERNANDO JIMENEZ TARAZONA" <juanjimt@etb.com.co>
Para: "contactenos" <contactenos@ricaurte-cundinamarca.gov.co>
Enviados: Miércoles, 6 de Diciembre 2023 15:36:51
Asunto: Solicitud de reparación de daños sobre infraestructura ETB en la diagonal 7 # 13-297 del municipio de Ricaurte Cundinamarca

Buenas tardes:

Amablemente se solicita el apoyo de la alcaldía del municipio de Ricaurte Cundinamarca para requerir a la interventoría del contrato mediante el cual se están realizando las excavaciones que se observan en el siguiente registro fotográfico, de la diagonal 7 # 13 - 297, del municipio de Ricaurte Cundinamarca, para que coordine con ETB un recorrido de verificación de infraestructura con el fin de que se realicen las reparaciones a las canalizaciones que se observaron en daño hoy 6 de diciembre de 2023 para que posteriormente ETB pueda reparar las redes de cobre y fibra óptica afectadas por las mismas excavaciones.


Agradecemos contactar al contratista para que no realice el relleno de las excavaciones, ni construya la vía o espacio público hasta que no repare las canalizaciones, pues es necesario que la canalización se encuentre reparada y funcional para poder reparar los daños en las redes de ETB.

Cabe anotar que en el sitio no se dispone de una valla o de señalización para establecer contacto con los encargados de las obras.

A continuación, el registro fotográfico de los ductos y redes en daño por las excavaciones:


6 dic. 2023 9:31:08 a. m.
Diagonal 7ª
Ricaurte
Cundinamarca


6 dic. 2023 9:31:25 a. m.
Diagonal 7ª
Ricaurte
Cundinamarca

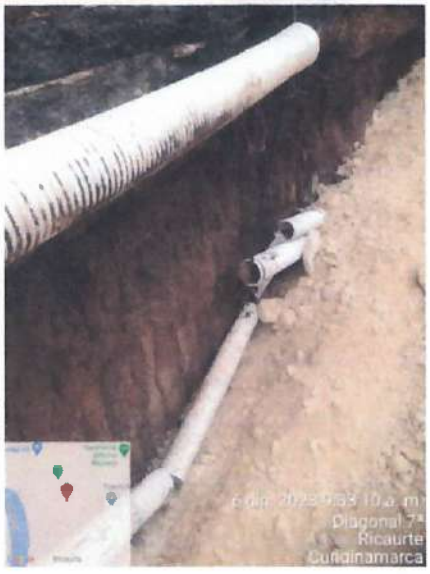
Diagonal 7ª
Ricaurte
Cundinamarca


6 dic. 2023 9:33:03 a. m.
Diagonal 7ª
Ricaurte
Cundinamarca


6 dic. 2023 9:33:15 a. m.
Diagonal 7ª
Ricaurte
Cundinamarca

1122





Cordialmente,

JUAN FERNANDO JIMENEZ TARAZONA
INGENIERO I
EQUIPO CONSTRUCCION Y GESTION CONVENIOS
VP DE INFRAESTRUCTURA

601242202 | 3057134816

Salitre, Cra 52 44C-55 | Piso 3 | Bogotá - Colombia

Los correos recibidos no implican respuesta inmediata si son enviados fuera de la jornada laboral, en cumplimiento con la Ley 2191 de desconexión laboral

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de ETB. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridad_informatica@etb.com.co y bórrelo. Si usted es el

destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.
LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information ETB. If you are not the intended recipient, you should not use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in Law 1273 of 5 January 2009 and all that apply .If you have received this e-mail transmission in error, please inform us at seguridad_informatica@etb.com.co and erase it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists.

Consorcio Diagonal RC

11 Diciembre 2023 – RICAURTE Cundinamarca.

CDRC7-2023-0011

PAOLA RODRIGUEZ ALCALA
ITERVENTORIA DIAGONAL 7
Ricaurte, Cundinamarca

Asunto: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE SOCIAL.

Referencia. Contrato de Obra No. 403 de 2023 – "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA".

A Su solicitud de los siguientes:

- Soporte de Censo o herramienta la cual se implementó para el conocimiento del total de casas a intervenir, teniendo en cuenta el impacto de la obra
- Actas de vecindad realizadas a la fecha y número de viviendas faltantes
- Actas de participación social ciudadana veeduría
- Soporte de gestión de predios sin habitantes
- Cronograma de actividades a ejecutar teniendo en cuenta el tiempo estimado de obra.

Cordial saludo.

En calidad de profesional social del consorcio diagonal RC doy a conocer:


1. Herramienta utilizada para la intervención de casa a realizar actas de vecindada inicial es la cartografía y el correspondiente censo en donde se evidencia 72 casa a realizar las visitas de acta inicial las cuales corresponden desde el punto puerta amarilla hasta al carrera 16 sobre la diagonal 7 del municipio de Ricaurte Cundinamarca sector en el que se está desarrollando el objeto del obra. - Anexo mapa:



Consorcio Diagonal RC

2. Se informa que a la fecha 04 diciembre 2023 se encuentran **68 ACTAS** de vecindad inicial realizadas con firma los propietarios de cada predio, residente de obra e interventoría. Número de viviendas faltantes 4.(adjunto escaneado del soporte de las mismas)
3. Actas de participación ciudadana 16 actas seguimiento veeduría (se adjuntara escaneo de las mismas por archivo adjunto).
4. Soporte de seguimiento de predios inhabitados.





5. Cronograma de actividades por mes a iniciar DICIEMBRE 2023. Por favor tener en cuenta que el siguiente será sujetos a cambios los cuales se informaran con un día de anticipación vía llamada, mensaje de whassap, mensaje correo a componente profesional social de inetreventoria.

DIA ,FECHA, HORA	ACTIVIDAD
VIERNES 01 DICIEMBRE 2023 2 A 5 PM	LEVANTAR ACTAS DE LAS VIVIENDAS FALTANTES SEGÚN SENCO CORRESPONDIENTE.
SABADO 02 DIEMBRE 2023 8 A 12 AM	INFORMAR A COMUNIDAD SOBRE EL SECTOR DEL TRAMO POZO 6, 7 DE LOS CIERRES Y CARRIL HABILITADO VEHICULAR
LUNES 04 DIEMBRE 2023 2 A 5 PM	INFORMAR Al club ETB SOBRE EL RETIRO DE LETRAS AVISO ADORNO DEL CLUB YA QUE SE ENCUENTRA EN EL SEPARADOR DE LA VIA Y ESTA SERA INTERVENIDA CON ESCABACION.
MARTES 05 DICIEMBRE 2023 2 A 5 PM	REDARTAR RESPUESTA DE OFICOS CORRESPINDIENTES, INFORMAR MEDIANTE VISCITA Y ENTREGA DE VOLANTE INFORMATIVO DEL PUNTO ATENCION AL USUSARIO.
MIERCOLES 06 DICIEMBRE 2023 2 A 5 PM	AJUSTAR ACTAS DE VECINDAD CON FOTOS DE FACHADA CORRESPONDIENTE.
JUEVES 07 DICIEMBRE 2023 2 A 5 PM	ASISTIR A CITA CON SEÑOR PROPIETARIO DE UN PREDIO DESABITADO YA QUE SU PROPIETARIO RADICA EN LA UNA CIUDAD DIFERENTE A DONDE SE ENCUENTRA EL PREDIO UBICADO SOBRE LA DIAGONAL 7 Y REALIZAR EL CORRESPONDIENTE ACTA
SABADO 09 DICEMBRE 2023 8 A 12 AM	INFORMAR A COMUNIDAD DEL PUNTO DE ATENCION HORARIOS PARA LAS RESPECTIVA QPR DE COMUNIDAD Y VEEDURIA LEVANTAR ACTA CON CORREO Y ATENCIO AL USUARIO

Consorcio Diagonal RC

LUNES 11 DICIEMBRE 2023 8 A 12 PM	REUNION CON COLABORADORES, RESPONDER OFICIO 1. EMITIDO POR INTERVENTORIA SOCIAL.
MARTES 12 DICIEMBRE 2023 2 A 5 PM	REALIZAR CARTELERA INFORMATIVA Y DEJAR INSTALADA EN PUNTO DE ATNECION A LA COMUNIDAD.
MIERCOLES 13 DICIEMBRE 2023 2 A 5 PM	IMPRIMIR ACTAS CON LAS RESPECTIVAS FOTOS - HACER CARPETA EN FISICO DE OFICIOS DE REQUIERIMIENTO SOCIAL.
JUEVES 14 DICIEMBRE 2023 2 A 5 PM	INICIAR INFORME MENSUAL Y ENVIAR PARA REVICION A COMPONENTE SOCIAL INTERVENTORIA
VIERNES 15 DICIEMBRE 2023 2 A 5 PM	RESPONDER OFICIO 2. ENVIADO POR INTERVENTORIA COMPONNTE SOCIAL ESTAR EN PUNTO DE ATENCION PARA RECIBIR Y RESPONDER QPR COMUNIDAD
SABADO 16 DICIEMBRE 2023 8 A 12 AM	REALIZAR RESPUESTA OFICIO 3 ENVIADO POR COMPONENTE SOCIAL INTERVENTORIA.
LUNES 18 DICIEMBRE 2023 2 A 5 PM	ESTAR EN PUNTO DE ATENCION A LA COMUNIDAD PARA RESPUESTA DE POSIBLES QPR SEGUIMIENTO Y ENTREGA AL INFORME MESUAL
MARTES 19 DICIEMBRE 2023 2 A 5 PM	RESPONDER OFICIO 4. ENVIADO POR INTERVENTORIA.
MIERCOLES 20 DICIEMBRE 2023 2 A 5 PM	REALIZAR RECORRIDO CON VEEDURIA DESDE EL INICIO DEL PROYECTO, AVANCES Y CONTINUIDAD DEL DESARROLLO DEL MISMO.
JUEVES 21 DICIEMBRE 2023 2 A 5 PM	CONVOCAR REUINION CON VEEDURIA PARA INFORMAR DE AVANCES Y DESARROLLO DEL OBJETO DE LA OBRA.
VIERNES 22 DICIEMBRE 2023 2 A 5 PM	ESTAR ATENTA EN PUNTO DE ATENCION A LA COMUNIDAD CONVOCAR REUINION CON VEEDURIA PARA INFORMAR DE AVANCES Y DESARROLLO DEL OBJETO DE LA OBRA.
SABADO 23 DICIEMBRE 2023 8 A 12 AM	ARCHIVAR DOCUMENTACION AZ
MARTES26 DICIEMBRE 2023 2 A 5 PM	CONVOCAR REUNION CON VEDURIA Y COMUNIDAD EN GENERAL
MIERCOLES 27 DICIEMBRE 2023 2 A 5 PM	INFORMAR, RESPONDER POSIBLES PQR
JUEVES 28 DICIEMBRE 2023 2 A 5 PM	REUNION CON VEEDURIA PARA SOCIALIZARA AVANCES Y DESARROLLO
VIERNES 29 DICIEMBRE 2023 2 A 5 PM	ESTAR EN PUNTO DE ATENCION A LA COMUNIDAD
SABADO 30 DICIEMBRE 2023 8 A 12 AM	ESTAR EN PUNTO DE ATENCION A LA COMUNIDAD

Consorcio Diagonal RC

11 Diciembre 2023 – RICAURTE Cundinamarca.

CDRC7-2023-0012

PAOLA RODRIGUEZ ALCALA
ITERVENTORIA DIAGONAL 7
Ricaurte, Cundinamarca

Asunto: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE SOCIAL.

Referencia. Contrato de Obra No. 403 de 2023 – "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA".

A Su solicitud de los siguientes:

- Soporte de Censo o herramienta la cual se implementó para el conocimiento del total de casas a intervenir, teniendo en cuenta el impacto de la obra
- Actas de vecindad realizadas a la fecha y número de viviendas faltantes
- Actas de participación social ciudadana veeduría
- Soporte de gestión de predios sin habitantes
- Cronograma de actividades a ejecutar teniendo en cuenta el tiempo estimado de obra.

Cordial saludo.

En calidad de profesional social del consorcio diagonal RC doy a conocer:

1. Herramienta utilizada para la intervención de casa a realizar actas de vecindad inicial es la cartografía y el correspondiente censo en donde se evidencia 72 Predios a realizar las visitas de acta inicial las cuales corresponden desde el punto puerta amarilla hasta al carrera 16 sobre la diagonal 7 del municipio de Ricaurte Cundinamarca sector en el que se está desarrollando el objeto del obra. - Anexo mapa:

Consorcio Diagonal RC

Agradezco su atención, apoyo ante desarrollo del objeto a la obra.

Cordialmente:



Yenit Yaneth Quintero Salguero
COMPONENTE SOCIAL DIAGONAL RC
MOVIL: 3144110756
yanethquinterot.s@gmail.com

Consorcio Diagonal RC



2. Se informa que a la fecha 11 Diciembre 2023 se encuentran **68 ACTAS** de vecindad inicial realizadas con firma los propietarios de cada predio, residente de obra e interventoría. Número de viviendas faltantes 4. (adjunto escaneado del soporte de las mismas)
3. Actas de participación ciudadana 16 actas seguimiento veeduría (se adjunta escaneo de las mismas por archivo adjunto).
4. Soporte de seguimiento de predios inhabitados.





5. Cronograma de actividades por mes a iniciar DICIEMBRE 2023. Por favor tener en cuenta que el siguiente será sujeto a cambios los cuales se informaran con un día de anticipación vía por medio de. llamada, mensaje de whassap, mensaje correo a componente profesional social de interventoría.

DIA ,FECHA, HORA	ACTIVIDAD
VIERNES 01 DICIEMBRE 2023 2 A 5 PM	LEVANTAR ACTAS DE LAS VIVIENDAS FALTANTES SEGÚN CENSO CORRESPONDIENTE.
SABADO 02 DIEMBRE 2023 8 A 12 AM	INFORMAR A COMUNIDAD SOBRE EL SECTOR DEL TRAMO POZO 6, 7 DE LOS CIERRES Y CARRIL HABILITADO VEHICULAR
LUNES 04 DIEMBRE 2023 2 A 5 PM	INFORMAR AL CLUB ETB SOBRE EL RETIRO DE LETRAS AVISO ADORNO DEL CLUB YA QUE SE ENCUENTRA EN EL SEPARADOR DE LA VIA Y ESTA SERA INTERVENIDA CON ESCABACION.

Consorcio Diagonal RC

Martes 05 Diciembre 2023 2 A 5 Pm	REDARTAR RESPUESTA DE OFICOS CORRESPINDIENTES, INFORMAR MEDIANTE VISCITA Y ENTREGA DE VOLANTE INFORMATIVO DEL PUNTO ATENCION AL USUSARIO.
Miércoles 06 Diciembre 2023 2 A 5 Pm	AJUSTAR ACTAS DE VECINDAD CON FOTOS DE FACHADA CORRESPONDIENTE.
Jueves 07 Diciembre 2023 2 A 5 Pm	ASISTIR A CITA CON SEÑOR PROPIETARIO DE UN PREDIO DESHABITADO YA QUE SU PROPIETARIO RADICA EN UNA CIUDAD DIFERENTE DONDE SE ENCUENTRA EL PREDIO UBICADO SOBRE LA DIAGONAL 7 Y REALIZAR EL CORRESPONDIENTE ACTA
Sábado 09 Diciembre 2023 8 A 12 Am	INFORMAR A COMUNIDAD DEL PUNTO DE ATENCION HORARIOS PARA LAS RESPECTIVA QPR DE COMUNIDAD Y VEEDURIA LEVANTAR ACTA CON CORREO , ATENCIO AL USUARIO
Lunes 11 Diciembre 2023 8 A 12 Pm	REUNION CON COLABORADORES, RESPONDER OFICIO 1. EMITIDO POR INTERVENTORIA SOCIAL.
Martes 12 Diciembre 2023 2 A 5 Pm	REALIZAR CARTELERA INFORMATIVA Y DEJAR INSTALADA EN PUNTO DE ATNECION A LA COMUNIDAD.
Miércoles 13 Diciembre 2023 2 A 5 Pm	IMPRIMIR ACTAS CON LAS RESPECTIVAS FOTOS . HACER CARPETA EN FISICO DE OFICIOS DE REQUIERIMIENTO SOCIAL.
Jueves 14 Diciembre 2023 2 A 5 Pm	INICIAR INFORME MENSUAL Y ENVIAR PARA ENVIAR A COMPONENTE SOCIAL INTERVENTORIA
Viernes 15 Diciembre 2023 2 A 5 Pm	RESPONDER OFICIO 2. ENVIADO POR INTERVENTORIA COMPONNTE SOCIAL ESTAR EN PUNTO DE ATENCION PARA RECIBIR Y RESPONDER QPR COMUNIDAD
Sábado 16 Diciembre 2023 8 A 12 Am	REALIZAR RESPUESTA OFICIO 3 ENVIADO POR COMPONENTE SOCIAL INTERVENTORIA.
Lunes 18 Diciembre 2023 2 A 5 Pm	ESTAR EN PUNTO DE ATENCION A LA COMUNIDAD PARA RESPUESTA DE POSIBLES QPR SEGUIMIENTO Y ENTREGA AL INFORME MESUAL
Martes 19 Diciembre 2023 2 A 5 Pm	RESPONDER OFICIO 4. ENVIADO POR INTERVENTORIA.
Miércoles 20 Diciembre 2023 2 A 5 Pm	REALIZAR RECORRIDO CON VEEDURIA DESDE EL INICIO DEL PROYECTO, AVANCES Y CONTINUIDAD DEL DESARROLLO DEL MISMO.
Jueves 21 Diciembre 2023 2 A 5 Pm	CONVOCAR REUINION CON VEEDURIA PARA INFORMAR DE AVANCES Y DESARROLLO DEL OBJETO DE LA OBRA.
Viernes 22 Diciembre 2023 2 A 5 Pm	ESTAR ATENTA EN PUNTO DE ATENCION A LA COMUNIDAD
Sábado 23 Diciembre 2023 8 A 12 Am	ARCHIVAR DOCUMENTACION AZ
Martes26 Diciembre 2023 2 A 5 Pm	CONVOCAR REUNION CON VEEDURIA Y COMUNIDAD EN GENERAL
Miércoles 27 Diciembre 2023 2 A 5 Pm	INFORMAR, RESPONDER POSIBLES PQR
Jueves 28 Diciembre 2023 2 A 5 Pm	REUNION CON VEEDURIA PARA SOCIALIZAR AVANCES Y DESARROLLO
Viernes 29 Diciembre 2023 2 A 5 Pm	ESTAR EN PUNTO DE ATENCION A LA COMUNIDAD
Sábado 30 Diciembre 2023 8 A 12 Am	ESTAR EN PUNTO DE ATENCION A LA COMUNIDAD

Consorcio Diagonal RC

12- DICIEMBRE 2023

CDRC7-2023-0013

Señora:
PAOLA RODRIGUEZ ALCALA
ITERVENTORIA DIAGONAL 7
Ricaurte, Cundinamarca

Referencia. Contrato de Obra **No. 403 de 2023 – "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"**

Asunto: **SOLICITUD ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL**

- Punto de atención presencial de atención al usuario
- Horarios de atención
- De no contar con disponibilidad de atención presencial, asegurar otros canales de registro de PQRS y atención al usuario (whatssap, correo electrónico) u otro el cual se encuentre al alcance del CONSORCIO DIAGONAL RC.
- Acta o soporte donde se evidencie la divulgación a la comunidad implicada sobre el punto de atención al ciudadano junto con sus horarios.
- Acta o soporte donde se evidencie divulgación a la comunidad implicada acerca de medios de atención al ciudadano para registro de PQRS o información general del proyecto, lo anterior de No contar con punto físico de atención.
- Formato de registro de PQRS
- Formato de respuesta, con logos del consorcio y demás donde el lector identifique, quien responde su manifestación.

Cordial saludo.
En calidad de componente profesional social.

1. Punto de atención predio lote alameda del sol ubicado sobre la diagonal 7 diagonal a la droguería.
2. Horario de atención 2 a 3 pm los días lunes y jueves
3. Correo: gprdiagonal7@mail.com
4. Celular:3144110756
5. Acta o soporte donde se evidencie la divulgación a la comunidad implicada sobre el punto de atención al ciudadano junto con sus horarios.

Consorcio Diagonal PC









6. Formato de registro PQR Y RESPUESTA con logos correspondientes.





Consorcio Diagonal RC

Agradezco su atención, apoyo ante desarrollo del objeto a la obra.

Cordialmente:



Yenit Yaneth Quintero Salguero
COMPONENTE SOCIAL DIAGONAL RC
MOVIL: 3144110756
yanethquinterot.s@gmail.com

1130

Consorcio Diagonal RC

Ricaurte, diciembre 13 de 2023

CDRC7-2023-014

Señores
Interventoría Diagonal Séptima
Atn. Ing. **PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA**
Representante Legal
Ricaurte - Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de obra pública 403-2023 el cual tiene por objeto la "PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16..."

ASUNTO: Intervención Andenes y retiro de cubiertas Diagonal 7.

Cordial saludo.

La presente tiene por objeto solicitar el acompañamiento para la socialización con la comunidad de la intervención de andenes y retiro de cubiertas exteriores de la Diagonal 7, en el entendido que se deben iniciar labores de excavación de la vía y andenes de acuerdo con la programación de obra del proyecto.

El día de ayer en horas de la tarde, se efectuó un recorrido con un funcionario de la Secretaria de Gobierno del municipio de Ricaurte, encargado del Espacio Público, detectando molestias en la comunidad vecina del proyecto, por la próxima ejecución de estas actividades.

Por lo anterior es importante adelantar las gestiones necesarias para poder continuar con el desarrollo del contrato de la referencia.

Cordialmente,

SERGIO MAURICIO LEAL TOVAR
Ingeniero Residente

Consorcio Diagonal RC

13 DE DICIEMBRE 2023

CDRC7-2023-0015

Señora:
PAOLA RODRIGUEZ ALCALA
ITERVENTORIA DIAGONAL 7
Ricaurte, Cundinamarca

Referencia. **Contrato de OBRA No 403 de 2023 — "PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"**

Asunto: **RESPUESTA A SU SOLICITUD ACTIVIDAD COMPONENTE SOCIAL – ORGANIZACIÓN TEMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.**

- Estrategia o plan para el aseguramiento de recolección de residuos en el sector el cual se encuentra siendo intervenido en este momento. Por personal del consorcio RC.
- Mecanismo de divulgación a la comunidad involucrada acerca de esta actividad
- Acta o soporte el cual corrobore la socialización de dicha actividad a la comunidad involucrada.

En calidad profesional Social del Consorcio Diagonal RC me permito informar:

Se realiza recorrido con el supervisor de la rutas correspondientes de la empresa ser ambiental donde se llega a acuerdos de garantizar el debido proceso de recolección de los residuos a los predios ubicados cercas al tramo de intervención de los pozos 6, 7 en donde queda como compromiso que seguirán siendo los días martes, jueves, sábados que la ruta de la empresa ser ambiental realizara dicha actividad. Y a su vez de parte del consorcio diagonal RC se garantizara el ingreso por medio carril habilitado para el debido desarrollo de recolección de los residuos.

Seguido a realizar acuerdos con el profesional de la empresa ser ambiental se informa mediante visitas domiciliaria a la comunidad que se garantizara el debido ingreso por la vía al carro recolector para que cumpla su actividad de recolección de residuos en sus respectivos predios como lo vienen ejecutando.

Consorcio Diagonal RC

1. Se anexa acta con supervisor.



2. Se anexa acta de información entregada a la comunidad del sector.





Agradezco su atención, apoyo ante desarrollo del objeto a la obra.

Cordialmente:



Yenit Yaneth Quintero Salguero
COMPONENTE SOCIAL DIAGONAL RC
MOVIL: 3144110756
yanethquinterot.s@gmail.com

ACTA DE REUNION DE COMUNIDAD N._____

TIPO DE CONTRATO: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBRA INTERVENTORIA CONSULTORIA ESTUDIOS DISEÑO OBRA OTRO)	OBRA	**CONTRATO/CONVENIO No.** (ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)	403 de 2023
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE –CUNDINAMARCA		
CONTRATISTA : (TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO) (RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA)	CONSORCIO DIAGONAL RC	**INTERVENTOR:** (NOMBRE SOCIAL DEL INTERVENTOR)	PAOLA RODRIGUEZ ALCALA
SUPERVISOR: (NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR DESIGNADO)	MUNICIPIO DE RICAURTE		

Objetivo De La Visita: Realizar recorrido con el supervisor de operaciones de la empresa SER AMBIENTAL, zona Ricaurte, con el fin de organizar estrategia a implementar para la adecuada recolección de residuos a las personas y establecimientos los cuales se encuentran ubicados alrededor del desarrollo de la obra.

DESARROLLO DE VISCITA

Se realiza contacto con el señor Wilmer Mora supervisor de las rutas recolectoras de la empresa ser ambiental a quien se realiza contacto vía llamada al número 3204269106 donde se llega a un acuerdo de recorrido en el sector cerca al tramo que se está interviniendo los pozos 6, 7 desarrollo en ejecución del objeto.

Con este recorrido se da a conocer al supervisor técnico encargado de la zona, los puntos exactos de intervención de la obra, con el fin de que se pueda llevar a cabo dicha actividad de recolección de residuos los días martes y jueves como es habitual, sin dificultad mayor.
Durante el recorrido se llega al club de la ETB, en donde manifiesta el señor Wilmer que si hay posibilidad de hacer un relleno justo al frente del tramo que esta destapado para que el conductor del carro recolector no tenga dificulta al ingresar al club ETB, se logra aclara en el momento que desde el componente social no se compromete a tapar dicho punto puesto que esa excavación está en desarrollo de ejecución a las actividades de avance del objeto de obra más sin embargo se realizara comunicación con el ingeniero residente para dicha sugerencia.

- A su vez indaga sobre los maletines a la vista para el ingreso con facilidad al club ante ello se informa que le pertenecen a la 40 EXPRESS y nosotros no logramos hacer dicha gestión ya que nosotros no nos corresponde ese sector en desarrollo.
- El consorcio diagonal RC desde el componente social informa al señor Wilmer que se garantizara medio carril para el vehículo recolector realice su recorrido correspondiente

De ante mano se agradece la atención y el tiempo al señor Wilmer quien en calidad de supervisor de operaciones, realizo este acompañamiento al componente social de la obra, con el fin de velar por el bienestar de la comunidad la cual se encuentra involucrada por el desarrollo de la obra **PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DELA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA.**

Anexo evidencia fotográfica del encuentro.






Nota. Acta verificada y ajustada, por parte de interventoría social, se brindan recomendaciones, para la elaboración de próximos documentos .

ACTA DE REUNION DE COMUNIDAD N._____

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO/CONVENIO No.** 403 de 2023

OBJETO: PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE -CUNDINAMARCA

CONTRATISTA : CONSORCIO DIAGONAL RC **INTERVENTOR:** PAOLA RODRIGUEZ ALCALA **SUPERVISOR:** MUNICIPIO DE RICAURTE

FIRMAS
Profesional Social
Supervisor de operaciones Ser Ambiental Wilmo. Mora
Interventoría Social Daniel Machetes

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

7.12 RESULTADOS DE LABORATORIO

1134

INGEOBRAS Ingeniería & Construcciones S.A.S

Girardot, 25 de Noviembre de 2023

Ingeniera:
PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
Ricaurte – Cundinamarca

Respetada Ing. Paola:

Por medio de la presente nos permitimos dar a conocer los resultados de los ensayos Toma de Densidades en el Terreno con Cono y Arena realizados directamente en el Proyecto que tiene como objeto; Contrato de Interventoría No. 413 de 2023. "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para las Obras de avimentación y embellecimiento de la Diagonal 7 desde la Calle 10 hasta la Carrera 16 del Municipio de Ricaurte – Cundinamarca"; Localizado en el Municipio de Ricaurte; Departamento de Cundinamarca.

Los ensayos fueron realizados de acuerdo con la Norma I.N.V E-161-2013.

Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración o información complementaria que pudiere requerirse y esperamos poder servirles.

Cordialmente,

OSCAR HUGO NIETO LAGUNA
Ingeniero Civil
Gerente Corporativo
Representante Legal

Carrera 9 No. 32-111 Barrio/Rosablanca Girardot-Cundinamarca
Cel.: 3218852425 - 3208095823
ingeobrasohnsas@gmail.com gerenciaohn@outlook.com

INGEOBRAS
Ingeniería & Construcciones S.A.S

EMISIÓN: 06/10/2020	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA INV E – 161 – 13	INGEOBRAS
VERSIÓN: 1		
CONSECUTIVO: INGEO N°2214		

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES

MATERIAL: BASE GRANULAR — PROCEDENCIA: NAUTILA

CONTRATISTA: PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA — MUNICIPIO: RICAURTE - CUNDINAMARCA

LOCALIZACIÓN: DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 — VÍA EXIST: ☐ — FECHA T: 23-nov-23

PROYECTO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 413 DE 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA" — VÍA NUEVA: ☑ — FECHA E: 25-nov-23

Densidad N°	1	2	3	4	5	6
Ubicación	POZO 2 AL POZO 3	POZO 3 AL POZO 3A				
Localizacón	ALCANTARILLADO	ALCANTARILLADO				
Profundidad (m)	0,12	0,12				
Peso frasco y arena inicial, g	6.370	6.494				
Peso frasco y arena restante, g	2.626	2.796				
Peso arena total usada, g	3.744	3.698				
Constante del Cono	1.676	1.647				
Peso arena en el hueco, g	2.068	2.051				
Densidad de la arena, g / cm^3	1,40	1,40				
Volumen del hueco, cm^3	1.477	1.465				
Peso material extraído húmedo, g	3.458	3.440				
% de Humedad	8,0	8,2				
Peso material extraído seco, g	3.202	3.179				
Densidad del material, g/cm^3	2,168	2,170				
Densidad Maxima de Laboratorio, g / cm^3	2,143	2,143				
% Humedad óptima laboratorio	8,5	8,5				
% De compactación en el terreno	101,1	101,3				
Peso Material Retenido en el terreno Tamiz 3/4"	355,0	410,0				
% Retenido Del material retiene Tamiz 3/4"	10,27	11,92				
Peso Especifico de Agregado Grueso	2,506	2,506				
Densidad Del Material Corregida g/cm3	2,135	2,132				
Densidad Maxima de Laboratorio g/cm3	2,143	2,143				
% De compactación en el terreno	99,6	99,5				
% De compactación especificada	98,0	98,0				
CUMPLE	☑ SI ☐ NO	☑ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

OBSERVACIONES: PROCTOR SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA

ING.OSCAR HUGO NIETO L.
GERENTE CORPORATIVO

KIRLEY DAVID PINO BEJARANO
ASISTENTE DE LABORATORIO

INGEOBRAS
Ingeniería & Construcciones S.A.S

EMISIÓN: 06/10/2020 VERSIÓN: 1 CONSECUTIVO: INGEO N°2215	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA INV E – 161 – 13	INGEOBRAS

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES

MATERIAL: RECEBO — PROCEDENCIA: CANTERA LA ESTRELLA

CONTRATISTA: PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA — MUNICIPIO: RICAURTE - CUNDINAMARCA

LOCALIZACIÓN: DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 — VÍA EXIST: ☑ — FECHA T: 23-nov-23

PROYECTO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 413 DE 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA" — VÍA NUEVA: ☐ — FECHA E: 25-nov-23

Densidad N°	1	2	3	4	5	6
Ubicación	POZO 3 A POZO 4	POZO 4 A POZO 5				
Localizacón	ALCANTARILLADO	ALCANTARILLADO				
Profundidad (m)	0,12	0,12				
Peso frasco y arena inicial, g	6.416	6.420				
Peso frasco y arena restante, g	2.510	2.662				
Peso arena total usada, g	3.906	3.758				
Constante del Cono	1.676	1.647				
Peso arena en el hueco, g	2.230	2.111				
Densidad de la arena, g / cm^3	1,40	1,40				
Volumen del hueco, cm^3	1.593	1.508				
Peso material extraído húmedo, g	3.480	3.326				
% de Humedad	8,8	9,0				
Peso material extraído seco, g	3.199	3.051				
Densidad del material, g/cm^3	2,008	2,024				
Densidad Maxima de Laboratorio, g / cm^3	2,056	2,056				
% Humedad óptima laboratorio	10,3	10,3				
% De compactación en el terreno	97,7	98,4				
Peso Material Retenido en el terreno Tamiz 3/4"	284,0	236,0				
% Retenido Del material retiene Tamiz 3/4"	8,16	7,10				
Peso Especifico de Agregado Grueso	2,606	2,606				
Densidad Del Material Corregida g/cm3	1,973	1,994				
Densidad Maxima de Laboratorio g/cm3	2,056	2,056				
% De compactación en el terreno	96,0	97,0				
% De compactación especificada	95,0	95,0				
CUMPLE	☑ SI ☐ NO	☑ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

OBSERVACIONES: PROCTOR SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA

ING.OSCAR HUGO NIETO L.
GERENTE CORPORATIVO

KIRLEY DAVID PINO BEJARANO
ASISTENTE DE LABORATORIO

Carrera 9 No. 32-111 Barrio/Rosablanca Girardot-Cundinamarca
Cel.: 3218852425 - 3208095823
ingeobrasohnsas@gmail.com gerenciaohn@outlook.com

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

7.13 CONCEPTO TÉCNICO GEOTECNISTA

DAIRO DUEÑAS MORALES
MASTER EN CALCULO DE ESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL
INGENIERO CIVIL
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN CONTROL Y GESTION DE CALIDAD

Referencia. **Contrato de Interventoría No 413 de 2023 — "INTERVENTORIA TECNICA ADMINITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"**

CONCEPTO TECNICO



DAIRO DUEÑAS MORALES
Especialista en Geotecnia.

Dirección : Carrera 4 No. 12-47 oficina 606. **Cel.** 3187162429 Mail : ingenierodairo@hotmail.com - ingeologia@gmail.com

DAIRO DUEÑAS MORALES
MASTER EN CALCULO DE ESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL
INGENIERO CIVIL — ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AMBIENTAL
INGENIERO INDUSTRIAL — ESPECIALISTA EN CONTROL Y GESTION DE CALIDAD

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION 3
2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION 3
3. LOCALIZACION Y CONDICIONES DE ENTORNO 4
3.1 LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO 5
4. GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA. 5
5. FENOMENOS PRESENTADOS EN LAS EXCAVACIONES 7
6. ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA MITIGACION Y CONTROL DE RIESGOS 8
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 9

Dirección : Carrera 4 No. 12-47 oficina 606. **Cel.** 3187162429 **Mail :** ingenierodairo@hotmail.com - ingeologia@gmail.com

DAIRO DUEÑAS MORALES
MASTER EN CALCULO DE ESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL
INGENIERO CIVIL
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN CONTROL Y GESTION DE CALIDAD

1. INTRODUCCION

La Alcaldía Municipal de Ricaurte - Cundinamarca suscribió contrato de consultoría con la ingeniera PAOLA RODRIGUEZ ALCALA para realizar la interventoria a la ejecución del contrato de obra cuyo objeto es la CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA.
La interventoria en desarrollo de sus actividades solicitó concepto geotécnico para evaluar las condiciones geotécnicas a tener en cuenta en el desarrollo de las excavaciones y ejecución de la obra.

En mi calidad de asesor de la INTERVENTORIA y como especialista en GEOTECNIA AMBIENTAL me permito emitir el presente concepto.

2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION

Sobre la DIAGONAL 7 del municipio de RICAURTE – CUNDINAMARCA se esta construyendo un colector en tubería PVC CORRUGADA a una profundidad superior a los 4.50 metros.

El suelo encontrado en las excavaciones realizadas corresponde a suelos arenosos sin plasticidad y cohesion muy baja.

Las excavaciones realizadas son inestables y se derrumban con facilidad. El peso de la cabeza del talud actuante sobre la pared de la excavación supera o sobrepasa la resistencia del material que compone el talud generando derrumbes identificados como sobreexcavaciones en el proceso de excavación para la instalación de tuberías.

Dirección : Carrera 4 No. 12-47 oficina 606. Cel. 3187162429 **Mail :** ingenierodairo@hotmail.com - ingeologia@gmail.com

DAIRO DUEÑAS MORALES
MASTER EN CALCULO DE ESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL
INGENIERO CIVIL — ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AMBIENTAL
INGENIERO INDUSTRIAL — ESPECIALISTA EN CONTROL Y GESTION DE CALIDAD

Es necesario tener las precauciones y tomar las medidas necesarias para la protección de la integridad personal de los trabajadores y operarios de obra.

DERRUMBES DE EXCAVACIONES EN CONDICIONES NATURALES Y MEDIDAS DE PRECAUCION PARA INSTALACION DE TUBERIAS.





3. LOCALIZACION Y CONDICIONES DE ENTORNO

La DIAGONAL 7 entre calles 10 y Carrera 16 corresponde a una de las vias principaels del casco urbano del municipio de RICAURTE – CUNDINAMARCA que sirve como arteria sustituta o via alterna en algunas ocasiones de saturación de la via principal GIRARDOT – MELGAR, esta via sirve como alternativa de movilidad para ingresar al municipio y evitar el paso por la via nacional.
La DIAGONAL 7 por su característica de alternatividad vial a través del tiempo ha venido incrementando su cantidad de transito y las características de vehículos que por allí transitan.

DAIRO DUEÑAS MORALES
MASTER EN CALCULO DE ESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL
INGENIERO CIVIL — ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AMBIENTAL
INGENIERO INDUSTRIAL — ESPECIALISTA EN CONTROL Y GESTION DE CALIDAD



3.1 LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO

El municipio de Ricaurte Cundinamarca se encuentra bajo las coordenadas geográficas de 4° 17´ 20" Latitud Norte y 74° 47" 70" longitud oeste del Meridiano de Greenwich, con 284 m de altura sobre el nivel del mar, y un área municipal aproximada de 125 Km² con una distancia a la capital del departamento de 142 Km. Dentro de la división general provincial del departamento de Cundinamarca el municipio de Ricaurte pertenece a la Provincia del Alto Magdalena cuya cabecera provincial se encuentra en Girardot. Además, hace parte de la jurisdicción de la CAR Alto Magdalena y se ubica al suroeste de la capital del país, por la vía que de Bogotá conduce hacia Girardot a una distancia de 142 Km.

DAIRO DUEÑAS MORALES
MASTER EN CALCULO DE ESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL
INGENIERO CIVIL
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN CONTROL Y GESTION DE CALIDAD

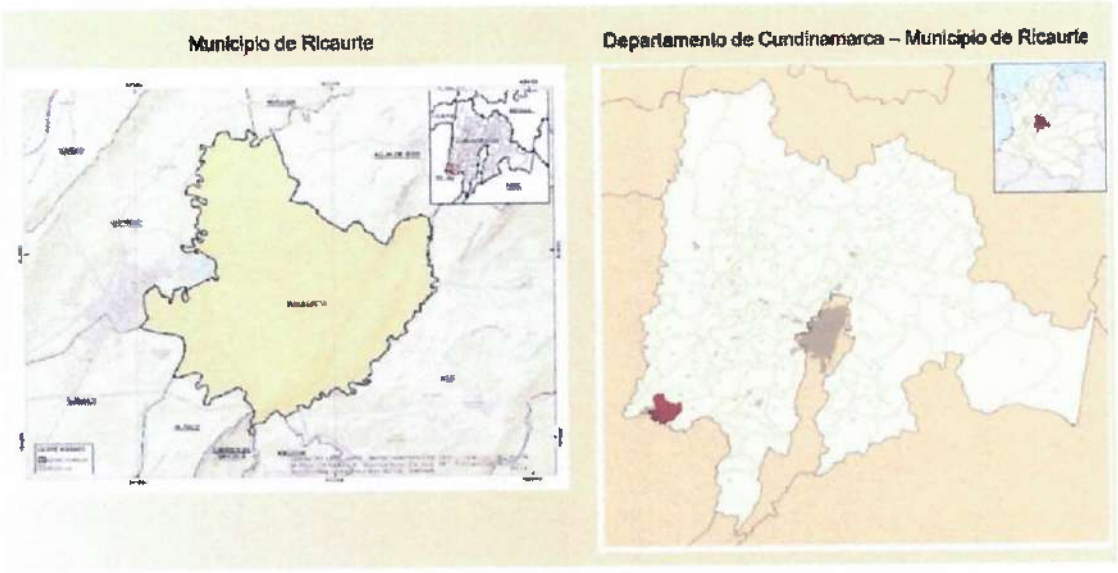


Ilustración 1 – Localización General del Proyecto


4. GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA.

El municipio de Ricaurte se encuentra situado geológicamente en la interfase de los valles medio y alto del río Magdalena y litológicamente está constituido por rocas sedimentarias marinas y continentales Unidades Estratigráficas.

El sitio de la obra corresponde geologicamente a la zona de DEPOSITO DE TERRAZA del rio MAGDALENA, el cual esta definido asi :

• Depósito de terraza: Unidades sedimentarias ampliamente desarrolladas en las partes bajas de los ríos Bogotá y Magdalena.

DAIRO DUEÑAS MORALES
MASTER EN CALCULO DE ESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL
INGENIERO CIVIL
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN CONTROL Y GESTION DE CALIDAD

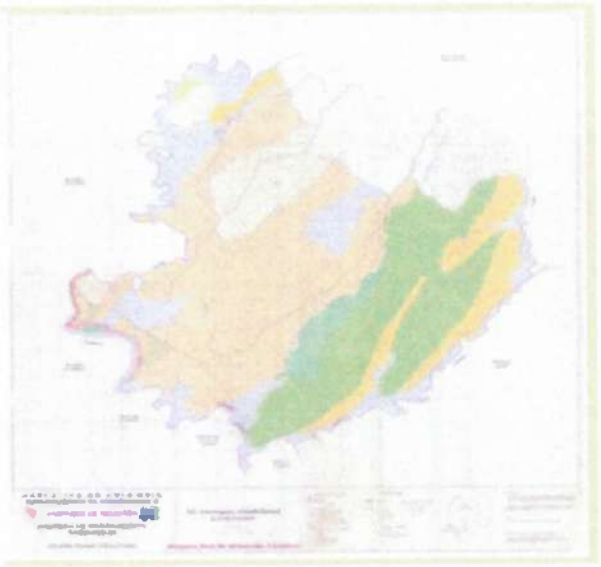

Fuente. EOT. Acuerdo Número 036 del 29 de Diciembre/ 2000

Material Properties

Property	RECEBO COMUN	ARENA LIMOSA	ARENISCA COMPACTA	ARENISCA ARCILLOSA	GRAVA ARENOSA COMPACTA	CONGLOMERADO ARENOSO
Color						
Strength Type	Mohr-Coulomb	Mohr-Coulomb	Mohr-Coulomb	Mohr-Coulomb	Mohr-Coulomb	Mohr-Coulomb
Unit Weight [kN/m3]	20	20	22	20	20	20
Cohesion [kPa]	2	1	0.5	6	4	5
Friction Angle [deg]	33	35	50	28	30	26
Water Surface	None	None	None	None	None	None
Ru Value	0	0	0	0	0	0

FACTORES GEOTECNICOS UTILIZADOS PARA LA MODELACION DEL TALUD DE EXCAVACIONES EN ZANJA.

La anterior estratificación del suelo se asumió de acuerdo a visita realizada a la obra y a las condiciones típicas de este tipo de suelos.

Dirección : Carrera 4 No. 12-47 oficina 606. Cel. 3187162429 **Mail :** ingenierodairo@hotmail.com - ingeologia@gmail.com

DAIRO DUEÑAS MORALES
MASTER EN CALCULO DE ESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL
INGENIERO CIVIL — ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AMBIENTAL
INGENIERO INDUSTRIAL — ESPECIALISTA EN CONTROL Y GESTION DE CALIDAD



Recebo común
Arena limosa

Arenisca compacta

Grava arenosa Compacta.

Conglomerado Arenoso

5. FENOMENOS PRESENTADOS EN LAS EXCAVACIONES

En el desarrollo de las excavaciones se presentan efectos geotécnicos del comportamiento del suelo que causan interferencias en la obra y pueden generar riesgos en la integridad de los trabajadores e integridad global de la obra.

Entre los efectos geotécnicos observados se tienen:

Deslizamientos: Son movimientos caracterizados por desarrollar una o varias superficies de ruptura, una zona de desplazamiento y una zona de acumulación de material desplazado bien definidas. Las paredes de las excavaciones de la zanja se derrumban en condiciones naturales.

Deslizamiento Traslacionales: Se relacionan más a movimientos en los cuales la superficie de ruptura coincide con un plano estructural, como un plano de buzamiento de una falla geológica o un plano de estratificación, un plano de foliación, diaclasas, o fracturas . En las excavaciones realizadas se presentan derrumbes traslacionales que se acercan hasta el borde de los andenes y sardineles laterales.

DAIRO DUEÑAS MORALES
MASTER EN CALCULO DE ESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL
INGENIERO CIVIL — ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AMBIENTAL
INGENIERO INDUSTRIAL — ESPECIALISTA EN CONTROL Y GESTION DE CALIDAD

Erosión: La erosión comprende el desalojo y transporte de materiales sueltos de la superficie terrestre, por el agua, el viento y el hielo, con la contribución de la gravedad, la cual actúa como fuerza direccional selectiva (Ortiz 1986 en Manual para el Control de la Erosión 1998).
Las excavaciones expuestas presentan erosion por intemperismo que incrementa la caidad de material hacia el fonde la zanja excavada.

Saturación del suelo: ante los procesos erosivos de las paredes de excavación de la zanja y algunas lluvias en el sector se presenta saturación del suelo componente de la estructura vial con presencia de líneas de flujo que pueden activar movimientos en masa por deslizamiento rotacional hacia el interior de la excavación aumentando el riesgo de colapso lineal de la pared de excavación.

6. ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA MITIGACION Y CONTROL DE RIESGOS

Para realizar las excavaciones de manera segura y garantizar la integridad de personal y equipos utilizados es neceario tener en cuenta las siguietes actividades.

- Realizar las excavaciones con sobre anchos hasta que el talud este en condición de reposo temporal que garantice la instalación de tablestacas de contención del talud.
- Instalar tablestacas metálicas para poder ingresar personal a realizar actividades de perfilada de fondo e instalación de la tubería.
- Evitar tener excavaciones expuestas a la intemperie.


7. MODELACION DE ZANJA EXCAVADA

Se modelo el comportamiento estructrual geotécnico de las paredes de la excavación de la zanja tomando un ancho de excavación de 1.80 metros a una profundidad de 4.50 metros con los estratos de suelo analizados anteriormente.

Se calcularon los factores de seguridad y eventuales cuñas de fallas que se pueden presentar en el desarrollo de las excavaciones.

Se aplicaron los métodos geotécnicos de JAMBU y BISHOP SIMPLIFICADO para el calculo de los factores de seguridad .

DAIRO DUEÑAS MORALES
MASTER EN CALCULO DE ESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL
INGENIERO CIVIL — ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AMBIENTAL
INGENIERO INDUSTRIAL — ESPECIALISTA EN CONTROL Y GESTION DE CALIDAD

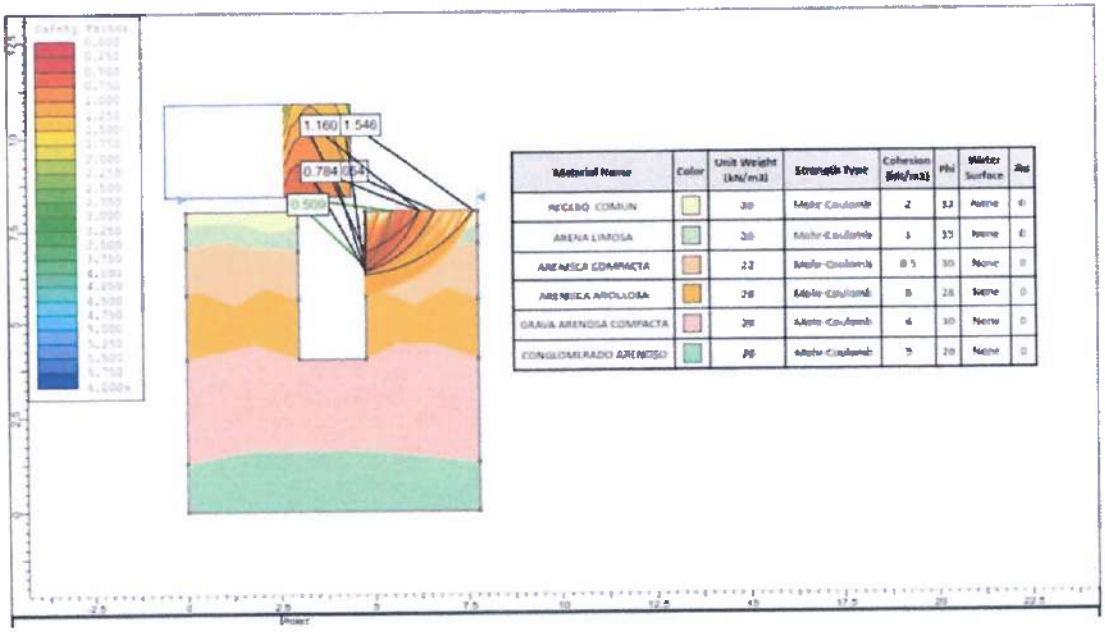

De acuerdo a la modelacion del talud se prevé que las paredes de la excavación colpasen hasta un ancho del doble de la excavación proyectada.
El factor de seguridad critico es de 0.509 correspondiente a la parte superior de la excavación y se prevé que este tenga un avance de máximo 1.80 metroa a nivel de via, ya que las cuñas de falla con factores de seguridad menores a 1 muy probablemente colapsaran al interior de la excavación.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se recomienda excavar la zanja con sobre anchos hasta que la corona de excavación quede en equilibrio por reposo natural e instalar tablestacas continuas para continuar las actividades con personal y equipo al interior de las excavaciones.

2. El sobre ancho estimado para encontrar equilibrio estatico natural se prevé que sea de máximo 1.80 metros a cada lado de la excavación de la zanja.


3. Debe realizarse control superficial de escorrentías que eviten el ingreso de agua hacia las paredes y provoquen el deslave de las mismas y por ende erosion por intervención antrópica.


DAIRO DUEÑAS MORALES
MASTER EN CALCULO DE ESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL
INGENIERO CIVIL
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN CONTROL Y GESTION DE CALIDAD

4. Para la cuantificación de las excavaciones debe realizarse topografía detallada que permita visualizar y cuantificar las cantidades de sobre anchos excavados.


Atentamente,

Ing. DAIRO DUEÑAS MORALES
Ingeniero Civil
Especialista en Geotecnia Ambiental
CC. 93.385.314 de Ibagué
MP- 70202087577 TLM



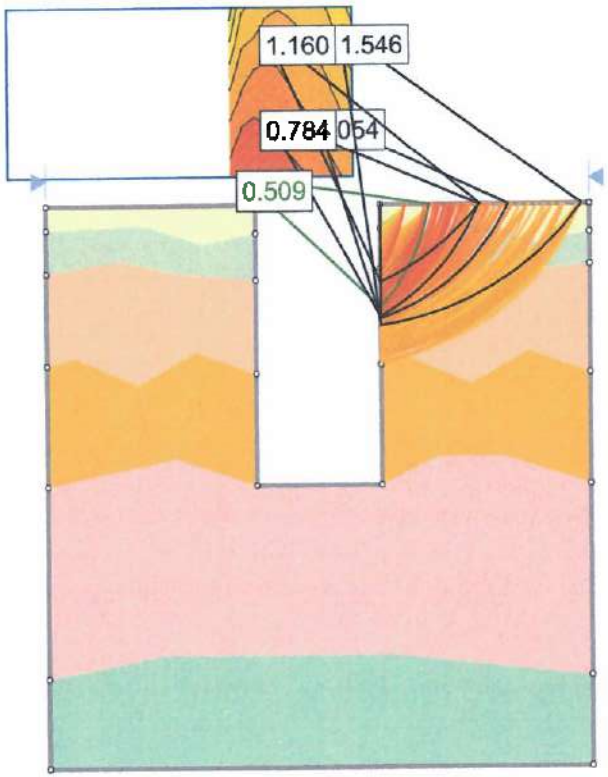

Material Name	Color	Unit Weight (kN/m3)	Strength Type	Cohesion (kN/m2)	Phi	Water Surface	Ru
RECEBO COMUN		20	Mohr-Coulomb	2	33	None	0
ARENA LIMOSA		20	Mohr-Coulomb	1	35	None	0
ARENISCA COMPACTA		22	Mohr-Coulomb	0.5	30	None	0
ARENISCA ARCILLOSA		20	Mohr-Coulomb	6	28	None	0
GRAVA ARENOSA COMPACTA		20	Mohr-Coulomb	4	30	None	0
CONGLOMERADO ARENOSO		20	Mohr-Coulomb	5	26	None	0



Project: SLIDE - An Interactive Slope Stability Program

Analysis Description:

Drawn By:

Company:

Date: 5/03/2024, 4:01:01 p. m.

File Name: ZANJA SIN SOBREANCHO.slim

RPRET 6.005

Slide Analysis Information

SLIDE - An Interactive Slope Stability Program

Project Summary

File Name: ZANJA SIN SOBREANCHO
Slide Modeler Version: 6.005
Project Title: SLIDE - An Interactive Slope Stability Program
Date Created: 5/03/2024, 4:01:01 p. m.

General Settings

Units of Measurement: Metric Units
Time Units: days
Permeability Units: meters/second
Failure Direction: Right to Left
Data Output: Standard
Maximum Material Properties: 20
Maximum Support Properties: 20

Analysis Options

Analysis Methods Used

Bishop simplified
Janbu simplified

Number of slices: 25
Tolerance: 0.005
Maximum number of iterations: 50
Check malpha < 0.2: Yes
Initial trial value of FS: 1
Steffensen Iteration: Yes

Groundwater Analysis

Groundwater Method: Water Surfaces
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3
Advanced Groundwater Method: None

Random Numbers

Pseudo-random Seed: 10116
Random Number Generation Method: Park and Miller v.3

Surface Options

Surface Type: Circular
Search Method: Grid Search
Radius Increment: 10
Composite Surfaces: Disabled
Reverse Curvature: Create Tension Crack
Minimum Elevation: Not Defined
Minimum Depth: Not Defined

Material Properties

Property	RECEBO COMUN	ARENA LIMOSA	ARENISCA COMPACTA	ARENISCA ARCILLOSA	GRAVA ARENOSA COMPACTA	CONGLOMERADO ARENOSO
Color						
Strength Type	Mohr-Coulomb	Mohr-Coulomb	Mohr-Coulomb	Mohr-Coulomb	Mohr-Coulomb	Mohr-Coulomb
Unit Weight [kN/m3]	20	20	22	20	20	20
Cohesion [kPa]	2	1	0.5	6	4	5
Friction Angle [deg]	33	35	30	28	30	26
Water Surface	None	None	None	None	None	None
Ru Value	0	0	0	0	0	0

Global Minimums

Method: bishop simplified

FS: 0.508841
Center: 2.819, 8.407
Radius: 2.726
Left Slip Surface Endpoint: 4.800, 6.534
Right Slip Surface Endpoint: 5.515, 8.000
Left Slope Intercept: 4.800 8.000
Right Slope Intercept: 5.515 8.000
Resisting Moment=15.4238 kN-m
Driving Moment=30.3117 kN-m

Method: janbu simplified

FS: 0.541782
Center: 2.819, 8.407
Radius: 2.726
Left Slip Surface Endpoint: 4.800, 6.534
Right Slip Surface Endpoint: 5.515, 8.000
Left Slope Intercept: 4.800 8.000

Right Slope Intercept: 5.515 8.000
Resisting Horizontal Force=3.14485 kN
Driving Horizontal Force=5.80463 kN

Valid / Invalid Surfaces

Method: bishop simplified

Number of Valid Surfaces: 1350
Number of Invalid Surfaces: 3435

Error Codes:

Error Code -106 reported for 10 surfaces
Error Code -107 reported for 953 surfaces
Error Code -108 reported for 1812 surfaces
Error Code -1000 reported for 660 surfaces

Method: janbu simplified

Number of Valid Surfaces: 1179
Number of Invalid Surfaces: 3606

Error Codes:

Error Code -106 reported for 10 surfaces
Error Code -107 reported for 953 surfaces
Error Code -108 reported for 1983 surfaces
Error Code -1000 reported for 660 surfaces

Error Codes

The following errors were encountered during the computation:

-106 = Average slice width is less than 0.0001 * (maximum horizontal extent of soil region). This limitation is imposed to avoid numerical errors which may result from too many slices, or too small a slip region.
-107 = Total driving moment or total driving force is negative. This will occur if the wrong failure direction is specified, or if high external or anchor loads are applied against the failure direction.
-108 = Total driving moment or total driving force < 0.1. This is to limit the calculation of extremely high safety factors if the driving force is very small (0.1 is an arbitrary number).
-1000 = No valid slip surfaces are generated at a grid center. Unable to draw a surface.

Slice Data

Global Minimum Query (bishop simplified) - Safety Factor: 0.508841

Slice Number	Width [m]	Weight [kN]	Base Material	Base Cohesion [kPa]	Base Friction Angle [degrees]	Shear Stress [kPa]	Shear Strength [kPa]	Base Normal Stress [kPa]	Pore Pressure [kPa]	Effective Normal Stress [kPa]
			ARENISCA							

			COMPACTA							
2	0.0274899	0.810052	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	15.275	7.77255	12.5964	0	12.5964
3	0.0274899	0.79158	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	14.6834	7.47151	12.075	0	12.075
4	0.0274899	0.772522	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	14.0885	7.16882	11.5507	0	11.5507
5	0.0274899	0.752847	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	13.4903	6.8644	11.0235	0	11.0235
6	0.0274899	0.732517	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	12.8885	6.55821	10.4931	0	10.4931
7	0.0274899	0.711494	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	12.2832	6.25019	9.95962	0	9.95962
8	0.0274899	0.689733	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	11.6741	5.94028	9.42284	0	9.42284
9	0.0274899	0.667181	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	11.0613	5.62842	8.88267	0	8.88267
10	0.0274899	0.643783	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	10.4444	5.31456	8.33906	0	8.33906
11	0.0274899	0.619472	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	9.82356	4.99863	7.79187	0	7.79187
12	0.0274899	0.594173	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	9.19855	4.6806	7.24101	0	7.24101
13	0.0274899	0.567797	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	8.56926	4.36039	6.68639	0	6.68639
14	0.0274899	0.540242	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	7.93564	4.03798	6.12797	0	6.12797
15	0.0274899	0.511384	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	7.29762	3.71333	5.56565	0	5.56565
16	0.0274899	0.481077	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	6.65516	3.38642	4.99944	0	4.99944
17	0.0297552	0.486288	ARENA LIMOSA	1	35	6.54918	3.33249	3.33115	0	3.33115
18	0.0297552	0.449903	ARENA LIMOSA	1	35	5.81974	2.96132	2.80105	0	2.80105
19	0.0297552	0.411008	ARENA LIMOSA	1	35	5.08615	2.58804	2.26797	0	2.26797
20	0.0297552	0.36912	ARENA LIMOSA	1	35	4.34869	2.21279	1.73205	0	1.73205
21	0.0297552	0.323567	ARENA LIMOSA	1	35	3.60785	1.83582	1.19368	0	1.19368
22	0.0297552	0.273365	ARENA LIMOSA	1	35	2.86475	1.4577	0.653666	0	0.653666
23	0.0297552	0.216955	ARENA LIMOSA	1	35	2.12156	1.07954	0.113589	0	0.113589
24	0.0332806	0.164288	RECEBO COMUN	2	33	1.66166	0.84552	-1.77774	0	-1.77774
25	0.0332806	0.0597344	RECEBO COMUN	2	33	0.790208	0.40209	-2.46057	0	-2.46057

Global Minimum Query (janbu simplified) - Safety Factor: 0.541782

Slice Number	Width [m]	Weight [kN]	Base Material	Base Cohesion [kPa]	Base Friction Angle [degrees]	Shear Stress [kPa]	Shear Strength [kPa]	Base Normal Stress [kPa]	Pore Pressure [kPa]	Effective Normal Stress [kPa]
1	0.0274899	0.827968	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	15.3593	8.32138	13.547	0	13.547
			ARENISCA							

			COMPACTA							
3	0.0274899	0.79158	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	14.2287	7.70885	12.4861	0	12.4861
4	0.0274899	0.772522	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	13.6581	7.39973	11.9507	0	11.9507
5	0.0274899	0.752847	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	13.0839	7.08863	11.4118	0	11.4118
6	0.0274899	0.732517	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	12.5059	6.77548	10.8695	0	10.8695
7	0.0274899	0.711494	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	11.924	6.46022	10.3234	0	10.3234
8	0.0274899	0.689733	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	11.3381	6.14279	9.77359	0	9.77359
9	0.0274899	0.667181	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	10.7481	5.82311	9.21989	0	9.21989
10	0.0274899	0.643783	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	10.1538	5.50112	8.6622	0	8.6622
11	0.0274899	0.619472	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	9.55506	5.17676	8.10038	0	8.10038
12	0.0274899	0.594173	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	8.95187	4.84996	7.53434	0	7.53434
13	0.0274899	0.567797	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	8.34404	4.52065	6.96397	0	6.96397
14	0.0274899	0.540242	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	7.73149	4.18878	6.38914	0	6.38914
15	0.0274899	0.511384	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	7.11412	3.8543	5.80981	0	5.80981
16	0.0274899	0.481077	ARENISCA COMPACTA	0.5	30	6.49185	3.51717	5.2259	0	5.2259
17	0.0297552	0.486288	ARENA LIMOSA	1	35	6.40721	3.47131	3.5294	0	3.5294
18	0.0297552	0.449903	ARENA LIMOSA	1	35	5.69753	3.08682	2.98029	0	2.98029
19	0.0297552	0.411008	ARENA LIMOSA	1	35	4.98307	2.69974	2.42748	0	2.42748
20	0.0297552	0.36912	ARENA LIMOSA	1	35	4.26397	2.31014	1.87107	0	1.87107
21	0.0297552	0.323567	ARENA LIMOSA	1	35	3.54066	1.91826	1.31142	0	1.31142
22	0.0297552	0.273365	ARENA LIMOSA	1	35	2.81412	1.52464	0.749266	0	0.749266
23	0.0297552	0.216955	ARENA LIMOSA	1	35	2.08636	1.13036	0.186167	0	0.186167
24	0.0332806	0.164288	RECEBO COMUN	2	33	1.63544	0.88605	-1.71532	0	-1.71532
25	0.0332806	0.0597344	RECEBO COMUN	2	33	0.779317	0.42222	-2.42957	0	-2.42957

List Of Coordinates

External Boundary

X	Y
0	0
7.8	0
7.8	1.28736

7.8	4
7.8	5.60406
7.8	7.14264
7.8	7.59881
7.8	8
4.8	8
4.8	7.65809
4.8	7.0945
4.8	5.73187
4.8	4
3	4
3	5.60406
3	6.93571
3	7.59881
3	8
0	8
0	7.65809
0	7.04653
0	5.73187
0	4
0	1.27342

Material Boundary

X	Y
0	4
1.83115	4.38453
3	4

Material Boundary

X	Y
4.8	4
5.61321	4.40171
6.57592	4.40171
7.8	4

Material Boundary

X	Y
0	5.73187
0.387089	5.84447
1.29822	5.44943
2.1234	5.91317
3	5.60406

Material Boundary

X	Y
0	7.65809
1.36699	7.71662
2.24374	7.44181
3	7.59881

Material Boundary

X	Y
4.8	5.73187
5.18709	5.84447
6.09822	5.44943
6.9234	5.91317
7.8	5.60406

Material Boundary

X	Y
4.8	7.65809
6.16699	7.71662
7.04374	7.44181
7.8	7.59881

Material Boundary

X	Y
0	7.04653
1.0512	7.22158
1.86071	7.02635
3	6.93571

Material Boundary

X	Y
4.8	7.0945
5.7507	7.22148
6.8404	7.05406
7.8	7.14264

Material Boundary

X	Y

0	1.27342
1.65158	1.58939
4.98252	1.58939
7.8	1.28736

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

7.14 INFORME TÉCNICO DE ESPECIES ARBOREAS

INFORME TECNICO Nº 33. NOVIEMBRE 15 DE 2023
VISITA DE PODA Y/O TALA DE ÁRBOL.

I. IDENTIFICACIÓN

Radicación	Octubre 19 de 2023
Solicitante o contraventor	CONSORCIO DIAGONAL RC – Luis Eduardo Alvarado Pulecio
Identificación	C.C. 1.105.678.088 de Espinal (Tolima)
Domicilio Solicitante	Carrera 7 N° 8 – 54 Espinal Tolima
Teléfonos Solicitante	2390025 – 2480155
Municipio	Ricaurte
Vereda	Zona Urbana
Predio	Espacio público, Separadores de la Diagonal séptima desde la calle 10 hasta la carrera 16
Ubicación	Espacio público, Separadores de la Diagonal séptima desde la calle 10 hasta la carrera 16
Asunto	VISITA DE PODA Y/O TALA DE ÁRBOL
Objetivo	VISITA DE PODA Y/O TALA DE ÁRBOL.
Fecha Visita	03 DE NOVIEMBRE DE 2023

II. ANTECEDENTES

La visita técnica se realiza por solicitud del señor Luis Eduardo Alvarado Pulecio C.C. 1.105.678.088 de Espinal (Tolima) en calidad de representante legal del CONSORCIO DIAGONAL RC contratista para la ejecución del CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 403 – 2023 "OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA" y de la señora Paola Andrea Rodríguez Alcalá en calidad de representante legal del contrato de Interventoría Nº 413 de 2023 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANACIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMIENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA", donde solicitan a la secretaria la intervención de las especies ubicadas en el espacio público (separador de la Diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 conforme al Plan de aprovechamiento forestal presentado) para "OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".

La visita se realizó atendiendo la solicitud antes mencionada, asistentes:

NOMBRE	CARGO
Juan Camilo Godoy Rodríguez	Ingeniero Agrónomo adscrito a S.A.A.D.R.
Hernán Montoya Rodas	Ingeniero Agrónomo adscrito a S.A.A.D.R.

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realiza visita por Juan Camilo Godoy Rodríguez y Hernán Montoya Rodas Ingenieros Agrónomos adscritos a la Secretaria de Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural, para AUTORIZAR la intervención de las especies ubicadas en el espacio público (separador de la Diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 conforme al Plan de Aprovechamiento Forestal presentado) para "OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".

En el recorrido realizado en los separadores de la diagonal séptima con el fin de abarcar el 100% del censo de los árboles ubicados en dichos separadores, se inicia en la calle 10 y finaliza en la carrera 16, en donde se pudo identificar setenta y seis (76) individuos vegetales distribuidos en los separadores de la diagonal séptima, los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 1. *Distribución de especies por familia y su abundancia de individuos vegetales ubicados en los separadores de la diagonal séptima desde la calle 10 hasta la carrera 16.*

NOMBRE CIENTIFICO	Ni
Manguifera indica	4
Plumeria pudica	21
Caryota mitis	2
Dypsis lutescens	2
Pritchardia pacifica	1
Roystonea regia	7
Dracaena fragrans	1
Crescentia cujete	1
Jacaranda caucana	1
Spathodea campanulata	1
Tabebuia rosea	6
Tabebuia guayacan	3
Cycas revoluta	1
Terminalia catappa	2
Licania tomentosa	1
Acacia dealbata	1
Acacia retinodes	4
Cassia fistula	2
Delonix regia	1
Samanea saman	1
Tectona grandis	1
Guazuma ulmifolia	2
Azadirachta indica	7
Psidium guajava	1
Fraxinus uhdei	1
Blighia sapida	1
TOTAL	76

En el recorrido se verifico el estado fitosanitario, circunferencia a la altura del pecho CAP y el diámetro a la altura de pecho DAP de cada individuo vegetal ubicados en los separadores de la diagonal séptima.

- **Diámetro a la altura del pecho (DAP)**; *Para el cálculo del diámetro a la altura del pecho, se utilizó una cinta métrica para medir el CAP, posteriormente en oficina se calcula el DAP. Este dato se registró a los 1.3 metros de altura aproximadamente con relación a la superficie del suelo.*

- **Marcación**; *Los individuos no se marcaron directamente, sin embargo, se le asigno un numero a cada uno según el sentido (ORDEN) en el cual se realizó el inventario, para ello el sentido coherente fue: Inicio calle 10 ; fin Carrera 16.*

- **Tratamiento silvicultural**; *Para su diagnóstico se evalúa condición, posición y nivel de afectación con respecto a la intervención previamente que se les han realizado a los individuos. Se procedió a diagnosticar si es necesario realizar una tala o traslado según las características del árbol.*

- **Registro de datos**; *El registro de la información se llevó a cabo en el formato de inventario forestal, en el cual se puede identificar variables como: N° del árbol, nombre común, nombre científico, CAP, DAP. Además, se registró el tratamiento silvicultural que se debe realizar a cada individuo.*

Tabla 2. Registro de datos del censo de los árboles forestales ubicados en los separadores de la Diagonal séptima desde la calle 10 hasta la carrera 16.

ORDEN	Especie	N. científico	Familia	CAP (cm)	DAP (cm)	Tratamiento	Observaciones	FOTOS
1	*Urapan*	*Fraxinus uhdei*	*Oleáceas*	*145*	*46*	*Tala*	*Rebrote, poda antitécnica.*	
2	*Saman*	*Samannea saman*	*Fabáceas*	*107*	*34*	*Tala*	*Rebrote débil, inclinación pronunciada*	
3	*Azuceno*	*Plumeria pudica*	*Apocinaceas*	*25*	*8*	*Tala*	*< a 10 cm DAP*	

4	*Azuceno*	*Plumeria pudica*	*Apocinaceas*	*22*	*7*	*Tala*	*< a 10 cm DAP*	
5	*Teca*	*Tectona grandis*	*Laminaceas*	*171*	*54*	*Tala*	*Rebrotes abundantes, malas condiciones fitosanitarias causado por ataque de agentes patógenos (termitas y hormigas).*	

6	*Azuceno*	*Plumeria pudica*	*Apocinaceas*	*18*	*6*	*Tala*	*< a 10 cm DAP*	
7	*Azuceno*	*Plumeria pudica*	*Apocinaceas*	*17*	*5*	*Tala*	*< a 10 cm DAP*	
8	*Azuceno*	*Plumeria pudica*	*Apocinaceas*	*21*	*7*	*Tala*	*< a 10 cm DAP*	

1167

9	*Azuceno*	*Plumeria pudica*	*Apocinaceas*	*25*	*8*	*Tala*	*< a 10 cm DAP*	
10	*Azuceno*	*Plumeria pudica*	*Apocinaceas*	*20*	*6*	*Tala*	*< a 10 cm DAP*	
11	*Azuceno*	*Plumeria pudica*	*Apocinaceas*	*22*	*7*	*Tala*	*< a 10 cm DAP*	

12	*Azucero*	*Plumeria pudica*	*Apocinaceas*	*21*	*7*	*Tala*	*< a 10 cm DAP*	
13	*Azucero*	*Plumeria pudica*	*Apocinaceas*	*20*	*6*	*Tala*	*< a 10 cm DAP*	
14	*Guayacan*	*Tabebula chrysanthus*	*Bignoniaceae*	*24,5*	*6*	*Tala*	*< a 10 cm DAP, rebrotes*	

9911

15	Azuceno	*Plumeria pudica*	Apocinaceas	19	6	Tala	< a 10 cm DAP	
16	Azuceno	*Plumeria pudica*	Apocinaceas	18	6	Tala	< a 10 cm DAP	
17	Azuceno	*Plumeria pudica*	Apocinaceas	18	6	Tala	< a 10 cm DAP	

18	*Palma mariposa*	*Caryota mitis*	*Arecaceae*	*18*	*6*	*Tala*	*< a 10 cm DAP*	
19	*Azuceno*	*Plumeria pudica*	*Apocinaceas*	*18*	*6*	*Tala*	*< a 10 cm DAP*	

20	*Neem*	*Azadirachta indica*	*Meliaceas*	*66*	*21*	*Tala*	*Malas condiciones fitosanitarias causadas por agentes fitopatógenos (hongos), exceso de rebrotes superior e inclinación hacia la vía.*	
21	*Azuceno*	*Plumeria pudica*	*Apocinaceas*	*17*	*5*	*Tala*	*< a 10 cm DAP*	
22	*Tulipán africano*	*Spathodea campanulata*	*Bignoninaceas*	*24*	*8*	*Tala*	*Rebrote abundante, poda antitécnica*	

23	*Almendro*	*Terminalia catappa*	*Combretaceae*	*73,5*	*23*	*Tala*	*Rebrote abundante, poda antitécnica, Presenta malas condiciones fitosanitarias causado por ataque de agentes patógenos como termitas y hormigas.*	
24	*Azuceno*	*Plumeria pudica*	*Apocinaceas*	*15*	*5*	*Tala*	*< a 10 cm DAP*	

1110

25	*Chicalá*	*Tecoma stans*	*Bignoniacea e*	*66*	*21*	*Tala*	*Presenta inclinación hacia la vía.*	
26	*Azuceno*	*Plumeria pudica*	*Apocinaceas*	*17*	*5*	*Tala*	*< a 10 cm DAP*	

27	Ocobo	Tabebuia rosea	Bignoniaceas	32	10	Tala	Presenta malas condiciones fitosanitarias causado por ataque de agentes patógenos como termites y hormigas. con riesgo de volcamiento.	
28	Palma real	Roystonea regia	Arecales	28	9	Traslado	Se requiere trasplantar.	

29	*Almendro*	*Terminalia catappa*	*Combretaceae*	*70*	22	*Tala*	*Rebrote abundante.*	
30	*Palma real*	*Roystonea regia*	*Arecales*	*15*	5	*Traslado*	*Se requiere trasplantar.*	


31	*Chicalá*	*Tecoma stans*	*Bignoniaceae*	*27,5*	*9*	*Tala*	*Poda antitécnica, rebrote abundante.*	
32	*Acacia*	*Acacia dealbata*	*Fabaceae*	*42*	*13*	*Tala*	*Poda antitécnica, árbol desequilibrado.*	
33	*Guácimo*	*Guazuma ulmifolia*	*Malvaceae*	*12*	*4*	*Tala*	*< a 10 cm DAP*	
34	*Ocobo*	*Tabebuia rosea*	*Bignoniaceas*	*70,5*	*22*	*Traslado*	*Se requiere trasplantar.*	

35	*Guácimo*	*Guazuma ulmifolia*	*Malvaceae*	*20*	*6*	*Tala*	*< a 10 cm DAP, rebrotes abundantes, poda antitécnica.*	
36	*Palma real*	*Roystonea regia*	*Arecales*	*16*	*5*	*Traslado*	*Se requiere trasplantar.*	

1175

37	*Guayacan*	*Tabebuia chrysanthus*	*Bignoniaceae*	*76*	*24*	*Tala*	*Rebrote abundante, presenta afectación por plagas en su base.*	
38	*Totumo*	*Crescentia cujete*	*bignoniáceas*	*18*	*6*	*Tala*	*< a 10 cm DAP.*	

1176

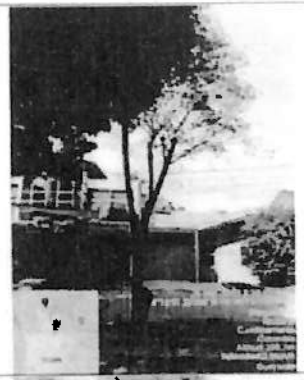39	*Guayacan*	*Tabebuia chrysanthus*	*Bignoniaceae*	*83*	*26*	*Tala*	*Rebrote abundante, poda antitécnica.*	
40	*Mango*	*Manguifera indica*	*Anacardiaceae*	*176*	*56*	*Tala*	*Copa desequilibrada.*	

1177

41	*Palma real*	*Roystonea regia*	*Arecales*	*104,5*	*33*	*Tala*	*Presenta raíces expuestas, riesgo de volcamiento.*	
42	*Mango*	*Manguifera indica*	*Anacardiaceae*	*63*	*20*	*Tala*	*Frutal*	

1179

43	*Azuceno*	*Plumeria pudica*	*Apocinaceas*	*16*	*5*	*Tala*	*< a 10 cm DAP*	
44	*Palma mariposa*	*Caryota mitis*	*Arecaceae*	*36*	*12*	*Tala*	*< a 10 cm DAP*	

1179

45	*Mango*	*Manguifera indica*	*Anacardiaceae*	*81,5*	*26*	*Tala*	*Rebrote abundante, podas antitécnicas.*	
46	*Mango*	*Manguifera indica*	*Anacardiaceae*	*112*	*36*	*Tala*	*Rebrote abundante, pudrición en fuste*	

47	Guayacan	Tabebuia chrysanthus	Bignoniaceae	102,5	33	Tala	Rebrote ebundante, poda antitécnica.	
48	Neem	Azadirachta indica	Meliaceas	20	6	Tala	Podas antitécnicas.	

1811

49	*Azuceno*	*Plumeria pudica*	*Apocinaceas*	*18*	*5*	*Tala*	*< a 10 cm DAP*	
50	*Palma avanico*	*Pritchardia pacifica.*	*Arecaceae*	*39,5*	*13*	*Tala*	-	

2811

51	*Azuceno*	*Plumeria pudica*	*Apocinaceas*	*18*	*6*	*Tala*	*< a 10 cm DAP*	
52	*Acacia Amarilla*	*Acacia retinodes*	*Acecieae*	*23,5*	*7*	*Tala*	*Podas antitécnicas*	

53	*Acacia Amarilla*	*Acacia retinodes*	*Acacieae*	*36,5*	*12*	*Tala*	*Rebrotes débil abundantes*	
54	*Acacia Amarilla*	*Acacia retinodes*	*Acacieae*	*18*	*6*	*Tala*	*Rebrotes débil abundantes*	

55	*Acacia Amarilla*	*Acacia retinodes*	*Acacieae*	*64*	*20*	*Tala*	*Rebrotes abundantes, deterioro general*		
56	*Neem*	*Azadirachta indica*	*Meliaceas*	*25,5*	*8*	*Tala*	*Rebrote abundante, estrangulamiento de fuste*		

57	Neem	Azadirachta indica	Meliaceas	83,5	27	Tala	Rebrote abundante, podas antitécnicas	
58	Neem	Azadirachta indica	Meliaceas	134	43	Tala	Rebrote abundante, podas antitécnices.	

9811

59	*Neem*	*Azadirachta indica*	*Meliaceas*	*157*	*53*	*Tala*	*Rebrote abundante, podas antitécnicas.*	
60	*Neem*	*Azadirachta indica*	*Meliaceas*	*106,8*	*34*	*Tala*	*Rebrote abundante, podas antitécnicas.*	

61	*Bienmes abe*	*Blighia sapida*	*Sapindaceae*	*22,7*	*7*	*Tala*	*Especie introducida*	
62	*Palma areca*	*Dypsis lutescens*	*Arecaceas*	*17*	*5*	*Traslado*	*Se requiere trasplantar*	

1187

63	Ohití	Licania tomentosa	Chrysobalanaceae	18	6	Tala	< a 10 cm DAP.	
64	Ocobo	Tabebuia rosea	Bignoninaceas	44	14	Tala	Podas antitécnicas.	

1184

65	*Palma areca*	*Dypsis lutescens*	*Arecaceae*	*17*	*5*	*Traslado*	*Se requiere trasplantar*	
66	*Palma cyca*	*Cycas revoluta*	*Cycadaceae*	*18*	*6*	*Traslado*	*Se requiere trasplante*	

67	*Acacia roja*	*Delonix regia*	*Fabacees*	*123,5*	*39*	*Tala*	*Presenta malas condiciones fitosanitarias causado por ataque de agentes patógenos como termitas y hormigas con riesgo de volcamiento, rebrotes abundantes*	
68	*Caña fistula*	*Cassia fistula*	*Fabaceae*	*131*	*42*	*Tala*	*Rebrotes abundantes, Presenta malas condiciones fitosanitarias causado por ataque de agentes patógenos como termitas y hormigas. riesgo de volcamiento.*	

69	*Palma real*	*Roystonea regia*	*Arecales*	*18*	*5*	*Traslado*	*Requiere trasplantar.*	
70	*Azuceno*	*Plumeria pudica*	*Apocinaceas*	*18*	*6*	*Tala*	*< a 10 cm DAP*	

1192

71	*Caña fistula*	*Cassia fistula*	*Fabaceae*	*138,5*	*44*	*Tala*	*Rebrotes abundantes.*	
72	*Palma real*	*Roystonea regia*	*Arecales*	*18*	*8*	*Traslado*	*< a 10 cm DAP*	

73	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniáceas	18	6	Tala	Podas antitécnicas.	
74	Guayabo	Psidium guajava	Mirtaceae	17	5	Tala	Frutal	

75	*Palma real*	*Roystonea regia*	*Aracales*	*23*	*7*	*Traslado*	*Se requiere trasplante*	
76	*Tronco de la felicida*	*Dracaena Fragrans*	*Asparagaceae*	*18*	*6*	*Tala*	*< a 10 cm DAP*	

1195

III. EVALUACIÓN DOCUMENTACION TÉCNICA

Sea lo primero indicar que el ambiente sano es un derecho del que gozan todas las personas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 de la Constitución Política de 1991. Para ello, el artículo 80 superior, en concordancia con el artículo 8° de la misma norma, dispone que el responsable del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales es el Estado, el cual tendrá como objetivo garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución.

De acuerdo con lo anterior, las entidades territoriales deben garantizar la debida protección de los recursos naturales de la Nación; Por ello, el artículo 65 de la Ley 99 de 1993 establece que, entre otras entidades, los municipios deben dictar, con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio. y promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Según lo normado en el Decreto 1076 (Mayo 26 de 2015), ***Sección 9. DEL APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS, Artículo 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicación por obra pública o privada,*** *se dispone:*

"Cuando se requiera talar, transplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ***ante las autoridades municipales****, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.*

La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o transplante cuando sea factible.

Parágrafo.- *Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Artículo, la autoridad ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o paisajístico, relacionadas con las especies, objeto de solicitud".* **(Subrayado y negrilla fuera de texto).**

Ahora, con respecto al aprovechamiento y manejo de los árboles aislados, de acuerdo con lo establecido en el ACUERDO 021 DE 2018 "Por el cual se determina el régimen de uso, aprovechamiento y protección, así como el transporte y movilización de la flora silvestre y de los bosques, naturales en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR", que en su artículo 50 dispone:

"ARTÍCULO 50. Tala y poda de árboles en el espacio público urbano. *El permiso para podar o talar árboles clasificados en la categoría de elementos complementarios del espacio urbano que sirven de adorno o decoración en jardines, separadores viales y parques, será otorgado por las* ***oficinas de planeación municipal o distrital o la dependencia que cumpla sus funciones*** *de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1077 de 2015 o las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan. Para la movilización de los productos se requiere el salvoconducto correspondiente otorgado por la CAR.*

Parágrafo. El presente artículo no cobija la tala o poda de árboles que hagan parte de los elementos constitutivos naturales del espacio público, definidos por el numeral 1 del artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015 o las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan". **(Subrayado y negrilla fuera de texto).**

Aunado a lo anterior, la secretaría competente en el municipio de Ricaurte para otorgar el permiso previsto en el Artículo 50 del Acuerdo No. 21 de 2018, es la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural, pues, entre las funciones establecidas. en el **Decreto No. 270 de 2017**, *se asume que debe: " i) planear, formular, dirigir, coordinar y evaluar las políticas, planes, programas y procesos relacionados con el diagnóstico ambiental y de recursos naturales a nivel municipal, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, ii) planear, formular, dirigir, coordinar, evaluar y controlar el desarrollo de las políticas, planes, programas y procesos relacionados con la asistencia técnica, asesoría, capacitación para el fomento, protección, control y desarrollo. del ambiente, fortalecimiento forestal y recursos naturales a nivel municipal, iii) planear, dirigir, controlar y evaluar el proceso de formular conceptos y viabilidad en materia ambiental en relación con proyectos y procesos de desarrollo urbanístico para el cumplimiento de normas sobre conservación y protección del ambiente".*

Una vez aclarado lo anterior, se evalúa la solicitud del señor Luis Eduardo Alvarado Pulecio C.C. 1.105.678.088 de Espinal (Tolima) en calidad de representante legal del CONSORCIO DIAGONAL RC contratista para la ejecución del CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 403 – 2023 "OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA" y de la señora Paola Andrea Rodríguez Alcalá en calidad de representante legal del contrato de Interventoría Nº 413 de 2023 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANACIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMIENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA", donde solicitan a la secretaria la intervención de las especies ubicadas en el espacio público (separador de la Diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 conforme al Plan de aprovechamiento forestal presentado) para "OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".

1. *PAF DIAGONAL 7MA.*
2. *Censo forestal Diagonal 7ma Ricaurte.*
3. *Mapa Censo Diagonal 7ma.*
4. *KMZ Censo forestal Diagonal 7ma Ricaurte ArcGis.*
5. *Registro Fotográfico.*

IV. CONCEPTO TÉCNICO

OTORGAR a favor del **CONSORCIO DIAGONAL RC**, *a través de su representante legal* **LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO** *identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.105.678.088 de Espinal (Tolima), la autorización para ejecutar SETENTA Y SEIS (76) intervenciones silviculturales, distribuidas en SESENTA Y SEIS (66) TALAS y DIEZ (10) TRASLADOS DE INDIVIDUOS ARBOREOS localizados en espacio público urbano (Separadores de la diagonal séptima desde la calle 10 hasta la carrera 16, conforme a lo establecido en* **Tabla 3.** *Registro de datos del censo de*

los árboles forestales ubicados en los separadores de la Diagonal séptima desde la calle 10 hasta la carrera 16, distribuidos de la siguiente manera:

- **ÁRBOLES AUTORIZADOS PARA TRASPLANTE:** *Como resultado del diagnóstico a la vegetación en el área de influencia se determinaron como tratamiento de traslado a 10 individuos mayormente < a 10 cm de DAP (relacionados en la* **Tabla 3.***), las cuales se determinaron viables para embellecimiento de otras zonas verdes en espacio público del municipio de Ricaurte Cundinamarca.*

***Tabla 4.** Distribución de especies para los individuos vegetales ubicados en los separadores de la diagonal séptima desde la calle 10 hasta la carrera 16 con tratamiento de traslado*

ORDEN	Especie	N. científico	Familia	CAP (cm)	DAP (cm)	Tratamiento	Observaciones
28	Palma real	Roystonea regia	Arecales	28	9	Traslado	Se requiere trasplantar
30	Palma real	Roystonea regia	Arecales	15	5	Traslado	Se requiere trasplantar.
34	Ocobo	Tabebuia rosea	Bignoniaceas	70,5	22	Traslado	Se requiere trasplantar.
36	Palma real	Roystonea regia	Arecales	16	5	Traslado	Se requiere trasplantar.
62	Palma areca	Dypsis lutescens	Arecaceas	17	6	Traslado	Se requiere trasplantar
65	Palma areca	Dypsis lutescens	Arecaceas	17	5	Traslado	Se requiere trasplantar
66	Palma cyca	Cycas revoluta	Cycadaceae	18	6	Traslado	Se requiere trasplante
69	Palma real	Roystonea regia	Arecales	18	5	Traslado	Requiere trasplantar.
72	Palma real	Roystonea regia	Arecales	18	8	Traslado	< a 10 cm DAP
75	Palma real	Roystonea regia	Arecales	23	7	Traslado	Se requiere trasplante

- **ÁRBOLES AUTORIZADOS PARA TALA:** *De los resultados obtenidos del inventario forestal, se diagnostica la necesidad de* **TALAR** *66 individuos arbóreos (relacionados en la* **Tabla 4.***) y conforme a lo estipulado en la columna de observaciones, adicional de interferir en el correcto desarrollo de la obra a ejecutar.*

***Tabla 5.** Distribución de especies para los individuos vegetales ubicados en los separadores de la diagonal séptima desde la calle 10 hasta la carrera 16 con tratamiento de TALA*

ORDEN	Especie	N. científico	Familia	CAP (cm)	DAP (cm)	Tratamiento	Observaciones
1	Urapan	Fraxinus uhdei	Oleáceas	145	46	Tala	Rebrote, poda antitécnica.

2	Saman	Samannea saman	Fabáceas	107	34	Tala	Rebrote débil, inclinación pronunciada
3	Azuceno	Plumeria pudica	Apocinaceas	25	8	Tala	< a 10 cm DAP
4	Azuceno	Plumeria pudica	Apocinaceas	22	7	Tala	< a 10 cm DAP
5	Teca	Tectona grandis	Leminaceas	171	54	Tala	Rebrotes abundantes, malas condiciones fitosanitarias causado por ataque de agentes patógenos (termitas y hormigas).
6	Azuceno	Plumeria pudica	Apocinaceas	18	6	Tala	< a 10 cm DAP
7	Azuceno	Plumeria pudica	Apocinaceas	17	5	Tala	< a 10 cm DAP
8	Azuceno	Plumeria pudica	Apocinaceas	21	7	Tala	< a 10 cm DAP
9	Azuceno	Plumeria pudica	Apocinaceas	25	8	Tala	< a 10 cm DAP
10	Azuceno	Plumeria pudica	Apocinaceas	20	6	Tala	< a 10 cm DAP
11	Azuceno	Plumeria pudica	Apocinaceas	22	7	Tala	< a 10 cm DAP
12	Azuceno	Plumeria pudica	Apocinaceas	21	7	Tala	< a 10 cm DAP
13	Azuceno	Plumeria pudica	Apocinaceas	20	6	Tala	< a 10 cm DAP
14	Guayacan	Tabebuia chrysanthus	Bignoniaceae	24,5	6	Tala	< a 10 cm DAP, rebrotes
15	Azuceno	Plumeria pudica	Apocinaceas	19	6	Tala	< a 10 cm DAP
16	Azuceno	Plumeria pudica	Apocinaceas	18	6	Tala	< a 10 cm DAP
17	Azuceno	Plumeria pudica	Apocinaceas	18	6	Tala	< a 10 cm DAP
18	Palma mariposa	Caryota mitis	Arecaceae	18	6	Tala	< a 10 cm DAP
19	Azuceno	Plumeria pudica	Apocinaceas	18	6	Tala	< a 10 cm DAP
20	Neem	Azadirachta indica	Meliaceas	66	21	Tala	Malas condiciones fitosanitarias causadas por agentes fitopatógenos (hongos), exceso de rebrotes superior e inclinación hacia la vía.
21	Azuceno	Plumeria pudica	Apocinaceas	17	5	Tala	< a 10 cm DAP
22	Tulipán africano	Spathodea campanulata	Bignoninaceas	24	8	Tala	Rebrote abundante, poda antitécnica

23	Almendro	Terminalia catappa	Combretacea e	73,5	23	Tala	Rebrote abundante, poda antitécnica, Presenta malas condiciones fitosanitarias causado por ataque de agentes patógenos como termitas y hormigas.
24	Azuceno	Plumeria pudica	Apocinaceas	15	5	Tala	< a 10 cm DAP
25	Chicalá	Tecoma stans	Bignoniacea e	66	21	Tala	Presenta inclinación hacia la vía.
26	Azuceno	Plumeria pudica	Apocinaceas	17	5	Tala	< a 10 cm DAP
27	Ocobo	Tabebuia rosea	Bignoninace as	32	10	Tala	Presenta malas condiciones fitosanitarias causado por ataque de agentes patógenos como termitas y hormigas. con riesgo de volcamiento.
29	Almendro	Terminalia catappa	Combretacea e	70	22	Tala	Rebrote abundante.
31	Chicalá	Tecoma stans	Bignoniacea e	27,5	9	Tala	Poda antitécnica, rebrote abundante.
32	Acacia	Acacia deelbata	Fabaceae	42	13	Tala	Poda antitécnica, árbol desequilibrado.
33	Guácimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	12	4	Tala	< a 10 cm DAP
35	Guácimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	20	6	Tala	< a 10 cm DAP, rebrotes abundantes, poda antitécnica
37	Guayacan	Tabebuia chrysanthus	Bignoniacea e	76	24	Tala	Rebrote abundante, presenta afectación por plagas en su base.
38	Tolumo	Crescentia cujete	bignoniáceas	18	6	Tala	< a 10 cm DAP.
39	Guayacan	Tabebuia chrysanthus	Bignoniacea e	83	26	Tala	Rebrote abundante, poda antitécnica.
40	Mango	Manguifera indica	Anacardiace ae	176	56	Tala	Copa desequilibrada.
41	Palma real	Roystonea regia	Arecales	104,5	33	Tala	Presenta raices expuestas, riesgo de volcamiento.
42	Mango	Manguifera índica	Anacardiace ae	63	20	Tala	Frutal
43	Azuceno	Plumeria pudica	Apocinaceas	16	5	Tala	< a 10 cm DAP
44	Palma mariposa	Caryota mitis	Arecaceae	38	12	Tala	< a 10 cm DAP
45	Mango	Manguifera indica	Anacardiace ae	81,5	26	Tala	Rebrote abundante, podas antitécnicas.
46	Mango	Manguifera índica	Anacardiace ae	112	36	Tala	Rebrote abundante, pudrición en fuste
47	Guayacan	Tabebuia chrysanthus	Bignoniacea e	102,5	33	Tala	Rebrote abundante, poda antitécnica.

48	Neem	Azadirachta indica	Meliaceas	20	6	Tala	Podas antitécnicas.
49	Azuceno	Plumeria pudica	Apocinaceas	18	5	Tala	< a 10 cm DAP
50	Palma avanico	Pritchardia pacifica.	Arecaceae	39,5	13	Tala	-
51	Azuceno	Plumeria pudica	Apocinaceas	18	6	Tala	< a 10 cm DAP
52	Acacia Amarilla	Acacia retinodes	Acacieae	23,5	7	Tala	Podas antitécnicas
53	Acacia Amarilla	Acacia retinodes	Acacieae	36,5	12	Tala	Rebrotes débil abundantes
54	Acacia Amarilla	Acacia retinodes	Acacieae	16	6	Tala	Rebrotes débil abundantes
55	Acacia Amarilla	Acacia retinodes	Acacieae	64	20	Tala	Rebrotes abundantes, deterioro general
56	Neem	Azadirachta indica	Meliaceas	25,5	8	Tala	Rebrote abundante, estrangulamiento de fuste
57	Neem	Azadirachta indica	Meliaceas	83,5	27	Tala	Rebrote abundante, podas antitécnicas
58	Neem	Azadirachta indica	Meliaceas	134	43	Tala	Rebrote abundante, podas antitécnicas.
59	Neem	Azadirachta indica	Meliaceas	157	53	Tala	Rebrote abundante. podas antitécnicas.
60	Neem	Azadirachta indica	Meliaceas	106,8	34	Tala	Rebrote abundante, podas antitécnicas.
61	Bienmesabe	Blighia sapida	Sapindaceae	22,7	7	Tala	Especie introducida
63	Ohiti	Licania tomentose	Chrysobalanaceae	18	6	Tala	< a 10 cm DAP
64	Ocobo	Tabebuia rosea	Bignoniaceas	44	14	Tala	Podas antitécnicas.
67	Acacia roja	Delonix regia	Fabaceas	123,5	39	Tala	Presenta malas condiciones fitosanitarias causado por ataque de agentes patógenos como termitas y hormigas con riesgo de volcamiento, rebrotes abundantes
68	Caña fistula	Cassia fistula	Fabaceae	131	42	Tala	Rebrotes abundantes, Presenta malas condiciones fitosanitarias causado por ataque de agentes patógenos como termitas y hormigas. riesgo de volcamiento.
70	Azuceno	Plumeria pudica	Apocinaceas	18	6	Tala	< a 10 cm DAP
71	Caña fistula	Cassia fistula	Fabaceae	138,5	44	Tala	Rebrotes abundantes.
73	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniáceas	18	6	Tala	Podas antitécnicas.
74	Guayabo	Psidium guajava	Mirtaceae	17	5	Tala	Frutal

75	Tronco de la felicida	Dracaena Fregrans	Asparagacea e	18	6	Tala	< a 10 cm DAP

V. VIGENCIA DEL PERMISO O AUTORIZACIÓN

Este permiso o autorización tiene vigencia de un (01) año. El termino inicialmente otorgado, podrá ser prorrogado siempre y cuando la solicitud se realice ante su expiración y se expida viabilidad técnica, ambiental y jurídica por parte de la Secretaria de Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural, a favor de El **CONSORCIO DIAGONAL RC**, *a través de su representante legal* **LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO** *identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.105.678.088 de Espinal (Tolima)*

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES

- *La Administración Municipal de Ricaurte y la secretaria de Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural, NO se hace responsable por los daños, afectaciones y perjuicios que se realicen a terceros por causa de la tala de los árboles.*
- *Remitir al* **CONSORCIO DIAGONAL RC**, *a través de su representante legal* **LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO** *identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.105.678.088 de Espinal (Tolima), el presente informe técnico para su conocimiento y fines pertinentes.*
- *Remitir a la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas para su conocimiento y fines pertinentes.*
- *La madera y productos derivados del Aprovechamiento forestal único NO se podrán comercializar, los residuos vegetales generados durante el aprovechamiento serán tratados como residuos ordinarios, a fin de su correcta disposición y eliminación total dejando al área libre de todo tipo de residuos, mediante la disposición en rellenos sitios autorizados y certificados por la autoridad ambiental CAR. El material de ser aprovechado debe ubicarse y definir el uso y reportarse a la Secretaria de Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural.*
- *De requerir la movilización de la madera producto del aprovechamiento forestal debe tramitar el correspondiente al salvoconducto de movilización ante la autoridad ambiental CAR, además informar previamente a la Secretaria de Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural.*
- *IMPONER al* **CONSORCIO DIAGONAL RC**, *a través de su representante legal* **LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO** *identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.105.678.088 de Espinal (Tolima), como MEDIDA DE COMPENSACIÓN POR LA TALA DE ÁRBOLES EN ESPACIO PÚBLICO URBANO OBJETO DE LA PRESENTE AUTORIZACIÓN, PLANTACIÓN DE SESENTA Y SEIS (66) ÁRBOLES DE ESPECIES NATIVAS, en los cuales se pueden tener en cuenta las siguientes: Acacio rojo (**Delonix regia**), Algarrobo (**Prosopis juliflora**), Ambuca (**Acacia tortuosa**), Bayo (**Acacia glomerata**), Cajeto (**Trichanthera gigantea**), Chicalá (**Tabebuia ochracea**), Gualanday (**Jacaranda caucana**), Guayacán (**Bulnesia arborea**), Guácimo (**Guazuma ulmifolia**), entre otros.*
- *La entidad titular de la presente autorización, deberá realizar las labores Silviculturales de mantenimiento, sostenimiento, fertilización y reposición de la mortalidad, por el término de tres (3) años o hasta que los individuos plantados demuestren su sobrevivencia de forma natural,*

de igual forma los árboles que se mueran o se afecten, deberán ser inmediatamente reemplazados. La supervivencia será del 90% y deberá presentar un informe (material probatorio) ante la Secretaria dentro de los tres (03) meses siguientes a la realización de la actividad, para así constatar dicha compensación.

- *SOLICITAR al* **CONSORCIO DIAGONAL RC,** *a través de su representante legal* **LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO** *identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.105.678.088 de Espinal (Tolima), la presentación de un informe técnico para el traslado los individuos arbóreos objeto de trasplante.*
- *Al momento de realizar el traslado de los individuos forestales coordinar con la secretaria de Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural para la respectiva intervención.*
- *Adoptar las medidas de precaución necesarias, para evitar cualquier percance a la integridad física de personal que circula por el sector o del operario que intervendrá en el aprovechamiento, así como de los bienes de propiedad propia o de terceros, empleando para los trabajos de aprovechamiento personal idóneo.*
- *Las actividades de tala deberán contar preferiblemente con la dirección y apoyo técnico de un Ingeniero Forestal que se encargue de coordinar las actividades, quien será el responsable técnico del trabajo, debe ser una persona con experiencia calificada y tener conocimientos en el derribo direccional de árboles, la planeación de las actividades, el control de personal y la seguridad patrimonial y del personal a su cargo, de tal manera que pueda distribuir a su personal eficientemente para que logre el éxito en el trabajo por realizar y con la máxima seguridad. Así como garantizar la no afectación de los bienes públicos y privados cercanos a los árboles autorizados.*
- *Durante el aprovechamiento forestal se deberá dar el manejo adecuado a los residuos o retal, tomando las medidas preventivas para el control de incendios, enfermedad y contaminación, a la vez evitar la disposición de residuos en sitios NO autorizados. Así mismo se deberá observar en desarrollo del aprovechamiento que el material vegetal de residuo producto de la tala deberá ser retirado de área en su totalidad.*
- *Realizar las actividades de aprovechamiento de los individuos forestales, relacionados en el ítem IV de la presente actuación, a través de personal idóneo que garantice la integridad del personal que desarrollan labores de aprovechamiento, de las personas que habitan y transitan por el lugar a intervenir, mediante la señalización del área, y así mismo evitar daños a las líneas de trasmisión eléctrica y de telefonía que se ubican sobre las copas de los árboles a cortar.*
- *Cumplir con las consideraciones ambientales requeridas para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos e impactos negativos causados en desarrollo del aprovechamiento forestal.*
- *Tener especial cuidado con la flora y fauna silvestre asociada al área del aprovechamiento, a fin de procurar por su protección y conservación, mediante prácticas de ahuyentamiento de especies, reubicación permanente o transitoria de nidos, entre otras que garanticen su conservación, durante la actividad de aprovechamiento forestal.*
- *Deberá cumplir los términos y condiciones de la medida de compensación que a través del presente acto administrativo se imponga.*

- *Abstenerse de provechar especies forestales diferentes a lo autorizado en la presente actuación administrativa.*
- *Los residuos del proceso de aprovechamiento, no podrán eliminarse por medio de quemas u otro método que menoscaben o vayan en perjuicio del medio ambiente y los recursos naturales.*

ADVERTIR AL CONSORCIO DIAGONAL RC, *a través de su representante legal* **LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO** *identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.105.678.088 de Espinal (Tolima), que cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio correspondiente.*

Es el informe,

RONALD FELIPE SALAZAR ABRIL
SECRETARIO DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Proyectó: Juan Camilo Godoy
Ing. Agrónomo adscrito a la secretaría
De Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural
