Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 04

"Contrato De Obra Pública No. 403 De 2023 – Pavimentación y embellecimiento de la diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte- Cundinamarca"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 413 DE 2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ

17 DE ENERO 2024 AL 16 DE FEBRERO DEL 2024

RICAURTE – CUNDINAMARCA

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN 4

CAPITULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5

1.2 ALCANCE DEL PROYECTO 6

1.3 ASPECTOS TÉCNICOS 10

CAPITULO 2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 413-2023 11

2.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 11

2.1.1 GENERALIDADES 11

2.1.2 PERSONAL DE INTERVENTORÍA 12

2.1.3 EQUIPO DE INTERVENTORÍA 12

2.2 INFORMACIÓN FISICO FINANCIERA 12

2.2.1 BALANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA 12

2.2.2 GRAFICOS DEL VALOR PORCENTAJE DE LA INTERVENTORÍA 13

2.2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS Y CONTROL DE CALIDAD 14

CAPITULO 3. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 403-2023 15

3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 403-2023 15

3.1.1 GENERALIDADES 15

3.1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA 15

3.1.3 PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA 16

3.1.4 EQUIPO Y/O MAQUINARIA EN OBRA 16

3.2 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA 16

3.2.1 CANTIDADES DE TRABAJO REALIZADO Y CONTROL DE CALIDAD 16

3.2.2 ACTIVIDADES DE OBRA 16

3.3 INFORMACIÒN FISICO FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 19

3.3.1 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 19

3.3.2 VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA POR CAPITULOS 21

3.3.3 GRAFICAS DE VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA POR CAPITULOS 22

CAPITULO 4. AVANCE Y SEGUIMIENTO DE OBRA 23

4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 23

4.2 GRAFICOS EN VALOR Y PORCENTAJE DEL PROYECTO.....25

CAPITULO 5. PÓLIZAS Y GARANTÍAS VIGENTES.....26

5.1 PÓLIZAS Y GARANTÌAS VIGENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÌA No. 413 – 2023.....26

5.2 PÒLIZAS Y GARANTÌAS VIGENTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 403 – 2023.....26

CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....28

CAPITULO 7. ANEXOS.....30

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene información relacionada con el seguimiento, control, revisión y ejecución del contrato de obra pública No. 403 de 2023 **"PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Se describe los aspectos más importantes relacionados con la obra como: descripción del proyecto, localización, cantidades de obra, revisiones técnicas y oficios con medidas preventivas conducentes al cumplimiento del objeto contractual y acatamiento de las especificaciones del mismo, actividades ejecutadas por parte de la interventoría durante el periodo comprendido desde **17 de enero de 2024 al 16 de febrero de 2024**.

En este informe esta recopilado el estado actual de obra del contrato en referencia, muestra el avance económico, físico y real del contrato de obra pública, todo esto supervisado por la interventoría garantizando la calidad y demás condiciones presentes del contrato de interventoría No. 413 de 2023.

Actualmente, el municipio de Ricaurte se caracteriza como centro turístico de la provincia del Alto Magdalena del departamento de Cundinamarca, y ante las 12.000 viviendas nuevas que tiene el municipio se ha presentado mayor congestión vehicular, accidentes y demoras para movilizarse y acceder a zonas residenciales, educativas, hoteleras, administrativas y bienes de servicios que se encuentran ubicadas en el casco urbano de este municipio.

Por lo cual, ante las condiciones no aptas para transitar y el deterioro vial de la diagonal séptima, una de las vías urbanas de acceso directo al centro del municipio y en aras de resolver la dificultad que tiene la población ricaurteña, desde la alcaldía municipal de Ricaurte, llevan a cabo la contratación para la PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA, desde el programa – Infraestructura de transporte y movilidad, línea estratégica: "Ricaurte con obras de infraestructura que construyen sociedad", programa: " Infraestructura de transporte y movilidad" del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, estableciendo como meta la vía urbana diagonal séptima mejorada, con el fin de brindarle a la comunidad, una malla vía con calidad y mejorar el desarrollo del municipio garantizando el fácil acceso a los centros de bienes y servicios.

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

CAPITULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en la diagonal 7 entre la vía principal ingresando por la calle 10 hasta la carrera 16 dentro del área urbana del municipio de Ricaurte en la provincia del Alto Magdalena del Departamento de Cundinamarca.

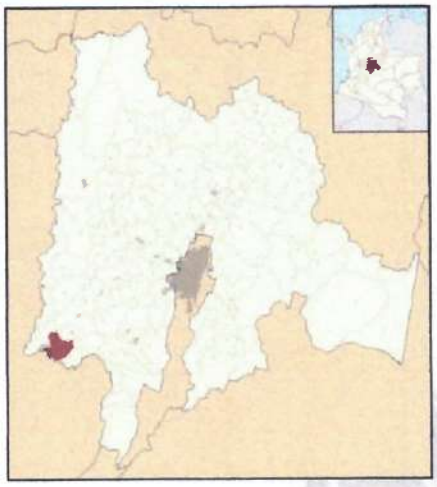


Imagen 1. Localización municipio de Ricaurte

La longitud del proyecto es aproximadamente de 840 metros lineales, el estado actual de la vía presenta deficiencias en su estructura debido a que en determinados tramos han realizado mantenimientos superficiales, pero no se han generado la rehabilitación del pavimento o construcción total de la estructura.



Imagen 2. Localización del área a intervenir – vía diagonal 7 desde calle 10 hasta carrera 16

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

1.2 ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance de la obra de **PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA**, contempla una vía en pavimento rígido de 840 metros de longitud conformada por dos carriles de ingreso sentido (calle 10- carrera 16) y un carril de salida sentido (carrera 16 – calle 10) y la demarcación de la ciclovía con un ancho de calzada de 11 metros aproximadamente.



Imagen 3. Diseño propuesto para la pavimentación y embellecimiento de la vía diagonal séptima.

La propuesta de urbanismo prioriza la recuperación del espacio público, la movilidad para el peatón y el uso energía renovable (Energía solar) en la iluminación y el ancho de los andenes será un ancho variable dependiente del paramento de los predios.

Descripción	Longitud (ml)	Descripción	Longitud (ml)
Primer tramo en Pavimento Flexible desde calle 10 hasta carrera 15	760	Pavimento Rígido desde la calle 10 hasta la carrera 16	840
Segundo tramo en pavimento Articulado Carrera 15 hasta Carrera 16	80		

Tabla 1. Diagnóstico actual Vs vía proyectada

El desarrollo del proyecto beneficiará directamente a la población de la zona urbana del sector (centro) donde habitan 1917 personas, de igual manera, en esta zona del casco urbana del municipio se encuentran centros educativos, hoteles, restaurantes y zonas administrativas prestadoras de bienes y servicios para la población, por lo cual, el proyecto brindará mejor movilidad y mejor calidad de vida para todos los habitantes y visitantes del municipio.

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA



Imagen 4. Diseño de concreto estampado para intersecciones y espacio público

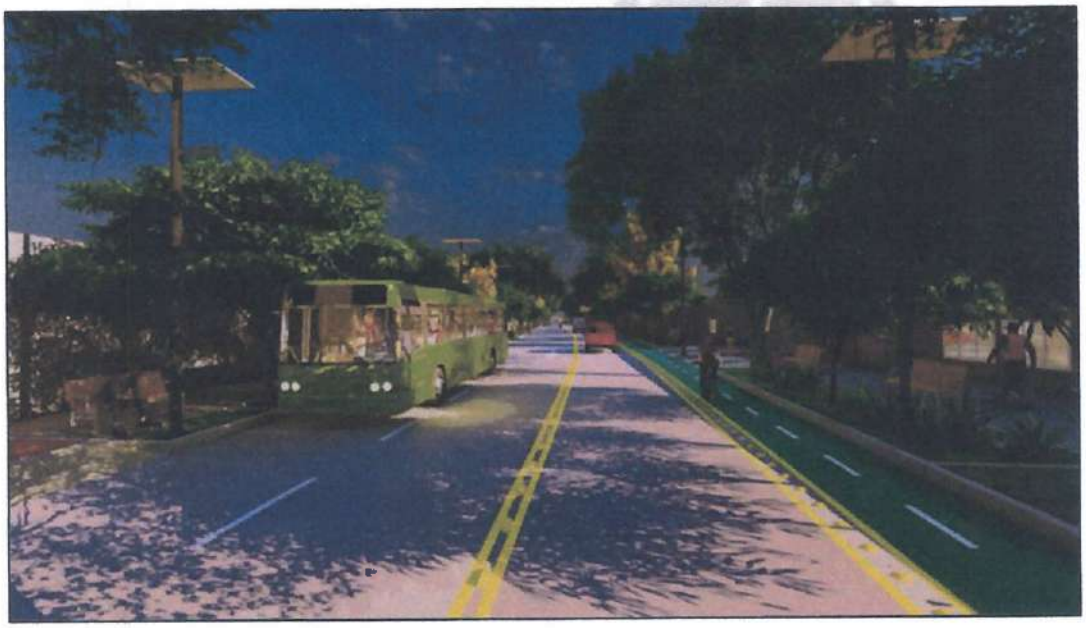


Imagen 5. Diseño de pavimentación y embellecimiento diagonal séptima

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes



Imagen 6. Diseño de urbanismo y espacios urbanos

El alcance del proyecto, será descrito a continuación, de acuerdo a lo contratado por la Alcaldía del municipio de Ricaurte del departamento de Cundinamarca, describiendo la construcción de una vía en pavimento rígido, con sus respectiva localización y tramos de intervención, uso y área para entender mejor los beneficios para la comunidad que generará este proyecto.

En el proyecto descrito encontramos como **primer capítulo** los preliminares que se comprende ejecutar y contine actividades como localización y replanteo con equipos de precisión, se refiere a ubicar y marcar en el terreno o superficie de construcción los ejes principales, verificar longitudes reales con respecto al plano de diseño, establecer sistemas de referencia planimétrico y altimétrico, cerca en tela verde como medida de prevención y aislamiento entre la obra a construir y la comunidad, con el fin de evitar accidentes y traumatismo con la comunidad que rodea el proyecto, fresado de concreto asfáltico (E= 5-12 cm) pavimento que debe ser retirado para la construcción de la nueva estructura de la vía, encontramos diferentes tipos de demoliciones para diferentes elementos existentes en mal estado y que se encuentran dentro del área a intervenir del proyecto, retiro de aro tapas de pozos existentes y nivelación, nivelación de pozos, desmonte de postes de alumbrado público y desmantelamiento de redes de alumbrado público, demolición de cárcamo, desmonte de señales verticales de tránsito y demolición de reductor de velocidad.

En el **segundo** capítulo se tienen actividades de explanación y excavación, las cuales hacen parte esencial para la previa construcción de la estructura del pavimento, dado que estas actividades refieren al corte y nivelación del terreno relacionadas a los movimientos de tierra, necesarios para adecuar el área de intervención a los niveles para la construcción de vías, dentro del capítulo se encuentran actividades como: excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km), excavación manual en material común h=0,0-2,0m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km),excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) ,transporte de materiales prov.

de explanación, canales, prestamos, sobre acarreos y derrumbes y derechos de disposición final en escombrera certificada.

El **tercer capítulo** corresponde a la estructura de pavimento, actividades esenciales para la construcción de la estructura de pavimento, se realiza compactación de la subrasante con el fin de mejorar la capacidad de soporte del material sobre el que se va a construir el pavimento, cualquier material inapropiado que se encuentre debe ser removido, control topográfico de niveles de excavación y de la estructura de pavimento garantizando el cumplimiento de las condiciones de diseño, conformación de la estructura del pavimento mediante la extensión y conformación, compactación y terminado de material granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicadas en los planos y demás documentos del proyecto o establecidos en el desarrollo del proyecto, losas en concreto para el pavimento rígido en concreto MR40, esta actividad consiste en la elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto hidráulico como estructura de pavimento, una vez nivelado, compactado y curado el material granular, se procede a ubicar las formaletas en tramos de varias placas en forma lineal nivelándolas con la estación topográfica, luego se instalan el acero de refuerzo de 60000 PSI, sellado de juntas en pavimento de concreto rígido incluido limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante, en las zonas de intersección se llevará a cabo estampado, endurecido y sellado de superficie en concreto, dentro de este capítulo se contempla también suministro e instalación de geotextil T2400 incluye estabilización, filtro y separación, corte de pavimento en concreto con disco diamantado, suministro e instalación color concreto verde pino C-144 para ciclovía, dosificación 6kg/m2 de incorporación manual acabado concreto rustico, incluye sellador de concreto ECO.

En el **cuarto capítulo** contempla las actividades de andenes y sardineles que hacen parte del embellecimiento de la vía garantizando uniformidad, en el cual se establece el desarrollo de actividades como relleno tipo 7 arena de peña para conformar el área a instalar loseta de cemento (textura, sin textura y toperol), adoquín de arcilla, instalación de gramoquin peatonal, andén en concreto de 3000 psi en sitio en los casos que sea necesario, bordillo prefabricado A-80 para limitar la zona de andén espacio público y sardinel prefabricado A-10 para delimitar la calzada de la vía.

Como **quinto capítulo** se encuentra las actividades de alcantarillado, sumideros y pozos correspondientes a la red pluvial, como primera actividad tenemos localización y replanteo de redes, en la cual se hace necesaria la utilización de topografía para localizar cada red, excavaciones varias a máquina sin clasificar incluido el retiro de sobrantes a una distancia menor de 5km utilizado para el tendido de redes, entibado tipo 2 ante como medida de contención ante los espacios confinados y profundidad de excavación para la instalación de red, relleno en materiales tipo 2 recebo, tipo 5 triturado grueso y tipo 7 arena de peña, suministro e instalación de tuberías PVC de 10", 12",16",24",36" y 42"; suministro e instalación de accesorios silla yee y codos, construcción de placa fondo, cilindros de pozos en ladrillo tolete, cubiertas de pozo, aro en acero y tapa de polipropileno de alto impacto, marco tapas de caja de inspección, cajas de inspección, cajas de contador de agua, sumideros fundidos en sitio reforzados, construcción de sumidero tipo cárcamo y cámaras de inspección para el funcionamiento de la red de distribución de aguas lluvias y sistema de drenaje de agua escorrentía que comprende la vía.

El **sexto capítulo** corresponde a objetos y equipamientos instalados en la vía pública y espacio urbano conocido como mobiliario urbano, se encuentran actividades como: suministro e instalación de banca urbana, banca en concreto M-40, bolardo M-3, suministro e instalación de caneca urbana,

suministro e instalación de paradero de bus, suministro e instalación de caseta de ventas, suministro e instalación de Mogador informativo, ciclo parqueadero M100 tipo 1.

El **séptimo capítulo** refiere a las actividades que modifican las características visibles, físicas y anímicas de los espacios utilizando plantas y recursos naturales y generando embellecimiento a la vía, en este capítulo se encuentran actividades como: contenedor de raíces en tubería corrugada PVC 36" y 24", suministro e instalación de árboles, poda de mantenimiento, poda radicular y conflicto con redes, apeo de árboles (tala, remoción y transporte de material descartado), relleno en tierra negra y grama en zonas verdes.

En el **octavo capítulo** con el fin de dar visibilidad al espacio se contempla el alumbrado público mediante el suministro e instalación de poste metálico de 8.5 metros de altura, troncocónico, diámetro cima: 127mm y diámetro base: 170mm certificado con retilap, incluye cimentación en concreto reforzado, sistema de puesta a tierra y doble propósito (para dos luminarias) y suministro e instalación de sistema solar para dos luminarias de 30 y 60w. incluye paneles solares con soporte, una luminaria de 60w y una luminaria de 30w, cofre, controlador de carga, baterías, protecciones de dc, conectores mc4 y cableado de conexión, ofreciendo mayor visibilidad para peatones y conductores y generando embellecimiento al espacio público.

Finalmente, se encuentra el **noveno capítulo** correspondiente a señalización, se contemplan actividades de demarcación con pintura en frío, señal de tránsito grupo I, suministro e instalación de tachas reflectivas unidireccionales y suministro e instalación de separador de carril tipo B, con el fin de informar, regular y canalizar el tránsito de vehículos y peatones.

1.3 ASPECTOS TÉCNICOS

El presente proyecto tenía como meta la pavimentación en concreto rígido con una longitud total de 840 metros lineales de la vía urbana diagonal séptima del municipio de Ricaurte. Sin embargo, ante la intervención del proyecto Glorieta Manueles por parte de la Concesión Bogotá- Girardot, se reduce la longitud total de pavimentación a 570 metros lineales aproximadamente.

Los tramos a intervenir se encuentran detallados a continuación:

TRAMO	UBICACIÓN	SECTOR
1	Puente peatonal puerta amarilla (Pozo 1) a la portería de Conconcreto (Pozo 8 - existente)	DIAGONAL SEPTIMA

Tabla 2. Tramo de intervención red pluvial

Ante la reducción de longitud, se expone el área de intervención con ajuste a las abscisas iniciales.

TRAMO	UBICACIÓN	SECTOR
1	K0+000 – K0+245	DIAGONAL SEPTIMA
2	K0+245 – K0+360	
3	K0+360 – K0+465	
4	K0+465 – K0+563	

Tabla 3. Tramos de intervención pavimentación

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

CAPITULO 2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 413-2023

2.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1.1 GENERALIDADES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 413 - 2023	
SECRETARIA EJECUTORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
CONTRATISTA	PAOLA RODRIGUEZ ALCALÀ CC. 28.548.736 de Ibagué
OBJETO	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"*
VALOR INTERVENTORIA	SEISCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($626.317.157)
PLAZO	SIETE (07) MESES, contados a partir cumplimiento de la firma del acta de inicio.
FECHA DE LEGALIZACIÓN	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. I-100026598
FECHA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÒN	16 DE MAYO DE 2024

DOCUMENTOS GENERADOS	
ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
INFORME No. 01	17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023
INFORME No. 02	17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023
INFORME No. 03	17 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 16 DE ENERO DE 2024
INFORME No. 04	17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2024

2.1.2 PERSONAL DE INTERVENTORÍA

PERFIL / CARGO	NOMBRE	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN
Director de Interventoría	Paola Andrea Rodríguez Alcalá	15%
Residente de Interventoría	Jeily Katherine Motta Tafur	100%
Asesor especialista en Pavimentos	Josue Guillermo Tibocha Granados	30%
Asesor especialista en Geotecnia	Dairo Dueñas Morales	30%
Asesor especialista en Hidráulica	Henry Julian Rodríguez Arana	30%
Asesor especialista eléctrico	Fredy Alexander Carranza Sanchez	30%
Ingeniero Forestal	Fredy Giovani Vargas Ramirez	30%
Profesional en seguridad y salud en el trabajo	Dennis Hortencia Barrero	50%
Trabajadora Social	Daniela Alejandra Cifuentes Murillo	60%
Profesional en Topografía	Jorge Fernando Morales Oliveros	50%
Auxiliar en Topografía	Carlos Fernando Sanchez Arias	50%
Inspector de Interventoría	Luis Felipe Guzmán Serrano	100%
Auxiliar Forestal	Juan Pablo Quintero Alférez	30%

2.1.3 EQUIPO DE INTERVENTORÍA

No.	DESCRIPCIÒN
1	Equipo de topografía
2	Equipo de comunicaciones
3	Computadores portátiles
4	Cinta métrica – flexo metro
5	Cámara de fotografía
6	Impresora

2.2 INFORMACIÓN FISICO FINANCIERA

2.2.1 BALANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO – La entidad pagará al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la ejecución del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95%) de su monto.


Parágrafo 1. La entidad realizará al contratista el ultimo pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad y con la suscripción del acta de liquidación por las partes.

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA


AVANCE DE LA INTERVENTORÍA No. 413-2023 (VALOR TOTAL DEL CONTRATO)			
	DINERO	DINERO	%
VALOR DEL CONTRATO	$626.317.157,00		
VALOR EJECUTADO MES No. 1		$101.018.896,30	16.13%
VALOR EJECUTADO MES No. 2		$80.815.117,04	12.90%
VALOR EJECUTADO MES No. 03		$80.815.117,04	12.90%
VALOR EJECUTADO MES No. 04		$101.018.896,30	16.13%
ACUMULADO		$363.668.026,68	58.06%
VALOR POR EJECUTAR		$262.649.130,32	41.94%
SUMAS IGUALES	$626.317.157,00	$626.317.157,00	100,00%

2.2.2 GRAFICOS DEL VALOR PORCENTAJE DE LA INTERVENTORÍA

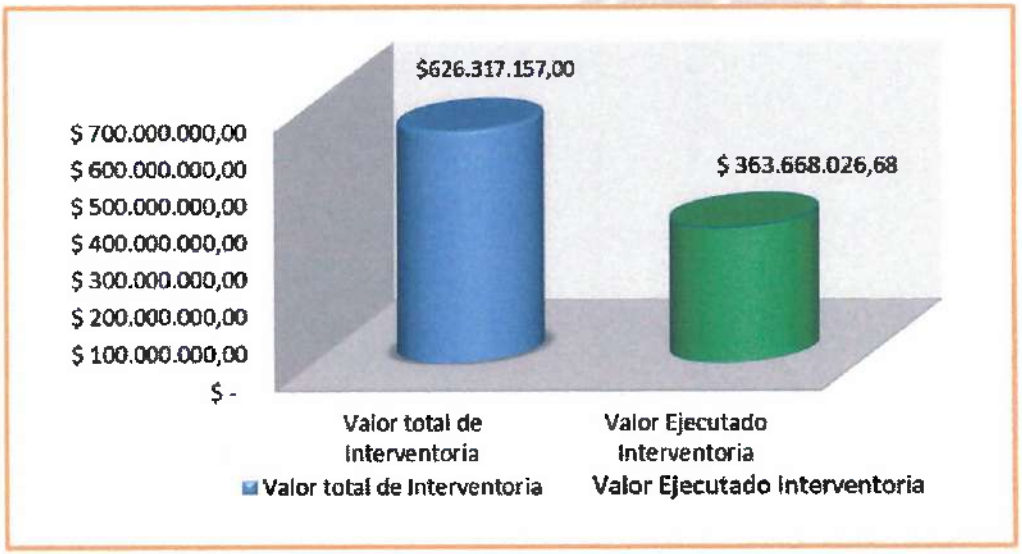

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría Ambiental y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

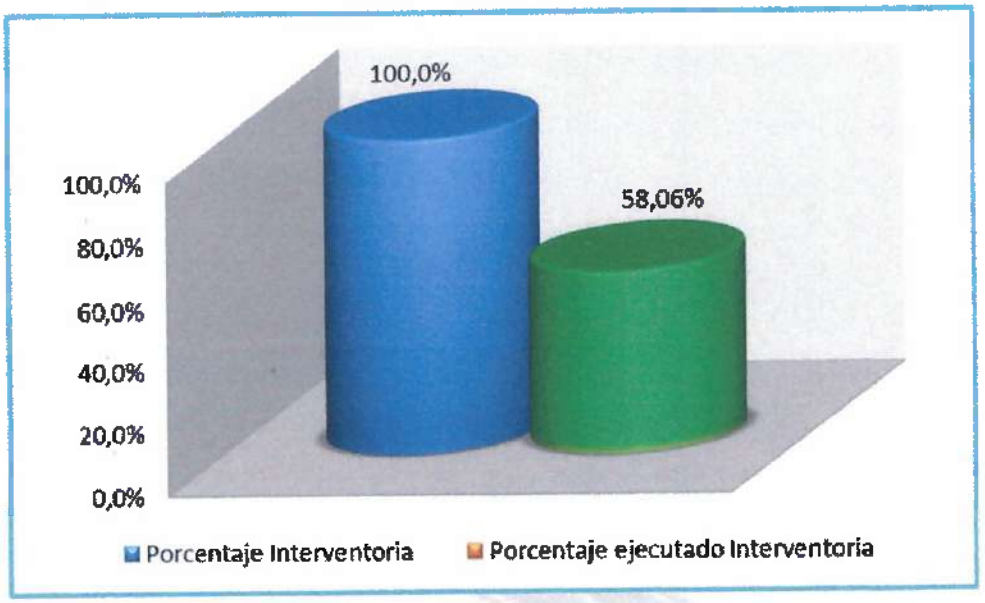

2.2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Vigilar, controlar y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el contratista de obra.
- Coordinación y seguimiento conjunto en procesos constructivos y diferentes actividades del alcance del proyecto.
- Observaciones a las actividades realizadas por el contratista de obra y estado del tiempo.
- Seguimiento al cumplimiento de obligaciones técnicas y administrativas al contratista de obra, sin que tal comprobación interfiera con la autonomía de decisiones que tiene el contratista de obra y/o traumaticen el normal desarrollo de los trabajos.
- Seguimiento al componente de seguridad y salud en el trabajo por parte del profesional de interventoría.
- Seguimiento al componente social del contratista de obra por parte del profesional social de Interventoria.
- Comités virtuales y presenciales, con el fin de dar a conocer el estado actual del proyecto, verificar los compromisos adquiridos, dar a conocer los inconvenientes presentados y dar oportuna solución, en dichos comités participan supervisión, contratista de obra e interventoria y demás entidades que sean requeridas según el tema a tratar.
- Control a las cantidades de las actividades desarrolladas en obra.
- Verificación de bitácora de obra.
- Registro fotográfico.
- Atención a la comunidad del área de influencia del proyecto.
- Constante acompañamiento a la supervisión y contratista de obra en reuniones y/o socializaciones del proyecto.
- Solicitud de requerimientos y atención al contratista de obra.

Paola Rodriguez Alcalá
Topógrafa Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

CAPITULO 3. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 403-2023

3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 403-2023

3.1.1 GENERALIDADES

CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 403 - 2023	
SECRETARIA EJECUTORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
CONTRATISTA	CONSORCIO DIAGONAL RC NIT. 901746184-7
OBJETO	*"PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"*
VALOR INTERVENTORIA	ONCE MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($11.302.197.879)
PLAZO	SIETE (07) MESES, contados a partir cumplimiento de la firma del acta de inicio.
FECHA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÒN	16 DE MAYO DE 2024

DOCUMENTOS GENERADOS	
MINUTA DE MODIFICACIÓN No. 001	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
INFORME No. 01	17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023
INFORME No. 02	17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA PARCIAL No. 01	16 DE DICIEMBRE DE 2023
INFORME No. 03	17 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 16 DE ENERO DE 2024
INFORME No. 04	17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2024

3.1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

De acuerdo a lo establecido en el contrato de obra pública No. 403-2023, el CONSORCIO DIAGONAL RC, debe garantizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, las cuales se encuentran contenidas en la **CLÁUSULA 9, LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE OBRA** y LA **CLÁUSULA 10, LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA.**

3.1.3 PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA

De acuerdo anexo técnico del proyecto, el CONSORCIO DIAGONAL RC cuenta ha tenido disponibilidad con el siguiente personal:

PERFIL / CARGO	NOMBRE	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN
Director de Obra	Aitor Mirena de Laurrari Echevarria	20%
Asesor en Pavimentos	Carlos Andres Nieto Laguna	30%
Residente de Obra	Sergio Mauricio Leal Tovar	100%
Asesor SISO	Jorge Edwin Faber Sanchez Marroquín	100%
Tecnólogo en Topografía	Oscar Rodriguez Vasquez	50%
Trabajador Social	Rosa Inés Pulecio Guzmán	50%
Profesional Programa de Gerencia de Proyectos	Álvaro Ángel Ballestas Robinson	100%

3.1.4 EQUIPO Y/O MAQUINARIA EN OBRA

El contratista de obra ha tenido disponible el desarrollo de las actividades del proyecto, el siguiente equipo:

No.	DESCRIPCIÒN
1	Herramienta menor
2	Retroexcavadora de oruga
3	Equipo Topográfico
4	Vibro compactador
5	Cámara Fotográfica

3.2 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

3.2.1 CANTIDADES DE TRABAJO REALIZADO Y CONTROL DE CALIDAD

Durante el periodo se ha implementado control de calidad respectivo a las actividades y materiales utilizados en obra, los cuales se incluyen en los anexos, correspondientes a certificados de calidad de materiales y cumplimiento del laboratorio.

En el **ANEXO 7.1** del presente informe, se relacionan las cantidades de trabajo realizado durante el periodo en el proyecto ***"PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"***.

3.2.2 ACTIVIDADES DE OBRA

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas por el CONSORCIO DIAGONAL RC durante el periodo del 17 de enero de 2023 al 16 de febrero de 2024:

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría Estructural y de Pavimentos
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

CAPITULO 1. PRELIMINARES

- **LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPOS DE PRECISIÓN**

Se refiere a ubicar y marcar en el terreno o superficie de construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares señalados en el plano de diseño del proyecto, así como los linderos del mismo, verificación de longitudes de terreno con respecto al diseño, definición de niveles y nivel 00 para cada zona, referenciación con pintura, mineral, tiza o cal.

Cantidad ejecutada: 5.035,75 M2



- **DEMOLICIÓN DE PLACA PISO E=0.10 M**

Esta actividad consiste en la demolición de placas existentes dentro del área a intervenir en andenes o vía, que implican la ejecución de nuevas obras que están contempladas dentro del diseño arquitectónico y estructural del alcance del proyecto. Incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra de los materiales provenientes de la demolición.

Cantidad ejecutada: 708,25 M2



Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

CAPITULO 2. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES

- **EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)**

Se refiere a la excavación necesaria para la conformación de la estructura del pavimento, de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos u ordenados por el interventor y/o supervisión, de acuerdo al desarrollo del proyecto. Incluye también la remoción, transporte y disposición de todo el material que se encuentre dentro de los límites de las excavaciones y la limpieza final que sea necesaria para la terminación de la actividad.

Cantidad ejecutada: 1,362.18 M3



CAPITULO 7. PAISAJISMO

- **APEO DE ÁRBOLES (TALA, REMOCIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL DESCARTADO, DE 3 A 12 MTS DE ALTURA)**

Esta actividad consiste en la operación de ir cortando poco a poco las extremidades de los árboles hasta eliminarlos de la tierra. Sin embargo, incluye también remoción y transporte del material descartado, este proceso busca desmantelar de manera segura y eficiente la estructura arbórea para liberar el espacio sin causar daños innecesarios al entorno.

Cantidad ejecutada: 12.00 UND



3.3 INFORMACIÒN FISICO FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

3.3.1 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo al contrato de obra pública No. 403-2023 y al suscrito modificatorio No.001 se modifica la **Cláusula sexta. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO:** la entidad entregará bajo la figura del anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato bajo las siguientes condiciones: a) El anticipo se tramitará previa solicitud del contratista y aceptación de las condiciones de la entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). b) La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. c) La entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el municipio de Ricaurte Cundinamarca con NIT No. 890.680.059-1, el cual será vigilado por el interventor del contrato.

Cláusula octava. FORMA DE PAGO: la entidad entregará un anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula sexta y posteriormente hará pagos parciales según avance de obra con su respectiva amortización.

3.3.1.1 BALANCE E INVERSIÓN DEL ANTICIPO

BALANCE FINANCIERO AL ANTICIPO			
	DINERO	DINERO	%
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$5.651.098.939,50		100.00%
VALOR AMORTIZADO		$759.665.361,50	13.44%

ACTA PARCIAL No. 01			
VALOR POR AMORTIZAR		$4.891.433.578,00	86.56%
SUMAS IGUALES	**$5.651.098.939,50**	**$5.651.098.939,50**	**100,00%**

INVERSIÓN AL ANTICIPO			
	DINERO	**DINERO**	**%**
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$5.651.098.939,50		100.00%
INFORME No.1 DE ANTICIPO		$1.455.000.000,00	25.75%
INFORME No. 2 DE ANTICIPO		$105.932.397,00	1.87%
INFORME No. 3 DE ANTICIPO		$350.000.000,00	6.19%
INFORME No. 4 DE ANTICIPO		$547.052.174,00	9.68%
ACUMULADO		**$2.457.984.571,00**	**43.49%**
VALOR POR EJECUTAR		$3.193.114.368,50	56.51%
SUMAS IGUALES	**$5.651.098.939,50**	**$5.651.098.939,50**	**100,00%**

3.3.1.2 BALANCE E INVERSIÓN DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO AL CONTRATO DE OBRA No. 403-2023			
	DINERO	**DINERO**	**%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 11.302.197.879,00		100.00%
VALOR EJECUTADO INFORME No. 1		$ 299.256.378,00	2.65%
VALOR EJECUTADO INFORME No. 2		$1.228.906.394,00	10.87%
VALOR EJECUTADO INFORME No. 3		$22.450.066,00	0.20%
VALOR EJECUTADO INFORME No. 4		$106.124.193,00	0.94%
ACUMULADO		**$1.656.731.319,00**	**14.66%**
VALOR POR EJECUTAR		$ 9.645.466.560,00	85.34%
SUMAS IGUALES	**$ 11.302.197.879,00**	**$ 11.302.197.879,00**	**100,00%**

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

3.3.2 VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA POR CAPITULOS


A continuación, se presenta el balance del contrato de obra definiendo el valor ejecutado acumulado a la fecha de cada capitulo en valor y porcentaje de avance.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 413 DE 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA"	VALOR TOTAL DE CADA CAPITULO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO DE CADA CAPITULO	PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO POR CAPITULO
PRESUPUESTO GENERAL (CAPITULOS)			
CAPITULO 1			
PRELIMINARES	$460.984.683,00	$ 51.067.062,00	11,32%
CAPITULO 2			
EXPLANACION Y EXCAVACIONES	$687.986.300,00	$56.965.772,00	8,28%
CAPITULO 3			
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$2.503.740.345,00	$0,00	0,00%
CAPITULO 4			
ANDENES Y SARDINELES	$1.502.450.751,00	$0,00	0,00%
CAPITULO 5			
ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS	$1.674.325.810,00	$1.405.410.778,00	83,94%
CAPITULO 6			
MOBILIARIO URBANO	$274.601.763,00	$0,00	0,00%
CAPITULO 7			
PAISAJISMO	$286.448.651,00	$89.603.379,00	31,28%
CAPITULO 8			
ALUMBRADO PUBLICO	$3.550.367.376,00	$0,00	0,00%
CAPITULO 9			
SEÑALIZACION	$229.794.037,00	$0,00	0,00%
PGIO			
	$107.368.656,00	$53.684.328,00	50,00%
INSPECCION RETIE Y RETILAP			
	$34.150.000,00		0,00%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	$ 11.302.198.272,00	$1.656.731.319,00	14,66%
AJUSTE AL PESO	$393,00		
	$ 11.302.197.879,00		

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

3.3.3 GRAFICAS DE VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA POR CAPITULOS

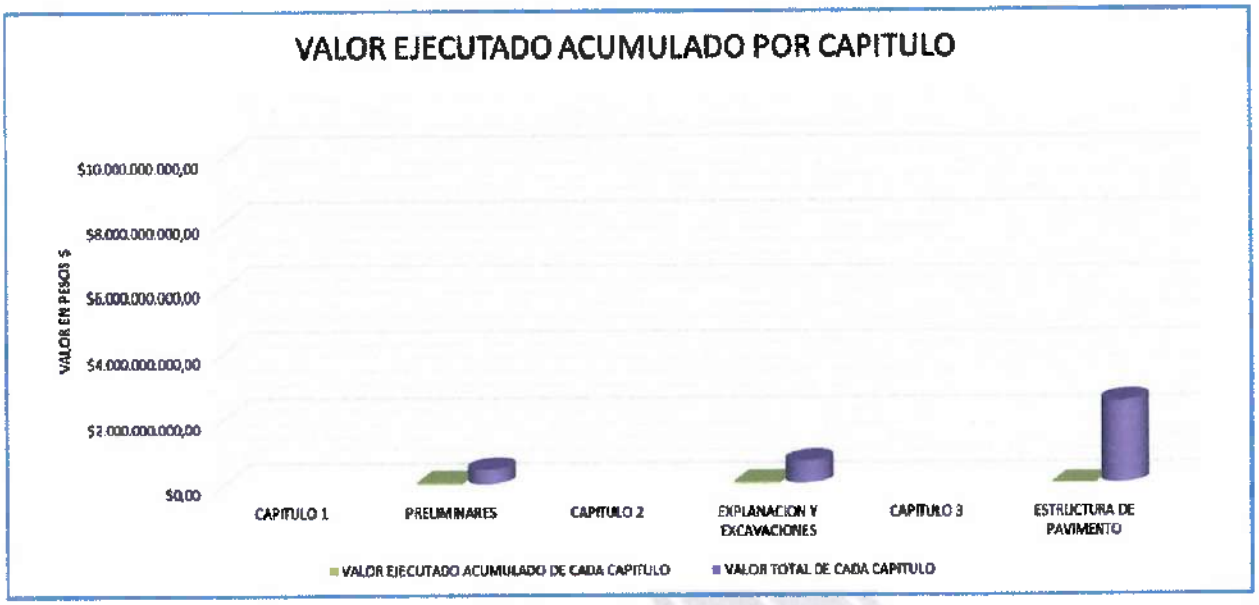


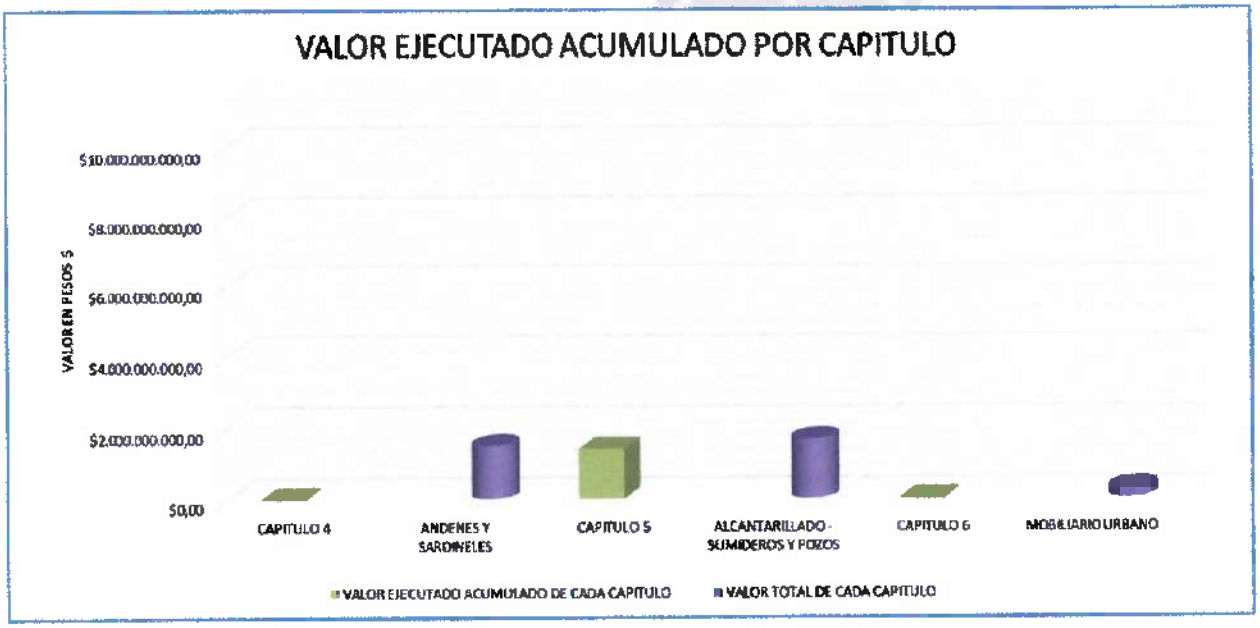



CAPITULO 4. AVANCE Y SEGUIMIENTO DE OBRA

4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

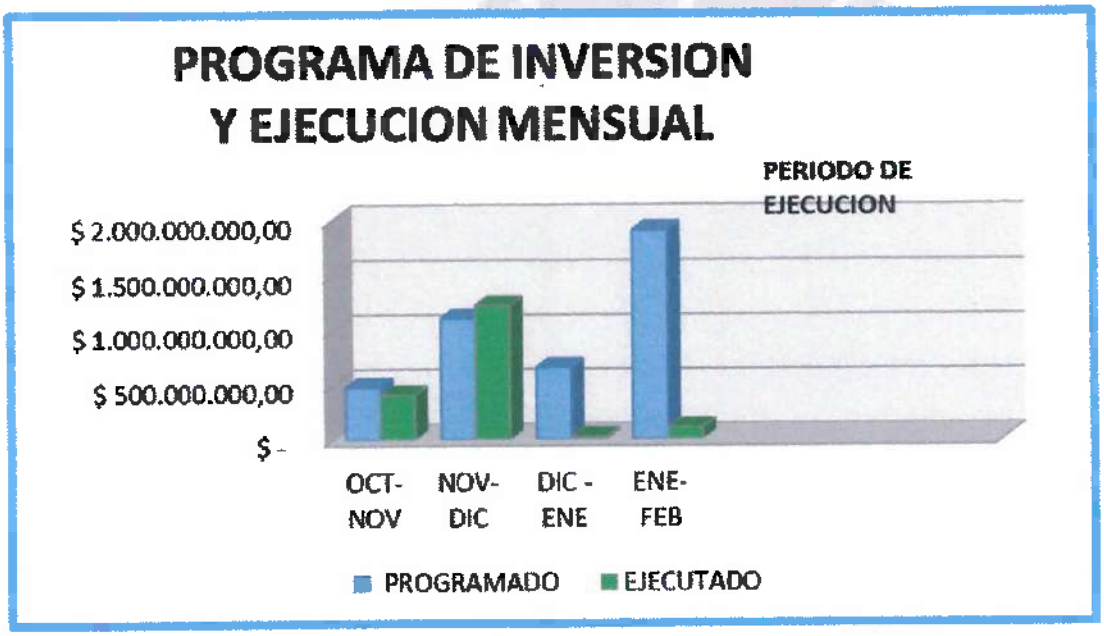

Paola Rodriguez Alcalá
Tecnóloga Civil
Especialista en Interventoría de Vías y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA


ESTADO ACTUAL PERIODO 17 DE ENERO 2023 AL 16 DE FEBRERO DE 2024


ALCANCE FISICO DESCRIPCIÓN OBRAS CAPITULO	CONTRATADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE DE CADA CAPITULO
CAPITULO 1	**$ 450.964.583,00**	**$ 133.659.985,88**	**$ 36.666.425,00**	
PRELIMINARES	$450.964.583,00	$ 133.659.985,88	$ 36.666.425,00	8,13%
CAPITULO 2	**$ 687.986.300,00**	**$ 290.216.540,00**	**$ 34.953.538,00**	
EXPLANACION Y EXCAVACIONES	$687.986.300,00	$ 290.216.540,00	$ 34.953.538,00	5,08%
CAPITULO 3	**$ 2.503.740.345,00**	**$ 772.967.342,52**	**$ 0,00**	
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$2.503.740.345,00	$ 772.967.342,52	$ 0,00	0,00%
CAPITULO 4	**$ 1.502.450.751,00**	**$ 615.010.366,67**	**$ 0,00**	
ANDENES Y SARDINELES	$1.502.450.751,00	$ 615.010.366,67	$ 0,00	0,00%
CAPITULO 5	**$ 1.674.325.810,00**	**$ 85.205.800,98**	**$ 0,00**	
ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS	$1.674.325.810,00	$ 85.205.800,98	$ 0,00	0,00%
CAPITULO 6	**$ 274.601.763,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	
MOBILIARIO URBANO	$274.601.763,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
CAPITULO 7	**$ 286.448.651,00**	**$ 0,00**	**$ 21.083.148,00**	
PAISAJISMO	$286.448.651,00	$ 0,00	$ 21.083.148,00	7,36%
CAPITULO 8	**$ 3.550.367.376,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	
ALUMBRADO PUBLICO	$3.550.367.376,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
CAPITULO 9	**$ 229.794.037,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	
SEÑALIZACION	$229.794.037,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
PGIO	**$ 107.368.656,00**	**$ 13.421.082,00**	**$ 13.421.082,00**	
	$107.368.656,00	$ 13.421.082,00	$ 13.421.082,00	12,50%
INSPECCION RETIE Y RETILAP	**$ 34.150.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	
	$34.150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
TOTAL % EJECUTADO	**$ 11.302.198.272,00**	**$ 1.910.481.118,03**	**$ 106.124.193,00**	0,94%

AVANCES DE CONTRATOS ACUMULADO

DESCRIPCIÓN DE CONTRATOS	VALOR PROYECTO	EJECUTADO	AVANCE CANTIDADES DE OBRA %
CONTRATO DE OBRA N° 403 DE 2023	$ 11.302.198.272,00	$ 106.124.193,00	0,94%
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 43 DE 2023	$ 626.317.157,00	$ 363.668.026,68	58,06%

4.2 GRAFICOS EN VALOR Y PORCENTAJE DEL PROYECTO

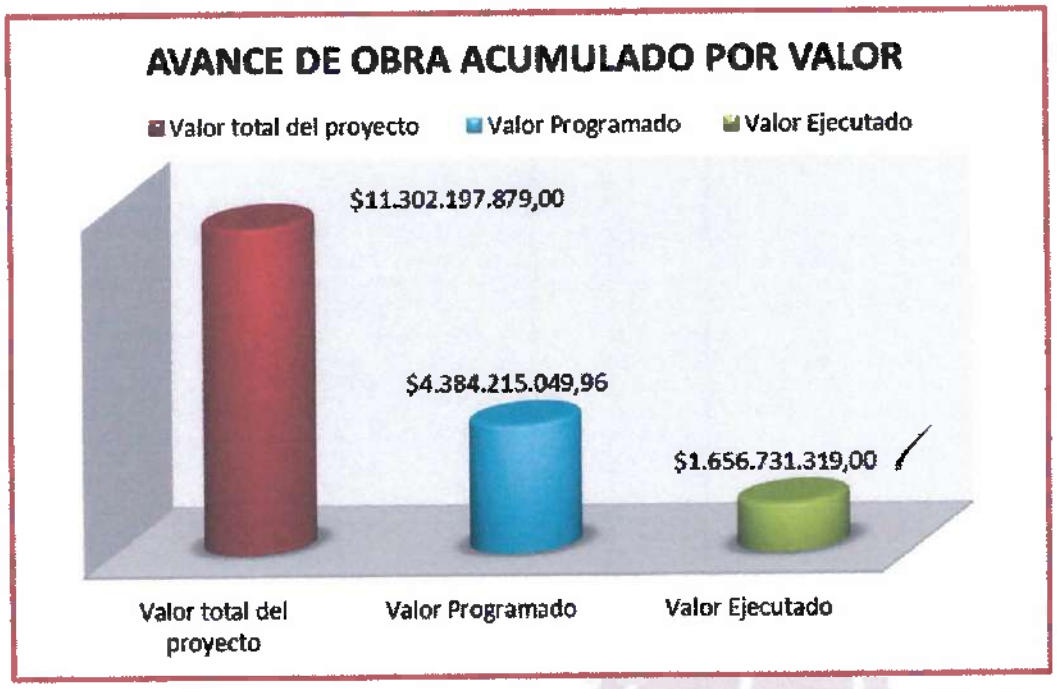

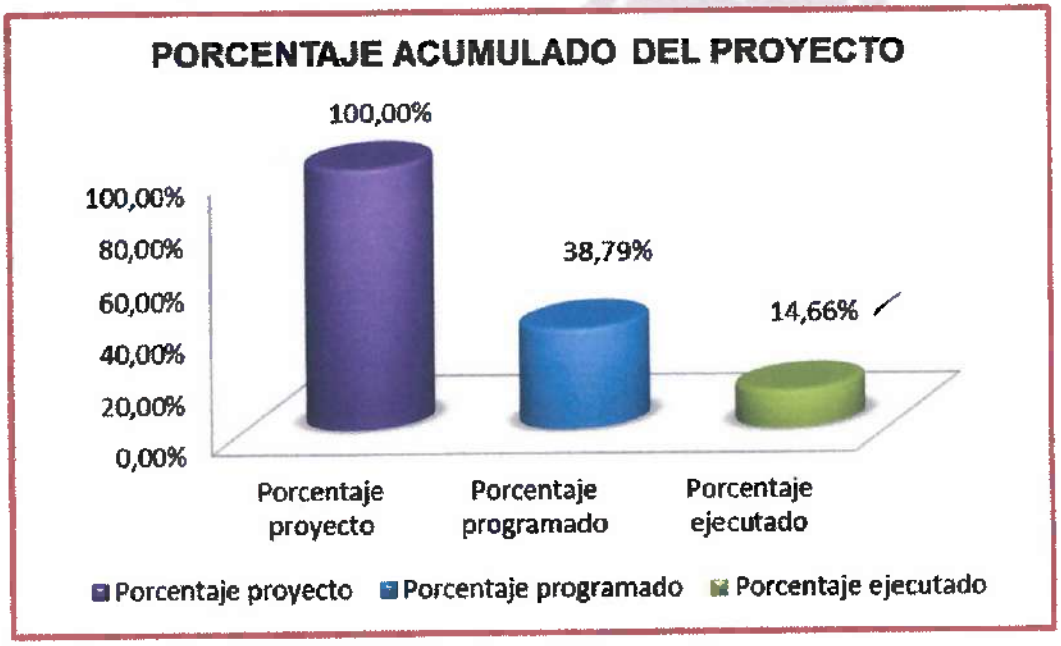

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

CAPITULO 5. PÓLIZAS Y GARANTÍAS VIGENTES

5.1 PÓLIZAS Y GARANTÌAS VIGENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÌA No. 413 – 2023

PÓLIZA DE SEGURO SERIEDAD DE LA OFERTA

Seguros Mundial
Póliza No. I-100025857
Anexo: 0 Fecha de expedición: 04/09/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 413-2023			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
SERIEDAD DE LA OFERTA	05/09/2023	20/12/2023	$62.631.715,70

PÓLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Seguros Mundial
Póliza No. I-100026598
Anexo: 0 Fecha de expedición: 28/09/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 413-2023			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	27/09/2023	27/12/2024	$62.631.715,70
PRESTACIONES SOCIALES	27/09/2023	27/04/2027	$31.315.857,85
CALIDAD DEL SERVICIO	27/04/2024	27/04/2029	$125.263.431,40

Seguros Mundial
Póliza No. I-100026598
Anexo: 2 Fecha de expedición: 18/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 413-2023			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	17/10/2023	16/01/2025	$62.631.715,70
PRESTACIONES SOCIALES	17/10/2023	17/05/2027	$31.315.857,85
CALIDAD DEL SERVICIO	17/05/2024	17/05/2029	$125.263.431,40

Actualización de vigencia según acta de inicio del 17/10/2023.

5.2 PÒLIZAS Y GARANTÌAS VIGENTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 403 – 2023

PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Berkley International Seguros Colombia S.A
Póliza No. 20569
Anexo: 1 Fecha de expedición: 05/10/2023

CONTRATO DE OBRA No. 403-2023			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
BASICO	31/08/2023	31/03/2024	$565.109.894,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	31/08/2023	31/03/2024	$565.109.894,00

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	31/08/2023	31/03/2024	$565.109.894,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	31/08/2023	31/03/2024	$565.109.894,00

Berkley International Seguros Colombia S.A
Póliza No. 20569
Anexo: 2 Fecha de expedición: 19/10/2023

CONTRATO DE OBRA No. 403-2023			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
BASICO	17/10/2023	17/05/2024	$565.109.894,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	17/10/2023	17/05/2024	$565.109.894,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	17/10/2023	17/05/2024	$565.109.894,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	17/10/2023	17/05/2024	$565.109.894,00

Actualización de vigencias según acta de inicio del 17/10/2023.

PÓLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Berkley International Seguros Colombia S.A
Póliza No. 70433
Anexo: 1 Fecha de expedición: 05/10/2023

CONTRATO DE OBRA No. 403-2023			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/08/2023	31/07/2024	$1.130.219.788,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/08/2023	31/03/2027	$565.109.894,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	31/03/2024	31/03/2029	$2.260.439.576,00

Berkley International Seguros Colombia S.A
Póliza No. 70433
Anexo: 2 Fecha de expedición: 06/10/2023

CONTRATO DE OBRA No. 403-2023			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	31/08/2023	31/07/2024	$5.651.098.940,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/08/2023	31/07/2024	$1.130.219.788,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/08/2023	31/03/2027	$565.109.894,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	31/03/2024	31/03/2029	$2.260.439.576,00

Actualización de vigencias según otro sí modificatorio No. 001 incluye cobertura de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

Berkley International Seguros Colombia S.A
Póliza No. 70433
Anexo: 3 Fecha de expedición: 19/10/2023

CONTRATO DE OBRA No. 403-2023			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17/10/2023	17/09/2024	$5.651.098.940,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/10/2023	17/09/2024	$1.130.219.788,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/10/2023	17/05/2027	$565.109.894,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	17/05/2024	17/05/2029	$2.260.439.576,00

Actualización de vigencias según acta de inicio 17/10/2023.

CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha del presente informe se presenta un avance acumulado de 14.66% frente a un programado de 38.79% por lo cual, se presenta un atraso de -24.13% según la programación de obra V2 remitida por el contratista de obra ante la suscrita acta de mayores y menores cantidades. Se aclara que, el seguimiento a la programación de obra V2 incluye la ejecución del plan de gestión integral de obra.

Ante el atraso presente en el proyecto, se informa a la supervisión que ante la temporada de festividades de fin de año y solicitud de la comunidad en representación de veedor ciudadano, se llevó a cabo cese de actividades de proceso constructivo a partir del 22 de diciembre de 2023 hasta el día 09 de enero de 2024 y el tiempo de definición de acometidas domiciliarias de alcantarillado residual y pluvial en los predios y/o lotes que no se contaban con la conexión a las redes en pro de evitar afectaciones futuras a la estructura del pavimento, generaron afectación al desarrollo del cronograma de obra.

Otros factores relevantes del atraso del proyecto corresponden a la afectación a la ductería de la red de telecomunicaciones de ETB ubicada sobre el carril izquierdo del tramo en intervención vial y las actividades de profundización de la red de acueducto de la empresa ACUAGYR SAS ESP en el tramo de intervención.


Esta interventoría aclara que se han adelantado reuniones y acercamientos con las empresas prestadoras de servicios mencionadas, con el propósito de solucionar los aspectos por atender y disminuir la afectación al cronograma de obra. Sin embargo, con el atraso presente en el proyecto y

la necesidad de definición e intervención de terceros, deberá considerarse prórroga al proyecto, garantizando así el cumplimiento del objeto contractual.

Ante los hechos expuestos en el comité anterior y las peticiones de la comunidad el día 12 de enero de 2024 y demás consideraciones, el día 15 de enero de 2024 se llevó a cabo comité técnico con la supervisión municipal, secretaria de planeación, contratista de obra e Interventoría, con el propósito de considerar el diseño actual del proyecto en atención a las peticiones de comerciantes y comunidad del sector de intervención, dentro del cual, se informa que se realizará ajuste al diseño por parte de la secretaria de planeación.

Se informa que durante el presente periodo no se registraron incidentes en el desarrollo de las actividades de obra, se brindó seguimiento y control al contratista de obra. Sin embargo, se reiteró al CONSORCIO DIAGONAL RC, la importancia de dar cumplimiento en los tiempos de entrega de documentación y atención a los requerimientos en atención a las obligaciones contractuales contenidas en su contrato de obra pública No. 403-2023.

Finalmente, esta interventoría informa que el día 29 enero de 2024 se llevó a cabo comité técnico con presencia de la supervisión municipal, secretaria de planeación, contratista de obra e interventoría, dentro del cual, se dio a conocer el ajuste al diseño del proyecto **"Pavimentación y embellecimiento de la diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte- Cundinamarca"**, estableciendo dos carriles de ingreso al municipio y dos carriles de salida, un separador de 1.00m, haciendo claridad que el ajuste del diseño contemplaba desde el centro vacacional de ETB hasta la Carrera 15, dado que, el tramo de la carrera 15 a la carrera 16 se encuentra sujeto a modificaciones puesto que se deben analizar condiciones de diseño por los niveles de las vías de intercesión. Ante los ajustes presentes al diseño, el día 12 de febrero de 2024 se llevó a cabo socialización con la comunidad de la zona para dar a conocer las modificaciones al diseño en atención a las solicitudes y peticiones por parte del sector comercial.

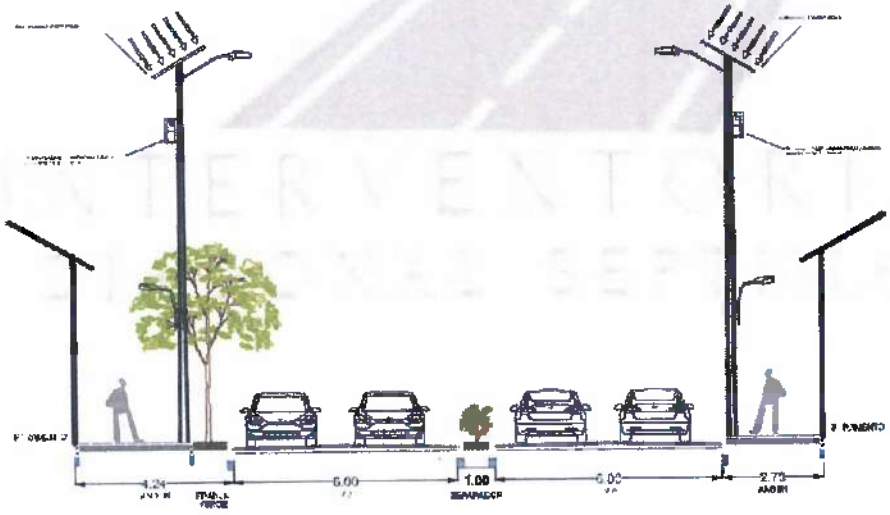

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

CAPITULO 7. ANEXOS

7.1 RELACIÒN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

7.2 INFORMES SEMANALES

7.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.4 ESTADO DEL CLIMA

7.5 CONTROL DE EQUIPO Y MAQUINARIA

7.6 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7.7 SOPORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA

7.8 INFORME SOCIAL

7.9 BITÀCORA DE OBRA

7.10 CORRESPONDENCIA ENVIADA

7.11 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

7.12 INFORMES DE PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

7.13 INFORME TÈCNICO ESPECIES ARBOREAS

7.14 ACTAS DE COMITÈ TÈCNICO

7.15 INFORME TOPOGRÁFICO CUATRIMESTRAL

Paola A. Rodriguez A.

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
REPRESENTANTE LEGAL

INFORME DE INTERVENTORIA 04
SEGUIMIENTO AL COMPONENTE AMBIENTAL.

Contrato de Obra No. 403 de 2023 - pavimentación y embellecimiento de la diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte – Cundinamarca.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 413 DE 2023

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCERA Y AMBIENTAL PARA "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA

PERIODO DE 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2024
RICAURTE – CÚNDINAMARCA

1.INTRODUCCIÓN

Desde esta interventoría con el presente informe se pretende garantizar en cumplimiento de la componente ambiental ejecutada por el Contratista CONSORCIO DIAGONAL RC, en ejecución del Contrato de obra 403 DE 2023 y aunque no se cuenta con ingeniero ambiental en su marco técnico, se realiza el seguimiento como lo indica en las obligaciones de interventoría.

2. OBJETIVOS

2.1. General

Describir las actividades ambientales ejecutadas durante el periodo de ejecución de obra, en cumplimiento a las obligaciones contractuales, anexo técnico y pliegos de condiciones del Contrato de Interventoría.

2.2. Específicos

- Hacer seguimiento al cumplimiento de las condiciones del Contrato de obra, en especial las obligaciones ambientales, con la finalidad de determinar el cumplimiento del contratista.

- Dar a conocer el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales relacionados con los aspectos Ambientales.

- Proporcionar información de avance respecto a las obligaciones de la gestión ambiental a través del seguimiento del Plan de Manejo Ambiental, como instrumento ambiental para la ejecución del Contrato de obra.

- Presentar el informe mensual ambiental de Interventoría durante cada periodo correspondiente.

3. GESTIÓN AMBIENTAL

La Interventoría en cumplimiento de sus funciones realiza el seguimiento de la gestión ambiental por parte del Contratista de obra y ejecuta las siguientes actividades:

• Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales del Contrato de obra, con la finalidad de determinar el cumplimiento de la firma contratista.

• Se realiza seguimiento a las actividades incluidas en el Plan de Manejo Ambiental, como son:

- ❖ Ejecución de capacitación ambiental al personal.
- ❖ Demarcación de la obra.
- ❖ Señalización de áreas internas.
- ❖ Seguimiento al suministro del recurso agua.
- ❖ Seguimiento al manejo de residuos sólidos y líquidos.
- ❖ Seguimiento al manejo del área del campamento y acopio de materiales.

1. Conclusiones

Positivos:

Cumplimiento a las capacitaciones relacionadas con el medio ambiente.
Señalizan en todas las áreas a intervenir.
Se evidencia punto de almacenamiento de los materiales.
El campamento cuenta con servicios esenciales (agua y energía, baños).
Se evidencia fichas de seguridad de los productos químicos.


Negativos:

Se continua sin puntos ecológicos en la obra.
No se cuenta con acopio para las bolsas de cemento.


EVIDENCIA FOROGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS A INTERVENIR



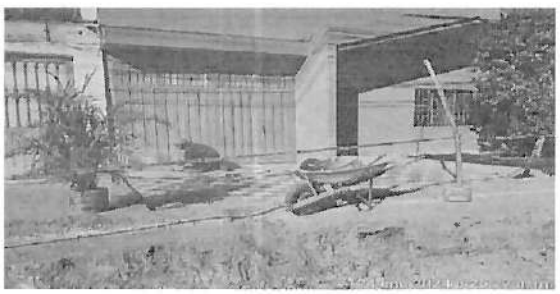

TALA DE ESPECIES ARBOREAS

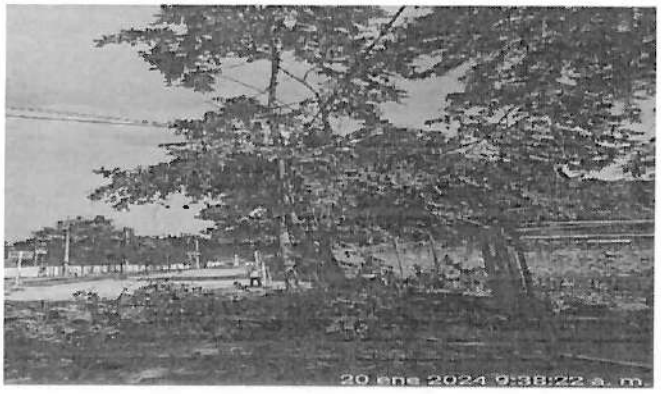

RIEGO DE AGUA EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN POR MATERIAL PARTICULADO



Nota: Todos los anexos ambientales reposan en los periodos de PGIO en el expediente del contrato de obra pública No.403 -2023

Atentamente.

Dennis Barrero
Profesional en Seguridad y Salud Ocupacional
Lic. SO. Res. No. 7624 de 01-07-2016

"PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 15 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"

	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA
	PRELIMINARES				
1,1	Localización y Replanteo Con Equipos de Precisión	M2	16.298,00	5.035,75	5.035,75
1,2	Cerca En Tela Verde H = 2.10 M	ML	1.949,00		297,50
1,3	Fresado de Concreto Asfáltico (E= 5- 12 cm)	M2	13.946,00		33,04
1,4	Demolición Adoquin Sobre Arena, H=0.15 M	M2	609,50		-
1,5	Demolición Placa Piso E= 0.10 M	M2	3.076,10	708,25	708,25
1,6	Demolición De Sardinel En Concreto	ML	2.408,00		-
1,7	Demolición de Sumideros	UND	45,00		-
1,8	Retiro de Aro Tapas De Pozos Existentes.	UND	41,00		-
1,9	Nivelación De Pozos De Inspección Di=1.20m, E=0.25m, H=0,21m (Incluye Pañete Interno Y Demolición)	UND	41,00		7,00
1,10	Retiro de Cajillas Medidor Acueducto Existentes.	UND	45,00		-
1,11	Desmonte De Poste Alumbrado Publico	UND	10,00		-
1,12	Desmantelamiento De Redes En Postes De Alumbrado Publico	UND	10,00		-
1,13	Demolición de Carcamo	ML	41,00		-
1,14	Desmonte De Señales Verticales De Transito	UND	44,00		21,00
1,15	Demolición Reductor de Velocidad E=0.15 A=1.0	ML	17,60		-
	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	UND.	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA
2,1	Excavación Manual En Conglomerado H=0.0-2.0 M (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)		141,5		-
2,2	Excavacion Manual en Material Comun H=0,0-2,0M (Incluye Retiro de Sobrantes a una Distancia Menor de 5 km)	M3	1.273,50		-
2,3	Excavaciones Varias a Maquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)	M3	5.610,00	1.362,18	1.714,05
2,4	Transporte De Materiales Prov. De Explanación, Canales, Prestamos, Sobre acarreos Y Derrumbes	M3-KM	224.022,00		-
2,5	Derechos de disposicion final en escombrera certificada	M3	7.400,00		1.050,00
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	UND.	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA
3.1	Compactacion de la Subrasante	M2	9.346,00		-

3.2	Control Topografico de Niveles de Excavacion y de la Estructura de Pavimento	M2	16.298,00		-
3.3	Sub-Base Granular (Norma INVIAS 320) para nivelacion y fallos (E=0,15m)	M3	1.402,00		-
3.4	Base Granular (Norma INVIAS 330) (E=0,15m)	M3	1.011,47		-
3.5	Pavimento Rígido En Concreto MR 40 (40 KG/CM2) (E=0,20m)	M3	1.434,47		-
3.6	Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 PSI	KG	19.699,00		-
3.7	Sellado De Juntas En Pavimento De Concreto Rígido (Incluye Limpieza, Suministro E Instalación De Fondo Y Sellante)	ML	2.383,00		-
3.8	Estampado, Endurecido Y Sellado De Superficie en Concreto	M2	626,00		-
3.9	Suministro E Instalación De Geotextil T 2400 (Estabilización, Filtro Y Separación)	M2	5.454,12		-
3.10	Corte de Pavimento En Concreto Con Disco Diamantado	ML	6.502,00		-
3.11	Suministro e instalacion COLOR CONCRETO VERDE PINO C-144 PARA CICLOVIA, dosificacion 6kg/m2 de incorporacion manual acabado concreto rustico, incluye sellador de concreto ECO.	M2	1.202,00		-
	ANDENES Y SARDINELES	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
4.1	Relleno Tipo 7 "Arena De Peña"	M3	248,00		-
4.2	Suministro e instalacion loseta de cemento 40 x 40 textura color tipo alfa	M2	1.678,00		-
4.3	Suministro e instalacion loseta de cemento 40 x 40 sin textura color tipo alfa	M2	1.555,00		-
4.4	Suministro e instalacion loseta de cemento 40 x 40 toperol color tipo alfa	ML	1.332,00		-
4.5	Adoquín De Arcilla 20x10x8cm	M2	1.612,00		-
4.6	Suministro e instalacion de gramoquín peatonal	M2	70,00		-
4.7	Andén Concreto 3000 Psi En Sitio E=0.1m	M2	177,00		-
4.8	Bordillo Prefabricado A-80	ML	3.289,00		-
4.9	Sardinel Prefabricado A-10	ML	2.204,90		-
	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
5.1	Localizacion y replanteo de redes	ML	407,15		407,15
5.2	Excavaciones Varias a Maquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)	M3	5.083,70		5.083,70
5.3	Entibado Tipo 2 (1/7 Utilizaciones)	M2	2.635,94		2.635,94
5.4	Transporte De Materiales Prov. De Explanación, Canales, Prestamos, Sobre acarreos Y Derrumbes	M3-KM	55.509,74		55.352,23

1642

5,5	Relleno en Tipo 2 "Recebo"	M3	2.843,31		2.843,31
5,6	Relleno Tipo 5 "triturado grueso"	M3	370,00		-
5,7	Relleno Tipo 7 "Arena De Peña"	M3	1.603,43		1.603,43
5,8	Tuberia PVC Alcantarillado 10"	ML	13,20		13,20
5,9	Tuberia PVC Alcantarillado 12"	ML	51,00		51,00
5,1	Tuberia PVC Alcantarillado 16"	ML	23,20		23,20
5,11	Tuberia PVC Alcantarillado Reforzado 24"	ML	117,80		117,80
5,12	Tuberia PVC Alcantarillado Reforzado 36"	ML	147,10		147,10
5,13	Tuberia PVC Alcantarillado 42"	ML	68,20		68,20
5,14	Suministro e instalación silla Yee PVC de 6X12"	UND	32,00		-
5,15	Suministro e instalación de Codo 45° PVC 6"	UND	32,00		-
5,16	Placa de Fondo Pozo d=1.7m, e=0.25m (concreto 3000psi con refuerzo)	UND	5,00		-
5,17	Cilindro pozo en ladrillo tolete, di=1.20m e=0.25m (inc. Pañete interno e=1.5cm y cañuela)	ML	12,98		-
5,18	Cubierta Pozo D= 1.7m, E=0.20m Concreto 3000 Psi Con Refuerzo (No Incluye Aro Y Tapa Hf)	UND	7,00		-
5,19	Aro en acero y Tapa en Polipropileno de alto impacto, para pozos de inspeccion.	UND	7,00		-
5,2	Marco Tapa Caja De Inspección	UND	32,00		-
5,21	Caja De Inspección De 60x60	UND	6,00		2,00
5,22	Caja Contador De Agua	UND	32,00		-
5,23	Sumidero Fundido en Sitio Reforzado de una sola camara, incluye marco y rejilla en metalica	UND	32,00		-
5,24	Construccion de Sumidero tipo carcamo medidas 0.4 m x 0.7m (interno) y paredes de 0.15m en concreto 3000 PSI incluye rejilla metalica	ML	40,00		-
5,25	Concreto f'c=3500 PSI (bases) para Camara de Inspeccion	M3	2,21		-
5,26	Concreto f'c=3500 PSI (Elevaciones) para Camara de Inspeccion	M3	10,84		-
5,27	Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 PSI	KG	400,00		-
	MOBILIARIO URBANO	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
6.1	Suministro E Instalación De Banca Urbana Ver Detalle Incluye Dado De Soporte	UND	14,00		-
6.2	Banca En Concreto M-40	UND	20,00		-
6.3	Bolardo M-63 Alto/Hierro	UND	53,00		-

6.4	Suministro E Instalación Caneca Urbana Ver Detalle Incluye Dado De Soporte	UND	20,00		-
6,5	Suministro E Instalación De Paradero De Bus Ver Detalle	UND	1,00		-
6,6	Suministro E Instalación De Caseta De Ventas Ver Detalle	UND	1,00		-
6.7	Suministro E Instalación De Mogador Informativo	UND	1,00		-
6,8	Ciclo Parqueadero M100 Tipo 1	UND	5,00		-
	PASAJISMO	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
7.1	Contenedor de raíces en tubería corrugada PVC 36" x 1 metro de desarrollo	UND	20,00		-
7,2	Contenedor de raíces en tubería corrugada PVC 24" x 1 metro de desarrollo	UND	12,00		-
7,3	Suministro E Instalación De Arboles H=1.50 m	UND	110,00		-
7,4	Poda De Mantenimiento, Poda Radicular y Conflicto Con Redes. (De 2 a 14 mts de altura)	UND	29,00		-
7,5	Apeo de Árboles (Tala, Remoción y Transporte de Material Descartado, De 3 a 12 mts de altura)	UND	79,00	12,00	51,00
7,6	Relleno En Tierra Negra	M3	45,00		-
7,7	Grama zonas verdes	M2	1.130,00		-
	ALUMBRADO PUBLICO	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
8,1	Suministro e instalacion de poste metalico de 8.5 metros de altura, troncoconico, Diametro cima: 127mm y Diametro Base: 170mm certificado con retilap, incluye Cimentacion en concreto reforzado, sistema de puesta a tierra y doble proposito (para dos luminarias).	UND	72,00		-
8,2	Suministro e instalacion de sistema solar para dos luminarias de 30 y 60W. Incluye paneles solares con soporte, una luminaria de 60W y una luminaria de 30W, cofre, controlador de carga, baterias, protecciones de DC, conectores MC4 y cableado de conexión.	UND	72,00		-
					-
	SEÑALIZACIÓN	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
9,1	Líneas De Demarcación Con Pintura En Frío	ML	2.781,00		-
9,2	Marca Vial Con Pintura En Frío	M2	97,00		-
9,3	Señal De Tránsito Grupo I 0.75x0.75m, Poste 3.5m	UND	40,00		-
9,4	Suministro e Instalación Separador de Canil Tipo B 0,78x0,20x0,15 Material: Polietileno de Alta densidad con estabilizador UV Resistencia: 50 toneladas. Reflectivos: 4 ojos por cara (Incluye: 4 Tornillos en Acero Inoxidable de1/2" de Ancho y 5 Tornillos en Acero Inoxidable de 1/2# de Largo)	UND	528,00		-
9,5	Suministro e Instalación de Tachas Reflectivas Unidireccionales	UND	1.723,00		-
					-
	PGIO				-

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

7.2 INFORMES SEMANALES

Ricaurte

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Paola Rodriguez Alcalá

REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA

El presente informe corresponde:	15 DE ENERO DEL 2024	AL	21 DE ENERO DE 2024	INFORME No:	14

CONTRATO:	Contrato No.403 de 2023	VALOR:	$ 11.302.197.879,00	PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO DIAGONAL RC	NIT:	901.746.184-7	PLAZO FINAL:	SIETE (07) MESES
OBJETO:	PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA			FECHA DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
SUPERVISOR:	HECTOR DANIEL MORALES DEVIA				

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	17/10/2023	SIETE (07) MESES	$ 11.302.197.879,00	
BALANCE DE MAYORES Y MENORES No.01	17/11/2023		$ 11.302.197.879,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO DIAGONAL RC	OBJETO:	PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA
REP. LEGAL:	LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO		
CONTRATO No:	Contrato No.403 de 2023	FECHA DEL CONTRATO	31 DE AGOSTO DEL 2023
VALOR COSTO DIRECTO:	$ 11.302.197.879,00	CONVENIO	
VALOR ADICIONAL:			
VALOR TOTAL:	$ 11.302.197.879,00	FECHA ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
EJECUTADO:			
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES	FECHA ACTUAL DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
PLAZO ADICIONAL 1:		ACTA MODIFICATORIA N°1	
TOTAL PLAZO:	SIETE (07) MESES	ACTA ADICIONAL N°1	
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	PRORROGA N°1	PRORROGA N°2
		REINICIO N°1	
Recurso Humano (Equipo/Materiales	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	SEÑALIZACION	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO,	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	17/10/2023	SIETE 807) MESES	$ 626.317.157,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA:	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ	OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"
REP. LEGAL:	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ		
CONTRATO No:	413-2023	FECHA DE CONTRATO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR INCIAL :	$ 626.317.157,00	CONVENIO	
VALOR ADICIONAL:			
VALOR TOTAL:	$ 626.317.157,00	FECHA ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
EJECUTADO:	$ -		
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES	FECHA ACTUAL DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
PLAZO ADICIONAL 1:		ACTA ADICIONAL N°2	
TOTAL PLAZO:	SIETE (07) MESES	SUSPENSIÓN N°1	
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	PRORROGA N°1	PRORROGA No-02
		REINICIO N°1	
Recurso	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	SEÑALIZACION	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA



	VALORES	PORCENTAJES
VR. TOTAL DE LA INTERVENTORIA	$ 626.317.157,00	100,00%
VR. TOTAL EJECUTADO INTERVENTORIA	$ 282.852.909,64	45,16%



VALORES EJECUTADOS POR LA INTERVENTORIA

SEMANA	VR. EJECUTADO	PERIODO DE EJECUCION	% EJECUTADO
1	$ 20.203.779,26	17/10/2023 AL 22/10/2023	3,23%
2	$ 20.203.779,26	23/10/2023 AL 29/10/2023	3,23%
3	$ 20.203.779,26	29/10/2023 AL 05/11/2023	3,23%
4	$ 20.203.779,26	06/11/2023 AL 12/11/2023	3,23%
5	$ 20.203.779,26	13/11/2023 AL 19/11/2023	3,23%
6	$ 20.203.779,26	20/11/2023 AL 26/11/2023	3,23%
7	$ 20.203.779,26	27/11/2023 AL 03/12/2023	3,23%
8	$ 20.203.779,26	04/12/2023 AL 10/12/2023	3,23%
9	$ 20.203.779,26	11/12/2023 AL 17/12/2023	3,23%
10	$ 20.203.779,26	18/12/2023 AL 24/12/2023	3,23%
11	$ 20.203.779,26	25/12/2023 AL 31/12/2023	3,23%

12	$ 20.203.779,26	01/01/2024 AL 07/01/2024	3,23%
13	$ 20.203.779,26	08/01/2024 AL 14/01/2024	3,23%
14	$ 20.203.779,26	15/01/2024 AL 21/01/2024	3,23%
TOTAL ACUMULADO	$	282.852.909,64	45,16%

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE OBRA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA

CONSORCIO DIAGONAL RC	Programado			Avance Real EJECUTADO		
MES: DICIEMBRE	Programado Semanal	Programado Acumulado	(%)	Avance Ejecutado Semanal	Avance Real Acumulado	(%)
17/10/2023 AL 22/10/2023	$ 8.438.276,67	$ 8.438.276,67	0,07%	$ 2.252.208,00	$ 2.252.208,00	0,02%
23/10/2023 AL 29/10/2023	$ 127.464.832,17	$ 135.903.108,83	1,13%	$ 76.175.042,00	$ 78.427.250,00	0,67%
29/10/2023 AL 05/11/2023	$ 145.186.491,33	$ 281.089.600,17	1,28%	$ 98.276.735,00	$ 176.703.985,00	0,87%
06/11/2023 AL 12/11/2023	$ 134.838.304,46	$ 415.927.904,63	1,19%	$ 87.340.257,00	$ 264.044.242,00	0,77%
13/11/2023 AL 19/11/2023	$ 290.143.265,08	$ 706.071.169,71	2,57%	$ 35.206.424,00	$ 299.250.666,00	0,31%
20/11/2023 AL 26/11/2023	$ 333.699.741,00	$ 1.039.770.910,71	2,95%	$ 401.128.675,00	$ 700.379.341,00	3,55%
27/11/2023 AL 03/12/2023	$ 308.543.629,10	$ 1.348.314.539,81	2,73%	$ 509.505.795,00	$ 1.209.885.136,00	4,51%
04/12/2023 AL 10/12/2024	$ 276.787.252,93	$ 1.625.101.792,74	2,45%	$ 163.139.948,00	$ 1.373.025.084,00	1,44%
11/12/2023 AL 17/12/2023	$ 191.523.484,41	$ 1.816.625.277,14	1,69%	$ 155.131.976,00	$ 1.528.157.060,00	1,37%
18/12/2023 AL 24/12/2023	$ 95.626.513,06	$ 1.912.251.790,20	0,85%	$ -	$ 1.528.157.060,00	0,00%
25/12/2023 AL 31/12/2023	$ 156.194.832,36	$ 2.068.446.622,56	1,38%	$ 13.421.082,00	$ 1.541.578.142,00	0,12%
01/01/2023 AL 07/01/2023	$ 181.156.860,90	$ 2.249.603.483,46	1,60%	$ 4.514.620,00	$ 1.546.092.762,00	0,04%
08/01/2024 AL 14/01/2024	$ 224.130.448,47	$ 2.473.733.931,92	1,98%	$ 4.514.364,00	$ 1.550.607.126,00	0,04%
15/01/2024 AL 21/01/2024	$ 306.858.086,76	$ 2.780.592.018,69	2,72%	$ 14.323.839,00	$ 1.564.930.965,00	0,13%
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO			24,60%	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		13,85%

TABLA VALORES ACUMULADOS

	COSTO DIRECTO	COSTO TOTAL	(%) PORCENTAJE
PROGRAMADO	$ 2.780.592.018,69	$ 2.780.592.018,69	24,60%
EJECUTADO	$ 1.564.930.965,00	$ 1.564.930.965,00	13,85%

PORCENTAJE CONTRACTUAL EJECUTADO COSTO DIRECTO



	VALORES COSTO DIRECTO	PORCENTAJES
VR. TOTAL DE OBRA	$ 11.302.197.879,00	100,00%
VR. TOTAL EJECUTADO DE OBRA	$ 1.564.930.965,00	13,85%



Actualmente se presenta un avance de obra de un 13,85%



PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
24,60%	13,85%	-10,76%

ACTUALMENTE SE PRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE 10,76%

ATRASO PRESUPUESTO :	-$ 1.215.661.053,69	ATRASO EN DIAS:	- 22,91	PORCENTAJE DE OBRA:	13,85%

VR. PROGRAMADO VS VR. EJECUTADO (COSTO DIRECTO)



VALOR TOTAL	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO
$ 11.302.197.879,00	$ 2.780.592.018,69	$ 1.564.930.965,00

ACTUALMENTE SE PRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE $1.215.661.053,69

CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD	VALOR	PORCENTAJE DE AVANCE ITEM SEMANAL ESTADO DE ACTIVIDAD	
				CULMINADA	EJECUCION
PRELIMINAR					
Localización y Replanteo Con Equipos de Precisión	1007,15	M2	$ 3.525.025,00		X
Demolición Placa Piso E= 0.10 M	141,65	M2	$ 3.808.260,00		X
EXPLANACION Y EXCAVACIONES					
Excavaciones Varias a Maquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)	272,43	M3	$ 6.990.554,00		X
		TOTAL	$ 14.323.839,00		

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

SEÑALIZACIÓN (TIPO)	CANTIDAD	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	SI	NO
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS		CASCOS	X	
SENDERO PEATONAL		BOTAS	X	
PROHIBIDO FUMAR		GUANTES	X	
LUGAR EN ORDEN Y ASEO		GAFAS	X	
REGLAS DE SEGURIDAD	1 UN	TAPABOCAS	X	
UBICACIÓN DE LA CAMILLA				

1646

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL













OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

PARA ESTA SEMANA EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ES DE 13,85% CON RESPECTO A UN PORCENTAJE PROGRAMADO DE 24,60%. POR TAL RAZON LA OBRA PRESENTA UN ATRASO DEL 10,76%.

DURANTE LA PRESENTE SEMANA INICIAN ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO EN ANDENES EXISTENTES DEL TRAMO 1 EN INTERVENCIÓN, CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN.

SE DESARROLLAN ACTIVIDADES SIN NOVEDADES, NI INCIDENTES LABORALES, SE CUENTA CON CONDICIONES CLIMATICAS FAVORABLES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

SE REALIZA VISITA DE CAMPO CON ALCARI SAS ESP CON EL PROPOSITO DE REALIZAR RECORRIDO DE INSPECCIÓN DE LOS PREDIOS EN DESARROLLO URBANISTICO O SIN CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA CONTINUAR GESTIONANDO LA DEFINICIÓN DE ACOMETIDAS PLUVIAL/SANITARIA A LA REDES EXISTENTES PARA EVITAR AFECTACIONES AL PAVIMENTO.

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION

ING. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
CONTRATISTA
INTERVENTORIA

Ricaurte

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Paola Rodriguez Alcala

REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA

El presente informe corresponde:	22 DE ENERO DEL 2024	AL	28 DE ENERO DE 2024	INFORME No:	15

CONTRATO:	Contrato No.403 de 2023	VALOR:	$ 11.302.197.879,00	PLAZO INCIAL:	SIETE (07) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO DIAGONAL RC	NIT:	901.746.184-7	PLAZO FINAL:	SIETE (07) MESES
OBJETO:	PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA			FECHA DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
SUPERVISOR:	HECTOR DANIEL MORALES DEVIA				

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	17/10/2023	SIETE (07) MESES	$ 11.302.197.879,00	
BALANCE DE MAYORES Y MENORES No.01	17/11/2023		$ 11.302.197.879,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO DIAGONAL RC	OBJETO:	PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA
REP. LEGAL:	LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO		
CONTRATO No:	Contrato No.403 de 2023		
VALOR COSTO DIRECTO:	$ 11.302.197.879,00	FECHA DEL CONTRATO	31 DE AGOSTO DEL 2023
VALOR ADICIONAL:		CONVENIO	
VALOR TOTAL:	$ 11.302.197.879,00		
EJECUTADO:		FECHA ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES		
PLAZO ADICIONAL 1:		FECHA ACTUAL DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
TOTAL PLAZO:	SIETE (07) MESES		
		ACTA MODIFICATORIA N°1	
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	ACTA ADICIONAL N°1	
		PRORROGA N°1	PRORROGA N°2
		REINICIO N°1	
Recurso Humano/Equipo/Materiales	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	SEÑALIZACION	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO,	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	17/10/2023	SIETE 807) MESES	$ 626.317.157,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA:	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ	OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"
REP. LEGAL:	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ		
CONTRATO No:	413-2023		
VALOR INICIAL :	$ 626.317.157,00	FECHA DE CONTRATO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR ADICIONAL:		CONVENIO	
VALOR TOTAL:	$ 626.317.157,00		
EJECUTADO:	$ -	FECHA ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES		
PLAZO ADICIONAL 1:		FECHA ACTUAL DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
TOTAL PLAZO:	SIETE (07) MESES		
		ACTA ADICIONAL N°2	
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	SUSPENSIÓN N°1	
		PRORROGA N°1	PRORROGA No-02
		REINICIO N°1	
Recurso Humano/Equipo/Materiales	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	SEÑALIZACION	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA



	VALORES	PORCENTAJES
VR. TOTAL DE LA INTERVENTORIA	$ 626.317.157,00	100,00%
VR. TOTAL EJECUTADO INTERVENTORIA	$ 303.056.688,90	48,39%



VALORES EJECUTADOS POR LA INTERVENTORIA

SEMANA	VR. EJECUTADO	PERIODO DE EJECUCION	% EJECUTADO
1	$ 20.203.779,26	17/10/2023 AL 22/10/2023	3,23%
2	$ 20.203.779,26	23/10/2023 AL 29/10/2023	3,23%
3	$ 20.203.779,26	29/10/2023 AL 05/11/2023	3,23%
4	$ 20.203.779,26	06/11/2023 AL 12/11/2023	3,23%
5	$ 20.203.779,26	13/11/2023 AL 19/11/2023	3,23%
6	$ 20.203.779,26	20/11/2023 AL 26/11/2023	3,23%
7	$ 20.203.779,26	27/11/2023 AL 03/12/2023	3,23%
8	$ 20.203.779,26	04/12/2023 AL 10/12/2023	3,23%
9	$ 20.203.779,26	11/12/2023 AL 17/12/2023	3,23%
10	$ 20.203.779,26	18/12/2023 AL 24/12/2023	3,23%
11	$ 20.203.779,26	25/12/2023 AL 31/12/2023	3,23%

12	$ 20.203.779,26	01/01/2024 AL 07/01/2024	3,23%
13	$ 20.203.779,26	08/01/2024 AL 14/01/2024	3,23%
14	$ 20.203.779,26	15/01/2024 AL 21/01/2024	3,23%
15	$ 20.203.779,26	22/01/2024 AL 28/01/2024	3,23%
TOTAL ACUMULADO	$ 303.056.688,90		48,39%

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE OBRA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA

CONSORCIO DIAGONAL RC	Programado			Avance Real EJECUTADO		
MES: DICIEMBRE	Programado Semanal	Programado Acumulado	(%)	Avance Ejecutado Semanal	Avance Real Acumulado	(%)
17/10/2023 AL 22/10/2023	$ 8.438.276,67	$ 8.438.276,67	0,07%	$ 2.252.208,00	$ 2.252.208,00	0,02%
23/10/2023 AL 29/10/2023	$ 127.464.832,17	$ 135.903.108,83	1,13%	$ 76.175.042,00	$ 78.427.250,00	0,67%
29/10/2023 AL 05/11/2023	$ 145.186.491,33	$ 281.089.600,17	1,28%	$ 98.276.735,00	$ 176.703.985,00	0,87%
06/11/2023 AL 12/11/2023	$ 134.838.304,46	$ 415.927.904,63	1,19%	$ 87.340.257,00	$ 264.044.242,00	0,77%
13/11/2023 AL 19/11/2023	$ 290.143.265,08	$ 706.071.169,71	2,57%	$ 35.206.424,00	$ 299.250.666,00	0,31%
20/11/2023 AL 26/11/2023	$ 333.699.741,00	$ 1.039.770.910,71	2,95%	$ 401.128.675,00	$ 700.379.341,00	3,55%
27/11/2023 AL 03/12/2023	$ 308.543.629,10	$ 1.348.314.539,81	2,73%	$ 509.505.795,00	$ 1.209.885.136,00	4,51%
04/12/2023 AL 10/12/2024	$ 276.787.252,93	$ 1.625.101.792,74	2,45%	$ 163.139.948,00	$ 1.373.025.084,00	1,44%
11/12/2023 AL 17/12/2023	$ 191.523.484,41	$ 1.816.625.277,14	1,69%	$ 155.131.976,00	$ 1.528.157.060,00	1,37%
18/12/2023 AL 24/12/2023	$ 95.626.513,06	$ 1.912.251.790,20	0,85%	$ -	$ 1.528.157.060,00	0,00%
25/12/2023 AL 31/12/2023	$ 156.194.832,36	$ 2.068.446.622,56	1,38%	$ 13.421.082,00	$ 1.541.578.142,00	0,12%
01/01/2023 AL 07/01/2023	$ 181.156.860,90	$ 2.249.603.483,46	1,60%	$ 4.514.620,00	$ 1.546.092.762,00	0,04%
08/01/2024 AL 14/01/2024	$ 224.130.448,47	$ 2.473.733.931,92	1,98%	$ 4.514.364,00	$ 1.550.607.126,00	0,04%
15/01/2024 AL 21/01/2024	$ 306.858.086,76	$ 2.780.592.018,69	2,72%	$ 14.323.839,00	$ 1.564.930.965,00	0,13%
22/01/2024 AL 28/01/2024	$ 326.384.596,22	$ 3.106.976.614,91	2,89%	$ 14.323.839,00	$ 1.579.254.804,00	0,13%
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO			27,49%	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		13,97%

TABLA VALORES ACUMULADOS

	COSTO DIRECTO	COSTO TOTAL	(%) PORCENTAJE
PROGRAMADO	$ 3.106.976.614,91	$ 3.106.976.614,91	27,49%
EJECUTADO	$ 1.579.254.804,00	$ 1.579.254.804,00	13,97%


PORCENTAJE CONTRACTUAL EJECUTADO COSTO DIRECTO



	VALORES COSTO DIRECTO	PORCENTAJES
VR. TOTAL DE OBRA	$ 11.302.197.879,00	100,00%
VR. TOTAL EJECUTADO DE OBRA	$ 1.579.254.804,00	13,97%



Actualmente se presenta un avance de obra de un 14,49%

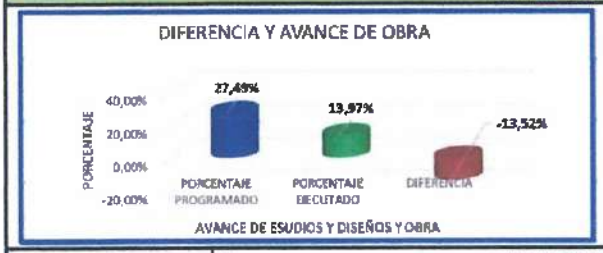

PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
27,49%	13,97%	-13,52%

ACTUALMENTE SE PRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE 13,52%

ATRASO PRESUPUESTO :	-$ 1.527.721.810,91	ATRASO EN DIAS:	- 28,79	PORCENTAJE DE OBRA:	13,97%

VR. PROGRAMADO VS VR. EJECUTADO (COSTO DIRECTO)



VALOR TOTAL	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO
$ 11.302.197.879,00	$ 3.106.976.614,91	$ 1.579.254.804,00

ACTUALMENTE SE PRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE $1.527.721.810,91

CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD	VALOR	PORCENTAJE DE AVANCE ITEM SEMANAL ESTADO DE ACTIVIDAD	
				CULMINADA	EJECUCION
PRELIMINAR					
Localización y Replanteo Con Equipos de Precisión	1007,15	M2	$ 3.525.025,00		X
Demolición Placa Piso E= 0.10 M	141,65	M2	$ 3.808.260,00		X
EXPLANACION Y EXCAVACIONES					
Excavaciones Varias a Maquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)	272,43	M3	$ 6.990.554,00		X
		TOTAL	$ 14.323.839,00		

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

SEÑALIZACIÓN (TIPO)	CANTIDAD	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	SI	NO
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS		CASCOS	X	
SENDERO PEATONAL		BOTAS	X	
PROHIBIDO FUMAR		GUANTES	X	
LUGAR EN ORDEN Y ASEO		GAFAS	X	

REGLAS DE SEGURIDAD	1 UN	TAPABOCAS	X	
UBICACIÓN DE LA CAMILLA				

1649

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL













OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

PARA ESTA SEMANA EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ES DE 13,97% CON RESPECTO A UN PORCENTAJE PROGRAMADO DE 27,49%. POR TAL RAZON LA OBRA PRESENTA UN ATRASO DEL 13,52%.

DURANTE LA PRESENTE SEMANA INICIAN ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO EN ANDENES EXISTENTES DEL TRAMO 1 EN INTERVENCIÓN, CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN.

SE DESARROLLAN ACTIVIDADES SIN NOVEDADES, NI INCIDENTES LABORALES, SE CUENTA CON CONDICIONES CLIMATICAS FAVORABLES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION

ING. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
CONTRATISTA
INTERVENTORIA

Ricaurte

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Paola Rodriguez Abaid

REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA

El presente informe corresponde:	29 DE ENERO DEL 2024	AL	04 DE FEBRERO DE 2024	INFORME No:	16

CONTRATO:	Contrato No.403 de 2023	VALOR:	$ 11.302.197.879,00	PLAZO INCIAL:	SIETE (07) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO DIAGONAL RC	NIT:	901.746.184-7	PLAZO FINAL:	SIETE (07) MESES
OBJETO:	PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA			FECHA DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
SUPERVISOR:	HECTOR DANIEL MORALES DEVIA				

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	17/10/2023	SIETE (07) MESES	$ 11.302.197.879,00	
BALANCE DE MAYORES Y MENORES No.01	17/11/2023		$ 11.302.197.879,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO DIAGONAL RC	OBJETO:	PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA
REP. LEGAL:	LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO		
CONTRATO No:	Contrato No.403 de 2023		
VALOR COSTO DIRECTO:	$ 11.302.197.879,00	FECHA DEL CONTRATO	31 DE AGOSTO DEL 2023
VALOR ADICIONAL:		CONVENIO	
VALOR TOTAL:	$ 11.302.197.879,00		
EJECUTADO:		FECHA ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES		
PLAZO ADICIONAL 1:		FECHA ACTUAL DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
TOTAL PLAZO:	SIETE (07) MESES	ACTA MODIFICATORIA N°1	
		ACTA ADICIONAL N°1	
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	PRORROGA N°1	PRORROGA N°2
		REINICIO N°1	
Recurso Humano/Equipo/Materiales	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	SEÑALIZACION	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO,	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:


ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	17/10/2023	SIETE 807) MESES	$ 626.317.157,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA:	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ	OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"
REP. LEGAL:	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ		
CONTRATO No:	413-2023		
VALOR INICIAL :	$ 626.317.157,00	FECHA DE CONTRATO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR ADICIONAL:	$ -	CONVENIO	
VALOR TOTAL:	$ 626.317.157,00		
EJECUTADO:	$ -	FECHA ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES		
PLAZO ADICIONAL 1:		FECHA ACTUAL DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
TOTAL PLAZO:	SIETE (07) MESES	ACTA ADICIONAL N°2	
		SUSPENSIÓN N°1	
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	PRORROGA N°1	PRORROGA No-02
		REINICIO N°1	
Recurso Humano/Equipo/Materiales	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	SEÑALIZACION	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA

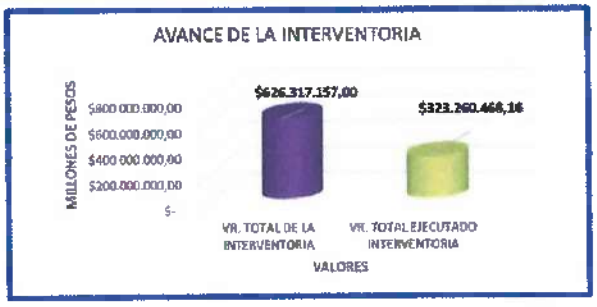

	VALORES	PORCENTAJES
VR. TOTAL DE LA INTERVENTORIA	$ 626.317.157,00	100,00%
VR. TOTAL EJECUTADO INTERVENTORIA	$ 323.260.468,16	51,61%



VALORES EJECUTADOS POR LA INTERVENTORIA

SEMANA	VR. EJECUTADO	PERIODO DE EJECUCION	% EJECUTADO
1	$ 20.203.779,26	17/10/2023 AL 22/10/2023	3,23%
2	$ 20.203.779,26	23/10/2023 AL 29/10/2023	3,23%
3	$ 20.203.779,26	29/10/2023 AL 05/11/2023	3,23%
4	$ 20.203.779,26	06/11/2023 AL 12/11/2023	3,23%
5	$ 20.203.779,26	13/11/2023 AL 19/11/2023	3,23%
6	$ 20.203.779,26	20/11/2023 AL 26/11/2023	3,23%
7	$ 20.203.779,26	27/11/2023 AL 03/12/2023	3,23%
8	$ 20.203.779,26	04/12/2023 AL 10/12/2023	3,23%
9	$ 20.203.779,26	11/12/2023 AL 17/12/2023	3,23%
10	$ 20.203.779,26	18/12/2023 AL 24/12/2023	3,23%
11	$ 20.203.779,26	25/12/2023 AL 31/12/2023	3,23%

12	$	20.203.779,26	01/01/2024 AL 07/01/2024	3,23%
13	$	20.203.779,26	08/01/2024 AL 14/01/2024	3,23%
14	$	20.203.779,26	15/01/2024 AL 21/01/2024	3,23%
15	$	20.203.779,26	22/01/2024 AL 28/01/2024	3,23%
16	$	20.203.779,26	29/01/2024 AL 04/02/2024	3,23%
TOTAL ACUMULADO	$		323.260.468,16	51,61%

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE OBRA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA

CONSORCIO DIAGONAL RC	Programado			Avance Real EJECUTADO		
MES: DICIEMBRE	Programado Semanal	Programado Acumulado	(%)	Avance Ejecutado Semanal	Avance Real Acumulado	(%)
17/10/2023 AL 22/10/2023	$ 8.438.276,67	$ 8.438.276,67	0,07%	$ 2.252.208,00	$ 2.252.208,00	0,02%
23/10/2023 AL 29/10/2023	$ 127.464.832,17	$ 135.903.108,83	1,13%	$ 76.175.042,00	$ 78.427.250,00	0,67%
29/10/2023 AL 05/11/2023	$ 145.186.491,33	$ 281.089.600,17	1,26%	$ 98.276.735,00	$ 176.703.985,00	0,87%
06/11/2023 AL 12/11/2023	$ 134.838.304,46	$ 415.927.904,63	1,19%	$ 87.340.257,00	$ 264.044.242,00	0,77%
13/11/2023 AL 19/11/2023	$ 290.143.265,08	$ 706.071.169,71	2,57%	$ 35.206.424,00	$ 299.250.666,00	0,31%
20/11/2023 AL 26/11/2023	$ 333.699.741,00	$ 1.039.770.910,71	2,95%	$ 401.128.675,00	$ 700.379.341,00	3,55%
27/11/2023 AL 03/12/2023	$ 308.543.629,10	$ 1.348.314.539,81	2,73%	$ 509.505.795,00	$ 1.209.885.136,00	4,51%
04/12/2023 AL 10/12/2024	$ 276.787.252,93	$ 1.625.101.792,74	2,45%	$ 163.139.948,00	$ 1.373.025.084,00	1,44%
11/12/2023 AL 17/12/2023	$ 191.523.484,41	$ 1.816.625.277,14	1,69%	$ 155.131.976,00	$ 1.528.157.060,00	1,37%
18/12/2023 AL 24/12/2023	$ 95.626.513,06	$ 1.912.251.790,20	0,85%	$ -	$ 1.528.157.060,00	0,00%
25/12/2023 AL 31/12/2023	$ 156.194.832,36	$ 2.068.446.622,56	1,38%	$ 13.421.082,00	$ 1.541.578.142,00	0,12%
01/01/2023 AL 07/01/2023	$ 181.156.860,90	$ 2.249.603.483,46	1,60%	$ 4.514.620,00	$ 1.546.092.762,00	0,04%
08/01/2024 AL 14/01/2024	$ 224.130.448,47	$ 2.473.733.931,92	1,98%	$ 4.514.364,00	$ 1.550.607.126,00	0,04%
15/01/2024 AL 21/01/2024	$ 306.858.086,76	$ 2.780.592.018,69	2,72%	$ 14.323.839,00	$ 1.564.930.965,00	0,13%
22/01/2024 AL 28/01/2024	$ 326.384.596,22	$ 3.106.976.614,91	2,89%	$ 14.323.839,00	$ 1.579.254.804,00	0,13%
29/01/2024 AL 04/02/2024	$ 452.569.778,93	$ 3.559.546.393,84	4,00%	$ 27.745.177,00	$ 1.606.999.981,00	0,25%
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO			31,49%	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		14,22%

TABLA VALORES ACUMULADOS

	COSTO DIRECTO	COSTO TOTAL	(%) PORCENTAJE
PROGRAMADO	$ 3.559.546.393,84	$ 3.559.546.393,84	31,49%
EJECUTADO	$ 1.606.999.981,00	$ 1.606.999.981,00	14,22%

PORCENTAJE CONTRACTUAL EJECUTADO COSTO DIRECTO



	VALORES COSTO DIRECTO	PORCENTAJES
VR. TOTAL DE OBRA	$ 11.302.197.879,00	100,00%
VR. TOTAL EJECUTADO DE OBRA	$ 1.606.999.981,00	14,22%



Actualmente se presenta un avance de obra de un 14,22%



PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
31,49%	14,22%	-17,28%

ACTUALMENTE SE PRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE 17,28%

ATRASO PRESUPUESTO :	-$ 1.952.546.412,84	ATRASO EN DIAS:	- 36,80	PORCENTAJE DE OBRA:	14,22%

VR. PROGRAMADO VS VR. EJECUTADO (COSTO DIRECTO)



VALOR TOTAL	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO
$ 11.302.197.879,00	$ 3.559.546.393,84	$ 1.606.999.981,00

ACTUALMENTE SE PRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE $1.952.546.412,84

CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD	VALOR	PORCENTAJE DE AVANCE ITEM SEMANAL ESTADO DE ACTIVIDAD	
				CULMINADA	EJECUCION
PRELIMINAR					
Localización y Replanteo Con Equipos de Precisión	1007,15	M2	$ 3.525.025,00		X
Demolición Placa Piso E= 0.10 M	141,65	M2	$ 3.808.260,00		X
EXPLANACION Y EXCAVACIONES					X
Excavaciones Varias a Maquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)	272,44	M3	$ 6.990.810,00		X
PGIO			$ 13.421.082,00		X
		TOTAL	$ 27.745.177,00		

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

SEÑALIZACIÓN (TIPO)	CANTIDAD	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	SI	NO
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS		CASCOS	X	
SENDERO PEATONAL		BOTAS	X	
PROHIBIDO FUMAR		GUANTES	X	
LUGAR EN ORDEN Y ASEO		GAFAS	X	
REGLAS DE SEGURIDAD	1 UN	TAPABOCAS	X	
UBICACIÓN DE LA CAMILLA				

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL













OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

PARA ESTA SEMANA EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ES DE 14,22% CON RESPECTO A UN PORCENTAJE PROGRAMADO DE 31,49%. POR TAL RAZON LA OBRA PRESENTA UN ATRASO DEL 17,28%.

CONTINUAN ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO EN ANDENES EXISTENTES DEL TRAMO 1 EN INTERVENCIÓN, CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN.

DESARROLLAN ACTIVIDADES SIN NOVEDADES, NI INCIDENTES LABORALES, DURANTE LA SEMANA SE PRESENTARON LLUVIAS EN EL DESARROLLO DE LA JORNADA LABORAL.

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION

ING. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
CONTRATISTA
INTERVENTORIA

Ricaurte

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Paola Rodriguez Alcalá

REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA

El presente informe corresponde:	05 DE FEBRERO DEL 2024	AL	11 DE FEBRERO DE 2024	INFORME No:	17

CONTRATO:	Contrato No.403 de 2023	**VALOR:**	$ 11.302.197.879,00	**PLAZO INCIAL:**	SIETE (07) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO DIAGONAL RC	**NIT:**	901.746.184-7	**PLAZO FINAL:**	SIETE (07) MESES
OBJETO:	PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA			**FECHA DE TERMINACION**	16 DE MAYO DE 2024
SUPERVISOR:	HECTOR DANIEL MORALES DEVIA				

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	17/10/2023	SIETE (07) MESES	$ 11.302.197.879,00	
BALANCE DE MAYORES Y MENORES No.01	17/11/2023		$ 11.302.197.879,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO DIAGONAL RC	**OBJETO:**	PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA
REP. LEGAL:	LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO		
CONTRATO No:	Contrato No.403 de 2023		
VALOR COSTO DIRECTO:	$ 11.302.197.879,00	**FECHA DEL CONTRATO**	31 DE AGOSTO DEL 2023
VALOR ADICIONAL:		**CONVENIO**	
VALOR TOTAL:	$ 11.302.197.879,00		
EJECUTADO:		**FECHA ACTA DE INICIO**	17 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES		
PLAZO ADICIONAL 1:		FECHA ACTUAL DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
TOTAL PLAZO:	SIETE (07) MESES		
		ACTA MODIFICATORIA N°1	
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	**ACTA ADICIONAL N°1**	
		PRORROGA N°1	PRORROGA N°2
		REINICIO N°1	
Recurso Humano/Equipo/Materiales	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	**SEÑALIZACION**	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	**CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL**	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:


ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	17/10/2023	SIETE 807) MESES	$ 626.317.157,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA:	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ	**OBJETO:**	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"
REP. LEGAL:	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ		
CONTRATO No:	413-2023		
VALOR INCIAL :	$ 626.317.157,00	**FECHA DE CONTRATO**	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR ADICIONAL:		CONVENIO	
VALOR TOTAL:	$ 626.317.157,00		
EJECUTADO:	$ -	FECHA ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES		
PLAZO ADICIONAL 1:		FECHA ACTUAL DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
TOTAL PLAZO:	SIETE (07) MESES		
		ACTA ADICIONAL N°2	
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	SUSPENSIÓN N°1	
		PRORROGA N°1	PRORROGA No-02
		REINICIO N°1	
Recurso Humano/Equipo/Materiales	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	**SEÑALIZACION**	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	**CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL**	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA

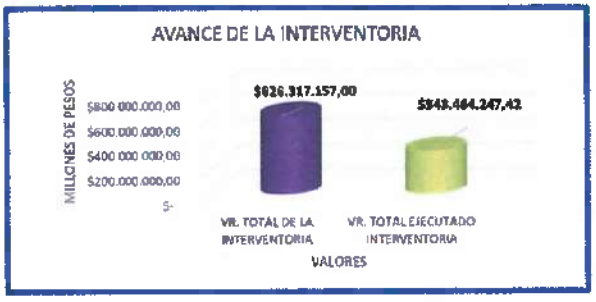

	VALORES	PORCENTAJES
VR. TOTAL DE LA INTERVENTORIA	$ 626.317.157,00	100,00%
VR. TOTAL EJECUTADO INTERVENTORIA	$ 343.464.247,42	54,84%



VALORES EJECUTADOS POR LA INTERVENTORIA

SEMANA	VR. EJECUTADO	PERIODO DE EJECUCION	% EJECUTADO
1	$ 20.203.779,26	17/10/2023 AL 22/10/2023	3,23%
2	$ 20.203.779,26	23/10/2023 AL 29/10/2023	3,23%
3	$ 20.203.779,26	29/10/2023 AL 05/11/2023	3,23%
4	$ 20.203.779,26	06/11/2023 AL 12/11/2023	3,23%
5	$ 20.203.779,26	13/11/2023 AL 19/11/2023	3,23%
6	$ 20.203.779,26	20/11/2023 AL 26/11/2023	3,23%
7	$ 20.203.779,26	27/11/2023 AL 03/12/2023	3,23%
8	$ 20.203.779,26	04/12/2023 AL 10/12/2023	3,23%
9	$ 20.203.779,26	11/12/2023 AL 17/12/2023	3,23%
10	$ 20.203.779,26	18/12/2023 AL 24/12/2023	3,23%
11	$ 20.203.779,26	25/12/2023 AL 31/12/2023	3,23%

12	$ 20.203.779,26	01/01/2024 AL 07/01/2024	3,23%
13	$ 20.203.779,26	08/01/2024 AL 14/01/2024	3,23%
14	$ 20.203.779,26	15/01/2024 AL 21/01/2024	3,23%
15	$ 20.203.779,26	22/01/2024 AL 28/01/2024	3,23%
16	$ 20.203.779,26	29/01/2024 AL 04/02/2024	3,23%
17	$ 20.203.779,26	05/02/2024 AL 11/02/2024	3,23%
TOTAL ACUMULADO	$ 343.464.247,42		54,84%

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE OBRA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA

CONSORCIO DIAGONAL RC	Programado			Avance Real EJECUTADO		
MES: DICIEMBRE	Programado Semanal	Programado Acumulado	(%)	Avance Ejecutado Semanal	Avance Real Acumulado	(%)
17/10/2023 AL 22/10/2023	$ 8.438.276,67	$ 8.438.276,67	0,07%	$ 2.252.208,00	$ 2.252.208,00	0,02%
23/10/2023 AL 29/10/2023	$ 127.464.832,17	$ 135.903.108,83	1,13%	$ 76.175.042,00	$ 78.427.250,00	0,67%
29/10/2023 AL 05/11/2023	$ 145.186.491,33	$ 281.089.600,17	1,28%	$ 98.276.735,00	$ 176.703.985,00	0,87%
06/11/2023 AL 12/11/2023	$ 134.838.304,46	$ 415.927.904,63	1,19%	$ 87.340.257,00	$ 264.044.242,00	0,77%
13/11/2023 AL 19/11/2023	$ 290.143.265,08	$ 706.071.169,71	2,57%	$ 35.206.424,00	$ 299.250.666,00	0,31%
20/11/2023 AL 26/11/2023	$ 333.699.741,00	$ 1.039.770.910,71	2,95%	$ 401.128.675,00	$ 700.379.341,00	3,55%
27/11/2023 AL 03/12/2023	$ 308.543.629,10	$ 1.348.314.539,81	2,73%	$ 509.505.795,00	$ 1.209.885.136,00	4,51%
04/12/2023 AL 10/12/2024	$ 276.787.252,93	$ 1.625.101.792,74	2,45%	$ 163.139.948,00	$ 1.373.025.084,00	1,44%
11/12/2023 AL 17/12/2023	$ 191.523.484,41	$ 1.816.625.277,14	1,69%	$ 155.131.976,00	$ 1.528.157.060,00	1,37%
18/12/2023 AL 24/12/2023	$ 95.626.513,06	$ 1.912.251.790,20	0,85%	$ -	$ 1.528.157.060,00	0,00%
25/12/2023 AL 31/12/2023	$ 156.194.832,36	$ 2.068.446.622,56	1,38%	$ 13.421.082,00	$ 1.541.578.142,00	0,12%
01/01/2023 AL 07/01/2023	$ 181.156.860,90	$ 2.249.603.483,46	1,60%	$ 4.514.620,00	$ 1.546.092.762,00	0,04%
08/01/2024 AL 14/01/2024	$ 224.130.448,47	$ 2.473.733.931,92	1,98%	$ 4.514.364,00	$ 1.550.607.126,00	0,04%
15/01/2024 AL 21/01/2024	$ 306.858.086,76	$ 2.780.592.018,69	2,72%	$ 14.323.839,00	$ 1.564.930.965,00	0,13%
22/01/2024 AL 28/01/2024	$ 326.384.596,22	$ 3.106.976.614,91	2,89%	$ 14.323.839,00	$ 1.579.254.804,00	0,13%
29/01/2024 AL 04/02/2024	$ 452.569.778,93	$ 3.559.546.393,84	4,00%	$ 27.745.177,00	$ 1.606.999.981,00	0,25%
05/02/2024 AL 11/02/2024	$ 458.274.928,48	$ 4.017.821.322,32	4,05%	$ 14.324.095,00	$ 1.621.324.076,00	0,13%
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO			35,55%	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		14,35%

TABLA VALORES ACUMULADOS

	COSTO DIRECTO	COSTO TOTAL	(%) PORCENTAJE
PROGRAMADO	$ 4.017.821.322,32	$ 4.017.821.322,32	35,55%
EJECUTADO	$ 1.621.324.076,00	$ 1.621.324.076,00	14,35%

PORCENTAJE CONTRACTUAL EJECUTADO COSTO DIRECTO



	VALORES COSTO DIRECTO	PORCENTAJES
VR. TOTAL DE OBRA	$ 11.302.197.879,00	100,00%
VR. TOTAL EJECUTADO DE OBRA	$ 1.621.324.076,00	14,35%



Actualmente se presenta un avance de obra de un 14,35%



PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
35,55%	14,35%	-21,20%

ACTUALMENTE SE PRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE 21,20%

ATRASO PRESUPUESTO :	-$ 2.396.497.246,32	ATRASO EN DIAS:	- 45,16	PORCENTAJE DE OBRA:	14,35%

VR. PROGRAMADO VS VR. EJECUTADO (COSTO DIRECTO)



VALOR TOTAL	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO
$ 11.302.197.879,00	$ 4.017.821.322,32	$ 1.621.324.076,00

ACTUALMENTE SE PRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE $2.396.497.246,32

CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD	VALOR	PORCENTAJE DE AVANCE ITEM SEMANAL	
				ESTADO DE ACTIVIDAD	
				CULMINADA	EJECUCION
PRELIMINAR					
Localización y Replanteo Con Equipos de Precisión	1007,15	M2	$ 3.525.025,00		X
Demolición Placa Piso E= 0.10 M	141,65	M2	$ 3.808.260,00		X
EXPLANACION Y EXCAVACIONES					
Excavaciones Varias a Maquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)	272,44	M3	$ 6.990.810,00		X
		TOTAL	$ 14.324.095,00		

1655

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

SEÑALIZACIÓN (TIPO)	CANTIDAD	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	SI	NO
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS		CASCOS	X	
SENDERO PEATONAL		BOTAS	X	
PROHIBIDO FUMAR		GUANTES	X	
LUGAR EN ORDEN Y ASEO		GAFAS	X	
REGLAS DE SEGURIDAD	1 UN	TAPABOCAS	X	
UBICACIÓN DE LA CAMILLA				

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL








OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

PARA ESTA SEMANA EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ES DE 15,39% CON RESPECTO A UN PORCENTAJE PROGRAMADO DE 35,55%. POR TAL RAZON LA OBRA PRESENTA UN ATRASO DEL 20,16%.

CONTINUA DEMOLICIÓN DE PISO EN ANDENES EXISTENTES Y CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN.

SE LLEVO A CABO COMITÉ CON ACUAGYR SAS ESP CON EL PRÓPOSITO DE PROFUNDIZAR LA RED DE ACUEDUCTO RENOVADA EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN A QUE LA PROFUNDIDAD NO CORRESPONDIA CON LA NORMA Y PODRÍA GENERAR COMPLICACIONES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE LA VÍA Y AFECTACIÓN A LA RED.

SE LLEVO A CABO VISITA DE INSPECCIÓN CON LA EMPRESA ETB EN RELACIÓN A LA AFECTACIÓN DE LA DUCTERÍA DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES UBICADA EN EL CARRIL IZQUIERDO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL TRAMO 1 A PARTIR DE LA CAMARA 1 A LA CAMARA 5, CON EL FIN DE ANALIZAR LAS AFECTACIONES CAUSADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE LA RED PLUVIAL Y LAS CONDICIONES DE INESTABILIDAD DEL TERRENO QUE GENERARON EN GRAN MEDIDA EL DESPRENDIMIENTO DE LOS DUCTOS EXISTENTES.

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION

ING. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
CONTRATISTA
INTERVENTORIA

1656

Ricaurte

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Paola Rodriguez Alcalá

INTERVENTORIA

REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA

El presente informe corresponde:	12 DE FEBRERO DEL 2024	AL	18 DE FEBRERO DE 2024	INFORME No:	18

CONTRATO:	Contrato No.403 de 2023	VALOR:	$ 11.302.197.879,00	PLAZO INCIAL:	SIETE (07) MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO DIAGONAL RC	NIT:	901.746.184-7	PLAZO FINAL:	SIETE (07) MESES
OBJETO:	PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA			FECHA DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
SUPERVISOR:	HECTOR DANIEL MORALES DEVIA				

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	17/10/2023	SIETE (07) MESES	$ 11.302.197.879,00	
BALANCE DE MAYORES Y MENORES No.01	17/11/2023		$ 11.302.197.879,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO DIAGONAL RC	OBJETO:	PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA
REP. LEGAL:	LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO		
CONTRATO No:	Contrato No.403 de 2023	FECHA DEL CONTRATO	31 DE AGOSTO DEL 2023
VALOR COSTO DIRECTO:	$ 11.302.197.879,00	CONVENIO	
VALOR ADICIONAL:			
VALOR TOTAL:	$ 11.302.197.879,00	FECHA ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
EJECUTADO:			
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES	FECHA ACTUAL DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
PLAZO ADICIONAL 1:		ACTA MODIFICATORIA N°1	
TOTAL PLAZO:	SIETE (07) MESES	ACTA ADICIONAL N°1	
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	PRORROGA N°1	PRORROGA N°2
		REINICIO N°1	
Recurso Humano/Equipo/Materiales	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	SEÑALIZACION	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO,	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:


ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	17/10/2023	SIETE 807) MESES	$ 626.317.157,00	

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA:	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ	OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"
REP. LEGAL:	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ		
CONTRATO No:	413-2023	FECHA DE CONTRATO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR INCIAL :	$ 626.317.157,00	CONVENIO	
VALOR ADICIONAL:			
VALOR TOTAL:	$ 626.317.157,00	FECHA ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
EJECUTADO:	$ -		
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES	FECHA ACTUAL DE TERMINACION	16 DE MAYO DE 2024
PLAZO ADICIONAL 1:		ACTA ADICIONAL N°2	
TOTAL PLAZO:	SIETE (07) MESES	SUSPENSIÓN N°1	
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	PRORROGA N°1	PRORROGA No-02
		REINICIO N°1	
Recurso Humano/Equipo/Materiales	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	SEÑALIZACION	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____
PAGO SITEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____	CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL	CUMPLE___X___ NO CUMPLE_____

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA

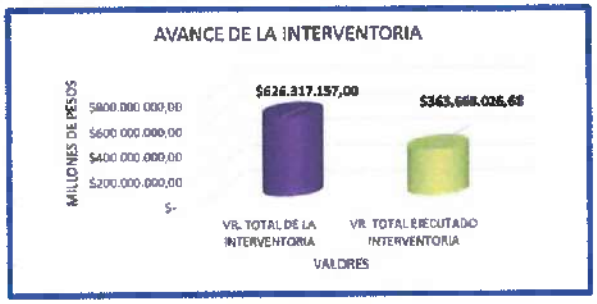

	VALORES	PORCENTAJES
VR. TOTAL DE LA INTERVENTORIA	$ 626.317.157,00	100,00%
VR. TOTAL EJECUTADO INTERVENTORIA	$ 363.668.026,68	58,06%



VALORES EJECUTADOS POR LA INTERVENTORIA

SEMANA	VR. EJECUTADO	PERIODO DE EJECUCION	% EJECUTADO
1	$ 20.203.779,26	17/10/2023 AL 22/10/2023	3,23%
2	$ 20.203.779,26	23/10/2023 AL 29/10/2023	3,23%
3	$ 20.203.779,26	29/10/2023 AL 05/11/2023	3,23%
4	$ 20.203.779,26	06/11/2023 AL 12/11/2023	3,23%
5	$ 20.203.779,26	13/11/2023 AL 19/11/2023	3,23%
6	$ 20.203.779,26	20/11/2023 AL 26/11/2023	3,23%
7	$ 20.203.779,26	27/11/2023 AL 03/12/2023	3,23%
8	$ 20.203.779,26	04/12/2023 AL 10/12/2023	3,23%
9	$ 20.203.779,26	11/12/2023 AL 17/12/2023	3,23%
10	$ 20.203.779,26	18/12/2023 AL 24/12/2023	3,23%

11	$ 20.203.779,26	25/12/2023 AL 31/12/2023	3,23%	
12	$ 20.203.779,26	01/01/2024 AL 07/01/2024	3,23%	
13	$ 20.203.779,26	08/01/2024 AL 14/01/2024	3,23%	
14	$ 20.203.779,26	15/01/2024 AL 21/01/2024	3,23%	
15	$ 20.203.779,26	22/01/2024 AL 28/01/2024	3,23%	
16	$ 20.203.779,26	29/01/2024 AL 04/02/2024	3,23%	
17	$ 20.203.779,26	05/02/2024 AL 11/02/2024	3,23%	
18	$ 20.203.779,26	12/02/2024 AL 18/02/2024	3,23%	
TOTAL ACUMULADO	$	363.668.026,68	58,06%	$ 363.668.026,68

INFORMACION SEMANAL DEL CONTRATO DE OBRA, AVANCES EN % PROGRAMADA VS EJECUTADA

CONSORCIO DIAGONAL RC	Programado			Avance Real EJECUTADO		
MES: FEBRERO	Programado Semanal	Programado Acumulado	(%)	Avance Ejecutado Semanal	Avance Real Acumulado	(%)
17/10/2023 AL 22/10/2023	$ 8.438.276,67	$ 8.438.276,67	0,07%	$ 2.252.208,00	$ 2.252.208,00	0,02%
23/10/2023 AL 29/10/2023	$ 127.464.832,17	$ 135.903.108,83	1,13%	$ 76.175.042,00	$ 78.427.250,00	0,67%
29/10/2023 AL 05/11/2023	$ 145.186.491,33	$ 281.089.600,17	1,28%	$ 98.276.735,00	$ 176.703.985,00	0,87%
06/11/2023 AL 12/11/2023	$ 134.838.304,46	$ 415.927.904,63	1,19%	$ 87.340.257,00	$ 264.044.242,00	0,77%
13/11/2023 AL 19/11/2023	$ 290.143.265,08	$ 706.071.169,71	2,57%	$ 35.206.424,00	$ 299.250.666,00	0,31%
20/11/2023 AL 26/11/2023	$ 333.699.741,00	$ 1.039.770.910,71	2,95%	$ 401.128.675,00	$ 700.379.341,00	3,55%
27/11/2023 AL 03/12/2023	$ 308.543.629,10	$ 1.348.314.539,81	2,73%	$ 509.505.795,00	$ 1.209.885.136,00	4,51%
04/12/2023 AL 10/12/2024	$ 276.787.252,93	$ 1.625.101.792,74	2,45%	$ 163.139.948,00	$ 1.373.025.084,00	1,44%
11/12/2023 AL 17/12/2023	$ 191.523.484,41	$ 1.816.625.277,14	1,69%	$ 155.131.976,00	$ 1.528.157.060,00	1,37%
18/12/2023 AL 24/12/2023	$ 95.626.513,06	$ 1.912.251.790,20	0,85%	$ -	$ 1.528.157.060,00	0,00%
25/12/2023 AL 31/12/2023	$ 156.194.832,36	$ 2.068.446.622,56	1,38%	$ 13.421.082,00	$ 1.541.578.142,00	0,12%
01/01/2023 AL 07/01/2023	$ 181.156.860,90	$ 2.249.603.483,46	1,60%	$ 4.514.620,00	$ 1.546.092.762,00	0,04%
08/01/2024 AL 14/01/2024	$ 224.130.448,47	$ 2.473.733.931,92	1,98%	$ 4.514.364,00	$ 1.550.607.126,00	0,04%
15/01/2024 AL 21/01/2024	$ 306.858.086,76	$ 2.780.592.018,69	2,72%	$ 14.323.839,00	$ 1.564.930.965,00	0,13%
22/01/2024 AL 28/01/2024	$ 326.384.596,22	$ 3.106.976.614,91	2,89%	$ 14.323.839,00	$ 1.579.254.804,00	0,13%
29/01/2024 AL 04/02/2024	$ 452.569.778,93	$ 3.559.546.393,84	4,00%	$ 27.745.177,00	$ 1.606.999.981,00	0,25%
05/02/2024 AL 11/02/2024	$ 458.274.928,48	$ 4.017.821.322,32	4,05%	$ 14.324.095,00	$ 1.621.324.076,00	0,13%
12/02/2024 AL 18/02/2024	$ 366.393.727,63	$ 4.384.215.049,96	3,24%	$ 35.407.243,00	$ 1.656.731.319,00	0,31%
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO			38,79%	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		14,66%

TABLA VALORES ACUMULADOS

	COSTO DIRECTO	COSTO TOTAL	(%) PORCENTAJE
PROGRAMADO	$ 4.384.215.049,96	$ 4.384.215.049,96	38,79%
EJECUTADO	$ 1.656.731.319,00	$ 1.656.731.319,00	14,66%

PORCENTAJE CONTRACTUAL EJECUTADO COSTO DIRECTO



	VALORES COSTO DIRECTO	PORCENTAJES
VR. TOTAL DE OBRA	$ 11.302.197.879,00	100,00%
VR. TOTAL EJECUTADO DE OBRA	$ 1.656.731.319,00	14,66%



Actualmente se presenta un avance de obra de un 14,66%



PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
38,79%	14,66%	-24,13%

ACTUALMENTE SE PRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE 24,13%

ATRASO PRESUPUESTO :	-$ 2.727.483.730,96	ATRASO EN DIAS:	- 51,40	PORCENTAJE DE OBRA:	14,66%

VR. PROGRAMADO VS VR. EJECUTADO (COSTO DIRECTO)



VALOR TOTAL	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO
$ 11.302.197.879,00	$ 4.384.215.049,96	$ 1.656.731.319,00

ACTUALMENTE SE PRESENTA UN ATRASO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE $2.272.483.730,96

CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD	VALOR	PORCENTAJE DE AVANCE ITEM SEMANAL ESTADO DE ACTIVIDAD CULMINADA	EJECUCION
PRELIMINAR					
Localización y Replanteo Con Equipos de Precisión	1007,15	M2	$ 3.525.025,00		X
Demolición Placa Piso E= 0.10 M	141,65	M2	$ 3.808.260,00		X
EXPLANACION Y EXCAVACIONES					
Excavaciones Varias a Maquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)	272,44	M3	$ 6.990.810,00		X

PAISAJISMO					
Apeo de Árboles (Tala, Remoción y Transporte de Material Descartado, De 3 a 12 mts de altura)	12,00	UND	$ 21.083.148,00		X
		TOTAL	$ 35.407.243,00		

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

SEÑALIZACIÓN (TIPO)	CANTIDAD	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	SI	NO
ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS		CASCOS	X	
SENDERO PEATONAL		BOTAS	X	
PROHIBIDO FUMAR		GUANTES	X	
LUGAR EN ORDEN Y ASEO		GAFAS	X	
REGLAS DE SEGURIDAD	1 UN	TAPABOCAS	X	
UBICACIÓN DE LA CAMILLA				

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL








OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

PARA ESTA SEMANA EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ES DE 14,66% CON RESPECTO A UN PORCENTAJE PROGRAMADO DE 38,79%. POR TAL RAZON LA OBRA PRESENTA UN ATRASO DEL 24,13%.

CONTINUA DEMOLICIÓN DE PISO EN ANDENES EXISTENTES, SE REALIZA EXCAVACIÓN MECANICA PARA PROFUNDIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y ACUAGYR SAS ESP, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE APEO DE ESPECIES ARBOREAS.

SE LLEVO A CABO SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD EN ATENCIÓN AL AJUSTE AL DISEÑO DEL PROYECTO ESTABLECIDO POR LA SUPERVISIÓN MUNICIPAL EN ATENCIÓN A SOLICITUDES E INCONFORMIDAD DE LA COMUNIDAD Y COMERCIANTES DEL SECTOR.

SE DESARROLLAN ACTIVIDADES SIN NOVEDADES, NI INCIDENTES LABORALES, SE CUENTA CON CONDICIONES CLIMATICAS FAVORABLES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION

ING. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
CONTRATISTA
INTERVENTORIA

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

7.3 REGISTRO FOTOGRAFICO

Paola Rodriguez Alcalá	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA** **No. 413-2023** **REGISTRO FOTOGRÀFICO**	INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 403 DE 2023

" PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA".

FECHA: 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2024



Foto 1. Demolición de placa piso



Foto 2. Localización y replanteo con elementos de precisión.

Paola Rodríguez Alcalá	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 413-2023 REGISTRO FOTOGRÀFICO	INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 403 DE 2023

" PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA".

FECHA: 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2024



Foto 3. **Demolición de placa piso.**



Foto **4. Demolición de placa de piso.**

Paola Rodriguez Alcalá	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 413-2023 REGISTRO FOTOGRÀFICO**	INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 403 DE 2023
" PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA".

FECHA: 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2024



Foto 5. Excavaciones varias a maquina sin clasificar.



Foto 6. Demolición de placa de piso.

Paola Rodriguez Alcalá	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 413-2023 REGISTRO FOTOGRÀFICO**	INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 403 DE 2023

" PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA".

FECHA: 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2024



Foto 7. Excavacaciones varias a mequina sin clasificar.



Foto 8. Excavaciones varias a maquina sin clasificar.

Paola Rodríguez Alcalá	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 413-2023 REGISTRO FOTOGRÀFICO**	INTERVENTORIA DIAGONAL SEPTIMA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 403 DE 2023
" PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA".

FECHA: 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2024



Foto 9. Demolición de placa piso.



Foto 10. Socialización de ajuste al diseño con la comunidad y comerciantes del sector de influencia.

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

7.4 ESTADO DEL CLIMA

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

Paola Rodriguez Alcala

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 10 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA"

INTERVENTORIA

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA RICAURTE

SUPERVISOR: ING. HECTOR DANIEL ROBLES DEVIA

PERIODO:

CONTRATO No: No. 413 de 2023

CONTRATISTA: PAOLA RODRIGUEZ ALCALA

PROYECTO: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 10 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA"

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DIA	7:00 a 8:00	8:00 a 9:00	9:00 a 10:00	10:00 a 11:00	11:00 a 12:00	13:00 a 14:00	14:00 a 15:00	15:00 a 16:00	16:00 a 17:00
17	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X	X	X	X	X

SOLEADO	X
NUBLADO	O
LLUVIOSO	*
DIAS NO LABORADOS	X

PAOLA A. RODRIGUEZ ALCALA

INTERVENTORIA

1666

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

7.5 CONTROL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
DEPARTAMENTO DEL CUNDINAMARCA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA"

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA

FECHA: 16 FEBRERO 2024

ENTIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE RICAURTE CUNDINAMARCA

SUPERVISOR: HECTOR DANIEL MORALES DEVIA

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES: 4

CONTRATO No.: 413 DE 2023

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO DIAGONAL RC

DIA	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MAQUINA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI
RETRO EXCAVADORA ORUGA	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
VOLQUETA 1	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
VOLQUETA 2	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
VIBRADOR DE CONCRETO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MEZCLADOR DE CONCRETO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MOTONIVELADORA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VIBRO COMPACTADOR	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
CARROTANQUE	I	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	A	I

CONVENCIONES
ACTIVO = A
REPARACION = R
INACTIVO = I
NO APLICA. NA

Paola A. Rodriguez A.
INTERVENTORÍA No. 413-2023
PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
REPRESENTANTE LEGAL

1668

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

7.6 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO Y SOPORTES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

INFORME DE INTERVENTORIA No. 04
SEGUIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Contrato de Obra No. 403 de 2023 - pavimentación y embellecimiento de la diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte – Cundinamarca.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 413 DE 2023

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCERA Y AMBIENTAL PARA "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA

PERIODO DE 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2024
RICAURTE – CÚNDINAMARCA

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

1. INTRODUCCIÓN

Desde la interventoría de Seguridad y Salud en el Trabajo y bajo los parámetros establecidos de la normatividad vigente, se pretende garantizar que los trabajadores realicen sus labores diarias en condiciones óptimas y seguras con el fin de prevenir incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y así garantizar el buen desarrollo y cumplimiento del proyecto.

2. OBJETIVO

Por medio de esta interventoría dar a conocer la gestión realizada en la Diagonal 7, en Seguridad y Salud en el Trabajo, en el desarrollo de las actividades laborales que tiene por objeto **"PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

2.1. OBJETIVOS GENERALES

- Seguimiento oportuno de todas las actividades realizadas en la obra para que se efectúen de manera segura, cumpliendo todas las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Continuo seguimiento de los hallazgos encontrados y recomendaciones realizadas.
- Mejora continua de las condiciones de trabajo y del buen ambiente laboral.
- Seguimiento al PGIO SST – (lista de verificación).

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y del Transporte
Universidad de los Andes

➢ **Personal del Subcontratista**

ITEM	NOMBRE	CARGO
1	JOSE ALEXANDER PULIDO	CONTRATISTA
2	ANDRESITO GUTIERREZ	OFICIAL DE OBRA
3	JHON ANTONIO RODRIGUEZ	MAESTRO DE OBRA
4	JHON SAAVEDRA	OP. RETROEXCAVADORA
5	FELIX ANDRES GUERRA	AUX OBRA
6	JOSE EDWIN ARIAS	OP. MNICARGADOR
7	ADELMO CELIS CAMPO	AUX OBRA
8	JOSE ROLANDO BARRIOS	OFICIAL DE OBRA
9	VALENTINA GUZMAN	TOPOGRAFO
10	RAFAEL BLADIMIRO	AUX OBRA
11	ALEXANDER GARCIA	CONDUCTOR DE VOLQUETA
13	JHON JAIRO LOZANO RUIZ	CONDUCTOR DE VOLQUETA
14	FABIAN GARCIA CARVAJAL	CONDUCTOR DE VOLQUETA
15	JAIRO ALBERTO GARCIA	CONDUCTOR DE VOLQUETA
16	IMANOL SMITH GONGORA	AUX OBRA
17	JAIDER JHOAN GONGORA	AUX OBRA

3. PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA.

➢ Durante el periodo se evidencia el siguiente personal Administrativo.

ITEM	NOMBRE	CARGO
1	AITOR MIRENA LARRAURI ECHEVARRIA	DIRECTOR DE OBRA
2	CARLOS ANDRES NIETO LAGUNA	ASESOR DE PAVIMENTOS
3	MAURICIO ALEJANDRO ESPINISA ALEMAN	RESIDENTE DE OBRA
4	JORGE EDWIN FABER SANCHEZ MARROQUIN	ASESOR SISO
5	OSCAR RODRIGUEZ VASQUEZ	TÉCNICO EN TOPOGRAFIA
6	ROSA INES PULECIO GUZMÁN	TRABAJADORA SOCIAL
7	ALVARO ANGEL BALLESTAS ROBINSON	PROFESIONAL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

➢ **Personal Operativo de obra del consorcio.**

ITEM	NOMBRE	CARGO
1	YENIT YANETH QUINTERO SALGUERO	AUXILAR TRABAJADORA SOCIAL
2	SEBASTIAN RAMIREZ AVILA	ING AUXILIAR RESIDENTE
3	YULI NATALIA RODRIGUEZ SANTOS	AUXIIAR. INSP. SST
4	ANDRES ALFONSO AMAYA RODRIGUEZ	AUX DE OBRA
5	JOSE EDISON BUSTOS PRADA	AUX TOPOGRAFO

Paola Rodríguez Alcalá
Tapias Civil
Especialista en Interventoría Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

4. ACTIVIDADES DEL PROYECTO REALIZADAS EN EL PERIODO





Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

5. ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA

En el cual para esta asesoría se realizó una verificación de los siguientes aspectos:

- La señalización reglamentaria e informativa en toda la obra con el objetivo orientar a los peatones, residentes y transeúntes de sector.
- Mantenimiento diario de la señalización.
- Atención, orientación a las inquietudes y dudas que a diario surjan, en las diferentes actividades en el proyecto.
- Se valida la planilla de la Seguridad social del personal del contratista y subcontratista, encontrándose al día, la cual reposa en los informes del contrato de obra.
- Observaciones sobre los avances del PGIO SST, por medio de una lista de verificación.

6. CONCLUSIONES

6.1. Positivos:

- El personal cuenta con sus respectivos elementos de protección personal (EPP).
- Se cumple con las diferentes inspecciones y charlas de SST.
- En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo (A.T) ni enfermedades laborales (E.L)
- Se garantizan señalizaciones de advertencia e informativas en la obra.
- El contratista de obra garantizo un espacio para realizar las actividades de oficina para el personal administrativo y personal operativo el cual cuenta con todos los servicios públicos.

6.2. Negativos

- No se cuenta con puntos ecológico, se recomida tener 1 en el área administrativa, y 2 en la zona de intervención de la obra.
- Falta de personal (ayudante de tráfico).
- Continúan pendientes algunos adjuntos de los ítems mencionados dentro del PGIO.

Desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta interventoría, se recomienda adjuntar los ítems que se encuentran pendientes por realizar para el avance y cumplimento del PGIO SST.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SST

SEÑALIZACION VIA Y CERRAMIENTO



DE LA VIA DE INTERVENCIÓN



SENDERO PEATONAL





Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA


SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE VIA CERRDA



CAPACITACIÓN AL PERSONAL



RIEGO EN LA VIA

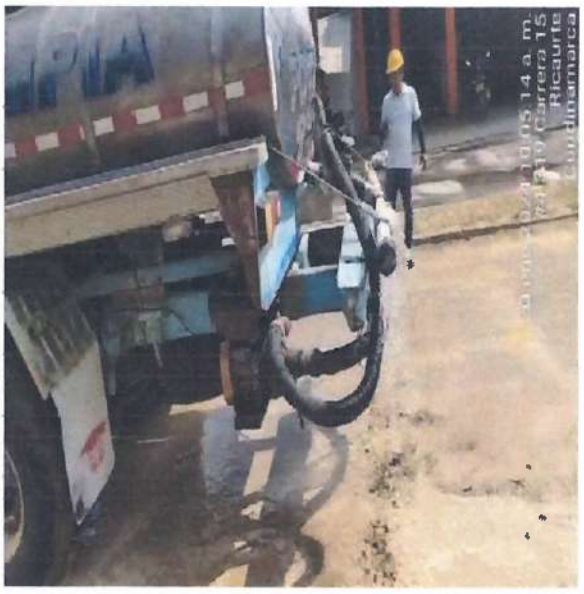

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

OFICINAS ADMINISTRATIVAS





UNIDAD SANITARIA



PUNTO DE HIDRATACIÓN



Anexo: Soporte de pago de las Planillas de Seguridad Social del mes correspondiente.

Atentamente.

Dennis Barrero
Profesional en Seguridad y Salud Ocupacional
Lic. SO. Res. No. 7624 de 01-07-2016

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93118240		DELARRAURI ECHEVARRIA AITOR MIRENA	INDEPENDIENTE	PRINCIEAL	CALLE 7 854	ESPINAL-TOLIMA	2390025	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	447132882	9462087217	I	2024/02/09	2024/02/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$778,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$778,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$778,400
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$0	$0			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$778,400
1	CC	93118240	DE LARRAURI AITOR		0	$0	$0	EPS037	30	$4,000,000	$500,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	0	$0	$0	No	$778,400
Total Afiliados(1)						$0	$0			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$778,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93118240		DELARRAURI ECHEVARRIA AITOR MIRENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 7 854	ESPINAL-TOLIMA	2390025	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	447132882	9462087217	I	2024/02/09	2024/02/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$778,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$278,400	$0	$0	$278,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$278,400	$0	$0	$278,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$500,000	$0	$0	$500,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$500,000	$0	$0	$500,000
TOTAL				1	$778,400	$0	$0	$778,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93118240		DELARRAURI ECHEVARRIA AITOR MIRENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 7 854	ESPINAL-TOLIMA	2390025	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	390067213	9461531765	I	2024/01/11	2024/01/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	$778,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct ti vio	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aportes	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$778,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$778,400
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$0	$0			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$778,400
1	CC 93118240	DE LARRAURI AITOR		0		$0	$0	EPS037	30	$4,000,000	$500,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	0	$0	$0	NO	$778,400
Total Afiliados(1)						$0	$0			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$778,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93118240		DELARRAURI ECHEVARRIA AITOR MIRENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 7 854	ESPINAL-TOLIMA	2390025	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	390067213	9461531765	I	2024/01/11	2024/01/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	$778,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$278,400	$0	$0	$278,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$278,400	$0	$0	$278,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$500,000	$0	$0	$500,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$500,000	$0	$0	$500,000
TOTAL				1	$778,400	$0	$0	$778,400

2024/01/11 10:53 AM

1680

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9271564		ESPINOSA ALEMAN MAURICIO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 5 sur # 88-30 T4 A201 CONJUNTO IWOKA	IBAGUE-TOLIMA	2654094	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	450137498	9461766929	I	2024/02/15	2024/02/12	BANCOLOMBIA	0	$285,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$285,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$285,000
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$285,000
1	CC	9271566	ESPINOSA MAURICIO	X	25-14	15	$1,000,000	$160,000	EPS005	15	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$285,000
Total	Afiliados(1)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$285,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9271566		ESPINOSA ALEMAN MAURICIO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 5 sur # 88-30 T4 A201 CONJUNTO IWOKA	IBAGUE-TOLIMA	2654094	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	450137498	9461766929	I	2024/02/15	2024/02/12	BANCOLOMBIA	0	$285,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$285,000	$0	$0	$285,000

1681

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11226691	CARLOS ANDRES NIETO LAGUNA	CARRERA 9A N 32-113	3175262303	edyvonni@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	GIRARDOT		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	13/02/2024	74748146	9451.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Nueva EPS	900156264-2	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Porvenir)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	830011153-6	90.500				90.500	0	0	90.500			905	90.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ADE, Lma, INT y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	90.500	90.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	461.000	461.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11229681	CARLOS ANDRES NIETO LAGUNA	CARRERA 9A N 32-111	3175252303	sdycons1@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 – Independiente			CUNDINAMARCA	GIRARDOT	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AAAA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	1	13/02/2024	74748146	$451.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Categoría	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días cotizados	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor Aporte Afiliado	Tarifa Aporte Empleador	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11229681	NIETO LAGUNA CARLOS ANDRES	M	0		11															30	230230	1.300.000	308.000	16	0	0	FRA067	1.300.000	152.880	14-28	1.309.000	5	80.658		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	93125735	OSCAR RODRIGUEZ VASQUEZ	CALLE 7 854	2390025	macson6@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	ESPINAL		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	13/02/2024	Y4748543	$372.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	162.500	0		0		0	5	800	0	163.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	5	1.000	0	209.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	163.300
Pensión	1	208.000	209.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	370.500	372.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	93125735	OSCAR RODRIGUEZ VASQUEZ	CALLE 7 B54	2390025	rascorito@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	ESPINAL	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	13/02/2024	74748643	$372.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Dias cotizados	Horas laboradas	Salario Integral	Tipo cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Cod. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor Bono o Aporte	Valor Interés Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	93125735	RODRIGUEZ VASQUEZ OSCAR	3	0		N																230301	1.300.000	306.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	192.900		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de información

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-02-08, 08:23:26 AM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1061214648

Periodo Cotización: enero de 2024 | Periodo Servicio: enero de 2024 | Referencia pago (PIN): 8810328035

PAGADO 08/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YENIT YANETH QUINTERO SALGUERO		
Documento	CC1069174262	**Dirección**	MANZANA E CASA 10 B/VILLA CAROLINA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3144110756
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RICAURTE	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días APO	Ing	Ret	Días COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1069174262	YENIT YANETH QUINTERO SALGUERO	03	00								0			30	(RESOL) PORVENIR	$ 966.667	$ 97.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 966.667	$ 79.000	0,000	$ 0	$ 0	(CCF50) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Ajustes a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 966.667	$ 966.667	$ 0	$ 0	$ 97.100	$ 79.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.000	$ 0	$ 176.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4449634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5148888 - Bucaramanga: 607 6438800 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1686

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1069179194		RAMIREZ AVILA SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 16 N 5 - 49 CENTRO RICAURTE	RICAURTE-CUNDINAMARCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	410858740	9461845508	I	2024/02/22	2024/01/22	NEQUI	0	$477,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,540,000	$246,400			$1,540,000	$192,500			$1,540,000	$30,800			$1,540,000	$8,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,540,000	$246,400			$1,540,000	$192,500			$1,540,000	$30,800			$1,540,000	$8,100		$0	$0
Ciudad: RICAURTE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,540,000	$246,400			$1,540,000	$192,500			$1,540,000	$30,800			$1,540,000	$8,100		$0	$0
1	CC 1069179194	RAMIREZ SEBASTIAN	230301	30	$1,540,000	$246,400	EPS002	30	$1,540,000	$192,500	CCF22	30	$1,540,000	$30,800	14-23	30	$1,540,000	$8,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,540,000	$246,400			$1,540,000	$192,500			$1,540,000	$30,800			$1,540,000	$8,100		$0	$0

2024/01/22 03:49 PM

1693

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013972194		RAMIREZ AVILA SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 16 N 5 - 49 CENTRO RICAURTE	RICAURTE-CUNDINAMARCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Plan Mora	Valor
2024-01	2024-01	410858743	9461845508	I	2024/02/22	2024/01/22	NEQUI	0	$477,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$246,400	$0	$0	$246,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$246,400	$0	$0	$246,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,100	$0	$0	$8,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,100	$0	$0	$8,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,800	$0	$0	$30,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$30,800	$0	$0	$30,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,500	$0	$0	$192,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$192,500	$0	$0	$192,500
TOTAL				1	$477,800	$0	$0	$477,800

2024/01/22 03:49 PM

1688

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-02-07, 03:28:37 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1061163378

Periodo Cotización: enero de 2024 | Periodo Servicio: enero de 2024 | Referencia pago (PIN): 8810324136

PAGADO 07/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YULI NATALIA RODRIGUEZ SANTOS	Dirección	CL 0 #0 - 0 SAN MIGUEL
Documento	CC1070620389	Teléfono	3214734574
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	GIRARDOT	Identificación	
Representante Legal		ARP	NINGUNA ARP
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																								Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VIP	IRP	Días ARP	Días AFP	Días CCF	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MIN	Total			
CC1070620389	YULI NATALIA RODRIGUEZ SANTOS	23	00	X																0	16	0	0	(25-14) ORDENADOS	$ 650,000	$ 104,000	(25-04) SURA EPS SANITAS	$ 650,000	$ 81,300	0,000	$ 0	$ 0	(000-00) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor ERS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 650,000	$ 650,000	$ 0	$ 0	$ 104,000	$ 81,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,300	$ 0	$ 185,300

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540877 - Medellín: 604 5146869 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6946444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618588 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos

1689

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8851917		BALLESTAS ROBINSON ALVARO ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 65a # 67-12 APTO 303	BUCARAMANGA-SANTANDER	2390025	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	453290189	94618594872	I	2024/02/06	2024/02/13	BANCO DAVIVIENDA	7	$464,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Vsp	Ing	Ige	Rte	Rdp	Sln	Vsp	Cor	Vst	Sln	Lge	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vtp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC	8851917	BALLESTAS ALVARO							X											03-14	30	$1,380,000	$386,000	EPS005	30	$1,380,000	$662,500		0	$0	$0	54-11	30	$1,380,000	$90,300		0	$0	$0	No	$469,800
Total	Afiliados(1)																						$386,000				$662,500				$0				$90,300				$0		$461,900

2024/02/13 04:30 PM

1690

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8851917		BALLESTAS ROBINSON ALVARO ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 65a # 67-12 APTO 303	BUCARAMANGA-SANTANDER	2390025	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	453290189	9481851072	I	2024/02/06	2024/02/13	BANCO DAVIVIENDA	7	$464,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,400	$0	$209,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,400	$0	$209,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$600	$0	$91,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	8	1	$90,500	$600	$0	$91,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,100	$0	$163,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$1,100	$0	$163,600
TOTAL				1	$461,000	$3,100	$0	$464,100

2024/02/13 04:30 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5993413		SANCHEZ MARROQUIN JORGE EDWIN FABER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av 13 #65-152	IBAGUE-TOLIMA	2721981	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	443806846	9461821606	I	2024/02/05	2024/02/08	BANCOLOMBIA	3	$429,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC 5993413	SANCHEZ JORGE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF48	30	$1,300,000	$26,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0

2024/02/07 10:08 PM

1692

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5993413		SANCHEZ MARROQUIN JORGE EDWIN FABER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av 13 #65-152	IBAGUE-TOLIMA	2721981	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	44380684 6	9461821606	I	2024/02/05	2024/02/08	BANCOLOMBIA	3	$429,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$600	$0	$208,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$600	$0	$208,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$100	$0	$31,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$100	$0	$31,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$100	$0	$26,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$26,000	$100	$0	$26,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$500	$0	$163,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$500	$0	$163,000
TOTAL				1	$428,200	$1,300	$0	$429,500

2024/02/07 10:08 PM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65694837		PULECIO GUZMAN ROSA INES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ I-2 CS 16 BRR ARCABAL	ESPINAL-TOLIMA	2488863	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	10214511	9465582515	1	2024/02/09	2024/01/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$429,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$15,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$15,100		$0	$0
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$15,100		$0	$0
1	CC	65694837	PULECIO ROSA	230201	30	$1,440,000	$230,400	EPS008	30	$1,440,000	$180,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,440,000	$15,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$15,100		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65694837		PULECIO GUZMAN ROSA INES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ I-2 CS 16 BRR ARCABAL	ESPINAL-TOLIMA	2488863	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	10214511	9461582515	1	2024/02/09	2024/01/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$425,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,400	$0	$0	$230,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$230,400	$0	$0	$230,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,100	$0	$0	$15,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$15,100	$0	$0	$15,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$180,000	$0	$0	$180,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$180,000	$0	$0	$180,000
TOTAL				1	$425,500	$0	$0	$425,500

2024/01/15 09:37 AM

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-02-08, 04:09:14 AM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1061197871

Periodo Cotización: enero de 2024 | Periodo Servicio: enero de 2024 | Referencia pago (PIN): 8810327617

PAGADO 07/02/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANDRES ALFONSO AMAYA RODRIGUEZ		
Documento	CC1120738206	**Dirección**	CL 0 #0 - 0 VILLA CAROLINA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3144299347
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RICAURTE	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	MinTrab	Aporte Esap/Men	Total
CC 1120738206	ANDRES ALFONSO AMAYA RODRIGUEZ	03	00	X																	0	14	0	0	(23301) POR PAS	$ 606.667	$ 87.100	(EPS030) SALUD TOTAL EPS	$ 606.667	$ 75.900	0.500		$ 0	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FISCAL
$ 606.667	$ 606.667	$ 0	$ 0	$ 87.100	$ 75.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.000	$ 1.100	$ 174.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446614 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1695

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Tipo Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad	Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93132880		BUSTOS PRADA JOSE EDINSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	URB VILLA CATALINA MZ C1 CASA 4	ESPINAL-TOLIMA		2390025	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	08163283	94623288152	I	2024/02/19	2024/02/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	5370.500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	93132880	BUSTOS JOSE	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Tipo de Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93132880		BUSTOS PRADA JOSE EDINSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	URB VILLA CATALINA MZ C1 CASA 4	ESPINAL-TOLIMA	2390225	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	0R163203	94623248152	I	2024/02/19	2024/02/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$370,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$370,500	$0	$0	$370,500

2024/02/05 10:20 AM

1697

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901052421	9	TETCO INGENIERIA SAS	1 - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORSUMINO	MZ 42 CASA 9 BARRIO SANTA ISABEL	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	7896244	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	450254897	9462866636	E	2024/02/06	2024/02/12	BANCOLOMBIA	6	$4,429,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO TOLIMA (16 Afiliados)																						$15,180,009	$2,429,700			$15,180,009	$608,100			$15,022,233	$601,800			$15,180,009		$765,500			$0	$0		$4,405,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																						$2,600,001	$416,100			$2,600,001	$104,100			$2,562,668	$102,600			$2,600,001		$11,800			$0	$0		$634,600
Ciudad: IBAGUÉ Depto: TOLIMA (2 Afiliados)																						$2,600,001	$416,100			$2,600,001	$104,100			$2,562,668	$102,600			$2,600,001		$11,800			$0	$0		$634,600
1	CC	65774779	ACOSTA LIGDA													X					23100 1	8	$346,667	$55,500	EPS002	8	$346,667	$13,900	CCF50	8	$309,334	$12,400	14-23	8	$346,667	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$81,800
2	CC	65774779	ACOSTA LIGDA							X											23100 1	22	$953,334	$152,600	EPS002	22	$953,334	$38,200	CCF50	22	$953,334	$38,200	14-23	22	$953,334	0.522%	$5,000	22	$0	$0	SI	$234,000
3	CC	52477532	PINZON MYRIAN							X											23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF50	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Centro de Trabajo: TARIFA 5 (14 Afiliados)																						$12,580,008	$2,013,600			$12,580,008	$504,000			$12,459,565	$499,200			$12,580,008		$753,700			$0	$0		$3,770,500
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (14 Afiliados)																						$12,580,008	$2,013,600			$12,580,008	$504,000			$12,459,565	$499,200			$12,580,008		$753,700			$0	$0		$3,770,500
4	CC	1110570889	ARIAS JOSE	X																	23020 1	22	$953,334	$152,600	EPS005	22	$953,334	$38,200	CCF50	22	$953,334	$38,200	14-23	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	SI	$295,400
5	CC	1105681850	BARRIOS JOSE	X																	23030 1	13	$520,000	$83,200	EPS002	13	$520,000	$20,800	CCF50	13	$520,000	$20,800	14-23	13	$520,000	6.960%	$36,200	13	$0	$0	SI	$161,000
6	CC	16661962	CASTRILLO CARLOS	X																	25-14	20	$866,667	$138,700	EPS037	20	$866,667	$34,700	CCF50	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	6.960%	$60,400	20	$0	$0	SI	$268,500
7	CC	11319833	GARCIA ALEXANDER												X						25-14	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF50	8	$309,334	$12,400	14-23	8	$346,667	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$81,800
8	CC	11319833	GARCIA ALEXANDER							X											25-14	22	$953,334	$152,600	EPS037	22	$953,334	$38,200	CCF50	22	$953,334	$38,200	14-23	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	SI	$295,400
9	CC	11220056	GARCIA FABIAN	X	X														X		23030 1	18	$650,000	$104,000	EPS017	15	$650,000	$26,000	CCF50	15	$677,083	$27,100	14-23	15	$650,000	6.960%	$45,300	18	$0	$0	SI	$202,400
10	CC	11226605	GARCIA JAIRO	X																	23020 1	5	$216,667	$34,700	EPS002	5	$216,667	$8,700	CCF50	5	$216,667	$8,700	14-23	5	$216,667	6.960%	$15,100	5	$0	$0	SI	$67,300
11	CC	1100691957	GUERRA FELIX												X						23030 1	8	$346,667	$55,500	EPS002	8	$346,667	$13,900	CCF50	8	$309,334	$12,400	14-23	8	$346,667	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$81,800
12	CC	1100691957	GUERRA FELIX							X											23030 1	22	$953,334	$157,600	EPS002	22	$953,334	$38,200	CCF50	22	$953,334	$38,200	14-23	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	SI	$295,400
13	CC	79966304	GUTIERREZ ANDRESITO	X	X														X		23020 1	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF50	1	$45,140	$1,900	14-23	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,800
14	CC	1110459353	LOZANO JHON												X						23030 1	8	$346,667	$55,500	EPS002	8	$346,667	$13,900	CCF50	8	$309,334	$12,400	14-23	8	$346,667	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$81,800
15	CC	1110459353	LOZANO JHON							X											23030 1	22	$953,334	$152,600	EPS002	22	$953,334	$38,200	CCF50	22	$953,334	$38,200	14-23	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	SI	$295,400
16	CC	11105006448	LOZANO RAFAEL	X																	23030 1	11	$476,667	$76,300	CCFC55	11	$476,667	$19,100	CCF50	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	6.960%	$33,200	11	$0	$0	SI	$147,700
17	CC	1110492182	NIETO CINDY												X						23030 1	8	$346,667	$55,500	EPS002	8	$346,667	$13,900	CCF50	8	$309,334	$12,400	14-23	8	$346,667	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$81,800
18	CC	1110492182	NIETO CINDY							X											23030 1	22	$953,334	$152,600	EPS002	22	$953,334	$38,200	CCF50	22	$953,334	$38,200	14-23	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	SI	$295,400
19	CC	11228950	PULIDO JOSE							X											23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF50	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
20	CC	79975231	RODRIGUEZ JHON	X																	23030 1	22	$953,334	$152,600	EPS002	22	$953,334	$38,200	CCF50	22	$953,334	$38,200	14-23	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	SI	$295,400
21	CC	1110513376	SAAVEDRA JHON												X						25-14	8	$373,334	$59,800	EPS037	8	$373,334	$15,000	CCF50	8	$373,334	$15,000	14-23	8	$373,334	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$89,800
22	CC	1110513376	SAAVEDRA JHON																		25-14	22	$1,026,667	$164,300	EPS037	22	$1,026,667	$41,100	CCF50	22	$1,026,667	$41,100	14-23	22	$1,026,667	6.960%	$71,500	22	$0	$0	SI	$318,000
Total Afiliados(16)																						$15,180,009	$2,429,700			$15,180,009	$608,100			$15,022,233	$601,800			$15,180,009		$765,500			$0	$0		$4,405,100

2024/02/12 08:23 AM

1698

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901052421	9	TETCO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	MZ 42 CASA 9 BARRIO SANTA ISABEL	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	7096244	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	458154897	9467866636	E	2024/02/06	2024/02/12	BANCOLOMBIA	6	$4,429,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$2,429,700	$13,300	$0	$2,443,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,100	$1,200	$0	$209,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$570,900	$3,100	$0	$574,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,248,800	$6,800	$0	$1,255,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$402,300	$2,200	$0	$404,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$765,500	$4,200	$0	$769,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	$765,500	$4,200	$0	$769,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$601,800	$3,300	$0	$605,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	16	$601,800	$3,300	$0	$605,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$608,100	$3,600	$0	$611,700
CAJACOPI	CCF055	901,543,211	6	1	$19,100	$200	$0	$19,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$26,000	$200	$0	$26,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$142,900	$800	$0	$143,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$277,900	$1,600	$0	$279,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$142,200	$800	$0	$143,000
TOTAL				16	$4,405,100	$24,400	$0	$4,429,500

2024/02/12 08:23 AM

1699

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

7.7 SOPORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA

ENERO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	28548736	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA		calle 12 no. 2 43	2623355	jack.0307@hotmail.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 9 / IBC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-01	2024-01	Y	29/01/2024	74234665	$935.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Exterior	Extranjero	Cotiza Estudiar	Reconocido	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntaria Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1069176487	CIFUENTES MURILLO DANIELA ALEJANDRA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	5	93.600		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1069178217	MOTTA TAFUR JEILY KATHERINE	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.883.505	5	134.600		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1104699792	GUZMAN SERRANO LUIS FELIPE	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.658.133	5	115.500		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1116558992	QUINTERO ALFEREZ JUAN PABLO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	5	93.500		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	39567522	BARRERO DENNIS HORTENCIA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	5	93.500		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	79855590	MORALES OLIVEROS JORGE FERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	5	93.500		0	0	0	0	0	0	0
7	CC	93395314	DUEÑAS MORALES DAIRO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	5	93.500		0	0	0	0	0	0	0
8	CC	93398631	CARRANZA SANCHEZ FREDY ALEXANDER	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	5	93.500		0	0	0	0	0	0	0
9	CC	9393009	TIBOCHA GRANADOS JOSUE GUILLERMO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	5	93.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

4101

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	28548738	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA		calle 12 no. 2 43	2623355	jack.0307@hotmail.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	Y	29/01/2024	74234855	$935.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	935.800				935.800	0	0	935.800			9.358	935.800	9

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, SP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	935.800	935.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	935.800	935.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1202

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	28548738	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA	calle 12 no. 2 43	2823355	jack.0307@hotmail.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	Y	27/02/2024	74552018	$92.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Solidario	Extranjero	Colombiano residente	Estudiante	IGE	LMA	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	ING	RET	VSP	CORRECCIÓN	Cód. AFP	ISC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	ISC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	ISC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	ISC CCF	Aporte CCF	ISC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1205[illegible]52	VARGAS RAMIREZ FREDY GIOVANI	58	D			N																								0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	6	91.000		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	28548736	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA	calle 13 no. 2 43	2623355	[illegible]0307@hotmail.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	Y	27/02/2024	74552018	$92.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	90.500				90.900	18	1.500	92.000			905	92.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IOE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	90.500	92.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	90.500	92.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1074

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28548736		RODRIGUEZ ALCALA PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 NO 3 11 APT 301 BRR BELEN	IBAGUE-TOLIMA	2732538	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	419453579	9462037131	I	2024/02/09	2024/01/29	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$652,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	28548736	RODRIGUEZ ALCALA PAOLA ANDREA	230201	30	$1,840,000	$294,400	EPS005	30	$1,840,000	$230,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,840,000	$128,100	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$128,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,400	$0	$0	$294,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$294,400	$0	$0	$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,100	$0	$0	$128,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$128,100	$0	$0	$128,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$0	$0	$230,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$230,000	$0	$0	$230,000
TOTAL				1	$652,500	$0	$0	$652,500

2024/01/27 10:29 AM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900497811-4	ANLAGENBAUER SAS	CARRERA 10 3 11	2607438	anlagenbauer@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	TOLIMA	IBAGUÉ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E		74235139	$3.228.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	220.000	0		0		0	0	0	0	220.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	147.300	0		0		0	0	0	0	147.300	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	182.500	0		0		0	0	0	0	182.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	589.000	0	0	0	0	0	0		589.000	2
230301	Porvenir	800224808-5	560.000	0	0	0	0	0	0		560.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	528.000	0	0	0	0	0	0		528.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	537.800				537.800	0	0	537.800			5.375	537.800	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF50	Comfandito	890700148-4	419.300	0	0	419.300	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
26.000	0	0	26.000	1
ICBF				
39.000	0	0	39.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IDE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	529.800	529.800
Pensión	3	1.677.000	1.677.000
Riesgos Laborales	1	537.800	537.800
CCF	1	419.300	419.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	39.000	39.000
MEN	0	0	0
SENA	1	26.000	26.000
TOTALES	10	3.228.700	3.228.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

enero

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900497811-4	ANLAGENBAUER SAS	CARRERA 10 3 11	2607436	anlagenbauer@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	TOLIMA	IBAGUÉ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E		74235138	$3.228.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRP	RET	PEN	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1069178217	MOTTA TAFUR JEILY KATHERINE	1	0			S																									230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	80.909	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF50	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
2	CC	1106682165	VERA DIAZ JURG NICOLAS	1	0			S																									230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.909	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF50	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	52281259	SANCHEZ SANCHEZ MYRIAM ESTELLA	1	0			N																									25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.830	14-11	1.300.000	1	8.800	CCF50	1.308.800	52.000	26.000	39.000	0	0	0
4	CC	1106682538	RAMIREZ SEPULVEDA JONATHAN JAVIER	1	0			S																									230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.909	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF50	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	5839612	DIAZ VARGAS JUAN CAMILO	1	0			S																									25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	158.200	CCF50	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
6	CC	1116682575	PRADO DAZA CRISTIAN FERNANDO	1	0			S																									230201	1.661.034	266.000	0	0	0	0	EPS005	1.661.034	67.300	14-11	1.661.034	1	8.800	CCF50	1.661.034	67.300	0	0	0	0	0

Solo Seg Social
Kathenre

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9399000	JOSUE GUILLERMO TIBOCHA GRANADOS	KR 18 150-30	2570015	joguti@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	1	26/01/2024	74214183	$370.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISE, LMA, FSP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	370.500	370.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9999000	JOSUE GUILLERMO TIBOCHA GRANADOS	KR 16 150-30	2570095	jogutti@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	Si

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	28/01/2024	74214163	$370.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Código ubicación	Pensionado	IGE	LPT	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días At Home	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	9999000	TIBOCHA GRANADOS JOSUE GUILLERMO	3	0		N													25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93385314		DUEÑAS MORALES DAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 53-53 APTO 201 TOSCANA	IBAGUE-TOLIMA	2657037	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	430265390	9462549168	I	2024/02/05	2024/02/01	NEQUI	0	$461,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	93385314	DUEÑAS MORALES DAIRO																		231001	30	EPS017	30		0	14-23	30	0	No
Total	Afiliados(1)																													

2024/02/01 03:21 PM

4410

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93385314		[redacted]	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 53-53 APTO 201 TOSCANA	IBAGUE-TOLIMA	2657037	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	490285390	9462549168	I	2024/02/05	2024/02/01	NEQUI	0	$461,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$0	$0	$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$461,000	$0	$0	$461,000

2024/02/01 03:21 PM

434

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901119307	0	CYPH SAS	S - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 9 74 81 CAMPINA	IBAGUE-TOLIMA	5160213	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	539113193	9464944501	E	2024/02/02	2024/03/27	BANCO DAVIVIENDA	54	$1,306,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)																																
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (4 Afiliados)																																
1	CC	1118823073	BASTIDAS PEÑA MARIA ALEJANDRA																	25-14	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	0.522%	30	SI
2	CC	1110489850	CORDOBA FRANCO DIEGO FERNANDO							X										23030 1	30	EPS005	30	CCF50	30	14-11	30	0.522%	30	SI
3	CC	1110472186	CRUZ CARDONA JOSE IVAN							X										23020 1	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	0.522%	30	SI
4	CC	1110507968	RODRIGUEZ ARANA HENRY JULIAN							X										23020 1	30	EPS005	30	CCF50	30	14-11	30	0.522%	30	SI
Total		Afiliados(4)																														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901119307	0	CYPH SAS	S - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 9 74 81 CAMPINA	IBAGUE-TOLIMA	5160213	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	539113193	9464944501	E	2024/02/02	2024/03/27	BANCO DAVIVIENDA	54	$1,306,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$832,000	$39,600	$0	$871,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$9,900	$0	$217,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$9,900	$0	$217,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$19,800	$0	$435,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$27,200	$1,300	$0	$28,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$27,200	$1,300	$0	$28,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$180,000	$8,600	$0	$188,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	4	$180,000	$8,600	$0	$188,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$208,000	$10,000	$0	$218,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$5,000	$0	$109,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$5,000	$0	$109,000
TOTAL				4	$1,247,200	$59,500	$0	$1,306,700

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	28546736-0	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA	cr3 no 11-24	2607459	paolaandreamartinezalcala@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 - Independiente			TOLIMA	IBAGUE	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	Y	12/04/2024	76300529	$95,500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otras Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	90,500				90,500	83	5,000	95,500			905	95,500	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor notas de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	95,500	95,500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	95,500	95,500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

4713

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	26548736-0	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA	cr5 no 11-24	2607436	paolaandrearodriguezalcala@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	Y	12/04/2024	76300539	885.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Indep.	Extranjero	Cotiz. Exterior	Sanción	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte FSAP	Aporte MEN
1	CC	1118507868	RODRIGUEZ ARANA HENRY JULIAN	00	0			N																	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	3	99.600		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

sumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93388631		CARRANZA SANCHEZ FREDY ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ B CS 11 BRR SANTA CRUZ	IBAGUE-TOLIMA	2733905	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	56550995	9462358881	I	2024/02/08	2024/01/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$370,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 93388631	CARRANZA FREDY	230901	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

1414

2024/01/31 01:12 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93388831		CARRANZA SANCHEZ FREDY ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ II CS 11 BRR SANTA CRUZ	IBAGUE-TOLIMA	2733905	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	36530995	9462358881	I	2024/02/06	2024/01/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$370,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$370,500	$0	$0	$370,500

2024/01/31 01:12 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	19955992	FREDY GIOVANI VARGAS RAMIREZ	Cra 1A No. 14A-72	3212664630	fredyvargas1971@yahoo.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	RICAURTE		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	28/02/2024	74591883	$373,000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	162,500	0		0		0	7	1,100	0	163,600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	208,000	0	0	0	0	7	1,400	0	209,400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162,500	163,600
Pensión	1	208,000	209,400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	370,500	373,000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1715

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13955982	FREDY GIOVANI VARGAS RAMIREZ	Cra 1A No. 14A-72	3212654630	fredyvargas1971@yahoo.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	RICAURTE	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	28/02/2024	74591893	$373.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Código	Extranjero	Cotiza exterior	Extranjero	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase aportante	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	13955982	VARGAS RAMIREZ FREDY GIOVANI	3	0			N																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	182.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1716

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	38567522	DENNIS HORTENCIA BARRERO		CR 5 #11-24 OFI 802 EDIF TORRE	2607436	anlegranbauer@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					1	0
PERÍODO SALUD	PERÍODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	26/01/2024	74214962	$370.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	370.500	370.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	38587522	DENNIS HORTENCIA BARRERO		CR 6 #11-24 OFI 802 EDIF TORRE [illegible]	2607436	[illegible]@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERÍODO SALUD	PERÍODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	26/01/2024	74214382	$370.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Residente	Exterior	Salario Integral	Suspensión	IGE	IRT	TAE	TDE	TDP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de Riesgo	Cot mora	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	38587522	BARRERO DENNIS HORTENCIA	3	0		N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1069175487	DANIELA ALEJANDRA CIFUENTES MURILLO		CRS #11-24	2607436	anlegenbauer@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	29/01/2024	74213932	$370.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800234308-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	370.500	370.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGADA

4114

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1088175487	DANIELA ALEJANDRA CIFUENTES MURILLO	CR5 #11-24	2607438	emiguentjaus@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / IPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-01	2024-01	E	29/01/2024	74213832	$370.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Pensionado	IGE	IRT	TDE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario y Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1088175487	CIFUENTES MURILLO DANIELA ALEJANDRA	3	0			N																23031	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JORGE FERNANDO MORALES
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-79855590
SUCURSAL	2031
FECHA PAGO	2024-01-09
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-79855590
NOMBRE EMPLEADO	JORGE FERNANDO MORALES OLIVEROS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR
ARL	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
NÚMERO PLANILLA	29157673
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2024-01
PERIODO SALUD	2024-01
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5411101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.300.000	0,1600000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.300.000	0,0696000	$ 90.500	666

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52,000	$ 402,500

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: CARLOS FERNANDO SANCHEZ
Identificación NIT - 80.768.926

Sucursal 2031
Periodo Pensión 2024-01
Periodo Salud 2024-01
Fecha Pago Planilla 2024-01-10

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	80.768.926
Nombre	CARLOS FERNANDO SANCHEZ
EPS	FAMISANAR EPS
AFP	PROTECCION
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familia - CAFAM
ARL	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
Número Planilla	28742724
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pension	2024-01
Periodo Salud	2024-01
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

INC	Fecha INC	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VACR Inicio	Fecha VACR Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1,160,000	0,0400000	$ 46,400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1,160,000	0,1600000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1,160,000	0,0069000	$ 80,000	696

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1,160,000	0,0400000	$ 46,400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

424

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1106880782	LUIS FELIPE GUZMAN SERRANO		CALLE 8 29 174 BR ACAPULCO	2807436	pipe11.malden@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUE		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	29/01/2024	74255608	$370.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Mora Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, SRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	370.500	370.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1106899792	LUIS FELIPE GUZMAN SERRANO		CALLE 8 29 174 BR ACAPULCO	2807438	pipe11.maidan@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	29/01/2024	74235609	$370.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Residente	Exterior transitorio	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	CORRECCIÓN	Cód. AFP	ISC AFP	Cotización	Valor Adicional Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	ISC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	ISC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	ISC CCF	Aporte CCF	ISC servs parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1106899792	GUZMAN SERRANO LUIS FELIPE	3	0			N																230301	1.300.000	296.200	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	102.300		0		0		0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110559992		QUINTERO ALFEREZ JUAN PABLO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana 7 casa 15 Etapa 3 Villa Cafe	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2783087	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	424798121	94622213542	I	2024/02/21	2024/01/30	BANCOLOMBIA	0	$403,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1110559992	QUINTERO ALFEREZ JUAN PABLO									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,300,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	No	$403,300
Total	Afiliados(1)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$403,300

2024/02/20 12:04 PM

1424

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140559992		QUINTERO ALFEREZ JUAN PABLO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana 7 casa 15 Etapa 3 Villa Cafe	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2783067	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	424798121	9462273542	I	2024/02/21	2024/01/30	BANCOLOMBIA	0	$403,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$403,300	$0	$0	$403,300

2024/02/20 12:04 PM

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

7.8 INFORME SOCIAL

1726

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

INFORME DE IINTERVENTORIA No. 04
SEGUIMIENTO A COMPONENTE
SOCIAL DEOBRA

Contrato de Obra No. 403 de 2023 – pavimentación y embellecimiento de ladiagonal 7desde la calle10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte – Cundinamarca.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 413 DE 2023

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA "PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE10HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA.

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA

17 DE ENERO 2024 AL 16 DE FEBRERO 2024
RICAURTE - CUNDINAMARCA

Cr 5 #11-24 Of.802 Edificio Torre Empresarial (608) 253-7486 - 3123065921
diagonalseptima.interventoria@gmail.com

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

INTRODUCCIÓN

En el presente informe pretendo dar a conocer, el seguimiento realizado desde la interventoría social, al componente social del consorcio diagonal RC, frente al cumplimiento de actividades que se encuentran contempladas en el contrato y otras que se encuentren en el plan de trabajo diseñado por el componente social del consorcio, brindando recomendaciones y direccionamiento según se requiera.

OBJETIVO GENERAL

Asegurar el cumplimiento de actividades comunitarias, impactadas por la ejecución de la obra, mediante acompañamiento, verificación y direccionamiento de la interventoría social, con el fin de mitigar problemáticas las cuales interfieran en el adecuado desarrollo y termino del proyecto.

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Acompañar de manera presencial, durante el desarrollo de actividades comunitarias, realizadas por la profesional encargada del componente social de la obra.

- Orientar frente a dudas o inquietudes que surjan, durante el desarrollo de actividades planeadas por la profesional encargada del componente social de la obra y otras situacionesque surjan durante el desarrollo y ejecución del proyecto.

- Direccionar frente a la importancia del cumplimiento de metas plasmadas en el plan de trabajo del componente social y otras las cuales estipula el contrato.

- Verificar, mediante validación documental y visitas el cumplimiento de actividades realizadasproyectadas en el plan de acción social y otras estipuladas en el contrato

- Realizar recomendaciones, de acuerdo a lo observado y según se evidencie necesidad.

- Gestionar soluciones frente a problemáticas comunitarias

INFORME DE INTERVENTORIA SOCIAL 17 ENERO AL 16 DE FEBRERO

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por parte de la interventoría social, como también, las actividades adelantadas por parte del componente social del consorcio diagonal RC, las observaciones que se realizan según lo evidenciado y lo pendiente por ejecutar, teniendo en cuenta el objeto del contrato.

ACTIVIDADES REALIZADAS INTERVENTORIA SOCIAL

- Formato de autorización para retiro de pérgolas. Se realiza formato de autorización, para el correspondiente retiro de pérgolas.
- Socialización a la comunidad sobre el retiro de pérgolas vivienda por vivienda y en cada establecimiento publico ubicado sobre la carrera 14 n 6ª cabe resaltar que dicha actividad se realizara por tramos según avance la obra.
- Acompañamiento a visita domiciliaria predio de la señora **CARMEN DALILA PONCE DE SEVILLANO** carrera 14 n 6ª -09, por solicitud de ella dado su inconformismo por falta de información correspondiente al desarrollo de la obra
- Envío de email componente social del consorcio diagonal RC requiriendo plan de

gestión social, teniendo en cuenta las obligaciones registradas en su contrato.

- Acompañamiento a profesional del consorcio a algunas visitas realizadas al club de la ETB.
- Recorrido a cada vivienda y local desde puerta amarilla hasta carrera 16 entregando folleto e invitando a la comunidad a la socialización de las modificaciones que se realizaron al diseño de la vía el día 12 de febrero a las 2 pm en la casa de la cultura,
- Asistencia en reunión llevada a cabo el 12 de febrero sobre socialización de nuevo diseño
- Elaboración de acta de los participantes a la reunión por Google meet.
- Sensibilización señora **MARIA** sobre la importancia en participar de las reuniones convocadas por parte del consorcio diagonal RC, con el fin de que pueda conocer e indagar acerca de temas de interés, pues la caseta comercial con la que cuenta, se encuentra ubicada en un punto el cual probablemente se tenga que intervenir.
- Acta de sensibilización señora **MARIA,** ítem anterior.
- Acompañamiento en recorrido con profesional forestal, profesionales de interventoría y profesionales de consorcio diagonal RC, con el fin de conocer lo referente al manejo de las especies que se encuentran ubicadas en los andenes o en frente de los predios.
- Recepción, seguimiento y respuesta de **DERECHO DE PETICION**, interpuesto por el señor **VICOR UBAQUE.**
- Recepción y direccionamiento vía email al correo de correspondenciadiagonal7ma de queja interpuesta por el señor **ANDRES GARCIA**
- Verificación y orientaciones al informe componente social del consorcio diagonal RC.

ACTIVIDADES PENDIENTES POR ASEGURAR -COMPONENTE SOCIAL CONSORCIO DIAGONAL RC

- Oportunidad en la contestación de respuestas de los emails enviados desde la interventoría, correspondientes a solicitud de información.
- Oportunidad en el envío mensual de informe de actividades.
- Entrega de actas iniciales desde la 14b hasta la carrera 16
- Respuesta a oficios pendientes radicados correspondientes al componente social, según obligación contrato.
- Oportunidad en el envío de respuestas PQRS interpuestas por la comunidad.

RECURSOS FISICOS EMPLEADOS

- Formatos de autorización retiro de pérgolas
- Folletos de invitación a socialización del nuevo diseño de la vía – 12 Enero
- Formato de cierre de vía
- Actas de soporte con la descripción de las actividades anteriormente mencionadas.

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

RECOMENDACIONES GENERALES PARA IMPLEMENTAR

Con el fin de optimizar el tiempo y lograr el cumplimiento de actividades dirigidas a la comunidad, durante el desarrollo y fin de la obra se sugiere.

- Realizar plan de gestión social 2024, teniendo en cuenta su disponibilidad y tiempo de permanencia en el contrato, lo anterior ya que a la fecha solo se evidencia vía email plan de trabajo hasta final de febrero.
- Dejar registrado mediante levantamiento de acta, actividades las cuales apoye o resuelva, y que no se encuentren incluidas en el cronograma y plan de trabajo. lo anterior con el fin de evidenciar su gestión adicional.
- Enviar vía email en el momento que se requiera, información correspondiente al componente a la interventoría social, con el fin de verificar avances y brindar apoyo correspondiente.
- Informar de manera oportuna situaciones de dificultad, con el fin de brindar apoyo correspondiente y de esta manera lograr el cumplimiento de actividades.
- Asegurar el cumplimiento de actividades detalladas en el contrato y tenerlas en cuenta en su plan de acción.
- Enviar de manera oportuna Informe mensual, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato.

FRENTE AL TALENO HUMANO

Durante los diferentes llamados realizados a la trabajadora social del consorcio diagonal RC, se evidencia receptiva y dispuesta a realizar los ajustes e implementar las recomendaciones realizadas por parte de la interventoría., Se aclaran dudas e inquietudes que surgen durante el periodo trabajado y se finaliza sin dificultad.

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

REGISTRO FOTOGRAFICOS

Recorrdido , Invitacion comerciantes socializacion nuevo diseño





Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

Formato de Retiro de Pergolas

Consorcio Diagonal 7 P.E

15 de enero 2024
Ricaurte Cundinamarca 2024

Cordial saludo

Asunto: autorización sobre retiro de pérgolas

Comedidamente me dirijo a ustedes en calidad profesional del componente social del consorcio y profesional social de interventoría con el fin de informar de manera verbal y mediante recorrido que se realizara el correspondiente retiro de pérgolas ubicadas en el espacio público para dar continuidad y avance con el objeto **PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 15 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE –CUNDINAMARCA.** Tal como se acordó en la reunión del pasado 12 de enero del 2024, llevada a cabo en las instalaciones de la alcaldía municipal, lo anterior con el fin de dar continuidad a la obra con contrato numero **CONTRATO 403 de 2023**

Durante el recorrido, se aclaran dudas e inquietudes, por parte de la comunidad .y se elabora como soporte acta y firmas.


Agradecemos su colaboración y tolerancia ante las actividades que se continuarán desarrollando

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes


INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

Envio de Solicitudes Via Email

Plan de Gestion Social

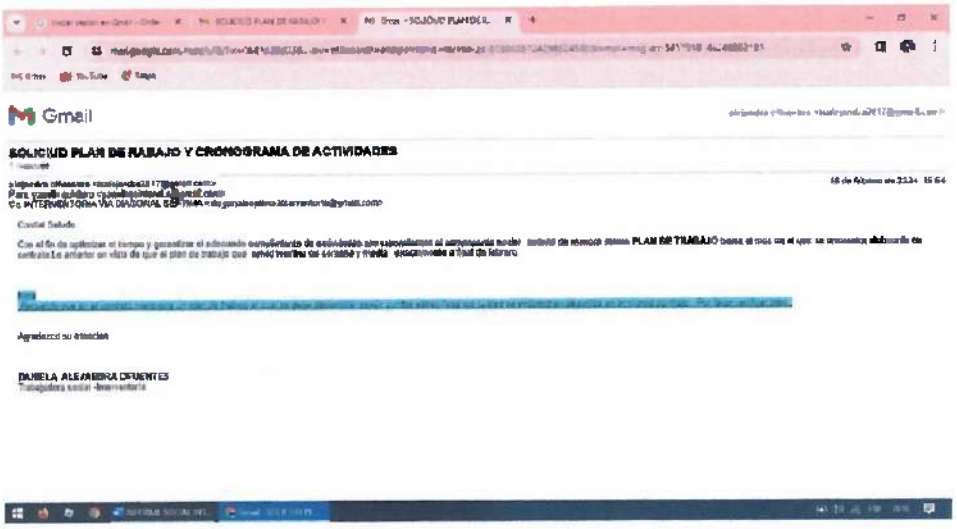


Solicitud de Soportes Actividades ejecutadas

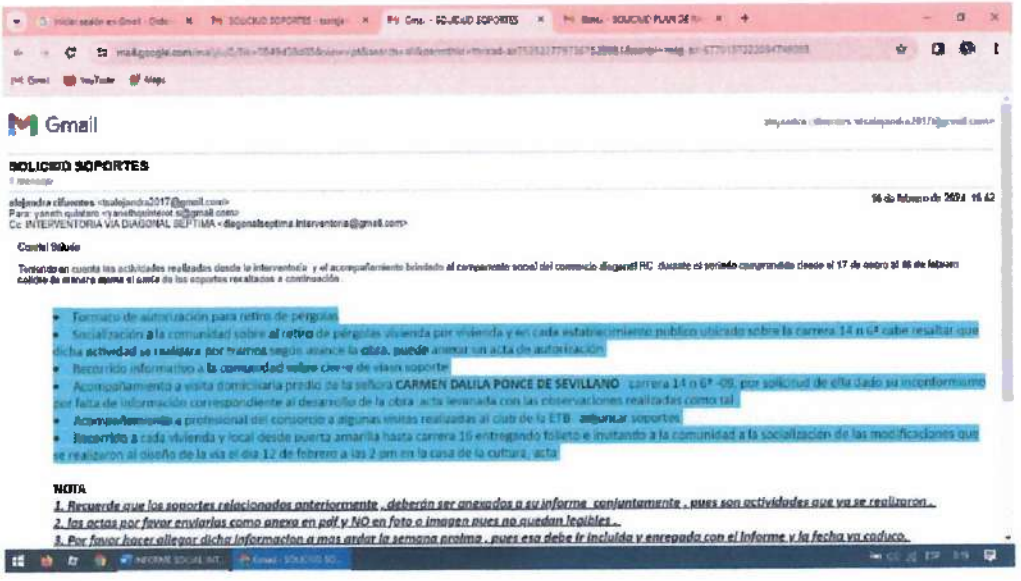

Yaola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

Seguimiento a Respuestas de oficios

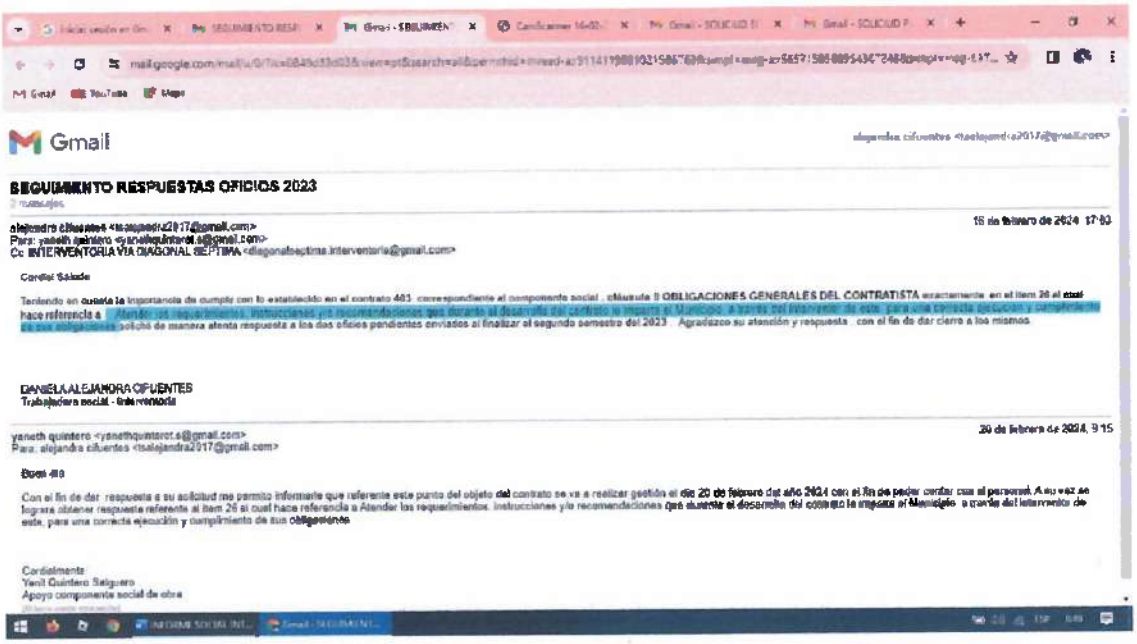

Gmail

SEGUIMIENTO RESPUESTAS OFICIOS 2023

alejandra cifuentes <tsalejandra2017@gmail.com> 15 de febrero de 2024, 17:03
Para: yaneth quintero <yanethquintero.s@gmail.com>
Cc: INTERVENTORIA VIA DIAGONAL SEPTIMA <diagonalseptima.interventoria@gmail.com>

Cordial Saludo

Teniendo en cuenta la importancia de cumplir con lo establecido en el contrato 483 correspondiente al componente social , cláusula 9 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA exactamente en el item 26 al cual hace referencia a Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Municipio, a través del interventor de este, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones solicito de manera atenta respuesta a los dos oficios pendientes enviados al finalizar el segundo semestre del 2023 . Agradezco su atención y respuesta con el fin de dar cierre a los mismos

DANIELA ALEJANDRA CIFUENTES
Trabajadora social - Interventoría


yaneth quintero <yanethquintero.s@gmail.com> 20 de febrero de 2024, 9:15
Para: alejandra cifuentes <tsalejandra2017@gmail.com>

Buen dia

Con el fin de dar respuesta a su solicitud me permito informarle que referente este punto del objeto del contrato se va a realizar gestión el dia 20 de febrero del año 2024 con el fin de poder contar con el personal A su vez se logrará obtener respuesta referente al item 26 al cual hace referencia a Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Municipio a través del interventor de este, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones


Cordialmente
Yaneth Quintero Salguero
Apoyo componente social de obra

Acompañamiento en Recorrido a proseional Forestal

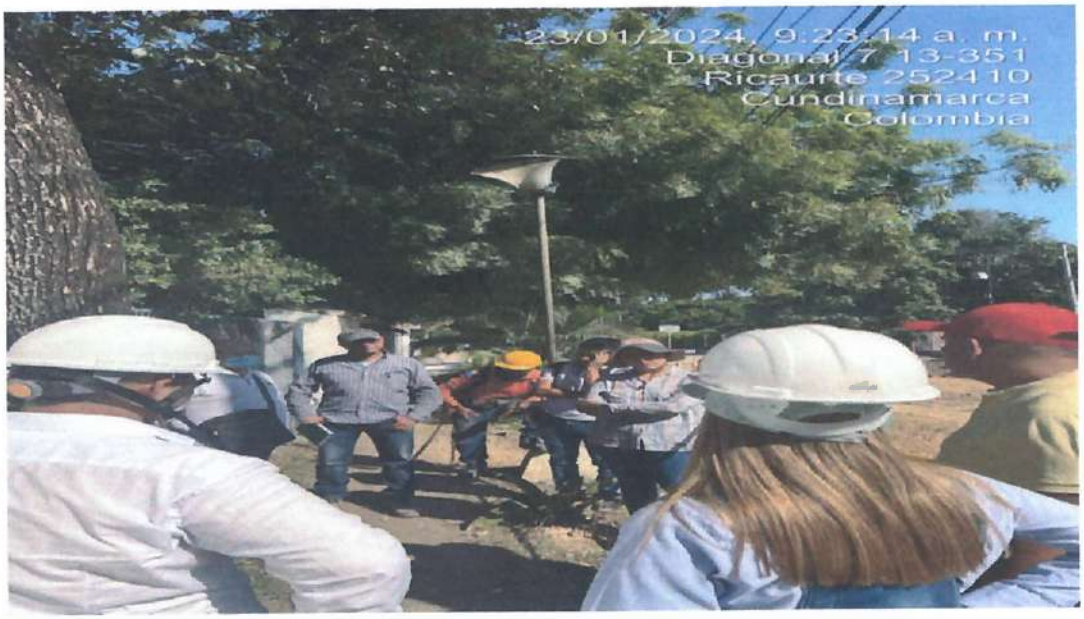

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

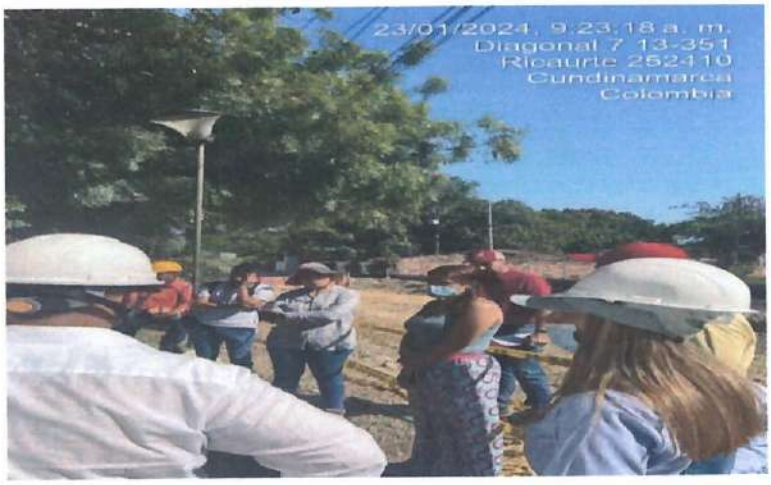

Sensibilizacion a comerciante , frente a la importancia de participar en las reuniones acerca del desarrollo del proyecto de pavimentación y embellecimiento de la diagonal 7desde la calle10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte – Cundinamarc



Daniela

DANIELA ALEJANDRA CIFUENTES MURILLOCÓDIGO.: 318461028-1

ACTA SOCIAL

RICAURTE-CUNDINAMARCA

OBSERVACIONES

Se realiza acercamiento a la caseta ubicada en el costado izquierdo de la carrera 16, con el fin de realizar invitación a la señora maría, antigua comerciante del municipio de Ricaurte, a la socialización del nuevo diseño de la vía, sin embargo, la señora se evidencia desinteresada a recibir dicha información y se niega a recibir el volante el cual contiene, lugar, y hora de la reunión.

Teniendo en cuenta la falta de receptividad, por parte de la señora MARIA, en recibir la información sobre el desarrollo y ejecución de la obra, se realiza notificación a la trabajadora social del consorcio diagonal RC, para que pueda realizar gestión correspondiente ante el ente municipal, con el fin de mitigar situaciones de dificultad con la señora MARIA en el momento en el que se deba intervenir el tramo donde se encuentra ubicada la caseta de la comerciante en mención.

Cabe resaltar que dicho acercamiento se realiza en compañía de la trabajadora social del consorcio, a quien se le asignan compromisos, teniendo en cuenta la situación.



VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN EL ACTA ANTERIOR

Ricaurte Paola Rodríguez Alcalá INTERVENTORÍA REGIONAL SEPTIMA

DESCRIPCION	RESPONSABLE	CUMPLIO	
Gestión ante ente municipal, sobre posible re ubicación de la caseta comercial, teniendo en cuenta el desarrollo y diseño del proyecto. Validar información con director o coordinador de obra. Realizar acta de vecindad de la caseta comercial de la sra María, con respectivo registro fotográfico	Yenith quintero	SI	NO

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

7.9 BITÁCORA DE OBRA

Ing MANUEL ESPINOZA
RESIDENTE OBRA

17 ENERO 2024 (MIERCOLES)

SE REALIZA ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y TOMA DE SECCION ADICION TOPOGRAFIA, SEÑALIZACION TRAMO -1 PASO PEATONAL, INICIANDO ACTIVIDADES DE CASEO (EXCAVACION MECANICA) SOBRE LA CALZADA DERECHA TRAMO -1, CARGUE Y RETIRO MATERIAL DE

1739

Powered by CamScanner

DE EXCAVACIÓN EN VOLQUETAS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL, SE REALIZARON CONTROLES TOPOGRÁFICOS.

Ing. MAURICIO ESPINOSA
RESIDENTE OBRA

Interventoría.

10 ENERO 2024 (JUEVES)

CONTINUACIÓN ACTIVIDADES DE CARGUE SOBRE LA CALZADA DERECHA TRAMO-1, CARGUE Y RETIRO MATERIAL EN VOLQUETA PARA SU DISPOSICIÓN FINAL. ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN ALEATORIO Y PASO PEATONAL. VERIFICACIÓN Y CONTROL DE TOPOGRAFÍA.

Ing. MAURICIO ESPINOSA
RESIDENTE OBRA

Interventoría.

19 ENERO 2024 (VIERNES)

CONTINUANDO ACTIVIDADES DE CARGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN MATERIAL EN VOLQUETAS, REALIZADAS EN EL TRAMO-1. SEÑALIZACIÓN GENERAL TRAMO Y PASO PEATONAL DEMARCADO.

Ing. MAURICIO ESPINOSA
RESIDENTE OBRA

Interventoría.

20 ENERO 2024 (SABADO)

SE REALIZA PARA EL TRAMO-1 UNJEO, CARGUE Y RETIRO MATERIAL EN VOLQUETAS PARA SU DISPOSICION FINAL, REFORZAMOS SEÑALIZACIÓN TRAMO-1 Y DE-MARCACION PARA PEATONAL.

Ing/ MAURICIO ESPINOSA
RESIDENTE OBRA

Interventoría.

22 ENERO 2024 (LUNES)

REALIZAMOS DEMOLICION SEPARADOR CENTRAL ENTRE EL K0+000 AL K0+080, CONTINUAMOS ACTIVIDADES DE CARGO CALZADA DERECHA., INICIAMOS RIEGO DE LA VIA, SE INICIA DESAGOTE DE TERRENO C.D. Y ANDENES DEMOLICIONES.

Ing MAURICIO ESPINOSA
RESIDENTE OBRA

Interventoría

23 ENERO 2024 (MARTES)

REALIZAMOS DEMOLICION ANDENES CALZADA IZQUIERDA RETRO MANUAL. CONTINUAMOS ACTIVIDADES DE CA-JEO ENTRE K0+080 - K0+120 CALZADA DERECHA CONTINUAMOS DEMOLICIONES ANDENES C.D. TRAMO-1

Ing MAURICIO ESPINOSA
RESIDENTE OBRA

Interventoría.

24 ENERO 2024 (MIERCOLES)

CONTINUANDO ACTIVIDADES DE CASEO CALZADA DERECHA, DEMOLICION ANDENES CALZADA DERECHA, RETIRO DE CORRIENTE TERCER CALZADA DERECHA. VISITA EN CAMPO TRAMO-1 CON FUNCIONARIOS DE ACUAGYR, SUPERVISION OBRA PUBLICA ALCALDIA, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA PARA VERIFICACION DE LA RED Ø4" POTABLE LOCALIZADA SUPERFICIALMENTE EN LA CALZADA DERECHA, NO COMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PROFUNDIDAD. DESDE EL K0+000 AL K0+360 CLAVE PROFUNDIDAD DE LA RED A 0.70 m SE SOLICITA LA VALIDACION PARA PROFUNDIZAR LA RED Y PODER CONTINUAR ACTIVIDADES.

Ing. Residente Obra

Interventoría.

25 ENERO 2024 (JUEVES)

CONTINUANDO ACTIVIDADES DE DEMOLICION, RETIRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL ANDENES, C.D. TRAMO-1, SECTOR ESTE CENTRO COMERCIAL, RETIRO DE PACHAS OBRA HIDRAULICAS. LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ANDENES DEMOLICION, CARGUE Y RETIRO ESCOMBROS, LIMPIEZA DE ESCOMBROS. CONTINUANDO ACTIVIDADES DE CASEO SE REALIZA VISITA DE CAMPO FUNCIONARIOS ALCALDIA PARA SOCIALIZAR LOS PUNTOS DE UBICACION DE POZOS Y REDES HIDRAULICAS PARA DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS SON CINCO POZOS TRES DE RED PLUVIAL Y DOS DE REDES ALCANTARILLADO.

Ing. Residente Obra

Interventoría.

26 ENERO 2024 (VIERNES)

CONTINUAMOS ACTIVIDADES DE EXCAVACION Y RETIRO MATERIAL ANDENES SECTOR ETB, DEMOLICION DE LOS MISMOS. IDENTIFICADOS REDES DE ALCANTARILLADO Y POZOS FUERA DE SERVICIO, SE SOLICITA VISITA FISCALIA DE INTERVENTORIA Y FUNCIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS, QUIENES DAN LA ORDEN DE REALIZAR LA DEMOLICION DE LOS POZOS Y TUBERIA DE GRES ANTIGUA, PROCEDEMOS A REALIZAR LAS ACTIVIDADES, LA CUAL COMPRENDEN DEMOLICION, CARGUE Y RETIRO, POSTERIORMENTE REALIZADOS RELLENO Y COMPACTACION (TOMA DE DENSIDADES). ENTRE EL K0+010 - K0+240

Ing MAURICIO ESPINOSA
RESIDENTE OBRA

Interventoria.

27 ENERO 2024 (SABADO)

REALIZAMOS RECIBO DE VIA ENTRE CRA 14A A LA CRA 15. CONTINUAMOS ACTIVIDADES DE EXCAVACION, DEMOLICION DE POZOS Y RED DE GRES ALCANTARILLADO FUERA DE SERVICIO, RETIRO DE MATERIAL Y POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACION CON RECEBO.

Ing MAURICIO ESPINOSA
RESIDENTE OBRA

INTERVENTORIA.

29 ENERO 2024 (LUNES)

CONTINUAMOS ACTIVIDADES DE EXCAVACION, DEMOLICION CARGUE Y RETIRO MATERIAL RED ALCANTARILLADO FUERA DE SERVICIO LOCALIZADO EN CENTRO K0+010 - K0+240 REALIZAMOS EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE POZO DE [illegible] URBANISTICO ARAUCANA DEL SOL

EJECUCION DE DOS POZOS UNO PLUVIAL Y UNO SANITARIOS CON SUS RESPECTIVAS CONEXIONES. REALIZAMOS TOMA DE DENSIDADES PARA RELLENO Y COMPACTACION EN EL TRAMO DE LA RED FUERA SERVICIO.
FUNDIMOS CAMA MATERIAL Ø 1.70. CONCRETO RETORNADO REALIZAMOS RIEGO DE LA VIA

Ing MAURICIO ESPINOSA
RESIDENTE OBRA

INTERVENTORIA.

30 ENERO 2024 (MARTES)
SE REALIZA EXCAVACION PARA CONEXION ACOMETIDA RED PLUVIAL Y SANITARIA PARA POZOS DESARROLLO URBANISTICO ALAMEDA SOL. VERIFICACION TOPOGRAFICA

Ing/ MAURICIO ESPINOSA
RESIDENTE OBRA

INTERVENTORIA.

31 ENERO 2024 (MIERCOLES)
REALIZAMOS EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE POZO DESARROLLO URBANISTICO PROYECTADO KO + 140 RED PLUVIAL, DE IGUAL FORMA EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL PARTE ACOMETIDA. REALIZAMOS DEMOLICION PARA INGRESO DE ACOMETIDA AL POZO RED PLUVIAL PRINCIPAL.
INSTALAMOS EXCAVACION Y RETIRO MATERIAL PARA CONEXION POZO KO4 195 A LA RED PRINCIPAL DE E.P.C
REALIZAMOS PODA Y TALA DE ESPECIES DE ACUERDO A INVENTARIO Y NORMATIVA

DEL 1 INTERVENTORIA, CALZADA IZQUIERDA ENTRE EJE KO+140 M2 KO+245

Ing. MAURICIO ESPINOSA
RESIDENTE OBRA

INTERVENTORIA

1º FEBRERO 2024 (JUEVES)
SE REALIZA EXCAVACION Y RETIRO MATERIAL EXTRAIDO-PORTE ENTRE POZO KO+195 Y POZO EPC.
SE REALIZA LEVANTAMIENTO DE POZO EN LADRILLO Y MORTERO KO+195 RED PLUVIAL, SE HACE LA INSTALACION DE ACOMETIDA. SE REALIZA RIEGO DE VIA

Ing. MAURICIO ESPINOSA
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA.

2 DE FEBRERO 2024 (VIERNES)
SE REALIZA EXCAVACION, RETIRO Y CARGUE DE MATERIAL PARA EJECUCION DE POZO K2 KO+115 RED SANITARIA PARA DESARROLLO PROYECTO
SE CONTINUA EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL PERTENECIENTE A LA RED ALCANTARILLADO EXISTENTE (DEMOLICION TORRINA ONES Y POZOS) ENTRE KO+030 KO+030, POSTERIORMENTE SE REALIZA RELLENO Y COMPACTACIÓN HECHA MIS MANO, TOMA DE DENSIDADES.

INTERVENTORIA

ING MAURICIO ESPINOSA
RESIDENTE OBRA

3 FEBRERO 2024 (SABADO)
SE REALIZA ENTIBADO PARA PROTECCION EXCAVACION
POZO KO+115 Y POZO KO+140
INICIAMOS EXCAVACION PARA POZO KO+020
DESARROLLO USANDO PROYECTO ULTRASONICO,
SE REALIZA SEÑALIZACION Y DEFLECTORES PA
PEATONAL, SEÑALIZACION TRAMO-?

INTERVENTORIA.
Ing MAURICIO ESPINOSA
RESIDENTE DE OBRA

5 FEBRERO 2024 (LUNES)
SE REALIZA VACIADO DE LOSA FONDO EN CONCRETO
REFORZADO PARA POZO KO+115 y KO+140
CONTINUAMOS RELLENO Y COMPACTACION ENTRE
KO+140 - KO+030

INTERVENTORIA.
Ing MAURICIO ESPINOSA
RESIDENTE OBRA

6 FEBRERO 2024 (MARTES)
SE REALIZA LEVANTAMIENTO DE POZO KO+140
PLUVIAL EN MAMPOSTERIA ANCLADO, SE REALIZA
ENTIBADO PARA PROTECCION Y EXCAVACION POZO
PLUVIAL KO+020, SE INICIA EXCAVACION, CHOQUE
Y RETIRO MAQUINA
INICIAMOS EXCAVACION PARA INSTALACION TUBERIA
PARA SUMIDERO KO+020 C.D.

INTERVENTORIA.
Ing MAURICIO ESPINOSA
RESIDENTE

7 FEBRERO DE 2024 (MIERCOLES)
CUADRILLA ETB INICIA SONDEO ENTRE CAMARA RED ETB, CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR EL ESTADO DE CONTINUIDAD DE LOS DUCTOS. LOCALIZADO ENTRE LA CAMARA DEL TRAMO-1 REALIZANDO INSTALACION TUBERIA PARA DESAGUES SUMIDERO RED PLUVIAL FOTO

Ing MAURICIO ESPINOSA
RESIDENTE OBRA

INTERVENTORIA.

8 FEBRERO 2024 (JUEVES)
PRESENCIA DE LLUVIAS EN HORAS DE LA MAÑANA ACTIVIDADES SUSPENDIDAS
LA EMPRESA ACUAGUA REALIZA VERIFICACION DE LA RED POTABLE HALLADA EN C.D., LA EMPRESA DE SERVICIOS CONFIRMA MEDIANTE PRUEBA QUE LA RED SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO.
SE REALIZA VERIFICACION DE CALICES DE POZOS EN EL PRIMER TRAMO, SE EVIDENCIA QUE SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO.
SE REALIZA LEVANTAMIENTO EN REDES POSTERIOR PARA EL POZO SANITARIO #0+115.

Ing HERNANDO ESPINOSA
RESIDENTE OBRA

INTERVENTORIA.

9 FEBRERO 2024 (VIERNES)
SE REALIZA VACIADO LOSA FONDO Ø 1.70 EN CONCRETO REFORZADO PARA POZO RED PLUVIAL K0+020 PROYECCION PROYECTO VIA ALTERNA SE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. SE REALIZA SEÑALIZACION Y DELIMITACION PARD PEATONAL

Fing HAROLD ESPINOSA
RESIDENTE OBRA

INTERVENTORIA.

10 FEBRERO 2024 (SABADO)
SE INICIA LEVANTAMIENTO DE POZO K0+020 EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO. SE REALIZA RIEGO DE UNA ENTRE VIA DE 14 A LAS 15. SE REALIZA SEÑALIZACION DE TODO EL TRAMO -1

Fing HAROLD ESPINOSA
RESIDENTE OBRA

INTERVENTORIA.

12 FEBRERO 2024 (LUNES)
REALIZAMOS LEVANTAMIENTO EN MAMPOSTERIA PARA EL POZO RED PLUVIAL K0+020.
REALIZAMOS APIQUES PARA IDENTIFICAR LA RED AGUA POTABLE 4" LA CUAL NO CUMPLIA CON LA PROFUNDIDAD ESTABLECIDA POR NORMA, SE SOLICITA EN COORDINACION CON LA SUPERVISION TECNICA DE LA ALCALDIA E INTERVENTORIA AL EMPRESA ACUAGYR PROFUNDIZAR LA RED EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS Y ESPECIFICACIONES, CON EL

OBJETIVO DE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION Y COMPACTACION RED SOBRE SOBRE LA CALZADA DERECHA.

Ing MAURICIO ESPINOSA
RESIDENTE OBRA

INTERVENTORIA.

13 FEBRERO 2024 (MARTES)

REALIZAMOS EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE, PARA EJECUTAR INSTALACION TUBERIA PARA SUMIDERO EN EL KO+245.

SE REALIZA RELLENO Y COMPACTACION DE AREAS ADYACENTES AL POZO KO+080, REALIZAMOS ADECUACION DE POZO INICIAMOS EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO MATERIAL PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA PROFUNDIZAR LA RED DE AGUA POTABLE Ø4" PERTENECIENTE A LA EMPRESA ACUAGETIR LA PROFUNDIZACION SE REALIZA DESDE EL KO+000 AL K0+245. LA ACTIVIDAD ES CONTEMPLADO: EXCAVACION Y RELLENO - COMPACTACION DESPUES QUE LA EMPRESA ACUAGETIR REALICE EL TRASLADO Y PROFUNDIZACION DE LA RED Y EFECTUE LAS CONEXIONES A LAS RESPECTIVAS ACOMETIDAS

Ing MAURICIO ESPINOSA
RESIDENTE OBRA

INTERVENTORIA

14 FEBRERO 2024 (MIERCOLES)

LA EMPRESA ACUAGETIR INICIA LABORES DE TRAZADO Y PROFUNDIZACION RED AGUA POTABLE Ø4" LA RED QUEDA A PROFUNDIDAD DE 0.90 m

CONTINUANDO CON LAS EXCAVACIONES PARA PROFUNDIZACION DE LA RED DE ACUAGYM. E INICIANDO INSTALACION DE CAMA DE ARENA PARA LA RED POTABLE Ø4".

Ing. MAURICIO ESPINOSA
RESIDENTE DE OBRA

Interventoría.

15 FEBRERO 2024 (JUEVES)

LA EMPRESA ACUAGYM CONTINUA LA INSTALACION Y TRASLADO DE LA RED Ø4" A LA PROFUNDIDAD ESTABLECIDA POR NORMA. - INICIANDO ACTIVIDADES DE RELLENO Y COMPACTACION HASTA EL EMPATE AL POZO CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS CON LA PROFUNDIZACION DE LA RED Ø4"

INICIANDO EXCAVACIONES PARA REALIZAR CONEXION DE ACOMETIDAS ENTRE EL POZO KO+165 AL POZO EPC.


Ing. MAURICIO ESPINOSA
RESIDENTE OBRA

Interventoría.

16 FEBRERO 2024 (VIERNES)

REALIZANDO ENTIBADO DE PROTECCION EN EL POZO EPC CON EL OBJETIVO DE INICIAR ACTIVIDADES DE INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PARA CAMARA DE CAIDA, REALIZANDO INSTALACION DE ACCESORIOS Y SE REALIZA CONEXION DE ADOPTORA AL POZO EPC. - ACTIVIDADES ADICIONALES HACEN REFERENCIA A LA CONEXION DEL POZO KO+165 SANITARIO AL POZO EPC, EL RELLENO Y COMPACTACION SE VIENE REALIZANDO DE ACU

DNO A LAS ESPECIFICACIONES, PARA LA CONEXION AL POZO EPC SE DEFINE EN CONJUNTO ACUERDO CON INTERVENTORIA LA CONEXION DEL POZO EOTIGT Y CAJA DE CONCRETO LAS CUALES A TRAVEZ DE ACOMETIDA Ø 10" LLEGARA A CAJA LA CUAL ES CONECTADA DIRECTAMENTE AL POZO EPC Y A TRAVEZ DE CAMARA DE CAIDA;

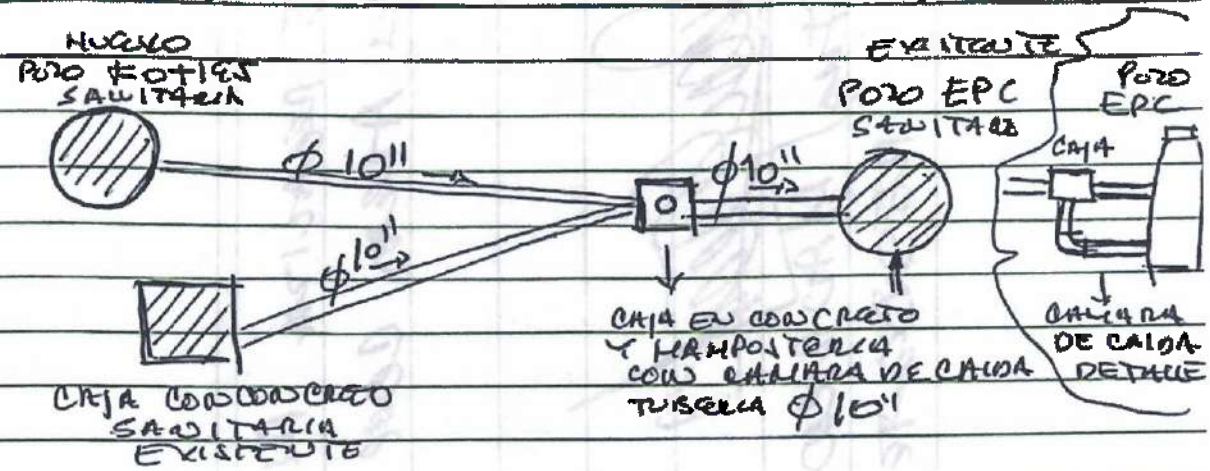

REALIZANDO TOMA DE DENSIDADES AL RELLENO RELACIONADO CON LA RED POTABLE DE ACUEDUCTO PROFUNDIZADA.

CON RELACION A LA ACORDADA ANTES DESCRITA, REALIZAMOS LA EJECUCION DE LA CAJA, INSTALACION DE TUBERIA Ø DESDE CAJA CONCONCRETO Y POZO EOTIGT.

LA CAJA ES CONSTRUIDA EN LOSA DE FONDO Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO, MAMPOSTERIA EN LADRILLO PAÑETADO

Ing Mauricio Espinosa
Residente Dana

Interventoria.

17 FEBRERO 2024 (SABADO)

INICIAMOS PROCESO DE RELLENO Y COMPACTACION POR CAPAS Y TOMA DE DENSIDADES EN EL AREA ENTRE POZO EOTIGT - CAJA CONCONCRETO Y POZO EPC SANITARIO ACTIVIDADES CONTROLADAS POR TOPOGRAFIA Y LABORATORIO DE CALIDAD.

SE REALIZA RIEGO DE VIA PARA HUMEDECER LAS AREAS COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Ing. MAURICIO ESPINOSA
RESIDENTE OBRA

Interventoría.

Paola Rodríguez Alcalá
Tecnóloga Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

7.10 CORRESPONDENCIA ENVIADA

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y G. Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 19 de enero de 2024

ID7R-055

Señor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
Consorcio Diagonal RC
Representante Legal
Espinal, Tolima

Referencia. **Contrato de Interventoría No 413 de 2023 — "INTERVENTORIA TECNICA ADMINITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"**

Asunto: **PLAN DE INTERVENCIÓN DEL CONTRATISTA PARA CONTRARRESTAR IMPACTO NEGATIVO DE LA OBRA EN LA COMUNIDAD.**

Cordial saludo Ing. Luis Eduardo,

Teniendo en cuenta la reunión realizada el pasado 12 de enero de 2024, en la cual participaron la comunidad, representantes de la Alcaldía, representantes del consorcio, y representantes de esta interventoría, así como también la reunión del pasado 17 de enero de 2024 con el representante de los comerciantes del sector intervenido, el señor **Víctor Ubaque**, se puedo evidenciar diferentes afectaciones negativas a la comunidad, respecto al desarrollo de la obra.

Es por lo anteriormente expuesto que la interventoría que represento, le solicita de manera urgente y prioritaria, nos comparta el plan de mitigación para contrarrestar el impacto negativo de la obra en la comunidad, el cual debe incluir la definición de las medidas correctivas de intervención por cada una de las problemáticas expuestas por la comunidad, así como cronograma con responsables e indicadores de seguimiento de la implementación de la mismas.

Agradecemos esta información nos sea compartida a más tardar el día miércoles 24 de enero de 2024 a las 8:00 am, entendiendo los compromisos pactados en la reunión y la implicación de su implementación.

A continuación, enumeramos las situaciones expuestas:

1. Afectación entre la carrera 14b y la carrera 15, en la cual se han presentado diferentes incidentes por caída a transeúntes.
2. Presencia constante de polvo o material particulado, proveniente del levantamiento de la capa asfáltica y la construcción de la obra.
3. Ausencia de señalización y demarcación de la obra.
4. Ausencia de ruta de evacuación en caso de emergencia.
5. Inexistencia de boletines de avance de obra que incluya a la comunidad.

Paola Rodriguez Alcalá

INTERVENTORIA DIAGONAL SEPTIMA

6. Inadecuado manejo de tránsito y señalización informativa y preventiva, para transeúntes y comunidad en general.

Es de resaltar que el incumplimiento por parte del Consorcio de los compromisos pactados con la veeduría, comerciantes y otros actores de la comunidad, hacen al consorcio directamente responsable en asumir cualquier daño o perjuicio que se derive de la ejecución de la obra de acuerdo con Clausula 10, Numeral 7 del contrato mencionado.

En espera de sus comentarios y sugerencias.

Atentamente

PAOLA ANDREA RODRÍGUEZ ALCALÁ
Representante Legal
Interventora de Obra.

Cra 5 #11-24 Oficina Edificio Torre Empresarial (628) 260-7436 - 3103206621
diagonalseptima interventoria@gmail.com

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 25 de enero de 2024

ID7R-056

Señor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
Consorcio Diagonal RC
Representante Legal
Espinal, Tolima

Referencia. **Contrato de Obra No. 403 de 2023 – "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Asunto: **SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.**

Cordial saludo,

Mediante el presente, esta interventoría solicita amablemente al CONSORCIO DIAGONAL RC, dar cumplimiento a los tiempos establecidos para la entrega de los informes mensuales y allegar la siguiente información:

- Informe Mensual No. 03 con sus respectivos anexos correspondiente al periodo 17 de diciembre de 2023 al 16 de enero de 2024. teniendo en cuenta el oficio ID7R-005 remitido el día 19 de octubre de 2023.
- Entrega de Diseño de Mezclas.

De igual manera, se le recuerda que los tiempos establecidos para la entrega de los informes mensuales, de acuerdo al acta de inicio del contrato en referencia, el CONSORCIO DIAGONAL RC debe hacer entrega del informe de obra, los tres (03) días hábiles siguientes de cada periodo a esta interventoría, para su respectiva revisión, aprobación y posterior radicación en la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas.

Finalmente, se le recuerda al contratista de obra que la información requerida hace parte de sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato en referencia.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

1749

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 25 de enero de 2024

ID7R-057

Señor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
Consorcio Diagonal RC
Representante Legal
Espinal, Tolima

Referencia. **Contrato de Obra No. 403 de 2023 – "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Asunto: **SOLICITUD DE AJUSTE AL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO.**

Cordial saludo,

Mediante el presente, esta interventoría solicita amablemente allegar plan de manejo de tránsito (PMT) ante los ajustes de coordinación de intervención por tramos, por lo cual, es necesario dar a conocer las estrategias de movilidad y mitigación de impacto a la comunidad que concurre el área de influencia del proyecto.

Teniendo en cuenta que, a la fecha no se cuenta con el ajuste correspondiente y se están adelantando actividades que generan afectación a la movilidad, así mismo, se le recuerda que el plan de manejo de tránsito debe contemplar las rutas de acceso y evacuación de los vehículos de tráfico pesado al proyecto.

Finalmente, se le recuerda al CONSORCIO DIAGONAL RC que el plan de manejo de tránsito debe ser aprobado por la secretaria competente del municipio de Ricaurte, por lo cual, es necesario su presentación en la menor brevedad.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Cr 5 #11-04 Of 802 Edificio Torre Empresarial (608) 262-7426 - 3103065921
diagonalseptima interventoria@gmail.com

1750

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 25 de enero de 2024

ID7R-058

Señor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
Consorcio Diagonal RC
Representante Legal
Espinal, Tolima

Referencia. **Contrato de Interventoría No 413 de 2023 — "INTERVENTORIA TECNICA ADMINITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"**

Asunto: **REITERACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN DEL CONTRATISTA PARA CONTRARRESTAR IMPACTO NEGATIVO DE LA OBRA EN LA COMUNIDAD.**

Cordial saludo,

Por medio del presente y en atención al comunicado emitido por esta interventoría el día 19 de enero de 2024 a través de ID7R-055, se solicita amablemente al CONSORCIO DIAGONAL RC, hacer entrega del plan de intervención para contrarrestar el impacto negativo de la obra en la comunidad.

Teniendo en cuenta, la reunión realizada el pasado 12 de enero de 2024, en la cual participaron la comunidad, representantes de la Alcaldía, representantes del consorcio, y representantes de esta interventoría, así como también la reunión del pasado 17 de enero de 2024 con el representante de los comerciantes del sector intervenido, el señor **Víctor Ubaque**, se puedo evidenciar diferentes afectaciones negativas a la comunidad, respecto al desarrollo de la obra.

Es por lo anteriormente expuesto que la interventoría que represento, le solicita de manera urgente y prioritaria, nos comparta el plan de mitigación para contrarrestar el impacto negativo de la obra en la comunidad, el cual debe incluir la definición de las medidas correctivas de intervención por cada una de las problemáticas expuestas por la comunidad, así como cronograma con responsables e indicadores de seguimiento de la implementación de la mismas.

Se le recuerda que a la fecha, no se ha emitido respuesta al derecho de petición del señor Víctor Ubaque radicado el día 18 de enero de 2024.

Atentamente,

PAOLA ANDREA RODRÍGUEZ ALCALÁ
Representante Legal
Interventora de Obra.

Cr 6 #11-24 Of 602 Edificio Torre Empresarial (608) 260-7486 - 3003065921
diagonalseptima.interventoria@gmail.com

1751

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 31 de enero de 2024

ID7R-059

Señor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
Consorcio Diagonal RC
Representante Legal
Espinal, Tolima

Referencia. **Contrato de Obra No. 403 de 2023 – "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Asunto: **SOLICITUD DE ENTREGA DE SOPORTES DE PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIONES DEL PERSONAL ADSCRITO AL CONSORCIO DIAGONAL RC.**

Cordial saludo,

Mediante el presente, esta interventoría solicita al CONSORCIO DIAGONAL RC, dar estricto cumplimiento en los tiempos de entrega de los soportes de pago de seguridad social del personal vinculado, como también, remitir soportes de afiliación de nuevo personal independiente de su modalidad de contratación.

Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en la **cláusula 9 numeral 21** y el oficio ID7R-006 del día 19 de octubre de 2023, teniendo en cuenta que, a la fecha no han sido remitidas a esta interventoría los soportes correspondientes al mes de diciembre.

Así mismo, se informa que la información requerida hace parte de la **cláusula 10 numeral 15 y 17.** Por lo cual, se solicita dar atención al presente requerimiento y allegar la documentación solicitada en la menor brevedad al correo de notificación de interventoría diagonalseptima.interventoria@gmail.com y al correo del área de seguridad y salud ocupacional interventoria.db@gmail.com.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Elaboró:Profesional SST

1752

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Administración Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SÉPTIMA

Ricaurte, 31 de enero de 2024

ID7R-060

Doctora
YEIMY PAULINA MENDOZA
Gerente
ALCARÍ SAS ESP
Ricaurte, Cundinamarca.

Referencia. **Contrato de Obra No. 403 de 2023 – "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"**

Asunto: **SOLICITUD DE COMITÉ TÉCNICO EN OBRA.**

Cordial saludo,

Mediante el presente, se solicita amablemente llevar a cabo comité técnico en el tramo en intervención, el día Jueves **01 de febrero de 2023** a las **07:00 am**, con el propósito de dar a conocer las situaciones presentes en campo de las acometidas sanitarias y pluviales de la diagonal séptima, de acuerdo a la definición emitida por su parte a través del comunicado A.S.A.S.E.S.P. 014-2024. Por lo cual, es necesario contar presencia del personal técnico de la empresa operadora del servicio.

Sin otro particular,

Cordialmente,

Paola A. Rodriguez A.

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Cr 5 #11-24 Of 802 Edificio Torre Empresarial (+57) 320-7486 - 3123065921
diagonalseptima.interventoria@gmail.com

1753

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 31 de enero de 2024

ID7R-061

Doctor
CARLOS MARIO RICARDO CORTES
Secretario de Gobierno
Ricaurte, Cundinamarca.

Referencia. **Contrato de Interventoría No. 413 de 2023 – "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"**

Contrato de Obra No. 403 de 2023 – "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"

Asunto: **SOLICITUD DE APROBACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO.**

Cordial saludo,

Mediante el presente, esta interventoría solicita amablemente aprobación del plan de manejo de tránsito para el desarrollo del contrato de obra pública No. 403 de 2023 – "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA", ante los ajustes presentados en los comités técnicos del mes de enero.

Finalmente, se informa que la documentación remitida es avalada por la presente interventoría, Sin embargo, ante los lineamientos municipales establecidos, es necesario contar con su respectiva aprobación.

Se anexa al presente:
Oficio CDRC7-2024-024
Plan de Manejo de Tránsito (Folios 31)

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Cr 8 #11-04 Of 802 Edificio Torre Empresarial (608) 263-7486 - 3153065901
diagonalseptima.interventoria@gmail.com

1754

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría Técnica, Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 01 de febrero de 2024

ID7R-062

Señor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
Consorcio Diagonal RC
Representante Legal
Espinal, Tolima

Referencia. **Contrato de Obra No. 403 de 2023 – "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Asunto: **EN ATENCIÓN Y RESPUESTA AL COMUNICADO CRC7-2024-025**

Cordial saludo,

Mediante el presente, esta interventoría agradece la atención al comunicado anterior ID7R-059 e informa que, una vez validado el correo en relación, se evidencia que en el anexo S20 se encuentra con la información requerida del mes de diciembre. Sin embargo, se aclara al CONSORCIO DIAGONAL RC, que los soportes de pago de seguridad social y afiliaciones de nuevo personal independiente de su modalidad de contratación deben ser remitidas de acuerdo a los tiempos establecidos en el oficio ID7R-006 del día 19 de octubre de 2023 y no hasta la fecha de remisión de revisión y verificación del informe mensual.

Ante lo mencionado anteriormente, las afiliaciones de ingreso del personal nuevo deben ser adjuntadas al correo de interventoria.db@gmail.com; un día antes de iniciar actividades para su verificación.

Por lo cual, se solicita al CONSORCIO DIAGONAL RC, dar cumplimiento en los tiempos de entrega, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, teniendo en cuenta que, la fecha de remisión del archivo excede el tiempo de presentación del informe mensual del periodo.

Finalmente, esta interventoría agradece la atención prestada e informa que se encuentra en disposición para mejorar los canales de comunicación y atención al área de seguridad y salud en el trabajo, en pro de trabajar mancomunadamente por el desarrollo del objeto contractual.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Elaboró: Profesional SST

1755

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 07 de febrero de 2024

ID7R-063

Señor
VICTOR ALFONSO UBAQUE RODRIGUEZ
Vocero comercial de Ricaurte
Ricaurte, Cundinamarca

Referencia. **Contrato de Interventoría No 413 de 2023 — "INTERVENTORIA TECNICA ADMINITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"**

Asunto: **EN ATENCIÓN Y RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN INTERPUESTO.**

Cordial saludo,

En atención al **DERECHO DE PETICION,** interpuesto por el señor Víctor Alfonso Ubaque Rodríguez, líder y vocero de los comerciantes, de la diagonal séptima, se remite respuesta a cada punto descrito en el mencionado documento.

1. **De acuerdo a la solicitud de que se realice de manera urgente y durante el proceso que dure la intervención de la diagonal séptima en los sectores que levanten polvo o polvillo el RIEGO DE AGUA 2 (DOS) VECES AL DÍA,** se informa que Se da inicio al riego por la vía desde la carrera 14 hasta la carrera 16, este riego se efectúo una vez al día en el horario de 11: 30 am a 2:30 pm. Desde el día 20 de enero, hasta el día 01 de febrero.
   Se da a conocer también que desde la fecha se realizara día de por medio. Cabe resaltar que dicho horario se encuentra sujeto a cambios por factores externos al consorcio diagonal RC, sin embargo y eventualmente si llegase a presentarse algún tipo de modificación adicional se notificara a la comunidad, por los canales informativos ya establecidos WhatsApp, veedurías y de manera presencial, tal y como se ha venido realizando.

2. **Se intervenga y tape el tramo entre la carrera 14 b y carrera 15 sobre la diagonal séptima,** se informa que El personal correspondiente al consorcio Diagonal RC realiza, intervención, mediante nivelación y compactación del material instalado en el tramo de la carrera 14b a la carrera 15, con el fin de subsanar dicha afectación. a la fecha se encuentra con señalización tal cual como se muestra en los anexos fotográficos. lo anterior con el fin de mitigar accidentes

3. **Correspondiente a incluir en el plan de movilidad del municipio, enviar todo el tráfico pesado sobre la carrera 16 y no sobre la carrera 15 como se presenta de manera habitual,** se sugiere de manera respetuosa que dicha solicitud sea redireccionada al área competente en las instalaciones de la Alcaldía municipal , con el fin de que se pueda contemplar la posibilidad de tramitar, pues esta solicitud no se encuentra al alcance del contratista del Consorcio Diagonal RC , sin embargo se informa, que las volquetas y demás maquinaria de tráfico pesado las cuales se utilizan en el desarrollo de la obra realizan ingreso por la carrera 16, Sin embargo es importante resaltar que a la fecha se está a la espera de la aprobación del plan de manejo de tránsito de acuerdo a las condiciones actualizadas de trabajo por parte de la secretaria de gobierno del municipio de Ricaurte, una

vez se cuente con la aprobación se informará a través de los canales de comunicación establecidos por parte del componente social.

Se anexa el registro fotográfico de lo descrito anteriormente y soporte de acta de la socialización referente al punto número 2.

Finalmente, esta interventoría informa que se encuentra presta en continuar atendiendo el llamado de la comunidad, con el fin de mitigar o contrarrestar situaciones de dificultad las cuales se puedan presentar durante el desarrollo de la obra.

1. **Riego Diagonal 7 desde la 14 b hasta la carrera 16**





1. **Nivelación del tramo de la carreara 14 B**

Antes



Después




Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Seguridad Vial y de Tránsito
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA





2. Acta socialización con los colaboradores conductores maquinaria pesada.

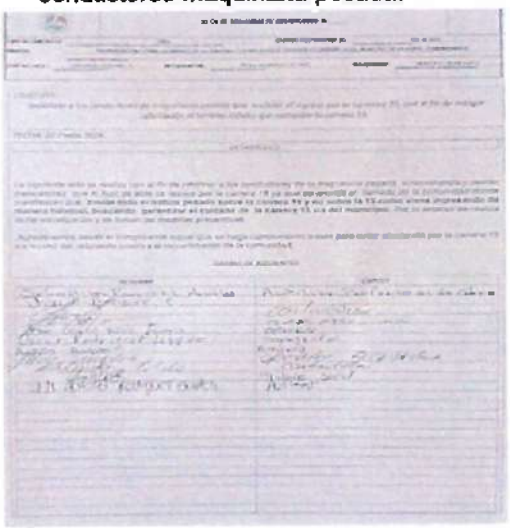

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Elaboró: Profesional Trabajo Social

Se anexa:
1. **Derecho de petición radicado**
2. **Respuesta del CONSORCIO DIAGONAL RC (Contratista de Obra)**

1757

Consorcio Diagonal RC

Ricaurte, Febrero 7 de 2024

CDRC7-2024-030

SEÑOR:
Víctor Alfonso Ubaque Rodríguez
Vocero Comercial Del Municipio

REFERENCIA: Contrato de obra pública 403-2023 el cual tiene por objeto la "PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16…"

Asunto: *Respuesta. Derecho de petición de fecha 18 de enero de 2024*

Mediante el **DERECHO DE PETICION**, radicado por el señor Víctor Alfonso Ubaque Rodríguez, líder y vocero de los comerciantes, de la diagonal séptima, se da respuesta en los siguientes puntos:

PRIMERO: Se realicen de manera urgente y durante el proceso que dure la intervención de la diagonal séptima en los sectores que levanten polvo o polvillo el RIEGO DE AGUA 2 (DOS) VECES AL DÍA

RESPUESTA: 1. Se realiza el correspondiente riego por la vía desde la carrera 14ª hasta la carrera 16 en el siguiente cronograma:

A. Desde el día 20 de Enero se realiza una vez al día hasta el día 1 de Febrero de 2024.
B. Desde el 3 de febrero en adelante se realiza esta actividad día de por medio en el horario 11: 30am a 2:30pm cabe resaltar que este horario esta sujeto a cambios donde se informara a la comunidad en general por medio de los canales de comunicación whatsapp o volante informativo a la veeduría y comunidad en general las diferentes situaciones su ese puedan presentar

SEGUNDO: Se intervenga y tape el tramo entre la carrera 14B y la carrera 15 sobre la diagonal séptima donde excavaron y dañaron la placas asfáltica sin previa autorización del Interventor, supervisor del contrato ni el mismo contratista ya que este mal proceso lo desarrollo un sub – contratista.

A. En el siguiente tramo ubicado en la 14 b sobre la diagonal 7 del municipio el consocio diagonal RC realiza nivelación, y compactación adicional se encuentran señalizaciones respectivas esto con el fin de mitigar cualquier situación de dificultad.

3. Teniendo en cuenta este punto donde manifiesta que **Por parte del Secretario De Gobierno se pueda incluir en el plan de movilidad del municipio, enviar todo el tráfico pesado sobre la carrera 16 y no sobre la 15.** Se recomienda de manera respetuosa que dicha solicitud sea radicada al área competente en las instalaciones de la Alcaldía municipal, con el fin de que se pueda contemplar la posibilidad de tramitar el transito general ya que este requerimiento no se encuentra al alcance del Consorcio Diagonal RC, sin embargo me permito informarle que las volquetas y demás maquinaria de tráfico pesado que son de uso para el avance y desarrollo de actividades de obra realizan el ingreso carrear 16 presto que se realiza socialización con los profesionales correspondiente que deben transitar por la 15 se puede ocasionar afectación a la vía.

A continuación se anexaran los soportes correspondientes.

Cordialmente,

MAURICIO ALEJANDRO ESPINOSA ALEMAN
Residente de Obra Consorcio Diagonal RC

Consorcio Diagonal RC

Anexos Fotográficos.

1. **Riego Diagonal 7 desde la 14 b hasta la carrea 16**





2. **Nivelación del tramo de la carreara 14 B**

Antes



Después







3. Acta socialización con los colaboradores conductores maquinaria pesada.



1759

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 08 de febrero de 2024

ID7R-064

Ingeniero
HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Alcaldía Municipal de Ricaurte
Cundinamarca

Referencia. **Contrato de Interventoría No. 413 de 2023 – "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"**

Asunto: **EN ATENCIÓN AL COMUNICADO 190.19 No. 062-2024**

Cordial saludo,

Mediante el presente y en atención al comunicado en asunto, esta interventoría informa que a través del oficio ID7R-063 fue atendido el derecho de petición del señor VICTOR A. UBAQUE R, radicado a través del correo electrónico de atención al usuario de nuestro componente social y remitido por su parte el día 22 de enero de 2024.

Por lo anterior, se anexa para su conocimiento:

1. Oficio ID7R-063 de interventoría.
2. Respuesta del CONSORCIO DIAGONAL RC.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Cr 5 #10-24 Of 820 Edificio Torre Empresarial (608) 260-7426 - 3103045921
diagonalseptima.interventoria@gmail.com

1760

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 09 de febrero de 2024

ID7R-065

Ingeniero
HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Alcaldía Municipal de Ricaurte
Cundinamarca

Referencia. **Contrato de Interventoría No. 413 de 2023 – "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"**

Asunto: **NOTIFICACIÓN DE SOCIALIZACIÓN AJUSTE DE DISEÑO A LA COMUNIDAD.**

Cordial saludo,

Mediante el presente y en atención a la solicitud de invitación a la comunidad, esta interventoría informa que se llevo a cabo puerta a puerta y notificación a la comunidad por parte del componente social de obra e interventoría a través de volante informativo y acta de recibido adjunto al presente, así mismo, fue difundida la información mediante los canales de comunicación del componente social con el grupo de veedores y lideres del sector.

Adicionalmente, se informa que de acuerdo a la información remitida se comunico que el dia 12 de febrero de 2024 a las 02:00 pm, se llevará a cabo socialización del proyecto **"PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA",** en atención a los ajustes de diseño presentes a la fecha.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Anexos.
Registro Fotográfico
Acta de Recibido
Volante informativo

Cr 5 #11-64 Of.820 Edificio Torre Empresarial (608) 263-7436 - 3125265921
diagonalseptima.interventoria@gmail.com

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Vías, Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SÉPTIMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO NOTIFICACIÓN E INVITACIÓN SOCIALIZACIÓN













Cr 5 #11-24 Of 602 Edificio Torre Empresarial (608) 250-7436 - 3103065921
diagonalseptima.interventoria@gmail.com

ACTA DE REUNION DE COMUNIDAD N.____

TIPO DE CONTRATO: OBRA — CONTRATO/CONVENIO No. 403 de 2023

OBJETO: PAVIMENTACIÓN Y EMBELECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE -CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO DIAGONAL RC — INTERVENTOR: PAOLA RODRIGUEZ ALCALA — SUPERVISOR: MUNICIPIO DE RICAURTE

OBJETIVO: *Informar al propietario, habitantes, comerciantes, arrendatarios y demás comunidad de la socialización sobre modificación del diseño de obra.*

FECHA: 08 Febrero 2024

DESARROLLO:

Se realiza recorrido desde el centro vacacional ETB hasta la carrerea 16 con el fin de informar a la comunidad en general que se realizara socialización de la modificación al diseño de obra diagonal 7 el próximo Lunes, 12 Febrero a las 2:00 pm lugar casa de la cultura municipal de Ricaurte Cundinamarca. Se notifica la invitación a esta reunión por los diferentes canales de comunicación como grupos de whtasapp Y folleto informativo.

NOMBRE	DIRECCION	CELULAR
Yurelli Zoraida Jimenez Ramirez	Centro Vacacional Ricaurte de la Policia	3204600590
Jose I. Zander Romero	Ferreteria J M.	3132187396.
Amparo Reyes Patiño	Tienda Puerta Amarilla	3142715465
Jose Guzmán	Condominio Portugal de Santa ana	3203338640.
Leydy Nayeth Ramos	La Posada 2	3207900353
Jessica Paola Ferro Ferro	tienda chapool	3232385420
José Rada	Centro Vacacional 95	3183760084.
Luz Danirla Leyton Diaz	Diagonal 7 13 323	314 477 1042
Luis Hernando Castro Tigue	Condominio Terralonga	3209373439
Jesus Mario Campos L.	Diagonal 7 Nº 14-56	3214771655
Angelo Hasbleidy Barrejón	Dig 7 # 14-86	3229465028
Leinnit Palomino b	dig 7 # 14 A	3245989521
Leonardo Cardozo	Dig 7 # 13-336	3024102493
Estefania Bustos	Di 7 # 14 A K.	3214198398.
Julio Rozo Diaz	Di 7 # 11 to 7	3116716514
Abrahan Pardo	Dig 14 A 21	3112327099
Dan Herrera	Dig 7 # 14 A	3154847133
Andrés Camargo	Diagonal 9 # 14 a 51	3197670378.
Mireya Matta G.	Diagonal 7 # 14 A 66	3202935568
Leidy Pena	Diagonal 7 #	314 859 3265
Sandra Milena Ospina	Diagonal 7 # 14A-48	3227785233
Diana Avila	Dg 7 14 A 66	3204359153.
Steven Magallon	Diagonal 7 # 14 A 66	3106130391.
Elody Yohana Pena	Dig 7: 14 A 7 C	3149642638
Yohana Suarez	Dig. 7. 14 A	3118173389
Marquiro Avila J.	Dig 7 # 14 B 01	3115773513
Daisy Rivera	Dig 7 # 14 B-52	3219227995
Brenes Lopez	Diagonal 7 Nº 14-68	3213541696.
Orlando Triana	Dig 7 # 14 A-68	3208351117
Natalia Estrella	Dig 7 # 14 A-68	3142029770
Yury Lorena Ochoa	Diag 7 # 14 A - 80	3006122690

ACTA DE REUNION DE COMUNIDAD N._____

TIPO DE CONTRATO: OBRA CONTRATO/CONVENIO No. 403 de 2023

OBJETO: PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE –CUNDINAMARCA

CONTRATISTA : CONSORCIO DIAGONAL RC INTERVENTOR: PAOLA RODRIGUEZ ALCALA SUPERVISOR: MUNICIPIO DE RICAURTE

NOMBRE	DIRECCIÓN	CELULAR
Sharon Torres	Cra 15 N 6-109	3185308048
Jenny Erazo	Cra Nro 6-104	3165168965
Janet Hidalgo T.	Ferretería trini	3202356955
Jorge A. Galindo G	Diagonal 7 - 15-24	3224681326
Isabela Monroy	Diagonal 7-15-28	3107853217
- Yuri Romero	Restaurante costeño.	3102779890
- Fonsit Cardona	Cr 16-15-01 local 1	3223771568
- VIVIANA TORRENTES	Cr 16-15-07 Local 2	3205678479
- Neyder Quevedo	Cr 16 12 01 Local 3	3214688910
Claudia	Cr 16 12 01 local 4	3002852954

EL CONSORCIO DIAGONAL RC



Contrato de obra pública 403-2023 el cual tiene por objeto la "PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16"

INICIO DE OBRA

se informa a la comunidad en general que se realizara
Socialización de la Modificación al Diseño de Obra Diagonal 7

FECHA LUNES, 12 FEBRERO 2024

HORA: 2:00 PM

LUGAR: CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL DE RICAURTE



Cualquier inquietud puede acercarse o comunicarse con: interventor.atencionalusuario@gmail.com
pardiagonal@gmail.com
Celular **3144110756 - 3104065513**

1764

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Seguridad Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 09 de febrero de 2024

ID7R-066

Ingeniero
HÉCTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Alcaldía Municipal de Ricaurte
Cundinamarca

Ingeniera
ELIANA ANDREA CARVAJAL RICO
Directora de Servicios Públicos
Alcaldía Municipal de Ricaurte

Referencia. **Contrato de Interventoría No. 413 de 2023 – "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"**

Asunto: **SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN ESTADO ACTUAL RED DE ACUEDUCTO 3" – ACUAGYR SAS ESP.**

Cordial saludo,

Mediante el presente, esta interventoría informa que de acuerdo al comité de inspección de campo el día 07 de febrero de 2024 y el compromiso pactado, el día 08 de febrero de 2024 el personal de ACUAGYR SAS ESP, realizó inspección y verificación del estado de la red de agua potable cuyo diámetro es de 3 pulgadas, localizada a una profundidad de 1,00 m en paralelo sobre la calzada derecha del alcance del proyecto.

Durante la presente inspección, se realizo perforación a la tubería y se determinó que no cuenta con flujo hídrico, por lo cual, el personal de ACUAGYR SAS ESP manifiesto que la red no se encuentra en servicio, como se evidencia en el registro fotográfico del comunicado en anexo.

Por lo anterior, solicitamos amablemente se allegue a los intervinientes del proyecto **"PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"**, certificación del estado actual de la red de acueducto correspondiente mediante la cual sea confirmado formalmente la inoperatividad del servicio.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal
Anexos.
Oficio CDRC7-2024-031

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

7.11 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

1766

Ricaurte

190.19 No. 055 - 2024

Ricaurte, 19 de enero 2024

Doctora:
YEIMY PAULINA MENDOZA
Gerente
ALCARI S.A.S E.S.P
Ricaurte – Cundinamarca.

Referencia: Contrato de Obra No. 403-2023 y de Interventoría N° 413-2023 "Pavimentación y embellecimiento de la Diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte - Cundinamarca".

Asunto: Solicitud cumplimiento de compromisos pactados.

Cordial saludo,

De acuerdo a la visita realizada el pasado 12 de enero de 2024 y una vez realizado el recorrido a la obra de la referencia, nos permitimos solicitar cumplimiento a los compromisos pactados en el Acta de Comité adjunta y que se describen a continuación:

COMPROMISOS PACTADOS				
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA EN QUE SE DEBE CUMPLIR		
		Año	Mes	Día
Entrega de diseño y definición de acometidas pluviales y sanitarias de la diagonal septima, incluyendo diámetro y puntos de conexión de las redes existentes.	ALCARI SAS ESP	17	1	2024
Definir el estado actual de la red sanitaria en que sobre la diagonal septima entre la carrera 15 hasta la carrera 14b	ALCARI SAS ESP	17	1	2024

Dado lo anterior y en pro del buen desarrollo del contrato de obra en los tiempos contractuales, solicitamos su respuesta de manera perentoria.

Agradecemos su atención a la presente.

Cordialmente,

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C)

Anexo: Acta de Comité del 12 de enero 2024 (04 folios).

Proyectado por: Ing. Mónica A. Malagón C.
Profesional Universitario de Apoyo SIOP

1767

Paola Rodriguez Alcalá
Tecnóloga Civil
Especialista en Pavimentos Flexibles y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SÉPTIMA

ACTA DE COMITÉ No.

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

INFORMACIÓN BÁSICA

FECHA	: Año 2024 Mes 01 Día 12		
LUGAR	: RICAURTE CUNDINAMARCA	CONTRATISTADE OBRA: CONSORCIO DIAGONAL RC	
HORA INICIO	: 11:00 am	CONTRATO DE OBRA N° : 403-2023	
HORA DE FINALIZACIÓN	: 12:40 pm	OBJETO DE OBRA: "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	: 433-2023 ~~2022~~		
INTERVENTORÍA	: PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ	OBJETO DE INTERVENTORÍA: "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA"	
COORDINADOR ACTA	: JEILY KATHERINE MOTTA TAFUR		
		SUMINISTRO ☐	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐
		CONSULTORÍA ☐	ADMINISTRATIVA ☐
OBJETIVO	: COMITÉ DE OBRA	OBRA ☒	☐

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO EMPRESA	FIRMA
Hector Morales Devia	Secretario de Infraestructura y Obras Publicas (c)	
Sebastian Gonzalez J.	Director de Proyecto y Planificacion	
Maria A Nalagon C.	Apoyo a la Supervisión Municipio	
Jeily Katherine Motta Tafur	Interventoria - cto int. 346 /2023	
Sebastian Ramirez A	Consorcio Diagonal RC	
Yirmi Paulina Mendoza	Gerente Alcan SAS ESP	

OBSERVACIONES AL ACTA ANTERIOR

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN EL ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIÓ SI	CUMPLIÓ NO

Paola Rodriguez Alcalá

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes 01 Día 12

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIÓ	
		SI	NO

TEMAS TRATADOS

De acuerdo a la mesa técnica de socialización y estado actual del proyecto llevada a cabo el día 11 de enero de 2024 en compañía del Alcalde Municipal, Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Secretaria de Planeación, Secretaria de Gobierno,ALCARI SAS ESP,contratista de obra e interventoría, se programa recorrido de inspección en obra para el día 12 de enero de 2024 a las 11:00 am

con el próposito de definir las acometidas pluviales y sanitarias de los predios que aun no se encuentran conectados a la red y/o se encuentran en trámite de proyectos urbanísticos por parte de ALCARI SAS ESP, teniendo en cuenta que, la Secretaria de Planeación el día 19 de diciembre de 2023 remitió bajo oficio 110.19.0469/2023 en atención a la trazabilidad expuesta por el contratista de obra e interventoría.

Siendo las 11:00 am se da inicio al recorrido de inspección sobre la diagonal septima desde la carrera 15 hasta la calle 10, en compañía del Secretario de Infraestructura y Obras Públicas en calidad de Supervisor, profesional de apoyo a la supervisión, Director de Proyectos en representación de la Secretaria de Planeación, Gerente de ALCARI SAS ESP, Contratista de Obra e Interventoría.

En el transcurso del recorrido, se evidencia red sanitaria(antigua) sobre la diagonal septima entre la carrera 15 y carrera 14b en uso, por lo cual, se solicita a la empresa prestadora del servicio ALCARI SAS ESP informar el estado actual de la red y definir si es necesario llevar a cabo reposición y/o rehabilitación de la red.

Se identifica que el predio No. 01 del comunicado 110.19.0469/2023, a la fecha cuenta con las acometidas pluviales y sanitarias, dado que en el mes de diciembre realizo el proceso de conexión a las redes.

Por lo anterior, se solicita a ALCARI SAS ESP definir las acometidas de los predios No. 2, 3,4,5,6 y 7 mencionados por la secretaria de planeación y el predio ubicado sobre la diagonal septima en la esquina del cruce de la carrera 14b (vivero), en el cual se establezca ubicación, puntos de conexión y diámetro de tubería.

En el caso del predio No.02 del comunicado, se solicita a la secretaria de planeación notificar al propietario las consideraciones de acuerdo al desarrollo del proyecto.

Se establecen los compromisos pactados por las partes intervinientes, finalize el comité a las 12:40pm.

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes 01 Día 12

TEMAS TRATADOS CONTINUACIÓN

1770

Paola Rodriguez Alcalá

INTERVENTORIA

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes 01 Dia 12

DECISIONES TOMADAS

ALCARI SAS ESP se compromete a definir las acometidas a más tardar el día miercoles 17 de enero de 2024, para dar continuidad a las actividades y no generar afectación al cronograma de obra.

COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA EN QUE SE DEBE CUMPLIR		
		Año	Mes	Dia
Entrega de diseño y definición de acometidas pluviales y sanitarias de la diagonal septima, incluyendo diámetro y puntos de conexión de las redes existentes.	ALCARI SAS ESP	17	1	2024
Definir el estado actual de la red sanitaria antigua sobre la diagonal septima entre la carrera 15 hasta la carrera 14b.	ALCARI SAS ESP	17	1	2024
Notificación del proyecto al propietario del predio No. 02	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	17	1	2024

PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA : Año 2024 Mes Dia

Por constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en RICAURTE CUNDINAMARCA, a los día(s) del mes de de 2024

Coordinador Acta_____
Firma

Distribución del documento

Original :
Primera copia :
Segunda copia :
Tercera copia :

1771

Ricaurte

190.19 No. 062 - 2024

Ricaurte, 22 de enero 2024

Doctor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
R.L. Consorcio Diagonal RC
Espinal - Tolima

Ingeniera
PAOLA RODRÍGUEZ ALCALÁ
R.L. Interventoría
Ibagué - Tolima

Referencia: Contrato de Obra No. 403-2023 y de Interventoría N° 413-2023 "Pavimentación y embellecimiento de la Diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte - Cundinamarca".

Asunto: Remisión Derecho de Petición Sr. Victor A. Ubaque R. del 18 de enero 2024.

Cordial saludo,

Por medio de la presente esta Secretaría se permite remitir el Derecho de Petición del señor Victor A. Ubaque R. del 18 de enero 2024, para que se sirvan tomar las medidas correctivas necesarias y también de acuerdo a compromisos en reuniones.

Así mismo, y teniendo en cuenta el comunicado ID7R-055 del 19 de enero 2024 emitido por la Interventoría, solicitamos respuesta a cada uno de los 3 puntos del derecho de petición.

Deben tener en cuenta que la respuesta al Derecho de petición cuenta desde el 18 de enero 2024, fecha en la que el señor peticionario les radicó el oficio en físico al contratista de obra y a la Interventoría.

Dado lo anterior, y tomando como fecha de recibido la solicitud desde el 18 de enero 2024, requerimos de su respuesta y solución para más tardar el 30 de enero 2024 para de esta manera nosotros poder dar respuesta de forma oportuna, clara y de fondo al peticionario; en los términos de la Ley 1755 de 2015

Cordialmente,

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C)

Proyectado por: Ing. Mónica A. Malagón
Profesional Universitario de Apoyo SIOP

1772

Ricaurte

190.19. No. 065 - 2024

Ricaurte, 23 de enero 2024

Señores:
ACUAGYR S.A.E.S.P.
Ing. Yan Mauricio Almanza
Gerente técnico
Girardot, Cundinamarca

Referencia: Contrato de Obra No. 403-2023 "Pavimentación y embellecimiento de la Diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte - Cundinamarca".

Asunto: Solicitud revisión tubería de Acuagyr superficial.

Cordial saludo,

De acuerdo a solicitud del contratista de obra Consorcio Diagonal RC mediante comunicado CDRC7-2024-022 del 19 de enero 2024 en el cual manifiesta que durante actividades de cajeo de la vía se están encontrando las redes de acueducto superficial (60-70cm) de profundidad desde la rasante de la vía, sin cumplir la normatividad de acuerdo al Reglamento Técnico para el sector de agua potable y Saneamiento Básico – RAS. Lo anterior, ha venido generando roturas de la red y saturación de la subrasante de la vía.

Agradecemos su pronta atención a lo mencionado, para que de esta manera el proyecto se ejecute en el tiempo contractual.

Cordialmente,

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C)

Anexo: Comunicado CDRC7-2024-022 del 19 enero 2024 (03 folios).

Proyectado por: Ing. Mónica A. Malagón C.
Profesional Universitario de Apoyo SIOP

1773

Consorcio Diagonal RC

Ricaurte, Enero 19 de 2024

CORC7-2024-022

Señores
INTERVENTORIA DIAGONAL SEPTIMA
Atn. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal
Ciudad

No 242
FECHA 19-ENERO-2024
HORA 4:02 PM
FOLIO 03
RECIBIDO

ALCALDÍA DE RICAURTE
Atn. Ing. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Supervisor del Proyecto
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
Ricaurte - Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de obra pública 403-2023 el cual tiene por objeto la "PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16..."
ASUNTO: Tubería Acueducto (Red Acuagyr) superficial

Cordial saludo.

Me permito informar que durante las actividades del cajeo de la vía, el cual a partir del diseño se está realizando a cincuenta (50) cm de profundidad, se están encontrando las redes de acueducto a escasos 10-20cm, esto quiere decir que estas redes fueron instaladas a tan solo 60-70cm de la rasante de vía (ver registro fotográfico adjunto).

Continua la Resolución "Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS"

ARTÍCULO 38. *Profundidades máximas y mínimas para la instalación de tuberías enterradas en las redes de distribución.* La profundidad de instalación de las tuberías que conforman la red de distribución no debe exceder de 1.50 m., medidos desde la clave de la tubería hasta la superficie del terreno.

En cuanto a la profundidad mínima de instalación, se debe cumplir con lo definido en la Tabla 3.

Tabla 3. Profundidades mínimas a cota clave de la tubería

SERVIDUMBRE	PROFUNDIDAD A LA CLAVE DE LA TUBERÍA (M)
Vías peatonales o zonas verdes	0,60
Vías vehiculares	1,00

Referencia 1. RAS, Articulo 38.

Edwin Tijo
19/01/24
4:25 pm

REGISTRO FOTOGRAFIÓ DEL TRAMO AFECTADO

1. Afectación por tubo de agua potable roto saturo el material de la rasante de la via.



2. La red de agua potable que instalo la empresa de Acuagyr, se encuentra a 0.70 metros de la vía por ye motivo la norma dice que la excavación mínima debe estará 1.20 metros y no se está cumpliendo con los parámetros de instalación.



Consorcio Diagonal RC

La normatividad establece que estas tuberías deben esta instaladas como mínimo a un (1) metro de profundidad de la rasante de vía, según lo establece el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, en el artículo 38 (ver referencia 1). A partir de lo anterior se evidencia un error en la instalación de la red en mención y se advierte que debido a esta situación ya se han presentado roturas de la red de acueducto afectando la subrasante y por consiguiente serán necesarias mayores cantidades de excavación y relleno, las cuales no podrán ser atribuidas al contratista de obra.

El consorcio Diagonal RC solicita a través de los canales de comunicación establecidos: Interventoría y Supervisión, que se requiera al operador de la red Acuagyr para que realice la profundización de las redes a la menor brevedad advirtiendo que de no realizarse la profundización se continuarán presentando nuevas roturas a la red en el proceso constructivo de la vía y estos daños al igual que al ya ocasionado no podrán ser atribuidos al Consorcio Diagonal RC.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
Representante Legal

Calle 7 No. 8-54 - Teléfono: 2390025 - 2430155 Espinal - Tolima
e-mail: correspondenciadiagonal7rc@gmail.com

1776

Gmail **INTERVENTORIA VIA DIAGONAL SEPTIMA <diagonalseptima.interventoria@gmail.com>**

AJUSTES DISEÑO DIAGONAL 7

2 mensajes

Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas <obras@ricaurte-cundinamarca.gov.co> 24 de enero de 2024, 5:56 p.m.
Para: orekasas <orekasas@gmail.com>, ingjaviervillamizar <ingjaviervillamizar@gmail.com>, diagonalseptima interventoria <diagonalseptima.interventoria@gmail.com>, Paola <paolacivil@yahoo.es>, diazcivil <diazcivil@yahoo.es>
CC: monicamalagon81 <monicamalagon81@gmail.com>

Ricaurte, 24 de enero 2024

Doctor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
R.L. Consorcio Diagonal RC
Espinal - Tolima

Ingeniera
PAOLA RODRÍGUEZ ALCALÁ
R.L. Interventoría
Ibagué - Tolima

Referencia: Contrato de Obra No. 403-2023 y de Interventoría N° 413-2023 "Pavimentación y embellecimiento de la Diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte - Cundinamarca".

Asunto: **Remisión ajuste Diseño de la vía Diagonal 7 desde K0+00 Club de la Etb a la Cra. 15.**

Remitimos comunicado emitido por Secretaría de Planeación, de acuerdo a compromisos adquiridos en el cual realizan las siguientes aclaraciones:

"(...) - Los arboles que van a hacer parte del proyecto se debe concertar con la Secretaría de Ambiente.
- El diseño de la vía entre la Carrera 15 y 16 se debe revisar teniendo en cuenta los espacios urbanos existentes.
- Cualquier ajuste que se requiera por temas de implantación o de proceso de obra se ajustarán mediante plano récord. (...)"

Además, se remite Plano en autocad para fines pertinentes.

Cordialmente,

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C)
Alcaldía de Ricaurte, Cundinamarca

Proyectó:
Ing. Mónica A. Malagón C.
Profesional Universitario de Apoyo SIOP

Ricaurte

De: "Monaleja Malagon" <monicamalagon81@gmail.com>
Para: "Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas" <obras@ricaurte-cundinamarca.gov.co>
Enviados: Miércoles, 24 de Enero 2024 17:07:29
Asunto: Fwd: AJUSTES DISEÑO DIAGONAL 7

De: "Proyectos" <proyectos@ricaurte-cundinamarca.gov.co>
Para: "obras" <obras@ricaurte-cundinamarca.gov.co>
Enviados: Martes, 23 de Enero 2024 10:57:18
Asunto: AJUSTES DISEÑO DIAGONAL 7

Buenos días,

Ingeniero
HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Publicas

El presente correo es para remitir el ajuste al diseño de la vía Diagonal 7 desde el K0+000 Club de la ETB a la Carrera 15 y se aclara lo siguiente:

- Los arboles que van a hacer parte del proyecto se debe concertar con la Secretaria de Ambiente.
- El diseño de la vía entre la Carrera 15 y 16 se debe revisar teniendo en cuenta los espacios urbanos existentes.
- Cualquier ajuste que se requiera por temas de implantación o de proceso de obra se ajustaran mediante plano récord.

Ricaurte	**ING. SEBASTIAN GONZALEZ JIMENEZ** Director de Proyectos y Planificación Estratégica Secretaría de Planeación

NOTA VERDE: No imprima este correo y sus anexos a menos que sea absolutamente necesario. Ahorra papel, ayuda a salvar un árbol y disminuir el calentamiento global.

Valora la vida, haz un uso responsable de los recursos.

DIAGONAL 7 AJUSTE ENERO DE 2024.dwg
23418K

1777

INTERVENTORIA VIA DIAGONAL SEPTIMA
<diagonalseptima.interventoria@gmail.com>
Para: correspondenciadiagonal7rte@gmail.com

25 de enero de 2024,
8:39 a.m.

Cordial saludo,

Mediante el presente correo remito adjunto ajuste de diseño remitido por parte de la supervisión municipal.

Paola Rodriguez Alcalá

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

[Texto citado oculto]

DIAGONAL 7 AJUSTE ENERO DE 2024.dwg
23418K

Ricaurte

190.19. No. 073 - 2024

Ricaurte, 25 de enero 2024

Doctor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
R.L. Consorcio Diagonal RC
Espinal - Tolima

Ingeniera
PAOLA RODRÍGUEZ ALCALÁ
R.L. Interventoria Diagonal séptima
Ibagué - Tolima

Referencia: Contrato de Obra No. 403-2023 y de Interventoría N° 413-2023 "Pavimentación y embellecimiento de la Diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte - Cundinamarca".

Asunto: **Certificación Red antigua combinada de Alcari.**

Cordial saludo,

Mediante la presente remitimos la Certificación emitida por la empresa Alcari S.A.S.E.S.P. sobre la red antigua combinada desde el K0+000 Club de la ETB de la Diagonal 7 hasta la Cra. 14B.

De acuerdo a certificación de Alcari en la cual recomienda el retiro de la tubería en mención a fin de evitar futuras fallas en la estructura del pavimento, por consiguiente, la Supervisión solicita que se tenga en cuenta las cantidades mayores a ejecutar en las actividades necesarias para el retiro y relleno, además deberán tener en cuenta dentro del balance que adelantará el contratista de obra.

Cordialmente,

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C)

Anexo: Certificación Alcari S.A.S.E.S.P.del 24Enero2024 (01 folio).

Proyectado por: Ing. Mónica A. Malagón C.
Profesional Universitario de Apoyo SIOP

1779

Alcari S.A.S. E.S.P.	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE S.A.S E.S.P – ALCARI S.A.S E.S.P	FR-GET-001
		Fecha Aprob: 05/09/2023
		Versión.02

CERTIFICACIÓN

La gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Alcantarillado y de Acueducto del Municipio de Ricaurte S.A.S. E.S.P. - ALCARI S.A.S. E.S.P., en visita de inspección realizada el día de hoy 24 de enero del presente año, se encontró una red antigua combinada desde el K0+00 de la obra de la pavimentación de la diagonal 7 hasta la Cra 14B con una proximidad al separador, la cual ya no se encuentra en uso y por tanto se recomienda retirarla a fin de evitar futuras fallas en la estructura del pavimento.

Expedida en Ricaurte – Cundinamarca, a los Veinticuatro (24) días del mes de Enero del año Dos Mil Veinticuatro (2.024).

YEIMI PAULINA MENDOZA PERDOMO
Gerente

Elaborado por:
Ing. Stephanni Olaya
Prof. Universitario Alcari S.A.S. E.S.P.

Revisado por:
Ing. Juan Pablo Avila Lombana
Contratista

1780

Ricaurte

190.19. No. 075 - 2024

Ricaurte, 25 de enero 2024

Señores
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E.S.P. - ETB
César Augusto Quintero Giraldo
Gerente Planta Externa
Bogotá D.C.

Ingeniero I
Juan Fernando Jiménez Tarazona
Equipo Construcción y Gestión Convenios
VP de Infraestructura ETB
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No. 403-2023 "Pavimentación y embellecimiento de la Diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte - Cundinamarca".

Asunto: Solicitud reunión para aclaración daños Red ETB en la Diagonal 7 #13-297 del municipio de Ricaurte - Cundinamarca.

Cordial saludo,

De acuerdo a solicitud del 06 de diciembre 2023 realizada por el Ingeniero Juan Fernando Jimenez Tarazona del equipo construcción y gestión convenios VP de infraestructura de la ETB sobre los daños o afectaciones a la tubería de la ETB ubicada en la diagonal 7 #13-297 del municipio de Ricaurte – Cundinamarca, se evidencia seguimiento y visita en sitio a la solicitud, mediante la trazabilidad del presente correo.

Dado lo anterior y en aras de solucionar lo mencionado y definir la ubicación de la red de telecomunicaciones a lo largo del tramo en ejecución, solicitamos una reunión presencial para la próxima semana, teniendo en cuenta el desarrollo del contrato.

Agradecemos su pronta respuesta,

Cordialmente,

ING. HECTOR **DANIEL MORALES DEVIA**
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C)

Proyectado por: Ing. Mónica A. Malagón C.
Profesional Universitario de Apoyo SIOP

1781

Alcari SAS ESP
NIT 900.639.486-4

Ricaurte, Enero 22/24

A.S.A.S.E.S.P. 014-2024

Señores:
Secretaría de Infraestructura y O.P.
Atn. Ing. Héctor Morales Devia
Secretario.
Ciudad.

397
FECHA 29-Enero-2024
HORA 8:50 AM
RECIBIDO 02Folios Y 01 Planos

Ref. Pavimentación y embellecimiento de la Av. Diag.7

Asunto: Definición de acometidas sanitarias y pluviales.

Cordial saludo,

En atención al asunto se realizó visita de inspección a las obras de pavimentación de la Av.Diag.7 a fin de identificar aquellos predios que se encuentran en proceso de desarrollo o próximos a desarrollar, según oficio # 110.19.0469/ 2023 de la Secretaría de Planeación de fecha Diciembre 19/23, y que aún no cuentan con las acometidas sanitarias y pluviales.

DEFINICIÓN DE LAS ACOMETIDAS SANITARIAS Y PLUVIALES:

Una vez verificadas las áreas de los proyectos a desarrollar se procedió con el trazado y determinación de los diámetros aproximados para las acometidas sanitarias y pluviales de los predios identificados como # 2 y 3.

Los predios identificados como # 4 y 5 deberán ser objeto de estudio en función del uso del suelo por parte de la Secretaría de Planeación Municipal por lo cual se deja pendiente la definición de las acometidas.

Los predios identificados como # 6 y 7 deberán ser objeto de estudio en función del uso del suelo por parte de la Secretaría de Planeación Municipal por lo cual se deja pendiente la definición de las acometidas.

De conformidad a los compromisos pactados en el acta de comité técnico de fecha Enero 12/24 se hace entrega de los siguientes documentos:

1. Plano del trazado y localización de las acometidas sanitarias y pluviales para los predios identificados como # 2 y 3 incluyendo la especificación del material de la tubería y el diámetro de la misma. La pendiente y el detalle constructivo de

Eduardo Tijerino
29/01/24
10:48 am

Alcari S.A.S E.S.P.
NIT. 900 639.486-4

conexión de las acometidas en cada red deberá sujetarse a la norma RAS actualizada.

1.1. Para el predio identificado como # 2 se recomienda coordinar con la Secretaria de Planeación Municipal los perfiles transversales de las futuras vias de cesión en colindancia con el predio # 1 y el proyecto Puerto Azul de la Constructora CONCONCRETO.

2. Certificación del estado actual de la red sanitaria ubicada sobre la Diag.7 entre los siguientes tramos; según catastro de redes actualizado:

Tramo 1: Entre CR- 14B y CR - 15.
Tramo 2: Entre CR- 15 y CR- 16.

3. Propuesta de rehabilitación de los tramos 1 y 2 de conformidad al plan de rehabilitación de redes sanitarias del PMA

3.1. Rehabilitación tramo - 1:

Se propone rehabilitar el tramo en tubería PVC NOVAFORT con diámetro, D = 8" y con flujo en el sentido desde la CR 15 hasta la CR- 14B.

3.2. Rehabilitación tramo - 2.:

Se propone rehabilitar el tramo en tubería PVC NOVAFORT con diámetro D = 8" y revisar el sentido del flujo en dicho tramo de acuerdo a las cotas de entrada en la conexión existente sobre la CR- 16.

Hasta otra oportunidad,

YEIMI PAULINA MENDOZA PERDOMO
Gerente.


Anexos:


* Plano de localización de las acometidas
* Certificación del estado actual de la red sanitaria en los tramos 1 y 2 de la Diag.7.

Proyecto: Ing. Juan Pablo Ávila Lombana
Contratista. asesor de supervisión
Contrato de PSP # 04/24.

1783



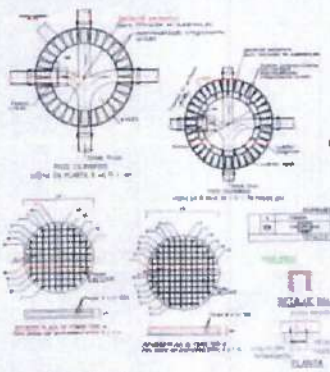





CONDOMINIO TERRALONGA

ALAMEDA DEL SOL - ETAPA -2

MUNICIPIO:
NEMOCÓN - CUNDINAMARCA

CONTENIDO:
PLANO DEL TRAZADO Y LOCALIZACIÓN DE LAS ACOMETIDAS SANITARIAS Y

Consorcio Diagonal RC

CDRC7-2024-024

Ricaurte, Enero 31 de 2024

Ingeniera
PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
Interventoría
Ricaurte - Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de obra pública 403-2023 el cual tiene por objeto la "PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16..."

Asunto: Respuesta a Oficio ID7R057 – Solicitud Ajuste Plan Manejo de Transito – PMT.

Cordial saludo.

Con la presente comunicación el Consorcio Diagonal RC, en respuesta al Oficio de la Interventoría relacionado en el Asunto, remitimos adjunto para su Revisión y fines pertinentes el ajuste solicitado al "Plan de Manejo de Transito – PMT", lo anterior en virtud al cumplimiento para identificar y dar a conocer las rutas de acceso y evacuación de los vehículos de trafico pesado (Volquetas y Maquinaria Amarilla).

Cordialmente,

MAURICIO A. ESPINOSA ALEMAN
Residente de Obra Consorcio Diagonal RC

Anexos; PLAN MANEJO TRANSITO – PMT .V2
Copia: N/A

1785

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE OBRA
N° 403 DE 2023

CONTRATISTA
CONSORCIO DIAGONAL RC

RICAURTE, CUNDINAMARCA.
V2 - ENERO, 2024.

Contenido

1 INTRODUCCION 3
2 OBJETIVOS 4
3 OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 4
4 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 4
5 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 4
6 METODOLOGIA 5
7 RECOLECCIÓN INFORMACIÓN BASICA 6
8 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO A EJECUTAR 6
8.1.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO 6
8.1.2 TIPO DE OBRA 6
8.1.3 TIEMPO DE EJECUCION 7
8.1.4 MAQUINARIA A EMPLEAR 7
9 INVENTARIO DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 7
10 DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO 8
11 MANEJO DEL TRANSITO VEHICULAR PARTICULAR 8
11.1.1 DELINEADORES TUBULARES SIMPLES 10
11.1.2 DELINEADORES TUBULARES COMPUESTOS 11
12 MANEJO DEL TRANSITO PEATONAL 12
13 SECUENCIA DE LA OBRA 12
14 SECUENCIA: 13
15 SEÑALIZACION 18
15.1 SEÑALES PREVENTIVAS 18
15.2 SEÑALES REGLAMENTARIAS 19
15.3 SEÑALES INFORMATIVAS. 20
15.4 DISPOSITIVOS PARA CANALIZACION DEL TRANSITO 21
15.5 DISPOSITIVOS LUMINOSOS 21
15.6 REFLECTORES 22
15.7 LUCES DE IDENTIFICACION DE PELIGRO (LUCES INTERMITENTES) 22
15.8 DISPOSITIVOS MANUALES 22
15.9 BANDERA 22
15.10 BANDERERO 22
15.10.1 SIGNIFICADO DE LAS INDICACIONES DEL BANDERERO. 23

15.11 PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO 23
15.12 AUXILIAR DE TRANSITO 23
15.12.1 PERSONAL A CARGO DE SEÑALIZACION 23
16 DIAGRAMA DE RUTAS ALTERNAS DE TRANSITO EN EL SECTOR INTERVENIDO 24
17 PUESTA EN MARCHA DEL PMT 29
17.1 Disponibilidad e instalación de los elementos contemplados para el plan. 29
17.2 Plan de coordinación de participantes en el plan. 29
17.3 Previsión para ajustes en campo del PMT. 30
18 INFORMACION Y DIVULGACION DEL PLAN 30
19 CONTROL Y SEGUIMIENTOS DEL PMT 30

1 INTRODUCCION

El presente documento enmarca la necesidad de la pavimentación y embellecimiento de la diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte, teniendo en cuenta que el estado actual de esta vía no permite el transito adecuado para los vehículos que se transportan por esta y no brinda las condiciones óptimas para los peatones que se movilizan por este sector.

Realizar estos trabajos mejorarían el flujo vehicular y peatonal ya que esta vía es el acceso principal al centro del municipio. Y evitaría congestión vehicular en temporadas festivas cuando se multiplica los visitantes al municipio.

En el marco del proyecto denominado **PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA** es de gran importancia definir y establecer el orden de intervención que debe seguirse durante las actividades de obra con el fin de coordinar el plan vial para la optimización y uso de las vías alternas a fin de disminuir la afectación de la ciudadanía durante los cierres de vías requeridos para la ejecución del proyecto.

2 OBJETIVOS

3 OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

El Objetivo de este capitulo es el de mitigar el impacto por las obras durante la construcción del proyecto, con el propósito de brindar un ambiente seguro, limpio, ágil a los conductores, pasajeros, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, bajo el cumplimiento de las normas establecidas para la regulación del tránsito.

4 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

- Proteger la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores.
- Evitar en lo Posible la restricción de los flujos vehiculares y peatonales.
- Ofrecer a los usuarios una señalización clara y de fácil interpretación, que les facilite la toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura.
- Implementar rutas alternativas con elementos de control y operación del tránsito, para permitir al transporte público, particular y escolar, la optimización de distancias y tiempos de recorrido acuerdo con el desarrollo de ejecución de las obras.
- Prestar atención continua a la seguridad en las vías dentro del área de influencia de las obras en ejecución.

5 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Las estrategias para el manejo temporal del tránsito por obras civiles deben apoyarse en los siguientes fundamentos:

- La seguridad de los usuarios en áreas de control temporal del tránsito, debe ser un elemento integral y de alta prioridad de todo el proyecto.
- La circulación vial deberá ser restringida u obstruida lo menos posible.
- Los conductores y peatones deben ser guiados de manera clara mediante dispositivos, mientras se aproximan y atraviesan la zona de las obras.
- Con el propósito de asegurar niveles de operación, aceptables, se deben realizar inspecciones rutinarias de los elementos de regulación del tránsito.
- Debido al incremento potencial de riesgo, durante la regulación temporal del tránsito, la seguridad en la zona debe tener constante atención.
- Para la toma de decisiones de trabajo, cada persona, cuyas acciones afectan el control temporal del tránsito, debe recibir entrenamiento


adecuado, desde el nivel superior del personal administrativo hasta el personal de campo.

- La regulación del tránsito a través de las áreas de trabajo, es una parte esencial en la ejecución de obras.

Es importante considerar la difusión de los trabajos por desarrollar, con el propósito de que se tenga un conocimiento por parte de los usuarios de las vías y los habitantes de la zona.

6 METODOLOGIA

La Metodología del Plan de Manejo del Tránsito, se desarrolla de acuerdo al Manual de Señalización Vial 2015, y se clasifica en categoría III, de acuerdo a las intervenciones que se requiere adelantar para la ejecución del Proyecto.

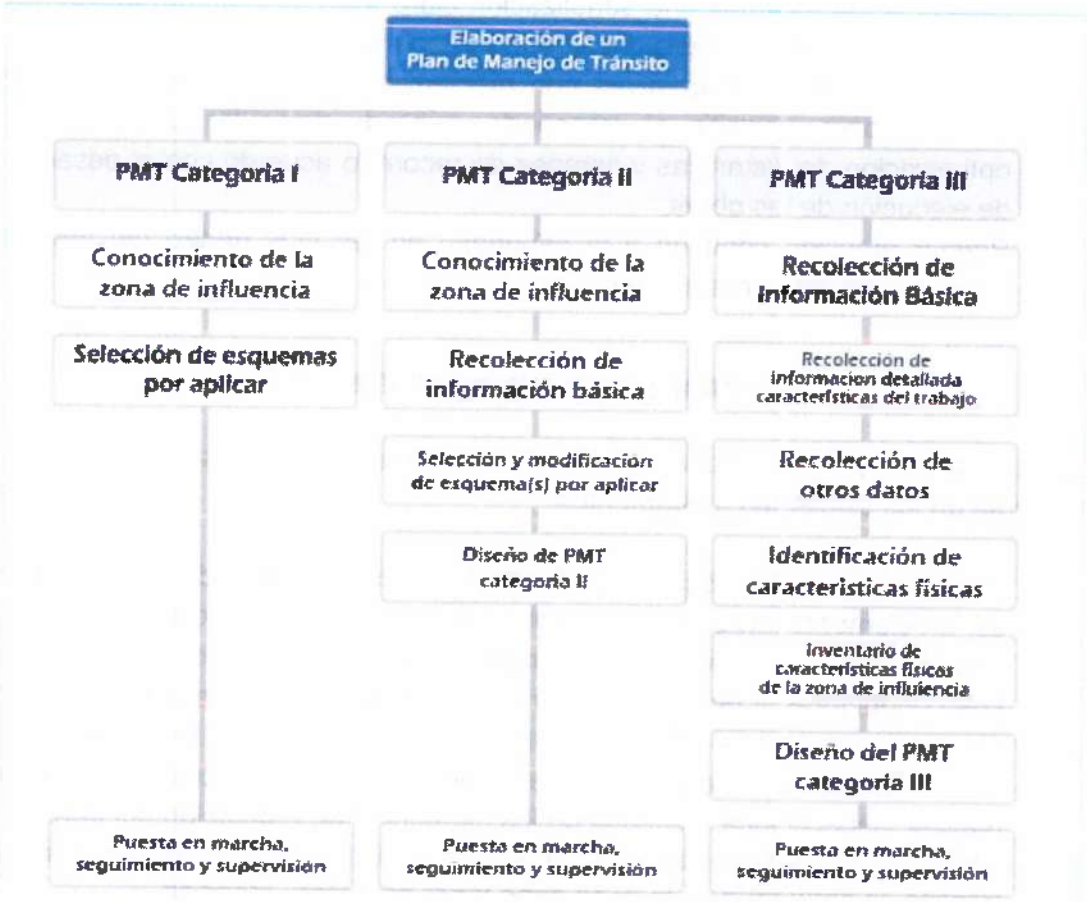

Fuente: Manual de Señalización Vial – Dispositivo para la regulación del tránsito, en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia versión 2015

7 RECOLECCIÓN INFORMACIÓN BASICA

8 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO A EJECUTAR.

8.1.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El Proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Ricaurte Departamento de Cundinamarca, en la zona urbana del municipio, barrio centro en la diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16".



Ilustración 1. Ubicación

Fuente. Googlemaps.

8.1.2 TIPO DE OBRA

El desarrollo del proyecto comprende en forma general las siguientes actividades: Localización y Replanteo, excavaciones, cargue y retiro de materiales provenientes de excavaciones y demoliciones, instalación de materiales seleccionados para la estructura de la vía.

8.1.3 TIEMPO DE EJECUCION

El tiempo de construcción de las obras estimado en siete (7) meses a partir del acta de inicio del Contrato de obra y previa autorización de la Interventoría. Circunstancias no contempladas o imprevistas podrían afectar la duración prevista para el contrato.

8.1.4 MAQUINARIA A EMPLEAR

De manera general en la construcción del proyecto se empleará la siguiente maquinaria: una retroexcavadora, un minicargador, un vibro compactador, volquetas, mezcladoras, saltarines, herramienta menor, cortadoras y compresores.

9 INVENTARIO DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

VIA DE LA DIAGONAL 7 ENTRE LA CALLE 10 Y CARERAR 16 DEL CENTRO DE RICAURTE.

CARACTERISTICAS	DESCRIPCION
Señalización vial existente.	Si
Estado de las vías.	Concreto flexible
Clasificación.	Zona urbana
Número de carriles.	dos
Dispositivos de control.	Señales de prioridad, en el inicio y final de obra
Sentidos del flujo vehicular.	Esta vía cuenta con dos sentidos de flujo vehicular
Rutas y paraderos de transporte público	transporte público urbano y veredal
Limites velocidad.	
Restricción de estacionamiento en las vías.	No Aplica
Restricción para vehículos pesados (cargue y descargue).	No Aplica
Lugares de estacionamiento en la vía pública y fuera de ella.	No Aplica

Tipo y estado del pavimento.	Concreto asfaltico en mal estado
Pasos peatonales existentes.	No cuenta con paso peatonal
Ubicación de zonas comerciales, institucionales, educativas o de salud, que concentren volúmenes vehiculares y peatonales considerables en determinados períodos o a lo largo del día.	SI
Sección vial del tramo afectado por las obras y del habilitado para la circulación vehicular y/o peatonal y/o ciclista.	Vía Diagonal 7 Entre Calle 10 Y Carrera 16 Tiene un ancho promedio de 13.00 m

10 DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO

El Plan general de manejo del tráfico tiene como objetivo mitigar el impacto que puedan ejercer las obras del proyecto de acuerdo con los lineamientos establecidos en el manual de señalización del ministerio de transporte y lo relacionado en los planes de manejo de tráfico y el tipo de zona de influencia para obras de interferencia moderada como lo es este proyecto.

11 MANEJO DEL TRANSITO VEHICULAR PARTICULAR

Para efectos de contrarrestar los impactos negativos sobre la circulación vehicular particular que inevitablemente se generan en el desarrollo de una obra y teniendo en cuenta que el tipo de obras que se van a ejecutar requieren de una intervención en todo el ancho y largo del tramo de intervención, este PMT contempla el cierre total por tramos de manera parcial, total y secuencial con el fin de proporcionar alternativas de circulación a la comunidad durante el tiempo de elección del proyecto.

El manejo de tránsito se realizará de acuerdo con lo programado en el cronograma de actividades de obra el cual deberá estar aprobado en su momento por la interventoría del proyecto.

En el esquema del PMT se refleja la situación de flujo de tránsito que actualmente se dispone, y que es funcional para la ejecución e intervención de los tramos para el proyecto, en el caso que se requiera el contratista y la interventoría dispondrán de la programación de las actividades para cierres parciales de las vías, y se utilizará todos los dispositivos y personal necesario para garantizar la seguridad a la población. *(Flujos Ver esquema PMT)*, teniendo en cuenta que para el PMT del proyecto se fundamenta en los lineamientos del Manual de Señalización INVIAS 2015, se pude indicar el profesional encargado del documento técnico del PMT adopta el (esquema típico 8 –Cierre de calzada con desvío de la ruta, como lo indica a continuación la gráfica.) Esquema Típico 10 - Cierre de carril en vía bidireccional pero con bajo nivel de tránsito, como lo indica a continuación la gráfica. Pag 580

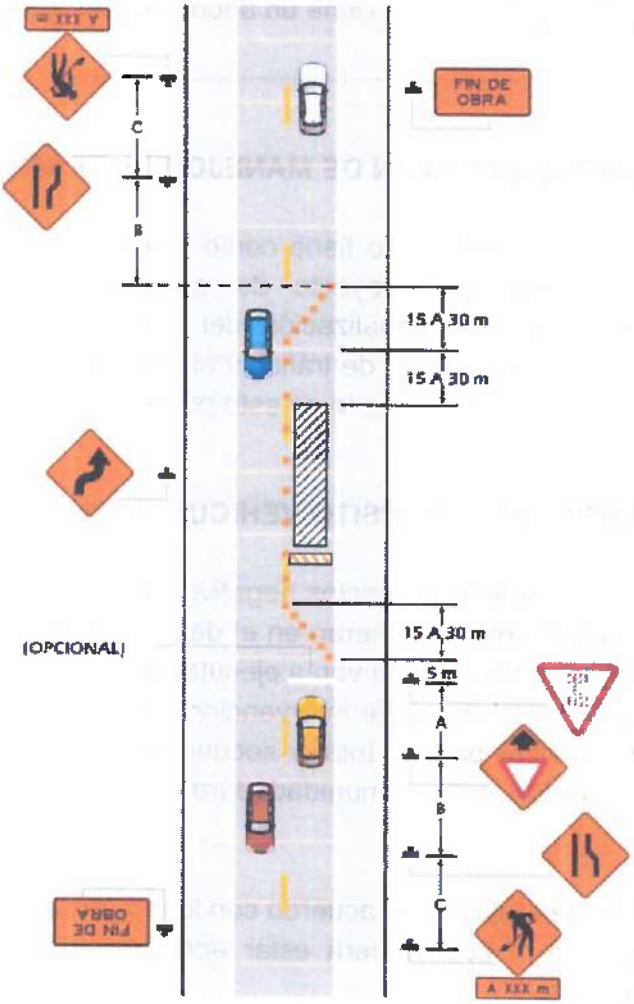


Ilustración 2. Esquema Típico 10

Notas:

1. Ver Tablas 4-12 y 4-13 para conocer simbología y significado de las letras.
2. Las demarcaciones se muestran para facilitar el entendimiento del esquema
3. y no son parte de la señalización de obra.
4. El PMT indicará la velocidad máxima por definir y cualquier otra señal.

11.1.1 DELINEADORES TUBULARES SIMPLES

Estos dispositivos pueden utilizarse, tanto para definir transiciones por angostamiento como para delinear el borde de la calzada. Los cilindros resultan particularmente apropiados para separar flujos opuestos en una calzada habilitada para el tránsito en dos sentidos, así como para separar dos carriles de tránsito divergente o convergente.

Deben ser construidos en material flexible de goma, pvc u otro material flexible de color naranja con tres bandas blancas retro reflectantes flexibles de características de retrorreflexión superior en su parte superior y cuyas dimensiones mínimas se indican en la Figura 4-12. Su perfil puede ser redondo u ovalado, pero la dimensión menor siempre se orientará paralela al tránsito.

Estos elementos indican la alineación horizontal y vertical de la vía permitiendo a los conductores individualizar el carril de circulación apropiado. Deben ubicarse suficientemente próximos unos de otros, de tal manera que delineen claramente la canalización durante las horas de oscuridad. Cuando se emplean para separar tránsito de flujos opuestos su espaciamiento máximo debe ser de 5 metros. El uso de estos elementos puede hacerse en combinación con otros dispositivos de canalización, siempre y cuando esta sea uniforme.

Su fijación al pavimento debe asegurar que el dispositivo pueda resistir numerosos impactos antes de que se desprenda del piso.



Ilustración 3. Figura 4-12 Delineador

11.1.2 DELINEADORES TUBULARES COMPUESTOS

Estos delineadores se utilizan tanto para definir transiciones como para delinear el borde de la calzada, para hacer cerramientos en obras y para el control de peatones. Tienen como mínimo tres franjas de material retro reflectivo flexible de características de retro reflexión superior, separadas 0,15 m o más; deben contar con un mínimo de dos (2) orificios o pasadores que permitan canalizar cintas plásticas demarcadoras de un mínimo de 0,075 m de ancho y de color predominante amarillo o naranja, que se extiendan a lo largo de la zona señalizada. En la parte inferior deberán anclarse a una base cuya forma garantice la estabilidad del delineador.

Para garantizar la estabilidad y funcionamiento de los delineadores tubulares compuestos, se recomienda una separación máxima entre los tubos de 3 debiendo lastrarse sus bases con arena o agua y/o descargar sacos de arena encima de ellas. Para aumentar la estabilidad del sistema, las cintas plásticas se pueden extender conectándolas a sacos de arena.

Los delineadores tubulares tienen menor área visible que otros dispositivos, por lo que se recomienda utilizarlos en sectores en donde las restricciones de espacio no permitan la colocación de otros dispositivos más visibles.

Los Delineadores Tubulares Compuestos se pueden utilizar para canalización de peatones, un ejemplo de estos se presenta en la Figura 4-13.



Ilustración 4. Figura 4-13 Ejemplo Delineador Compuesto

12 MANEJO DEL TRANSITO PEATONAL

Se dispondrá de dispositivos de canalización en los pasos de las carreras intervenidas, así mismo se dispondrá de los elementos necesarios exigidos por las normas para dar seguridad y accesibilidad a los peatones, se implementarán señales (canalización peatonal) que orienten al peatón.

13 SECUENCIA DE LA OBRA

Para facilitar el manejo de la obra y acorde con la infraestructura disponible, el plan general de manejo del tráfico utilizará la señalización de acuerdo a lo estipulado en las normas del ministerio de transporte y el tránsito municipal, de la siguiente forma:

• Se dispondrá de señales de tipo informativo y de precaución, instaladas en sitios específicos localizadas a lo largo del proyecto, que sirvan para informar de manera general que se construirá determinada obra.

• Se dispondrá de señales del tipo preventivas temporales en el sitio específico donde se desarrollarán en tramo a construir en el día a día del proyecto.

• Se dispondrán de señales del tipo preventivas en los puntos en donde por razones constructivas se deban tener holguras en el desarrollo de las actividades, tales como construcción de Pozos. Una vez socializado el proyecto se procederá con la localización, trazado y replanteo del tramo a ejecutar inicialmente entregados por la Interventoría, los cuales deben tener los permisos o concesiones necesarias para la ejecución de las actividades; previo a iniciación de las actividades se procederá a instalar los elementos informativos respecto a los datos de las obras.

14 SECUENCIA:

Teniendo en cuenta que debido al tipo de actividades que se van a ejecutar como, por ejemplo: instalación de tubería, realización de pozos, conformación de vía, instalación de estructura de vía y pavimento, entre otros, se hace necesario una intervención total de la vía por tramos. De acuerdo a lo anterior se propone el cierre parcial de los tramos anteriormente mencionados de acuerdo a la programación de obra, así:

Total, Aproximado a intervenir: 561.97 ML



Ilustración 5. TRAMOS

TRAMO 1. Diagonal 7 Entre E.T.B Y Carrera 14A (245.00 ML)

ESTADO TRANSITO		MES	INTERVENCION
			Localización y replanteo del proyecto,
	Cierre de la vía.	TERCERO CUARTO	Se iniciará conformación de vía, instalación de material para estabilidad Subbase granular, base granular e instalación de pavimento, terminación del tramo.



Ilustración 6. TRAMO 1

Fuente. Google Earth pro.

TRAMO 2. Diagonal 7 Entre Carrera 14A Y Carrera 14B (125 ML)

ESTADO TRANSITO		MES	INTERVENCION
	Cierre de carril en vía bidireccional	CUARTO QUINTO	Se iniciará conformación de vía, instalación de material para estabilidad Subbase granular, base granular e instalación de pavimento, terminación del tramo.



Ilustración 7. TRAMO 2

Fuente. Google Earth pro

TRAMO 3. Diagonal 7 Entre Carrera 14B Y Carrera 15 (98 ML)

ESTADO TRANSITO		MES	INTERVENCION
	Cierre de carril en vía bidireccional	QUINTO-SEXTO	Se iniciará conformación de vía, instalación de material para estabilidad Subbase granular, base granular e instalación de pavimento, terminación del tramo.



Ilustración 8. TRAMO 3

Fuente. Google Earth pro

TRAMO 4. Diagonal 7 Entre Carrera 15 Y Carrera 16 (95 ML)

ESTADO TRANSITO		MES	INTERVENCION
	Cierre de carril en vía bidireccional	SEXTO-SEPTIMO	Se iniciará conformación de vía, instalación de material para estabilidad Subbase granular, base granular e instalación de pavimento, terminación del tramo.

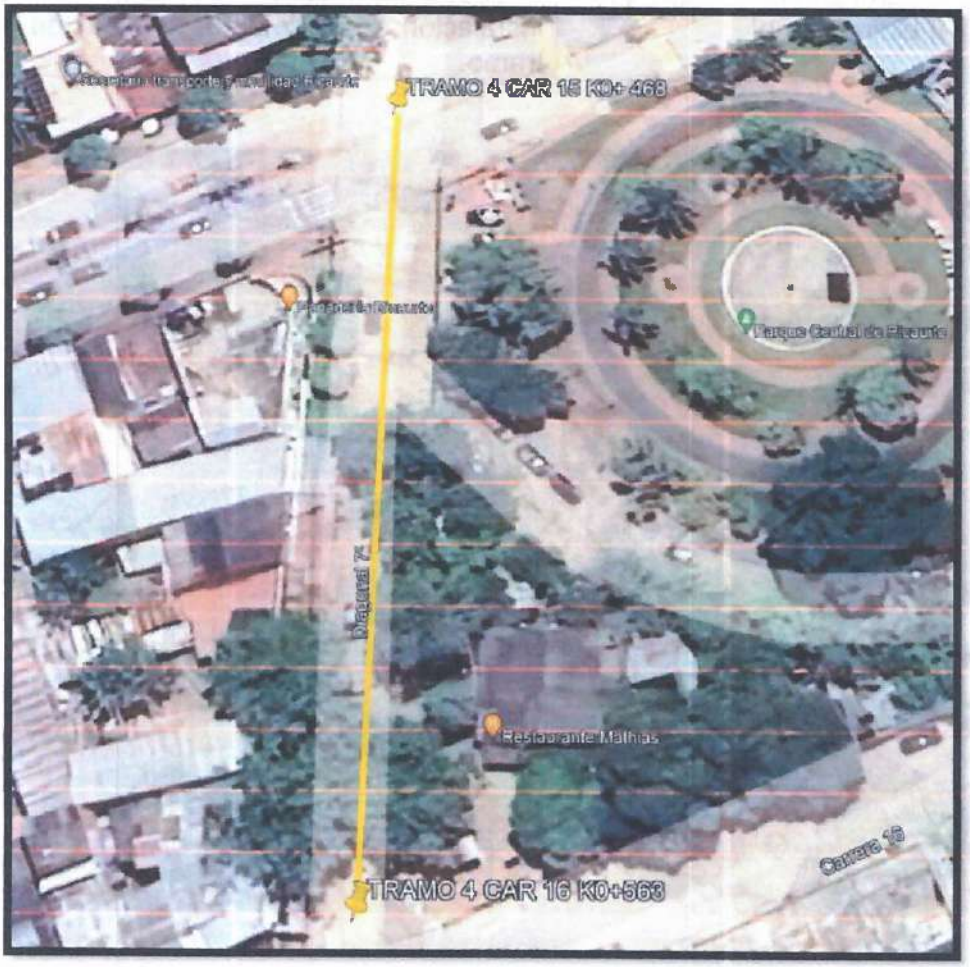


Ilustración 9. TRAMO 4

Fuente. Google Earth pro

15 SEÑALIZACION

Cuando se ejecutan trabajos de construcciones en una determinada vía se presentan condiciones especiales que afectan la circulación de vehiculas y personas.

Para dicha situación se deben implementar medias técnicas apropiadas, que se incorporan a lo largo de la ejecución del proyecto, esto con el objeto de reducir el riesgo de accidentes del flujo vehicular (conductores), el flujo peatonal (transeúntes) y personal de la obra que interviene en el mismo.

Los dispositivos para la regulación del tránsito, en el tramo a intervenir en la vía deberán ubicarse con anterioridad al inicio de la obra, permanecer durante la ejecución de la misma y serán retirados una vez cesen las condiciones que dieron origen a su instalación. Como es el caso de la ejecución de los trabajos de excavación, aguas lluvias que se deben acometer por etapas, deberán permanecer en el lugar solamente las señales y dispositivos que san requeridas. El costo del retiro de la señal de información y preventivas de obra, se encuentran incluidas en los costos indirectos de las obras.

15.1 SEÑALES PREVENTIVAS

Tienen por objeto advertir a los usuarios de la vía sobre peligros potenciales existentes en la zona, cuando existe una obra que afecta el tránsito y puede presentarse un cierre parcial de la vía. Las señales preventivas deberán ubicarse con suficiente anticipación al lugar de inicio de la obra. La señal preventiva tiene forma de rombo y sus colores serán naranja para el fondo y negro para símbolos, textos, flechas y orla. Se colocarán a los lados derecho y/o izquierdo de la vía que se afecte por la obra.

SPO-01 TRABAJO EN LA VIA

SPO-01



Esta señal se empleará para advertir la proximidad a un tramo de la vía que se ve afectado por la ejecución de una obra que perturba el tránsito por la calzada o sus zonas aledañas. *(Localización Ver esquema PMT).*

SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA



Esta señal se empleará para advertir la proximidad a un sector por el que habitualmente circula equipo pesado para el desarrollo de obras. La entrada y salida de maquinaria y vehículos de la obra, se hará previa programación de las actividades y avalada por la Interventoría.

SPO-03. BANDERERO



Esta señal se empleará para advertir a los conductores la aproximación a un tramo de vía que estará regulado por personal de la obra, el cual utilizará señales manuales.

15.2 SEÑALES REGLAMENTARIAS

Los Trabajos en las vías públicas o en zonas próximas a ellas que afecten el tránsito, originan situaciones que requieren atención especial. Si en tales condiciones son necesarias medidas de reglamentación diferentes a las usadas normalmente, los dispositivos reglamentarios permanentes se removerán a se cubrirán adecuadamente y se reemplazarán por los que resulten apropiados para las nuevas condiciones del tránsito. Estas señales se identificarán con el código SRO-Numero.

SRO-01

SPO-03



Esta señal se empleará para notificar a los conductores el inicio del tramo de vía por el cual no se permite circular vehículos, la utilización del personal se hará previa programación de las actividades que se requieran como desvió por cierre parcial, entrada y salida de maquinaria y vehículos pesados a la obra, paso de peatones en canalización peatonal y demás actividades que considere la Interventoría.

SRO-02 DESVIO



Se usará esta señal para reglamentar el paso alternado de los vehículos, cuando se cierre el carril.

15.3 SEÑALES INFORMATIVAS.

SIO-01 APROXIMACION A OBRA EN LA VIA

SIO-01




Esta señal se empleará para advertir a conductores y peatones la aproximación a un tramo de vía afectado por la obra. La señal llevara la leyenda "" obra en la vía".

seguida de la distancia a la cual se encuentra la obra. Se podrá usar conjuntamente con otras señales o repetirla variando la distancia.

Para el caso del Tramo 1 en el nivel de intervención, se empleará el dispositivo adicionando la ubicación de la carrera y margen que se intervendrá *(Localización Ver esquema PMT).*

SIO-02. SIO-03 **INFORMACION DE INCIO O FIN DE OBRA**



Esta señal indicara el inicio de los trabajos en la vía o zona adyacente a ella, con mensaje "INICIO DE OBRA". Igualmente, se instalará otra señal con las mismas características, pero indicando el sitio de finalización de la obra, con la leyenda "FIN DE OBRA" *(Localización Ver esquema PMT).*

SIO-05 **DESVIO**



Esta señal indicara que se aproxima un desvió en la distancia de 100 m, y se empleara de acuerdo al esquema del PMT *(Ver esquema*).

15.4 DISPOSITIVOS PARA CANALIZACION DEL TRANSITO

La función de estos elementos es encauzar el tránsito de la zona de trabajos y marcando las transiciones graduales necesarias en los casos en que se reduce el ancho de la vía o se generan movimientos inesperados. Deberá poseer características tales que no ocasionen daños serios a los vehículos que lleguen a impáctalos.

15.5 DISPOSITIVOS LUMINOSOS

Se emplearán estos dispositivos solamente en horas o en condiciones climáticas adversas, por lo tanto, es necesario complementar las señales verticales y los elementos de canalización con dispositivos luminosos, tales como reflectores, luces permanentes y luces intermitentes o de destello, las utilizaciones de estos dispositivos se harán con previa autorización

15.6 REFLECTORES

Estos dispositivos se usarán cuando se desarrollen trabajos nocturnos para iluminar la zona de trabajo, también para iluminar el bandereo., Se deben tener cuidado e iluminar correctamente el área deseada para evitar el encandilamiento de los conductores.

15.7 LUCES DE IDENTIFICACION DE PELIGRO (LUCES INTERMITENTES)

Serán utilizadas en puntos de peligro como un medio de llamar la atención de los conductores. Las luces de identificación de peligro son de tipo intermitente con luz amarilla, con una lente mínima de 20 cm de diámetro. La activación de las luces intermitentes se hará en horas nocturnas.

15.8 DISPOSITIVOS MANUALES


En este proyecto por sus características puntuales la regulación del tránsito alternado se realizará mediante bandereros y/o paletero en el extremo de la obra.

15.9 BANDERA

Consistirá en un rectángulo de 0.6 por 0.6 m. hecha de metal u otro material rígido cubierto por ambos lados por material reflectante rojo. Irá colocada en un palo de 1.0 m. de largo aproximadamente, pintado de blanco

15.10 BANDERERO

Equipo y significado de sus indicaciones







15.10.1 SIGNIFICADO DE LAS INDICACIONES DEL BANDERERO.

Para detener el tránsito. Se ubicará de frente hacia los conductores que desea detener y extenderá la bandera con la mano derecha, en forma horizontal, con el brazo también extendido en dicha posición. Cuando se hayan detenido los primeros vehículos, puede bajar la bandera en 45º, o dejarla horizontal en un soporte adecuado. Así mismo podrá hacer oscilar la bandera a fin de prevenir o indicar una reducción de velocidad. Para permitir el tránsito, avanzar. Girará hacia la derecha, ubicándose al costado, en forma paralela al movimiento del tránsito, con la bandera y el brazo derecho fuera de la vista del conductor y hará señas con el brazo izquierdo para que avancen los vehículos.

15.11 PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

Los requerimientos de personal y su dedicación durante la ejecución de las obras se muestran a continuación. Además, se incluyen las funciones que deberá desempeñar el personal de acuerdo al cargo.

15.12 AUXILIAR DE TRANSITO

Corresponde al personal encargado de controlar el tránsito de vehículos dentro de la zona de afectación por la obra. Serán los encargados de guiar en forma segura los conductores y trabajadores, estando en contacto directo con la ciudadanía; en consecuencia, para desempeñarse en este cargo, se seleccionará personal capacitado con educación básica secundaria completa, experiencia en obras similares, con buenas relaciones interpersonales, buenos reflejos y reacciones, sentido de responsabilidad, conocimiento de las normas básicas de tránsito, buenas condiciones físicas y mentales. Su dedicación es de tiempo completo.

15.12.1 PERSONAL A CARGO DE SEÑALIZACION

Personal de la obra que estará pendiente dentro de sus funciones de la movilización, ubicación y revisión de la estabilidad de las señales colocadas. Dedicación puede ser parcial dentro de otra función que tengan asignadas en el

frente de trabajo. El plan de manejo del Transito ha de implementarse antes del inicio de obras, por lo que ha de asignarse el responsable de la implementación capacitación y puesta en marcha del mismo, usualmente a cargo del ingeniero residente o el supervisor de la obra, por lo que las señales y quipo mínimo requerido han de estar instalados y disponibles antes del inicio de las mismas.

16 DIAGRAMA DE RUTAS ALTERNAS DE TRANSITO EN EL SECTOR INTERVENIDO

TRAMO 1 – 245.00 ML
La obra a ejecutar en este tramo 1 de la diagonal 7 desde el k+0.00 hasta el k+0.245.00 que llegaría a la carrera 14A, se dejará el acceso garantizado para la comunidad y negocios comerciales que estén ubicados en este primer tramo de la pavimentación de la vía y construcción de andenes, y se dará manejo al personal de obra y comunidad como tal. Sabiendo que el tramo va estar cerrado desde el centro vacacional ETB hasta la carrera 14A del municipio de Ricaurte Cundinamarca.

TRAMO 2 – 125.00 ML
La obra a ejecutar en este tramo 2 de la diagonal 7 desde la carrera 14A k+0.245.00 hasta el k+0.370.00 que llegaría a la carrera 14B, se dejará el acceso garantizado para la comunidad y negocios comerciales que estén ubicados en este primer tramo de la pavimentación de la vía y construcción de andenes, y se dará manejo al personal de obra y comunidad como tal. Sabiendo que el tramo va estar cerrado desde la carrera 14A hasta la carrera 14B del municipio de Ricaurte Cundinamarca.

TRAMO 3 – 98.00 ML
La obra a ejecutar en este tramo 3 de la diagonal 7 desde la carrera 14B k+0.370.00 hasta el k+0.468.00 que llegaría a la carrera 15, se dejará el acceso garantizado para la comunidad y negocios comerciales que estén ubicados en este primer tramo de la pavimentación de la vía y construcción de andenes, y se dará manejo al personal de obra y comunidad como tal. Sabiendo que el tramo va estar cerrado desde la carrera 14B hasta la carrera 15 del municipio de Ricaurte Cundinamarca.

TRAMO 4 – 95.00 ML
La obra a ejecutar en este tramo 4 de la diagonal 7 desde la carrera 15 k+0.468.00 hasta el k+0.562.00 que llegaría a la carrera 16, se dejará el acceso garantizado para la comunidad y negocios comerciales que estén ubicados en este primer tramo de la pavimentación de la vía y construcción de andenes, y se dará manejo al personal de obra y comunidad como tal. Sabiendo que el tramo va estar cerrado desde la carrera 15 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte Cundinamarca. Si en algún momento de las actividades, se presentara flujo continuo:

Las vías tendrán cierres totales, se programarán cierres parciales por el movimiento de equipos y maquinaria de la obra, para el desarrollo de la actividad se programará con personal de la obra (paletero) que realizará el control de tráfico en los periodos de cierre.

RUTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE MAQUINARIA PESADA

Para las rutas de ingreso de la volquetas y maquinaria amarilla, definimos en conjunto con la interventoría, la entrada y salida de volquetas por la calle 10, carrera 16 y carrera 18. El ingreso deber efectuarse por la calle 7 para ingresar a la Diagonal 7. Las vías antes mencionadas son las adecuadas para soportar el flujo de carga pesada (volquetas y maquinaria amarilla).

- **Tramo 1**: El ingreso y salida de maquinaria del Consorcio Diagonal RC, lo realizamos por la calle 10 para conectar con la diagonal 7 para llegar al tramo de la primera fase del proyecto.



- **Tramo 2**; El ingreso y salida de volquetas y maquinaria amarilla del Consorcio Diagonal RC, por la carreara 16 realiza giro en la calle 7 para conectarse a la diagonal 7, la flecha de color rojo define el trazado de ingreso y la flecha de color azul define la salida de las volquetas y maquinaria pesada.




- **Tramo 3**: El ingreso y salida de volquetas y maquinaria amarilla del Consorcio Diagonal RC, por la carreara 18 realiza giro en la calle 7 para conectarse a la diagonal 7, la flecha de color rojo define el ingreso y la flecha de color azul define la salida de las volquetas y maquinaria.




Los Cierres de la vías serán programados en coordinación con la Interventoría y ejecutados por Tramos de cada intervención.

TRAMO 1- K0+000 A LA CARRERA 14A K0+245

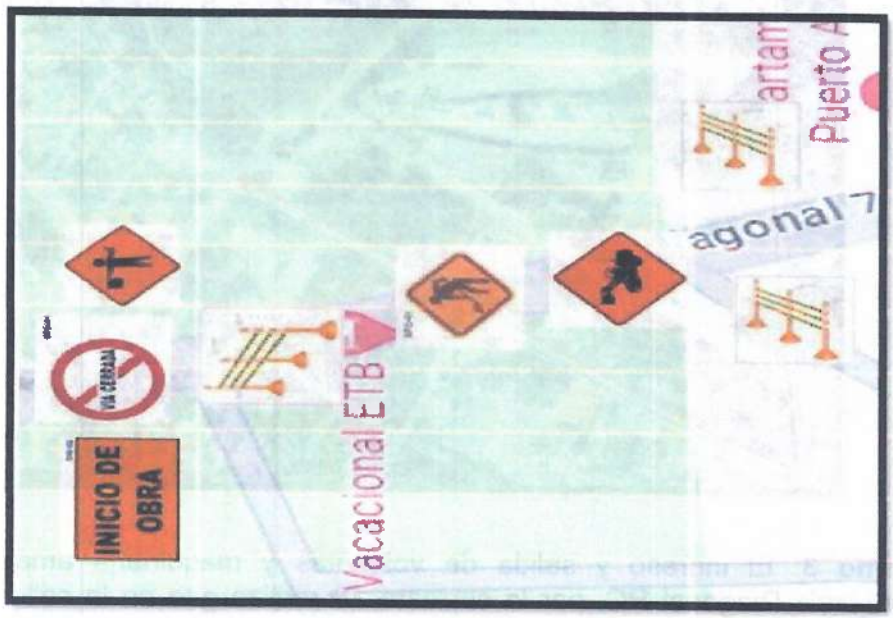

TRAMO 2- CAR 14A K0+245 A LA CAR 14B K0+370

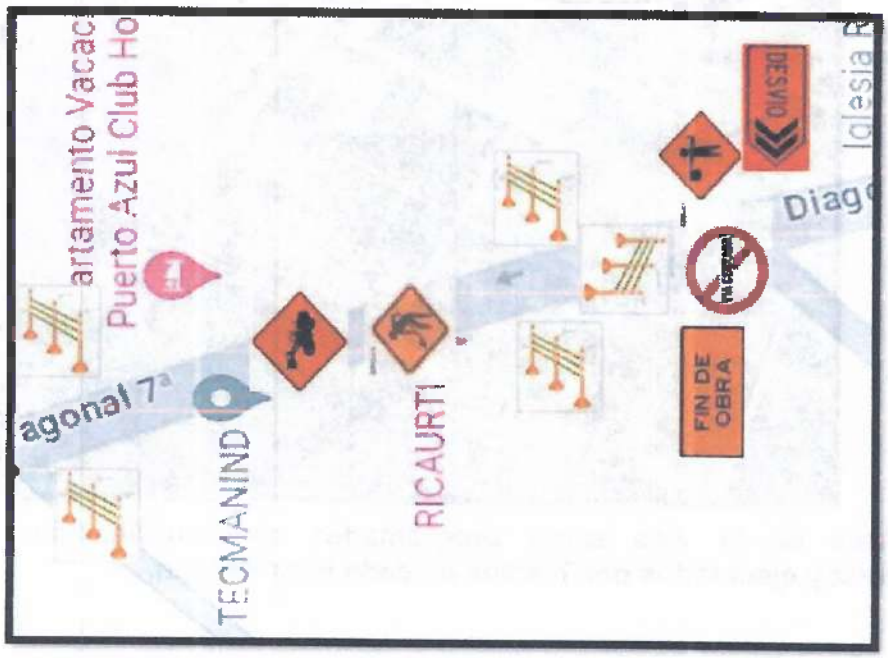

TRAMO 3 - CAR 14B K0+370 A LA CAR 15 K0+468



TRAMO 4 - CAR 15 K0+468 A LA CAR 16 K0+ 563



TABLA DE CRONOGRAMA POR FASES DE PROCESO CONSTRUCTIVO

TRAMO	SECTOR	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
1	**TRAMO DE RED PLUVIAL 243 ML**	x	x					
2	**TRAMO 1 - 245 ML DIAGONAL 7**			x	x			
3	**TRAMO 2 – 125 ML DIAGONAL 7**				x	x		
4	**TRAMO 3 – 98 ML DIAGONAL 7**					x	x	
5	**TRAMO 4 - 95 ML DIAGONAL 7**						x	x

17 PUESTA EN MARCHA DEL PMT

Para la puesta en marcha de deben tener en cuenta varios aspectos, destacándose los siguientes:

17.1 Disponibilidad e instalación de los elementos contemplados para el plan.

La disponibilidad de los elementos se garantiza con la asignación del recurso en el presupuesto general del proyecto.

17.2 Plan de coordinación de participantes en el plan.

Conviene tener definida la forma de comunicación y el programa detallado de responsabilidades y compromisos para el plan.

PARTICIPANTES	ACTIVIDAD	COMPROMISO
Contratista	Puesta en marcha e Implementación del PMT	Implementar el PMT, en cada uno de los componentes. Implementar los elementos y dispositivos planteados.
Interventoría	Seguimiento y control del PMT	Realizar el seguimiento y control de la puesta en marcha del PMT

FUENTE. Propia

17.3 Previsión para ajustes en campo del PMT.

El contratista, Interventoría y profesional de la secretaria de Infraestructura, programarán mesas técnicas con el fin de analizar la puesta en marcha el PMT, donde se estudiarán cada componente que lo contiene.

18 INFORMACION Y DIVULGACION DEL PLAN

Una vez aprobados el plan de manejo de tránsito y señalización para el proyecto **"PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA."** Se adelantará una campaña de divulgación el mismo, con el fin de informar oportunamente a los usuarios del tramo a intervenir, la cual se realizará por medio de piezas de divulgación masiva tales como reuniones, avisos y volantes.

19 CONTROL Y SEGUIMIENTOS DEL PMT

Una vez puesto en marcha el plan de manejo de tráfico, la Interventoría dispondrá del profesional y los elementos necesarios para llevar un adecuado seguimiento y control del mismo. De este seguimiento y de las acciones a realizar durante el mismo, dependerá el buen funcionamiento del PMT.

El contratista deberá elaborar planes de contingencia que le permitan aplicar acciones oportunas que den solución a las diferentes alteraciones al tráfico que puedan presentarse durante la ejecución de la obra.

Cordialmente,

MAURICIO A. ESPINOSA ALEMAN
Ingeniero Residente Consorcio Diagonal RC

1801

Consorcio Diagonal RC

CDRC7-2024-025

Ricaurte, febrero 01 de 2024

Ingeniera
PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
Interventoría
Ricaurte - Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de obra pública 403-2023 el cual tiene por objeto la "PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16..."

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO ID7R-059-CORRRESPONDIENTE AL ÁREA DE SST

A fin de dar respuesta al oficio ID7R-059 referente a solicitud de entrega de soportes de pago de planilla de seguridad Social y afiliaciones del personal adscrito al consorcio diagonal RC me permito informar que:

1. Los soportes correspondientes a pago de planillas y pago de seguridad social del personal adscrito al consorcio diagonal RC correspondientes al mes de diciembre se enviaron el día 29-01-2024, tal como se evidencia en la carpeta de anexos S20.

2. Estos soportes se encuentran incluidos dentro de la matriz PGIO en el anexo S20 vía E-mail la cual fue enviada a la profesional Dennise Barrero del área interventoría SST el día 29-01-2024

3. Desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo se agradece el poder mejorar los canales de comunicación con el fin de optimizar todo lo concerniente al área en mención, lo anterior teniendo en cuenta que lo solicitado por la interventoría de SST ya se había remitido en su momento, cabe resaltar que me encuentro presta a atender y responder cualquier solicitud verbal y presencial en el momento que sea requerido.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
Representante Legal
Elaboro: Yuli Natalia Rodriguez Santos-Aux SST

1802

Consorcio Diagonal RC

CDRC7-2024-026

Ricaurte, febrero 02 de 2024

Ingeniera
PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
Interventoria
Ricaurte - Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de obra pública 403-2023 el cual tiene por objeto la "PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16..."

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO ID7R-062 CORRRESPONDIENTE AL ÁREA DE SST

A fin de dar respuesta al oficio ID7R-062 referente a entrega de soportes correspondientes a afiliaciones y aportes a seguridad social en tiempos establecidos me permito informar que:

1. Se tendrá en cuenta el correo electrónico interventoria.db@gmail.com para enviar los soportes correspondientes a ARL un día antes de iniciar actividades del personal nuevo. sin embargo, los soportes correspondientes de EPS- AFP del personal antiguo y nuevo se podrán remitir se podrán remitir una ves terminado el mes (mes vencido) ya que antes es imposible contar con ellos por tramites internos administrativos.

Cabe resaltar que estos soportes pueden ser verificados desde el componente de seguridad y salud en el trabajo de interventoría de manera presencial en el momento que sea requerido con el fin de optimizar tiempo.

Finalmente remitiré los soportes correspondientes a ARL del personal activo en obra con el fin de rectificar la información, sin otro motivo en particular exceiente día.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
Representante Legal
Elaboro: Yuli Natalia Rodriguez Santos-Aux SST

1803

Gmail

INTERVENTORIA VIA DIAGONAL SEPTIMA <diagonalseptima.interventoria@gmail.com>

Fwd: AJUSTE DE PLANO DIAGONAL 7 SEGUN REMISION PLANEACION

1 mensaje

Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas <obras@ricaurte-cundinamarca.gov.co> 2 de febrero de 2024, 10:52 a.m.
Para: orekasas@gmail.com, ingjaviervillamizar@gmail.com, correspondenciadiagonal7rte@gmail.com, diagonalseptima.interventoria@gmail.com, diazcivil@yahoo.es, paolacivil@yahoo.es
CC: monicamalagon81 <monicamalagon81@gmail.com>

Ricaurte, 02 de febrero 2024

Doctor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
R.L. Consorcio Diagonal RC
Espinal - Tolima

Ingeniera
PAOLA RODRÍGUEZ ALCALÁ
R.L. Interventoría
Ibagué - Tolima

Referencia: Contrato de Obra No. 403-2023 y de Interventoría N° 413-2023 "Pavimentación y embellecimiento de la Diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte - Cundinamarca".

Asunto: **Remisión ajuste Plano en Autocad Diseño de la vía Diagonal 7 desde K0+00 Club de la Etb a la Cra. 15.**

Remitimos comunicado emitido por Secretaría de Planeación, como se cita:

"(...) El presente correo es para remitir el plano ajustado de la Diagonal 7, ajustando perfiles viales y adicionando la placa de concreto texturizada en el empalme del club de la ETB donde termina el pavimento de la concesión denominado K0+000. (...)"

Se remite Plano en autocad para fines pertinentes.

Cordialmente,

Cordialmente,

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C)
Alcaldía de Ricaurte, Cundinamarca

Ricaurte

Proyectó:
Ing. Mónica A. Malagón C.
Profesional Universitario de Apoyo SIOP

-------- Forwarded message --------
De: **Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas** <obras@ricaurte-cundinamarca.gov.co>
Date: jue, 1 feb 2024 a la(s) 5:26 p.m.
Subject: AJUSTE DE PLANO DIAGONAL 7
To: monicamalagon81 <monicamalagon81@gmail.com>

Remito para conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C)
Alcaldía de Ricaurte, Cundinamarca

De: "Proyectos" <proyectos@ricaurte-cundinamarca.gov.co>
Para: "obras" <obras@ricaurte-cundinamarca.gov.co>
Enviados: Jueves, 1 de Febrero 2024 14:43:49
Asunto: AJUSTE DE PLANO DIAGONAL 7

Buenas tardes,

Ingeniero
HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Publicas

El presente correo es para remitir el plano ajustado de la Diagonal 7, ajustando perfiles viales y adicionando la placa de concreto texturizada en el empalme del club de la ETB donde termina el pavimento de la concesión denominado K0+000.

ING. SEBASTIAN GONZALEZ JIMENEZ
Director de Proyectos y Planificación Estratégica
Secretaría de Planeación

NOTA VERDE: No imprima este correo y sus anexos a menos que sea absolutamente necesario. Ahorra papel, ayuda a salvar un árbol y disminuir el calentamiento global.

Valora la vida, haz un uso responsable de los recursos.

DIAGONAL 7 AJUSTE ENERO DE 2024.dwg
21148K

Gmail **INTERVENTORIA VIA DIAGONAL SEPTIMA <diagonalseptima.interventoria@gmail.com>**

Aviso Socialización con comunidad Obra Diagonal séptima el 12 de Febrero 2024.

1 mensaje

Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas <obras@ricaurte-cundinamarca.gov.co> 6 de febrero de 2024, 3:25 p.m.
Para: orekasas <orekasas@gmail.com>, ingjaviervillamizar <ingjaviervillamizar@gmail.com>, correspondenciadiagonal7rte <correspondenciadiagonal7rte@gmail.com>
CC: diagonalseptima interventoria <diagonalseptima.interventoria@gmail.com>, Paola <paolacivil@yahoo.es>, diazcivil <diazcivil@yahoo.es>, monicamalagon81 <monicamalagon81@gmail.com>

Ricaurte, 06 de febrero 2024

Doctor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
Representante Legal
CONSORCIO DIAGONAL RC
Espinal - Tolima

Ingeniera
PAOLA RODRÍGUEZ ALCALÁ
R.L. Interventoría
Ibagué - Tolima

Referencia: Contrato de Obra No. 403-2023 y Contrato de Interventoría
Objeto: "Pavimentación y embellecimiento de la Diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte - Cundinamarca".

Asunto: Aviso Socialización con comunidad Obra Diagonal 7 el 12 de Febrero 2024.

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos hacer extensiva la invitación a la socialización con la comunidad sobre los ajustes al Diseño de la obra de la referencia:

Fecha: Lunes 12 de Febrero de 2024
Hora: 02:00 p.m.
Lugar: Casa de la cultura ubicada en el predio denominado Pacande. Calle 3 # 15-37 B/Pesebre.

Esperamos contar con su asistencia y la de su equipo de trabajo.

Así mismo, solicitamos realicen la invitación a toda la comunidad mediante un puerta a puerta y tomar registro de la evidencia.

Agradeciendo la atención a la presente.

Cordialmente,

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C)
Alcaldía de Ricaurte, Cundinamarca

Proyectado por: Ing. Mónica A. Malagón C.
Profesional Universitario de Apoyo SIOP

Ricaurte

1805

Consorcio Diagonal RC

Ricaurte, febrero 7 de 2024

CDRC7-2024-029

Ingeniera
PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
Interventoría
Ricaurte - Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de obra pública 403-2023 el cual tiene por objeto la "PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16..."

Asunto: *Remisión Documentos para Análisis y Aprobación del Lote para Recepción Meterial de Excavación Finca "Los Barrancos".*

Cordial saludo,

Con la presente comunicación, solicitamos formalmente a la Interventoría realizar el respectivo análisis de los documentos remitidos referentes al Lote denominado Finca "Los Barrancos", localizado sobre la vía Concesionada por Devisab km 8 sentido Girardot-Tocaima, predio autorizado mediante la Resolución N° 1946 de 2014 expedida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. El lote propuesto por este Consorcio Diagonal RC, seria definido para realizar el traslado del material de excavación, a continuación, relacionamos los documentos;

- Propuesta para Recepción del Material de Excavación en el Lote Finca "Los Barrancos", localizado sobre la vía Concesionada por Devisab km 8 sentido Girardot-Tocaima.
- Respuesta al Radicado 03221000456, Desarrollo Plan Manejo Ambiental – Expediente 47501.
- Resolución CAR N° 1946 de 2014.

Sin otro en particular, quedamos atentos a su gestión y colaboración para su Aprobación.

MAURICIO ALEJANDRO ESPINOSA ALEMAN
Residente de Obra Consorcio Diagonal RC

Anexos; Los documentos relacionados, Veintiún (21) Folios.

1806

Ricaurte

190.19 No. 124 - 2024

Ricaurte, 08 de febrero 2024

Señor
VICTOR A. UBAQUE R.
Vocero comercial
Cra. 14B N°6-79 Ricaurte
Cel: 3152003644
Ciudad

Referencia: Remisión Derecho de Petición Sr. Victor A. Ubaque R. del 18 de enero 2024

Asunto: Respuesta **Derecho de Petición.**

Cordial saludo,

Revisada la **petición** interpuesta por **usted** el **pasado** 18 de enero 2024 bajo el **radicado N°** 229 a las 4:42pm en la ventanilla del palacio municipal, y estando dentro del término legal respectivo, nos permitimos dar respuesta a la petición elevada, así:

Mediante comunicado ID7R-063 **remitido** al correo cooporativa101@gmail.com por **parte** de la Interventoría **del** Proyecto el 08 de febrero 2024 a las 8:43a.m., realizaron remisión de la respuesta una vez se contó con el comunicado del Contratista de Obra CDRC7-2024-030 radicado a la Interventoría y al Municipio el 06 de febrero 2024.

Dado lo anterior, esperamos haber dado respuesta a su solicitud.

Cordialmente,

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C)

Anexos:
Oficio ID7R-063 de Interventoría con soporte (04 folios)
Oficio CDRC7-2024-030 del Contratista de Obra (04 folios)

Proyectado por: Ing. Mónica A. Melegón C.
Profesional Universitario de Apoyo SIOP

Gmail

INTERVENTORIA VIA DIAGONAL SEPTIMA <diagonalseptima.interventoria@gmail.com>

ID7R-063 EN ATENCIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN INTERPUESTO

1 mensaje

INTERVENTORIA VIA DIAGONAL SEPTIMA <diagonalseptima.interventoria@gmail.com> 8 de febrero de 2024, 8:43 a.m.

Para: "coorporativa101@gmail.com" <coorporativa101@gmail.com>
CC: "interventoriaatencionalusuario@gmail.com" <interventoriaatencionalusuario@gmail.com>, Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas <obras@ricaurte-cundinamarca.gov.co>, diazcivil <diazcivil@yahoo.es>

Señor
VICTOR UBAQUE

Cordial saludo.

Por medio del presente y en atención a su solicitud, nos permitimos remitir adjunto oficio ID7R-063 con anexo de respuesta por parte del contratista CONSORCIO DIAGONAL RC.

Sin otro particular,

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y Ar Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA DIAGONAL SEPTIMA

3 archivos adjuntos

- **ID7R-063.pdf** 962K
- **Derecho De Peticion Diagonal Septima 18Enero2024 (1).pdf** 111K
- **RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN CONSORCIO DIAGONAL RC.pdf** 1035K

1808

Consorcio Diagonal RC

Ricaurte, febrero 9 de 2024

CDRC7-2024-031

Ingeniera
PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
Interventoría
Ricaurte - Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de obra pública 403-2023 el cual tiene por objeto la "PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16"

Asunto: *Solicitud Certificación Red Agua Potable Ø 3" Fuera Servicio - ACUAGYR*

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la Visita de verificación realizada el pasado 8 de febrero de 2024 por parte de los operarios de la empresa ACUAGYR, a la Red de agua Potable Ø 3" localizada a 1,00 m de profundidad paralelamente sobre la calzada derecha, se pudo evidenciar por parte del personal de ACUAGYR, que la Red no se encuentra en servicio, como se evidencia a continuación;



Verificación personal ACUAGYR, Red agua potable Ø 3" Fuera Servicio.

1809

Ricaurte

190.19. No. 128 - 2024

Ricaurte, 09 de febrero 2024

Doctor
LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
R.L. Consorcio Diagonal RC
Espinal - Tolima

Ingeniera
PAOLA RODRÍGUEZ ALCALÁ
R.L. Interventoría Diagonal séptima
Ibagué - Tolima

Referencia: Contrato de Obra No. 403-2023 y Contrato de Interventoría N° 413-2023 "Pavimentación y embellecimiento de la Diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte - Cundinamarca".

Asunto: **Comunicado A.S.A.S.E.S.P. 027-2024 de Alcari sobre reposición redes sanitarias sobre Diagonal 7.**

Cordial saludo.

Mediante la presente remitimos el comunicado del asunto emitido por la empresa ALCARI S.A.S.E.S.P. sobre la reposición de las redes sanitarias de los tramos desde la Kr 15 a la Kra 14B y desde la Kr 16 a la Kr 16 de la Diagonal 7, en cumplimiento del compromiso adquirido por ALCARI en el comité de visita técnica del 24 de enero 2024.

Lo anterior, con el fin de que esta información sea revisada y aprobada por la interventoría y el contratista de obra y se incluyan las actividades necesarias para la reposición de estas redes en el desarrollo del contrato de obra de la referencia.

Cordialmente,

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C)

Anexos:
- Comunicado A.S.A.S.E.S.P. 027-2024 (01 folio).
- Archivo en Excel con memoria técnica de diseño de las redes sanitarias.
- Plano de diseño en pdf con firmas (01 folio).
- Plano de diseño en formato Autocad-dwg.

Proyectado por: Ing. Mónica A. Malagón
Profesional Universitario de Apoyo SIOP

Alcari SAS ESP
NIT. 900.639.486-4

Ricaurte, Febrero 7/24.

A.S.A.S.E.S.P. 027-2024

Señores
Secretaría de Infraestructura y O.P.
Atn. Ing. Héctor Daniel Morales Devia.
Secretario
Ciudad

Ref. Reposición de redes sanitarias sobre la Diag.7.

Asunto: Entrega formal de rediseños de la red sanitaria.

Cordial saludo,

En atención a la referencia se hace entrega formal de los rediseños de redes sanitarias sobre la Diag.7; específicamente sobre los tramos 1 y 2, que se identifican más adelante, a fin que la SIOP ordene su construcción al contratista de la pavimentación y embellecimiento de la mencionada vía.

Los tramos que fueron objeto de rediseño son los siguientes:

1. Tramo # 1: Sentido del flujo desde la Kr 15 a la Kr 14B
2. Tramo # 2: Sentido del flujo desde la Kr 15 a la Kr 16.

Nota: El tramo # 2 requiere tener en cuenta la instalación de una sección de la tubería con tecnología de perforación dirigida para conectarse al pozo de la Kr 16.

Para los efectos se hace entrega de los siguientes documentos:

1. Memoria técnica de diseño de las redes sanitarias.
2. Plano de diseño de las redes sanitarias nuevas para los tramos # 1 y 2 de la Diag.7.
3. Archivos en medio magnético.

Hasta otra oportunidad,

YEIMI PAULINA MENDOZA PERDOMO
Gerente

Anexo lo enunciado en 16 folios, 1 plano + 1 CD.

Proyectó: Ing. Juan Pablo Ávila Lombana
Contratista, asesor técnico de supervisión.
Contrato de PSP # 04/24.

Ricaurte

190.19. No. 136 - 2024

Ricaurte, 12 de febrero 2024

Señores:
ACUAGYR S.A.E.S.P.
Ing. Yan Mauricio Almanza
Gerente técnico
Girardot, Cundinamarca

Referencia: Contrato de Obra No. 403-2023 "Pavimentación y embellecimiento de la Diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte - Cundinamarca".

Asunto: Solicitud Certificación Redes existentes de Acueducto sobre la Diagonal 7 desde Carrera 14b hasta Carrera 16.

Cordial saludo,

De acuerdo a la ejecución de obras de pavimentación que se vienen adelantando del contrato de la referencia, nos permitimos solicitar la Certificación emitida por la empresa prestadora del servicio, sobre el estado actual de las redes existentes desde la Carrera 14b hasta la Carrera 16 de la diagonal séptima, indicando el diámetro de la tubería, la profundidad, ubicación y la verificación de domiciliarias junto con sus proyecciones.

Así mismo, solicitamos remitan el Plano con la identificación de las redes en mención.

Agradecemos su pronta atención.

Cordialmente,

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C)

Proyectado por: Ing. Mónica A. Malagón C.
Profesional Universitario de Apoyo SIOP

1812

Consorcio Diagonal RC

Espinal, 9 de febrero de 2024

CDRC7-2024-032

Recibido.
15 Feb 2024.


Señores
ALCALDIA DE RICAURTE
Atn. Ing. HECTOR MORALES DEVIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
Supervisor del Proyecto

INTERVENTORIA DIAGONAL SEPTIMA
Atn. Ing. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra No. 403-2023 – *"Pavimentación y embellecimiento de la diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 del Municipio de Ricaurte Cundinamarca"*
ASUNTO: Aval diseño de pavimento.

Cordial saludo.

Se informa a la interventoría y a la supervisión que una vez revisado por parte del CONSORCIO DIAGONAL RC el diseño de pavimento remitido para la ejecución del proyecto este cumple con lo establecido en la normatividad y por consiguiente se avala para la ejecución del proyecto; a continuación, confirmo sección de pavimento según diseño:

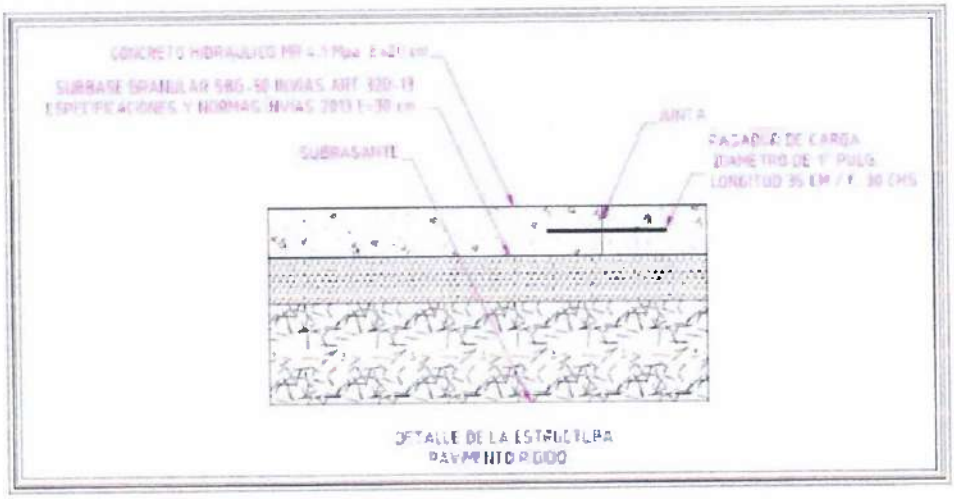

Fuente. EDYCONST S.A.S.

Atentamente

AITOR DE LARRAURI ECHEVARRIA
Director de Obra
CONSORCIO DIAGONAL RC

1813

ACUAGYR

ACUAGYR S.A. E.S.P. ALAGUNA
Origen: ING. YAN MAURICIO ALMANZA
Destino: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2024.02.16 - 15:27:17 SABE-2024-000295

GT-2024-0214

Girardot, 16 de febrero de 2024

Señores:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
Att; Ing. Héctor Daniel Morales Devia
Secretario de Infraestructura (C)
Alcaldía Municipal de Ricaurte- Carrera 15 No. 6-22 Centro
Ricaurte- Cundinamarca

Asunto: Terminación de actividades establecidas para efectuar la profundización de la red de acueducto de Ø4" en el sector de la Diagonal 7 entre Calle 10 y Carrera 14 en el municipio de Ricaurte.

Cordial saludo,

ACUAGYR S.A. E.S.P. informa que entre los días 14 y 15 de febrero del 2024, se realizaron las actividades asignadas para efectuar la profundización de la red de acueducto de Ø4" en el sector de la Diagonal 7 entre Calle 10 y Carrera 14 en el municipio de Ricaurte, en las cuales se ejecutaron las siguientes actividades:

- Excavación para dejar liberada la red de Ø4" y proceder a su traslado.
- Relleno en arena dejando cama y relleno superior a la tubería de Ø4".
- Instalación de cinta de detección de la tubería.
- Empalme de la red y de las acometidas de acueducto, quedando con servicio la comunidad.

Según el compromiso adquirido en comité de obra efectuado el día 12 de enero en la Diagonal 7 en compañía del Ing. Héctor Morales ejerciendo su cargo de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA del municipio de Ricaurte y los Ingenieros Mauricio y Sebastián en representación del CONSORCIO DIAGONAL



RC, se acordó efectuar las actividades anteriormente relacionadas, en el cual dimos cumplimiento lo mas pronto posible para que puedan continuar con sus labores.

Igualmente, quedamos atentos a que nos informe con antelación la fecha para proceder con el tramo faltante, con el fin de programar la respectiva suspensión del servicio de acueducto.

A continuación, se anexa registro fotográfico de las actividades ejecutadas:



- Excavación para dejar liberada la red de Ø4" y proceder a su traslado



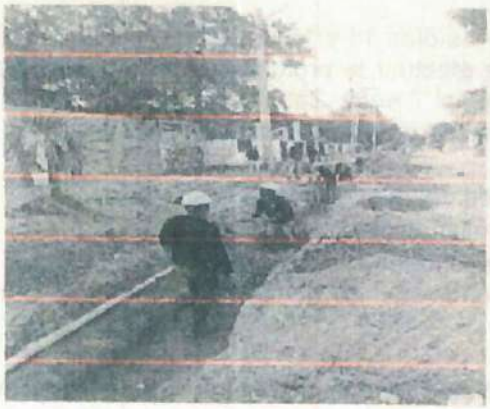
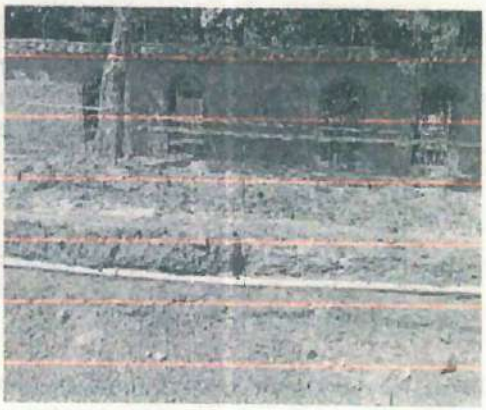



ACUAGYR
Aguas de Girardot, Ricaurte y La Región


- Relleno en arena dejando cama y relleno superior a la tubería de Ø4"

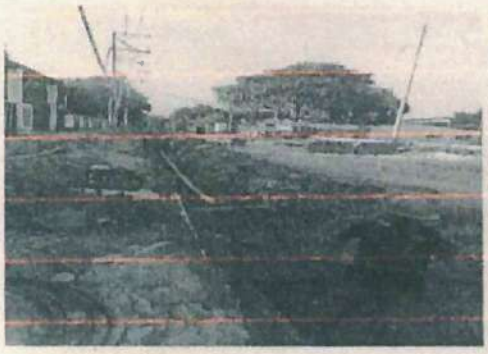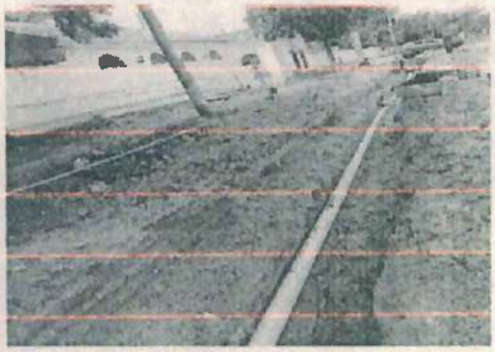- Instalación de cinta de detección de la tubería

- Empalme de la red y de las acometidas de acueducto, quedando con servicio la comunidad

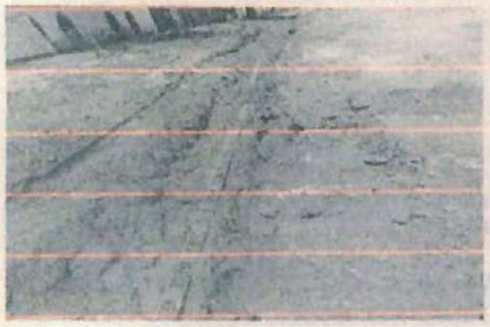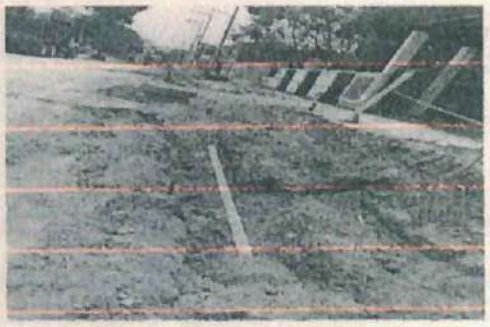ACUAGYR
Aguas de Girardot, Ricaurte y La Región

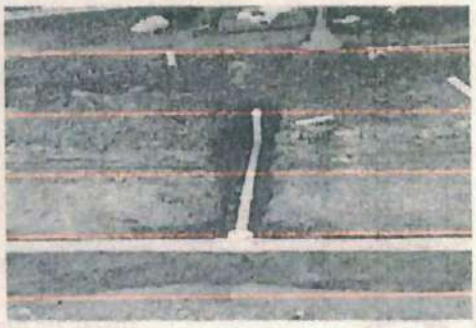

Cordialmente,

Ing. YAN MAURICIO ALMANZA R.
Gerente Técnico

RMR

C.C. CONSORCIO DIAGONAL RC- Ing. LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO- Representante Legal- - Calle 7 No 8-54 Espinal- Tolima.

C C. INTERVENTORIA DIAGONAL SEPTIMA- Ing. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ- Representante Legal- diagonalseptima.interventoria@gmail.com

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

7.12 INFORMES DE PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

Ricaurte, 6febrero 2024

INGENIERA
PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
INTERVENTOR DE OBRA

REF: Contrato N.403 / 31 agosto 2023
Pavimentacion y embellecimiento de la Diaonal 7
Municipio de Ricaurte - Cundinamarca

Asunto: **Entrega Informe N.4**
Desembolso anticipo Fiducia

Adjunto Informe de fiducia N.4 para su revision y aprobacion. Si tiene alguna observacion al respecto estaremos atentos a aclarar cualquier inquietud y hacer las correcciones según lo indique.

El presente desembolso se ciñe a lo presentado en el plan de Inversion aprobado para el desemolso del anticipo del contrato de la referencia.

Adjunto informe N.4 con la descripcion de pagos / 2 folios

Cordial saludo,

LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO
CC 1.105.678.088 DE ESPINAL TOLIMA
RL CONSORCIO DIAGONAL RC

CONTRATO No.403 / 31 AGOSTO 2023

PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE RICAURTE - DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

Contratante: **Municipio de Ricaurte**
NIT 809.680.059 - 1
Dra. Gloria Ricardo Doncel
Alcalde 2020 - 2023
Contratista: **Consorcio Diagonal RC**
NIT 901.746.184 - 7
RL Luis Eduardo Alvarado Pulecio
Interventor: **Paola Andrea Rodriguez Alcala**
CC 28.548.736 de Ibague Tolima

INFORME No.4
COD 11 64 61
FIDEICOMISO ANTICIPO DIAGONAL RC

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR		SOPORTE	VALOR
1	**SUMINISTRO DE MATERIALES**				
	Compra de 4000 pasadores de 1pulg Long35cm	Proadsteel SAS	NIT 901.705.202 -6	Cotizacion	35.276.200
	Compra de material de ferreteria, tuberia pvc presion y otros	Deposito San Carlos LTDA	NIT 890.705.196 -0	Ver relacion de facturas	11.951.080
	Compra de madera	Orlando Espinosa	CC93.118.366 - 7	Fact 2508	571.200
	Compra de ladrillo tolete	Ceramicas Hondave SAS	NIT 832.007.893 -0	Fact 1540	3.744.000
	Compra de alambre negro	Grupo Empresarial AyC SAS	NIT 900.451.557 -1	Cotizacion CTG-109	560.000
	SUB TOTAL				**52.102.480**

5	**COMPRA DE APARATOS ESPECIALES / ALUMBRADO SISTEMA SOLAR**				
	Obras complementarias para alumbrado publico	Tetco Ingenieria SAS	Reembolso al consorciado Ing Aitor de Larrauri	Facturas FETE 326 / 328 / 343	312.960.022
	Obras complementarias para alumbrado publico	Tetco Ingenieria SAS	Pago a terceros	Facturas FETE 338 / 348 / 349	128.011.737
	Obras complementarias para alumbrado publico	Tetco Ingenieria SAS	Pago a terceros	Cuenta de cobro anticipo	53.977.935
	SUB TOTAL				**494.949.694**

CONTRATO No.403 / 31 AGOSTO 2023

PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE RICAURTE - DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

Contratante: **Municipio de Ricaurte**
NIT 809.680.059 - 1
Dr. Campo Elias Prada Ortiz
Alcalde 2024 - 2027
Contratista: **Consorcio Diagonal RC**
NIT 901.746.184 - 7
RL Luis Eduardo Alvarado Pulecio
Interventor: **Paola Andrea Rodriguez Alcala**
CC 28.548.736 de Ibague Tolima

	GASTOS SEGÚN EL PLAN DE INVERSION	
1	Suministro de Materiales	52.102.480
2	Subcontratos (Mano de obra)	
3	Maquinaria y equipo	
4	Compra y transporte de agregados petreos, recebo, base y sub base granular	
5	Compra de aparatos especiales (alumbrado sistema solar)	494.949.694
6	Pago de nominas y personal administrativo	
	TOTAL	**547.052.174**

DESCRIPCION DEL DESEMBOLSO / Según el plan de Inversion					
INFORME No. 4					
1	Proadsteel SAS	NIT 901.705.202 -6	Pago a terceros	35.276.200	
1	Deposito San Carlos LTDA	NIT 890.705.196 -0	Pago a terceros	11.951.080	
1	Orlando Espinosa	CC93.118.366 - 7	Pago a terceros	571.200	
1	Ceramicas Hondave SAS	NIT 832.007.893 -0	Pago a terceros	3.744.000	
1	Grupo Empresarial AyC SAS	NIT 900.451.557 -1	Pago a terceros	560.000	52.102.480
5	Aitor Mirena de Larrauri	NIT 93.118.240	Reembolso	312.960.022	
5	Tetco Ingenieria SAS	NIT 901.052.421 - 9	Pago a terceros	128.011.737	
5	Tetco Ingenieria SAS	NIT 901.052.421 - 9	Pago a terceros	53.977.935	494.949.694
	DESEMBOLSO No.4			**547.052.174**	

TOTAL REEMBOLSO AL CONSORCIADO / AITOR DE LARRAURI	312.960.022

BALANCE DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo	5.651.098.939,50	
Informe No.1	Pagos realizados 11 nov 2023	1.455.000.000
Informe No.2	Pagos realizados 19 diciembre 2024	105.932.397
Informe No.3	Pagos realizados 20 diciembre 2024	350.000.000
Informe No.4		547.052.174
Saldo en poder de Fiducia		3.193.114.368
SUMAS IGUALES	**5.651.098.939,50**	**5.651.098.940**

Elaborado por:
Consorcio Diagonal RC
RL Luis Eduardo Alvarado Pulecio
Contratista de obra

Revisado por:
Paola Andrea Rodriguez Alcala
Interventor de Obra

1819

Alianza Fiduciaria

t: (601) 644 7700
Carrera 15 # 82 – 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE ENERO DEL 2024

FIDEICOMISO ANTICIPO DIAGONAL RC CODIGO SIFI 116461

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 10/4/2023 rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

VIGILADA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4820

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000007882

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO ANTICIPO DIAGONAL RC

Carrera 2 # 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	3,742,329,078.83	*SALDO PROMEDIO*	$	3,742,405,691
TOTAL ABONOS	$	2,375,005.97	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,375,005.97
SALDO ACTUAL	$	3,744,704,084.80	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			2,375,005.97	3,744,704,084.80

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FIDEICOMISO ANTICIPO DIAGONAL RC
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #514489 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_455946 del 08/02/2024 16:10:55, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
4	BANCOLOMBIA - CH - 33259392468	832007893	CERAMICAS HONDAVE SAS	PG - Pagado	OP_455946-DES:MATERIALES	$3,744,000.00
5	BANCOLOMBIA - CC - 07972558868	900451557	GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S.	PG - Pagado	OP_455946-DES:MATERIALES	$560,000.00
1	BANCOLOMBIA - CH - 25300010155	901705202	PROADSTEEL S.A.S	PG - Pagado	OP_455946-DES:MATERIALES	$35,276,200.00
2	BANCO DE BOGOTA - CC - 296039688	890705196	DEPOSITO SAN CARLOS LTDA	PG - Pagado	OP_455946-DES:MATERIALES	$11,951,080.00
3	BANCOLOMBIA - CH - 41117709521	93118366	ESPINOSA SUAREZ ORLANDO	PG - Pagado	OP_455946-DES:MATERIALES	$571,200.00

6	BANCOLOMBIA - CC - 41102947996	93116240	DE LARRAURI ECHEVARRIA AITOR MIRENA	PG - Pagado	OP_455946-DES:OTROS	$312,960,022.00
7	BANCOLOMBIA - CH - 15300003480	901052421	TECTO INGENIERIA SAS	PG - Pagado	OP_455946-DES:OTROS	$128,011,737.00
8	BANCOLOMBIA - CH - 15300003480	901052421	TECTO INGENIERIA SAS	PG - Pagado	OP_455946-DES:OTROS	$53,977,935.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 04/03/2024 13:43:41.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

1823

CERAMICAS HONDAVE S.A.S
NIT 832007893-0

VEREDA PATIO BONITO NEMOCON
TEL 3108653252 - 8511165 Nemocón - Colombia

"*Actividad Económica DIAN 2392
*Actividad Económica ICA Nemocón 2392

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764059869334 de 14/11/2023 hasta 14/11/2024
Rango Autorizado del CH1453 al CH1600

SEÑORES:
CONSORCIO DIAGONAL RC
Tipo documento: NIT
No.: 901746184-7
Dirección: CL 7 8 54. Espinal - Colombia

Dirección de envío:

Factura electrónica de venta No.: CH1540
Fecha emisión: 7/02/2024
Fecha vencimiento: 7/02/2024
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Otro*
Orden de compra:
TRM:

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	% DESC	% IMPTO	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
1	LAD003	LADRILLO COMÚN	94	4000	$960.00	0	0.00	$0.00	$3,840,000.00

1 Item

Observaciones: REMISION 3394

TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	$3,840,000.00
TOTAL	$3,840,000.00
Ret.Fuente	$96,000.00
NETO CON RETENCIONES	$3,744,000.00

Responsabilidad fiscal: R-99-PN

Firma electrónica: GGoaKOcjemQWBtNY
+C162jVz507Xdn0AAfOn3xRZtxzZ3/Fcgvvb55CnSWqImN8UgaNGvU8QZulW6TfoVDr2YmoFUzPTY/cQl8JVZ9dU7ztKgwwxeQTAfV0vO4e2frmefxcUg4hVzQytdBovc145atcJVLZSqXYml
d1nYPZMQ6Gm4NscPljrd
+bX9eT0GnUExirzip0xoGS7iFu23XGZj8VgW7u0mdQBfXkZyVGAA5U4uiJtWiym7aMPkt8onqX830s8VxOgVRm8FE8AJOZVQuVoFvTEbhlUfldx2+EzTLVKAW0HcsvPxqALhFhY6n/DMggX
XjzAdldFAlyOJjew==

GIRAR CHEQUE O HACER TRANSFERENCIA A NOMBRE DE CERAMICAS HONDAVE S.A.S A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No.33259392468 CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No.065070922

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ÁRTICULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231/ 08

Fecha y hora de generación: 2/7/2024 3:34 PM Fecha y hora de expedición: 2/7/2024 3:34 PM

CUFE: 34fec2df7dd371e6cf41acda64d2d75e526d2fc5ab7e8b48d4a2cf5116d6b4824fbddfc5c452ed497fa4c945bbb03080

Proveedor Tecnológico: BIT CONSULTING SAS - NIT: 830005677 - Nombre Software: DOCUMENTEME - Código Proveedor Tecnológico: 010

Generado por: Documénteme by Mentum Group

1824

GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FV9 2104

GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S
Nit: 900451557-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CRA.48 SUR N. 86-81 MIROLINDO IBAGUE TOLIMA Tel. 3174353200 - 2693458

Adquiriente **CONSORCIO DIAGONAL RC**		Fecha **Feb-09-2024**	Infomacion de pago **Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR**
Identific. **NIT 901746184-7**	Tels:**6082390025**		**Medio**
Direccion **CAL 7 8 54** **Espinal - Tolima**		Vencimiento **Feb-09-2024**	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	000052	ALAMBRE NEGRO	KILO	19	100.00	4,705.88	470,588.23

Total Items : 1 **Peso : 100.00 kg**

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	470,588.23	89,411.77	Subtotal	470,588.23
					Iva/Inc	89,411.77
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900063058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764050260737 de Jun-09-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-09-2024 Rango: FV9 1-10000					TOTAL$	560,000.00

Son: QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS mcte.

CUFE: 8ce5aac7ec72527b4048e5b0adc48851d26045703b5a06138edec0af9cd5b95f0ec447469a742a3273f4e510a5aa1776
Fecha generación: 2024-02-09T11:23:00 Fecha expedición: 2024-02-09T17:24:04 Elaboró: EVANGELINA GOMEZ Pág: 1/1

PROADSTEEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.PR 90

Expedida	Vence
2024/02/20	2024/02/20

PROADSTEEL SAS
NIT 901,705,202-6 - Responsable de IVA
CI48 No. 77c-40

Cliente: CONSORCIO DIAGONAL RC — **Nit:** 901,746,184 -7
Dirección: CL 7 8 54 — **Tel:**
Ciudad: ESPINAL - TOLIMA

#	Código	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	P0025	PASADOR 1 X 35 CM	Unid	19%	4,284	7,570.00	$32,429,880.00

	Sub Total	$32,429,880.00
	I.V.A	$6,161,677.20
	Retencion	$810,747.00
Total items:1	Total Factura	$37,780,810.20

Son: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS Con 20 CTS M/L
Forma de pago:Crédito , Plazo: 2024/02/20

Resolución facturación No. 18764051902060 del 2023/07/15 al 2024/07/15, consecutivos autorizados del PR1 al PR2000

Firma y Sello del Cliente: _____ **Fecha Recibido:** _____

Cufe: 85ba983c8943af5cfde6ee3a2f1466e3213ce494871fe0f7d9cfb0a6f95aa63bcfd737ab68b913932713fcb1f4f9a0ea

Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A Nit: 860935034 — **Fecha hora validación:** 2024-02-20 14:28

Fecha hora generación:2024/02/20 14:02 Elaborado por: DPM

Impreso por: Software contable Claus - Software de Colombia S.A.S Nit: 800.241.389-5

1826

DEPOSITO SAN CARLOS FERRETERIA

DEPOSITO SAN CARLOS LIMITADA

NIT. 890.705.196-0

Espinal - Tolima Calle 10 No. 7-56 PBX 2485757

email:deposito.sancarlos@telecom.com.co www.depositosancarlos.co

Actividad Económica 4752 Tarifa ICA 5 x 1000
Responsable del Impuesto Sobre las Ventas - IVA

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA No 18764044869761
FECHA:2023-02-23 Vigencia 12 Meses, FECT-4285339 AL No. FECT-6000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FECT 4271861

Fecha Expedicion:31/01/2024 17:22

CLIENTE: CONSORCIO DIAGONAL RC
NIT : 901746184-7 TEL : 6082390025
DIRECCION: ESPINAL; CL 7 8 54
ASESOR : ARMANDO PCR-1-55806-O.C-11778

Fecha Factura: 31/01/2024 6:22 p.m.
Fecha Vencimiento: 01/03/2024
Forma de Pago: 30 DIAS

#	CODIGO	BOD	DESCRIPCION	UND	CANT	V/R UNITARIO	DCTO	TOTAL
1	116160-02	01	PALA N 2 PUNTA REDONDA HERRAGRO R:6056-20 (*)	UN	4,00	23.848	10	85.853
2	031403-02	01	CABO PALA FINO	UN	4,00	11.215	10	40.374
3	298240-10	01	PUNTILLA C/CAB. 2 400 - GRS	UN	10,00	3.277	0	32.770
4	298240-13	01	PUNTILLA C/CAB. 3 400 - GRS	UN	10,00	3.277	0	32.770
5	132730-03	02	TUBO ACOMETIDA DOMIC. PF + UAD 1/2 RDE 9 X M.L	MT	1,00	1.621	0	1.621
6	132780-03	02	UNION PF+UAD DE 1/2	UN	20,00	2.851	0	57.020
7	132705-03	02	CODO 90 PF 1/2 PF	UN	20,00	2.352	0	47.040
8	131330	01	TUBO RDE 13.5 X 1/2" X 6 MTS(CELTA)	TB	5,00	8.000	0	40.000
9	131290-03	01	UNION 1/2 PRESION PVC	UN	20,00	420	53	3.948
10	131200-03	01	TEE 1/2 PRESION PVC	UN	20,00	868	53	8.159
11	131000-03	01	CODO 90 1/2 PRESION PVC	UN	20,00	656	53	6.166
12	131120-08	01	SOLDADURA 1/8 CELTA	UN	8,00	53.955	53	202.871
13	131100-08	01	LIMPIADOR CELTA 12 ONZ.	UN	4,00	27.360	53	51.437
14	135024-06	02	TUBO DURAFORT S8 160 MM 6" X 6 M ALCANT. CELTA	TB	1,00	93.230	0	93.230
15	134802-06	02	CODO DURAFORT 45 DE 6" (160 MM) (2901867)	UN	20,00	24.575	0	491.500
16	135024-10	03	TUBO DURAFORT S8 250 MM 10" X 6 M ALCANT. CELTA	TB	20,00	209.614	0	4.192.280
17	135024-16	03	TUBO DURAFORT S8 400 MM 16" X 6 M ALCANT. CELTA	TB	3,00	514.374	0	1.543.122
18	135025-16	03	TUBO DURAFORT S8 400 MM 16" X 6 M ALCANT. CELTA (OBRA)	TB	6,00	514.374	0	3.086.244

Total de Lineas: 18

SON:
ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS Y 00 / 100

V/MERCANCIA :	10.016.405
V/R EXCLUIDO :	
V/R GRAVADO :	10.016.405
IVA 19 % :	1.886.805
IVA 5% :	4.293
RTE FUENTE :	250.410
RTE ICA :	0
RTE IVA :	0
VALOR TOTAL :	11.657.092

DIRECCION DE ENVIO:
O.C. 11778 ENTREGA MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA. ING MAURICIO
3114307516 Basado en Ofertas de ventas 100556806

Esta Factura de Venta se Asimila en sus efectos a una Letra de Cambio (ART.779 del Codigo de Comercio). La firma por un tercero del comprador implica su obligacion de acuerdo al art. 640 del c.c. y ademas equivale a la constancia de la entrega real y material de la mercancia descrita. Después de su vencimiento causará intereses de mora a la tasa maxima legal vigente.

PESO: 12,48

ACEPTADO COMPRADOR

NOMBRE: _____

CÉDULA _____

FECHA RECIBIDO _____

Impreso Por SAP Business One -Deposito San Carlos Ltda Nit: 890705196-0
Documento expedido Por SAP COLOMBIA SAS NIT Nit 900320612-5 - SAP Business One FACTURE

DESPUÉS DE (5) DÍAS DE ENTREGADA LA MCIA NO SE ACEPTA RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

CUFE: 681e21fa3c674f20f9af27bfb1e6eb6cd9e171cf8fb059e440a8cf9d09594a875c31efe0fb0090a46d1dd69ba101934c

DEPOSITO SAN CARLOS FERRETERIA

DEPOSITO SAN CARLOS LIMITADA

NIT. 890.705.196-0

Espinal - Tolima Calle 10 No. 7-56 PBX 2485757

email:deposito.sancarlos@telecom.com.co www.depositosancarlos.co

Actividad Económica 4752 Tarifa ICA 5 x 1000
Responsable del Impuesto Sobre las Ventas - IVA

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA No 18764044869761
FECHA:2023-02-23 Vigencia 12 Meses, FECT-4265339 AL No. FECT-6000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FECT 4271977

Fecha Expedicion:07/02/2024 10:18

CLIENTE: CONSORCIO DIAGONAL RC
NIT : 901746184-7 TEL : 6082390025
DIRECCION: ESPINAL; CL 7 8 54
ASESOR : .ARMANDO COT-87907-O.C-11781

Fecha Factura: 07/02/2024 10:16 a.m
Fecha Vencimiento: 08/03/2024
Forma de Pago: 30 DIAS

#	CODIGO	BOD	DESCRIPCION	UND	CANT	V/R UNITARIO	DCTO	TOTAL
1	134890-08	02	HIDROSELLO NOVAFORT 8" (200 MM)	UN	14,00	8.032	53	52.851
2	134890-10	02	HIDROSELLO NOVAFORT 10"(250 MM)	UN	9,00	14.028	53	59.338
3	021480-10	02	CAL HIDRATADA X 10 KG ARGOS	BL	4,00	13.906	0	55.624
4	303318-04	01	DISCO CORTE FINO METAL 4-1/2 X 7/8 DEWALT R:8062	UN	20,00	4.402	10	79.236

Total de Lineas: 4

SON:
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 00 / 100

DIRECCION DE ENVIO:
O.C. 11781 Basado en Ofertas de ventas 87907.

Esta Factura de Venta se Asimila en sus efectos a una Leta de Cambio (ART.779 del Codigo de Comercio). La firma por un tercero del comprador implica su obligacion de acuerdo al art. 640 del c.c. y ademas equivale a la constancia de la entrega real y material de la mercancia descrita. Después de su vencimiento causará intereses de mora a la tasa maxima legal vigente.

PESO: 40,00

V/MERCANCIA :	247.049
V/R EXCLUIDO :	
V/R GRAVADO :	247.049
IVA 19 % :	46.939
IVA 5% :	
RTE FUENTE :	0
RTE ICA :	0
RTE IVA :	0
VALOR TOTAL :	293.988

ACEPTADO COMPRADOR

NOMBRE: _____

CÉDULA _____

FECHA RECIBIDO _____

Impreso Por SAP Business One -Deposito San Carlos Ltda Nit: 890705196-0
Documento expedido Por SAP COLOMBIA SAS NIT Nit 900320612-5 - SAP Business One FACTURE

DESPUÉS DE (5) DÍAS DE ENTREGADA LA MCIA NO SE ACEPTA RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

CUFE: 11979fed82b1aa42b5b1673514f6ebc21b0a468fe785303f9796a1cb8a8c3ce478a4cf605dd96a5dbf08c496845a81c0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario **14848618189**

(415)7707212489984(8020) 000001484861818 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 7 0 5 1 9 6	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DEPOSITO SAN CARLOS LIMITADA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Espinal 2 6 8

41. Dirección principal
CL 10 7 56 BRR CENTRO

42. Correo electrónico deposito.sancarlos@telecom.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 4 8 5 7 5 7	2 4 8 3 9 4 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	1 9 8 3 0 1 1 5							2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 9 14 33 42 48 52 55

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de renta
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒ | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2022 - 08 - 13 / 16 : 11: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 31-05-2023 05:37:10PM

DOCUMENTO DIGITALIZADO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa DEPOSITO SAN CARLOS LIMITADA identificado(a) con NIT 8907051960 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 296039688 desde el 22 de marzo de 2000, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 07 de enero de 2020, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

1828



ORLANDO ESPINOSA SUAREZ
NIT 93.118.366-7
CR 9 15-03
Tel: (038) 2480659
Espinal - Colombia
oes.21@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2508

Señores	CONSORCIO DIAGONAL RC		
NIT	901.746.184-7	**Teléfono**	(608) 2390025 - Ext. 000
Dirección	CL 7 8 54	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/02/2024, 08:05
Expedición	07/02/2024, 08:05
Vencimiento	22/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Tabla burra 28x3 mtr	10.00	32,000.00	320,000.00
2	Cuarton 8x4x3 mtr	10.00	16,000.00	160,000.00

Total ítems: 2

Total Bruto	480,000.00
IVA 19%	91,200.00
Total a Pagar	**571,200.00**

Valor en Letras: Quinientos setenta y un mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-22 por $ 571,200.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764061510047 aprobado en 20231207 prefijo FE desde el número 2384 al 3000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 5*1000

CUFE: 584bff492b1a19c3c9cdb77894744646410a2dacf0d0d38238714b55b756773df494d57fa281a03bfd84ef871bd7147ce2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica vence el XXX

1829.

Miercoles, 7 febrero 2024

CONTRATANTE CONSORCIO DIAGONAL RC
NIT 901.746.184 - 7

CONTRATISTA TETCO INGENIERIA SAS
NIT 901.052.421 - 9

REEMBOLSO AL CONSORCIADO
ING AITOR DE LARRAURI CC 93.118.240

FECHA	FACTURA N.	VALOR A PAGAR
14Diciembre2023	FETE 326	292.232.412
15Diciembre2023	FETE 328	8.636.250
2enero2024	FETE 343	12.091.360
	TOTAL REEMBOLSO	**312.960.022**

Se adjuntan facturas para gestionar reembolso

Valor Reembolso: 312.960.022 Son Trescientos doce millones novecientos sesenta mil veintidos pesos m/cte

Revisado y aprobado
Luis Eduardo Alvarado Pulecio
RL Consorcio Diagonal RC

1830

Bancolombia

Diciembre 14 de 2020

Señores:
A QUIEN INTERESE
Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHAVARRIA** identificado (a) con C.C **93.118.240** a la fecha de expedición de ésta Referencia, tiene el siguiente producto con el Banco:

TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO DE LA CUENTA
CUENTA CORRIENTE	411-029479-96	1993/01/29	A ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 0982709900 EXT 77013-77019 (Ibagué), o en BANCOLOMBIA – Oficina de Servicios Empresariales, ubicada en la Cra.3 No. 11 – 02 piso 4. Teléfono 098-2611108 Ext: 360.
Atentamente,

BANCOLOMBIA
Ibagué Of. 849 Ofic. De Servicios Especializados
María Elsy Vargas C
Auxiliar Administrativo
Cédula Nº 65719366

MARIA ELSY VARGAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

TETCO INGENIERIA S.A.S
NIT 901.062.421-9
CL 108 LT 4 PAR CANINO
Tel: (3125463078)
Ibagué - Colombia
tetcoingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FETE 326

				Fecha y hora Factura	
Señores	CONSORCIO DIAGONAL RC			**Generación**	14/12/2023, 09:56
NIT	901.748.184-7	**Teléfono**	(608) 2390025 - Ext. 000	**Expedición**	14/12/2023, 09:56
Dirección	CL 7 # 8-54	**Ciudad**	Espinal - Colombia	**Vencimiento**	14/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7, DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA.	1.00	285,438,964.64	286,523,632.71

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Doscientos noventa y dos millones doscientos treinta y dos mil cuatrocientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-14 por $ 292,232,412.00

Observaciones:
ACTA DE OBRA No. 4
CTO. 01/403 DE 2023

Total Bruto	285,438,964.64
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 2.00%	5,708,779.29
IVA 19% (AIU)	1,084,668.07
Total a Pagar	292,232,412.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.146-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764058842052 aprobado en 20231027 prefijo FETE desde el número 307 al 2000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 67778627ed56b4834b1263489b06b4872d9c4d2b6b1f4cde363606b5041516143ecea33b2c531f4d8aa08ad49e492f32

1832

TETCO INGENIERIA S.A.S
NIT 901.052.421-9
CL 108 LT 4 PAR CANINO
Tel: (3125483078)
Ibagué - Colombia
tetcoingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FETE 328

Señores	CONSORCIO DIAGONAL RC		
NIT	901.746.184-7	**Teléfono**	(608) 2390025 - Ext. 000
Dirección	CL 7 # 8-54	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2023, 14:33
Expedición	15/12/2023, 14:33
Vencimiento	15/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRANSPORTE A BOTADERO	150.00	57,575.00	8,636,250.00

Total Items: 1

Total Bruto	8,636,250.00
Total a Pagar	8,636,250.00

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos treinta y seis mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-15 por $ 8,636,250.00

Observaciones:
ACTA No.1
TRANSPORTES A BOTADERO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764058842052 aprobado en 20231027 prefijo FETE desde el número 307 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: ef5c5452c9c4ec74d91bef4fe4967af52b8641502e80abaf039029b9364e39afe40356cd84822db02290bb0afdf0713d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 2 XML

TETCO INGENIERIA S.A.S
NIT 901.052.421-9
CL 108 LT 4 PAR CANINO
Tel: (3125483078)
Ibagué - Colombia
tetcoingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FETE 343

Señores	CONSORCIO DIAGONAL RC		
NIT	901.746.184-7	**Teléfono**	(608) 2390025 - Ext. 000
Dirección	CL 7 # 8-54	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/01/2024, 09:31
Expedición	25/01/2024, 09:31
Vencimiento	25/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7, DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA.	1.00	11,810,275.44	11,855,154.49

Total Items: 1

Valor en Letras:
Doce millones noventa y un mil trescientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-25 por $ 12,091,360.00

Observaciones:
ACTA DE OBRA No. 6
CTO. 01/403 DE 2023

Total Bruto	11,810,275.44
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 2.00%	236,205.51
IVA 19% (AIU)	44,879.05
Total a Pagar	**12,091,360.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764058842052 aprobado en 20231027 prefijo FETE desde el número 307 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: d3e2a13ab18263da39b62e39f1760799f7aa2b2e78644575435990931 8cb0a9178a41f33591e4212ec4ca914e6d1d178

Miercoles, 7 febrero 2024

SOPORTE INFORME 4 FIDUCIA

CONTRATANTE CONSORCIO DIAGONAL RC
NIT 901.746.184 - 7

CONTRATISTA TETCO INGENIERIA SAS
NIT 901.052.421 - 9

RELACION DE FACTURAS PARA GIRO A TETCO

FECHA	FACTURA N.	VALOR A PAGAR
15Enero2024	FETE 338	17.157.350
7febrero2024	FETE 348	103.809.387
7febrero2024	FETE 349	7.045.000

TOTAL REEMBOLSO 128.011.737

Valor pago $128.011.737 Son ciento veintiocho millones once mil setecientos treinta y siete pesos m/cte

Revisado y aprobado
Luis Eduardo Alvarado Pulecio
RL Consorcio Diagonal RC

1835

TETCO INGENIERIA SAS

TETCO INGENIERIA S.A.S
NIT 901.052.421-9
CL 108 LT 4 PAR CANINO
Tel: (3125483078)
Ibagué - Colombia
tetcoingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FETE 338

Señores	CONSORCIO DIAGONAL RC		
NIT	901.746.184-7	**Teléfono**	(608) 2390025 - Ext. 000
Dirección	CL 7 # 8-54	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/01/2024, 10:50
Expedición	15/01/2024, 10:51
Vencimiento	16/01/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRANSPORTE A BOTADERO	298,00	57,575.00	17,157,350.00

Total Ítems: 1

Total Bruto	17,157,350.00
Total a Pagar	17,157,350.00

Valor en Letras:
Diecisiete millones ciento cincuenta y siete mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-15 por $ 17,157,350.00

Observaciones:
ACTA No.3
TRANSPORTES A BOTADERO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764059642052 aprobado en 20231027 prefijo FETE desde el número 307 al 2000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: c9440bd2d06331cf7b0ed0bee81d6baa7fed2dc777fcf186042f8813de4cae3450f3bb44574e1ed206f8184651c9c76e0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: iSigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: iSigo Nube. Para electrónica ver en el XML.

TETCO INGENIERIA SAS

TETCO INGENIERIA S.A.S
NIT 901.052.421-9
CL 108 LT 4 PAR CANINO
Tel: (3125463078)
Ibagué - Colombia
tetcoingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FETE 348

Señores	CONSORCIO DIAGONAL RC		
NIT	901.746.184-7	**Teléfono**	(608) 2390025 - Ext. 000
Dirección	CL 7 # 8-54	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/02/2024, 17:12
Expedición	07/02/2024, 17:12
Vencimiento	07/02/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7, DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA.	1.00	101,396,158.43	101,761,463.83

Total Items: 1

Valor en Letras:
Ciento tres millones ochocientos nueve mil trescientos ochenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-07 por $ 103,809,387.00

Observaciones:
ACTA DE OBRA No. 7
CTO. 01/403 DE 2023

Total Bruto	101,396,158.43
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 2.00%	2,027,923.17
IVA 19% (AIU)	385,305.40
Total a Pagar	103,809,387.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764058842852 aprobado en 20231027 prefijo FETE desde el número 307 al 2000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: e831786b2e2056c0aa6a7a3fc41036e2a44397c3cd48d03bc54d07cb8de6d08d3827dac40fefea7919d5006d84a438a5f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830106861.3 AC-IL Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

1837

TETCO INGENIERIA SAS

TETCO INGENIERIA S.A.S
NIT 901.052.421-9
CL 108 LT 4 PAR CANINO
Tel: (3125483078)
Ibagué - Colombia
tetcoingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FETE 349

Señores	CONSORCIO DIAGONAL RC		
NIT	901.748.164-7	**Teléfono**	(608) 2390025 - Ext. 000
Dirección	CL 7 # B-54	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/02/2024, 17:17
Expedición	07/02/2024, 17:17
Vencimiento	07/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRANSPORTE DE ARENA	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00
2	TRANSPORTE A BOTADERO	167.00	35,000.00	5,845,000.00

Total items: 2

Total Bruto	7,045,000.00
Total a Pagar	7,045,000.00

Valor en Letras:
Siete millones cuarenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-07 por $ 7,045,000.00

Observaciones:
ACTA No.4
TRANSPORTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764088842062 aprobado en 20231027 prefijo FETE desde el número 307 al 2000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 745d5d0630ac58025f20d9e89aa9049a358b86d11bf90d2daa50d4e6a1ebc715f0d7a941add0863be0d0831cb8c41d3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: ISigo SAS - Nit 830.048.345-8. Nombre Software: ISigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

1838

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14921232991

(415)7707212489984(8020) 000001492123299 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 2 4 2 1	9	Impuestos y Aduanas de Ibagué	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TETCO INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
TETCO INGENIERIA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
CL 108 LT 4 PAR CANINO

42. Correo electrónico: tetcoingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 5 4 8 3 0 7 8	3 1 3 3 7 7 8 4 8 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 7 0 2 0 9	7 7 3 0	2 0 1 7 0 2 0 9	4 6 6 3	4 9 2 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2023 - 06 - 20 / 18 : 25: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

864. Nombre: PULIDO HERRERA JOSE ALEXANDER
865. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 12-09-2023 03:26:16PM

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

1839

Bancolombia

Ibagué, 01 de Noviembre de 2023

Señor(es)

AQUIEN INTERESE

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **TETCO INGENIERIA S A S** identificado(a) Con NIT **901052421**, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha de apertura	Estado
CUENTA DE AHORRO	153-000034-80	2023/09/29	VIGENTE Y ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

* Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

1840

Ibague, 7 febrero 2024

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO DIAGONAL RC
NIT 901.746.184 - 7

DEBE A

TETCO INGENIERIA SAS
NIT 901.052.421 - 9

Concepto	**ANTICIPO** contrato de obra civil (obras complementarias para alumbrado publico con paneles solares) para la obra Pavimentacion en la Diagonal Septima en el Municipio de Ricaurte Cundinamarca
Valor Anticipo	**$53.977.935,oo** Cincuenta y tres millones novecientos setenta y siete mil novecientos treinta y cinco pesos m/cte

Jose Alexander Pulido

JOSE ALEXANDER PULIDO HERRERA
Representante Legal
CC 11.228.950 Girardot - Cundinamarca
Celular 3125483078

1841

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14921232991

(415)7707212489984(8020) 000001492123299 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 2 4 2 1	9	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TETCO INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial
TETCO INGENIERIA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
CL 108 LT 4 PAR CANINO

42. Correo electrónico tetcoingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 5 4 8 3 0 7 8	3 1 3 3 7 7 8 4 8 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 7 0 2 0 9	7 7 3 0	2 0 1 7 0 2 0 9	4 6 6 3	4 9 2 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 20 / 18 : 25: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, **suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.**
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

964. Nombre PULIDO HERRERA JOSE ALEXANDER
965. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 12-09-2023 03:26:15PM

Bancolombia,

Ibagué, 01 de Noviembre de 2023

Señor(es)

AQUIEN INTERESE

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **TETCO INGENIERIA S A S** identificado(a) Con NIT **901052421**, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha de apertura	Estado
CUENTA DE AHORRO	153-000034-80	2023/09/29	VIGENTE Y ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

*** Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.**
***Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.**

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

7.13 INFORME TÈCNICO ESPECIES ARBOREAS

Ricaurte	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA INFORME TÉCNICO	FR-GAR-002 Fecha Aprob. 27/12/2022 Versión 01

INFORME TECNICO Nº 02. ENERO 22 DE 2024
VISITA DE PODA Y/O TALA DE ÁRBOL.

I. IDENTIFICACIÓN

Radicación	Enero 15 de 2024
Solicitante o contraventor	CONSORCIO DIAGONAL RC – Luis Eduardo Alvarado Pulecio Representante Legal
Identificación	C.C. 1.105.678.088 de Espinal (Tolima)
Domicilio Solicitante	Carrera 7 N° 8 – 54 Espinal Tolima
Teléfonos Solicitante	2390025 – 2480155
Municipio	Ricaurte
Vereda	Zona Urbana
Predio	Espacio público, Andenes peatonales de la Diagonal séptima desde la calle 10 hasta la carrera 16
Ubicación	Espacio público, Andenes peatonales de la Diagonal séptima desde la calle 10 hasta la carrera 16
Asunto	Solicitud de permiso de intervención de especies ubicadas en los andenes peatonales de la vía diagonal 7
Objetivo	VISITA DE PODA Y/O TALA DE ÁRBOL.
Fecha Visita	22 DE ENERO DE 2024

II. ANTECEDENTES

La visita técnica se realiza por solicitud del señor Luis Eduardo Alvarado Pulecio C.C. 1.105.678.088 de Espinal (Tolima) en calidad de representante legal del CONSORCIO DIAGONAL RC contratista para la ejecución del CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 403 – 2023 "OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA" y de la señora Paola Andrea Rodríguez Alcalá en calidad de representante legal del contrato de Interventoría Nº 413 de 2023 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANACIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMIENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA", donde solicitan a la secretaria la intervención de las especies ubicadas en los andenes peatonales (Diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 conforme al Plan de aprovechamiento forestal presentado) para "OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".

La visita se realizó atendiendo la solicitud antes mencionada, asistentes:

NOMBRE	CARGO
Ronald Felipe Salazar Abril	Secretario de Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural
Jorge Eduardo Sánchez Guio	Profesional Universitario adscrito a SAADR.

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realiza visita por Ronald Felipe Salazar Abril Secretario de Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural y Jorge Eduardo Sánchez Guio Profesional Universitario adscrito a la Secretaria de Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural (SAADR), para AUTORIZAR la intervención de las especies ubicadas en el espacio público (Andenes peatonales de la Diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 conforme al Plan de Aprovechamiento Forestal presentado) para "OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".

En el recorrido realizado en los andenes peatonales de la diagonal séptima con el fin de abarcar el 100% del censo de los árboles ubicados en dichos andenes, se inicia en la calle 10 y finaliza en la carrera 16, en donde se pudo identificar cincuenta y ocho (58) individuos vegetales distribuidos en los andenes peatonale de ambos costados de la diagonal séptima desde la calle 10 hasta la carrera 16, los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 1. *Distribución de especies por familia y su abundancia de individuos vegetales ubicados en los andenes peatonales de la diagonal séptima desde la calle 10 hasta la carrera 16.*

FAMILIA	No. INDIVIDUOS
Acacia dealbata	1
Annona squamosa	1
Azadirachta indica	7
Bougainvillea glabra	1
Crateva tapia	4
Crescentia cujete	1
Dypsis lutescens	6
Guazuma ulmifolia	7
Licania tomentosa	4
Morinda citrifolia	1
Murraya paniculata	1
Pasovia pyrifolia	1
Samanea saman	3
Sassafras albidum	1
Spathodea campanulata	1
Swinglea glutinosa	2
Syzygium malaccense	5
Tabebuia guayacan	5
Tabebuia rosea	2
Terminalia catappa	2
Cassia fistula	1
Leucaena leucocephala	1
Total	**58**

En el recorrido se verifico el estado fitosanitario, circunferencia a la altura del pecho CAP y el diámetro a la altura de pecho DAP de cada individuo vegetal ubicados en los separadores de la diagonal séptima.

- **Diámetro a la altura del pecho (DAP)**; Para el cálculo del diámetro a la altura del pecho, se utilizó una cinta métrica para medir el CAP, posteriormente en oficina se calcula el DAP. Este dato se registró a los 1.3 metros de altura aproximadamente con relación a la superficie del suelo.

- **Marcación**; Los individuos no se marcaron directamente, sin embargo, se le asigno un numero a cada uno según el sentido (CODIGO) en el cual se realizó el inventario, para ello el sentido coherente fue: Inicio calle 10; fin Carrera 16. (Empezando sector izquierdo)

- **Tratamiento silvicultural**; Para su diagnóstico se evalúa condición, posición y nivel de afectación con respecto a la intervención previamente que se les han realizado a los individuos. Se procedió a diagnosticar si es necesario realizar una tala o traslado según las características del árbol.

- **Registro de datos**; El registro de la información se llevó a cabo en el formato de inventario forestal, en el cual se puede identificar variables como: N° del árbol, nombre común, nombre científico, CAP, DAP. Además, se registró el tratamiento silvicultural que se debe realizar a cada individuo.

Tabla 2. Registro de datos del censo de los árboles forestales ubicados en los andenes peatonales de la Diagonal séptima desde la calle 10 hasta la carrera 16.

CODIGO	ESPECIE	N.CIENTIFICO	FAMILIA	CAP (cm)	DAP (cm)	ALTURA (m)	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES
1	Pomarroso	*Syzygium malaccense*	Myrtaceae	77.5	25	6	Tala	Frutal
2	Palma areca	*Dypsis lutescens*	Arecaceae	21.0	7	3.5	Tala	
3	Palma areca	*Dypsis lutescens*	Arecaceae	28.0	9	3	Tala	
4	Palma areca	*Dypsis lutescens*	Arecaceae	12.0	4	2	Tala	
5	Neem	*Azadirachta indica*	Meliáceas	65.0	21	8	Poda de despeje	
6	Palma areca	*Dypsis lutescens*	Arecaceae	10.0	3	2	Tala	
7	Palma areca	*Dypsis lutescens*	Arecaceae	13.0	4	1.8	Tala	
8	Chicala	*Tabebuia rosea*	Bignoniáceas	65.0	21	6	Tala	
9	Naranjuelo	*Crateva tapia*	Capparaceae	172.0	55	10	Tala	
10	Guacimo	*Guazuma ulmifolia*	Malváceas	145.0	46	9	Tala	Volcamiento
11	Swingle	*Swinglea glutinosa*	Rutaceae	38.0	12	2.8	Tala	
12	Veranera	*Bougainvillea glabra*	Nyctaginaceae	8.0	3	3	Tala	
13	Naranjuelo	*Crateva tapia*	Capparaceae	74.5	24	5	Tala	Muerto en pie por anillamiento
14	Saman	*Samanea saman*	Fabáceas	58.0	18	5	Tala	Raiz expuesta riesgo de volcamiento
15	Naranjuelo	*Crateva tapia*	Capparaceae	64.0	20	6.5	Tala	Raiz expuesta riesgo de volcamiento
16	Naranjuelo	*Crateva tapia*	Capparaceae	70.0	22	7	Tala	Raiz expuesta riesgo de volcamiento
17	Chicala	*Tabebuia rosea*	Bignoniáceas	55.5	18	7	Tala	
18	Oití	*Licania tomentosa*	Chrysobalanaceae	38.0	12	3	Tala	
19	Neem	*Azadirachta indica*	Meliáceas	62.0	20	8	Tala	
20	Guayacan	*Tabebuia guayacan*	Bignoniáceas	94.5	30	7	Tala	
21	Guayacan	*Tabebuia guayacan*	Bignoniáceas	90.0	29	7	Tala	
22	Guayacan	*Tabebuia guayacan*	Bignoniáceas	100.0	32	8	Tala	
23	Guayacan	*Tabebuia guayacan*	Bignoniáceas	102.0	32	8	Tala	
24	Guayacan	*Tabebuia guayacan*	Bignoniáceas	95.0	30	8	Tala	
25	Caña fistula	*Cassia fistula*	Fabáceas	128.0	41	9	Tala	
26	Pomarroso	*Syzygium malaccense*	Myrtaceae	71.0	23	4	Contenedor de raicez	Frutal

27	Pomarroso	*Syzygium malaccense*	Myrtaceae	71.5	23	4.5	Contenedor de raicez	Frutal
28	Pomarroso	*Syzygium malaccense*	Myrtaceae	40.0	13	4.5	Contenedor de raicez	Frutal
29	Pomarroso	*Syzygium malaccense*	Myrtaceae	55.0	18	4	Contenedor de raicez	Frutal
30	Almendro	*Terminalia catappa*	Combretáceas	165.0	53	11	Poda radicular	Frutal
31	Neem	*Azadirachta indica*	Meliáceas	160.0	51	12	Tala	
32	Neem	*Azadirachta indica*	Meliáceas	175.0	56	10	Tala	
33	Almendro	*Terminalia catappa*	Combretáceas	166.0	53	12	Tala	Frutal
34	Neem	*Azadirachta indica*	Meliáceas	210.0	67	11	Tala	
35	Neem	*Azadirachta indica*	Meliáceas	200.0	64	12	Tala	
36	Swingle	*Swinglea glutinosa*	Rutaceae		0		Poda	
37	Saman	*Samanea saman*	Fabáceas	62.0	20	5	Poda	
38	Guacimo	*Guazuma ulmifolia*	Malváceas	52.0	17	6	Poda	
39	Guacimo	*Guazuma ulmifolia*	Malváceas	48.0	15	4.5	Poda	
40	Leucaena	*Leucaena leucocephala*	Fabáceas	53.0	17	6	Poda	
41	Oití	*Licania tomentosa*	Chrysobalanaceae	48.0	15	3	Tala	
42	Oití	*Licania tomentosa*	Chrysobalanaceae	20.0	6	2.5	Tala	
43	Saman	*Samanea saman*	Fabáceas	187.0	60	5	Tala	
44	Sazafraz	*Sassafras albidum*	Lauráceas	58.0	18	4	Tala	
45	Palma areca	*Dypsis lutescens*	Arecaceae	13.0	4	3	Tala	
46	Noni	*Morinda citrifolia*	Rubiaceae	42.0	13	3	Tala	Frutal
47	Oití	*Licania tomentosa*	Chrysobalanaceae	35.0	11	3.5	Tala	
48	Anon	*Annona squamosa*	Annonaceae	20.0	6	2	Tala	Frutal
49	Neem	*Azadirachta indica*	Meliáceas	22.0	7	2	Tala	
50	Totumo	*Crescentia cujete*	Bignoniáceas	82.0	26	8	Tala	Frutal
51	Acacia	*Acacia dealbata*	Fabáceas	60.0	19	5	Tala	
52	Pasovia	*Pasovia pyrifolia*	Loranthaceae	30.0	10	4	Tala	
53	Guacimo	*Guazuma ulmifolia*	Malváceas	98.0	31	5	Tala	
54	Limonaria	*Murraya paniculata*	Rutaceae	42.0	5	3	Contenedor de raicez	
55	Tulipan africano	*Spathodea campanulata*	Bignoniáceas	50.0	16	5	Contenedor de raicez	
56	Guacimo	*Guazuma ulmifolia*	Malváceas	72.0	23	4	Tala	
57	Guacimo	*Guazuma ulmifolia*	Malváceas	43.0	14	3	Tala	
58	Guacimo	*Guazuma ulmifolia*	Malváceas	51.0	16	5	Tala	

*Los diferentes registros fotográficos reposan en la SAADR.

1845

III. EVALUACIÓN DOCUMENTACION TÉCNICA

Sea lo primero indicar que el ambiente sano es un derecho del que gozan todas las personas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 de la Constitución Política de 1991. Para ello, el artículo 80 superior, en concordancia con el artículo 8° de la misma norma, dispone que el responsable del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales es el Estado, el cual tendrá como objetivo garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución.

De acuerdo con lo anterior, las entidades territoriales deben garantizar la debida protección de los recursos naturales de la Nación; Por ello, el artículo 65 de la Ley 99 de 1993 establece que, entre otras entidades, los municipios deben dictar, con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio. y promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Según lo normado en el Decreto 1076 (Mayo 26 de 2015), ***Sección 9. DEL APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS, Artículo 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicación por obra pública o privada,*** se dispone:

"Cuando se requiera talar, transplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ***ante las autoridades municipales****, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.*

La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o transplante cuando sea factible.

Parágrafo.- *Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Artículo, la autoridad ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o paisajístico, relacionadas con las especies, objeto de solicitud".* **(Subrayado y negrilla fuera de texto).**

Ahora, con respecto al aprovechamiento y manejo de los árboles aislados, de acuerdo con lo establecido en el *ACUERDO 021 DE 2018 "Por el cual se determina el régimen de uso, aprovechamiento y protección, así como el transporte y movilización de la flora silvestre y de los bosques, naturales en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR"*, que en su artículo 50 dispone:

"ARTÍCULO 50. Tala y poda de árboles en el espacio público urbano. *El permiso para podar o talar árboles clasificados en la categoría de elementos complementarios del espacio urbano que sirven de adorno o decoración en jardines, separadores viales y parques, será otorgado por las* ***oficinas de planeación municipal o distrital o la dependencia que cumpla sus funciones*** *de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1077 de 2015 o las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan. Para la movilización de los productos se requiere el salvoconducto correspondiente otorgado por la CAR.*

Parágrafo. *El presente artículo no cobija la tala o poda de árboles que hagan parte de los elementos constitutivos naturales del espacio público, definidos por el numeral 1 del artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015 o las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan".* **(Subrayado y negrilla fuera de texto).**

Aunado a lo anterior, la secretaría competente en el municipio de Ricaurte para otorgar el permiso previsto en el Artículo 50 del Acuerdo No. 21 de 2018, es la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural, pues, entre las funciones establecidas. en el ***Decreto No. 270 de 2017***, se asume que debe: " *i) planear, formular, dirigir, coordinar y evaluar las políticas, planes, programas y procesos relacionados con el diagnóstico ambiental y de recursos naturales a nivel municipal, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, ii) planear, formular, dirigir, coordinar, evaluar y controlar el desarrollo de las políticas, planes, programas y procesos relacionados con la asistencia técnica, asesoría, capacitación para el fomento, protección, control y desarrollo. del ambiente, fortalecimiento forestal y recursos naturales a nivel municipal, iii) planear, dirigir, controlar y evaluar el proceso de formular conceptos y viabilidad en materia ambiental en relación con proyectos y procesos de desarrollo urbanístico para el cumplimiento de normas sobre conservación y protección del ambiente".*

Una vez aclarado lo anterior, se evalúa la solicitud del señor Luis Eduardo Alvarado Pulecio C.C. 1.105.678.088 de Espinal (Tolima) en calidad de representante legal del CONSORCIO DIAGONAL RC contratista para la ejecución del CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 403 – 2023 "OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA" y de la señora Paola Andrea Rodríguez Alcalá en calidad de representante legal del contrato de Interventoría Nº 413 de 2023 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANACIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMIENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA", donde solicitan a la secretaria la intervención de las especies ubicadas en el espacio público (andenes peatonales de la Diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 conforme al Plan de aprovechamiento forestal presentado) para "OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".

1. PAF DIAGONAL 7MA ANDENES.
2. Censo forestal Andenes Diagonal 7ma Ricaurte.
3. Mapa Censo Andenes Diagonal 7ma.
4. KMZ Censo forestal Andenes Diagonal 7ma Ricaurte KMZ.
5. Registro Fotográfico.

IV. CONCEPTO TÉCNICO

OTORGAR a favor del **CONSORCIO DIAGONAL RC**, a través de su representante legal **LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO** identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.105.678.088 de Espinal (Tolima), la autorización para ejecutar CINCUENTA Y OCHO (58) intervenciones silviculturales, distribuidas en CUARENTA Y TRES (43) TALAS y QUINCE (15) PODAS DE INDIVIDUOS ARBOREOS localizados en espacio público urbano (Andenes peatonales de la diagonal

séptima desde la calle 10 hasta la carrera 16, conforme a lo establecido en ***Tabla 3.*** *Registro de datos del censo de los árboles forestales ubicados en los andenes peatonales de la Diagonal séptima desde la calle 10 hasta la carrera 16,* distribuidos de la siguiente manera:

- **ÁRBOLES AUTORIZADOS PARA PODA:** Como resultado del diagnóstico a la vegetación en el área de influencia se determinaron como tratamiento de poda a 13 individuos mayormente < a 10 cm de DAP (relacionados en la **Tabla 3.**), las cuales se determinaron viables dejar por el tratamiento que se le da y que no interfieren en el desarrollo de obra.

Tabla 4. *Distribución de especies para los individuos vegetales ubicados en los andenes peatonales de la diagonal séptima desde la calle 10 hasta la carrera 16 con tratamiento de poda.*

COd	ESPECIE	N. CIENTIFICO	FAMILIA	CAP (cm)	DAP (cm)	ALT (m)	TRATAMIENTO	OBSERV
5	Neem	*Azadirachta indica*	Meliáceas	65.0	21	8	Poda de despeje	
26	Pomarroso	*Syzygium malaccense*	Myrtaceae	71.0	23	4	Contenedor de raicez	Frutal
27	Pomarroso	*Syzygium malaccense*	Myrtaceae	71.5	23	4.5	Contenedor de raicez	Frutal
28	Pomarroso	*Syzygium malaccense*	Myrtaceae	40.0	13	4.5	Contenedor de raicez	Frutal
29	Pomarroso	*Syzygium malaccense*	Myrtaceae	55.0	18	4	Contenedor de raicez	Frutal
30	Almendro	*Terminalia catappa*	Combretáceas	165.0	53	11	Poda radicular	Frutal
36	Swingle	*Swinglea glutinosa*	Rutaceae		0		Poda	
37	Saman	*Samanea saman*	Fabáceas	62.0	20	5	Poda	
38	Guacimo	*Guazuma ulmifolia*	Malváceas	52.0	17	6	Poda	
39	Guacimo	*Guazuma ulmifolia*	Malváceas	48.0	15	4.5	Poda	
40	Leucaena	*Leucaena leucocephala*	Fabáceas	53.0	17	6	Poda	
54	Limonaria	*Murraya paniculata*	Rutaceae	42.0	5	3	Contenedor de raicez	
55	Tulipan africano	*Spathodea campanulata*	Bignoniáceas	50.0	16	5	Contenedor de raicez	

- **ÁRBOLES AUTORIZADOS PARA TALA:** De los resultados obtenidos del Inventario forestal, se diagnostica la necesidad de **TALAR** 45 individuos arbóreos (relacionados en la **Tabla 4.**) y conforme a lo estipulado en la columna de observaciones, adicional de interferir en el desarrollo de la obra a ejecutar.

Tabla 5. *Distribución de especies para los individuos vegetales ubicados en los andenes peatonales de la diagonal séptima desde la calle 10 hasta la carrera 16 con tratamiento de TALA*

COD	ESPECIE	N.CIENT	FAMILIA	CAP (cm)	DAP (cm)	ALT (m)	TRATAM	OBSERVACIONES
1	Pomarroso	*Syzygium malaccense*	Myrtaceae	77.5	25	6	Tala	Frutal
2	Palma areca	*Dypsis lutescens*	Arecaceae	21.0	7	3.5	Tala	
3	Palma areca	*Dypsis lutescens*	Arecaceae	28.0	9	3	Tala	
4	Palma areca	*Dypsis lutescens*	Arecaceae	12.0	4	2	Tala	
6	Palma areca	*Dypsis lutescens*	Arecaceae	10.0	3	2	Tala	
7	Palma areca	*Dypsis lutescens*	Arecaceae	13.0	4	1.8	Tala	
8	Chicala	*Tabebula rosea*	Bignoniáceas	65.0	21	6	Tala	
9	Naranjuelo	*Crateva tapia*	Capparaceae	172.0	55	10	Tala	
10	Guacimo	*Guazuma ulmifolia*	Malváceas	145.0	46	9	Tala	Volcamiento
11	Swingle	*Swinglea glutinosa*	Rutaceae	38.0	12	2,8	Tala	
12	Veranera	*Bougainvillea glabra*	Nyctaginaceae	8.0	3	3	Tala	

13	Naranjuelo	*Crateva tapia*	Capparaceae	74.5	24	5	Tala	Muerto en pie por anillamiento
14	Saman	*Samanea saman*	Fabáceas	56.0	18	5	Tala	Raiz expuesta riesgo de volcamiento
15	Naranjuelo	*Crateva tapia*	Capparaceae	64.0	20	6.5	Tala	Raiz expuesta riesgo de volcamiento
16	Naranjuelo	*Crateva tapia*	Capparaceae	70.0	22	7	Tala	Raiz expuesta riesgo de volcamiento
17	Chicala	*Tabebuia rosea*	Bignoniáceas	55.5	18	7	Tala	
18	Oití	*Licania tomentosa*	Chrysobalanaceae	38.0	12	3	Tala	
19	Neem	*Azadirachta indica*	Meliáceas	62.0	20	8	Tala	
20	Guayacan	*Tabebuia guayacan*	Bignoniáceas	94.5	30	7	Tala	
21	Guayacan	*Tabebuia guayacan*	Bignoniáceas	90.0	29	7	Tala	
22	Guayacan	*Tabebuia guayacan*	Bignoniáceas	100.0	32	8	Tala	
23	Guayacan	*Tabebuia guayacan*	Bignoniáceas	102.0	32	8	Tala	
24	Guayacan	*Tabebuia guayacan*	Bignoniáceas	95.0	30	8	Tala	
25	Caña fistula	*Cassia fistula*	Fabáceas	128.0	41	9	Tala	
31	Neem	*Azadirachta indica*	Meliáceas	160.0	51	12	Tala	
32	Neem	*Azadirachta indica*	Meliáceas	175.0	56	10	Tala	
33	Almendro	*Terminalia catappa*	Combretáceas	168.0	53	12	Tala	Frutal
34	Neem	*Azadirachta indica*	Meliáceas	210.0	67	11	Tala	
35	Neem	*Azadirachta indica*	Meliáceas	200.0	64	12	Tala	
41	Oití	*Licania tomentosa*	Chrysobalanaceae	48.0	15	3	Tala	
42	Oití	*Licania tomentosa*	Chrysobalanaceae	20.0	6	2.5	Tala	
43	Saman	*Samanea saman*	Fabáceas	187.0	60	5	Tala	
44	Sazafraz	*Sassafras albidum*	Lauráceas	56.0	18	4	Tala	
45	Palma areca	*Dypsis lutescens*	Arecaceae	13.0	4	3	Tala	
46	Noni	*Morinda citrifolia*	Rubiaceae	42.0	13	3	Tala	Frutal
47	Oití	*Licania tomentosa*	Chrysobalanaceae	35.0	11	3.5	Tala	
48	Anon	*Annona squamosa*	Annonaceae	20.0	6	2	Tala	Frutal
49	Neem	*Azadirachta indica*	Meliáceas	22.0	7	2	Tala	
50	Totumo	*Crescentia cujete*	Bignoniáceas	82.0	26	8	Tala	Frutal
51	Acacia	*Acacia dealbata*	Fabáceas	60.0	19	5	Tala	
52	Pasovia	*Pasovia pyrifolia*	Loranthaceae	30.0	10	4	Tala	
53	Guacimo	*Guazuma ulmifolia*	Malváceas	98.0	31	5	Tala	
56	Guacimo	*Guazuma ulmifolia*	Malváceas	72.0	23	4	Tala	
57	Guacimo	*Guazuma ulmifolia*	Malváceas	43.0	14	3	Tala	
58	Guacimo	*Guazuma ulmifolia*	Malváceas	51.0	16	5	Tala	

V. VIGENCIA DEL PERMISO O AUTORIZACIÓN

Este permiso o autorización tiene vigencia de un (01) año. El termino Inicialmente otorgado, podrá ser prorrogado siempre y cuando la solicitud se realice ante su expiración y se expida viabilidad técnica, ambiental y jurídica por parte de la Secretaria de Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural, a favor de El **CONSORCIO DIAGONAL RC**, a través de su representante legal **LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO** identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.105.678.088 de Espinal (Tolima)

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES

- La Administración Municipal de Ricaurte y la Secretaria de Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural, NO se hace responsable por los daños, afectaciones y perjuicios que se realicen a terceros por causa de la tala y/o poda de los árboles autorizados en el presente informe técnico.
- Remitir al **CONSORCIO DIAGONAL RC**, a través de su representante legal **LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.105.678.088 de Espinal (Tolima), el presente informe técnico para su conocimiento y fines pertinentes.
- Remitir a la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas para su conocimiento y fines pertinentes.
- La madera y productos derivados del Aprovechamiento forestal único NO se podrán comercializar, los residuos vegetales generados durante el aprovechamiento serán tratados como residuos ordinarios, a fin de su correcta disposición y eliminación total dejando al área libre de todo tipo de residuos, mediante la disposición en rellenos sitios autorizados y certificados por la autoridad ambiental CAR. El material de ser aprovechado debe ubicarse y definir el uso y reportarse a la Secretaria de Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural.
- De requerir la movilización de la madera producto del aprovechamiento forestal debe tramitar el correspondiente al salvoconducto de movilización ante la autoridad ambiental CAR, además informar previamente a la Secretaria de Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural.
- IMPONER al **CONSORCIO DIAGONAL RC**, a través de su representante legal **LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.105.678.088 de Espinal (Tolima), como MEDIDA DE COMPENSACIÓN POR LA TALA DE ÁRBOLES EN ESPACIO PÚBLICO URBANO OBJETO DE LA PRESENTE AUTORIZACIÓN, LA PLANTACIÓN DE CUARENTA Y CINCO (45) ÁRBOLES DE ESPECIES NATIVAS, en los cuales se pueden tener en cuenta las siguientes: Acacio rojo (***Delonix regia***), Algarrobo (***Prosopis juliflora***), Ambuca (***Acacia tortuosa***), Bayo (***Acacia glomerata***), Cajeto (***Trichanthera gigantea***), Chicalá (***Tabebuia ochracea***), Gualanday (***Jacaranda caucana***), Guayacán (***Bulnesia arborea***), Guácimo (***Guazuma ulmifolia***) entre otros o especies de porte medio de acuerdo al diseño paisajístico de la obra.
- La entidad titular de la presente autorización, deberá realizar las labores Silviculturales de mantenimiento, sostenimiento, fertilización y reposición de la mortalidad, por el término de tres (3) años o hasta que los individuos plantados demuestren su sobrevivencia de forma natural, de igual forma los árboles que se mueran o se afecten, deberán ser inmediatamente reemplazados. La supervivencia será del 90% y deberá presentar un informe (material probatorio) ante la Secretaria dentro de los tres (03) meses siguientes a la realización de la actividad, para así constatar dicha compensación.
- Adoptar las medidas de precaución necesarias, para evitar cualquier percance a la integridad física de personal que circula por el sector o del operario que intervendrá en el aprovechamiento, así como de los bienes de propiedad propia o de terceros, empleando para los trabajos de aprovechamiento personal idóneo.
- Las actividades de tala deberán contar preferiblemente con la dirección y apoyo técnico de un Ingeniero Forestal que se encargue de coordinar las actividades, quien será el responsable técnico del trabajo, debe ser una persona con experiencia calificada y tener conocimientos en el derribo direccional de árboles y podas, la planeación de las actividades, el control de

personal y la seguridad patrimonial y del personal a su cargo, de tal manera que pueda distribuir a su personal eficientemente para que logre el éxito en el trabajo por realizar y con la máxima seguridad. Así como garantizar la no afectación de los bienes públicos y privados cercanos a los árboles autorizados.

- Durante el aprovechamiento forestal se deberá dar el manejo adecuado a los residuos o retal, tomando las medidas preventivas para el control de incendios, enfermedad y contaminación, a la vez evitar la disposición de residuos en sitios NO autorizados. Así mismo se deberá observar en desarrollo del aprovechamiento que el material vegetal de residuo producto de la tala deberá ser retirado de área en su totalidad.
- Realizar las actividades de aprovechamiento de los individuos forestales, relacionados en el ítem IV de la presente actuación, a través de personal idóneo que garantice la integridad del personal que desarrollan labores de aprovechamiento, de las personas que habitan y transitan por el lugar a intervenir, mediante la señalización del área, y así mismo evitar daños a las líneas de trasmisión eléctrica, de telefonía entre otras que se ubican sobre las copas de los árboles a talar y/o podar.
- Cumplir con las consideraciones ambientales requeridas para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos e impactos negativos causados en desarrollo del aprovechamiento forestal.
- Tener especial cuidado con la flora y fauna silvestre asociada al área del aprovechamiento, a fin de procurar por su protección y conservación, mediante prácticas de ahuyentamiento de especies, reubicación permanente o transitoria de nidos, entre otras que garanticen su conservación, durante la actividad de aprovechamiento forestal.
- Deberá cumplir los términos y condiciones de la medida de compensación que a través del presente acto administrativo se imponga.
- Abstenerse de provechar especies forestales diferentes a lo autorizado en la presente actuación administrativa.
- Los residuos del proceso de aprovechamiento, no podrán eliminarse por medio de quemas u otro método que menoscaben o vayan en perjuicio del medio ambiente y los recursos naturales.

ADVERTIR AL CONSORCIO DIAGONAL RC, a través de su representante legal **LUIS EDUARDO ALVARADO PULECIO** identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.105.678.088 de Espinal (Tolima), que cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio correspondiente.

Es el informe,

RONALD FELIPE SALAZAR ABRIL
SECRETARIO DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

7.14 ACTAS DE COMITÈ TÈCNICO

Paola Rodriguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

INFORMACIÓN BÁSICA

FECHA	: Año 2024 Mes 04 Día 24		
LUGAR	: RICAURTE CUNDINAMARCA	CONTRATISTADE OBRA: CONSORCIO DIAGONAL RC	
HORA INICIO	: 08:09 am	CONTRATO DE OBRA N° : 403-2023	
HORA DE FINALIZACIÓN	: 10:30 am	OBJETO DE OBRA: "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	: 413 -2023		
INTERVENTORÍA	: PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ	OBJETO DE INTERVENTORÍA: "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA"	
ORDINADOR ACTA	: JEILY KATHERINE MOTTA TAFUR		
		SUMINISTRO [ ]	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN [ ]
		CONSULTORÍA [ ]	ADMINISTRATIVA [ ]
OBJETIVO	: COMITÉ DE OBRA	OBRA [X]	[ ]

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO EMPRESA	FIRMA
Stephanni Carolina Clark	PROF. universitaria área técnica	Stephanni Clark
María Fernanda Padilla D.	Jefe Coordinación Técnica	
Eliana Andrea Carvajal Rico	Dir. Servicios Públicos	
Nohora A. Malagon C.	Apoyo a la Supervisión Municipio	
Sebastian Gonzalez Jimenez	Director de Proyectos	
JUAN PABLO AVILA L	CONTRATISTA - S.I.C.O.P	
Jeily Katherine Motta Tafur	Interventoría	
Hector Daniel Morales Devia	Ser. Infraestructura y Obras Publicas	

OBSERVACIONES AL ACTA ANTERIOR

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN EL ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIÓ SI	CUMPLIÓ NO

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes Día

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIÓ	
		SI	NO

TEMAS TRATADOS

Se da inicio al comité a las 08:09am con presencia del Ing Hector Morales - Secretario de Infraestructura y obras públicas, apoyo a la Supervisión, profesionales de Alcari, directora de servicios públicos, asesor de obras públicas, contratista de obra e interventoría

El Ingeniero Hector Morales manifiesta que el proposito del recorrido en obra es hacer entrega del Plano de definición de acometidas por parte de Alcari a la Secretaria de Infraestructura y obras públicas. Así mismo, inspeccionar el estado actual de la red antigua sanitaria.

el asesor informa que entre la carrera 14b a la carrera 15 Sobre la diagonal Séptima requiere ser rehabilitada y se encuentra considerada dado que se encuentra en asbesto cemento, por lo cual, se debe considerar en el balance y alcance del proyecto la reposición de la red

el ingeniero Hector Morales solicita alcari informar cuando definirá el estado actual de la red antigua combinada con el propósito de definir sellar la red, por lo cual, Alcari como empresa prestadora del Servicio deberá certificar el estado y así definir al Contratista de obra y dar continuidad a las actividades de obra. De igual manera, se recomienda al contratista de obra e interventoría rendique si se evidencia funcionamiento de la red antigua en algún tramo.

Alcari sas esp manifiesta que realizará inspección de la red con el personal operativo durante el día.

el Ingeniero Hector Morales solicita al contratista de obra despejar los pozos que se encuentran con material para que Alcari pueda verificar la red antigua y proceder a emitir la certificación y definir el procedimiento a seguir para la suspensión y cierre definitivo de la red antigua Por otra parte, una vez revisada la certificación enviada por Alcari sas esp del día 22 de enero de 2024

Paola Rodriguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

TEMAS TRATADOS CONTINUACIÓN

enmada a la secretaria de Infraestructura en horas de la noche del día 23 de enero de 2024. del estado actual de la red entre la cra 14B y a la cra 15 y el tramo entre la Cra 15 y Cra 16. El secretario de obras públicas manifesta que la certificación debe contener el diametro, profundidad de la tubería y correspondiente diseño de la red a reponer, certificar el estado actual y/o especificas técnicas a tener en cuenta en los tramos mencionados.

Alcan sas esp procede a socializar plano de domiciliarias de los predios en proceso de desarrollo urbanistico futuro y/o no cuentan con la conexión a las redes existentes. Sin embargo, se evidencia que se encuentran pendientes algunos predios. Por lo cual, se sugiere dirigirnos a la alcaldía a la secretaria de planeación y verificar los temas pendientes, realiza acompañamiento el Ing Director de Proyectos. Se aivstará el plano de acometidas de alcan sas esp dado que en el predio alameda del sol esta contra flujo, el Ing sebastian Gonzalez manifesta que tomará los ajustes correspondientes. El secretario de obras públicas solicita que el predio de alameda del sol se conecte directamente a la red y no se considere la caja sanitaria que se encuentra en el espacio público de andén. Se encuentra pendiente considerar el predio 4 y 5, independientemente de lo que se vaya a proyectar. Se solicita a Alcan sas esp incluir de acuerdo al diseño que entregará en el mes de Febrero definir la conexión de acometida de los predios 4 y 5. Surgen dos predios que se encuentran ubicados en la intersección en la cra 14b y diagonal septima. Se deberá definir también en el diseño de entrega el día 07 de Febrero de 2024. Se hace necesario que desde la secretaria de planeación se informe a los propietarios de los predios la definición de las acometidas y así contar con su respectivo permiso, por lo cual, se solicita presencia de la dirección de urbanismo para realizar el acercamiento y contar con el permiso del propietario. El ingeniero Hector Morales manifesta que se establezca el tiempo de notificación a los propietarios para desarrollar las actividades y dejar la colilla del tubo en el predio de lo contrario, se realizará conexión de acometida con caja de inspección en el espacio público. El Ingeniero Hector Morales coloca a consideración a las partes, se concluye que las acometidas se construirán con caja hasta el andén. En el caso de los predios 6 y 7, cuentan con conexión sanitaria pero se debe considerar la red de aguas lluvias. Sin embargo, planeación recomienda considerar acometida sanitaria y de aguas lluvias. El Ingeniero Hector Morales recomienda verificar a alcan sas esp el diámetro de la acometida actual de los predios y verificar si es necesario considerar conexión de acometida con un diametro mayor. Finalmente, concluyen que para los predios 6 y 7, se realizará conexión de acometidas para aguas lluvias y alcan sas esp definirá el diámetro y el punto de conexión (ubicación). realizando análisis al predio No. 02, el director de proyectos sugiere considerar las acometidas con un manejo similar al empleado por concreto

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes Día

DECISIONES TOMADAS

Alcari sas esp atenderá los compromisos pactados y entregará los ajustes correspondientes junto con las certificaciones y diseño en donde se presente detalle, como también, concluirá el ajuste del plano de definición de acometidas con celendad para evitar afectación a la programación de obra

COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA EN QUE SE DEBE CUMPLIR		
		Año	Mes	Día
Despejar los pozos de la red antigua que se encuentran cubiertos entre la ETB y terralonga	contratista de obra	2024	01	24
Inspección de la red antigua desde la ETB hasta la carrera 15.	Alcari Sas esp	2024	01	24
Emitir certificación del estado actual y el procedimiento a ejecutar de la red antigua	Alcari sas esp	2024	01	26
Ajuste a la certificación y solicitud de reposición de red tramos Cra 14b - Cra 15 y Cra 15 a Ta Cra. 16.	Alcari sas esp	2024	02	07
Entrega de plano de definición de domiciliarias a interventoría y contratista de obra.	Supervisión	2024	01	24
ajuste de plano de red conexión de acometidas domiciliarias.	Alcari Sas esp	2024	01	25.

PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA : Año 2024 Mes Día

Por constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en RICAURTE CUNDINAMARCA, a los día(s) del mes de de 2024

Coordinador Acta

Firma

Distribución del documento Original :
Primera copia :
Segunda copia :
Tercera copia :

Paola Rodriguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

INFORMACIÓN BÁSICA

FECHA	: Año 2024 Mes 01 Día 24		
LUGAR	: RICAURTE CUNDINAMARCA	**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO DIAGONAL RC	
HORA INICIO	: 10:38 AM	**CONTRATO DE OBRA N°** : 403-2023	
HORA DE FINALIZACIÓN	: 10:58 AM	**OBJETO DE OBRA:** "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	: 413 -2023		
INTERVENTORÍA	: PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ	**OBJETO DE INTERVENTORÍA:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA"	
COORDINADOR ACTA	: JEILY KATHERINE MOTTA TAFUR		
		SUMINISTRO [ ]	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN [ ]
		CONSULTORÍA [ ]	ADMINISTRATIVA [ ]
OBJETIVO	: COMITÉ DE OBRA	OBRA [X]	[ ]

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO EMPRESA	FIRMA
Rosa Magaly Rojas	Líder de Ingeniería Acuagyrsas	
Julanto Sastoque O.	Líder de de Ingeniería Acuagyr.	
Eliana Andrea Carvajal Rios	Dir. Servicios Públicos Municipio.	
MAURICIO ESPINOSA A.	RESIDENTE OBRA CONSOR RC	
Marca A. Nabay C.	Apoyo Supervisor Municip.	
Jeily Katherine Motta Tafur	Interventoría	
Hector Daniel Morales Devia	Ser. Infraestructura y Obras Públicas	

OBSERVACIONES AL ACTA ANTERIOR

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN EL ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIÓ SI	CUMPLIÓ NO

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes Día

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIÓ	
		SI	NO

TEMAS TRATADOS

Se da inicio al recorrido de obra con presencia del Secretario de Obras Públicas, acuagar sas esp, dirección de servicios públicos, contratista de obra e interventoría con el propósito de atender el oficio del consorcio diagonal RC, en el cual manifiestan que la red de acueducto se encuentra en una profundidad menor a la requerida en la norma, se esta encontrando tubería a 0,70 m generando afectación a la sobrasante de la vía. Acuagar sas esp informa que requerirá al contratista ejecutor de la renovación de la red, verificar las profundidas de instalación del club vacacional de la ETB hasta la carrera 14b. Sin embargo, Por cuestiones de programación de obra, se considera que el contratista de obra tomará las medidas preventivas para evitar afectación a la red y no generar afectación al programa de obra ante los tiempos que tomaría el requerimiento o atención de acuagar sas esp.

Así, es necesario que acuagar sas esp se comprometa que en caso de generarse afectación a la red por las actividades de obra llevará a cabo las reparaciones en el menor tiempo posible y al costo de la empresa operadora acuagar sas esp.

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes Día

TEMAS TRATADOS CONTINUACIÓN

1857

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA Año 2024 Mes Día

DECISIONES TOMADAS

El contratista de obra continuará con sus labores programadas con medidas preventivas para evitar afectación y daños a la red en la profundidad existente.

Aguagyr sas esp se compromete atender cualquier daño que se pueda presentar a la red oportunamente sin generar un cobro al contratista de obra.

COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA EN QUE SE DEBE CUMPLIR		
		Año	Mes	Día

PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA : Año 2024 Mes Día

Por constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en RICAURTE CUNDINAMARCA, a los día(s) del mes de de 2024

Coordinador Acta_____
Firma

Distribución del documento

Original :
Primera copia :
Segunda copia :
Tercera copia :

Paola Rodriguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

INFORMACIÓN BÁSICA

FECHA	: Año 2024 Mes 01 Día 29		
LUGAR	: RICAURTE CUNDINAMARCA	**CONTRATISTADE OBRA:** CONSORCIO DIAGONAL RC	
HORA INICIO	: 02:41 pM	**CONTRATO DE OBRA N°** : 403-2023	
HORA DE FINALIZACIÓN	:	**OBJETO DE OBRA:** "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	: 413 -2023		
INTERVENTORÍA	: PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ	**OBJETO DE INTERVENTORÍA:** "INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA"	
COORDINADOR ACTA	: JEILY KATHERINE MOTTA TAFUR		
		SUMINISTRO ☐	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐
		CONSULTORÍA ☐	ADMINISTRATIVA ☐
OBJETIVO	: COMITÉ DE OBRA	OBRA ☒	☐

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO EMPRESA	FIRMA
Sorany Ortega Delgadillo	Secretaria De Planeación	
Hector Daniel Morales Daza	Sec. de Infraestructura y Obras Publicas	
Sebastian Gonzalez	Director de Proyectos	
MAURICIO ESPINOSA A.	RESIDENTE DE OBRA CONS. DIAG RC	
Andrea Concepción Rico	Dir. Servicios Públicos	
JUAN PABLO AVILA L.	CONTRATISTA - ASESOR S.I.O.P.	
Nora A Malagon C.	Aprueba la Supervisión	

OBSERVACIONES AL ACTA ANTERIOR

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN EL ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIÓ SI	CUMPLIÓ NO

Paola Rodriguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes Día

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIÓ	
		SI	NO
ajuste al diseño de querido al acta de comité 15 de enero de 2024	Secretaria de Planeación	X	

TEMAS TRATADOS

Se reunen en las instalaciones de la Alcaldía Municipal con presencia del Sr. Alcalde Campo Elias Prada Ortiz, Secretario de Infraestructura y obras públicas, Secretaria de planeación, asesor de Infraestructura, director de proyectos, directora de servicios públicos, profesional de apoyo a la supervisión, contratista de obra e Interventoría, con el proposito de dar a conocer el ajuste del diseño de la diagonal Septima y así mismo, establecer la fecha de socialización a la comunidad de los ajustes.

el director de proyectos da inicio a la exposición del ajuste del diseño e informa que se realizo la implantación de la Glorieta Manueles con las condiciones finales, respeto el eje de la vía actual garantizando el ancho de calzada, se hace claridad que el ajuste al diseño contempla del club vacacional de la ETB hasta la carrera 15 dado que, se tendrá que analizar las condiciones de diseño de la Carrera 15 hasta la carrera 16. así mismo, se debe realizar acercamiento con la Secretaria de agricultura, contratista de obra e interventoría para analizar las especies preferiblemente ornamentales en el separador y zonas verdes. Teniendo en Cuenta que, el ancho del Separador será de 1,00 mts con un área verde de 60 cm aproximadamente, ancho de cada calzada 6,00 mts.

Realiza intervención el Ing Hector Morales en calidad de Secretario de Infraestructura y obras públicas, informa a los partícipes que ante la presencia de la red antigua combinada

Paola Rodriguez Alcala

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA Año 2024 Mes Dia

TEMAS TRATADOS CONTINUACIÓN

Y en comité con alcari se solicito establecer el estado actual de la red y las recomendaciones correspondientes, Por lo cual, alcari sugiere realizar retiro y/o remoción de la red antigua y así evitar afectaciones futuras a la estructura de pavimentación, dicha medida también es aprobada por la supervisión municipal. Por otra Parte, la supervisión municipal hace entrega del ajuste al diseño de Pavimento de la consultoría CONSORCIO Diseño 7, al contratista de obra e interventoría, para que sea revisado por los Profesionales correspondientes para su respectiva aprobación y/o consideración en el desarrollo del proyecto.

Finalmente, se hace entrega del ajuste al diseño y se hace claridad que el contratista de obra e interventoría deberá analizar y definir la ubicación del mobiliario urbano, así mismo, analizar las especies arboreas para el desarrollo del paisajismo del proyecto, se procede a realizar el plano ajustado de las acometidas de red pluvial y/o sanitaria de los Proyectos o predios que no se encuentran conectados a la red existente de alcantarillado pluvial y/o sanitario; plano que será remitido en horas de la tarde, se recomienda al contratista de obra e interventoría que cualquier ajuste debe ir en cumplimiento de la normatividad RAS, se informa que la empresa alcari sas esp no recomienda y sugiere dejar las acometidas existentes de los predios pese al desarrollo futuro que tengan los Predios, Dado que, no se cuenta con claridad del diseño y desarrollo futuro de los predios.

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes Día

DECISIONES TOMADAS

COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA EN QUE SE DEBE CUMPLIR		
		Año	Mes	Día
Entrega oficial del plano de diseño de pavimentación ajustado.	Supervisión municipal, secretaria de planeación	2024	01	29
Entrega oficial del plano de acometidas de redes pluviales y sanitarias	alcari sas esp.	2024	01	29

PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA : Año 2024 Mes Día

Por constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en RICAURTE CUNDINAMARCA, a los día(s) del mes de de 2024

Coordinador Acta_____

Firma

Distribucion del documento Original :

Primera copia :

Segunda copia :

Tercera copia :

Paola Rodriguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

INFORMACIÓN BÁSICA

FECHA	: Año 2024 Mes 01 Día 30		
LUGAR	: RICAURTE CUNDINAMARCA	**CONTRATISTADE OBRA:** CONSORCIO DIAGONAL RC	
HORA INICIO	: 10:10 AM	**CONTRATO DE OBRA N°** : 403-2023	
HORA DE FINALIZACIÓN	: 10:30 AM	**OBJETO DE OBRA:** "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	: 413 -2023		
INTERVENTORÍA	: PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÀ	**OBJETO DE INTERVENTORÍA:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA"	
ORDINADOR ACTA	: JEILY KATHERINE MOTTA TAFUR		
		SUMINISTRO [ ]	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN [ ]
		CONSULTORÍA [ ]	ADMINISTRATIVA [ ]
OBJETIVO	: COMITÉ DE OBRA	OBRA [x]	[ ]

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO EMPRESA	FIRMA
Wilson Ivan Ramirez	Jefe Oficina Claro.	
Jose Roberto Cayo J	Director Tto's Alcaldia de Ricaurte	
Monica Rodriguez	Supervisor Agentes TTT	
Camilo Gomez	Area Comercial	
MAURICIO ESPINOSA	RESIDENTE CONSORCIO DIAGONAL RC	
Jeily Katherine Motta Tafur	Interventoria	

OBSERVACIONES AL ACTA ANTERIOR

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN EL ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIÓ SI	CUMPLIÓ NO

Paola Rodriguez Alcala

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes Día

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIÓ	
		SI	NO

TEMAS TRATADOS

Se realiza visita al tramo en intervención por parte de la empresa de telecomunicaciones claro sa en compañía del Ing Jose Antonio Camros en calidad de director de la Tics del municipio de ricaurte, contratista de obra e interventoría, se informa a la empresa del desarrollo del proyecto del contrato de obra No. 403-2023, y las actividades a ejecutar en los proximos días en los andenes, en los muros se encuentran redes de servicio de la empresa en mención en redes que se encuentran ubicadas en la estructura de postería de la empresa de servicio de energía enel colombia, se informa que se está adelantando acercamiento con la empresa enel, dado que se realizará tala de especies arboreas en anden, ya que, interfieren con el diseño del proyecto y no cuentan con condiciones morfologicas idoneas. y ante la presencia de redes que estan interfiriendo con las especies a intervenir. Por lo cual, ante el presente acercamiento se solicita amablemente que claro sa realice acompañamiento los dias en que se Programen las actividades con el propósito de evitar afectaciones a la red de fibra óptica y HFC Presente en el sector; o en efecto, que se presente alguna afectación sea reparada de forma oportuna.

el Ingeniero Wilson Trujillo (Interventor de proyectos de claro) se compromete a brindar el acompañamiento una vez sea notificado a través del telefono de contacto 3202755406 y correo electrónico wilson.trujillo@claro.co.

Paola Rodriguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes Dia

TEMAS TRATADOS CONTINUACIÓN

El contratista de obra informa que se estima dar inicio a las actividades de tala de las especies del club de la ETB hasta la Cra. 14a (tramo en intervención en el momento) el día Jueves 01 de Febrero de 2024. Sin embargo, se informará oportunamente para garantizar el acompañamiento. Interventoría de la diagonal septima manifiesta que el alcance del proyecto es desde el centro vacacional de la ETB hasta la carrera 16, sin embargo, las intervenciones se realizarán por tramos, por lo cual, se notificará de acuerdo al avance y cronograma de obra. Finalmente, el Ingeniero Wilson Trujillo informa que cualquier afectación o daño a la red no producerá costo alguno al consorcio diagonal RC y/o municipio, sino será asumido por la empresa de telecomunicaciones claro sa. Así mismo, recomienda que en caso de daño masivo informar oportunamente para enviar el recurso de reparación dado que estas redes son la principal fuente de alimentación de los servicios de Hogar del municipio de Ricaurte.

1865

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes Día

DECISIONES TOMADAS

COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA EN QUE SE DEBE CUMPLIR		
		Año	Mes	Día
Notificar a claro el inicio y programación de Tala de especies arboreas	contratista de obra	2024	01	31

PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA : Año 2024 Mes Día

Por constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en RICAURTE CUNDINAMARCA, a los día(s) del mes de de 2024

Coordinador Acta_____
Firma

Distribucion del documento Original :
Primera copia :
Segunda copia :
Tercera copia :

Ricaurte

Paola Rodriguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

INFORMACIÓN BÁSICA

FECHA	: Año 2024 Mes 01 Día 31	
LUGAR	: VIRTUAL - TEAMS	**CONTRATISTADE OBRA:** CONSORCIO DIAGONAL RC
HORA INICIO	: 11:00 AM	**CONTRATO DE OBRA Nº :** 403-2023
HORA DE FINALIZACIÓN	: 12:30 PM	**OBJETO DE OBRA:** "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"
CONTRATO DE INTERVENTORIA	: 413 -2023	
INTERVENTORÍA	:PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ	**OBJETO DE INTERVENTORÍA:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA"
COORDINADOR ACTA	: JEILY KATHERINE MOTTA TAFUR	
		SUMINISTRO [ ] DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN [ ]
		CONSULTORÍA [ ] ADMINISTRATIVA [ ]
OBJETIVO	: COMITÉ DE OBRA	OBRA [X] [ ]

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO EMPRESA	FIRMA
JUAN FERNANDO JIMENEZ TARAZONA	DELEGADO / ETB	
CARLOS ALBERTO BERMEO CALDERÓN	LÍDSR DE DISEÑO / ETB	
HECTOR DANIEL MORALES DEVIA	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE RICAURTE	
JUAN PABLO AVILA LOMBANA	ASESOR SIOP	
MONICA ALEJANDRA MALAGÓN	PROFESIONAL DE APOYO SIOP	
JAVIER ORLANDO VILLAMIZAR	COORDINADOR DE PROYECTOS CONTRATISTA DE OBRA	
MAURICIO ESPINOSA ALEMÁN	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO DIAGONAL RC	
JEILY KATHERINE MOTTA TAFUR	INTERVENTORÍA PAOLA RODRIGUEZ ALCALÀ	

OBSERVACIONES AL ACTA ANTERIOR

NO APLICA

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN EL ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIÓ SI	CUMPLIÓ NO
NO APLICA			

Ricaurte

Paola Rodriguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes 01 Día 31

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIÓ	
		SI	NO
NO APLICA	NO APLICA		

TEMAS TRATADOS

Se lleva a cabo reunión virtual a través de la plataforma Microsoft Teams con personal de la Gerencia Planta Externa de ETB, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Contratista de Obra e Interventoría.

En atención a la solicitud de reunión emitida por parte de la Supervisión municipal el día 26 de enero de 2024, con el fin de dar a conocer el alcance del proyecto "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE- CUNDINAMARCA" y así mismo, conocer las redes existentes de la empresa de telecomunicaciones ETB.

Teniendo en cuenta que, durante el desarrollo de las actividades de excavación para la instalación de red pluvial se produjo afectación en una zona del tramo de intervención, por lo cual, se han venido adelantando acercamientos entre las partes, sin embargo, no ha sido definido las reparaciones de las redes y el encargado del desarrollo de las mismas.

Así mismo, se solicita a los participantes de ETB, planos de la redes existentes en el tramo de intervención del proyecto.

El Ing. Carlos Bermeo Profesional de la ETB informa que validará los planos de redes existentes en versión dwg y solicita generar implantación a los planos del diseño del proyecto con el próposito, tener claridad de los tramos que tienen alcance dentro del proyecto.

El Ingeniero Hector Morales - Secelario de Infraestructura y Obras Públicas manifiesta que en caso de requerirse traslado de la red de ETB, cuanto tiempo tomaria realizar el traslado. Sin embargo, el contratista de obra realiza intervención y manifiesta que de acuerdo al desarrollo del proyecto y los contratiempos presentes a la fecha, en caso de realizarse un traslado a la red deberia llevarse a cabo en paralelo a las actividades en ejecución para poder dar inicio a las actividades de conformación de la estructura del pavimento.

Adicionalmente, el Ingeniero Hector Morales manifiesta que ante lo expuesto, se requiere premura para realizar la revisión y localización de las redes existentes.

El Ing. Carlos Bermeo manifiesta que entiende la situación y premura para dar continuidad a las actividades del proyecto y no generar afectación, por lo cual, solicita definan cuando sería remitido planimetría del proyecto para poder realizar la implantación de la infraestructura de las redes existentes a cargo de la empresa.

El Ingeniero Hector Morales interviene y manifiesta que al finalizar la reunión o antes se remitirá vía correo electrónico el plano de diseño del proyecto, sin embargo, hace claridad que entre la carrera 15 a la carrera 16 sobre la diagonal septima, se encuentra en consideración llevar a cabo ajuste al diseño ante unas condiciones técnicas existentes.

2378

Ricaurte

Paola Rodríguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes 01 Día 31

TEMAS TRATADOS CONTINUACIÓN

El Ing. Carlos Bermeo (ETB) solicita amablemente sea remitido el plano de diseño en dwg versión 2017 o anterior e informa que apenas sea recibido se pondrá en contacto en caso de requerir cualquier aclaración, comparte a través del chat de Teams información de contacto.

El Ingeniero Juan Pablo Avila en calidad de Asesor de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas interviene, manifestando si a la fecha existe un informe de diagnóstico de los daños efectuados y costo aproximado, así mismo, si las redes existentes se encuentran en la normativa que corresponde.

El Ingeniero Juan Fernando Jimenez Profesional asignado para el proyecto por parte de la ETB interviene y manifiesta que en el momento no se cuenta con esa información, ya que, eso corresponde el área de mantenimiento y remiten la información después de realizar la reparación que corresponda, por lo cual, tampoco cuentan con un estimado.

Hace intervención el Ing. Carlos Bermeo y manifiesta que dependiendo de como se encuentra la infraestructura se establecerán las afectaciones causadas por el proyecto y estas quedarán plasmadas en los planos de Diseño. Una vez se cuente con los planos solicitados al contratista.

Así mismo, informa que la conclusión es llegar al punto de determinar la reparación que tenga lugar y a quien corresponde ejecutarla. De igual manera, manifiesta que ante las dudas e inquietudes presentes se tendría que programar visita a campo para conocer el estado de las redes existentes de ETB, en el entendido del desconocimiento por parte de los demás partícipes del trazado de las redes.

De igual manera, manifiesta que se encuentran en disposición de brindar el respectivo acompañamiento para dar continuidad al proyecto y garantizar el bienestar del proyecto y evitar afectaciones futuras a la red existente en el alcance del proyecto de los tramos de intervención próximos.

El Ing. Juan Pablo Avila pregunta si los partícipes de la ETB tienen conocimiento del tiempo de construcción de la red existente, para lo cual el Ingeniero Carlos Bermeo responde que son redes de hace mucho tiempo desde cuando existía Teletequendama.

El Ing. Hactor Morales manifiesta que se encontraran atentos a cualquier novedad, inquietud y/o solicitud por parte de la ETB y que una vez sea finalizada la reunión la interventoría remitirá el plano de diseño del proyecto para la ejecución de la implantación de las redes existentes.

Se da por finalizada la reunión virtual y se notificará la programación de la proxima reunión a través de correo electrónico de notificaciones de los presentes.

Ricaurte

Paola Rodriguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes 01 Dia 31

DECISIONES TOMADAS

Realizar incorporación de las redes existentes de ETB en el plano de diseño del proyecto "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE- CUNDINAMARCA"

Dar continuo seguimiento y acercamiento para determinar las reparaciones de la afectación causada en la red existente.

COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA EN QUE SE DEBE CUMPLIR		
		Año	Mes	Día
Remitir plano de diseño del proyecto en versión dwg 2017 o anterior.	Interventoría y Contratista de Obra	2024	1	31
Implantar las redes existentes en el plano de diseño del proyecto.	ETB	2024	2	2
Programar nueva reunión para socializar la implantación y determinar las afectaciones	Supervisión / ETB	2024	2	2

PROXIMA REUNIÓN

FECHA :Año 2024 Mes 02 Dia 31

Por constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en RICAURTE CUNDINAMARCA, a los dia(s) del mes de de 2024

Coordinador Acta_____
Firma

Distribución del documento Original :
Primera copia :
Segunda copia :
Tercera copia :

Ricaurte

Paola Rodriguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

INFORMACIÓN BÁSICA

FECHA	: Año 2024 Mes 02 Día 05		
LUGAR	: VIRTUAL - TEAMS	CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO DIAGONAL RC	
HORA INICIO	: 11:00 AM	CONTRATO DE OBRA Nº : 403-2023	
HORA DE FINALIZACIÓN	: 12:15 PM	OBJETO DE OBRA: "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 18 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	: 413 -2023		
INTERVENTORÍA	: PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ	OBJETO DE INTERVENTORÍA: "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 18 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA"	
COORDINADOR ACTA	: JEILY KATHERINE MOTTA TAFUR		
		SUMINISTRO [ ]	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN [ ]
		CONSULTORÍA [ ]	ADMINISTRATIVA [ ]
OBJETIVO	: COMITÉ DE OBRA	OBRA [x]	[ ]

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO EMPRESA	FIRMA
JUAN FERNANDO JIMENEZ TARAZONA	DELEGADO / ETB	
CARLOS ALBERTO BERMEO CALDERÓN	LÍDER DE DISEÑO / ETB	
HECTOR DANIEL MORALES DEVIA	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE RICAURTE	
MONICA ALEJANDRA MALAGÓN	PROFESIONAL DE APOYO SIOP	
JAVIER ORLANDO VILLAMIZAR	COORDINADOR DE PROYECTOS CONTRATISTA DE OBRA	
MAURICIO ESPINOSA ALEMÁN	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO DIAGONAL RC	
JUAN PABLO ÁVILA LOMBANA	ASESOR SIOP	
JEILY KATHERINE MOTTA TAFUR	INTERVENTORÍA PAOLA RODRIGUEZ ALCALÁ	

OBSERVACIONES AL ACTA ANTERIOR

NO APLICA

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN EL ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIÓ SI	CUMPLIÓ NO	
Entrega de plano de diseño alcance del proyecto diagonal septima en versión dwg 2017 o anterior.	Contratista de Obra e Interventoria	X		
Implantación de redes existentes de ETB en el plano de diseño del proyecto de pavimentación y embellecimiento de la diagonal septima.	ETB			De acuerdo a correo del 02 de febrero 2024 ETB indica que los planos entregados por Contratista e Interventoria no se encuentran georeferenciados por ello, enviaron cartografia ETB para que Obra Implanta las redes en el plano y se socialice en reunion virtual del 05 de febrero 2024.

Ricaurte

Paola Rodriguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes 02 Día 05

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIÓ	
		SI	NO
NO APLICA	NO APLICA		

TEMAS TRATADOS

Se realiza comité técnico virtual con presencia de la Supervisión municipal, profesionales de la ETB, Interventoría y Contratista de Obra.

El contratista de obra expone la afectación presentada en las redes existentes de ETB en el desarrollo de las actividades de excavación en el tramo de intervención, generando afectación a la ductería y red de servicio de la empresa de telecomunicaciones, haca claridad que, los daños que se presentaron fueron producto del desarrollo del sector para la instalación de red pluvial pendiente en el tramo correspondiente del club de la ETB hasta el pozo 8 (portería de concreto) y ante el alineamiento de las redes de telecomunicaciones con las actividades en ejecución se produjo la afectación.

Continuamente, desde el área de topografía del contratista de obra CONSORCIO DIAGONAL RC, prodecen a exponer el levantamiento de redes de la ETB, teniendo en cuenta que, el plano remitido por ETB no contaba con coordenadas reales y no se podía realizar la implantación al plano de diseño del alcance del presente contrato, por lo cual, se procedió a hacer el levantamiento respectivo de las redes existentes por parte del equipo de topografía.

Una vez finalizada la presentación del área de topografía de la obra, realiza intervención el personal delegado de la empresa ETB a través de pantalla compartida, exponen las redes existentes y el alinesamiento de las redes que tienen a cargo en el municipio de Ricaurte.

Por parte de los participantes del presente comité se concluye realizar visita en campo, con el fin de evidenciar los daños de la red afectada y acordar quien asumirá la reparación del tramo afectado.

Se da por finalizada la reunión virtual y se encuentra a la espera por parte de los Profesionales de la ETB confirmación del día y hora de la visita a campo para este misma semana.

Ricaurte

Paola Rodriguez. Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA	Año 2024	Mes 02	Dia 05	Página 3 de 4

TEMAS TRATADOS CONTINUACIÓN

NO APLICA

Ricaurte

Paola Rodríguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes 02 Dia 05

DECISIONES TOMADAS

Se determina realizar recorrido sobre la zona de la diagonal septima para determinar los daños causados en el tramo intervenido a la fecha.

Definir durante el desarrollo de la visita de campo quienes deberán asumir los gastos de reparación de los daños causados.

COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA EN QUE SE DEBE CUMPLIR		
		Año	Mes	Dia
Visita de campo en el área de intervención del proyecto PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DIAGONAL 7	Todos los presentes en el comité	2024	2	Por confirmar

PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA : Año 2024 Mes 02 Dia 05

Por constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en RICAURTE CUNDINAMARCA, a los día(s) del mes de de 2024

Coordinador Acta _____
Firma

Distribución del documento:

Original :
Primera copia :
Segunda copia :
Tercera copia :

Ricaurte

Paola Rodriguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

INFORMACIÓN BÁSICA

FECHA	Año 2024 Mes 02 Dia 05		
LUGAR	: RICAURTE CUNDINAMARCA	CONTRATISTADE OBRA: CONSORCIO DIAGONAL RC	
HORA INICIO	: 4:15 PM	CONTRATO DE OBRA N° : 493 2023	
HORA DE FINALIZACIÓN	: 5:35 pm	OBJETO DE OBRA: "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	:413 -2023		
INTERVENTORÍA	: PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ	OBJETO DE INTERVENTORÍA: "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA"	
COORDINADOR ACTA	: JEILY KATHERINE MOTTA TAFUR		
		SUMINISTRO ☐	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐
		CONSULTORÍA ☐	ADMINISTRATIVA ☐
OBJETIVO	: COMITÉ DE OBRA	OBRA ☒	☐

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO EMPRESA	FIRMA
MAURICIO ESPINOSA A.	RESIDENTE DIAGONAL RC	
Katherine Motta Tafur.	Interventoria Diagonal 7.	
Mónica A Malagón C.	Apoyo a la Supervisión	
JUAN PABLO AVILA L.	CONTRATISTA - SIOP.	

OBSERVACIONES AL ACTA ANTERIOR

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGUN EL ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIÓ SI	CUMPLIÓ NO

Ricaurte

Paola Rodríguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes Día

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIÓ	
		SI	NO

TEMAS TRATADOS

se da inicio al comite de obra en la oficina de infraestructura y obras publicas con la participacion de la supervision municipal, interventoria y contratista de obra

-El contratista manifiesta que la domiciliaria de las aguas sanitarias de concreto, inicialmente en su tramo tiene tuberia de 10" pero finalizando se reduce a 8", la cual no corresponde con el diseño actual y que se esta implementando tuberia de 10", por tal motivo el contratista de obra plantea 2 posibles soluciones para poder dar continuidad a la ejecucion de este tramo

* OPCIÓN 1: el contratista de obra sugiere la realizacion de una caja de interseccion que recoja y dirija las aguas residuales al POZO, al realizarse esta caja se tendra aumentar el diametro de salida de la tuberia de caida la cual se encuentra en 6" por una de 12" o 14".

+OPCIÓN 2: el contratista de obra sugiere la construccion de un nuevo POZO de recoleccion justo al frente de la domiciliaria de concreto, donde se cancelara la red existente para posteriormente conectar al nuevo POZO.

- en conjunto con la supervision municipal, la interventoria y el contratista de obra se analizan las

Ricaurte

Paola Rodríguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes Día

TEMAS TRATADOS CONTINUACIÓN

2 opciones plasmadas por el contratista.

En conjunto y por sugerencia de la supervision se define como mejor opción la #1.

Donde se procederia con la construccion de una caja interseccion y la ampliacion de la cuneta de caida.

Se finaliza el comite llegando a un concenso acordado.

Ricaurte

Paola Rodríguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACION

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes Día

DECISIONES TOMADAS

Se realizara la construccion de una caja interceptora la cual recibira las aguas residuales redirigiendola al pozo, de igual forma se ampliara el diametro de la camara de caida a un diametro de 12" o 14".

COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA EN QUE SE DEBE CUMPLIR		
		Año	Mes	Día

PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA : Año 2024 Mes Día

Por constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en RICAURTE CUNDINAMARCA, a los día(s) del mes de de 2024

Coordinador Acta _____ Firma

Distribución del documento

Original :

Primera copia :

Segunda copia :

Tercera copia :

Ricaurte

Paola Rodriguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

INFORMACIÓN BÁSICA

FECHA	: Año 2024 Mes 02 Día 07		
LUGAR	: RICAURTE CUNDINAMARCA	CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO DIAGONAL RC	
HORA INICIO	: 10:32 am	CONTRATO DE OBRA N° : 403-2023	
HORA DE FINALIZACIÓN	: 03: 20 pm	OBJETO DE OBRA: "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	: 413 -2023		
INTERVENTORÍA	: PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ	OBJETO DE INTERVENTORÍA: "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA"	
COORDINADOR ACTA	: JEILY KATHERINE MOTTA TAFUR		
		SUMINISTRO ☐	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐
		CONSULTORÍA ☐	ADMINISTRATIVA ☐
OBJETIVO	: COMITÉ DE OBRA	OBRA ☒	☐

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO EMPRESA	FIRMA
Juan F. Jiménez T	Delegado CTO 403-23	
Carlos Bermeo	Ing. I. Diseño	
Julio Cesar Varón	Diseño. Ejes	
MAURICIO ESPINOSA	RESIDENTE DE OBRA CD7	
JUAN PABLO AVILA L.	CONTRATISTA - ASESOR S.I.O.P.	
Mónica M Malagón C	Apoyo a la Supervisión.	

OBSERVACIONES AL ACTA ANTERIOR

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN EL ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIÓ SI	CUMPLIÓ NO

Ricaurte

Paola Rodriguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes Día

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIÓ SI	CUMPLIÓ NO

TEMAS TRATADOS

- se da inicio al recorrido en presencia de la supervisión municipal personal de la ETB, interventoría y contratista de obra
- El contratista de obra inicia exponiendo el proyecto al personal de la ETB, sobre el pompeyano que se esta en definición, el cual afectaría en tema de recibimiento de aguas lluvias en la entrada de la ETB.
- De realizarse el pompeyano se debería modificar la acera tapa de la ETB.
- la supervisión manifiesta que no se realizara el pompeyano.
- la supervisión solicita amablemente a la ETB la sugerencia de la reposición de la infraestructura de la ETB.
- la ETB manifiesta que la ETB no generara reposición de la infra estructura la cual se encuentra en optimas condiciones.
  Por lo que no considera necesaria la reposición.
- De igual forma manifiesta que cualquier afectación generada esta sera asumida por el proyecto.
- los representantes manifiestan que para realizar cualquier modificación al diseño se debe contar con la autorización de la ETB y dejar constancia de su aprobación.

Ricaurte

Paola Rodríguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes Día

TEMAS TRATADOS CONTINUACIÓN

- Camara telefonica 1 cota 302.65 reconstruida con movimiento del acceso para garantizar el ~~acceso de personal y tapar la separación~~ también puede quedar incluido dentro de MR y debe garantizar el acceso de la acometida. se d
- De la camara 1 a la camara 2 se debe reponer la canalización.
- camara telefonica 2 se reconstruira con movimiento del acceso garantizando la acometida a ~~partir la cual queda~~ dentro de la via y MR, se debe llevar a -0.60 m del nivel de la via.
- caja telefonica 3 nivelar a -0.13cm se reconstruira con movimiento del acceso para garantizar el ingreso del personal tecnico de la ETB, se movilizara y quedara dentro de la via y el MR
- caja telefonica 4 nivelar a +0.01m se reconstruira con movimiento de acceso para garantizar el ingreso del personal tecnico de la ETB. se movilizara y quedara dentro de la via y el MR. reponer canalizacion de caja 4 a la 5

Nota: la canalizacion debe quedar minimo a -0.80m de la cota rasante de la carretera se debera instalar cinta de proteccion

- caja telefonica 5 nivelar a -0.11m
- se realiza el recorrido desde K0+00 centro Vacacional ETB hasta carrera 14A K0+257.5. en compañia del personal Tecnico ETB
- se le solicita a la ETB se remitan las especificaciones Tecnicas de Telecomunicaciones ETB las cuales debelan ser remitidas via Email.

Nota: la canalizacion se debe garantizar en buen estado desde el inicio del proyecto hasta la culminacion del tramo 1 "K0+00 A K0+257.50. ~~Este tramo se cierra con la aprobacion de los~~ Planos de diseño ~~hasta~~ desde la K0+00 A K0+257.50 y se ~~programara~~ un nuevo recorrido para el tramo que se encuentra sin intervencion.

Ricaurte

Paola Rodriguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes Día

TEMAS TRATADOS CONTINUACIÓN

camara 4 A 4A

se tiene 7 ductos en el cruce de la camara 4 a la 4A de 4" "4 ocupados 3 Libres" se debe garantizar su continuidad la ETB sugiere

-LA ETB solicita dar Prioridad ala Proteccion y continuidad a las redes sobre las zonas a intervenir teniendo en cuenta que cualquier afectacion Debera ser asumida por el Proyecto.

-se Programara Nueva visita por parte del personal tecnico de la ETB para la revision de la red que a la fecha no se a intervenido la cual sera desde el K0+257.50 en adelante. para saber las condiciones en que se encuentra la red y la infra estructura para ello es necesario la realizacion de plano con la identificacion de la red e infra estructura

-la ETB entrega las especificaciones y solicita garantizar la estabilidad y funcionalidad de la estructura y la red

Ricaurte

Paola Rodriguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACION

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes Dia

DECISIONES TOMADAS

COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA EN QUE SE DEBE CUMPLIR		
		Año	Mes	Dia
-Plano con identificacion de red ETB y elementos	contratista obra	24	02	09
-Plano con el estado de ejecucion y el diseño del primer llamo	ETB	24	02	13
-se realizara comite virtual para socializacion de planos.		24	02	14

PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA : Año 2024 Mes Dia

Por constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en RICAURTE CUNDINAMARCA, a los día(s) del mes de de 2024

Coordinador Acta

Firma

Distribución del documento

Original :

Primera copia :

Segunda copia :

Tercera copia :

Ricaurte

Paola Rodriguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

INFORMACIÓN BÁSICA

FECHA	: Año 2024 Mes 02 Dia 07		
LUGAR	: RICAURTE CUNDINAMARCA	**CONTRATISTADE OBRA:** CONSORCIO DIAGONAL RC	
HORA INICIO	: 3:49 Pm	**CONTRATO DE OBRA N° :** 403 2023	
HORA DE FINALIZACIÓN	: 4:49 Pm	**OBJETO DE OBRA:** "PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	: 413 -2023		
INTERVENTORÍA	: PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ	**OBJETO DE INTERVENTORÍA:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA"	
COORDINADOR ACTA	: JEILY KATHERINE MOTTA TAFUR		
		SUMINISTRO [ ]	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN [ ]
		CONSULTORÍA [ ]	ADMINISTRATIVA [ ]
OBJETIVO	: COMITÉ DE OBRA	OBRA [x]	[ ]

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO EMPRESA	FIRMA
Jocelyn Santaguo O.	Lider de Redes de Acued. y Alcant.	
JUAN PABLO AVILA L.	CONTRATISTA - ASESOR S.I.O.B.	
MAURICIO ESPINOSA A	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO D7	
Nohora A Malagon C	Apoyo a la Gerencia Municipio	
Eliana Andrea Cortes R.	Dir. Servicios Publicos	

OBSERVACIONES AL ACTA ANTERIOR

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN EL ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIÓ SI	CUMPLIÓ NO

Ricaurte

Paola Rodríguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes Día

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIÓ SI	CUMPLIÓ NO

TEMAS TRATADOS

- se inicia comité con la participación de la supervisión municipal. las representantes de la empresa AQUAGYE, interventoría y contratista de obra.
- AQUAGYE manifiesta que en reparaciones realizadas 3 meses atras se encontro la red en ASBESTO la cual se realizaron reparaciones en PVC.
- la empresa en su momento decidio hacer la renovación total de la red de ASBESTO por tubería en PVC dejando la red existente sin operación, actualmente ~~la~~ se encuentra esta sin operación.
- AQUAGYE manifiesta que para el dia 8-FEBRERO 2024 realizara verificación de la red que no esta en operación para garantizar la ~~la~~ intervención del contratista sin generar daños al servicio.
- la red de acueducto se evidencia que no cumple con la profundidad minima requerida, por tal motivo esto genera afectaciones a la red al momento de realizarse la compactación de la estructura vial
- se eleva nuevo requerimiento a la empresa AQUAGYE para la verificación de la profundidad de la red de acueducto que se encuentra en funcionamiento la cual fue renovada recientemente.

Ricaurte

Paola Rodriguez Alcalá

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes Día

TEMAS TRATADOS CONTINUACIÓN

- una vez se hace la verificacion se evidencia que no cumple con la profundidad minima requerida tal cual se elevara procedimiento para tomar pronta solucion.

Ricaurte

ACTA DE COMITÉ No.

CONTINUACIÓN

ALCALDIA RICAURTE CUNDINAMARCA

FECHA :Año 2024 Mes Día

DECISIONES TOMADAS

COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA EN QUE SE DEBE CUMPLIR		
		Año	Mes	Día
Visita Aquagil alcteo	AQUAGIL	2024	07	08

PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA : Año 2024 Mes Día

Por constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en RICAURTE CUNDINAMARCA, a los día(s) del mes de de 2024

Coordinador Acta

Firma

Distribución del documento

Original :

Primera copia :

Segunda copia :

Tercera copia :

1883

Ricaurte	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA ACTA DE REUNION	FR-GDC-004 Fecha Aprob: 11/01/2024 Versión.03 | Pág. 1 de 8

Fecha:	12 de Febrero 2024	**Hora Inicio:**	2:00pm	**Hora Fin:**	4:30pm
Objeto de la Reunión:	Socialización ajustes a los diseños del proyecto				
Lugar:	Plazoleta Casa de la Cultura ubicada en el predio denominado Pacandé. Calle 3 # 15-37 B/Pesebre.				
N° Contrato y Objeto:	N° 403-2023, Pavimentación y embellecimiento de la diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte Cundinamarca.				
Contratista de Obra:	Consorcio Diagonal RC. Nit 901746184-7 R.L. Luis Eduardo Alvarado Pulecio C.C. N° 1.105.678.088 de Espinal				
Contratista de Interventoría:	Paola Rodríguez Alcalá. C.c. N° 28.548.736 de Ibagué				

PARTICIPANTES:	
Nombre	**Cargo**
Hector Daniel Morales Devia	Secretario de Infraestructura y Obras Públicas - Supervisor
Juan Pablo Ávila Lombana	Contratista Asesor Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
Monica A. Malagón Cárdenas	Ingeniera Apoyo a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
Carlos Mario Ricardo Cortés	Secretario de Gobierno y participación comunitaria
Sorany Marnell Ortega Delgadillo	Secretaria de Planeación
María Camila Garrido	Asesora de Despacho
Mauricio Alejandro Espinosa Aleman	Residente de Obra
Sebastián Ramírez	Ingeniero apoyo a Obra
Jelly Katherine Motta Tafur	Ingeniera Residente de Interventoría
Comunidad de la Diagonal séptima	

ORDEN DEL DIA:	
1. Introducción de la citada reunión	3. Preguntas y respuestas comunidad
2. Exposición Contratista de Obra	4. Conclusiones

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El día 06 de febrero 2024 por parte de la Supervisión del Municipio se realiza notificación al Contratista de Obra y a la Interventoría sobre la invitación a la presente reunión de socialización de ajustes a los diseños del proyecto para que realicen la divulgación a toda la comunidad a través de las profesionales sociales. Adicionalmente, la Supervisión envió el comunicado 190.19 N° 115-2024 el 06 de febrero 2024 al Veedor del proyecto José William Daza Gómez vía correo electrónico y entregado en físico para que informara a la comunidad aferente a la obra.

También por parte del componente social de la Interventoría y del contratista de obra realizaron la notificación puerta a puerta a la comunidad de los predios ubicados sobre la Diagonal 7 desde la Calle 10 hasta la Carrera 16, como se evidencia en el comunicado ID7R-065 del 09 de febrero 2024; así mismo, se crea un link mediante la aplicación MEET para la transmisión en vivo de la socialización a la comunidad que no puede asistir presencial (se adjuntará el anexo del registro).

La reunión de socialización ajustes a los diseños se desarrolla así:

1. **Introducción de la citada reunión:** se inicia con la intervención del Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, el cual explica que la presente reunión obedece a solicitudes que la comunidad realizó directamente al señor Alcalde sobre el diseño transversal de la vía, manifestando no estar de acuerdo con los dos (2) carriles de entrada y uno (1) de salida con ciclo vía; cuestionando porque es un solo carril de salida; la ciclovía representa un riesgo de accidentalidad para el transeúnte; por ser una de las avenidas principales de ingreso al municipio se requiere buena transitabilidad y entre otras anotaciones.

Se proyecta la imagen del corte transversal de la vía para explicar que la propuesta en el ajuste del diseño consiste en omitir la ciclovía y en reemplazo se plantean dos carriles de ingreso al municipio y dos carriles de salida del municipio con un separador en la mitad y conservando el mismo ancho de andenes a cada costado. Así mismo, se contempla en el separador zona verde para la plantación de ciertas especies y en zona de andenes habrá algunas zonas verdes específicas. También habla sobre el diseño de las pérgolas para los predios que cuenten con local comercial.

Además, el Secretario de Infraestructura y Obras Públicas explica a la comunidad sobre los imprevistos que se han venido presentando en la acometida de la red de telecomunicaciones ETB que se encuentra por el costado izquierdo y en la red de agua

de la empresa ACUAGYR S.A.E.S.P. que se encuentra ubicada en el costado derecho, las cuales han generado atraso en el avance de actividades de obra.

Seguido le cede la palabra al contratista de obra para que explique más al detalle.

2. Exposición Contratista de Obra: El Ingeniero Residente de obra aclara que los imprevistos en la red de telecomunicaciones y en la red de acueducto le ha impedido poder avanzar en las actividades de llenado de la estructura de la vía con la subbase granular por lo que primero se tiene que reparar lo que se encuentra por debajo para que a futuro no se presenten daño en las tuberías y así no se afecte el pavimento nuevo que van a construir.

3. Preguntas y Respuestas comunidad:

La comunidad participa realizando varias preguntas:

- ¿Por qué se evidencia poco personal trabajando en la obra, a sabiendas que el contratista de obra se comprometió a ejecutar el primer tramo en un tiempo de dos meses y medio?

Rpta: *El Contratista de obra aclara que por los inconvenientes que se han presentado en la red de telecomunicaciones ETB y en la red de acueducto de ACUAGYR, no han podido avanzar en las demás actividades de la vía y tampoco vale la pena tener todo el personal y maquinaria sin poder ejecutar actividades, lo que generaría pérdidas. El Secretario de Infraestructura aclara que se han venido adelantando reuniones con los profesionales de la ETB asignados para el proyecto y que el miércoles 14 de febrero 2024 se tiene programada una reunión con ellos para cuadrar las actividades a realizar para los arreglos de la ductería; al igual que con la empresa de ACUAGYR ya se ha adelantado la visita de inspección y se encuentran ejecutando la profundización de la tubería en acompañamiento del contratista de obra.*

- ¿El ancho de los andenes se van a modificar?

Rpta: *El Secretario de Infraestructura y Obras Públicas comenta que el ancho de los andenes se conserva y aclara que habrá en algunos puntos en los cuales se situarán zona verde y para el caso donde se encuentren negocios, se procederá a no contener el anden la zona verde.*

- Algunas personas manifiestan no estar de acuerdo con el diseño de la pérgola si es el mismo que instalaron en la Cra. 16, sin embargo, otras personas si manifiestan estar de acuerdo.

Rpta: *El Secretario de Infraestructura y Obras Públicas informa que al diseño de la pérgola se modificará es con una lámina de policarbonato que evite sea traslúcida y no permita el paso del agua.*

- La comunidad solicita se aclaren los tramos de intervención.

Rpta: *La Ingeniera Residente de Interventoría explica que el tramo 1 va desde el k0+000 Centro Vacacional ETB hasta la Cra. 14a, es decir, el tramo que en la actualidad se en encuentra cajeado. El tramo 2 va desde la Cra. 14a hasta la Cra. 14b. El tramo 3 va desde la Cra. 14b a la Cra. 15 y el Tramo 4 va desde la Cra. 15 a la Cra. 16.*

- La comunidad manifiesta que el contratista de obra ya no está ejecutando el riego de agua diario para evitar el polvo.

Rpta: *El Contratista de obra aclara que si se está realizando día de por medio.*

4. Conclusiones:

- La comunidad manifiesta estar de acuerdo con la propuesta de ajuste al diseño transversal de la vía, quedando en común acuerdo aprobada la propuesta de dos carriles de ingreso al municipio y dos carriles de salida con un separador en la mitad y conservando el mismo ancho de andenes a cada costado.

COMPROMISOS			
Item	Descripción	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	N.A.		
2			
3			

De conformidad con lo anterior desarrollado y acordado, se firma el listado de asistencia por los que participaron:

ANEXOS:

1. Listado de asistencia.
2. Registro fotográfico.

Ricaurte	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA ACTA DE REUNION	FR-GDC-004 Fecha Aprob: 11/01/2024 Versión.03 | Pág. 5 de 8

LISTADO DE ASISTENCIA

Fecha - 12 de Febrero 2024

NOMBRE	C.C.	TELEFONO	DIRECCIÓN
Dennys Barrero	39567552	3124403693	Interventoría.
Yuli Natalia Rodriguez S.	1010620889	3214734594	Consorcio Dogard PC
Jeily Katherine Motta Tafur	1069418217	3209331495	Interventoría
JUAN PABLO AVILA L.	3.249.888	3102846853	CONTRATISTA - S.I.O.P
Sorany Ortega Delgadillo	1070.607.403	317 4304793	Sec. Planeación.
Ana Camila Gamba	1070595847	3143625104	Asesora Despacho
CARLOS MARIO RUEDAS CORTES	1069924513	3134129035	SECRETARIA DE GOBIERNO
Hector Daniel Morales Devia	1070609911	3143710691	Sec. Infraestructura y Obras P.
Nelson F. Malagón Cabrera	1070607212	3134532661	Apoyo - Secretaria Tec.
MAURICIO ESPINOSA ALCALDE	91271566	3114307426	CONSORCIO OINCOR PC
Sebastian Ramirez	1069179114	3227152[illegible]	SUPERVISA

LISTADO DE ASISTENCIA

Fecha = 12 Febrero 2024

NOMBRE	C.C.	TELEFONO	DIRECCIÓN
Jesús Riscanevo	79417816	3108919509	Diagonal 7 # 14-66.
INGRID CARDONA O.	1010165720	3223771568	Diagonal 7 #15-66
Viviana Marentes L.	21018855	3205678477	Diagonal 7 # 15-66
JAIME H. MANCIPE P.	7934/944	3107653217	Diagonal 7 N: 15-28.
Jeison Giovanny Murillo	1013630644	3017545968	Diag 4 No 14 B-62
Julio C. Galles M.	1'550.914	311-6017670	C/6AN°14-33.
Leonor Tavera	1.0975267	3134892	diag. 7 # 13323
[illegible]	1003485178	3154	Diagonal 7 #14
[illegible]	79267887	3194102193	Dg. 7 #13-336
Sandra Florez	39582923	3202857621	Dg 7A # 14-97
Jose William Daza	11223035	3115808392	Dg 7 # 14-96.
Manuel Antonio Toro P.	79521693	3124183097	Dg 7 N° 14a 34
MAYIBE AMO Gamba	39578678	3202900353	Carrera 10 11 21.
Luis M Díaz C.	1925740 1	3138187414	DIAG. 7 # 14-06
Elizabeth Bustos	20.705.514	321419	diagonal 4 # 14
José Iziquiel Romero	93360673	3134021299	calle 10 N° 12-301
Jairo Caldera	19087816	3112327029	dg 7 # 14 21

Ricaurte	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA ACTA DE REUNION	FR-GDC-004 Fecha Aprob: 11/01/2024 Versión.03 Pág. 7 de 8

LISTADO DE ASISTENCIA


Fecha = 12 Febrero 2024

NOMBRE	C.C.	TELEFONO	DIRECCIÓN
Abraham Fajardo	9600404	3143082184	Dg 7 # 14A 38
Sandra Muñoz	39573.106	3183621999	Diag 7 # 13-297
Mireya Motta	39579205	3228590212	Diag 7 # 14A - 61
Sandra Milena Espina S.	52201475	3227735233	Diag. 7 #14A - 48
Victor Moyano	1069177099	3152035144	Cra 14B # 6-79
Ana Esperanza Trujillo	52501820	3134021367	Dg 7 N° 14 - 52
Edilma Hidalgo	39569452	3145998985	Diag. 7 N° 14 96
Gloria Ruth Rojas	11320626	3165352503	Cra 10 N° 12-66
Luz E Salamanca	41554764	3135771697	Dg 7 # 14A 65
Angela Patricia Barragan	80443220	3229465028	Dg 7 # 14-86
Deisy Yuri Cortes	39571177	3224681326	Diagonal 7 N° 15-24

REGISTRO FOTOGRÁFICO





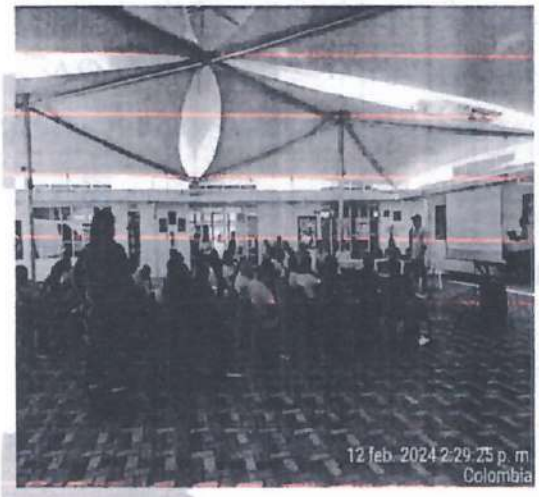



Ricaurte Paola Rodriguez Alcalde INTERVENTORIA DIAGONAL SEPTIMA

ACTA SOCIAL

RICAURTE-CUNDINAMARCA

OBSERVACIONES


Se realiza acta de reunión concerniente a socialización de modificación del diseño del proyecto de la diagonal 7ma.
Se da inicio a las 2.30 pm en la casa de la cultura, contando con la presencia de algunos comerciantes, propietarios y arrendatarios los cuales residen en la zona donde se está desarrollando el proyecto de **PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16,** también asisten profesionales del CONSORCIO DIAGONAL RC , equipo de interventoría , y algunos representantes de la alcaldía municipal.


Realiza intervención el señor **HECTOR MORALES** profesional de infraestructura y obras públicas, quien da un breve relato acerca de la intención de la reunión y da paso al residente de obra del consorcio diagonal RC, quien expone los temas plasmados en la presentación.

- Descripción de la necesidad
- Datos generales de los contratos
- Ubicación de la obra
- Actividades y alcance del proyecto
- Actividades ejecutadas y en ejecución
- Componente social, ambiental y SST
- Dudas e inquietudes

Cabe resalar que desde el componente social del consorcio diagonal RC se trasmite mediane reunión virtual meet a algunas personas de la comunidad que no lograron asistir de manera presencial. Lo anterior dada la solicitud del señor **MILLER CESAR HEERNANDEZ** quien no reside en el municipio de Ricaurte, sin embargo, tiene 3 locales en la zona donde se desarrolla el proyecto.

Durante la dinámica, se observa a la comunidad activa, realizando preguntas, el coordinador de obra realiza claridad frente a las mismas y se finaliza sin dificultad.

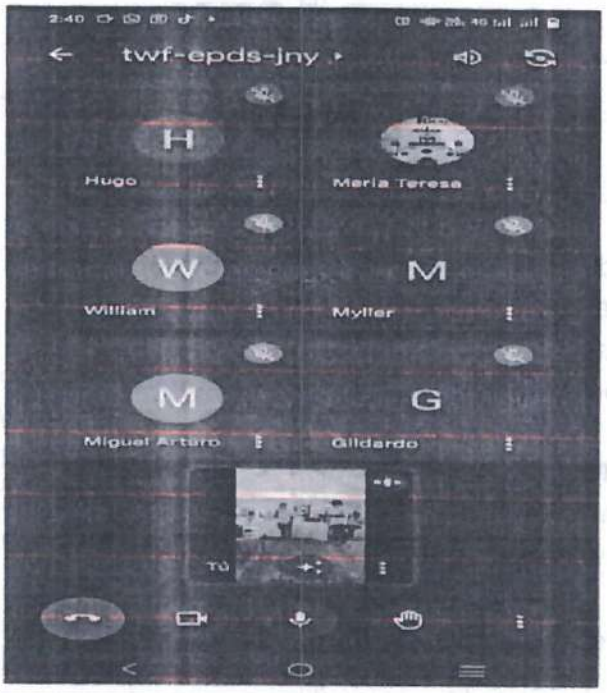
twf-epds-jny
H
Hugo
María Teresa
W
William
M
Myller
M
Miguel Arturo
G
Gildardo
Tú

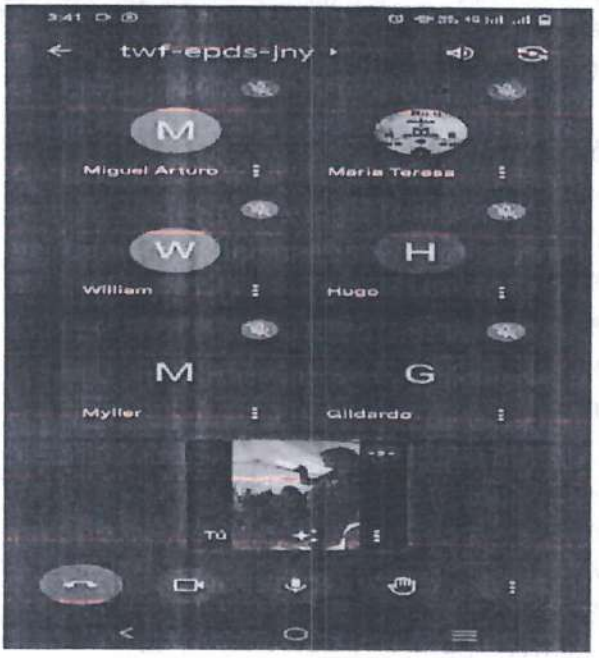
twf-epds-jny
M
Miguel Arturo
María Teresa
W
William
H
Hugo
M
Myller
G
Gildardo
Tú

Ricaurte Pardo Rodríguez Alcalá INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

Se anexa listado de nombre y dirección de los asistentes a la reunión.

NOMBRE	DIRECCION
MILLER CESAR	diagonal 7ma n 14 -76
HUGO PULIDO	Diagonal 7ma 14. 22
MARIA TERESA	Diagonal 7ma n 13-85
MIGUEL ARTURO	Condominio terralonga
GILDARDO	Diagonal 7ma n 13-85
WILLIAM DAZA	Diagonal 7 ma n 14 b - 86

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORIA
DIAGONAL SEPTIMA

7.15 INFORME TOPOGRÁFICO CUATRIMESTRAL

	CONORCIO DIAGONAL 7	
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	RESUMEN DE ACTIVIDADES

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMETACION Y EMBELLECIMENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA"



INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFÍA MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 2024

mhingenierostopografos@gmail.com
www.mhingenierostopografos.weebly.com
facebook instagram :mhingenierostopografos@gmail.com
Corporativo 3208686249- Ing. Fernando morales 3107575188- Ing. Aníbal Hernández 3012896354
https://mhingenieriaytopografia.blogspot.com/

	CONORCIO DIAGONAL 7	
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	RESUMEN DE ACTIVIDADES

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 5

2.1 OBJETIVO GENERAL 5

2.2 OBJETIVO GENERAL 5

2.3 OBJETIVO ESPECÍFICOS 5

3. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
4. ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO. 9

4.1 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL TRABAJO TOPOGRÁFICO 9

4.2 ORGANIZACIÓN 11

4.3 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 11

5. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 14

5.1 METODOLOGÍA 14

5.2 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 14

5.3 COORDENADAS DE AMARRE LEVANTAMIENTO 14

6. MATERIALES Y EQUIPOS 15
ANEXO 1 – CARTERAS TOPOGRÁFICAS 17
ANEXO 2 - CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y CERTIFICADO DE TOPOGRAFO 88
ANEXO 3 – REGISTRO FOTOGRAFICO 97

mhingenierostopografos@gmail.com
www.mhingenierostopografos.weebly.com
facebook instagram :mhingenierostopografos@gmail.com
Corporativo 3208686249- Ing. Fernando morales 3107575188- Ing. Aníbal Hernández 3012896354
https://mhingenieriaytopografia.blogspot.com/

	CONORCIO DIAGONAL 7	
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	RESUMEN DE ACTIVIDADES

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización General del proyecto (Fuente: Wikipedia)..... 7

Ilustración 2. Mapa Político Municipio Ricaurte Cundinamarca..... 8

Ilustración 3. Localización Exacta del Proyecto..... 9

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Codificación.....10

Tabla 2. Integrantes De Comisión Topográfica.....11

Tabla 3. Control Con Estación Total.....13

Tabla 4. Materiales Y Equipos.....16

Tabla 5. Tramos a Intervenidos.....104

mhingenierostopografos@gmail.com
www.mhingenierostopografos.weebly.com
facebook instagram :mhingenierostopografos@gmail.com
Corporativo 3208686249- Ing. Fernando morales 3107575188- Ing. Aníbal Hernández 3012896354
https://mhingenieriaytopografia.blogspot.com/

1. INTRODUCCIÓN

Los métodos actuales para realizar levantamientos topográficos se apoyan en parámetros convencionales internacionales que establecen las normas y metodologías, a esto se le debe añadir la tecnología instrumental altamente sofisticada que asisten al trabajo con la mayor precisión posible. En nuestro país se emplean levantamientos topográficos con gran precisión, dentro de un sistema geo referenciado. El presente informe y la documentación que se adjunta será testimonio suficiente del levantamiento topográfico.

El principal alcance es obtener los datos topográficos de la zona determinada con los detalles necesarios para realizar el diseño del proyecto, replanteo o sacar cantidades,para esto se deben tomar todos los detalles más relevantes tales como accidentes de la vías, cruce de vías, paramentos de construcciones, sumideros, alcantarillas, cuerpos de agua, etc., que permitan tener argumentos de juicio para el diseño e implementación del proyecto, y tomando como inicio dos puntos con coordenadas Magna-Sirgas los cuales son materializados en el tramo o cerca a el para así cuando se requiera hacer una actividad de topografía cualquiera que sea esta siempre se estará trabajando en las coordenadas del proyecto.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

2.2 OBJETIVO GENERAL

Realizar la localización de puntos topográficos respectivo para las vías ubicada en el municipio de Ricaurte Cundinamarca diagonal 7 entre calle 10 hasta carrera 16, para el desarrollo de los diseños del proyecto cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA ,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMETACION Y EMBELLECIMENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA"

2.3 OBJETIVO ESPECÍFICOS

- Realizar el levantamiento planimétricos y altimétrico de la vía tomando detalles como bordes de vía, centro de vía, cunetas, taludes, puntos de terreno, muros de contención, construcciones y alcantarillado.
- Elaborar informes donde se incluyan carteras de campo y de oficina de acuerdo a la normativa que establece criterios de formato.
- Realizar planos de cada uno de los tramos de vía.
- Referenciar el tramo con coordenadas en el sistema Magna Sirgas.

3. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Territorialmente el municipio Ricaurte se encuentra ubicado en la cordillera oriental, dista de Bogotá a 142 kilómetros, de territorios planos, semiondulados, con accidentes orográficos de poca elevación, destacándose la Serranía del Callejón y los cerros la Dormida y San Alberto, bañados por los ríos Magdalena y Sumapaz; dentro de su área sorprende la variedad de recursos turísticos, ante los cuales la comunidad, se ha mostrado un tanto indiferente debido a la falta de orientación y capacitación.

Límites del municipio:

Norte: con los municipios de Tocaima y Agua de Dios
Sur: con el río Magdalena y los municipios de Flandes, Suárez, Carmen de Apicalá y Melgar.
Oriente: con el municipio de Nilo y el río Sumapaz.
Occidente: con los municipios de Girardot y Flandes; y el río Bogotá.

Extensión total: 130 kilómetros cuadrados.

Altitud de la cabecera municipal: 284 metros sobre el nivel del mar.

Temperatura media: 29°C

Distancia de referencia: 142 kilómetros de Bogotá

	CONORCIO DIAGONAL 7	
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	RESUMEN DE ACTIVIDADES



Ilustración 1. Localización General del proyecto (Fuente: Wikipedia)

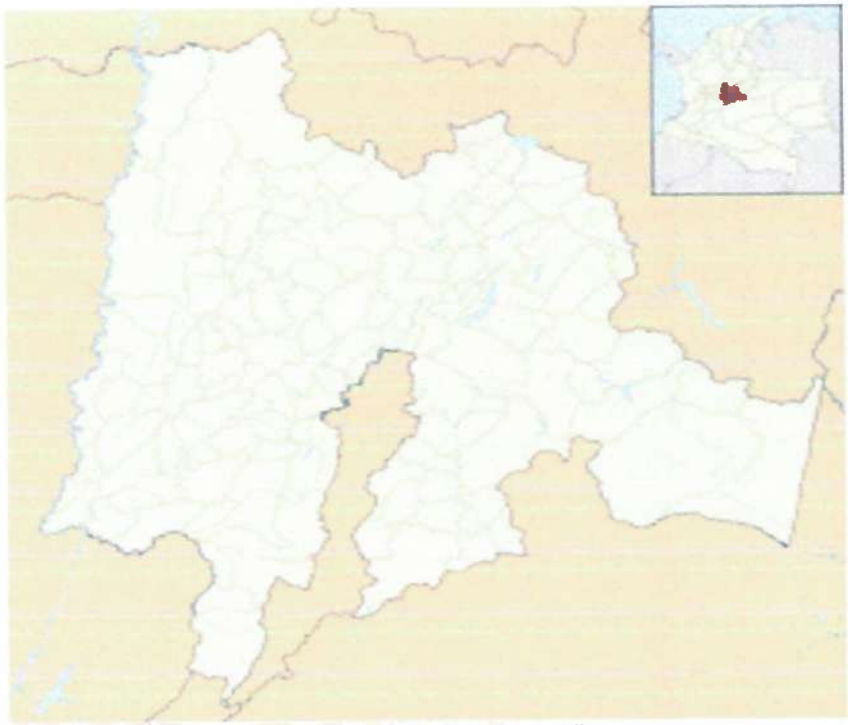


Ilustración 2. Mapa Político Municipio ricaurte cundinamarca.

4. ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO.

4.1 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL TRABAJO TOPOGRÁFICO

El objetivo de la topografía es medir las longitudes de los tramos de vía con los accidentes topográficos del sector, tomando todos los datos necesarios tales como como accidentes de las vías, paramentos de construcciones, sumideros, alcantarillas, cuerpos de agua, etc. para representar en un plano a escala todos los accidentes.

Inicialmente utilizando un equipo marca kolida kts 442 rl, que es usado en el tramo de via el cual , al momento de ingresarle las coordenadas del inicio calcula cada punto levantado obteniendo así x y z de cada elemnto y así poder trabajar de manera adecuada y con coordenadas reales en el software de dibujo.

- Las referencias fueron debidamente materializadas en el terreno estos deltas aparecen en el plano y se anexan en el presente informe.
- El sistema es una radiación simple apoyada por una poligonal abierta.
- El procedimiento a seguir en el trabajo topográfico está compuesto de dos etapas fundamentales.
- El trabajo de campo, la recopilación de datos o la localización de puntos.
- El trabajo de oficina que comprende el cálculo post proceso y el dibujo.

Durante el proceso se determina la planimetría del terreno y la altimetría para dar un resultado de planta con curvas de nivel

TN	Terreno natural		**CER**	Cerca
CON	Muros		**PZ**	Pozo
ARB	Arbol		**DRE**	Drenaje o Caño
INIC	Inicio Placa Huella		**CONC**	Placa Huella Vieja
CAS	Casa		**GAV**	Gavion
PZ	Pozo		**ALC**	Alcantarilla
POS	Poste		**BADEN**	Baden
FIN	Fin Placa Huella		**EJE**	Eje de Placa Huella

Tabla 1. Codificación

4.2 ORGANIZACIÓN.

El topógrafo tuvo bajo su responsabilidad las siguientes actividades:

- Programar, coordinar y controlar las diferentes etapas de las labores de campo y de oficina.

- Realizar las actividades necesarias para la toma de la información y la generación de cálculos, informe y planos necesarios para chequear proyecto.

4.3 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO.

Se realizó visita preliminar al Municipio para llevar a cabo una logística de desplazamiento y de esta forma ejecutar levantamiento topográfico de los tramos a intervenir en las vías del sector, el recorrido se realizó con el topógrafo de la construtora el cual indico los sectores y longitudes de los tramos a intervenir.

Tomando como referente las características más significativas y los detalles más determinantes donde puedan variar las condiciones planimétricas y altimétricas del terreno y así realizar la entrega de un producto manejable y con la información necesaria. El trabajo se realizó partiendo de dos puntos con coordenadas georreferenciadas al datum Magna-Sirgas según lo adoptado en Colombia. Se almacenaron en la estación total una cantidad considerable de puntos los cuales se adjuntan en el informe topográfico para su debido procesamiento.

4.4 ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES

El Levantamiento topográfico se desarrolla dentro del marco del trabajo de Topografía al detalle. Los trabajos de control terrestre se llevaron a cabo desarrollando las actividades siguientes:

- Recopilación de información
- Reconocimiento y foto identificación de puntos de control terrestre
- Ubicación de puntos de amarre geo-referenciados

4.5 TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS

En función a la importancia de los estudios a ejecutarse, cómo es el sistema de vías , a ejecutarse en el Municipio de Ricaurte y dar cumplimiento a lo requerido en los términos de referencia; se han empleado equipos electrónicos de alta precisión que suministran datos a programas de cómputo para la elaboración de planos sectorizados en sistema CAD.

Para el caso de la poligonal de control se realizó con un equipo de estación total, básicamente para poder obtener niveles de error mínimos. Para ello, se tomaron lecturas de distancia repetida y en modo fino del instrumento lo que significa que, en un intervalo de tiempo de 1 segundos por visada, utilizando de este tiempo el promedio de lecturas computarizadas, cada una de ellas, medidas con rayos infrarrojos de onda corta, el cual se afecta principalmente por la posición y el número de prismas utilizados. Además, se realizaron los ajustes por temperatura y la metodología resumida fue la siguiente:

Se implantaron vértices de la poligonal sin exceder de una distancia promedio de 200m en el caso de las vías en el predio de 10 mts. Asegurando su intervicibilidad.

Para los trabajos de levantamiento topográfico de las obras lineales se siguió el siguiente procedimiento:

- Apoyados en los vértices y a las poligonales de control, se levantaron en campo todos los detalles planimétricos compatible con la escala de presentación de los servicios, tales como: viviendas, sumideros, ejes de via, postes, esquinas, canales, boxcoulvert, cercas paramentos, bordes de vía etc.

- Se caracterizaron todos los puntos bajos y puntos altos, tomados a partir de la lectura de puntos intermedios entre las plantillas.

- Toda la información obtenida se ha procesado empleando programas con un software de cálculo en el caso de la estación total (indicando en el equipo de software utilizado). como el KOLIDA SOFWARE.

- Los puntos de coordenadas y con el empleo de los programas indicados en el punto número 2, se procedieron a modelar las superficies topográficas para finalmente obtener las curvas de nivel.

- Estos trazos que generan los planos, han sido procesados en dibujos sectorizados en Auto-CAD los archivos están en unidades métricas los puntos topográficos tomados o levantados en el terreno o in sitio son incluidos como bloques en la capa 0 y controlada en tres tipos de información básica (número de punto norte, este, elevación, y descripción) PNEZD.

5. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

5.1 METODOLOGÍA

La metodología empleada para la ejecución de chequeos mencionado parte de la toma de datos e información recopilada en campo, y su respectivo análisis en oficina la cual soporta el presente estudio topográfico de acuerdo a las normas preestablecidas.

5.2 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Se recopilaron los datos en el terreno relacionados con el proyecto, también los resultados de la inspección y el reconocimiento del sitio.

5.3 COORDENADAS DE AMARRE LEVANTAMIENTO

Los trabajos en campo se desarrollaron con una comisión de topografía, compuesta por un topógrafo y dos cadeneros.

Basados en los puntos ya materializados, se comenzó con el trabajo de campo, numerando cada uno de los puntos de base topográfica. Una vez definido el sitio del trabajo se continuó con el levantamiento topográfico de puntos de detalle codificados de acuerdo a una lista utilizada por el topógrafo mediante el sistema de radiación para ir llevándolos a un colector de información y luego ser plasmados en formato digital (DWG) mediante un software especializado.
El sistema de radiación múltiple utilizado consistió en el detalle de puntos de las áreas importantes como son zonas aferentes, esta información corresponde a puntos topográficos con un formato estándar (No Punto, Norte, Este, Cota, Descripción) de cada punto.

Estos planos se anexan al presente informe al igual que sus carteras de coordenadas.

6. MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales y equipos utilizados en el levantamiento topográfico se relacionan a continuación.


Tabla 4. Materiales Y Equipos

ESTACIÓN TOTAL
GPS GARMIN
PRISMAS
BATERÍAS
CÁMARA FOTOGRÁFICA
CINTA METÁLICA
FLEXÓMETRO
TRÍPODES
ESTACAS
PUNTILLAS
MASETA
VARILLAS
MACHETE


Con toda la actividad desarrollada, tal como se explica en el presente informe, se demuestra la responsabilidad y la meticulosidad con la que se ejecutó el trabajo, más aún cuando se utilizó instrumentos de alta precisión, gama alta en el mercado actual de equipos topográficos y la metodología adecuada, aspectos que nos permite afirmar con seguridad que el trabajo es altamente confiable, acorde a las exigencias tecnológicas modernas y de las especificaciones requerida

Ya habiendo dado a conocer como se realizaron las actividades preliminares antes de la intervención en el proyecto, se establecerá cronológicamente el proceso y las actividades realizadas.

grafica del levantamiento del tramo realizado para intervension de el tramo diagonal 7

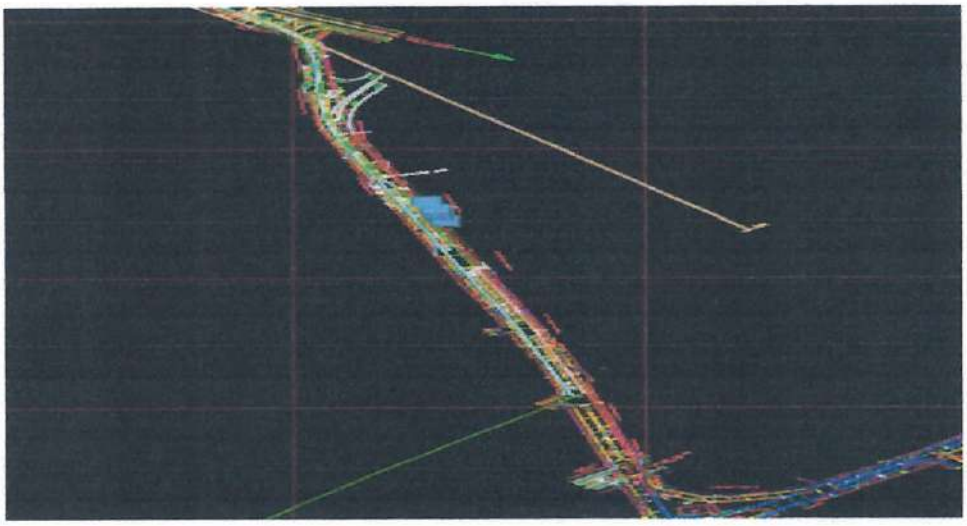

Levantamiento inicial diagonal 7 base para diseños de alcantarillado y diseño geométrico

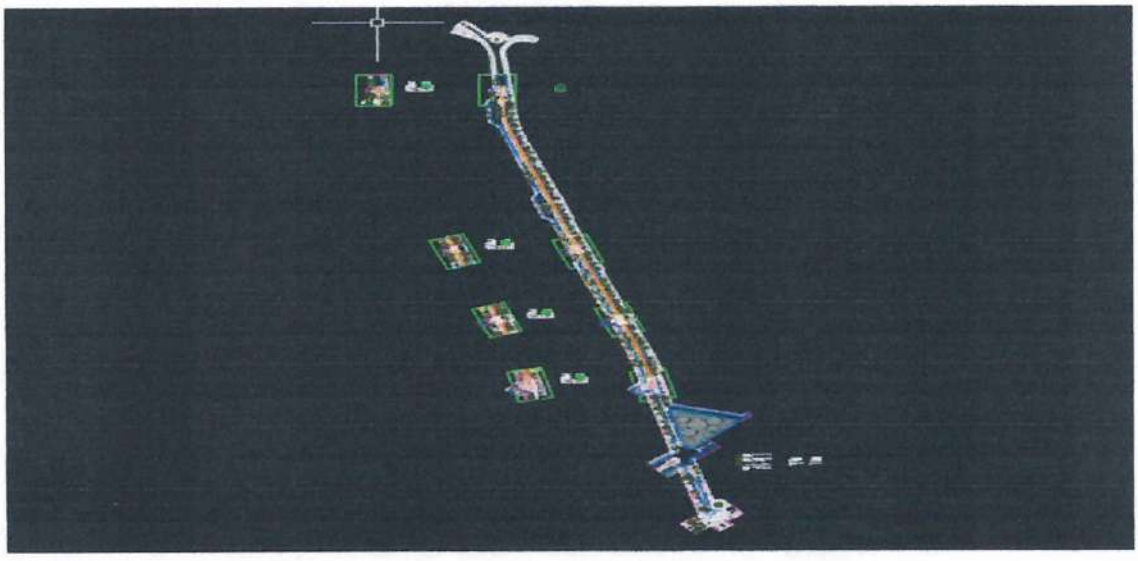

Diseño suministrado por alcadia para ejecución del diseño geométrico

	CONORCIO DIAGONAL 7	
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	RESUMEN DE ACTIVIDADES

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN TRE PERIODOS COMPRENDIDOS ASI:

01 DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE en dicho periodo se realizaron labores de instalación de redes de alcantarillado repartidas en 8 tramos comprendidos desde la cruce con la via principal que conecta a municipio de ricaurte con el municipio de girardot hasta donde termina el club de empleados de la ETB y revisadas según el diseño , también se calcularon los respectivos rellenos junto con sus respectivos registro fotograficos, se elaboraron las carteras de campo de cada tramo calculado.

Instalacion y cajeo de tramos





Entivado de los tramos segun norma de segurudad






RICAURTE CUND. PROGRESO - PAZ - CORDIALIDAD	CONORCIO DIAGONAL 7	
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	RESUMEN DE ACTIVIDADES





Compactacion de material calculado y equipos usados para nivelar cajeo

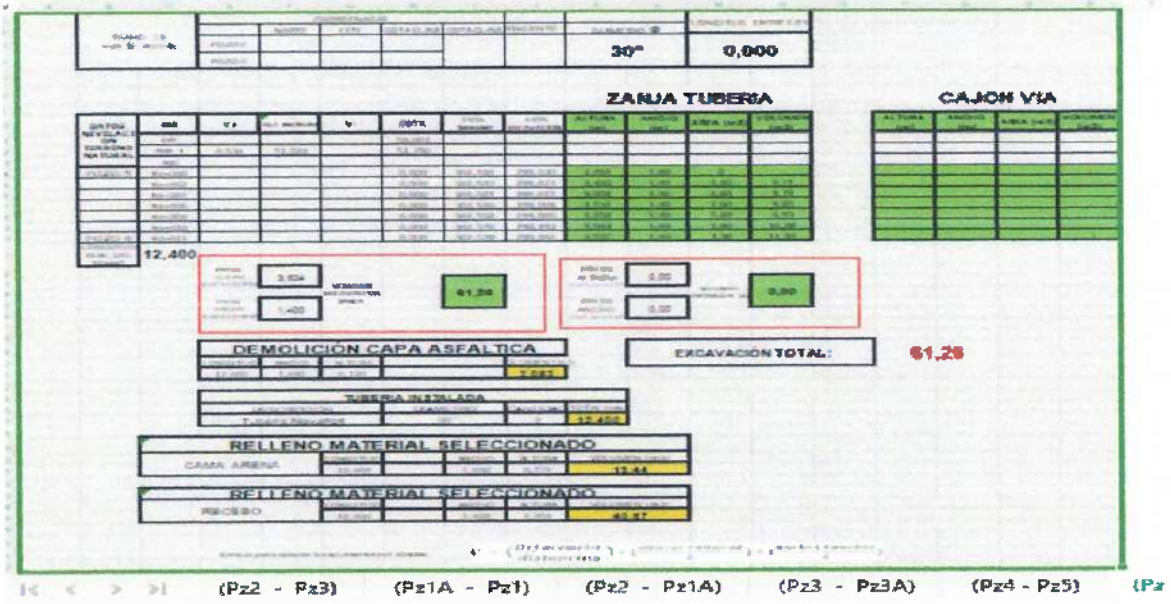

Carteras de calculos de los primeros 6 tramos intervenidos durante este periodo junto con sus registros fotograficos el clima colaboro durante estos periodos aunque hubo asuntos que se solucionaron como mejoramiento de las base del canjeo ya que el terreno estaba demasiado saturado de arcillas que impedían que el cajón se sostuviera a pesar de estar entibado

Cuadro acumulativo de actividades ejecutadas en este periodo

	CONORCIO DIAGONAL 7	
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	RESUMEN DE ACTIVIDADES

"PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"

	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA
	PRELIMINARES				
1,1	Localización y Replanteo Con Equipos de Precisión	M2	16.298,00		-
1,2	Cerca En Tela Verde H = 2.10 M	ML	1.949,00	297,50	297,50
1,3	Fresado de Concreto Asfáltico (E= 5-12 cm)	M2	13.946,00	33,04	33,04
1,4	Demolición Adoquín Sobre Arena, H=0.15 M	M2	609,50		-
1,5	Demolición Placa Piso E= 0.10 M	M2	4.033,00		-
1,6	Demolición De Sardinel En Concreto	ML	2.628,00		-
1,7	Demolición de Sumideros	UND	45,00		-
1,8	Retiro de Aro Tapas De Pozos Existentes.	UND	41,00		-
1,9	Nivelación De Pozos De Inspección Di=1.20m, E=0.25m, H=0,21m (Incluye Pañete Interno Y	UND	41,00	7,00	7,00

	CONORCIO DIAGONAL 7	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

	Demolición)				
1,10	Retiro de Cajillas Medidor Acueducto Existentes.	UND	45,00		-
1,11	Desmonte De Poste Alumbrado Publico	UND	10,00		-
1,12	Desmantelamiento De Redes En Postes De Alumbrado Publico	UND	10,00		-
1,13	Demolición de Carcamo	ML	41,00		-
1,14	Desmonte De Señales Verticales De Transito	UND	44,00	21,00	21,00
1,15	Demolición Reductor de Velocidad E=0.15 A=1.0	ML	17,60		- -
	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
2,1	Excavación Manual En Conglomerado H=0.0-2.0 M (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)	M3	141,5		
2,2	Excavacion Manual en Material Comun H=0,0-2,0M (Incluye Retiro de Sobrantes a una Distancia Menor de 5 km)	M3	1.273,50		-
2,3	Excavaciones Varias a Maquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor	M3	5.610,00		-

	De 5 KM)				
2,4	Transporte De Materiales Prov. De Explanación, Canales, Prestamos, Sobre acarreos Y Derrumbes	M3-KM	224.022,00		-
2,5	Derechos de disposicion final en escombrera certificada	M3	7.400,00	750,00	750,00
					-
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
3.1	Compactacion de la Subrasante	M2	9.346,00		-
3.2	Control Topografico de Niveles de Excavacion y de la Estructura de Pavimento	M2	16.298,00		-
3.3	Sub-Base Granular (Norma INVIAS 320) para nivelacion y fallos (E=0,15m)	M3	1.402,00		-
3.4	Base Granular (Norma INVIAS 330) (E=0,15m)	M3	1.402,00		-
3.5	Pavimento Rígido En Concreto MR 40 (40 KG/CM2) (E=0,20m)	M3	1.825,00		-
3.6	Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 PSI	KG	19.699,00		-
3.7	Sellado De Juntas En Pavimento De Concreto Rígido (Incluye Limpieza, Suministro E Instalación De Fondo Y Sellante)	ML	2.383,00		-

	CONORCIO DIAGONAL 7	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

3.8	Estampado, Endurecido Y Sellado De Superficie en Concreto	M2	628,00		-
3.9	Suministro E Instalación De Geotextil T 2400 (Estabilización, Filtro Y Separación)	M2	7.346,00		-
3.10	Corte de Pavimento En Concreto Con Disco Diamantado	ML	6.502,00		-
3.11	Suministro e instalacion COLOR CONCRETO VERDE PINO C-144 PARA CICLOVIA, dosificacion 6kg/m2 de incorporacion manual acabado concreto rustico, incluye sellador de concreto ECO.	M2	1.202,00		-
					-
	ANDENES Y SARDINELES	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
4.1	Relleno Tipo 7 "Arena De Peña"	M3	248,00		-
4,2	Suministro e instalacion loseta de cemento 40 x 40 textura color tipo alfa	M2	1.678,00		-
4,3	Suministro e instalacion loseta de cemento 40 x 40 sin textura color tipo alfa	M2	1.555,00		-
4,4	Suministro e instalacion loseta de cemento 40 x 40 toperol color tipo alfa	ML	1.332,00		-
4,5	Adoquín De Arcilla 20x10x8cm	M2	1.812,00		-

	CONORCIO DIAGONAL 7	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

4,6	Suministro e instalacion de gramoquin peatonal	M2	70,00		-
4,7	Andén Concreto 3000 Psi En Sitio E=0.1m	M2	177,00		-
4,8	Bordillo Prefabricado A-80	ML	3.289,00		-
4,9	Sardinel Prefabricado A-10	ML	2.350,00		-
					-
	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
5.1	Localizacion y replanteo de redes	ML	396,00	407,15	407,15
5,2	Excavaciones Varias a Maquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)	M3	1.600,00	950,33	950,33
5,3	Entibado Tipo 2 (1/7 Utilizaciones)	M2	1.730,00	1.061,36	1.061,36
5,4	Transporte De Materiales Prov. De Explanación, Canales, Prestamos, Sobre acarreos Y Derrumbes	M3-KM	26.088,00	18.450,00	18.450,00
5,5	Relleno en Tipo 2 "Recebo"	M3	1.300,00	446,51	446,51
5,6	Relleno Tipo 5 "triturado grueso"	M3	370,00		-

	CONORCIO DIAGONAL 7	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

5,7	Relleno Tipo 7 "Arena De Peña"	M3	170,00	212,87	212,87
5,8	Tuberia PVC Alcantarillado 10"	ML	73,00		-
5,9	Tuberia PVC Alcantarillado 12"	ML	43,00	43,00	43,00
5,10	Tuberia PVC Alcantarillado 16"	ML	24,00	23,20	23,20
5,11	Tuberia PVC Alcantarillado Reforzado 24"	ML	123,00	117,80	117,80
5,12	Tuberia PVC Alcantarillado Reforzado 36"	ML	144,00		-
5,13	Tuberia PVC Alcantarillado 42"	ML	62,00		-
5,14	Suministro e instalación silla Yee PVC de 6X12"	UND	32,00		-
5,15	Suministro e instalación de Codo 45° PVC 6"	UND	32,00		-
5,16	Placa de Fondo Pozo d=1.7m, e=0.25m (concreto 3000psi con refuerzo)	UND	5,00		-
5,17	Cilindro pozo en ladrillo tolete, di=1.20m e=0.25m (inc. Pañete interno e=1.5cm y cañuela)	ML	12,96		-
5,18	Cubierta Pozo D= 1.7m, E=0.20m Concreto 3000 Psi Con Refuerzo (No Incluye Aro Y Tapa Hf)	UND	7,00		-

	CONORCIO DIAGONAL 7	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

5,19	Aro en acero y Tapa en Polipropileno de alto impacto, para pozos de inspeccion.	UND	7,00		-
5,20	Marco Tapa Caja De Inspección	UND	32,00		-
5,21	Caja De Inspección De 80x80	UND	6,00		-
5,22	Caja Contador De Agua	UND	32,00		-
5,23	Sumidero Fundido en Sitio Reforzado de una sola camara, incluye marco y rejilla en metalica	UND	32,00		-
5,24	Construccion de Sumidero tipo carcamo medidas 0.4 m x 0.7m (interno) y paredes de 0.15m en concreto 3000 PSI incluye rejilla metalica	ML	40,00		-
5,25	Concreto f'c=3500 PSI (bases) para Camara de Inspeccion	M3	2,21		-
5,26	Concreto f'c=3500 PSI (Elevaciones) para Camara de Inspeccion	M3	10,84		-
5,27	Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 PSI	KG	400,00		-
					-
	MOBILIARIO URBANO	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
6.1	Suministro E Instalación De Banca Urbana Ver Detalle Incluye Dado De Soporte	UND	14,00		-

	CONORCIO DIAGONAL 7	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

6.2	Banca En Concreto M-40	UND	20,00		-
6.3	Bolardo M-63 Alto/Hierro	UND	83,00		-
6.4	Suministro E Instalación Caneca Urbana Ver Detalle Incluye Dado De Soporte	UND	20,00		-
6,5	Suministro E Instalación De Paradero De Bus Ver Detalle	UND	1,00		-
6,6	Suministro E Instalación De Caseta De Ventas Ver Detalle	UND	1,00		-
6,7	Suministro E Instalación De Mogador Informativo	UND	1,00		-
6,8	Ciclo Parqueadero M100 Tipo 1	UND	5,00		-
					-
	PASAJISMO	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
7.1	Contenedor de raíces en tubería corrugada PVC 36" x 1 metro de desarrollo	UND	20,00		-
7,2	Contenedor de raíces en tubería corrugada PVC 24" x 1 metro de desarrollo	UND	12,00		-
7,3	Suministro E Instalación De Arboles H=1.50 m	UND	110,00		-
7,4	Poda De Mantenimiento, Poda Radicular y Conflicto Con Redes. (De	UND	29,00		-

	2 a 14 mts de altura)				
7,5	Apeo de Árboles (Tala, Remoción y Transporte de Material Descartado, De 3 a 12 mts de altura)	UND	79,00		-
7,6	Relleno En Tierra Negra	M3	45,00		-
7,7	Grama zonas verdes	M2	1.130,00		-
					-
	ALUMBRADO PUBLICO	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
8,1	Suministro e instalacion de poste metalico de 8.5 metros de altura, troncoconico, Diametro cima: 127mm y Diametro Base: 170mm certificado con retilap, incluye Cimentacion en concreto reforzado, sistema de puesta a tierra y doble proposito (para dos luminarias).	UND	72,00		-
8,2	Suministro e instalacion de sistema solar para dos luminarias de 30 y 60W. Incluye paneles solares con soporte, una luminaria de 60W y una luminaria de 30W, cofre, controlador de carga, baterias, protecciones de DC, conectores MC4 y cableado de conexión.	UND	72,00		-
					-
	SEÑALIZACIÓN	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**

	CONORCIO DIAGONAL 7				
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16				RESUMEN DE ACTIVIDADES
9,1	Líneas De Demarcación Con Pintura En Frío	ML	2.781,00		-
9,2	Marca Vial Con Pintura En Frío	M2	97,00		-
9,3	Señal De Tránsito Grupo I 0.75x0.75m, Poste 3.5m	UND	40,00		-
9,4	Suministro e Instalación Separador de Carril Tipo B 0,78x0,20x0,15 Material: Polietileno de Alta densidad con estabilizador UV Resistencia: 50 toneladas. Reflectivos: 4 ojos por cara (Incluye: 4 Tornillos en Acero Inoxidable de1/2" de Ancho y 5 Tornillos en Acero Inoxidable de 1/2# de Largo)	UND	528,00		-
9,5	Suministro e Instalación de Tachas Reflectivas Unidireccionales	UND	1.723,00		-
					-
	PGIO				-

17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE :

En dicho periodo se continuo con instalación de redes de alcantarillado tramos faltantes es decir tramo de pz 6-7 y del 7-8 con sus respectivos rellenos cálculos y demás componentes propios de esta clase de actividades . se continua presentando terreno inestable el cual es necesario estabilizar antes de instalar la tubería con la pendiente indicada en el diseño

	CONORCIO DIAGONAL 7	
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	RESUMEN DE ACTIVIDADES





Instalacion de entibado y nivelacion de tramos faltantes





Estabilizacion de tramos y reconstruccion de redes secas afectadas por terreno inestable

	CONORCIO DIAGONAL 7	
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	RESUMEN DE ACTIVIDADES





Instalación de material granular en la excavacion de la tuberia a instalar

TRAMO	COTA TERRENO	COTA EXCAVACION	CORTE	ANCHO SUPERIOR	ANCHO INFERIOR	ANCHO PROMEDIO	VOLUMEN EXCAVACION
P7							
KD+00	303.1	298.81	4.29	5.8	3.8	4.8	
							107.36
KD+05	303.06	298.82	4.24	5.6	4	4.8	
							103.51
KD+10	303.04	298.83	4.21	5.5	4.5	5	
							105.0
KD+15	303.01	298.84	4.17	5.6	4.6	5.1	
							105.13
KD+20	302.97	298.85	4.12	5.5	4.6	5.05	
							103.7
KD+25	302.95	298.86	4.09	5.7	4.8	5.25	
							105.33
KD+30	302.93	298.87	4.06	5.8	4.5	5.15	
							102.77
KD+35	302.92	298.88	4.04	5.8	4.2	5	
							98.24
KD+40	302.91	298.89	4.02	5.4	4.2	4.8	
							93.5
KD+45	302.88	298.9	3.98	5.5	4	4.75	
							94.05
KD+50	302.85	298.91	3.94	5.5	4	4.75	
							94.08
KD+55	302.82	298.92	3.9	5.5	4.2	4.85	
							82.97
KD+59.40	302.79	298.93	3.86	5.6	4	4.8	
P6							

				VOL. TOTAL EXCAVACION
				1041.11
52.40	72.8	53.4		
CORTE PROMEDIO GENERAL	ANCHO SUPERIOR GENERAL	ANCHO INFERIOR GENERAL		
4.07	5.6	4.28		

Cartera de cálculos de tramos faltantes

Cuadro de cantidades acumuladas en este periodo

	CONORCIO DIAGONAL 7	
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	RESUMEN DE ACTIVIDADES

"PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"

	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA
	PRELIMINARES				
1,1	Localización y Replanteo Con Equipos de Precisión	M2	16.298,00		-
1,2	Cerca En Tela Verde H = 2.10 M	ML	1.949,00		297,50
1,3	Fresado de Concreto Asfáltico (E= 5-12 cm)	M2	13.946,00		33,04
1,4	Demolición Adoquín Sobre Arena, H=0.15 M	M2	609,50		-
1,5	Demolición Placa Piso E= 0.10 M	M2	3.076,10		-
1,60	Demolición De Sardinel En Concreto	ML	2.408,00		-
1,70	Demolición de Sumideros	UND	45,00		-
1,80	Retiro de Aro Tapas De Pozos Existentes.	UND	41,00		-
1,9	Nivelación De Pozos De Inspección Di=1.20m, E=0.25m, H=0,21m (Incluye Pañete Interno Y Demolición)	UND	41,00		7,00

	CONORCIO DIAGONAL 7	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

1,10	Retiro de Cajillas Medidor Acueducto Existentes.	UND	45,00		-
1,11	Desmonte De Poste Alumbrado Publico	UND	10,00		-
1,12	Desmantelamiento De Redes En Postes De Alumbrado Publico	UND	10,00		-
1,13	Demolición de Carcamo	ML	41,00		-
1,14	Desmonte De Señales Verticales De Transito	UND	44,00		21,00
1,15	Demolición Reductor de Velocidad E=0.15 A=1.0	ML	17,60		-
	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
2,1	Excavación Manual En Conglomerado H=0.0-2.0 M (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)		141,5		-
2,2	Excavacion Manual en Material Comun H=0,0-2,0M (Incluye Retiro de Sobrantes a una Distancia Menor de 5 km)	M3	1.273,50		-
2,3	Excavaciones Varias a Maquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)	M3	5.610,00		-

	CONORCIO DIAGONAL 7	
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	RESUMEN DE ACTIVIDADES

2,4	Transporte De Materiales Prov. De Explanación, Canales, Prestamos, Sobre acarreos Y Derrumbes	M3-KM	224.022,00		-
2,5	Derechos de disposicion final en escombrera certificada	M3	7.400,00	300,00	1.050,00
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
3.1	Compactacion de la Subrasante	M2	9.346,00		-
3.2	Control Topografico de Niveles de Excavacion y de la Estructura de Pavimento	M2	16.298,00		-
3.3	Sub-Base Granular (Norma INVIAS 320) para nivelacion y fallos (E=0,15m)	M3	1.402,00		-
3.4	Base Granular (Norma INVIAS 330) (E=0,15m)	M3	1.011,47		-
3.5	Pavimento Rígido En Concreto MR 40 (40 KG/CM2) (E=0,20m)	M3	1.434,47		-
3.6	Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 PSI	KG	19.699,00		-
3.7	Sellado De Juntas En Pavimento De Concreto Rígido (Incluye Limpieza, Suministro E Instalación De Fondo Y Sellante)	ML	2.383,00		-
3.8	Estampado, Endurecido Y Sellado De Superficie en Concreto	M2	628,00		-

	CONORCIO DIAGONAL 7	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

3.9	Suministro E Instalación De Geotextil T 2400 (Estabilización, Filtro Y Separación)	M2	5.454,12		-
3.10	Corte de Pavimento En Concreto Con Disco Diamantado	ML	6.502,00		-
3.11	Suministro e instalacion COLOR CONCRETO VERDE PINO C-144 PARA CICLOVIA, dosificacion 6kg/m2 de incorporacion manual acabado concreto rustico, incluye sellador de concreto ECO.	M2	1.202,00		-
	ANDENES Y SARDINELES	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
4.1	Relleno Tipo 7 "Arena De Peña"	M3	248,00		-
4,2	Suministro e instalacion loseta de cemento 40 x 40 textura color tipo alfa	M2	1.678,00		-
4,3	Suministro e instalacion loseta de cemento 40 x 40 sin textura color tipo alfa	M2	1.555,00		-
4,4	Suministro e instalacion loseta de cemento 40 x 40 toperol color tipo alfa	ML	1.332,00		-
4,5	Adoquín De Arcilla 20x10x8cm	M2	1.812,00		-
4,6	Suministro e instalacion de gramoquin peatonal	M2	70,00		-

4,7	Andén Concreto 3000 Psi En Sitio E=0.1m	M2	177,00		-
4,8	Bordillo Prefabricado A-80	ML	3.289,00		-
4,9	Sardinel Prefabricado A-10	ML	2.204,90		-
	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
5.1	Localizacion y replanteo de redes	ML	407,15		407,15
5,2	Excavaciones Varias a Maquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)	M3	5.083,70	4.133,37	5.083,70
5,3	Entibado Tipo 2 (1/7 Utilizaciones)	M2	2.635,94	1.574,58	2.635,94
5,4	Transporte De Materiales Prov. De Explanación, Canales, Prestamos, Sobre acarreos Y Derrumbes	M3-KM	55.509,74	36.902,23	55.352,23
5,5	Relleno en Tipo 2 "Recebo"	M3	2.843,31	2.396,80	2.843,31
5,6	Relleno Tipo 5 "triturado grueso"	M3	370,00		-
5,7	Relleno Tipo 7 "Arena De Peña"	M3	1.603,43	1.390,56	1.603,43

	CONORCIO DIAGONAL 7	
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	RESUMEN DE ACTIVIDADES

5,8	Tuberia PVC Alcantarillado 10"	ML	13,20	13,20	13,20
5,9	Tuberia PVC Alcantarillado 12"	ML	51,00	8,00	51,00
5,1	Tuberia PVC Alcantarillado 16"	ML	23,20		23,20
5,11	Tuberia PVC Alcantarillado Reforzado 24"	ML	117,80		117,80
5,12	Tuberia PVC Alcantarillado Reforzado 36"	ML	147,10	147,10	147,10
5,13	Tuberia PVC Alcantarillado 42"	ML	68,20	68,20	68,20
5,14	Suministro e instalación silla Yee PVC de 6X12"	UND	32,00		-
5,15	Suministro e instalación de Codo 45° PVC 6"	UND	32,00		-
5,16	Placa de Fondo Pozo d=1.7m, e=0.25m (concreto 3000psi con refuerzo)	UND	5,00		-
5,17	Cilindro pozo en ladrillo tolete, di=1.20m e=0.25m (inc. Pañete interno e=1.5cm y cañuela)	ML	12,96		-
5,18	Cubierta Pozo D= 1.7m, E=0.20m Concreto 3000 Psi Con Refuerzo (No Incluye Aro Y Tapa Hf)	UND	7,00		-
5,19	Aro en acero y Tapa en Polipropileno de alto impacto, para pozos de inspeccion.	UND	7,00		-

5,20	Marco Tapa Caja De Inspección	UND	32,00		-
5,21	Caja De Inspección De 80x80	UND	6,00	2,00	2,00
5,22	Caja Contador De Agua	UND	32,00		-
5,23	Sumidero Fundido en Sitio Reforzado de una sola camara, incluye marco y rejilla en metalica	UND	32,00		-
5,24	Construccion de Sumidero tipo carcamo medidas 0.4 m x 0.7m (interno) y paredes de 0.15m en concreto 3000 PSI incluye rejilla metalica	ML	40,00		-
5,25	Concreto f'c=3500 PSI (bases) para Camara de Inspeccion	M3	2,21		-
5,26	Concreto f'c=3500 PSI (Elevaciones) para Camara de Inspeccion	M3	10,84		-
5,27	Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 PSI	KG	400,00		-
	MOBILIARIO URBANO	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
6.1	Suministro E Instalación De Banca Urbana Ver Detalle Incluye Dado De Soporte	UND	14,00		-
6.2	Banca En Concreto M-40	UND	20,00		-

6.3	Bolardo M-63 Alto/Hierro	UND	83,00		-
6.4	Suministro E Instalación Caneca Urbana Ver Detalle Incluye Dado De Soporte	UND	20,00		-
6,5	Suministro E Instalación De Paradero De Bus Ver Detalle	UND	1,00		-
6,6	Suministro E Instalación De Caseta De Ventas Ver Detalle	UND	1,00		-
6,7	Suministro E Instalación De Mogador Informativo	UND	1,00		-
6,8	Ciclo Parqueadero M100 Tipo 1	UND	5,00		-
	PASAJISMO	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
7.1	Contenedor de raíces en tubería corrugada PVC 36" x 1 metro de desarrollo	UND	20,00		-
7,2	Contenedor de raíces en tubería corrugada PVC 24" x 1 metro de desarrollo	UND	12,00		-
7,3	Suministro E Instalación De Arboles H=1.50 m	UND	110,00		-
7,4	Poda De Mantenimiento, Poda Radicular y Conflicto Con Redes. (De 2 a 14 mts de altura)	UND	29,00		-

	CONORCIO DIAGONAL 7	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

7,5	Apeo de Árboles (Tala, Remoción y Transporte de Material Descartado, De 3 a 12 mts de altura)	UND	79,00	39,00	39,00
7,6	Relleno En Tierra Negra	M3	45,00		-
7,7	Grama zonas verdes	M2	1.130,00		-
	ALUMBRADO PUBLICO	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
8,1	Suministro e instalacion de poste metalico de 8.5 metros de altura, troncoconico, Diametro cima: 127mm y Diametro Base: 170mm certificado con retilap, incluye Cimentacion en concreto reforzado, sistema de puesta a tierra y doble proposito (para dos luminarias).	UND	72,00		-
8,2	Suministro e instalacion de sistema solar para dos luminarias de 30 y 60W. Incluye paneles solares con soporte, una luminaria de 60W y una luminaria de 30W, cofre, controlador de carga, baterias, protecciones de DC, conectores MC4 y cableado de conexión.	UND	72,00		-
	SEÑALIZACIÓN	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
9,1	Líneas De Demarcación Con Pintura En Frío	ML	2.781,00		-

	CONORCIO DIAGONAL 7				
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16				RESUMEN DE ACTIVIDADES
9,2	Marca Vial Con Pintura En Frío	M2	97,00		-
9,3	Señal De Tránsito Grupo I 0.75x0.75m, Poste 3.5m	UND	40,00		-
9,4	Suministro e Instalación Separador de Carril Tipo B 0,78x0,20x0,15 Material: Polietileno de Alta densidad con estabilizador UV Resistencia: 50 toneladas. Reflectivos: 4 ojos por cara (Incluye: 4 Tornillos en Acero Inoxidable de1/2" de Ancho y 5 Tornillos en Acero Inoxidable de 1/2# de Largo)	UND	528,00		-
9,5	Suministro e Instalación de Tachas Reflectivas Unidireccionales	UND	1.723,00		-
					-
	PGIO				-

DEL 17 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO

Es de recordar que a partir del 18 de diciembre a la primer semana de enero en cese de actividades por solicitud de la veeduría y la comunidad.

Sin embargo al regreso de deste receso se empezó con jomadas de ornato y aseo y culminación de remates de los tramos de alcantarillado para así dar inicio al cojeo de la via como tal pera luego proseguir con la actividad de pavimentado según el diseño suministrado.

	CONORCIO DIAGONAL 7	
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	RESUMEN DE ACTIVIDADES





Amarre de coordenadas para verificacion de cajeo





Verificacion de cotas de cajeo para calculo de estructura de pavimento

	CONORCIO DIAGONAL 7	
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	RESUMEN DE ACTIVIDADES

B	C	D	E	F	G
7	964894,9	922984,869	301,56	DELTA7	
3	964899,073	923013,856	301,537	AUX3	
4	965119,311	922931,834	303,171	AUX4	
8	965119,311	922931,834	303,171	DELTA7	
7	964894,905	922984,868	301,424	D7	
100	965116,6	922941,318	303,221	RAZANTE	
101	965115,606	922938,361	303,197	RAZANTE	
102	965114,058	922934,202	303,202	RAZANTE	
103	965122,401	922931,007	303,223	RAZANTE	
104	965127,069	922929,314	303,194	RAZANTE	
105	965125,08	922923,72	303,037	RAZANTE	
106	965132,509	922921,118	303,162	RAZANTE	
107	965140,442	922918,439	303,15	RAZANTE	
108	965149,507	922915,184	303,125	RAZANTE	
109	965157,574	922912,353	303,225	RAZANTE	
110	965164,806	922909,524	303,18	RAZANTE	
111	965173,055	922906,589	303,174	RAZANTE	
112	965181,514	922903,258	303,197	RAZANTE	
113	965189,77	922900,488	303,193	RAZANTE	
114	965198,403	922897,555	303,192	RAZANTE	
115	965206,568	922894,744	303,191	RAZANTE	
116	965215,356	922891,592	303,188	RAZANTE	
117	965224,099	922888,534	303,061	RAZANTE	

NUBE CAJÓN_1 CUBICACIÓN CAJA +

Cartera de levantamiento de cajon de via para calculos de material

CUBICACIÓN CAJA ENERO DE 2024		
	RASANTE	CAJA
Suma:	41514,810	85632,966
No. De dato	137,000	283,000
Promedio:	303,028	302,590
Altura:		0,438
Área total de la caja:		3228,628
VOLUMEN :		1413,572

Calculo parcial de cajon excavado

Cuadro de cantidades acumuladas en este periodo

	CONORCIO DIAGONAL 7	
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	RESUMEN DE ACTIVIDADES

"PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"

	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA
	PRELIMINARES				
1,1	Localización y Replanteo Con Equipos de Precisión	M2	16.298,00		-
1,2	Cerca En Tela Verde H = 2.10 M	ML	1.949,00		297,50
1,3	Fresado de Concreto Asfáltico (E= 5-12 cm)	M2	13.946,00		33,04
1,4	Demolición Adoquín Sobre Arena, H=0.15 M	M2	609,50		-
1,5	Demolición Placa Piso E= 0.10 M	M2	3.076,10		-
1,6	Demolición De Sardinel En Concreto	ML	2.408,00		-
1,7	Demolición de Sumideros	UND	45,00		-
1,8	Retiro de Aro Tapas De Pozos Existentes.	UND	41,00		-
1,9	Nivelación De Pozos De Inspección Di=1.20m, E=0.25m, H=0,21m (Incluye Pañete Interno Y	UND	41,00		7,00

	Demolición)				
1,10	Retiro de Cajillas Medidor Acueducto Existentes.	UND	45,00		-
1,11	Desmonte De Poste Alumbrado Publico	UND	10,00		-
1,12	Desmantelamiento De Redes En Postes De Alumbrado Publico	UND	10,00		-
1,13	Demolición de Carcamo	ML	41,00		-
1,14	Desmonte De Señales Verticales De Transito	UND	44,00		21,00
1,15	Demolición Reductor de Velocidad E=0.15 A=1.0	ML	17,60		-
	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
2,1	Excavación Manual En Conglomerado H=0.0-2.0 M (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)		141,5		-
2,2	Excavacion Manual en Material Comun H=0,0-2,0M (Incluye Retiro de Sobrantes a una Distancia Menor de 5 km)	M3	1.273,50		-
2,3	Excavaciones Varias a Maquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor	M3	5.610,00	351,87	351,87

	CONORCIO DIAGONAL 7	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

	De 5 KM)				
2,4	Transporte De Materiales Prov. De Explanación, Canales, Prestamos, Sobre acarreos Y Derrumbes	M3-KM	224.022,00		-
2,5	Derechos de disposicion final en escombrera certificada	M3	7.400,00		1.050,00
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
3.1	Compactacion de la Subrasante	M2	9.346,00		-
3.2	Control Topografico de Niveles de Excavacion y de la Estructura de Pavimento	M2	16.298,00		-
3.3	Sub-Base Granular (Norma INVIAS 320) para nivelacion y fallos (E=0,15m)	M3	1.402,00		-
3.4	Base Granular (Norma INVIAS 330) (E=0,15m)	M3	1.011,47		-
3.5	Pavimento Rígido En Concreto MR 40 (40 KG/CM2) (E=0,20m)	M3	1.434,47		-
3.6	Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 PSI	KG	19.699,00		-
3.7	Sellado De Juntas En Pavimento De Concreto Rígido (Incluye Limpieza, Suministro E Instalación De Fondo Y Sellante)	ML	2.383,00		-

	CONORCIO DIAGONAL 7	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

3.8	Estampado, Endurecido Y Sellado De Superficie en Concreto	M2	628,00		-
3.9	Suministro E Instalación De Geotextil T 2400 (Estabilización, Filtro Y Separación)	M2	5.454,12		-
3.10	Corte de Pavimento En Concreto Con Disco Diamantado	ML	6.502,00		-
3.11	Suministro e instalacion COLOR CONCRETO VERDE PINO C-144 PARA CICLOVIA, dosificacion 6kg/m2 de incorporacion manual acabado concreto rustico, incluye sellador de concreto ECO.	M2	1.202,00		-
	ANDENES Y SARDINELES	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
4.1	Relleno Tipo 7 "Arena De Peña"	M3	248,00		-
4,2	Suministro e instalacion loseta de cemento 40 x 40 textura color tipo alfa	M2	1.678,00		-
4,3	Suministro e instalacion loseta de cemento 40 x 40 sin textura color tipo alfa	M2	1.555,00		-
4,4	Suministro e instalacion loseta de cemento 40 x 40 toperol color tipo alfa	ML	1.332,00		-
4,5	Adoquín De Arcilla 20x10x8cm	M2	1.812,00		-

	CONORCIO DIAGONAL 7	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

4,6	Suministro e instalacion de gramoquin peatonal	M2	70,00		-
4,7	Andén Concreto 3000 Psi En Sitio E=0.1m	M2	177,00		-
4,8	Bordillo Prefabricado A-80	ML	3.289,00		-
4,9	Sardinel Prefabricado A-10	ML	2.204,90		-
	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
5.1	Localizacion y replanteo de redes	ML	407,15		407,15
5,2	Excavaciones Varias a Maquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)	M3	5.083,70		5.083,70
5,3	Entibado Tipo 2 (1/7 Utilizaciones)	M2	2.635,94		2.635,94
5,4	Transporte De Materiales Prov. De Explanación, Canales, Prestamos, Sobre acarreos Y Derrumbes	M3-KM	55.509,74		55.352,23
5,5	Relleno en Tipo 2 "Recebo"	M3	2.843,31		2.843,31
5,6	Relleno Tipo 5 "triturado grueso"	M3	370,00		-

	CONORCIO DIAGONAL 7	
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	RESUMEN DE ACTIVIDADES

5,7	Relleno Tipo 7 "Arena De Peña"	M3	1.603,43		1.603,43
5,8	Tuberia PVC Alcantarillado 10"	ML	13,20		13,20
5,9	Tuberia PVC Alcantarillado 12"	ML	51,00		51,00
5,1	Tuberia PVC Alcantarillado 16"	ML	23,20		23,20
5,11	Tuberia PVC Alcantarillado Reforzado 24"	ML	117,80		117,80
5,12	Tuberia PVC Alcantarillado Reforzado 36"	ML	147,10		147,10
5,13	Tuberia PVC Alcantarillado 42"	ML	68,20		68,20
5,14	Suministro e instalación silla Yee PVC de 6X12"	UND	32,00		-
5,15	Suministro e instalación de Codo 45° PVC 6"	UND	32,00		-
5,16	Placa de Fondo Pozo d=1.7m, e=0.25m (concreto 3000psi con refuerzo)	UND	5,00		-
5,17	Cilindro pozo en ladrillo tolete, di=1.20m e=0.25m (inc. Pañete interno e=1.5cm y cañuela)	ML	12,96		-
5,18	Cubierta Pozo D= 1.7m, E=0.20m Concreto 3000 Psi Con Refuerzo (No Incluye Aro Y Tapa Hf)	UND	7,00		-

	CONORCIO DIAGONAL 7	
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	RESUMEN DE ACTIVIDADES

5,19	Aro en acero y Tapa en Polipropileno de alto impacto, para pozos de inspeccion.	UND	7,00		-
5,2	Marco Tapa Caja De Inspección	UND	32,00		-
5,21	Caja De Inspección De 80x80	UND	6,00		2,00
5,22	Caja Contador De Agua	UND	32,00		-
5,23	Sumidero Fundido en Sitio Reforzado de una sola camara, incluye marco y rejilla en metalica	UND	32,00		-
5,24	Construccion de Sumidero tipo carcamo medidas 0.4 m x 0.7m (interno) y paredes de 0.15m en concreto 3000 PSI incluye rejilla metalica	ML	40,00		-
5,25	Concreto f'c=3500 PSI (bases) para Camara de Inspeccion	M3	2,21		-
5,26	Concreto f'c=3500 PSI (Elevaciones) para Camara de Inspeccion	M3	10,84		-
5,27	Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 PSI	KG	400,00		-
	MOBILIARIO URBANO	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
6.1	Suministro E Instalación De Banca Urbana Ver Detalle Incluye Dado De Soporte	UND	14,00		-

6.2	Banca En Concreto M-40	UND	20,00		-
6.3	Bolardo M-63 Alto/Hierro	UND	83,00		-
6.4	Suministro E Instalación Caneca Urbana Ver Detalle Incluye Dado De Soporte	UND	20,00		-
6,5	Suministro E Instalación De Paradero De Bus Ver Detalle	UND	1,00		-
6,6	Suministro E Instalación De Caseta De Ventas Ver Detalle	UND	1,00		-
6,7	Suministro E Instalación De Mogador Informativo	UND	1,00		-
6,8	Ciclo Parqueadero M100 Tipo 1	UND	5,00		-
	PASAJISMO	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
7.1	Contenedor de raíces en tubería corrugada PVC 36" x 1 metro de desarrollo	UND	20,00		-
7,2	Contenedor de raíces en tubería corrugada PVC 24" x 1 metro de desarrollo	UND	12,00		-
7,3	Suministro E Instalación De Arboles H=1.50 m	UND	110,00		-
7,4	Poda De Mantenimiento, Poda Radicular y Conflicto Con Redes. (De	UND	29,00		-

	2 a 14 mts de altura)				
7,5	Apeo de Árboles (Tala, Remoción y Transporte de Material Descartado, De 3 a 12 mts de altura)	UND	79,00		39,00
7,6	Relleno En Tierra Negra	M3	45,00		-
7,7	Grama zonas verdes	M2	1.130,00		-
	ALUMBRADO PUBLICO	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
8,1	Suministro e instalacion de poste metalico de 8.5 metros de altura, troncoconico, Diametro cima: 127mm y Diametro Base: 170mm certificado con retilap, incluye Cimentacion en concreto reforzado, sistema de puesta a tierra y doble proposito (para dos luminarias).	UND	72,00		-
8,2	Suministro e instalacion de sistema solar para dos luminarias de 30 y 60W. Incluye paneles solares con soporte, una luminaria de 60W y una luminaria de 30W, cofre, controlador de carga, baterias, protecciones de DC, conectores MC4 y cableado de conexión.	UND	72,00		-
					-
	SEÑALIZACIÓN	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**

	CONORCIO DIAGONAL 7	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

9,1	Líneas De Demarcación Con Pintura En Frío	ML	2.781,00		-
9,2	Marca Vial Con Pintura En Frío	M2	97,00		-
9,3	Señal De Tránsito Grupo I 0.75x0.75m, Poste 3.5m	UND	40,00		-
9,4	Suministro e Instalación Separador de Carril Tipo B 0,78x0,20x0,15 Material: Polietileno de Alta densidad con estabilizador UV Resistencia: 50 toneladas. Reflectivos: 4 ojos por cara (Incluye: 4 Tornillos en Acero Inoxidable de1/2" de Ancho y 5 Tornillos en Acero Inoxidable de 1/2# de Largo)	UND	528,00		-
9,5	Suministro e Instalación de Tachas Reflectivas Unidireccionales	UND	1.723,00		-
					-
	PGIO				-

	CONORCIO DIAGONAL 7	
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	RESUMEN DE ACTIVIDADES


DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO

Durante este periodo se continua con el cajeo de la vía al igual que la extensión de material granular para pavimentación.





Extensión de material en granular pruebas de densidades del mismo.

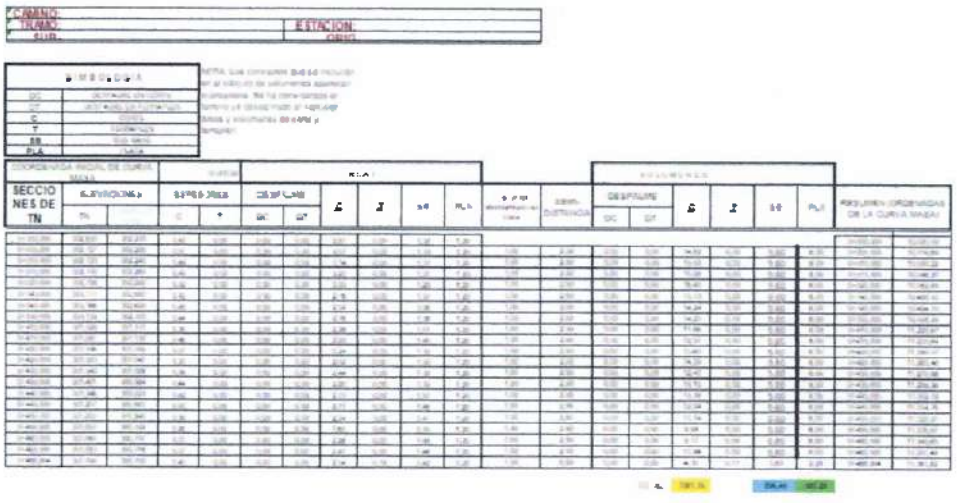

Cartera segunda parte del calculo de la exvavacion del cajon de la via

	CONSORCIO DIAGONAL 7	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

Cuadro de cantidades acumuladas en este periodo

"PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA"

	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA
	PRELIMINARES				
1,1	Localización y Replanteo Con Equipos de Precisión	M2	16.298,00	5.035,75	5.035,75
1,2	Cerca En Tela Verde H = 2.10 M	ML	1.949,00		297,50
1,3	Fresado de Concreto Asfáltico (E= 5-12 cm)	M2	13.946,00		33,04
1,4	Demolición Adoquín Sobre Arena, H=0.15 M	M2	609,50		-
1,5	Demolición Placa Piso E= 0.10 M	M2	3.076,10	708,25	708,25
1,6	Demolición De Sardinel En Concreto	ML	2.408,00		-
1,7	Demolición de Sumideros	UND	45,00		-
1,8	Retiro de Aro Tapas De Pozos Existentes.	UND	41,00		-

	CONSORCIO DIAGONAL 7	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

1,9	Nivelación De Pozos De Inspección Di=1.20m, E=0.25m, H=0,21m (Incluye Pañete Interno Y Demolición)	UND	41,00		7,00
1,10	Retiro de Cajillas Medidor Acueducto Existentes.	UND	45,00		-
1,11	Desmonte De Poste Alumbrado Publico	UND	10,00		-
1,12	Desmantelamiento De Redes En Postes De Alumbrado Publico	UND	10,00		-
1,13	Demolición de Carcamo	ML	41,00		-
1,14	Desmonte De Señales Verticales De Transito	UND	44,00		21,00
1,15	Demolición Reductor de Velocidad E=0.15 A=1.0	ML	17,60		-
	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
2,1	Excavación Manual En Conglomerado H=0.0-2.0 M (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)		141,5		-
2,2	Excavacion Manual en Material Comun H=0,0-2,0M (Incluye Retiro de Sobrantes a una Distancia Menor de 5 km)	M3	1.273,50		-

	CONSORCIO DIAGONAL 7	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

2,3	Excavaciones Varias a Maquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)	M3	5.610,00	1.362,18	1.714,05
2,4	Transporte De Materiales Prov. De Explanación, Canales, Prestamos, Sobre acarreos Y Derrumbes	M3-KM	224.022,00		-
2,5	Derechos de disposicion final en escombrera certificada	M3	7.400,00		1.050,00
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
3.1	Compactacion de la Subrasante	M2	9.346,00		-
3.2	Control Topografico de Niveles de Excavacion y de la Estructura de Pavimento	M2	16.298,00		-
3.3	Sub-Base Granular (Norma INVIAS 320) para nivelacion y fallos (E=0,15m)	M3	1.402,00		-
3.4	Base Granular (Norma INVIAS 330) (E=0,15m)	M3	1.011,47		-
3.5	Pavimento Rígido En Concreto MR 40 (40 KG/CM2) (E=0,20m)	M3	1.434,47		-
3.6	Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 PSI	KG	19.699,00		-
3.7	Sellado De Juntas En Pavimento De Concreto Rígido (Incluye Limpieza,	ML	2.383,00		-

	CONSORCIO DIAGONAL 7	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

	Suministro E Instalación De Fondo Y Sellante)				
3.8	Estampado, Endurecido Y Sellado De Superficie en Concreto	M2	628,00		-
3.9	Suministro E Instalación De Geotextil T 2400 (Estabilización, Filtro Y Separación)	M2	5.454,12		-
3.10	Corte de Pavimento En Concreto Con Disco Diamantado	ML	6.502,00		-
3.11	Suministro e instalacion COLOR CONCRETO VERDE PINO C-144 PARA CICLOVIA, dosificacion 6kg/m2 de incorporacion manual acabado concreto rustico, incluye sellador de concreto ECO.	M2	1.202,00		-
	ANDENES Y SARDINELES	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
4.1	Relleno Tipo 7 "Arena De Peña"	M3	248,00		-
4,2	Suministro e instalacion loseta de cemento 40 x 40 textura color tipo alfa	M2	1.678,00		-
4,3	Suministro e instalacion loseta de cemento 40 x 40 sin textura color tipo alfa	M2	1.555,00		-
4,4	Suministro e instalacion loseta de cemento 40 x 40 toperol color tipo alfa	ML	1.332,00		-

	CONSORCIO DIAGONAL 7	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

4,5	Adoquín De Arcilla 20x10x8cm	M2	1.812,00		-
4,6	Suministro e instalacion de gramoquin peatonal	M2	70,00		-
4,7	Andén Concreto 3000 Psi En Sitio E=0.1m	M2	177,00		-
4,8	Bordillo Prefabricado A-80	ML	3.289,00		-
4,9	Sardinel Prefabricado A-10	ML	2.204,90		-
	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
5.1	Localizacion y replanteo de redes	ML	407,15		407,15
5,2	Excavaciones Varias a Maquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 KM)	M3	5.083,70		5.083,70
5,3	Entibado Tipo 2 (1/7 Utilizaciones)	M2	2.635,94		2.635,94
5,4	Transporte De Materiales Prov. De Explanación, Canales, Prestamos, Sobre acarreos Y Derrumbes	M3-KM	55.509,74		55.352,23
5,5	Relleno en Tipo 2 "Recebo"	M3	2.843,31		2.843,31

5,6	Relleno Tipo 5 "triturado grueso"	M3	370,00		-
5,7	Relleno Tipo 7 "Arena De Peña"	M3	1.603,43		1.603,43
5,8	Tuberia PVC Alcantarillado 10"	ML	13,20		13,20
5,9	Tuberia PVC Alcantarillado 12"	ML	51,00		51,00
5,1	Tuberia PVC Alcantarillado 16"	ML	23,20		23,20
5,11	Tuberia PVC Alcantarillado Reforzado 24"	ML	117,80		117,80
5,12	Tuberia PVC Alcantarillado Reforzado 36"	ML	147,10		147,10
5,13	Tuberia PVC Alcantarillado 42"	ML	68,20		68,20
5,14	Suministro e instalación silla Yee PVC de 6X12"	UND	32,00		-
5,15	Suministro e instalación de Codo 45° PVC 6"	UND	32,00		-
5,16	Placa de Fondo Pozo d=1.7m, e=0.25m (concreto 3000psi con refuerzo)	UND	5,00		-
5,17	Cilindro pozo en ladrillo tolete, di=1.20m e=0.25m (inc. Pañete interno e=1.5cm y cañuela)	ML	12,96		-

	CONSORCIO DIAGONAL 7	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

5,18	Cubierta Pozo D= 1.7m, E=0.20m Concreto 3000 Psi Con Refuerzo (No Incluye Aro Y Tapa Hf)	UND	7,00		-
5,19	Aro en acero y Tapa en Polipropileno de alto impacto, para pozos de inspeccion.	UND	7,00		-
5,2	Marco Tapa Caja De Inspección	UND	32,00		-
5,21	Caja De Inspección De 80x80	UND	6,00		2,00
5,22	Caja Contador De Agua	UND	32,00		-
5,23	Sumidero Fundido en Sitio Reforzado de una sola camara, incluye marco y rejilla en metalica	UND	32,00		-
5,24	Construccion de Sumidero tipo carcamo medidas 0.4 m x 0.7m (interno) y paredes de 0.15m en concreto 3000 PSI incluye rejilla metalica	ML	40,00		-
5,25	Concreto f'c=3500 PSI (bases) para Camara de Inspeccion	M3	2,21		-
5,26	Concreto f'c=3500 PSI (Elevaciones) para Camara de Inspeccion	M3	10,84		-
5,27	Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 PSI	KG	400,00		-

	CONSORCIO DIAGONAL 7	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

	MOBILIARIO URBANO	UND.	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA
6.1	Suministro E Instalación De Banca Urbana Ver Detalle Incluye Dado De Soporte	UND	14,00		-
6.2	Banca En Concreto M-40	UND	20,00		-
6.3	Bolardo M-63 Alto/Hierro	UND	83,00		-
6.4	Suministro E Instalación Caneca Urbana Ver Detalle Incluye Dado De Soporte	UND	20,00		-
6,5	Suministro E Instalación De Paradero De Bus Ver Detalle	UND	1,00		-
6,6	Suministro E Instalación De Caseta De Ventas Ver Detalle	UND	1,00		-
6,7	Suministro E Instalación De Mogador Informativo	UND	1,00		-
6,8	Ciclo Parqueadero M100 Tipo 1	UND	5,00		-

	PASAJISMO	UND.	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA
7.1	Contenedor de raíces en tubería corrugada PVC 36" x 1 metro de desarrollo	UND	20,00		-

7,2	Contenedor de raíces en tubería corrugada PVC 24" x 1 metro de desarrollo	UND	12,00		-
7,3	Suministro E Instalación De Arboles H=1.50 m	UND	110,00		-
7,4	Poda De Mantenimiento, Poda Radicular y Conflicto Con Redes. (De 2 a 14 mts de altura)	UND	29,00		-
7,5	Apeo de Árboles (Tala, Remoción y Transporte de Material Descartado, De 3 a 12 mts de altura)	UND	79,00	12,00	51,00
7,6	Relleno En Tierra Negra	M3	45,00		-
7,7	Grama zonas verdes	M2	1.130,00		-
	ALUMBRADO PUBLICO	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
8,1	Suministro e instalacion de poste metalico de 8.5 metros de altura, troncoconico, Diametro cima: 127mm y Diametro Base: 170mm certificado con retilap, incluye Cimentacion en concreto reforzado, sistema de puesta a tierra y doble proposito (para dos luminarias).	UND	72,00		-

	CONSORCIO DIAGONAL 7	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

8,2	Suministro e instalacion de sistema solar para dos luminarias de 30 y 60W. Incluye paneles solares con soporte, una luminaria de 60W y una luminaria de 30W, cofre, controlador de carga, baterias, protecciones de DC, conectores MC4 y cableado de conexión.	UND	72,00		-
					-
	SEÑALIZACIÓN	**UND.**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO**	**CANTIDAD ACUMULADA**
9,1	Líneas De Demarcación Con Pintura En Frío	ML	2.781,00		-
9,2	Marca Vial Con Pintura En Frío	M2	97,00		-
9,3	Señal De Tránsito Grupo I 0.75x0.75m, Poste 3.5m	UND	40,00		-
9,4	Suministro e Instalación Separador de Carril Tipo B 0,78x0,20x0,15 Material: Polietileno de Alta densidad con estabilizador UV Resistencia: 50 toneladas. Reflectivos: 4 ojos por cara (Incluye: 4 Tornillos en Acero Inoxidable de1/2" de Ancho y 5 Tornillos en Acero Inoxidable de 1/2# de Largo)	UND	528,00		-
9,5	Suministro e Instalación de Tachas Reflectivas Unidireccionales	UND	1.723,00		-
					-
	PGIO				-

	CONSORCIO DIAGONAL 7	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

ANEXO DE CERTIFICADOS DE EQUIPOS USADO PARA CHEQUEOS EN TERRENO

	CONSORCIO DIAGONAL 7	
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	RESUMEN DE ACTIVIDADES

ARFOR Ingenieria
Carrera 76 # 65A - 60 Bogotá D.C.
Teléfono: (601) 438 1646
Celular/ Whatsapp +57 3174045226
E-mail: info@arforingenieria.com
www.arforingenieria.com

Bogotá D.C., enero 2 de 2024

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 0779

Datos de Contacto:

CIUDAD	BOGOTA D.C.
SEÑOR (ES)	JORGE FERNANDO MORALES
N° IDENTIFICACIÓN	C.C. N° 79.855.580
TELEFONO	310 757 5198

Datos del Equipo:

EQUIPO	ESTACION TOTAL
FABRICANTE	KOLIDA
MODELO	KTS-442RB
N° DE SERIE	7262203

Por medio del presente certificamos que el equipo descrito fue revisado en nuestro laboratorio, cumple con las especificaciones del fabricante y sus caracteristicas técnicas se encuentran dentro de los rangos tolerados. Asimismo certificamos que el equipo se encuentra en perfectas condiciones óptico-mecánicas.

VERIFICACIÓN REALIZADA CON COLIMADOR DE ALTA PRECISIÓN
MARCA: SANWEI FSSHD3
S/N: 18575120022
RESOLUCIÓN: 3"
PROCEDIMIENTO BAJO NORMA DIN 18723

PARAMETROS TECNICOS	
Resolución angular	1", 5"
Precisión angular directa	2"
Aumento	30x
Medición máxima con un prisma	5000 m
Medición máxima sin prisma	800 m
Medición máxima con tres prismas	6000 m
Campo de visión	1°30'
Sistema compensador	Doble Eje
Sensibilidad del compensador	+/-
Precisión del compensador	1"
Temperatura de trabajo	-20°C ~ +50°C
Distancia de enfoque mínima	1.0 m
Torque movimiento fino	Verificado
Aumentos y campo visual a 100 m	Verificado

ARFOR Ingenieria SERVICIO TECNICO

RICAURTE CUND. PROGRESO - PAZ - CORDIALIDAD	**CONSORCIO DIAGONAL 7**	RESUMEN DE ACTIVIDADES
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	

ARFOR Ingeniería
Carrera 76 B 65° - 68 Bogotá D.C.
Teléfono (601) 438 1646
Celular/ Whatsapp: +57 3174045226
E mail info@arforingenieria.com
www.arforingenieria.com

Bogotá D.C., enero 2 de 2024

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 0778

Datos de Contacto

CIUDAD	BOGOTA D.C.
SEÑOR (ES)	JORGE FERNANDO MORALES
N° IDENTIFICACIÓN	C.C. N° 79.855.590
TELEFONO	310 757 5188

Datos del Equipo:

EQUIPO	NIVEL AUTOMÁTICO
FABRICANTE	TOPCON
MODELO	AT B4
N° DE SERIE	N14286

Por medio del presente certificamos que el equipo descrito fue revisado en nuestro laboratorio cumple con las especificaciones del fabricante y sus características técnicas se encuentran dentro de los rangos tolerables. Asimismo certificamos que el equipo se encuentra en perfectas condiciones óptico-mecánicas.

VERIFICACIÓN REALIZADA CON COLIMADOR DE ALTA PRECISIÓN
MARCA: SANWEI F550/D3
S/N: 18675120022
RESOLUCIÓN: 3"
PROCEDIMIENTO BAJO NORMA DIN 18723

PARAMETROS TÉCNICOS	
Precisión por km doble de nivelación	+/- 2mm
Aumento	28x
Distancia de enfoque mínima	0.20 m
Sistema compensador	Rango +/- 15 ft precisión de ajuste +/- 0.5
Poder de resolución	4"
Apertura del objetivo	42 mm
Campo de visión	1°25
Limbo graduado	360°
Precisión del nonio	1"
Temperatura de trabajo	20°C ~ +50°C

ARFOR Ingeniería NIT. 901.134.879-3 SERVICIO TÉCNICO

Página 1/2

	CONSORCIO DIAGONAL 7	
	INFORME COMPONENTE TECNICO DE TOPOGRAFIA Tramo diagonal 7 entre calle10 hasta carrera 16	RESUMEN DE ACTIVIDADES


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA
MATRICULA PROFESIONAL No.
25335212280CND
INGENIERO TOPOGRAFICO
DE FECHA 01/09/2011
JORGE FERNANDO
MORALES OLIVEROS
C.C. 79855590
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
PRESIDENTE DEL CONSEJO

COPNIA

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-1987747

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JORGE FERNANDO MORALES OLIVEROS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79855590, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA TOPOGRAFICA con MATRICULA PROFESIONAL 25335-212280 desde el 01 de Septiembre de 2011, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1336.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL de la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiseis (26) días del mes de Abril del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que no hayan sanciones su participación en procesos contractuales, se debe de tener en cuenta la vigencia del Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Micrositio/CertificadoOficialBanding/CertificadoOficialBanding.aspx indicando el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

1958



Bogotá D.C, 16 de febrero de 2024

CUENTA DE COBRO No. 01

PAOLA ANDREARODRIGUEZ
NIT: 28548736

DEBE A:
JORGE FERNANDO MORALES OLIVEROS
NIT 79.855.590 – 0

REGIMEN SIMPLIFICADO

Por concepto de: (4) meses de alquiler equipos de topografía en el municipio de Ricaurte Cundinamarca, para el contrato de interventoría No. 413 de 2023 cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMETACION Y EMBELLECIMENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA"** durante el periodo del 17 de octubre de 2023 al 16 de febrero de 2024.

Descripción	C/Meses	Valor Unitario	Valor Total
Alquiler de equipos de topografía (incluye estación total, nivel de precisión y GPS)	4,00	$3.523.579,00	$14.094.316,00

SON: **CATORCE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE ($14.094.316,00)**

Favor consignar dicho valor en la cuenta de AHORROS No. 0550488403907329 de DAVIVIENDA a nombre de JORGE FERNANDO MORALES.

Atentamente,

JORGE FERNANDO MORALES
CC 79855590 de Bogotá
Ing. topográfico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Especialista en Gerencia de Obras
Tel 3107575188-3186267657

1959

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14893030616

(415)7707212489984(8020) 000001489303061 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 8 5 5 5 9 0	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 8 6 5 5 9 0	1 9 9 7 0 1 1 3

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MORALES	OLIVEROS	JORGE	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 2 B 40 B 3 O

42. Correo electrónico: FERNANDOMORALESTOPOGRAFIA@HOTMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 0 3 0 0 2 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 0 3 0 1 1 0	4 3 1 2	2 0 1 3 0 7 0 5			3 1 1 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 01-02-2023 11:37:10PM

GENERADOR DE DOCUMENTO SIN COSTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79855590
MORALES OLIVEROS
JORGE FERNANDO
Jorge Fernando Morales



12-NOV-1978
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
1.67 O+ M
12-DIC-1997 BOGOTA D.C.

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 19 de febrero de 2024

ID7R- ACTA PARCIAL 01

Ingeniero
HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Alcaldia Municipal de Ricaurte
Cundinamarca

Referencia. **Contrato de Interventoría No. 413 de 2023 – "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Asunto: **ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 413 DE 2023**

Cordial saludo Ingeniero,

Mediante el presente, esta interventoría remite para su revisión, aprobación y trámite acta parcial No. 01 correspondiente al 55,48% del contrato de interventoría No. 413-2023 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

- Acta parcial No. 01 del contrato de interventoría No. 413-2023
- Factura correspondiente al acta parcial No. 01
- Certificado de pago de parafiscales por parte del revisor fiscal
- Certificación bancaria

La información relacionada en el acta parcial No. 01 se encuentra soportada en los informes mensuales No. 01,02,03 y 04 del contrato en referencia durante el periodo del 17 de octubre de 2023 al 16 de febrero de 2024.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ

Ricaurte

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No.01
CONTRATO No. 413 - 2023

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 16 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA"

Paola Rodriguez Alcalá

MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	**CONTRATISTA:**	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ C.C. No. 28.548.736 de Ibagué	FECHA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2023
			FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE MAYO DE 2024
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	**SUPERVISOR:**	ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS (C)		ACTA PARCIAL No. 01
			FECHA PRESENTE ACTA	19 DE FEBRERO DE 2024

CONDICIONES CONTRATUALES

CARGO / OFICIO	CANTIDAD	DEDICACIÓN	MESES	COSTOS DE PERSONAL	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 01 CANT.	ACTA PARCIAL No. 01 VALOR TOTAL	ACUMULADO CANT.	ACUMULADO VALOR TOTAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	15%	7	$ 7.362.097,00	$ 7.730.201,85	4	$ 4.417.258,20	4	$ 4.417.258,20
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	100%	7	$ 6.708.987,00	$ 46.962.909,00	4	$ 26.835.948,00	4	$ 26.835.948,00
ESPECIALISTA EN PAVIMENTO	1	30%	7	$ 7.362.097,00	$ 15.460.403,70	4	$ 8.834.516,40	4	$ 8.834.516,40
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	30%	7	$ 7.362.097,00	$ 15.460.403,70	4	$ 8.834.516,40	4	$ 8.834.516,40
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO	1	30%	7	$ 7.362.097,00	$ 15.460.403,70	4	$ 8.834.516,40	4	$ 8.834.516,40
INGENIERO ELECTRICO ASESOR	1	30%	7	$ 7.362.097,00	$ 15.460.403,70	4	$ 8.834.516,40	4	$ 8.834.516,40
INGENIERO FORESTAL	1	30%	7	$ 6.708.987,00	$ 14.088.872,70	4	$ 8.050.784,40	4	$ 8.050.784,40
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	50%	7	$ 4.500.000,00	$ 15.750.000,00	4	$ 9.000.000,00	4	$ 9.000.000,00
TRABAJORA SOCIAL	1	60%	7	$ 4.500.000,00	$ 18.900.000,00	4	$ 10.800.000,00	4	$ 10.800.000,00
PROFESIONAL EN TOPOGRAFÍA	1	50%	7	$ 4.500.000,00	$ 15.750.000,00	4	$ 9.000.000,00	4	$ 9.000.000,00
AUXILIAR EN TOPOGRAFÍA (CADENERO)	1	50%	7	$ 2.157.396,00	$ 7.550.886,00	4	$ 4.314.792,00	4	$ 4.314.792,00
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	1	100%	7	$ 4.145.326,00	$ 29.017.282,00	4	$ 16.581.304,00	4	$ 16.581.304,00
VALOR PERSONAL					$ 217.591.766,35		$ 124.338.152,20		$ 124.338.152,20
FACTOR MULTIPLICADOR				2,20					
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL MÍNIMO					$ 478.701.885,97		$ 273.543.934,84		$ 273.543.934,84

OTROS COSTOS DIRECTOS

CARGO / OFICIO	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
Densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono y arena para base y sub-base granular, NORMA INV E-161 (min 10und/km)	UND	100,00	$ 50.000,00	$ 5.000.000,00	7,00	$ 350.000,00	7,00	$ 350.000,00
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto NORMA INV E-410 min(8und/20m3)	UND	730,00	$ 15.000,00	$ 10.950.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Alquiler de equipos de topografía (incluye estación total, nivel de precisión y GPS)	MES	7,00	$ 3.523.579,00	$ 24.665.053,00	4,00	$ 14.094.316,00	4,00	$ 14.094.316,00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	UND	7,00	$ 1.000.000,00	$ 7.000.000,00	4,00	$ 4.000.000,00	4,00	$ 4.000.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				$ 47.615.053,00		$ 18.444.316,00		$ 18.444.316,00
SUBTOTAL COSTO DE LA INTERVENTORÍA			$ 526.316.938,97			$ 291.988.250,84		$ 291.988.250,84
IVA 19%			$ 100.000.218,40			$ 55.477.768,00		$ 55.477.768,00
AJUSTE			($ 0,37)					
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA			$ 626.317.157,00			$ 347.466.018,84		$ 347.466.018,84

RESUMEN ECONOMICO

DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.413-2023	$ 626.317.157,00	100%
2. VALOR ACTA PARCIAL No.1 INTERVENTORIA	**$ 347.466.018,84**	**55,48%**
3. VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 347.466.018,84	55,48%
4. VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR	$ 278.851.138,16	44,52%

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DIECIOCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

ING.HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (C)
SUPERVISOR

1961

1963

Certificado
Bancario

Jueves, 18 de enero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA identificado(a) con CC 28548736, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	86952449208	2009/08/24	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

1964

Niyireth Dueñas Morales
Contadora Pública

CERTIFICA QUE

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ con cédula de ciudadanía No. 28.548.736 de Ibagué, se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Ibagué a los trece (13) días del mes de febrero de 2024

Cordialmente,

NIYIRETH DUEÑAS MORALES
CONTADORA PÚBLICA
T.P 100.287-T

Dirección: Bosques de Alamedo Mz a Cs 24 Ibagué – Tolima - Teléfono 2618186
Celular: 3158007707 - E-mail: [illegible]

1965

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 65.738.338
DUEÑAS MORALES
APELLIDOS
NIYIRETH
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-ENE-1967
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

01-OCT-1986 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-2900100-00127429-F-0065738338-20081113 0005898021A 1 6350023112

1966

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

100287-T



NIYIRETH
DUEÑAS MORALES
C.C. 65738338
RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA 2004/04/29
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE MIGUEL T[illegible] IE PEÑA

107713

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

1967

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4DB0EBEF1C0CBB2E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NIYIRETH DUEÑAS MORALES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65738338 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 100287-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2024

Ricaurte

190.19. No. 389 - 2024

Ricaurte, 06 de mayo 2024

Interventoria Jud
07 mayo 2024
Hora: 03:00pm

Ingeniera
PAOLA RODRÍGUEZ ALCALÁ
Contratista de Interventoría
Ibagué - Tolima

Referencia: Contrato de Interventoría No. 413-2023.
Objeto: "Pavimentación y embellecimiento de la Diagonal 7 desde la calle 10 hasta la carrera 16 del municipio de Ricaurte - Cundinamarca".

Asunto: Solicitud Documentación Acta Parcial N°01.

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos solicitar la entrega de la siguiente documentación con el fin de dar trámite a la cuenta parcial No°01 del Contrato de la referencia, la cual es:

- Certificación de la vinculación del personal de mano de obra no calificada, de acuerdo a lo establecido en las Obligaciones Generales N° 01 del Contratista de Obra.
- Copia de los soportes de la verificación y aval del personal mínimo de obra y maquinaria mínima requerida.
- Certificación de las fuentes de materiales con los respectivos permisos de explotación por el contratista y avalados por la interventoría.
- Informe 1 y 2 de SST del Contratista de Obra con su respectiva verificación y aval por parte del Contratista de Interventoría y copia del soporte de verificación y aval de los demás informes.
- Certificación de la verificación de los contratos suscritos entre el contratista y el personal de obra, de acuerdo a la Obligación Especifica N° 15 del Contrato de Obra.
- Certificación del cumplimiento de las Obligaciones Específicas N° 16 y 17 del Contrato de Obra:

(...)16. "El contratista deberá uniformar con dotación identificable a todos y cada uno de los trabajadores que participen en la obra y durante todo el tiempo de ejecución de esta, este costo deberá ser asumido por el contratista el cual debe ser contemplado en los costos administrativos del proyecto (...)

(...) 17. "Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya enganchando personal, el contratista deberá presentar relaciones del personal con los siguientes datos: nombre, documento de identificación, libreta militar, domicilio, certificado medico (copia), cargo que desempeña, salarios, constancias de afiliación al régimen de seguridad social y los que requiera la Supervisión municipal para poder hacer las respectivas revisiones" (...)

- Cronograma de programación de las diferentes actividades contempladas en el proceso de interventoría.
- Certificación del cumplimiento de la Obligación Especifica- Funciones Administrativas N°15(...) "*Verificar que los sitios aledaños a la obra se mantengan libres de residuos, herramientas, y elementos sobrantes dejando los mismos completamente aseados, cumpliendo con el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros de acuerdo a la normativa vigente" (...)*

Ricaurte

Por lo anterior, esta supervisión solicita la documentación en la menor brevedad posible con el fin de dar trámite al Acta Parcial N°01 del Contrato de la referencia, de acuerdo a lo establecido en la Clausula 10. Obligaciones Especificas del Interventor: A) Funciones Técnicas B) Funciones Administrativas C) Funciones Financieras D) Funciones Ambientales E) Conocimiento de las normas y F) Otras obligaciones del Contratista.

Atentamente,

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C)

Proyectado por: Ing. Majeni Caterine Yate Trujillo
Profesional Contratista de Apoyo SIOP

Recibido.
2068
23-05-2024
04:42 Pm

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría Integral y de Tránsito
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 23 de mayo de 2024

ID7R-110

Ingeniero
HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Alcaldía Municipal de Ricaurte
Cundinamarca

Referencia. **Contrato de Interventoría No. 413 de 2023 – "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Asunto: **ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN ATENCIÓN AL COMUNICADO 190.19 No. 389-2024.**

Por medio del presente y en atención al comunicado 190.19 No. 389-2024 para dar trámite al Acta Parcial No. 01 del contrato en referencia, correspondiente al periodo del 17 de octubre de 2023 al 16 de febrero de 2024, esta interventoría hace entrega de la siguiente documentación:

- Certificado de vinculación del personal de mano de obra no calificada de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra pública No. 403-2023 durante el periodo de informes 1 al 4 del tiempo contractual, además, se hace entrega en el expediente de obra de informe social en atención a lo requerido.
- Soporte de verificación y aval del personal mínimo de obra y maquinaria requerida en el contrato de obra pública No. 403-2023, fue avalada por esta interventoría a través de ID7R-045, ID7R-046 y certificación de aval de motoniveladora.
- Certificación de fuentes de materiales con los respectivos permisos de explotación por el contratista de obra y aval de interventoría, se informa que los permisos de explotación reposan en la información correspondiente al componente ambiental del PGIO del contrato de obra durante los periodos de informes 1 al 4 del tiempo contractual y se adjunta certificación de aval por parte de la presente interventoría.
- Certificación de revisión y aval de los informes de SST del contratista de obra por parte de interventoría, se informa que los informes 1 y 2 fueron adjuntos al expediente de obra.
- Certificación de verificación de contratos en atención a la obligación No. 15 del contrato de obra por parte de interventoría, se informa que los contratos de vinculación laboral fueron radicados en el expediente de obra.
- Certificación del cumplimiento de las obligaciones especificas No. 16 y No. 17 del contrato de obra pública No. 403-2023 por parte de interventoría, se informa que la información requerida en las obligaciones fue radicada y reposan en el expediente de obra.
- Cronograma de actividades de interventoría.
- Certificación de industria nacional.
- Certificación de sitios aledaños libres de residuos.

Cordialmente,

Paola A. Rodriguez A.

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Cr 5 #11-24 Of 302 Edificio Torre Empresarial (608) 260-7436 - 3123065921
diagonalseptima.interventoria@gmail.com

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

En calidad de interventoría, y ante el informe del componente social entregado por el contratista Consorcio Diagonal RC, se da a conocer que este si está cumpliendo con los siguientes puntos de la cláusula 9, la cual se dará a conocer a continuación

(..) ***CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:***

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. (...)

A partir de ello, esta interventoría certifica el cumplimiento por parte del contratista al cumplir en la cláusula 9 numeral 1 ya que desde el periodo comprendido desde octubre del 2023 a febrero del 2024 poseen un porcentaje promedio de mujeres que representa el 15,18% de toda su nómina (entre 4 a 5 mujeres); sin embargo, los datos detallados se encontrarán más adelante.

(..) 2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del ciento (5%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades Indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. (...)

A partir de ello, esta interventoría certifica el cumplimiento por parte del contratista al cumplir en la cláusula 9 numeral 2 ya que desde el periodo comprendido desde octubre del 2023 a febrero del 2024 poseen un porcentaje promedio de mujeres cabeza de hogar y personas en condición de pobreza extrema que representa el 16,90% de toda su nómina (entre 5 y 6 personas en condición de pobreza extrema y mujeres cabeza de hogar); sin embargo, los datos más detallados se encontrarán más adelante.

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA


A partir de ello, se dará a conocer los parámetros que permiten dar a conocer el cumplimiento del contratista.

En este contexto, es importante destacar los esfuerzos realizados por el contratista en cuanto a la inclusión y participación de los diferentes grupos poblacionales mencionados, así como la adecuada asignación de los recursos y la implementación de estrategias que garanticen el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Además, se verificará que las acciones emprendidas por el contratista no solo cumplan con los porcentajes estipulados, sino que también promuevan un impacto positivo y sostenible en la comunidad local, mejorando la calidad de vida de los beneficiarios directos e indirectos del proyecto.

El compromiso del contratista con la inclusión social y el desarrollo comunitario se refleja en la transparencia y diligencia con la que se lleva a cabo la selección y contratación del personal y proveedores locales, asegurando que se respeten los principios de equidad y justicia social. Estos aspectos serán monitoreados de manera continua durante toda la vigencia del contrato, garantizando que se mantenga el cumplimiento de las obligaciones contractuales y que se realicen las correcciones necesarias en caso de identificarse desviaciones.


En cuanto a la cláusula 9 numeral 1

Domicilio – Octubre - Noviembre		
Ciudad	Cantidad	%
Ricaurte	3	12%
Purificación	1	4%
Ibagué	6	23%
Girardot	10	38%
Flandes	1	4%
Espinal	5	19%
Total	26	100%

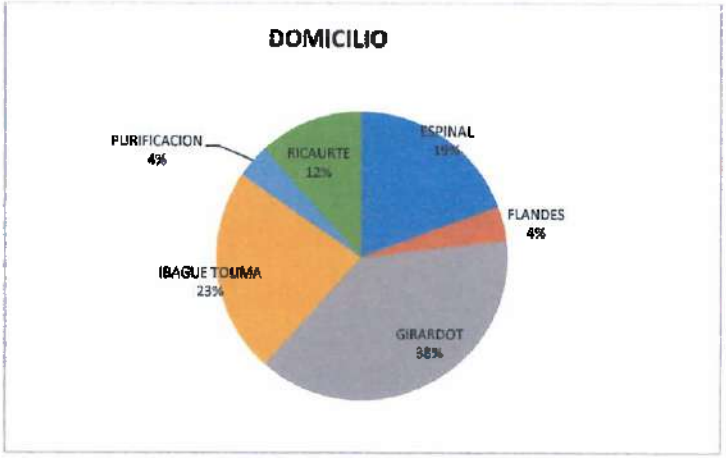

A partir de ello, las mujeres representan el 15,83% del personal del contratista


Domicilio – Noviembre - Diciembre		
Ciudad	Cantidad	%
Ricaurte	4	12,90
Venadillo	1	3,22
Ibagué	9	29,03
Girardot	10	32,25
Flandes	2	6,45
Espinal	5	16,12
Total	31	100

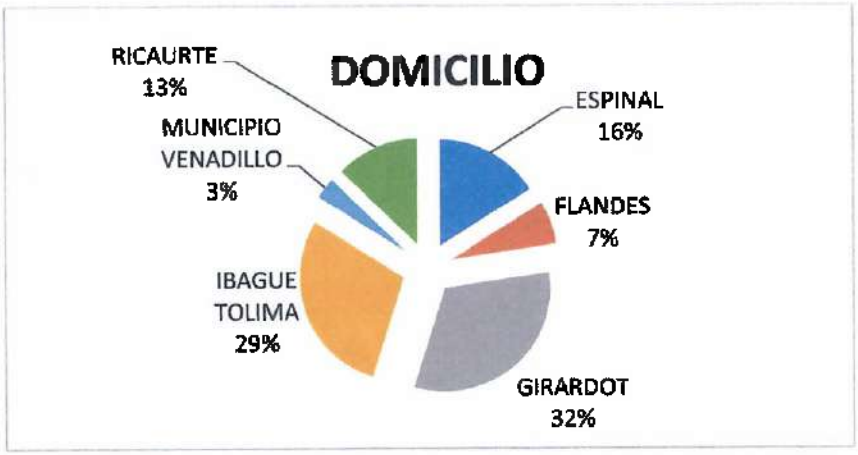

A partir de ello, las mujeres representan el 16,12% del personal del contratista


Domicilio – Diciembre – Enero		
Ciudad	Cantidad	%
Ricaurte	3	10,34
Venadillo	1	3,44
Ibagué	7	24,13
Girardot	11	37,93
Flandes	1	3,44
Espinal	6	20,68
Total	29	100

Paola Rodriguez Alcalá
Técnico Civil
Especialista en Interventoría Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

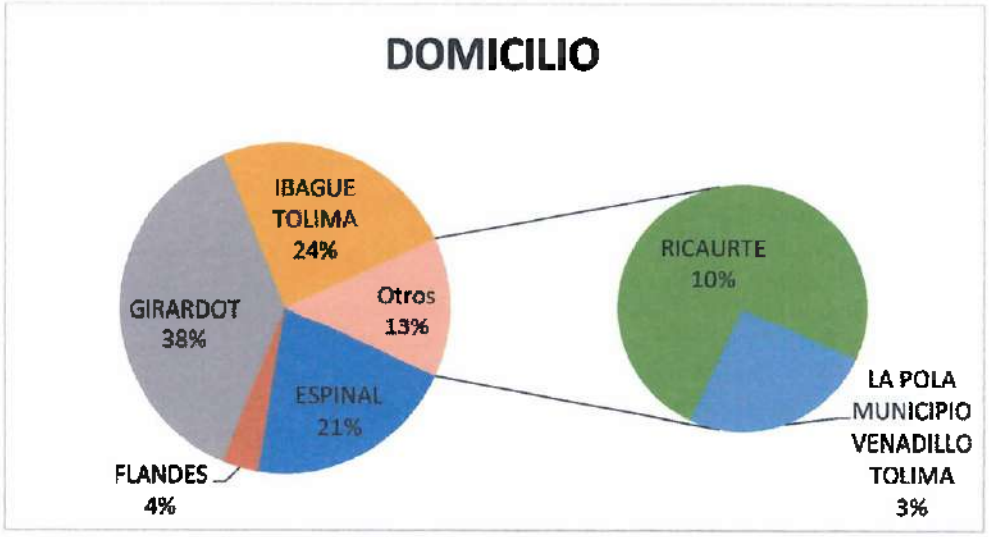

A partir de ello, las mujeres representan el 17,24% del personal del contratista

Domicilio – Enero – Febrero		
Ciudad	Cantidad	%
Ricaurte	5	19,23
Venadillo	1	3,84
Ibagué	5	19,23
Girardot	9	34,61
Flandes	1	3,84
Espinal	5	19,23
Total	26	100

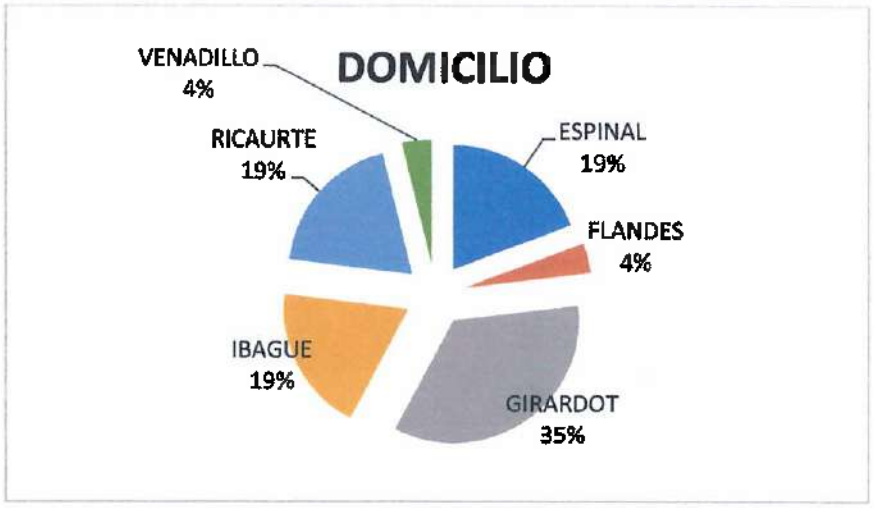


Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

A partir de ello, las mujeres representan el 11,53% del personal del contratista


En cuanto a la cláusula 9 numeral 2

Población con sisben – Octubre – Noviembre		
Ciudad	Cantidad	%
Vulnerable	4	15
Pobreza moderada	7	27
No tiene	7	27
No pobre no vulnerable	2	8
No aplica	6	23
Total	26	100

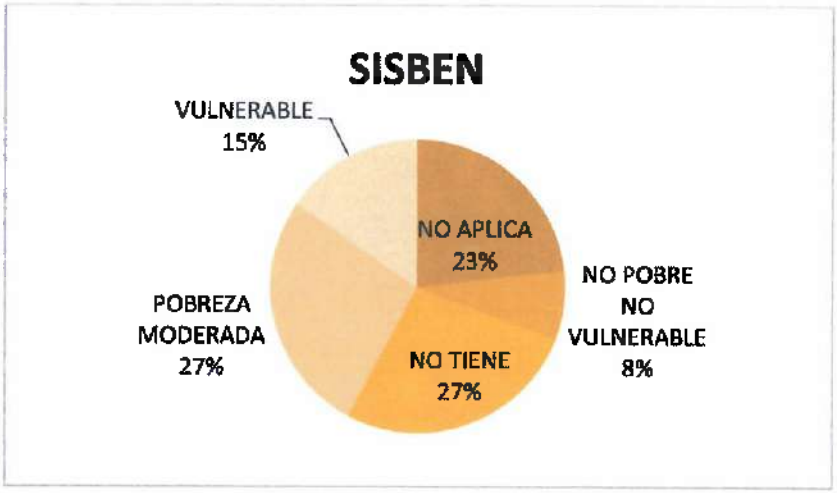


Población con sisben – Noviembre – Diciembre		
Ciudad	Cantidad	%
Vulnerable	4	13
Pobreza moderada	8	26
No tiene	9	29
No pobre no vulnerable	2	6
Pobreza Extrema	1	3
No aplica	7	23
Total	31	100

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

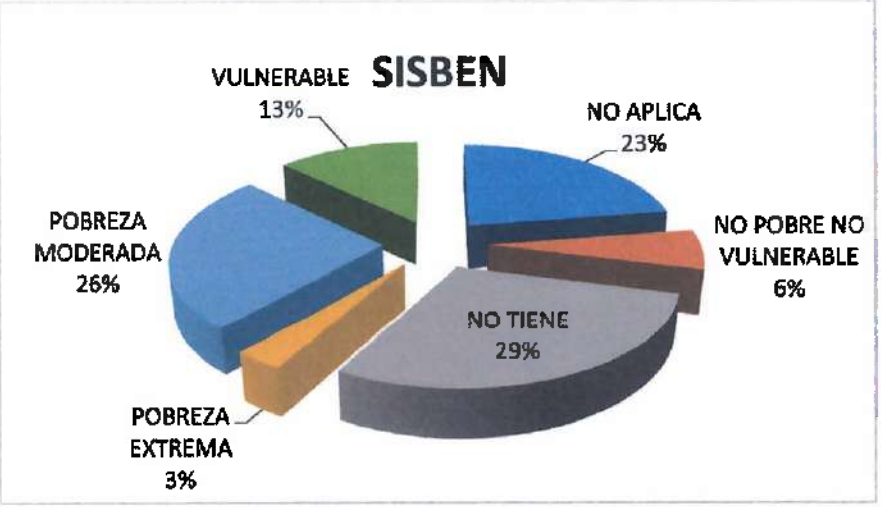

Población con sisben – Diciembre – Enero		
Ciudad	Cantidad	%
Vulnerable	3	10
Pobreza moderada	8	28
No tiene	12	41
No pobre no vulnerable	2	7
Pobreza extrema	1	4
No aplica	3	10
Total	29	100

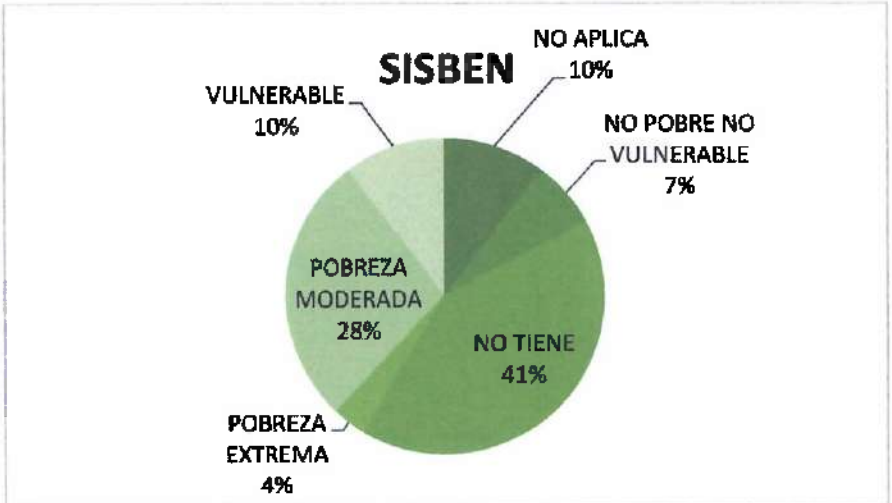

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Administración Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

Población con sisben – Enero – Febrero		
Ciudad	Cantidad	%
Vulnerable	4	15
Pobreza moderada	6	23
No tiene	14	54
No pobre no vulnerable	1	4
No aplica	1	4
Total	26	100



Además de ello, se evidencia que el contratista ha implementado campañas de contratación para personas residentes del municipio de Ricaurte, como se puede evidenciar en el Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3. En estos anexos se detalla la documentación y los registros de las campañas realizadas, incluyendo anuncios en medios locales, jornadas de difusión y reclutamiento en distintas zonas del municipio, así como la colaboración con instituciones locales para promover las vacantes disponibles. A pesar de estos esfuerzos, se constató que los residentes no se interesaron por aplicar a las vacantes ofrecidas.

Este hecho no desvirtúa el compromiso del contratista ni su cumplimiento de la cláusula 9 (numerales 1 y 2), sino que más bien reafirma su esfuerzo y diligencia para cumplir con las obligaciones establecidas, demostrando su disposición para integrar a la comunidad local en la ejecución del contrato. Es importante señalar que, aunque la respuesta de la comunidad no haya sido la esperada, el contratista ha cumplido con su responsabilidad de manera proactiva y transparente, siguiendo las directrices y procedimientos establecidos.

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

A partir de ello, con el presente documento

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO DIAGONAL RC en calidad de contratista de obra del proyecto **"PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA"**, en cumplimiento de las obligaciones generales contenidas en la cláusula 9 numeral 1 y 2 del contrato de obra pública No. 403 de 2023, ha llevado a cabo acercamientos, difusión y adelantado gestión desde el componente social, en pro de garantizar el cumplimiento de las obligaciones mencionadas.

Ante el documento expuesto, esta interventoría informa que el contratista de obra ha dado cabalidad a lo establecido.


En constancia firma, a los veinte (20) días del mes de mayo de 2024.

Cordialmente,

Paola A. Rodriguez A.

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
CC. 28.548.736 de Ibagué- Tol
Representante Legal

Anexo 1. Volante de oferta laboral

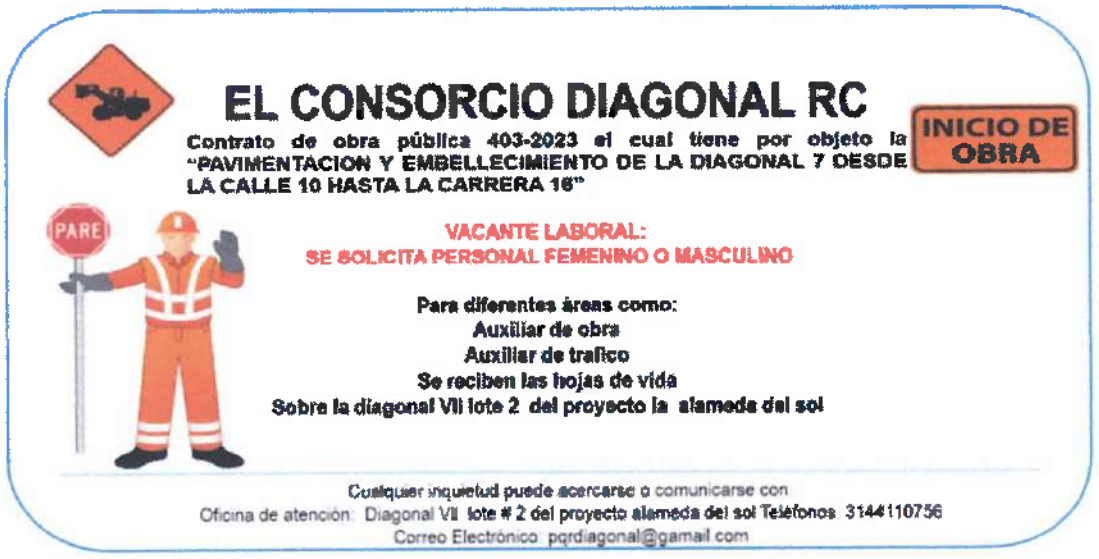

Anexo 2. Volante de oferta laboral ubicado en el supermercado Isímo



Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

Anexo 3. Volante ubicado en poste aledaño a la obra



722
2079

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Gerencia Integral Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 21 de diciembre de 2023

ID7R-045

Ingeniera
DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ
Secretaria de Infraestructura y obras públicas
Alcaldía Municipal de Ricaurte
Cundinamarca
Ciudad

Referencia. **Contrato de Interventoría No. 413 de 2023 – "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Asunto: **APROBACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL MINIMO DEL CONTRATO DE OBRA No. 403 -2023**

Cordial saludo,

Por medio del presente y en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, se informa a la presente supervisión, que de acuerdo a la información remitida por el contratista de obra correspondiente a las hojas de vida del personal profesional mínimo requerido del contrato de obra pública No. 403 de 2023 cuyo objeto es: **"PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Una vez revisada la información suministrada y atendiendo los criterios del personal profesional mínimo requerido (anexo), esta interventoría APRUEBA los profesionales relacionados a continuación:

Item	Cargo / profesión	Nombre del profesional aprobado
1	Director de Obra	Aitor Mirena de Larrauri Echevarria
2	Asesor en Pavimentos	Carlos Andres Nieto Laguna
3	Residente de Obra	Sergio Mauricio Leal Tovar
4	Asesor SISO	Jorge Edwin Faber Sanchez Marroquin
5	Tecnólogo en Topografía	Oscar Rodriguez Vasquez
6	Trabajador Social	Rosa Ines Pulecio Guzman

Anexo. Matriz de cumplimiento del personal mínimo requerido bajo los criterios del pliego de condiciones donde C (Cumple) y NC (No cumple).

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

Anexo. Matriz de cumplimiento del personal mínimo requerido según criterios del pliego de condiciones.

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO										
PERFIL No.	CARGO	DEDICACIÓN MENSUAL	CANTIDAD DE PROFESIONALES	EXPERIENCIA GENERAL	NC	C	EXPERIENCIA ESPECIFICA	NC	C	NOMBRE DEL PROFESIONAL
1	DIRECTOR DE OBRA	20%	1	Mínimo Quince (15) años, contados a partir de la matrícula profesional		✓	Dos (02) contratos como director de obra, cuyo objeto corresponda a construcción o mejoramiento en pavimento asfáltico o concreto hidráulico o placa huella de vías primarias o secundarias o vías terciarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos, la suma de los contratos debe tener un valor igual o mayor al 100% del presupuesto oficial.		✓	AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRIA
2	ASESOR EN PAVIMENTOS	30%	1	Mínimo diez (10) años, contados a partir de la matrícula profesional		✓	Dos (02) contratos como asesor en diseño de pavimentos y/o a fines, cuyo objeto corresponda a construcción o mejoramiento en pavimento asfáltico o concreto hidráulico o placa huella de vías primarias o secundarias o vías terciarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos, la suma de los contratos debe tener un valor igual o mayor al 100% del presupuesto oficial.		✓	CARLOS ANDRES NIETO LAGUNA
3	RESIDENTE DE OBRA	100%	1	Mínimo diez (10) años, contados a partir de la matrícula profesional		✓	Dos (02) contratos como residente de obra y/o coordinador de obra, cuyo objeto corresponda a construcción o mejoramiento en pavimento asfáltico o concreto hidráulico o placa huella de vías primarias o secundarias o vías terciarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos, la suma de los contratos debe tener un valor igual o mayor al 100% del presupuesto oficial.		✓	SERGIO MAURICIO LEAL TOVAR

4	ASESOR SISO	100%	1	Mínimo cinco (05) años. Contados a partir de la matrícula profesional y/o licencia y/o resolución profesional		✓	Dos (02) contratos como asesor SISO, cuyo objeto corresponda a construcción o mejoramiento en pavimento asfáltico o concreto hidráulico o placa huella de vías primarias o secundarias o vías terciarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos, la suma de los contratos debe tener un valor igual o mayor al 100% del presupuesto oficial.		✓	JORGE EDWIN FABIER SANCHEZ MARROQUIN
5	TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA	50%	1	Mínimo cinco (05) años. Contados a partir de la matrícula profesional y/o licencia y/o resolución profesional		✓	Dos (02) contratos como Tecnólogo en Topografía, cuyo objeto corresponda a construcción o mejoramiento en pavimento asfáltico o concreto hidráulico o placa huella de vías primarias o secundarias o vías terciarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos, la suma de los contratos debe tener un valor igual o mayor al 100% del presupuesto oficial.		✓	OSCAR RODRIGUEZ VASQUEZ
6	TRABAJADOR SOCIAL	50%	1	Mínimo cinco (05) años. Contados a partir de la matrícula profesional		✓	Un (01) contrato como trabajador social, cuyo objeto corresponda a construcción o mejoramiento en pavimento asfáltico o concreto hidráulico o placa huella de vías primarias o secundarias o vías terciarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos, la suma de los contratos debe tener un valor igual o mayor al 100% del presupuesto oficial.		✓	ROSA INES PULECIO GUZMÁN

Paola A. Rodríguez A.

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

124
2081

2082

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ

CERTIFICA QUE:

El **CONSORCIO DIAGONAL RC** en calidad de contratista de obra del proyecto **PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA,** en cumplimiento del factor de calidad – 7B disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra, dispuso maquinaria de obra con una antigüedad a veinte (20) años según su función.

Esta interventoría avala la maquinaria de obra empleada por el **CONSORCIO DIAGONAL RC,** ante la información suministrada por el contratista de obra que reposa en el expediente del contrato de obra pública No. 403-2023 y se adjunta verificación.

La presente se expide a los ocho (08) días del mes de mayo de 2024.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
CC. 28.548.736 de Ibagué- Tol
Representante Legal

Cr 5 #11-24 Of.802 Edificio Torre Empresarial (608) 260-7436 - 3123265921
diagonalseptima.interventoria@gmail.com

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO							
ITEM	EQUIPO	CANTIDAD	FACTOR DE CALIDAD	NC	C	DESCRIPCION	OBSERVACIÓN
1	RETRO DE ORUGA	1	DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA Utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años - Formato 7B		✓	EXCAVADORA KOBELCO MODELO 2006 No. de serie YC60M4110	Ficha técnica de la maquina, tarjeta de propiedad, formato de revisión de vehiculos y maquinaria.
2	VOLQUETAS DE CAPACIDAD MINIMA DE 7M3	2	DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA Utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años - Formato 7B		✓	VOLQUETA 1 INTERNATIONAL MODELO 2006 PLACA: INF160 VOLQUETA 2 INTERNATIONAL MODELO 2013 PLACA: TGN 274	Se anexa tarjeta de propiedad y documentos legales vigentes.
3	VIBRADOR DE CONCRETO	1	DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA Utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años - Formato 7B		✓	VIBRADOR ELECTRICO MARCA BOSCH CON MANGUERA DE 14 PIES	Anexa factura de compra en el año 2007
4	MEZCLADOR DE CONCRETO CAPACIDAD MINIMA DE 1 BULTO	2	DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA Utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años - Formato 7B		✓	MEZCLADORA DIESEL MOTOR	Anexa factura de compra
5	MOTONIVELADORA	1	DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA Utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años - Formato 7B		✓	MOTONIVELADORA DRESSER MODELO 2012	Se anexa tarjeta de propiedad y manifiesto de importación.
6	VIBRO COMPACTADOR	1	DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA Utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años - Formato 7B		✓	VIBRO COMPACTADOR INGERSOLL RAND MODELO DD28HF AÑO 2006	Se anexa manifiesto de importación y tarjeta de propiedad
7	CARROTANQUE	1	DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA Utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años - Formato 7B		✓	CARROTANQUE INTERNATIONAL MODELO 2012 PLACA: SWW 256	Se anexa tarjeta de propiedad y documentos legales vigentes.

2094

648
Recibido
22/12/2023
2:47pm

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Gerencia de Proyectos de Infraestructura
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

Ricaurte, 21 de diciembre de 2023

Ingeniera
DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ
Secretaria de Infraestructura y obras públicas
Alcaldía Municipal de Ricaurte
Cundinamarca
Ciudad

ID7R-046

Referencia. **Contrato de Interventoría No. 413 de 2023 – "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Asunto: **ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN INICIAL E INFORMES MENSUALES DE OBRA**

Cordial saludo,
Por medio del presente y en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, esta interventoría hace entrega de:

1. Informe Mensual de Obra No. 01 correspondiente al periodo del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2023 con sus respectivos anexos
2. Informe Mensual de Obra No. 02 correspondiente al periodo del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2023 con sus respectivos anexos
3. Hojas de vida del personal profesional requerido correspondiente al anexo técnico No. 01
4. Presupuesto inicial de obra
5. Análisis de precios unitarios (APU's)
6. Cronograma de obra
7. Factor de calidad con sus respectivos anexos
   - Presentación e implementación del programa de gerencia de proyectos
   - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra
   - Plan de calidad
8. Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) y seguimiento correspondiente al 17 de octubre al 16 de diciembre de 2023.

Lo anterior, de acuerdo a la información remitida el día 20 de diciembre de 2023 a través del oficio CDRC7-2023-020 por el contratista del contrato de obra pública No. 403 de 2023 cuyo objeto es: **"PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA".**

Finalmente, esta interventoría aclara que la información remitida había sido requerida al contratista de obra en reiteradas ocasiones bajo la trazabilidad de los oficios ID7R-002, ID7R-011, ID7R-020, ID7R-031 y ID7R-040, una vez entregada y revisada la información remitida es avalada por la presente interventoría.

Se anexa cuadro de criterios de cumplimiento factor de calidad y maquinaria mínima requerida.

Cordialmente,

Paola A. Rodríguez A.

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ

Cr 5 #11-24 Of 802 Edificio Torre Empresarial (608) 260-7436 - 3123065921
diagonalseptima.interventoria@gmail.com

FACTOR DE CALIDAD							
ITEM	CONCEPTO	FORMATO	DESCRIPCIÓN	NC	C	OBSERVACIÓN	DETALLE
1	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS	FORMATO 7A	El adjudicatario deberá instaurar el programa de gerencia de proyectos y contar con un profesional de tiempo completo en las áreas de ingeniería o arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones A. OPCIÓN 1: Profesional con certificado o credencial PMP, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.		✓	El contratista de obra CONSORCIO DIAGONAL RC, anexa programa de gerencia de proyectos y hoja de vida del profesional en gerencia de proyectos con certificación de de experiencia y carta de argumento técnico en relación al certificado o credencial PMP	JUAN PABLO ÁVILA SÁNCHEZ INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS TP: 25202-307724 CND
2	DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA	FORMATO 7B	Se compromete a utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a (20) años y en caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los viente (20) años cuentan desde la fecha de repotencia de la máquina		✓	Pendiente el cumplimiento de la maquinaria mínima requerida para el proyecto con la aplicación del formato 7B.	
3	PRESENTACIÓN DE PLAN DE CALIDAD	FORMATO 7C	Se compromete a presentar un plan de calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018		✓	El contratista de obra CONSORCIO DIAGONAL RC anexa en su programa de gerencia de proyectos, PLAN DE CALIDAD, el cual será implementado en el desarrollo del proyecto.	

2083
619

FACTOR DE CALIDAD

CONCEPTO	FORMATO	DESCRIPCIÓN	NC	C	OBSERVACIÓN	DETALLE
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS	FORMATO 7A	El adjudicatorio deberá instaurar el programa de gerencia de proyectos y contar con un profesional de tiempo completo en las áreas de ingeniería o arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones A. OPCIÓN 1: Profesional con certificado o credencial PMP, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.		✓	El contratista de obra CONSORCIO DIAGONAL RC, anexa programa de gerencia de proyectos y hoja de vida del profesional en gerencia de proyectos con certificación de de experiencia y carta de argumento técnico en relación al certificado o credencial PMP	ALVARO ANGEL BALLESTAS ROBINSON INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VÍAS TP: 13202-125620
DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA	FORMATO 7B	Se compromete a utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a (20) años y en caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los viente (20) años cuentan desde la fecha de repotencia de la máquina		✓	Pendiente el cumplimiento de la maquinaria mínima requerida para el proyecto con la aplicación del formato 7B.	
PRESENTACIÓN DE PLAN DE CALIDAD	FORMATO 7C	Se compromete a presentar un plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018		✓	El contratista de obra CONSORCIO DIAGONAL RC anexa en su programa de gerencia de proyectos, PLAN DE CALIDAD, el cual será implementado en el desarrollo del proyecto.	

MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO							
ITEM	EQUIPO	CANTIDAD	FACTOR DE CALIDAD	NC	C	DESCRIPCION	OBSERVACIÓN
1	RETRO DE ORUGA	1	DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA Utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años - Formato 7B		✓	EXCAVADORA KOBELCO MODELO 2008 No. de serie YD09U4116	Ficha técnica de la maquina, tarjeta de propiedad, formato de revisión de vehículos y maquinaria.
2	VOLQUETAS DE CAPACIDAD MINIMA DE 7M3	2	DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA Utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años - Formato 7B		✓	VOLQUETA 1 INTERNATIONAL MODELO 2006 PLACA: INI160 VOLQUETA 2 INTERNATIONAL MODELO 2013 PLACA: TGN 274	Se anexa tarjeta de propiedad y documentos legales vigentes.
3	VIBRADOR DE CONCRETO	1	DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA Utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años - Formato 7B		✓	VIBRADOR ELECTRICO MARCA BOSCH CON MANGUERA DE 14 PIES	Anexa factura de compra en el año 2007

67
2CB

4	MEZCLADOR DE CONCRETO CAPACIDAD MINIMA DE 1 BULTO	2	DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA Utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años - Formato 7B		✓	MEZCLADORA DIESEL MOTOR	Anexa factura de compra
5	MOTONIVELADORA	1	DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA Utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años - Formato 7B	X		MOTONIVELADORA A450 E MODELO 1988	EL CONTRATISTA DE OBRA SE COMPROMETE ALLEGAR LOS DOCUMENTOS DE LA MOTONIVELADORA EN EL MOMENTO QUE INICIEN ACTIVIDADES EN RELACIÓN A LA MAQUINARIA
6	VIBRO COMPACTADOR	1	DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA Utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años - Formato 7B		✓	VIBRO COMPACTADOR INGERSOLL RAND MODELO DD28HF AÑO 2006	Se anexa manifiesto de importación y tarjeta de propiedad
7	CARROTANQUE	1	DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA Utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años - Formato 7B		✓	CARROTANQUE INTERNATIONAL MODELO 2012 PLACA: SWW 256	Se anexa tarjeta de propiedad y documentos legales vigentes.

2588 2.5.9

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ

CERTIFICA QUE:

El **CONSORCIO DIAGONAL RC** en calidad de contratista de obra del proyecto **PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA,** dio a conocer los documentos y/o licencias ambientales de las fuentes que suministran materiales de construcción y disposición de RCD, información que reposa durante los periodos de informes en los anexos del componente ambiental y calidad del PGIO del contrato de obra No. 403 de 2023.

Por lo anterior, esta interventoría informa que las fuentes de materiales y disposición de RCD avaladas son:

- **Empresa SAP AGREGADOS**
- **Empresa TRITURADOS DEL TOLIMA**
- Cantera **CALIFORNIA**
- **Empresa NAUTILA SAS**

Así mismo, informamos que esta interventoría también avaló la disposición de RCD, la escombrera SAN THOMAS bajo resolución 2256 del 06 de septiembre de 2013 por CORTOLIMA, presentada durante el periodo del 17 de octubre de 2023 al 16 de enero de 2024.

Los documentos de permisos y/o licencias ambientales reposan en el expediente del contrato de obra.

La presente se expide a los diecisiete (17) días del mes de mayo de 2024.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
CC. 28.548.736 de Ibagué- Tol
Representante Legal

2090

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ

CERTIFICA QUE:

Desde el área de seguridad y salud en el trabajo de esta interventoría se ha realizado revisión, verificación y aprobación de los informes de seguridad y salud en el trabajo del contrato de obra No. 403-2023 cuyo objeto es **"PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA."**

Durante los periodos de informes presentados por el CONSORCIO DIAGONAL RC, se ha llevado a cabo revisión, verificación de compromisos y atención de observaciones, siendo avalados por nuestra profesional del área.

La presente se expide a los veinte (20) días del mes de mayo de 2024.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
CC. 28.548.736 de Ibagué- Tol
Representante Legal

Cr 5 #11-24 Of 802 Edificio Torre Empresarial (608) 260-7496 - 3123065921
diagonalseptima.interventoria@gmail.com

Paola Rodríguez Alcalá
Tecnóloga Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ

CERTIFICA QUE:

El **CONSORCIO DIAGONAL RC** en calidad de contratista de obra del proyecto **PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA,** dando cumplimiento a la obligación contractual contenida en la cláusula 10 numeral 15 del contrato de obra pública No. 403 de 2024, ha suministrado contratos de vinculación del personal empleado en obra en el área administrativa y operativa, como también, soporte de pago de nómina.

Dicha información ha sido verificada por el componente de seguridad y salud en el trabajo de esta interventoría.

Los soportes documentales del personal reposan en el expediente del contrato de obra.

La presente se expide a los veinte (20) días del mes de mayo de 2024.

Cordialmente,

Paola A. Rodriguez A.

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
CC. 28.548.736 de Ibagué- Tol
Representante Legal

Paola Rodriguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ

CERTIFICA QUE:

El **CONSORCIO DIAGONAL RC** en calidad de contratista de obra del proyecto **PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA,** realizó entrega de dotación al personal de obra vinculado al proyecto durante los días 15 y 16 de abril de 2024, dando cumplimiento a la cláusula 10 obligaciones especificas del contratista, numeral 16 *"el contratista deberá uniformar con dotación identificable a todos y cada uno de los trabajadores que participe en la obra y durante todo el tiempo de ejecución de esta".*





La presente se expide a los catorce (14) días del mes de mayo de 2024.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
CC. 28.548.736 de Ibagué- Tol
Representante Legal

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Interventoría Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ

CERTIFICA QUE:

El **CONSORCIO DIAGONAL RC** en calidad de contratista de obra del proyecto **PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA**, dando cumplimiento a la obligación contractual contenida en la cláusula 10 numeral 17 del contrato de obra pública No. 403 de 2024, desde el componente de seguridad y salud en el trabajo, lleva a cabo control del personal vinculado al proyecto, a través de los siguientes documentos:

- Base de datos del personal vinculado administrativo y operativo
- Certificación de afiliación a EPS, ARL
- Certificado de exámenes médicos ocupacionales.

La presente se expide a los veinte (20) días del mes de mayo de 2024.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
CC. 28.548.736 de Ibagué- Tol
Representante Legal

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Estructuras y Vías y en Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA DIAGONAL SEPTIMA

	INFORME 1					INFORME 2		
	17-oct.-23	23-oct.-23	30-oct.-23	6-nov.-23	13-nov.-23	20-nov.-23	27-nov.-23	4-dic.-23
	22-oct.-23	29-oct.-23	5-nov.-23	12-nov.-23	19-nov.-23	26-nov.-23	3-dic.-23	10-dic.-23
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD								
COMPONENTE TÉCNICO - ADMINISTRATIVO								
Elaboración de Informes semanales	X	X	X	X	X	X	X	X
Elaboración y entrega de Informe Mensual Técnico					INFORME			
Inspección de actividades de obra y verificación de medidas según diseños	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento técnico, financiero, administrativo	X	X	X	X	X	X	X	X
Disposición y acompañamiento para realizar comités técnicos	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPONENTE SST								
Elaboración y entrega de Informe Mensual SST					INFORME			
Inspección de señalización del proyecto	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificación de soportes de seguridad social y afiliaciones	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento de seguridad y salud en el trabajo	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPONENTE SOCIAL								
Elaboración y entrega de Informe Mensual Social					INFORME			
Brindar atención a la comunidad de influencia	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompañamiento y seguimiento al plan de gestión social	X	X	X	X	X	X	X	X

Paola A. Rodriguez A.

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
Representante Legal

2694

	INFORME 3				INFORME 4						
11-dic.-23	18-dic.-23	25-dic.-23	1-ene.-24	8-ene.-24	15-ene.-24	22-ene.-24	29-ene.-24	5-feb.-24	12-feb.-24	19-feb.-24	26-f
17-dic.-23	24-dic.-23	31-dic.-23	7-ene.-24	14-ene.-24	21-ene.-24	28-ene.-24	4-feb.-24	11-feb.-24	18-feb.-24	25-feb.-24	3-m
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INFORME				INFORME					INFORME		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INFORME				INFORME					INFORME		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INFORME				INFORME					INFORME		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

IRME 5			INFORME 6				INFORME 7				
eb.-	4-mar.-24	11-mar.-24	18-mar.-24	25-mar.-24	1-abr.-24	8-abr.-24	15-abr.-24	22-abr.-24	29-abr.-24	6-may.-24	12-may.-24
ar.-	10-mar.-24	17-mar.-24	24-mar.-24	31-mar.-24	7-abr.-24	14-abr.-24	21-abr.-24	28-abr.-24	5-may.-24	11-may.-24	16-may.-24
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		INFORME				INFORME					INFORME
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
											INFORME
		INFORME				INFORME					
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
											INFORME
		INFORME				INFORME					
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2095

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento del puntaje de **INDUSTRIA NACIONAL** para la ejecución del **Contrato de Interventoría No. 413 de 2023 – "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA,** cuenta con el 100% de empleados y contratistas por prestación de servicios colombianos, de conformidad con el tercer inciso del artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1085 de 2015.

La presente se expide a los ocho (08) días del mes de mayo de 2024.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
CC. 28.548.736 de Ibagué- Tol
Representante Legal

Paola Rodríguez Alcalá
Ingeniera Civil
Especialista en Infraestructura Vial y de Transporte
Universidad de los Andes

INTERVENTORÍA
DIAGONAL SEPTIMA

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ

CERTIFICA QUE:

El proyecto **PAVIMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA,** se encuentra libre de residuos sólidos y RCD en los sitios aledaños de la obra, teniendo en cuenta que, el **CONSORCIO DIAGONAL RC** en calidad de contratista de obra, garantiza la correcta disposición y recolección de residuos, a través de las siguientes actividades:

- Jornadas de limpieza dentro y fuera de la obra
- Puntos ecológicos dentro del campamento de la obra como en las áreas de intervención
- Recolección y acopio de residuos peligros (sacos de cemento)
- Recolección, acopio y disposición final de RCD

La presente se expide a los ocho (08) días del mes de mayo de 2024.

Cordialmente,

Paola A. Rodriguez A.

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
CC. 28.548.736 de Ibagué- Tol
Representante Legal
