I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	
OBJETO DEL INFORME	Informe de supervisión N° 3 CONVENIO 23001315 H3 DE 2023
NOMBRE DEL PROYECTO	Mantenimiento lado aire aeródromo municipio de LA PRIMAVERA VICHADA
FECHA DEL INFORME	01 de ABRIL de 2024 al 30 de ABRIL de 2024
PERSONAL QUE ADELANTA EL INFORME - SUPERVISOR	**Mayor. PUERTA TORRES HADINSON** **Supervisor Convenio Interadministrativo** 23001315 H3 DE 2023
II. DATOS GENERALES DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
CONVENIO O CONTRATO N°	Convenio Interadministrativo 23001315 H3 DE 2023
INTERVINIENTES	Unidad administrativa especial de aeronáutica civil AEROCIVIL Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional Comando de Ingenieros COING Central administrativa y contable especializada de Ingenieros CENAC Batallón de Ingenieros de Combate N° 28 "CR. ARYRO HERRERA CASTAÑO "
OBJETO DEL CONVENIO	"Anuar esfuerzos técnicos administrativos y financieros entre el AEROCIVIL y Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional- CENAC de Ingenieros a través del COING y sus unidades designadas, para mejoramiento de infraestructura lado aire de aeródromos priorizados por AEROCIVIL.
CANTIDAD A EJECUTAR	1. CONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DE: Pista: 1500m x 23m 2. CONSTRUCCIÓN OBRAS DE DRENAJE DE LA PISTA Y LA PLATAFORMA. Construcción de zanjas de infiltración toda la parte lateral de la pista y calle de rodaje, canales de recolección de aguas superficiales en la parte perimetral de la plataforma. 3. CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AERÓDROMO El cerramiento contará con una altura de 2,4m y estará formado por una rejilla metálica galvanizada y plastificada de 50x50 mm. Sobre el vallado se colocará el alambre de espino galvanizado para garantizar la no intrusión de personal no autorizado a las


Powered by CamScanner


	instalaciones aeroportuarias. Los postes de sujeción del cerramiento, que serán también de acero galvanizado de un diámetro de 60mm, se situarán cada 3m. 4. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN HORIZONTAL DE LA PISTA PLATAFORMA Y CALLE DE RODAJES a. Pista: ▪ Umbral ▪ Eje de vía ▪ Fajas de umbral ▪ Señal punto de visada ▪ Señal de zona de toma de contacto ▪ Señal de zona de faja lateral de pista b. Calle de rodaje: ▪ Eje de calle de rodaje ▪ Señal mejorada de calle de rodaje ▪ Señal de borde de calle de rodaje ▪ Señal de plataforma de viraje en la pista ▪ Señal de punto de espera en pista ▪ Señal con instrucciones obligatorias ▪ Señal de información c. Plataforma de aeronaves ▪ Señales de puestos de estacionamiento de aeronaves ▪ Líneas de seguridad en planta 5. CONSTRUCCIÓN FRANJA DE PISTA: Para la franja de seguridad longitudinal que se extenderá antes del umbral y más allá del extremo de la pista o de la zona de parada hasta una distancia mayor a 60 metros en material de Afirmado.
UNIDAD EJECUTORA	Batallón de Ingenieros de Combate N° 28"CR. ARTURO HERRA CASTAÑO "
POBLACION BENEFICIADA	La principal población beneficiada es la comunidad que habita la región de la primavera, santa Rosalía con una población aproximada de 7900 habitantes (cifras proyectadas por el DANE dic 2023).
FECHA DE SUSCRIPCION	15 de diciembre del 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 17.621.001.061,00 millones de pesos**

Powered by CamScanner

FECHA DE ACTA DE INICIO	28 de Diciembre del 2023
FECHA DE ENTREGA	31 de enero del 2025.
MODIFICATORIOS	Ninguno

III. UBICACIÓN DEL PROYECTO

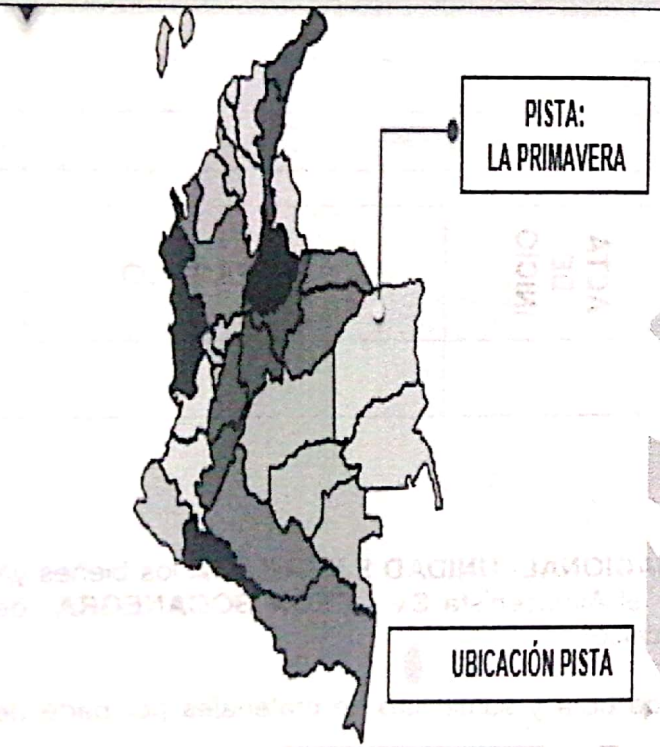

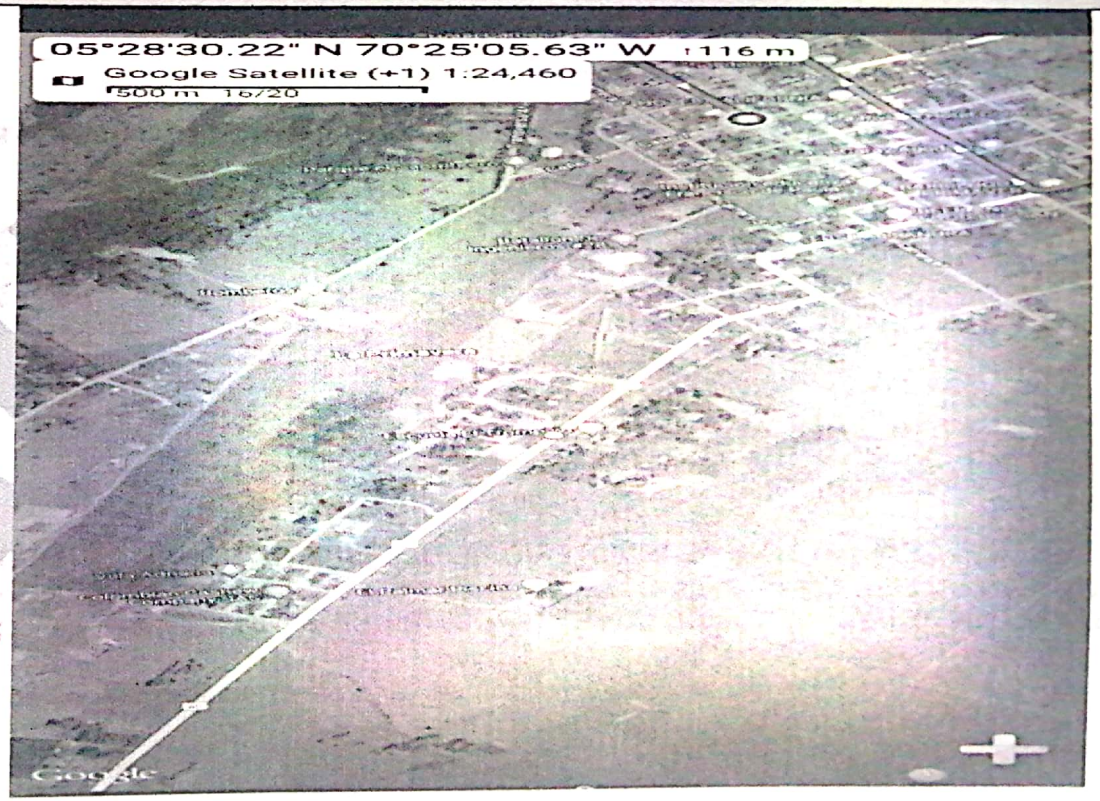

IV. INFORMACION JURIDICA

Powered by CamScanner

1. Se suscribió el convenio Interadministrativo 23001315 H3 DE 2023 el 15 de Diciembre del 2023 por parte de la AEROCIVIL y el CENAC de Ingenieros.
2. Por parte de la AEROCIVIL se tiene pendiente realizar las socializaciones pertinentes con las comunidades beneficiaras y culminar las gestiones prediales que se tienen pendientes en relación a los predios aledaños al proyecto que se verán afectados más adelante en la ejecución del mismo.

1. RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS

V. INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR OBRA, SUMINISTRO O BIEN	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	POLIZA	APRO B. POLIZA	ACTA DE INICIO	PAGADO

2. MATERIAL RECIBIDO

A continuación, se relacionan **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- UNIDAD EJECUTORA** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista **SV CERON BOCANEGRA** del **BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE N°28 (BIAHE 28)** de acuerdo al concepto técnico:

- De acuerdo a los planes de intervención se tiene previsto iniciar las actividades de obra y suministro de materiales por parte del operador logistico de las AEORCIVIL el 1 mayo 2024.

3. DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23001315 H3 DE 2023

A la fecha se ha cancelado lo siguiente:

Powered by CamScanner

DESEMBOLSOS EFECTUADOS	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No.1:	Demerito y desgaste	Enero 2024	$ 1.321.575.079,58
TOTAL			$ 1.321.575.079,58

4. BALANCE CONTRACTUAL

	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO
PLAN DE COMPRAS	$0	$ 0
VALOR DEMERITO	$ 1.321.575.079,58	$ 0
TOTAL	$ 1.321.575.079,58	$ 0

VI. INFORMACIÓN TECNICA

- Se continua la realización del plan de necesidades para el traslado de maquinaria, plan de traslado de personal y el plan para la ejecución de la obra.
- Está pendiente las actividades de movimiento de maquinaria hasta el mes de junio siempre y cuando ENTERRITORIO contrate los insumos necesarios.
- Está pendiente las memorias de cálculo y los planes de necesidades basados en los nuevos diseños generados por el consorcio ASIS contratado por las AEROCIVIL.


- Se presentan las recomendaciones y sugerencias para mejorar la ejecución de la obra, como:
  1. El ingreso del material se de debe hacer antes de que comience la época de lluvia. con el fin de evitar contra tiempos en la ejecución del proyecto

AVANCE LINEA DE TIEMPO ACTIVIDADES PRELIMINARES DE TOPOGRAFÍA

OMITIDO

LINEA DE TIEMPO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23001315 H3 DE 2023

Powered by CamScanner

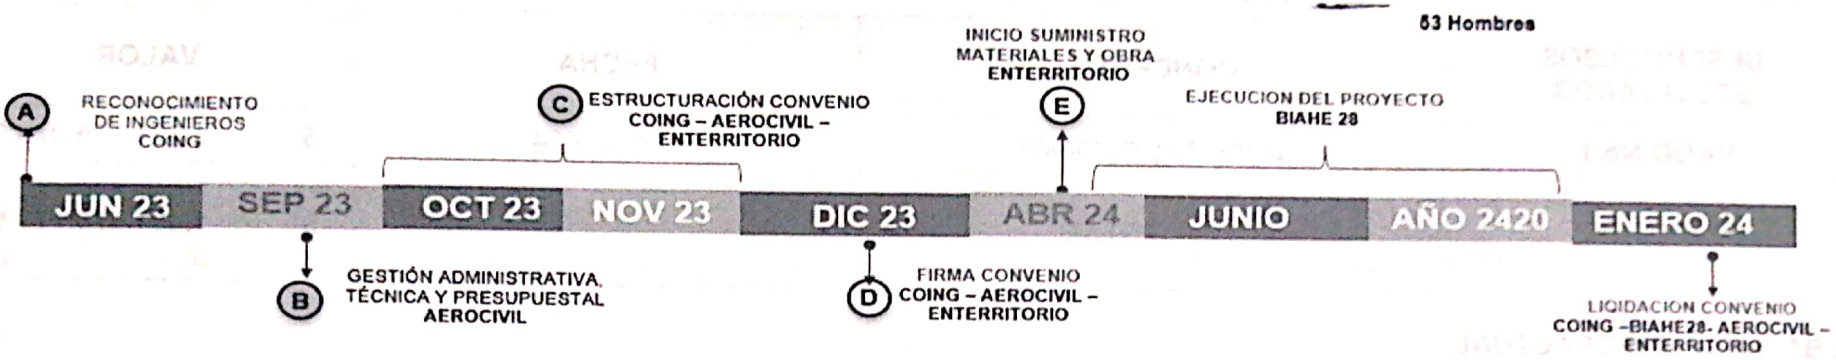

PROYECTO CONVENIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23001315 H3 DE 2023

Presupuesto: $ 17.621.001.061,00 **millones de pesos**
Programado General: 0%

Ejecutado General: 0%
Atraso o avance general: 0%

- Todas las actividades anteriormente mencionadas serán sujetas a cambios dentro del alcance del proyecto donde se pueda proyectar el recurso de la primera fase del convenio INTERADMINISTRATIVO 23001315 H3 DE 2023.
- Se encuentran en el planeamiento respectivo para la gestión del movimiento del equipo de combate de ingenieros y la construcción del campamento.
- Por parte de ENTERRITORIO se está adelantando la contratación derivada relacionada para suplir las necesidades de combustibles, repuestos, grasas y lubricantes, materiales de construcción y suministros pétreos.

Powered by CamScanner

VII. EVIDENCIAS VISUALES

RESEÑA FOTOGRÁFICA	DESCRIPCIÓN
	El Aeródromo Jorge Julián Silva se encuentra ubicado al costado suroccidental del casco urbano del municipio de La Primavera, en el departamento del Vichada, localizado sobre la margen derecha del río Meta, aproximadamente a 390 Km al sur occidente de Puerto Carreño, capital departamental. La región se caracteriza por una variedad paisajística lo cual permite realizar turismo dadas las condiciones ecológicas, la cercanía del río Meta, lagunas, reservas forestales e indígenas.

VIII. INFORMACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

- Se finalizó con la actividad de campo en relación a la visita técnica donde la población civil se evidenció predispuesta y conforme con la ejecución del proyecto y la intervención del Ejército Nacional en ello. Teniendo en cuenta la riqueza y diversidad paisajística, de flora y fauna nativa, el municipio no tiene una vocación turística ni planes de inversión para fortalecer o crear senderos ecoturísticos o demás atracciones que incentiven la inversión y la llegada de turistas.

IX. INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

- El aeródromo LA PRIMAVERA cuenta con una terminal aérea en deplorable estado , en los contornos no hay conexión del acueducto, los campamentos existentes para los trabajos de recuperación de la zona llevan el agua desde el casco urbano.

- Se encuentra pendiente que la AEROCIVIL realice gestiones a través de su operador logístico para la ejecución de tramites de permisos ambientales, de aprovechamiento forestal, de ocupación de causes, captación de aguas superficiales y vertimiento de aguas residuales.

X. INFORMACIÓN SALUD OCUPACIONAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL

Powered by CamScanner

CAPACITACIONES REALIZADAS				
ACTA N°	FECHA	TEMA	CANTIDAD PERSONAL CAPACITADO	OBSERVACIONES

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
ELEMENTO ENTREGADO	FECHA	CANTIDAD	PERSONAL QUE RECIBE EPP	TIPO (PRIMERA VEZ O REPOSICIÓN)	OBSERVACIONES
Pendiente la entrega por parte del convenio interadministrativo 23001315 h3 de 2023 y el coordinador logístico ENTERRITORIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO					
FECHA	TIPO (ACCIDENTE O INCIDENTE)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PERSONAL AFECTADO	MEDIDA CORRECTIVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OTRAS ACTIVIDADES: N/A

XI. CONSIDERACIONES ESPECIALES

- Se está a la espera de la entrega del alcance del proyecto por parte de la AEROCIVIL
- Tanto personal como equipo se encuentra ya en el punto del proyecto

XII. CONCLUSIONES

- Se dará inicio a la fase constructiva una vez se realicen el suministro de insumos y materiales por parte ENTERRITORIO.
- Se desplazará el personal y la maquinaria al lugar de ejecución una vez se ejecuten los contratos por parte de la AEROCIVIL.

XIII. RECOMENDACIONES

Powered by CamScanner

- Se recomienda por parte del COING oficiar a ENTERRITORIO para recibir una respuesta formal como van los procesos de contratación de las interventorías, laboratorio de suelos, combustibles, grasas, repuestos, lubricantes, materiales de ferretería, suministros pétreos.
- Ingreso de material y maquinaria antes de la época invernal

SV CERON BOCANERA RAUL
Residente Convenio Interadministrativo **23001315 H3 DE 2023**

Teniente. CABRERA BENAVIDES JORGE
JEFE SECCION TECNICA BIAHE 28

Mayor. PUERTA TORRES HADINSON ESTEVEN
Comandante del Batallón de Ingenieros de Combate N° 28 "CR. ARTURO HERRERA CASTAÑO" (E)
Supervisor Convenio Interadministrativo **23001315 H3 de 2023**

BIAHE 28

Powered by CamScanner
