	INFORME	CODIGO:	
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE	VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE CONTRATISTAS PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION	PAGINA	Página: 1 de 6

INFORME DE ACTIVIDADES

Tipo de Informe:	Final	X	Parcial		Pago No: FINAL Y UNICO

Número del contrato: No. SVIV-010 (CO1.PCCNTR.5990673)	**Fecha del contrato:** DEL22 DE FEBRERO DEL 2024	**Fecha de Iniciación:** 23 DE FEBRERO DEL 2024	**Fecha de Terminación:** 07 DE MAYO DEL 2024
Nombre del Contratista: GEOVANNY ORTIZ PÉREZ		**Identificación del Contratista:** 88.282.468	
OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CARRETEBLES EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO Y AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER			
Nombre del Supervisor: **ING. LICED ARENAS MEJIA (DESDE EL INICIO HASTA EL DÍA 18/05/2024)** **ING. CARMEN CHONA LEON (19/058/2024 HASTA EL 07 DE MAYO DE 2024)**	**Cargo del Supervisor:** PROFESIONAL AREA DE VIAS PROFESIONAL AREA DE INFRAESTRUCTURA	**Dependencia:** AREA DE VIAS AREA DE IFRAESTRUCTURA	
Estado actual del desarrollo del contrato (Porcentaje de ejecución): 100.0%			
VALOR A PAGAR: $58.499.350 Cuenta Corriente No.318-893101-01 BANCOLOMBIA			

Obligaciones / Productos programados (según contrato, cronograma y/o asignaciones)	ACTIVIDADES / PRODUCTOS DESARROLLADOS FRENTE A LO PROGRAMADO DEL 23 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DEL 2024
1) Cumplir con el objeto contractual.	En desarrollo del contrato No. SVIV-010 (CO1.PCCNTR.5990673), el contratista de obra realizó las diferentes actividades estipuladas en el objeto del contrato; tendientes a realizar el mantenimiento y adecuación de los carreteables en los corregimientos de Buenavista, Pueblo Nuevo y Agua de la Virgen a través de Conformación de la calzada existente (perfilado y cuneteo), adición de material para el mejoramiento de la subrasante y el transporte requeridos de la maquinara a los sitios intervenidos.
2) Hacer los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales).	El contratista de obra presenta las planillas de pago correspondientes a la seguridad social y aportes parafiscales de los operarios de la motoniveladora y retroexcavadora tipo pajarita, ajustados a los tiempos de trabajo dentro del contrato. Se presenta las planillas Aportes en Línea No. 9466878408, 9466965556 y 9466878484
3) El Contratista se Obliga a asumir todos los gastos que genere el presente Contrato.	En desarrollo del cumplimiento del objeto de contrato el contratista asumió todos los costos requeridos en la ejecución de las diferentes actividades, tales como; Transportes, pago de operarios, pagos de seguridad social y aportes, combustibles, lubricantes, mantenimientos de la maquinaria y todos los necesarios para la ejecución del mantenimiento y adecuación de las vías intervenidas.


	INFORME	CODIGO:	
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE	VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE CONTRATISTAS PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION	PAGINA	Página: 2 de 6

4) Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor	Se han atendido todas las instrucciones y recomendaciones impartidas por la supervisión del contrato en cumplimiento del objeto contractual.

Otras actividades realizadas
La documentación de las actividades requeridas para este informe hace parte de los archivos de la secretaria de vías, infraestructura y vivienda, en el cual lo sustenta la revisión que hacen la secretaria y a la satisfacción de las entregas,
GEOVANNY ORTIZ PÉREZ **C.C. 88.282.468 de OCAÑA**
En calidad de supervisora del contrato anotado, manifiesto que el Contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas para el objeto del contrato dentro del periodo del 23 de febrero al 07 de mayo del 2024. Igualmente, certifico que el Contratista acreditó los pagos de aportes al Régimen de Seguridad Social integral para dicho periodo. Por lo anterior, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato de obra pública No. CO1.PCCNTR.5990673 del 22 de febrero del 2024. **CARMEN CHONA LEON** Profesional Universitario Área de infraestructura y construcciones Supervisor


	INFORME	CODIGO:	
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE	VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE CONTRATISTAS PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION	PAGINA	Página: 3 de 6


REGISTRO FOTOGRÁFICO

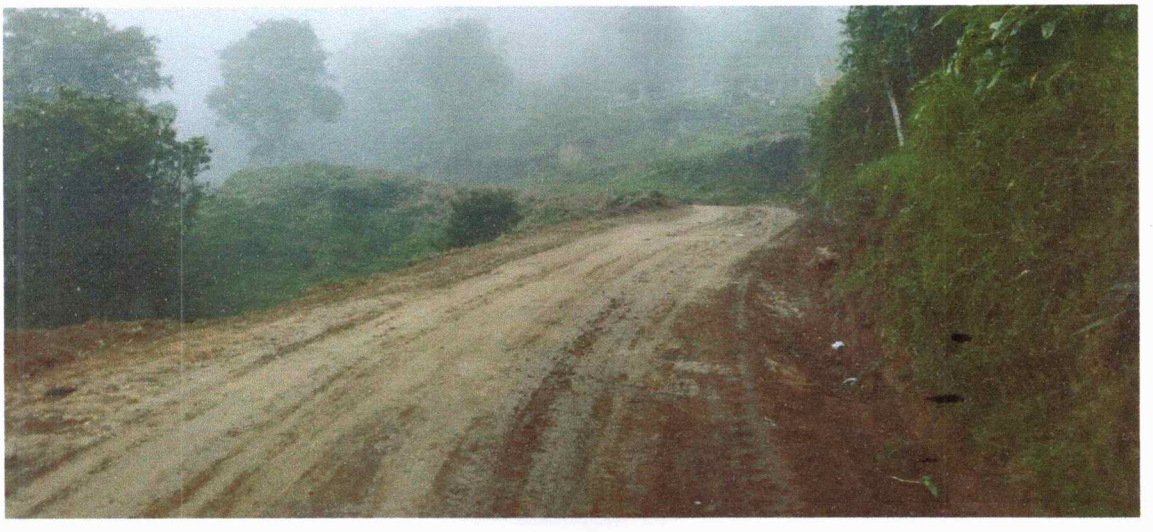



	INFORME	CODIGO:	
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE	VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE CONTRATISTAS PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION	PAGINA	Página: 4 de 6

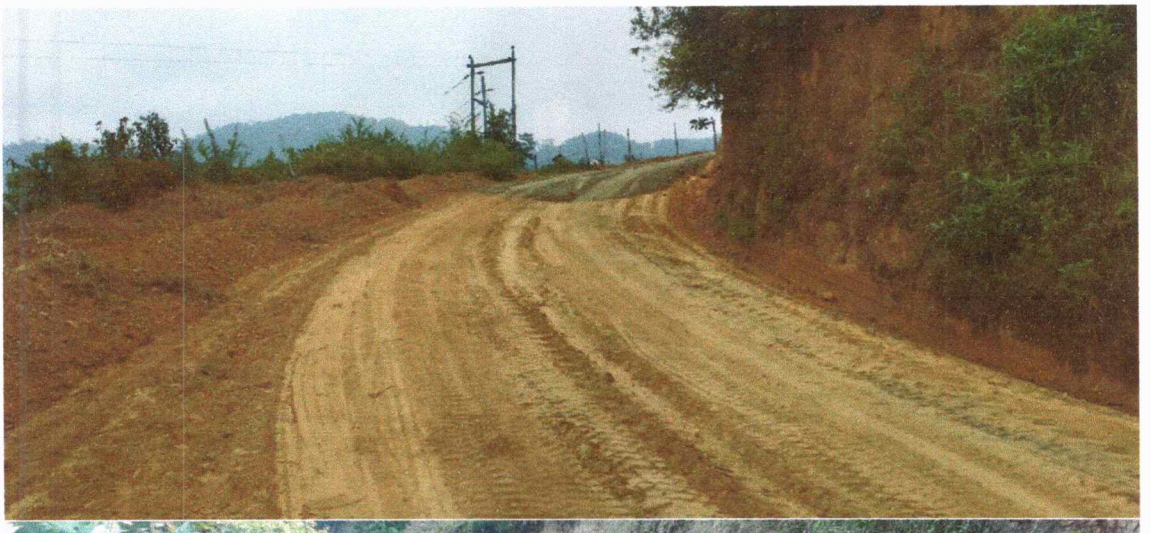


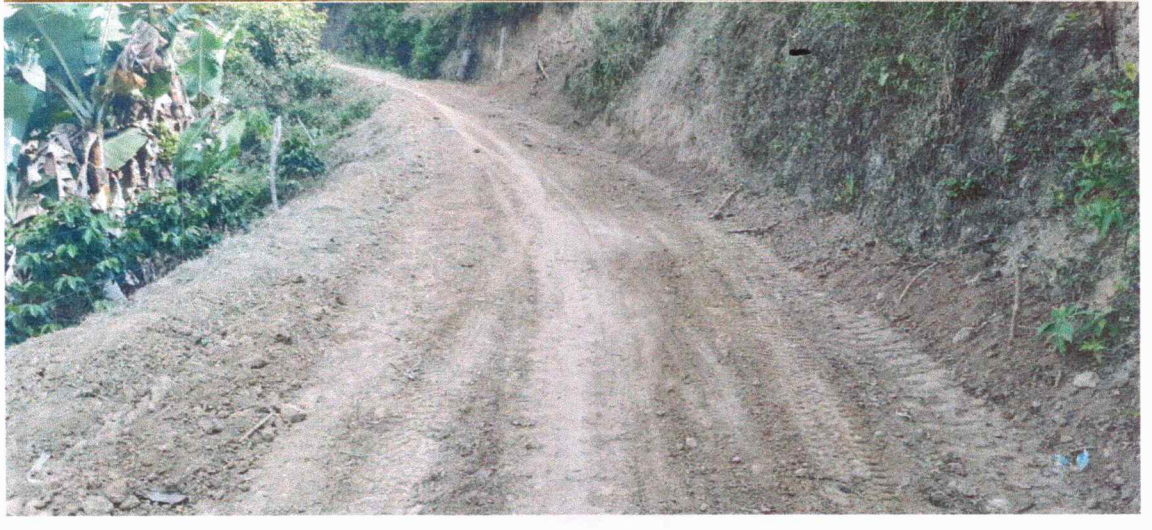



	INFORME	CODIGO:	
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE	VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE CONTRATISTAS PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION	PAGINA	Página: 5 de 6



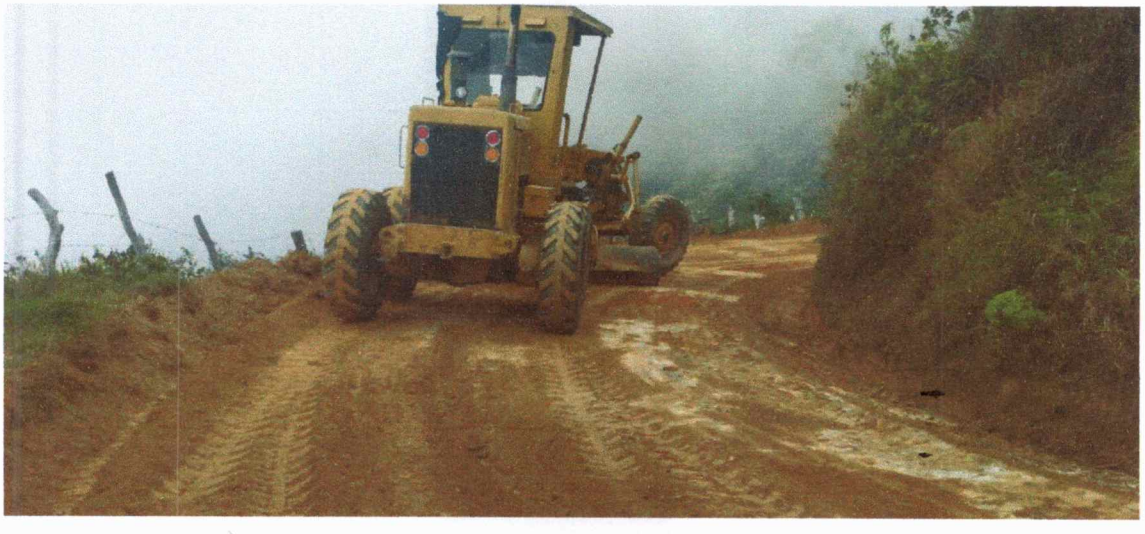




Ingeniero Civil Geovanny Ortiz Pérez
Construcciones & Consultorías

INFORME FINAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Fecha del presente informe: 07 de mayo de 2024
PERIODO DEL INFORME: UNICO - FINAL

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CARRETEBLES EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO Y AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER

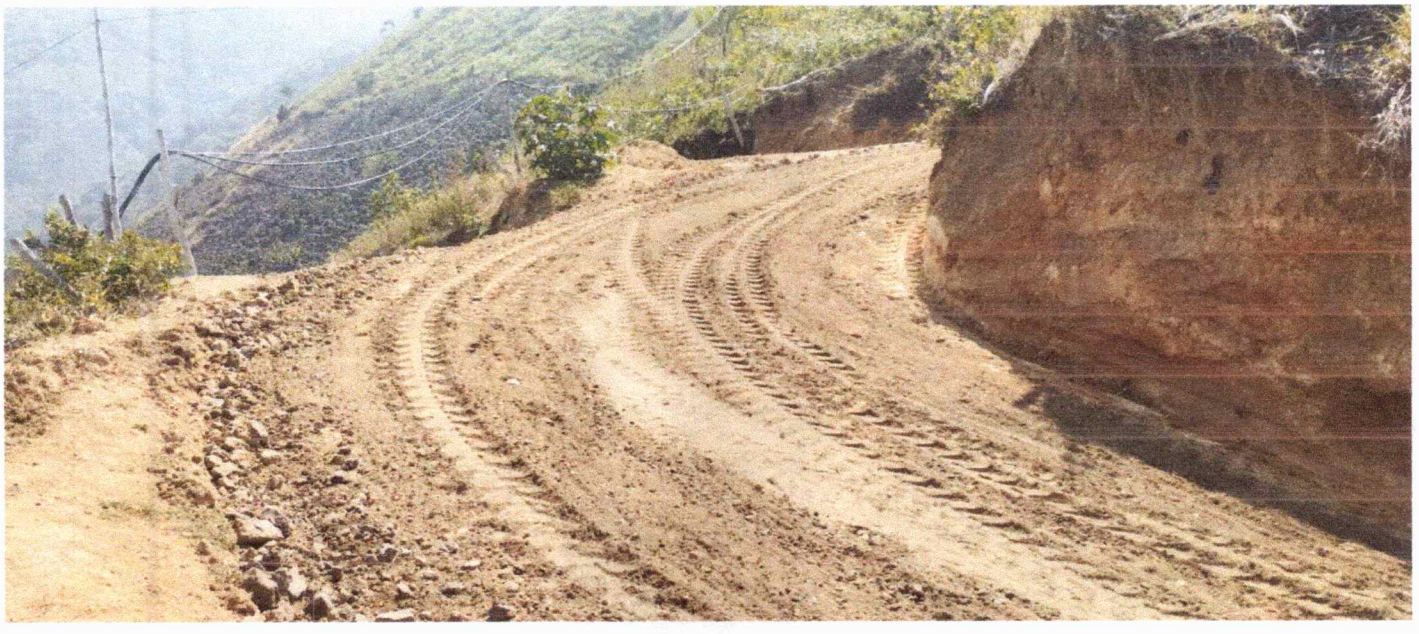

CONTRATISTA
GEOVANNY ORTIZ PEREZ

SUPERVISOR

SECRETARÍA DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, N.S.

MAYO 07 DE 2024

Ingeniero Civil Geovanny Ortiz Pérez
Construcciones & Consultorías

INFORME FINAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Fecha del presente informe: 07 de mayo de 2024
PERIODO DEL INFORME: UNICO - FINAL

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CARRETEBLES EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO Y AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
No. DEL CONTRATO:	No. SVIV 010 DEL 22 DE febrero DEL 2024 (CO1.PCCNTR.5990673)
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CARRETEBLES EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO Y AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	GEOVANNY ORTIZ PÉREZ - C.C. 88.282.468 de Ocaña
SUPERVISOR:	Profesional Área de Vías
VALOR INICIAL:	$ 51.846.500,00
VALOR ADICIONAL #1:	$ 6.652.850,00 Modificatorio No. 002 del 22 de abril de 2024
VALOR ACTUAL:	$ 58.499.350,00
VALOR EJECUTADO:	$ 58.499.350,00
VALOR ANTICIPO:	$0,00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL #1:	QUINCE (15) DÍAS Modificatorio No. 002 del 22 de abril de 2024
PLAZO ACTUAL:	DOS (02) MESES + QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO:	jueves, 22 de febrero de 2024
FECHA DE SUSPENCIÓN No.1:	N.A.
FECHA DE REINICIO No.1:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:	martes, 7 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	martes, 7 de mayo de 2024

MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO

OTROS SÍ

Ninguno

MODIFICACIONES

1. Modificatorio No. 002 del 22 de abril de 2024
   Por medio del cual se adiciona al contrato No. SVIV-010 DEL 22 DE febrero DEL 2024 (CO1.PCCNTR.5990673) el valor de $6.652.850,oo y se Amplia el plazo en QUINCE (15) días adicionales.
2. Comité Tecnico No. 002 del 23 de abril de 2024
   Por medio del cual se realiza acta de modificación de cantidades de obra de acuerdo al resultado de la revision de los lugares de ejecucion del contrato.

OTRAS

Ninguna

Ingeniero Civil Geovanny Ortiz Pérez
Construcciones & Consultorías

INFORME FINAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Fecha del presente informe: 07 de mayo de 2024
PERIODO DEL INFORME: UNICO - FINAL

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CARRETEBLES EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO Y AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER

INFORMACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	VALOR	VALOR	DESCRIPCIÓN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$51.846.500,0		Contrato No. SVIV-010 DEL 22 DE febrero DEL 2024 (CO1.PCCNTR.5990673); Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CD0260 del 14 de febrero de 2024 y Registro Presupuestal No. RP0263 del 22 de febrero de 2024
ANTICIPO		$0	No se contempla Anticipo dentro de la forma de pago
VALOR ADICIONAL #1 AL CONTRATO	$6.652.850		Modificatorio No. 002 del 22 de abril de 2024; Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CD0260 del 14 de febrero de 2024 y Registro Presupuestal No. RP0487 del 22 de Abril de 2024.
VALOR PAGO ACTA PARCIAL		$0	No se tramitaron actas parciales
VALOR PAGO ACTA DE RECIBO FINAL		$58.499.850	Acta de recibo final del 07 de mayo de 2024; pendiente de pago
VALORES NO EJECUTADOS		$0	
VALOR PENDIENTE DE PAGO		$0,0	
SUMAS IGUALES	$58.499.350	$58.499.850	

GARANTIAS

Garantías iniciales del Contrato

GARANTIA	ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A.	56-44-101007373 Anexo 0	23/02/2024	23/08/2024	$ 5.184.650,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ESTABILIDAD DE LA OBRA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
CALIDAD DEL SERVICIO	Seguros del Estado S.A.	56-44-101007373 Anexo 0	23/02/2024	23/08/2024	$ 5.184.650,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	Seguros del Estado S.A.	56-44-101007373 Anexo 0	23/02/2024	23/04/2027	$ 2.592.325,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Seguros del Estado S.A.	56-40-101003277 Anexo 0	23/02/2024	23/04/2024	$ 260.000.000,00

Garantías ajustadas al Modificatorio No. 002 del 22 de abril de 2024

GARANTIA	ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A.	56 44 101007373 Anexos 1 y 2	23/02/2024	7/09/2024	$ 5.849.935,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ESTABILIDAD DE LA OBRA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
CALIDAD DEL SERVICIO	Seguros del Estado S.A.	56-44-101007373 Anexos 1 y 2	23/02/2024	7/09/2024	$ 5.849.935,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	Seguros del Estado S.A.	56-44-101007373 Anexos 1 y 2	23/02/2024	7/05/2027	$ 2.924.967,50
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Seguros del Estado S.A.	56-40-101003277 Anexo 1	23/02/2024	7/05/2024	$ 260.000.000,00

Ingeniero Civil Geovanny Ortiz Pérez
Construcciones & Consultorías

INFORME FINAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Fecha del presente informe: 07 de mayo de 2024
PERIODO DEL INFORME: UNICO - FINAL

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CARRETEBLES EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO Y AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El lugar de ejecución son los corregimientos de Buenavista, Pueblonuevo y Agua de la Virgén en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

ALCANCE DEL PROYECTO

El objeto del contrato contempla el mejoramiento y adecuación de los carreteables que comunican con los corregimientos de Buenavista, Pueblonuevo y Agua de la Virgén en el municipio de Ocaña, con el fin de mejorar la transitabilidad en estos sectores y mejorar las condiciones economicas y sociales en estos corregimientos; esta intervención se realiza a traves de actividades de Conformación de la calzada existente, perfilado y cuneteo (19.021ml); Mejoramiento de la subrasante con adición de material (372m3) y el transporte de la maquinaria al sitio de las obras (3 transportes). Finalmente, mediante comite técnico No. 2 del 23 de abril de 2024 se definieron puntualmente las veredas a intervenir finalmente; quedando de la siguiente forma; Corregimiento de Buenavista (Veredas Alto de filadelfia, Bética, Altogrande, Buenavista, Mariquita, Ekl Pino, Santa Clara, Espiritu Santo y Bueno aires; Corregimiento Agua de la Virgén (Vereads Nuevo amanecer, Samaritana, San Agustín y Agua de la Virgón)

CANTIDADES Y VALORES DE OBRA CONTRATADA

ITEM	ESPECIFICACION GENERAL	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1.1		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE, PERFILADO Y CUNETEO	ML	16190	$ 2.350	$ 38.046.500,00
1.2		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL	M3	372	$ 25.000	$ 9.300.000,00
1.3		TRANSPORTE DE MAQUINARIA	UND	3	$ 1.500.000	$ 4.500.000,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	$ 51.846.500
					VALOR TOTAL OBRAS CONTRATADAS	51.846.500

VALOR TOTAL CONTRATADO: CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/C

CANTIDADES Y VALORES DE OBRA CONTRATADA SEGÚN MODIFICATORIO No. 002 del 22 de abril de 2024

Se suscribió el día 22 de abril de 2024 el modificatorio No. 02 con el fin de aumentar el alcance del proyecto de acuerdo a los recursos existentes y con el fin de ampliar la longitud intervenida y mejorada en estos carreteables, teniendo en cuenta las dificiles condiciones existentes en estas vías y el alto numero de solicitudes por parte de la comunidad para atenderlas. En esta modificatoria se adicionaron recursos por valor de $6.652.850,oo y se amplio el plazo de ejecución en quince (15) días mas.

ITEM	ESPECIFICACION GENERAL	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1.1		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE, PERFILADO Y CUNETEO	ML	2831	$ 2.350	$ 6.652.850,00
1.2		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL	M3	0	$ 25.000	$ -
1.3		TRANSPORTE DE MAQUINARIA	UND	0	$ 1.500.000	$ -
					TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.652.850
					VALOR TOTAL OBRAS ADICIONADAS	6.652.850

VALOR TOTAL ADICIONADO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

Ingeniero Civil Geovanny Ortiz Pérez
Construcciones & Consultorías

INFORME FINAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Fecha del presente informe: 07 de mayo de 2024
PERIODO DEL INFORME: UNICO - FINAL

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CARRETEBLES EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO Y AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER

CANTIDADES Y VALORES FINALES DE OBRA CONTRATADA

ITEM	ESPECIFICACION GENERAL	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL
AGUA DE LA VIRGEN						
1.1		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE, PERFILADO Y CUNETEO	ML	9638,30	$ 2.350	$ 22.650.000,00
1.2		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL	M3	0	$ 25.000	$ -
1.3		TRANSPORTE DE MAQUINARIA	UND	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000,00
BUENAVISTA						
2.1		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE, PERFILADO Y CUNETEO	ML	10021	$ 2.350	$ 23.549.350,00
2.2		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL	M3	372	$ 25.000	$ 9.300.000,00
2.3		TRANSPORTE DE MAQUINARIA	UND	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	$ 58.499.350

VALOR FINAL OBRAS CONTRATADAS: 58.499.350

VALOR TOTAL CONTRATADO: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

AVANCE SEGÚN EL PRESENTE INFORME

CANTIDADES Y VALORES DE OBRA EJECUTADA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

ITEM	ESPECIFICACION GENERAL	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL
AGUA DE LA VIRGEN						
1.1		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE, PERFILADO Y CUNETEO	ML	9638,30	$ 2.350	$ 22.650.000,00
1.2		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL	M3	0	$ 25.000	$ -
1.3		TRANSPORTE DE MAQUINARIA	UND	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000,00
BUENAVISTA						
2.1		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE, PERFILADO Y CUNETEO	ML	10021	$ 2.350	$ 23.549.350,00
2.2		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL	M3	372	$ 25.000	$ 9.300.000,00
2.3		TRANSPORTE DE MAQUINARIA	UND	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	$ 58.499.350

VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS: 58.499.350
PORCENTAJE EJECUTADO: 100,0%

El valor ejecutado hasta el momento corresponde a **$58.499.350,00** lo que representa un avance porcentual de **100,0%**

Ingeniero Civil Geovanny Ortiz Pérez
Construcciones & Consultorías

INFORME FINAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Fecha del presente informe: 07 de mayo de 2024
PERIODO DEL INFORME: UNICO - FINAL

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CARRETEBLES EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO Y AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER

TIEMPO TRANSCURRIDO

	MESES				Tiempo transcurrido		Actividades y/o observaciones
1	del:	23/02/2024	Al:	22/03/2024	29	días	Transporte de maquinaria y ejecución de conformación de la calzada existente a traves de perfilado y cuneteo con motoniveladora
2	del:	23/03/2024	Al:	22/04/2024	31	días	Transporte de maquinaria y ejecución de conformación de la calzada existente a traves de perfilado y cuneteo con motoniveladora, adicionalmente se realiza mejoramiento de la subrasante mediante la adición de material
3	del:	23/04/2024	Al:	7/05/2024	15	días	Transporte de maquinaria y ejecución de conformación de la calzada existente a traves de perfilado y cuneteo con motoniveladora, adicionalmente se realiza mejoramiento de la subrasante mediante la adición de material
				TOTAL DIAS TRANSCURRIDOS	75	días	


OBRA PROGRAMADA


	7/05/2024
Obra Física Programada (%)	100,00%
Valor de la Obra programada:	$ 58.499.350,00

OBRA RECIBIDA

	7/05/2024
Obra Física Ejecutada (%)	100,00%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 58.499.350

AVANCE DE LA OBRA

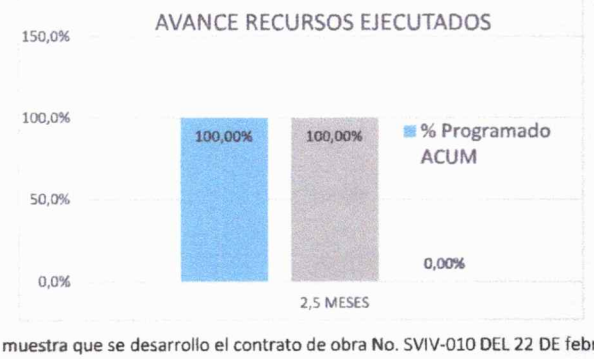

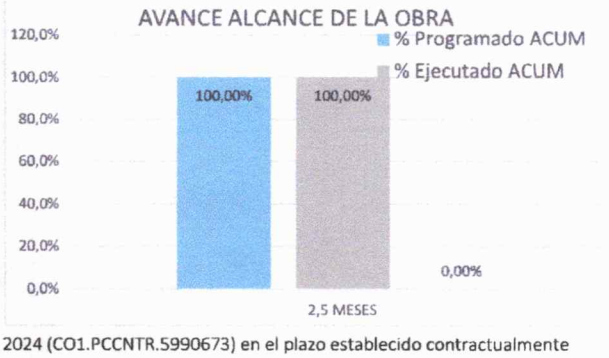

Lo anterior, muestra que se desarrollo el contrato de obra No. SVIV-010 DEL 22 DE febrero DEL 2024 (CO1.PCCNTR.5990673) en el plazo establecido contractualmente

Ingeniero Civil Geovanny Ortiz Pérez
Construcciones & Consultorías

INFORME FINAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Fecha del presente informe: 07 de mayo de 2024
PERIODO DEL INFORME: UNICO - FINAL

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CARRETEBLES EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO Y AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER

PERSONAL EN OBRA

No.	NOMBRE	CEDULA	OCUPACIÓN	Tiempo de vinculación		SEGURIDAD SOCIAL	APORTES PARAFISCALES
				DESDE	HASTA		
1	Josue Diaz Barajas	1.094.533.262	Operario Motonivelado ra	23-feb	7-may	Pensión: Porvenir	Comfaoriente
						Salud: Nueva EPS	Sena
						ARL: Colpatria ARP	ICBF
2	German Mejia Sanchez	9.691.888	Operario Retroexcavad ora	1-mar	30-mar	Pensión: Porvenir	Comfaoriente
						Salud: Nueva EPS	Sena
						ARL: Colpatria ARP	ICBF
3	Geovanny Ortiz Pérez	88.282.468	Contratista y Residente	23-feb	7-may	Pensión: Colpensiones	INDEPENDIENTE
						Salud: Sanitas	
						ARL: Porvenir	

Se anexan Pagos de Seguridad social

EQUIPO EN OBRA

Se presenta relación del EQUIPO dispuesto por el contratista durante el desarrollo del contrato.

Equipo	Marca	Tipo	Modelo	Propietario	Observación
RETROEXCAVADORA TIPO PAJARITA	John Deere	410K	2012	Nadín Antonio Ortiz Soto	En Alquiler
MOTONIVELADORA	Caterpillar	1206	1987	Nadín Antonio Ortiz Soto	En Alquiler
VOLQUETA	International	4700 Placa DDJ109	1996	Nadín Antonio Ortiz Soto	En Alquiler
VOLQUETA	Chevrolet	Kodiak Placa ZII507	1995	Nadín Antonio Ortiz Soto	En Alquiler

Ingeniero Civil Geovanny Ortiz Pérez
Construcciones & Consultorías

INFORME FINAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Fecha del presente informe: 07 de mayo de 2024
PERIODO DEL INFORME: UNICO - FINAL

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CARRETEBLES EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO Y AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER


DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE INFORME

1.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE, PERFILADO Y CUNETEO	UND:	ML	CANTIDAD EJECUTADA:	9638,297872

En desarrollo del mantenimiento y la adecuación de las vías a intervenir en el presente contrato, se ejecuto como actividad principal la conformación de las vias o calzadas existentes, realizandose mediante el uso de motoniveladora el perfilado y cuneto correspondiente; ejecutandose mas de 19 kms de vías mejoradas

Registro fotográfico



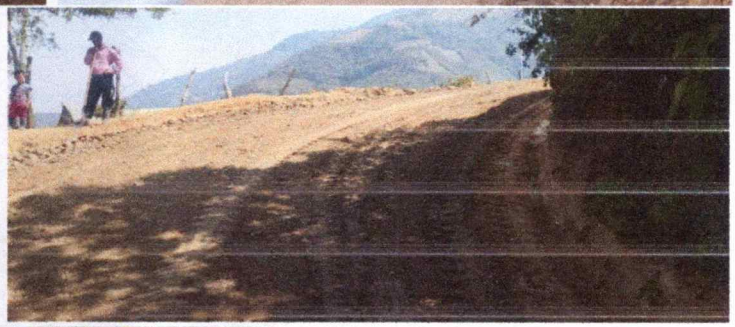




Ingeniero Civil Geovanny Ortiz Pérez
Construcciones & Consultorías


INFORME FINAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Fecha del presente informe: 07 de mayo de 2024
PERIODO DEL INFORME: UNICO - FINAL

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CARRETEBLES EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO Y AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER



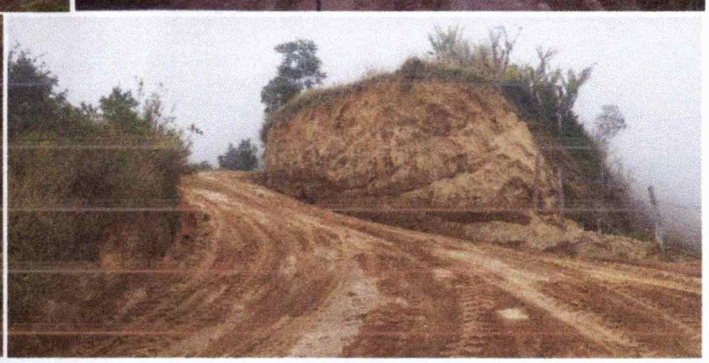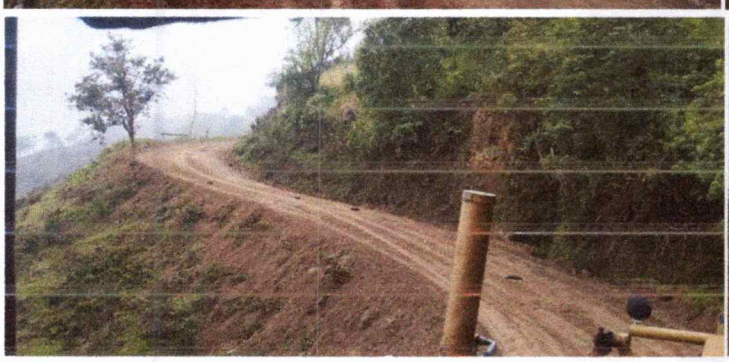

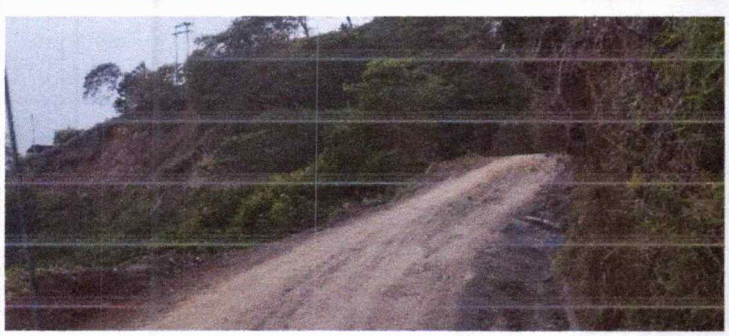
Ingeniero Civil Geovanny Ortiz Pérez
Construcciones & Consultorías

INFORME FINAL DEL CONTRATISTA DE OBRA


Fecha del presente informe: 07 de mayo de 2024
PERIODO DEL INFORME: UNICO - FINAL


MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CARRETEBLES EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO Y AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER

2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL	UND:	m3	CANTIDAD EJECUTADA:	0

Una vez mejorada la subrasante mediante perfilado y cuneteo se procedio a la adición de material de peña tipo receba o cascajo, en capas de aproximadamente 20 cms de espesor. Esta actividad se realizó en los sitios mas criticos de las vías intervenidas

Registro fotográfico

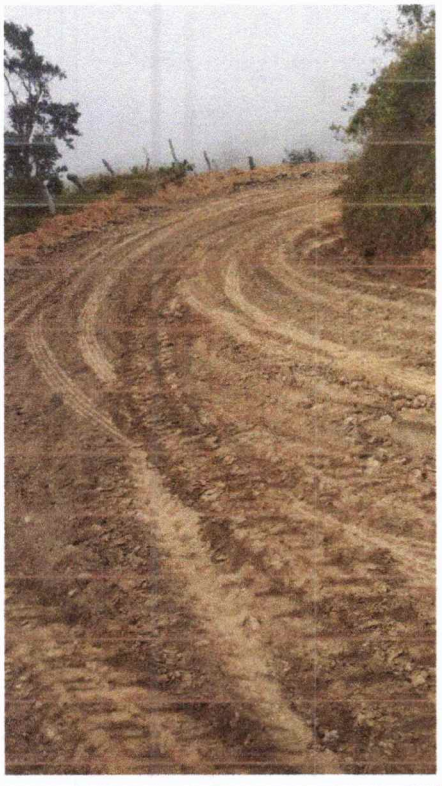

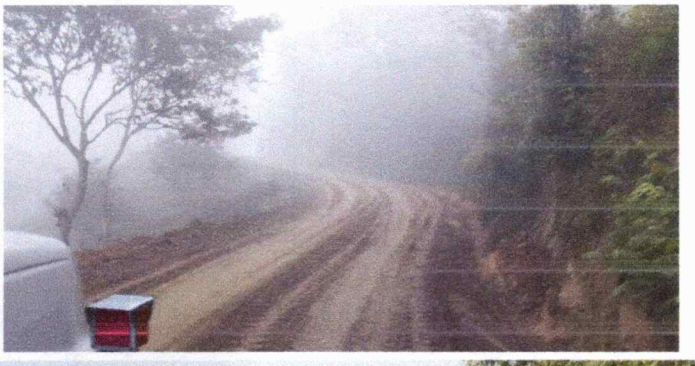








Ingeniero Civil Geovanny Ortiz Pérez
Construcciones & Consultorías

INFORME FINAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Fecha del presente informe: 07 de mayo de 2024
PERIODO DEL INFORME: UNICO - FINAL


MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CARRETEBLES EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO Y AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER

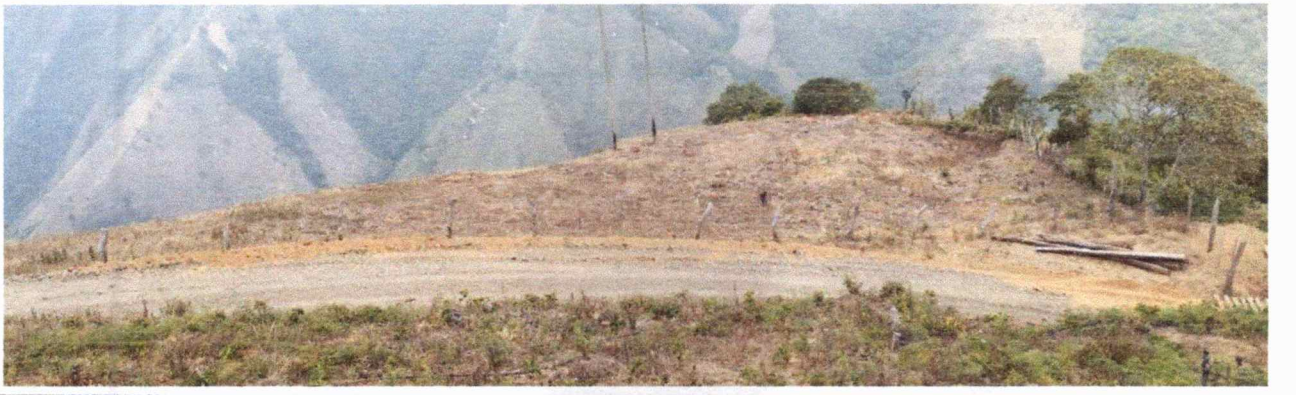







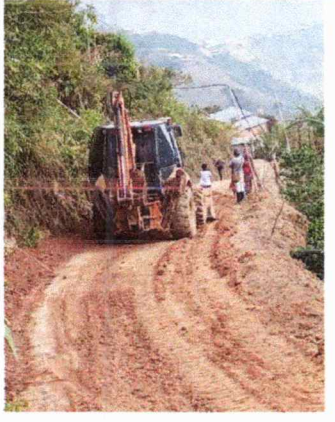



Ingeniero Civil Geovanny Ortiz Pérez
Construcciones & Consultorías

INFORME FINAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Fecha del presente informe: 07 de mayo de 2024
PERIODO DEL INFORME: UNICO - FINAL

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CARRETEBLES EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO Y AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER

9.	TRANSPORTE DE MAQUINARIA	UND:	und	CANTIDAD EJECUTADA:	3

Este item tiene como finalidad el pago del transporte de la maquinaria utilizadas desde el sitio de origen a las zonas donde se realizaron los mejoramientos y adecuaciones viales.

CONCLUSIONES U OBSERVACIONES

Se puede establecer por parte del contratista que se realizó la ejecución del contrato No. SVIV-010 DEL 22 DE febrero DEL 2024 (CO1.PCCNTR.5990673) de forma correcta según los alcances definidos en el objeto del contrato y en el presupuesto de obra; lograndose realizar una correcta inversión de los recursos; permitiendose mejorar la movilidad de trafico liviano y de carga por estas vías rurales, aumentando la calidad de vida de un importante sector del municipio de Ocaña

FIRMAS

GEOVANNY ORTIZ PÉREZ
Contratista de Obra

INFORME FINAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Fecha del presente informe: 07 de mayo de 2024
PERIODO DEL INFORME: UNICO - FINAL

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CARRETEBLES EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO Y AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER

Anexo No. 1

DOCUMENTOS CONTRACTUALES
