CONSORCIO 2022 COLEGIO ERU 2022	**INFORME SEMANAL**	**FT 300** **VERSIÓN: 00** **23/05/2022**

I. INFORMACIÓN GENERAL						
CONTRATO No.	**Contrato de obra No.133 de 2022**					
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**					
SEMANA No.	94	**DEL**	**4 de marzo de 2024**		**AL**	**10 de marzo de 2024**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	658	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO COLEGIO ERU 2022**	**INTERVENTOR:**	**GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**
Contrato No.	**133 de 2022**	**Contrato No.**	**134 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	23/05/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	5/05/2022
Valor Inicial	$ 43,322,137,680.00	**Valor Inicial**	$ 1,570,157,939.00
Valor Adicion No.01	$ 9,372,533,448.00	**Valor Adicion No.01**	$ 608,308,421.00
Valor Total	$ 52,694,671,128.00	**Valor Total**	$ 2,178,466,360.00
Plazo Inicial	17 MESES	**Plazo Inicial**	17 MESES
Prorroga No.01	7 MESES	**Prorroga No.01**	7 MESES
Plazo Actualizado	24 MESES	**Plazo Actualizado**	24 MESES
Fecha de Iniciación	23 de mayo de 2022	**Fecha de Iniciación**	23/05/2022
Fecha de Terminación*	22 de mayo de 2024	**Fecha de Terminación**	22/05/2024
No póliza contrato de obra	CBC-100035966	**No póliza contrato de interventoría**	15-45-101142718
Fecha aprobación	23 MAYO DE 2022	**Fecha aprobación**	12/05/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA

AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
CUMPLIMIENTO DE OBRA	11/10/2023 hasta 23/11/2024	$ 10,538,934,255.60	A la fecha no presenta ninguna novedad
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11/10/2023 hasta 23/05/2027	$ 5,269,467,112.80	A la fecha no presenta ninguna novedad
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/05/2024 hasta 23/05/2029	$ 13,173,667,782.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	11/10/2023 hasta 23/07/2024	$ 8,664,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL	05/05/2022 hasta 23/05/2024	$ 2,634,733,556.00	A la fecha no presenta ninguna novedad

III. ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA


No	**Ubicación de la actividad**	**ESTADO**	**Valor Programado a la fecha**	**Valor total actividad costo directo**	**Valor ejecutado acumulado**	**%AVANCE**	**Descripción de la Actividad**
1.1.1	Localización y Replanteo de Obras generales.	EJEUCIÓN	$ -	$ 111,559,919.94	$ 70,731,073	63.40%	REPLANTEO MODULO K Y TEATRINO.
1.2.1	Demolición de estructuras en concreto existentes - muros - adoquines - losetas - estructuras asfalticas (Incluye cargue y retiro)	EJEUCIÓN	$ 14,691,382	$ 17,229,506.14	$ 9,688,235	56.23%	MUROS CORRESPONDIENTES AL ANTIGUO ALMACEN, CAMPAMENTO, BATERIA DE BANOS Y ENFERMERIA.
5.1.1	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a dos caras. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo.	EJEUCIÓN	$ 4,589,493	$ 1,709,972,228.90	$ 1,092,872,870	63.91%	MAMPOSTERIA QUE SE ADELANTA EN MODULO I NIVEL 1 y NIVEL 2; MODULO G NIVEL 1.
5.1.3	Construccion de Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 3/8" . de profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)	EJEUCIÓN	$ 3,359,575	$ 927,803,448.00	$ 688,494,906	74.21%	MAMPOSTERIA QUE SE ADELANTA EN MODULO I NIVEL 1 y NIVEL 2; MODULO G NIVEL 1.
8.3.1.3	Suministro e instalacion cable Cat 6, utp 500mhz, 10g 4x2x23awg, carrete de 305 metros, LSZH	EJEUCIÓN	$ 19,998,167	$ 10,567,404.00	$ 4,167,474	39.44%	INSTALACION EN MODULOS A, B, C, D y E NIVELES 1, 2 y 3.
8.3.1.4	Suministro e instalación de salida para voz o/y datos en faceplate doble RJ45 certificado, incluye 1xjacks Cat 6, caja metalica galvanizada, accesorios de fijación, identificacion y certificacion a 500Mhz	EJEUCIÓN	$ 7,235,229	$ 2,115,080.00	$ 367,840	17.39%	INSTALACION EN MODULOS A, B, C, D y E NIVELES 1, 2 y 3.
8.3.1.5	Suministro e instalación de salida para voz o/y datos en faceplate doble RJ45 certificado, incluye 2xjacks Cat 6, caja metalica galvanizada, accesorios de fijación, identificacion y certificacion a 500Mhz	EJEUCIÓN	$ 62,410	$ 858,420.00	$ 457,824	53.33%	INSTALACION EN MODULOS A, B, C, D y E NIVELES 1, 2 y 3.
12.1.1	Suministro e instalacion Piso en baldosa de granito 30 x 30 cm, incluye adhesivo en polvo de altas prestaciones tipo pegacor o similar y boquilla, , incluye destronque pulida y brillado	EJEUCIÓN	$ 60,769,270	$ 1,059,112,760.45	$ 643,830,418	60.79%	MODULO G - NIVEL 1 (PORTERIA, MODULO H NIVEL 2 (PASILLO), MODULO O NIVEL 2 (PASILLO)
16.1.4	Suministro y aplicación de Pintura tipo Koraza para exteriores	EJEUCIÓN	$ -	$ 28,230,167.36	$ 15,873,797	56.23%	DFACHADA NORTE MODULO E NIVEL 2.
21.1.13	Cerramiento exterior tipo sed en malla eslabonada altura 2.4 (parales en tubo estructural 100x40x2 empotrado en dados de concreto cuerpos en ángulos de 2 1/2" - 1 1/4" x 3/16 -3/4 x 1/8", malla ondulada 2x2" 4mm, terminada con base imprimante epóxica y esmalte	EJEUCIÓN	$ -	$ 523,648,697.18	$ 168,883,952	32.25%	CERRAMIENTO TIPO S.E.D. COSTADO NORTE DEL PROYECTO, PARALELO AL MODULO N.

CONSORCIO 2022 COLEGIO ERU 2022	INFORME SEMANAL	FT 300 VERSIÓN: 00 23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL							
CONTRATO No.	Contrato de obra No.133 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.						
SEMANA No.	94	DEL	4 de marzo de 2024		AL	10 de marzo de 2024	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	658	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ				

26.1	Aseo Permanente en Obra	EJEUCIÓN	$ 70,951,709	$ 69,027,840.00	$ 56,206,080	81.43%	MODULO L, M y N - NIVEL 2.
26.2	Aseo Final	EJEUCIÓN	$ 586,414,048	$ 61,500,769.50	$ 29,174,960	47.44%	MODULOS A, B, C, D Y E EN NIVELES 1, 2, 3 Y CUBIERTA; PLAZOLETA DE ACCESO PRINCIPAL, PATIOS INTERNOS DEL MODULO A, DEL MODULO C y DEL MODULO D.
28.6	Elemento de concreto reforzado dentro de mamposteria (Dovela en grouting)	EJEUCIÓN	$ 6,547,126	$ 439,360,678.80	$ 295,064,244	67.16%	MAMPOSTERIA QUE SE ADELANTA EN MODULO I NIVEL 1 y NIVEL 2; MODULO G NIVEL 1.
28.9	Junta de dilataccion mamposteria interior	EJEUCIÓN	$ -	$ 30,119,814.00	$ 7,367,831	24.46%	SANOLES MODULO D NIVEL 3 (AULA 308 y AULA 309) Y DEPOSITO NIVEL 3.
28.12	Guardaescobas baldosa vibroprensada biselado grano de marmol. Dim.: h= 10 x L= 30 cm Ref: Perlato claro grano 3 fondo crema.	EJEUCIÓN	$ 86,317,671	$ 74,551,522.00	$ 37,695,405	50.56%	MODULO H - NIVEL 2.
28.17	Alistados de pisos en mortero 1:4 e=5 cm	EJEUCIÓN	$ 14,876,566	$ 624,358,986.00	$ 290,760,517	46.57%	MODULO G - NIVEL 1 (PORTERIA, MODULO H NIVEL 2 (PASILLO), MODULO O NIVEL 2 (PASILLO)
28.21	Chapa en ladrillo prensado instalación tradicional - (incluye, safarreo y escarificación) ancho menor e igual a 60cm.	EJEUCIÓN	$ 455,911	$ 114,481,036.98	$ 88,191,371	77.04%	MAMPOSTERIA QUE SE ADELANTA EN MODULO I NIVEL 1 y NIVEL 2; MODULO G NIVEL 1.
28.25	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M , menor o igual a 60 cm de longitud . Incluye mortero de pega	EJEUCIÓN	$ 26,159,467	$ 641,250,880.88	$ 490,837,730	76.54%	MAMPOSTERIA QUE SE ADELANTA EN MODULO I NIVEL 1 y NIVEL 2; MODULO G NIVEL 1.
28.26	lavado para protección de mamposteria a la vista	EJEUCIÓN	$ 27,691,665	$ 193,098,326.10	$ 73,105,973	37.86%	MODULOS L / M / N NIVEL 2.
28.27	Construccion de losa a la vista para lockers en concreto reforzado de 3000 PSI, en situ - (Dimensiones de acuerdo a localización) Diseño y especificaciones técnicas según diseño estructural.	EJEUCIÓN	$ 18,132,428	$ 64,929,287.00	$ 42,163,102	64.94%	MODULO I NIVEL 2 (SALONES DE MUSICA Y DANZA).
28.51	Bordillo arranque de ventaneria en concreto reforzado de 3000 PSI a la vista biselado, en situ - (Dimensiones 0,2 x 0,12) Diseño y especificaciones técnicas según diseño estructural. .	EJEUCIÓN	$ 3,964,685	$ 81,035,798.76	$ 60,452,946	74.60%	MODULO I NIVEL 2 (SALONES DE MUSICA Y DANZA).

VALOR PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO EJE.	AVANCE
$ 29,263,327,807.48	$ 896,719,347.55	$ 30,160,047,155.03	$ 26,581,872,967.07	$ 137,894,476.31	$ 26,719,767,443.38	-$ 3,440,279,711.65
68.30%	2.09%	70.39%	62.04%	0.32%	62.36%	-8.03%

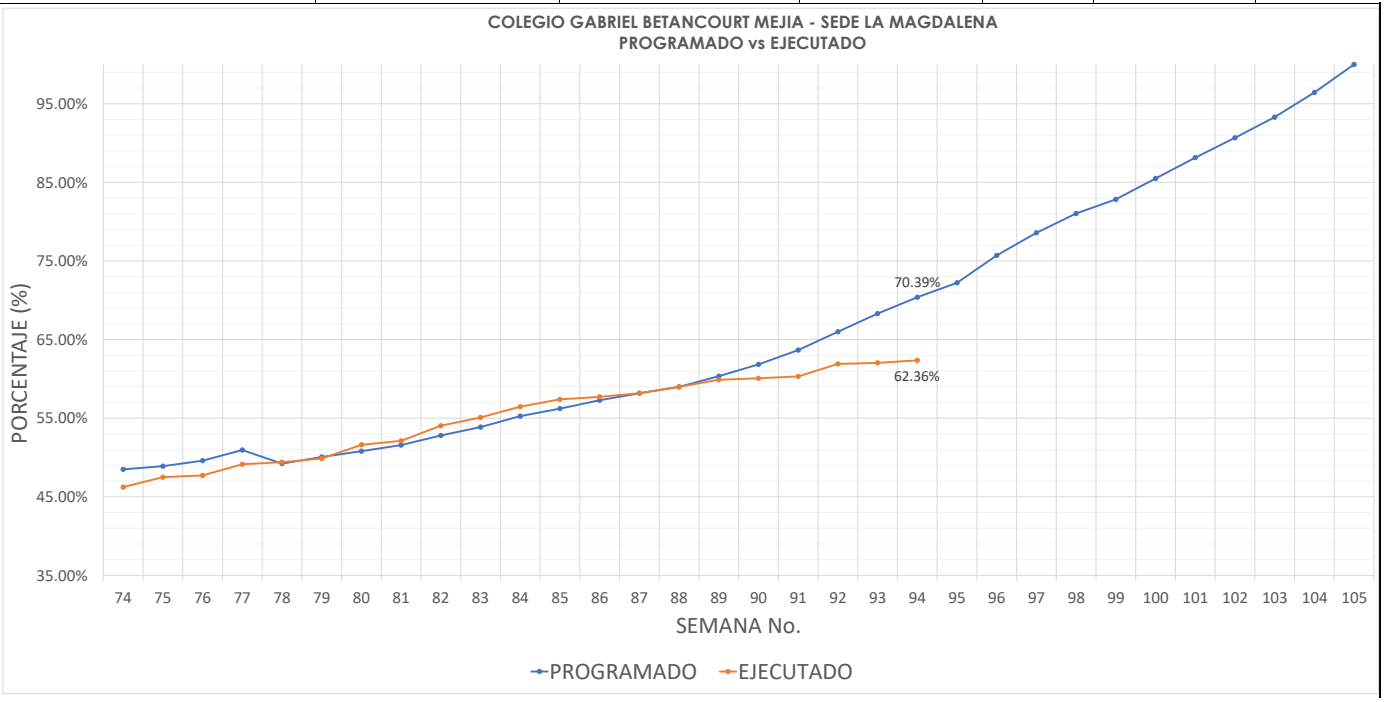

CONSORCIO 2022 COLEGIO ERU 2022	INFORME SEMANAL	FT 300 VERSIÓN: 00 23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL					
CONTRATO No.	Contrato de obra No.133 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.				
SEMANA No.	94	DEL	4 de marzo de 2024	AL	10 de marzo de 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	658	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASOS

Item	Actividad	Valor atrasos	Atraso con respecto al presupuesto total	OBSERVACIONES
1.3	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-$ 817,995,381	-1.91%	Hasta el pasado 12 de febrero se pudo iniciar desmonte de las aulas existentes, y hasta el 19 de febrero se pudo iniciar con las labores de movimiento de tierras del módulo K, más de un mes despues del tiempo programado, y aún hay mobiliario de la secretaria de educación en el predio, siendo esta actividad de la ruta crítica del proyecto.
2.1	CIMENTACION	-$ 269,664,854	-0.63%	Marca atraso porque ya se tenía programado el inicio de esta labor, pero por la demora en la entrega del predio y las actividades predecesoras de ello, no se ha podido adelantar nada de ello, siendo ruta crítica de la programación de obra.
5.1	MAMPOSTERIA	-$ 977,877,856	-2.28%	Este capítulo marca atraso por el tema de la definición técnica por todas las partes con respecto a los acabados de las terrazas transitables a nivel de cubierta de los módulos L, M, N, G y H, pero es de recalcar que se adelantan labores en dichos sectores a riesgo del contratista para no seguir acumulando atrasos y sacar el proyecto adelante.
12	PISOS Y ENCHAPES	-$ 576,846,419	-1.35%	Este capítulo marca atraso por el tema de la definición técnica por todas las partes con respecto a los acabados de las terrazas transitables a nivel de cubierta de los módulos L, M, N, G y H, pero es de recalcar que se adelantan labores en dichos sectores a riesgo del contratista para no seguir acumulando atrasos y sacar el proyecto adelante.
18	CARPINTERIA METALICA	-$ 406,221,166	-0.95%	Este capítulo marca atraso por el tema de la definición técnica por todas las partes con respecto a los acabados de las terrazas transitables a nivel de cubierta de los módulos L, M, N, G y H, pero es de recalcar que se adelantan labores en dichos sectores a riesgo del contratista para no seguir acumulando atrasos y sacar el proyecto adelante.
21	OBRAS EXTERIORES, MOBILIARIO URBANO Y PAISAJISMO	-$ 287,430,519	-0.67%	Hasta el pasado 12 de febrero se pudo iniciar desmonte de las aulas existentes, y hasta el 19 de febrero se pudo iniciar con las labores de movimiento de tierras del módulo K, más de un mes despues del tiempo programado, y aún hay mobiliario de la secretaria de educación en el predio, siendo esta actividad de la ruta crítica del proyecto.
28	NO PREVISTOS	-$ 900,529,122	-2.10%	Este capítulo marca atraso por el tema de la definición técnica por todas las partes con respecto a los acabados de las terrazas transitables a nivel de cubierta de los módulos L, M, N, G y H, pero es de recalcar que se adelantan labores en dichos sectores a riesgo del contratista para no seguir acumulando atrasos y sacar el proyecto adelante.

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

Durante la semana 94 comprendidos entre los días 04 de marzo al 10 de marzo del 2024, se radicó los siguientes oficio:
1. El dia 4 de marzo del 2024 se da respuesta al comunicado GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_900 en el oficio CCERU-22-1285. Se radica los informes de asentamiento de topografia en el oficio CCERU-22-1286
2. El dia 5 de marzo del 2024 se da respuesta al comunicado GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_939 en el oficio CCERU-22-1287. Se radica la propuesta de iluminacion exterior-sistema de energia solar en el oficio CCERU-22-1288
3. El dia 6 de marzo del 2024 se da respuesta al comunicado GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_933 con el oficio CCERU-22-1284. Se radica los informes semanales en el oficio CCERU-22-1289.
4. El dia 8 de marzo del 2024 se radica la solicitud aprobacion analisis de prev en el oficio CCERU-22-1291

Aspecto Financiero

No se presento ninguna actividad en la semana

Aspecto Tecnico

Se observan atrasos con respecto a la programación vigente, toda vez que parte de las actividades programadas se encuentran dentro de las áreas que hasta en la semana 91 (12 de febrero) hizo entrega el colegio (aclarando que aún hay espacios sin poder intervenir ya que hay mobiliario de la S.E.D.), razón por la que este Consorcio requiere la entrega oficial y total de toda el área del Colegio, en aras de ejecutar lo programado sin aumentar el retraso actual. Se aclara que segun nueva programación de obra se evidencia más de un mes de atrasos en actividades de desmontes, demoliciones y excavaciones en el área del predio y todo lo que desencadenan estas dos actividades principales.

Es de recalcar, que al presentarse un retraso de más de un mes en la entrega parcial del área del colegio (aún tienen espacios ocupados), esto repercute directamente en actividades de la ruta crítica del programa de obra, debido a que son de gran peso en el presupuesto de obra (mov. tierras, cimentaciones y estructuras) y desencadenan varias actividades del proyecto que estan programadas hace tiempo y hasta ahora se ha podido ejecutar parcialmente algo de ello, es de anotar que son actividades de la ruta crítica del proyecto y predecesoras indispensables de más actividades que cronológicamente no se pueden adelantar ni traslapar en la ejecución. Como se observa que está en cero en la columna de valor programado, esto nos representa puntualmente que esto se tuvo que ejecutar desde hace más de un mes y hasta ahora se pudo intervenir algunas areas del colegio que se encontraba en uso. También se aclara que está pendiente la definición técnica del acabado de las cubiertas de los módulos L, M, N, G y H, definición que lleva mas de 6 meses trabajando en ello, y que las actividades de acabados de los niveles inferior a estas cubiertas estan detenidos afectando el programa de obra. Tambien se informa que el contratista avanza en estos módulos asumiendo riesgos con el fin de avanzar y no aumentar el retraso en el proyecto.

Se informa que con los recursos actuales existe una imposibilidad de desarrollar las obras al 100%, razón por la que se debe definir el alcance real de las obras. Es de anotar que el atraso no es tan representativo, pero se debe a que el contratista ha buscado la forma de ejecutar actividades que se permitan a medida del avance de la obra y los espacios entregados, sin importar o no que estén en la programación con el fin de no reflejar incumplimientos ni retrasos mayores.

Aspecto SST-Ambiental

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto Ambiental:
1. El dia 5 de marzo del 2024 se reciben observaciones de informe ambiental No. 21
2. El dia 7 de marzo del 2024 se da respuesta a observaciones de informe ambiental No. 21, se envía a interventoría informe ambiental No. 21 V2, Se realiza recolección de residuos de acopio temporal

Lunes, miércoles y viernes: se realiza la disposición de residuos sólidos convencionales generados en obra a través del operador de aseo del sector de acuerdo con las microrutas de recolección establecidas, todos los días se realiza limpieza de vías, adicionalmente todos los días se realiza jornada de orden y aseo a las áreas intervenidas

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto SST:
1. El dia 4 de marzo del 2024 se realiza charla de seguridad, pausas activas, diligenciar documentos para las actividades del consorcio y de urbanismo (ats,permisos de trabajo,inspecciones,)entrega de epp, Supervision de actividades en obra- verificacion de planillas ingreso de vehiculos,radicación personal nuevo señalizacion de areas, supervicion de actividades del personal de servicios .
2. El dia 5 de marzo del 2024 se realiza charla de seguridad, pausas activas, verificacion de ats,permisos de trabajo,inspecciones)entrega de EPP , Supervision de actividades propias del consorcio, supervicion de actividades del personal de urbanismo y suprevicion actividades de los contratistas. verificacion de planillas para ingreso de vehiculos,hacer carnet de personal nuevo, capacitaciones sst,señalizacion de areas, supervicion de actividades.
3. El dia 6 de marzo del 2024 se realiza charla de seguridad, pausas activas, verificacion de ats,permisos de trabajo,inspecciones)entrega de EPP , Supervision de actividades propias del consorcio, supervicion de actividades del personal de urbanismo y suprevicion actividades de los contratistas. verificacion de planillas para ingreso de vehiculos,radicación personal nuevo.
4. El dia 7 de marzo del 2024 se realiza charla de seguridad, verificacion de ats,permisos de trabajo,inspecciones)entrega de EPP , Supervision de actividades propias del consorcio, supervicion de actividades del personal de urbanismo y suprevicion actividades de los contratistas. verificacion de planillas para ingreso de vehiculos,radicación personal nuevo, capacitaciones sst .
5. El dia 8 de marzo del 204 se realiza pausas activas, verificacion de ats,permisos de trabajo,inspecciones)entrega de EPP , Supervision de actividades propias del consorcio, supervicion de actividades del personal de urbanismo y suprevicion actividades de los contratistas. verificacion de planillas para ingreso de vehiculos,radicación personal nuevo.
6. El dia 9 de marzo del 2024 se realiza charla 5 minutos, validacón de permisos en campo, reunión SST , recorrido en campo, gestión de cronograma de actividades SST, socializacion actividades semanales .

Aspecto Social

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:
1. El dia 4 de marzo del 2024 se recibe aprobación al Informe Mensual Gestión Social No 21
2. El dia 7 de m arzo del 2024 se remite a interventoría para revisión y aprobación volantes No 46 y No 47 correspondientes a la convocatoria para la Reunión del Comité de Participación Ciudadana No 19. Asistencia y participación Comité de Seguimiento Social
3. El dia 8 de marzo del 2024 se realiza a traves de correo electrónico, se remite a interventoría la Relación Personal Mano de Obra No Calificada (MONC) - Obra Colegio Gabriel Betancourt Mejía - Sede La Magdalena, con corte al 9 de marzo de 2024.

Entre el 01 al 08 de marzo de 2024: Se garantizará la atención a la ciudadanía, conforme a los mecanismos de atención al ciudadano dispuestos (línea de atención telefónica, correo electrónico), así mismo, se efectuó atención en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en el horario presencial establecido los días jueves entre la 1:00 pm y las 5:00 pm.

CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	INFORME SEMANAL	FT 300 VERSIÓN: 00 23/05/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL						
CONTRATO No.	**Contrato de obra No.133 de 2022**					
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**					
SEMANA No.	94	**DEL**	**4 de marzo de 2024**	**AL**	**10 de marzo de 2024**	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	658	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ			

Aspecto PMT

No se presenta ninguna actividad esta semana.

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
25316 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
35147 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			
35148 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			
35149 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA
Con respecto a las polizas de adicion y prorroga, a la fecha aun se encuentran en tramite	
	Firma
