CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	INFORME SEMANAL	FT 300 VERSIÓN: 00 23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL						
CONTRATO No.	**Contrato de obra No.133 de 2022**					
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**					
SEMANA No.	96	**DEL**	**18 de marzo de 2024**		**AL**	**24 de marzo de 2024**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	672	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO COLEGIO ERU 2022**	**INTERVENTOR:**	**GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**
Contrato No.	**133 de 2022**	**Contrato No.**	**134 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	23/05/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	5/05/2022
Valor Inicial	$ 43,322,137,680.00	**Valor Inicial**	$ 1,570,157,939.00
Valor Adicion No.01	$ 9,372,533,448.00	**Valor Adicion No.01**	$ 608,308,421.00
Valor Total	$ 52,694,671,128.00	**Valor Total**	$ 2,178,466,360.00
Plazo Inicial	17 MESES	**Plazo Inicial**	17 MESES
Prorroga No.01	7 MESES	**Prorroga No.01**	7 MESES
Plazo Actualizado	24 MESES	**Plazo Actualizado**	24 MESES
Fecha de Iniciación	23 de mayo de 2022	**Fecha de Iniciación**	23/05/2022
Fecha de Terminación*	22 de mayo de 2024	**Fecha de Terminación**	22/05/2024
No póliza contrato de obra	CBC-100035966	**No póliza contrato de interventoría**	15-45-101142718
Fecha aprobación	23 MAYO DE 2022	**Fecha aprobación**	12/05/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA

AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DE OBRA	11/10/2023 hasta 23/11/2024	$ 10,538,934,255.60	A la fecha no presenta ninguna novedad
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11/10/2023 hasta 23/05/2027	$ 5,269,467,112.80	A la fecha no presenta ninguna novedad
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/05/2024 hasta 23/05/2029	$ 13,173,667,782.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	11/10/2023 hasta 23/07/2024	$ 8,664,427,536.00	A la fecha no presenta ninguna novedad
RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL	05/05/2022 hasta 23/05/2024	$ 2,634,733,556.00	A la fecha no presenta ninguna novedad

III. ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA

No	Ubicación de la actividad	ESTADO	Valor Programado a la fecha	Valor total actividad costo directo	Valor ejecutado acumulado	%AVANCE	Descripción de la Actividad
4.1.1	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para columnas de 4,000 PSI (28 Mpa)	EJEUCIÓN	$ 1,295,753,669	$ 870,056,615.83	$ 728,531,664	83.73%	COLUMNAS DE MODULO J PARTE 2, DE NIVEL 2 A CUBIERTA.
4.2.2	Suministro e instalacion de Acero de refuerzo Columnas figurado fy= 420 Mpa	EJEUCIÓN	$ 18,076,452	$ 1,266,044,391.08	$ 1,161,615,732	91.75%	ACERO DE REFUERZO COLUMNAS DEL MODULO P
4.3.3	Construccion de Poyo muebles en concreto reforzado de 3000 PSI	EJEUCIÓN	$ -	$ 9,944,483.01	$ 4,294,341	43.18%	MODULO H NIVEL 1
5.1.1	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a dos caras. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo.	EJEUCIÓN	$ 4,722,047	$ 1,709,972,228.90	$ 1,119,086,070	65.44%	MAMPOSTERIA QUE SE ADELANTA EN MODULO I NIVEL 1.
5.1.3	Construccion de Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 3/8" . de profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)	EJEUCIÓN	$ 3,456,607	$ 927,803,448.00	$ 698,213,175	75.25%	MAMPOSTERIA QUE SE ADELANTA EN MODULO I NIVEL 1.
6.2.4.5	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	EJEUCIÓN	$ 14,414,136	$ 36,753,639.39	$ 15,259,318	41.52%	TEATRINO
6.3.2.1	Suministro e instalación tubería y accesorios Cobre Rígido tipo "L" Ø 1/2" . Laboratorios	EJEUCIÓN	$ 1,980,846	$ 203,346,441.60	$ 132,097,052	64.96%	MODULO I NIVEL 2 (LABORATORIOS).
6.3.2.2	Suministro e Instalación Válvula de Corte Ø 1/2" . Laboratorios	EJEUCIÓN	$ -	$ 233,868.00	$ 175,401	75.00%	MODULO I NIVEL 2 (LABORATORIOS).
6.3.2.6	Suministro e Instalación Válvula de Corte Ø 1/2"	EJEUCIÓN	$ -	$ 1,403,208.00	$ 1,403,208	100.00%	MODULO I NIVEL 2 (LABORATORIOS).
7.1.5.8	Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 2.1/2"	EJEUCIÓN	$ 12,555,097	$ 10,832,826.00	$ 10,832,826	100.00%	MODULOS L / M / N - NIVEL 1
7.1.7.2	Suministro e instalación de rociadores automáticos tipo pendiente temperatura intermedia (K=5.6 y rango de temperatura 79-107°C) para instalar en cubierta traslucida	EJEUCIÓN	$ 577,700	$ 33,039,638.00	$ 30,652,744	92.78%	MODULO M - NIVEL 1 (SALONES)


CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	INFORME SEMANAL	FT 300
		VERSIÓN: 00
		23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	**Contrato de obra No.133 de 2022**						
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**						
SEMANA No.	96	**DEL**	**18 de marzo de 2024**		**AL**	**24 de marzo de 2024**	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	672	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**			ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

8.4.1.1	Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4", incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.	EJEUCIÓN	$ 8,495,906	$ 34,035,300.00	$ 19,507,899	57.32%	MODULOS L / M / N / G / H - NIVEL 1
12.1.1	Suministro e instalacion Piso en baldosa de granito 30 x 30 cm, incluye adhesivo en polvo de altas prestaciones tipo pegacor o similar y boquilla, , incluye destronque pulida y brillado	EJEUCIÓN	$ 91,121,348	$ 1,059,112,760.45	$ 649,400,405	61.32%	MODULO G - NIVEL 1
12.2.1	Suministro e instalacion pared en ceramica 30 x 60 cm corona o similar (incluye remates y esquineros en aluminio)	EJEUCIÓN	$ -	$ 142,385,586.98	$ 77,636,564	54.53%	BAÑOS MODULO N - NIVEL 1
16.1.2	Suministro y aplicación de Estuco y Pintura Antibacterial a Base de Agua de Alta Resistencia	EJEUCIÓN	$ -	$ 26,094,640.08	$ 20,708,160	79.36%	BATERIAS DE BAÑOS MODULOS L / M / N - NIVEL 1
26.1	Aseo Permanente en Obra	EJEUCIÓN	$ 72,896,639	$ 69,027,840.00	$ 57,335,040	83.06%	MODULO I NIVEL 2 (LABORATORIOS) Y MODULOS G y H NIVEL 2 (SALONES).
28.6	Elemento de concreto reforzado dentro de mamposteria (Dovela en grouting)	EJEUCIÓN	$ 9,817,182	$ 439,360,678.80	$ 300,528,077	68.40%	MAMPOSTERIA QUE SE ADELANTA EN MODULO I NIVEL 1.
28.14	Media caña en granito - 10*10*100 CM remate de piso con mediacaña en granito, referencia similar al piso blanco huila.	EJEUCIÓN	$ 124,457,972	$ 53,638,740.00	$ 43,897,290	81.84%	BAÑOS MODULO N - NIVEL 1
28.25	Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M , menor o igual a 60 cm de longitud . Incluye mortero de pega	EJEUCIÓN	$ 27,433,232	$ 641,250,880.88	$ 494,809,751	77.16%	MAMPOSTERIA QUE SE ADELANTA EN MODULO I NIVEL 1.
28.31	Boca puerta en granito ancho hasta 10 cm incluye destroncado y pulida	EJEUCIÓN	$ 2,183,665	$ 24,818,524.36	$ 13,218,301	53.26%	BAÑOS MODULO N - NIVEL 1
28.33	Suministro e instalación de dilatación plástica en color blanco para baldosa en granito.	EJEUCIÓN	$ 33,961,517	$ 28,015,490.69	$ 14,231,593	50.80%	MODULO G - NIVEL 1
28.34	Suministro e instalación de punto de 6" para salida de tragantes de 8 x 6¨	EJEUCIÓN	$ 297,492,577	$ 19,663,280.00	$ 8,503,040	43.24%	TEATRINO
28.49	suministro e instalacion de bandeja en lamina galvanizada para fachada flotante	EJEUCIÓN	$ 19,180,792	$ 370,707,120.00	$ 269,665,200	72.74%	MODULO E y MODULO D - COSTADO OCCIDENTAL DEL PROYECTO.
28.51	Bordillo arranque de ventaneria en concreto reforzado de 3000 PSI a la vista biselado, en situ - (Dimensiones 0,2 x 0,12) Diseño y especificaciones técnicas según diseño estructural. .	EJEUCIÓN	$ 4,427,584	$ 81,035,798.76	$ 64,371,126	79.44%	MODULO I - NIVEL 2 (LABORATORIOS).

VALOR PROGRAMADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO SEMANA ANTERIOR	SEMANAL	ACUMULADO EJE.	AVANCE
$ 30,943,739,994.20	$ 1,499,256,345.43	$ 32,442,996,339.64	$ 26,843,254,938.44	$ 263,017,126.54	$ 27,106,272,064.98	-$ 5,336,724,274.66
72.22%	**3.50%**	**75.72%**	**62.65%**	**0.61%**	**63.26%**	**-12.45%**

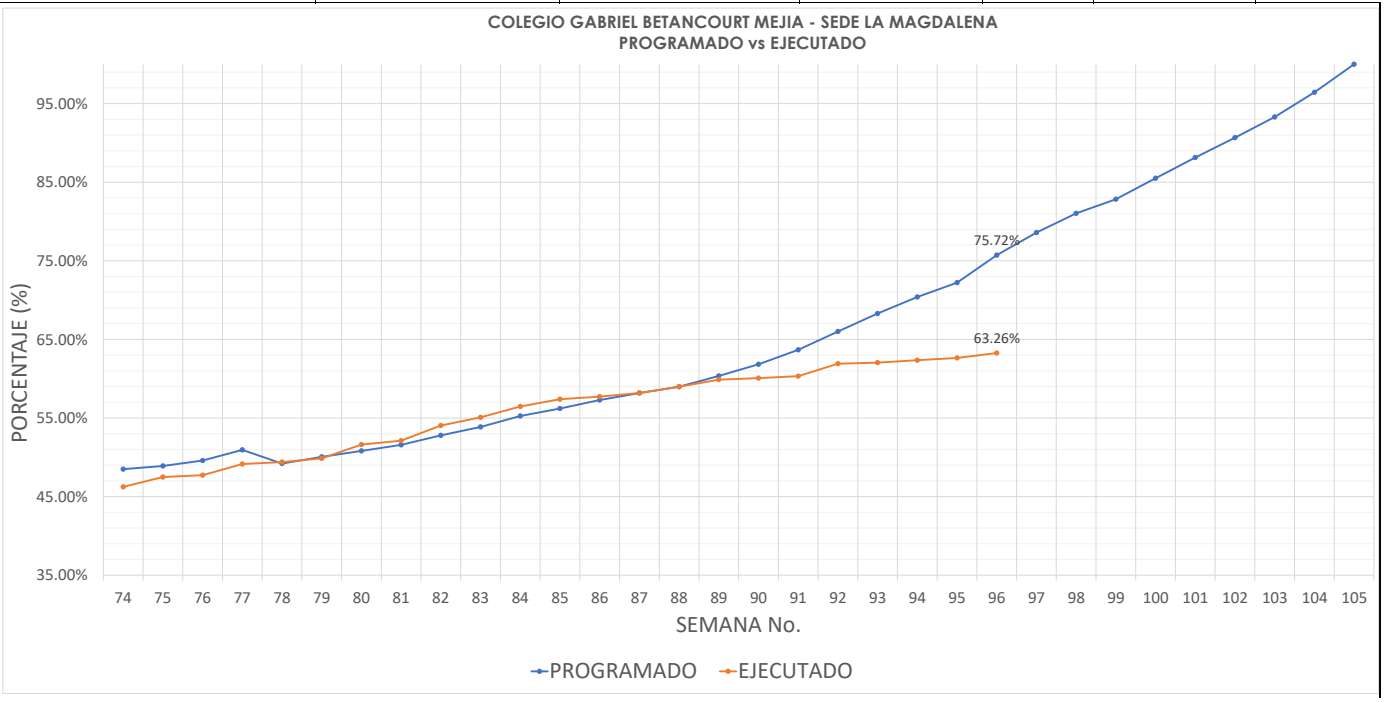

CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	INFORME SEMANAL	FT 300 VERSIÓN: 00 23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL					
CONTRATO No.	**Contrato de obra No.133 de 2022**				
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**				
SEMANA No.	96	**DEL**	**18 de marzo de 2024**	**AL**	**24 de marzo de 2024**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	672	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASOS

Item	Actividad	Valor atrasos	Atraso con respecto al presupuesto total	OBSERVACIONES
1.3	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-$ 808,433,917	**-1.89%**	Hasta el pasado 12 de febrero se pudo iniciar desmonte de las aulas existentes, y hasta el 19 de febrero se pudo iniciar con las labores de movimiento de tierras del módulo K, más de un mes despues del tiempo programado, y aún hay mobiliario de la secretaria de educación en el predio, siendo esta actividad de la ruta crítica del proyecto.
2.1	CIMENTACION	-$ 344,765,942	**-0.80%**	Marca atraso porque ya se tenía programado el inicio de esta labor, pero por la demora en la entrega del predio y las actividades predecesoras de ello, no se ha podido adelantar nada de ello, siendo ruta crítica de la programación de obra.
5.1	MAMPOSTERIA	-$ 994,365,186	**-2.32%**	Este capítulo marca atraso por el tema de la definición técnica por todas las partes con respecto a los acabados de las terrazas transitables a nivel de cubierta de los módulos L, M, N, G y H, pero es de recalcar que se adelantan labores en dichos sectores a riesgo del contratista para no seguir acumulando atrasos y sacar el proyecto adelante.
12	PISOS Y ENCHAPES	-$ 692,813,559	**-1.62%**	Este capítulo marca atraso por el tema de la definición técnica por todas las partes con respecto a los acabados de las terrazas transitables a nivel de cubierta de los módulos L, M, N, G y H, pero es de recalcar que se adelantan labores en dichos sectores a riesgo del contratista para no seguir acumulando atrasos y sacar el proyecto adelante.
18	CARPINTERIA METALICA	-$ 621,148,676	**-1.45%**	Este capítulo marca atraso por el tema de la definición técnica por todas las partes con respecto a los acabados de las terrazas transitables a nivel de cubierta de los módulos L, M, N, G y H, pero es de recalcar que se adelantan labores en dichos sectores a riesgo del contratista para no seguir acumulando atrasos y sacar el proyecto adelante.
21	OBRAS EXTERIORES, MOBILIARIO URBANO Y PAISAJISMO	-$ 390,222,894	**-0.91%**	Hasta el pasado 12 de febrero se pudo iniciar desmonte de las aulas existentes, y hasta el 19 de febrero se pudo iniciar con las labores de movimiento de tierras del módulo K, más de un mes despues del tiempo programado, y aún hay mobiliario de la secretaria de educación en el predio, siendo esta actividad de la ruta crítica del proyecto.
28	NO PREVISTOS	-$ 1,201,527,589	**-2.80%**	Este capítulo marca atraso por el tema de la definición técnica por todas las partes con respecto a los acabados de las terrazas transitables a nivel de cubierta de los módulos L, M, N, G y H, pero es de recalcar que se adelantan labores en dichos sectores a riesgo del contratista para no seguir acumulando atrasos y sacar el proyecto adelante.

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

Durante la semana 96 comprendidos entre los días 18 de marzo al 24 de marzo del 2024, se radicó los siguientes oficio:
1.El dia 18 de marzo del 2024 se radica la muestra de colores de ventaneria de preescolar en el oficio CCERU-22-1306. Se radica el plano de maestras piso 3 bloques H-G en el oficio CCERU-22-1308. Se radica el concepto de cargas estructurales de los modulos L M N en el oficio CERU-22-1309. Se radica los planos de distribucion de los elementos estructurales de las cubiertas del modulo I en el oficio CCERU-22-1310
2. El dia 20 de marzo del 2024 se radica al colegio teresa martinez de varela el manual de mantenimiento de operaciones e el oficio CCERU-22-1312.
3. El dia 21 de marzo del 2024 se radican las muestras de colores para mesones en corian en el oficio CCERU-22-1313

Aspecto Financiero

No se presento ninguna actividad en la semana

Aspecto Tecnico

Se observan atrasos con respecto a la programación vigente, toda vez que parte de las actividades programadas se encuentran dentro de las áreas que hasta en la semana 91 (12 de febrero) hizo entrega el colegio (aclarando que aún hay espacios sin poder intervenir ya que hay mobiliario de la S.E.D.), razón por la que este Consorcio requiere la entrega oficial y total de toda el área del Colegio, en aras de ejecutar lo programado sin aumentar el retraso actual. Se aclara que segun nueva programación de obra se evidencia más de un mes de atrasos en actividades de desmontes, demoliciones y excavaciones en el área del predio y todo lo que desencadenan estas dos actividades principales.

Es de recalcar, que al presentarse un retraso de más de un mes en la entrega parcial del área del colegio (aún tienen espacios ocupados), esto repercute directamente en actividades de la ruta crítica del programa de obra, debido a que son de gran peso en el presupuesto de obra (mov. tierras, cimentaciones y estructuras) y desencadenan varias actividades del proyecto que estan programadas hace tiempo y hasta ahora se ha podido ejecutar parcialmente algo de ello, es de anotar que son actividades de la ruta crítica del proyecto y predecesoras indispensables de más actividades que cronológicamente no se pueden adelantar ni traslapar en la ejecución. Como se observa que está en cero en la columna de valor programado, esto nos representa puntualmente que esto se tuvo que ejecutar desde hace más de un mes y hasta ahora se pudo intervenir algunas areas del colegio que se encontraba en uso. También se aclara que está pendiente la definición técnica del acabado de las cubiertas de los módulos L, M, N, G y H, definición que lleva mas de 6 meses trabajando en ello, y que las actividades de acabados de los niveles inferior a estas cubiertas estan detenidos afectando el programa de obra. Tambien se informa que el contratista avanza en estos módulos asumiendo riesgos con el fin de avanzar y no aumentar el retraso en el proyecto.

Se informa que con los recursos actuales existe una imposibilidad de desarrollar las obras al 100%, razón por la que se debe definir el alcance real de las obras. Es de anotar que el atraso no es tan representativo, pero se debe a que el contratista ha buscado la forma de ejecutar actividades que se permitan a medida del avance de la obra y los espacios entregados, sin importar o no que estén en la programación con el fin de no reflejar incumplimientos ni retrasos mayores.

Tambien se aclara que desde la semana pasada se han presentado lloviznas, lluvias fuertes, tormentas eléctricas leves que por temas de seguridad y salud en el trabajo se deben detener actividades para salvaguardar o proteger la integridad de cada trabajador retrasando el normal desarrollo de algunas actividades constructivas del proyecto. Es de aclarar que para todo el tema de las actividades que se adelantan en exteriores, especialmente en urbanismo, el movimiento de tierras y llenos, no solo afecta el tiempo de la precipitación sino el tiempo en que se sequen los materiales y se re construya o este adecuado lo que se había avanzado para poder continuar con dichas labores y garantizar la estabilidad y calidad de ello.

Aspecto SST-Ambiental

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto Ambiental:
1. El dia 20 de marzo del 2024 se reciben inspección ambiental de marzo por parte de interventoría
2. El dia 212 de marzo del 2024 se hace asistencia comité integral de obra
3. El dia 22 de marzo del 2024 se hace asistencia y participación en comité de participación ciudadana, se remite a interventoría formatos RCD diligenciados para el cargue al aplicativo de la SDA, limpieza de sumideros, mantenimiento protección de individuos arbóreos, capacitación al personal operativo.

Lunes, miércoles y viernes: se realiza la disposición de residuos sólidos convencionales generados en obra a través del operador de aseo del sector de acuerdo con las microrutas de recolección establecidas, todos los días se realiza limpieza de vías, adicionalmente todos los días se realiza jornada de orden y aseo a las áreas intervenidas

Se realizaron las siguientes actividades en el Aspecto SST:
1. El dia 18 de marzo se hace validación permisos, charla 5 minutos , recorrido en obra, acompañamiento en actividades de alto riesgo,seguimiento cronograma actividades, verificación planillas seguridad social personal visistante y proveedores.
2. El dia 19 de marzo del 2024 se reliza inducción personal nuevo, validación planillas de seguridad social, radicación personal, inducciones de sst , elaboración y diligenciamiento de hojas de vida de equipos propios y control de revisión de planillas de seguridad social.
3. El dia 20 de marzo del 2024 se hace validación permisos de trabajo en conjunto con interventoria, subsanación de observaciones,Charla 5 minutos, reunión sst, recorrido en campo, gestión de cronograma de actividades SST, subsanación observaciones informe mensual.
4. El dia 21 de marzo del 2024 se realiza charla de seguridad, verificacion de ats,permisos de trabajo,inspecciones)entrega de EPP , Supervision de actividades propias del consorcio, supervicion de actividades del personal de urbanismo y suprevicion actividades de los contratistas. verificacion de planillas para ingreso de vehiculos,radicación personal nuevo, capacitaciones sst
5. El dia 22 de marzo del 2024 se realiza charla 5 minutos, validacón de permisos en campo, reunión SST , recorrido en campo, gestión de cronograma de actividades SST, socializacion actividades semanales .
6. El dia 23 de marzo del 2024 se realiza charla 5 minutos, validacón de permisos en campo, reunión SST , recorrido en campo, gestión de cronograma de actividades SST, socializacion actividades semanales .organizacion permisos (ATS, permisos alturas, en caliente y preoparacionales)

CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	INFORME SEMANAL	FT 300 VERSIÓN: 00 23/05/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL						
CONTRATO No.	**Contrato de obra No.133 de 2022**					
OBJETO DEL CONTRATO	**Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía- Sede la Magdalena .Por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste , ubicado en la localidad de Kenedy , de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.**					
SEMANA No.	96	**DEL**	**18 de marzo de 2024**	**AL**	**24 de marzo de 2024**	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	672	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ			

Aspecto Social

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:
1. El dia 18 de marzo del 2024 se realiza a través de correo electronico se remitió convocatoria a la Reunión del Comité de Participación Ciudadana No 19 al señor rector, Dirección Local de educación, representantes de Alcaldia Local de Kennedy, y miembros del Comité de Participación Ciudadana, así mismo se remitió encuesta medición de impactos.
2. El dia 20 de marzo del 2024 se realiza a través de correo electrónico, se remite a interventoría la Relación Personal Mano de Obra No Calificada (MONC) - Obra Colegio Gabriel Betancourt Mejía - Sede La Magdalena, con corte al 16 de marzo de 2024.
3. El dia 21 de marzo del 2024 se realiza asistencia y participación Comité de Seguimiento Social. Asistencia y participación Comité de Seguimiento Integral
4. El dia 22 de marzo del 2024 se realiza la Reunión del Comité de Participación Ciudadana No 19, encuentro en el cual se socializó la ejecución del proyecto a la fecha en cada uno de los componentes (técnico, sst, ambiental y social), pese a que se realizó una convocatoria masiva, la asistencia fue baja, es relevante resaltar el acompañamiento al encuentro de la supervisión del proyecto, interventoría, representantes de la Dirección Local de Kennedy, rector, docente, estudiantes y comunidad aledaña.

Entre el 18 al 22 de marzo de 2024: Se garantizará la atención a la ciudadanía, conforme a los mecanismos de atención al ciudadano dispuestos (línea de atención telefónica, correo electrónico), así mismo, se efectuó atención en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en el horario presencial establecido los días jueves entre la 1:00 pm y las 5:00 pm.

Aspecto PMT

1. El dia 22 de marzo del 2024 se radica el PMT aprobado con el periodo correspondiente del 22 de marzo del 2024 al 27 de febrero del 2025 en el oficio CCERI-SST-2022-317

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
25316 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
35147 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			
35148 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			
35149 COI No. 37	202261202576662*	16/09/2022	14/09/2023			

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE OBRA
Con respecto a las polizas de adicion y prorroga, a la fecha aun se encuentran en tramite	
	Firma
